TEKLED ELECTRIC

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАЙЛ СОГЛАСОВАНИЯ

Шкаф управления наружным освещением

ШУНО-1

Astana — Ергун Бей


Дата: 21.09.2026

Наименование панели	ШУНО-1 — шкаф управления наружным освещением
Проект / заказ	Astana — Ергун Бей, 260921
Количество	1 комплект
Габариты (В×Ш×Г)	1000 × 650 × 250 мм
Исполнение	Навесное, однодверное
Степень защиты	IP54 (по BOM / проекту)
Корпус	TEKSAN F, арт. 714-15110
Ввод кабеля	Снизу
Открывание двери	Вправо, петли справа
Внутренние перегородки	Не предусмотрены

Основание: BOM 260921_Astana_ErgunBey_SHUNO1_CHINT_BOM.xlsx

1. Габаритный чертёж — вид спереди

ШУНО-1 — ВИД СПЕРЕДИ

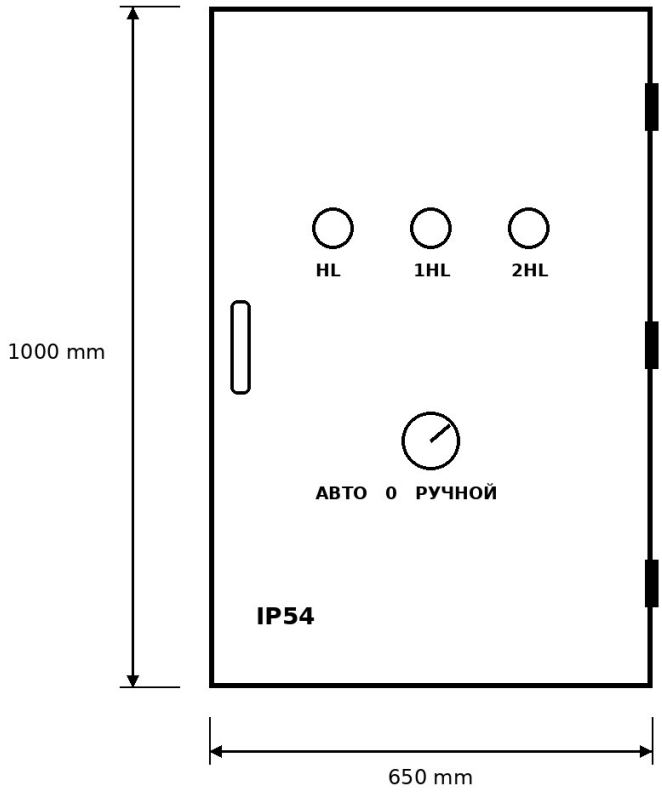

Исполнение:
навесное

Степень защиты:
IP54

Дверь:
1 шт., петли справа


Материал:
стальной корпус

Ввод кабеля:
снизу


Примечание: органы управления на двери — 3 зелёных индикатора и 3-позиционный переключатель «Авто–0–Ручной».

2. Вид сбоку и снизу


ШУНО-1 — ВИД СБОКУ И СНИЗУ

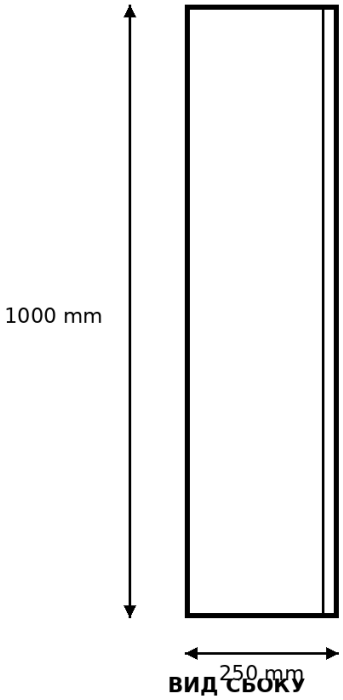

ВИД СБОКУ



ВИД СНИЗУ / КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД




Примечания:

- Кабельный ввод выполнить снизу через съёмную вводную пластину.
- PE-провод двери: ПВ3 1×6 мм².
- Свободные отверстия заглушить; сохранить степень защиты IP54.
- Наружное фотореле монтируется вне шкафа.

3. Предварительная внутренняя компоновка

ШУНО-1 — ВИД СПЕРЕДИ (ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА)

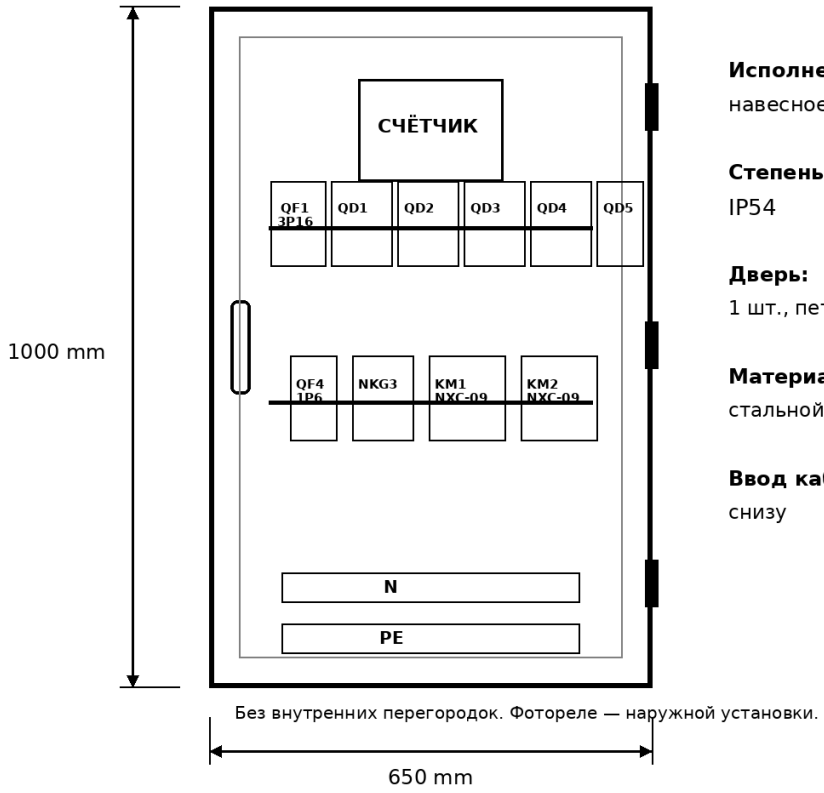

Исполнение:
навесное

Степень защиты:
IP54

Дверь:
1 шт., петли справа

Материал:
стальной корпус

Ввод кабеля:
снизу

Без внутренних перегородок. Фотореле — наружной установки.

Компоновка выполнена по BOM. Внутренние перегородки не применяются. Окончательное расположение DIN-реек и кабельных каналов допускается уточнить при сборке без изменения электрической схемы и доступности обслуживания.

4. Основное оборудование

№	Оборудование	Кол.	Назначение / примечание
1	Счётчик 3ф SAIMAN Дала CA4-3720, 5(60)A	1	Прямое включение, без ТТ
2	Авт. выключатель CHINT NXB-63S 3P C16 4.5kA	1	Ввод
3	Диф. автомат CHINT NXBLE-63YH 3P+N C10 30mA тип A 6kA	4	Группы 1,3,4,5
4	Диф. автомат CHINT NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A 6kA	1	Группа 2
5	Авт. выключатель CHINT NXB-63S 1P C6	1	Цепь управления
6	Контактор CHINT NXC-09, катушка 220V	2	KM1, KM2
7	Таймер CHINT NKG3 AC230V	1	Автоматическое управление
8	Фотореле ФР-602 IP44	1	Наружная установка
9	Индикатор зелёный ND16-22D/2 230V	3	На двери
10	Переключатель NP8-11X/312, 3 положения IP65	1	Авто–0–Ручной, на двери
11	Шины N / PE	1+1	В нижней части шкафа

5. Производственные требования

- Корпус принять 1000×650×250 мм, IP54, навесного исполнения.
- Дверь односторонняя, открывание вправо (петли справа).
- Кабельный ввод выполнить снизу; неиспользуемые отверстия заглушить с сохранением IP54.
- Фотореле ФР-602 — наружной установки, в шкафу место не резервировать.
- Счётчик прямого включения 5(60)A; трансформаторы тока не устанавливаются.
- N и PE шины установить в нижней части шкафа. Дверь заземлить проводом ПВ3 1×6 мм².
- Маркировка аппаратов и проводов — по принципиальной схеме/BOM; фазировку и затяжку клемм проверить перед ОТК.
- ВНИМАНИЕ: для наружной установки BOM/проектом принят IP54. Если шкаф устанавливается полностью под открытым небом без козырька, до запуска в производство подтвердить, достаточно ли IP54 или требуется IP65.

6. Согласование

Этап	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Проектирование			
Проверка			
Производство			
ОТК			
