PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BATYS TEHNO

260925 | Актау | Рахми Бей

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ - КОМПЛЕКТ ЩИТОВ

№	Щит	Габариты ВхШхГ	Кол.
1	**ШУ-ПЧ-75-1 - ПЧ 75 кВт, IP31, У3**	1800x600x450 мм	**4**
2	Я5111-3674 УХЛ4 - 1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А	650x500x220 мм	**1**
3	ЯУО9601-3474 - управление освещением	500x400x220 мм	**1**
4	ЩР - проект: ЩМП 800x800x205 IP65 УХЛ1	1320x750x300 мм	**1**
5	ЩЭО обогрев - проект: ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1	1000x650x300 мм	**1**

В комплекте 5 типов щитов. По щитам ЩР и ЩЭО обогрев выявлены критические расхождения между обозначением проекта, строкой корпуса в BOM и примечанием. Эти позиции отмечены стоп-пунктом и требуют подтверждения до резки металла.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ШУ-ПЧ-75-1

ПЧ 75 кВт, IP31, У3



Щит ВРУ 1800x600x450 + цоколь 100 мм

Объект	BATYS TEHNO, Актау
Наименование щита	ШУ-ПЧ-75-1 - ПЧ 75 кВт, IP31, У3
Тип корпуса	Щит ВРУ 1800x600x450 + цоколь 100 мм
Габариты (ВхШхГ)	1800 x 600 x 450 мм
Монтаж	напольный, цоколь 100 мм
Степень защиты / цвет	IP54 корпус / проект IP31 / RAL 7035
Сеть / ввод	3P+N+PE, 400/230 В, 50 Гц
Главный аппарат	NXM-250S 3P 200A 36кА
Количество	4 компл.
Источник данных	BOM 260925_Aktau_RahmiBey_CHINT_BOM - recete.xlsx

КЛЮЧЕВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ


УСЛОВНО СОГЛАСОВАТЬ: подтвердить тепловой расчёт и исполнение IP54 вместо IP31.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	ОТК		Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	**ШУ-ПЧ-75-1** Титульный лист и исходные данные	**1**	**R0**	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ЗАКРЫТА

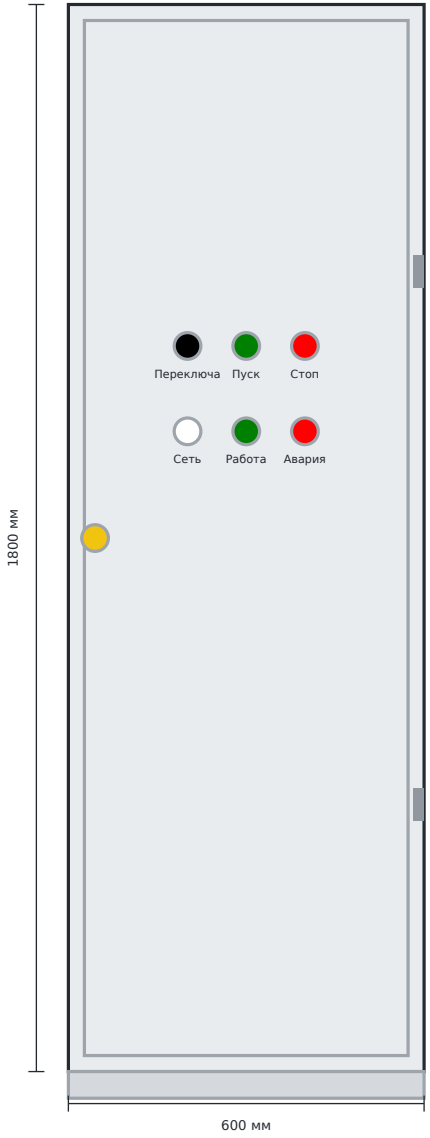


ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ - КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД




Монтаж	напольный, цоколь 100 мм
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо.
Замок	Замок на левой свободной кромке двери.
Кабельный ввод	Снизу; отверстия выполнять после подтверждения диаметров кабелей.
PE двери	Гибкий провод ПВ3 6 мм².
Важно	УСЛОВНО СОГЛАСОВАТЬ: подтвердить тепловой расчёт и исполнение IP54 вместо IP31.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	ШУ-ПЧ-75-1	Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Габаритные виды: спереди, сбоку, сверху и снизу	2	R0	25.09.26

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ОТКРЫТА

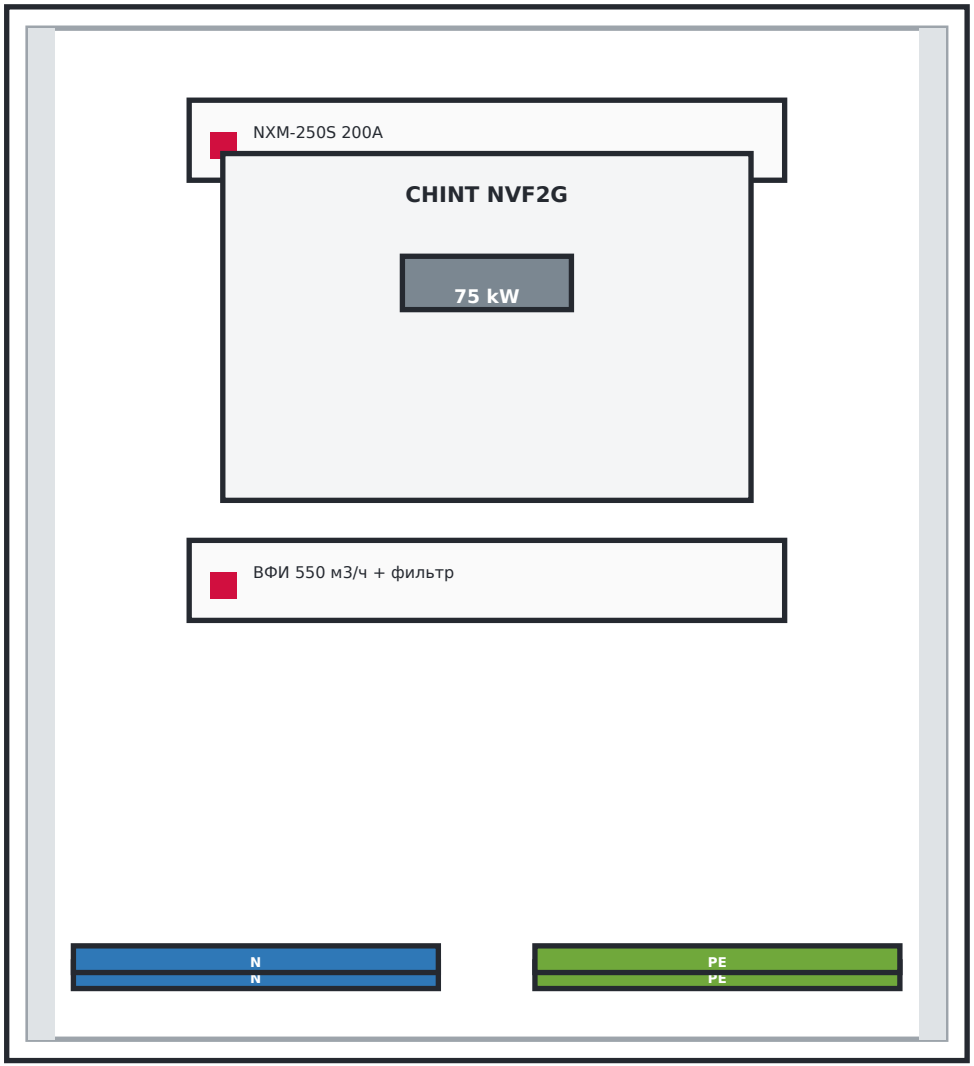

Зона / оборудование	
1.	NXM-250S 200A
2.	2 x NXB-63S 1P C6
3.	NVF2G-75/TS4 75 кВт
4.	ВФИ 550 м3/ч + фильтр
5.	Cu шины 3x20, N, PE

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые и цепи управления прокладывать раздельно по каналам.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником ПВ3 6 мм².
3. Обеспечить свободный доступ к аппаратам и клеммам.
4. Маркировка аппаратов и проводов по BOM и схеме проекта.
5. N и PE не объединять после точки разделения.
6. После сборки: затяжка, PE-непрерывность, изоляция, механика двери/замка.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	Корпус ВРУ 1800x600x450 + цоколь 100 мм	719-15602	TEKSAN F	1	шт
2	MCCB NXM-250S/3P 200A 36кА	131367	CHINT	1	шт
3	MCB NXB-63S 1P C6 4.5кА	296708	CHINT	2	шт
4	Преобразователь частоты NVF2G-75/TS4 75кВт	639057	CHINT	1	шт
5	Переключатель NP8-11X/312 3 поз.	667137	CHINT	1	шт
6	Кнопка Пуск NP8-10BN/3 зел.	667232	CHINT	1	шт
7	Кнопка Стоп NP8-01BN/4 красн.	667231	CHINT	1	шт
8	Индикатор ND16-22D/2 белый	593073	CHINT	1	шт
9	Индикатор ND16-22D/2 зелёный	593077	CHINT	1	шт
10	Индикатор ND16-22D/2 красный	593075	CHINT	1	шт
11	Вентилятор с фильтром ВФИ 550 м3/ч IP55	270300292	IEK	1	шт
12	Фильтр-решётка ВФИ 480-700 м3/ч	270300298	IEK	1	шт
13	Шина Cu 3x20	130300473	EKT	2.75	м
14	Изолятор ИО101-30	32101DEK	DEKRAFT	10	шт
15	Кабельный канал перф. 40x40	280100020	IEK	6.5	м
16	ПВ3 1x1.5	151.01.PV3.01,5	HARMONY	13	м
17	ПВ3 1x70	151.01.PV3.70	HARMONY	1.7	м
18	ПВ3 1x6 (PE двери)	151.01.PV3.06	HARMONY	0.5	м

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ


- Корпус: Щит ВРУ 1800x600x450 + цоколь 100 мм.
- Дверь открывается вправо; петли справа.
- Замок установлен на левой свободной кромке.
- Все двери и съёмные металлические части заземлены.
- N и PE выполнены раздельно.
- Кабельный ввод снизу; отверстия после подтверждения кабелей.
- Аппараты закреплены, маркировка читаема, доступ к клеммам сохранён.
- Проверить момент затяжки силовых соединений.
- Выполнить проверку изоляции и PE-непрерывности.
- Выполнить механическую проверку двери, замка, вентиляции.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Я5111-3674 УХЛ4

1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А

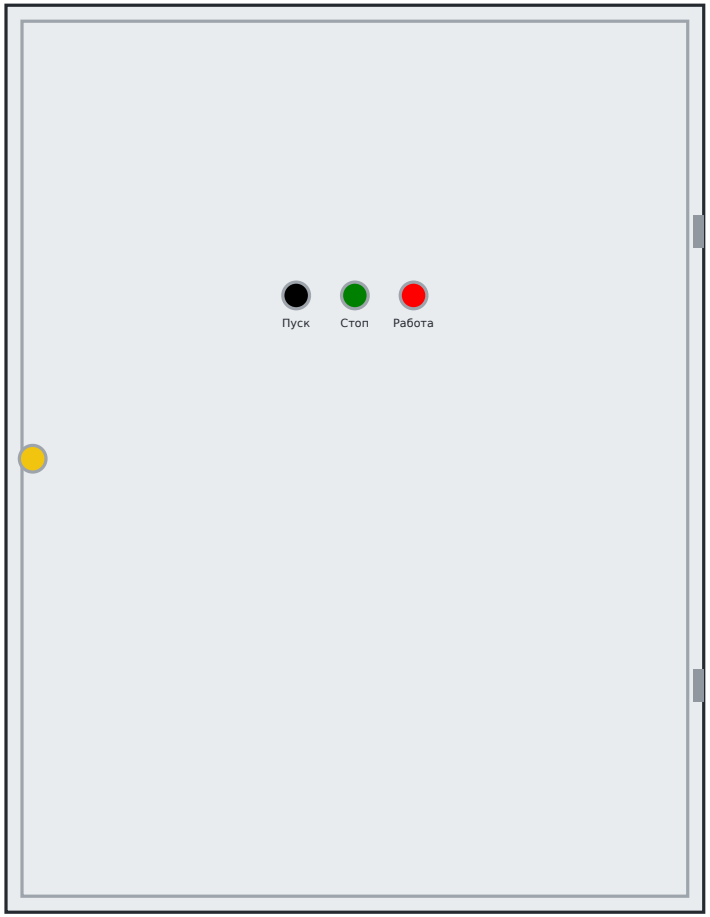

ЩМП-3 650x500x220

Объект	BATYS TEHNO, Актау
Наименование щита	Я5111-3674 УХЛ4 - 1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А
Тип корпуса	ЩМП-3 650x500x220
Габариты (ВхШхГ)	650 x 500 x 220 мм
Монтаж	навесной
Степень защиты / цвет	BOM: IP31; примечание: IP54 / RAL 7035
Сеть / ввод	3P+N+PE, 400/230 В, 50 Гц
Главный аппарат	NXM-125S 3P 50A 25кА
Количество	1 компл.
Источник данных	BOM 260925_Aktau_RahmiBey_CHINT_BOM - recete.xlsx

КОНТРОЛЬ ДО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: в строке корпуса IP31, в примечании к BOM указан IP54.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	ОТК		Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	**Я5111-3674 УХЛ4** Титульный лист и исходные данные	**1**	**R0**	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

Проект 260925 | Актау | BATYS TEHNO | Я5111-3674 УХЛ4

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ЗАКРЫТА

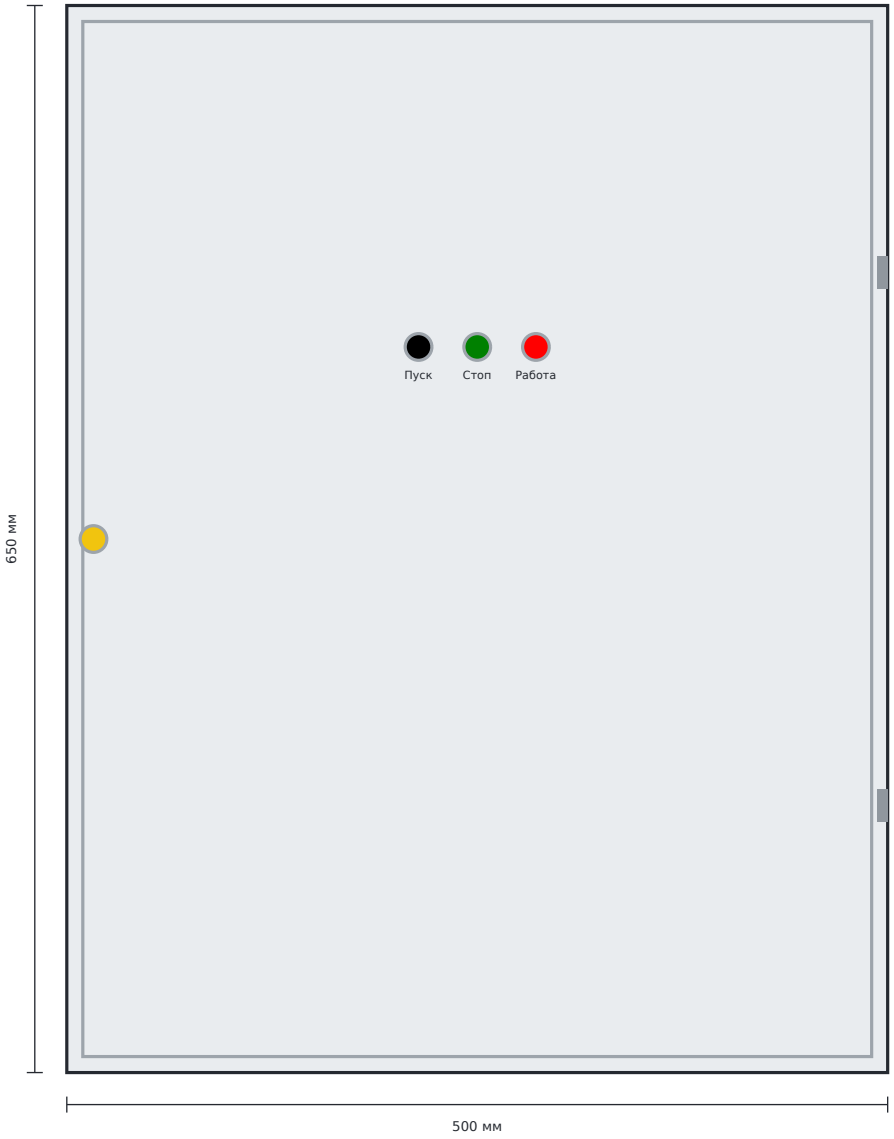


ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ - КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД




Монтаж	навесной
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо.
Замок	Замок на левой свободной кромке двери.
Кабельный ввод	Снизу; отверстия выполнять после подтверждения диаметров кабелей.
PE двери	Гибкий провод ПВ3 6 мм².
Важно	ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: в строке корпуса IP31, в примечании к BOM указан IP54.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Я5111-3674 УХЛ4	Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Габаритные виды: спереди, сбоку, сверху и снизу	2	R0	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ОТКРЫТА

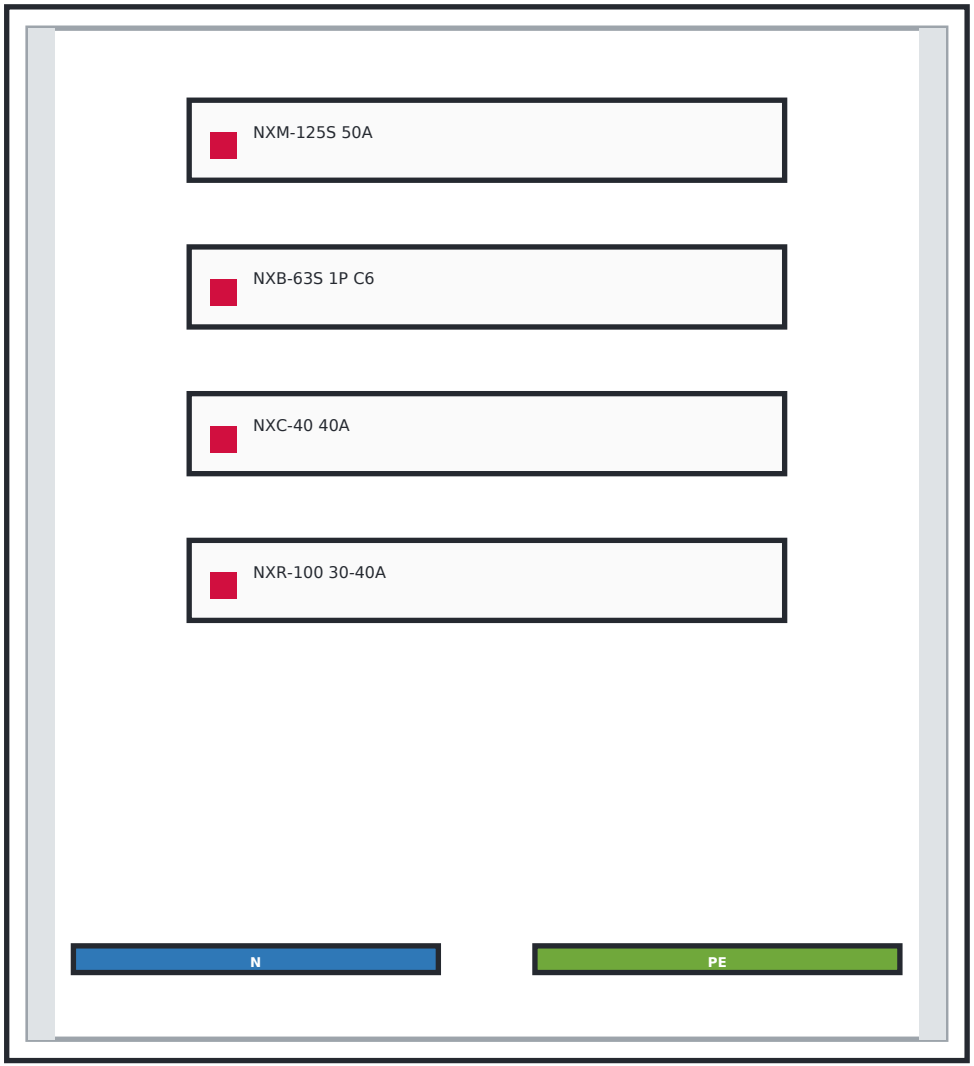

Зона / оборудование	
1.	NXM-125S 50A
2.	NXB-63S 1P C6
3.	NXC-40 40A
4.	NXR-100 30-40A
5.	N / PE

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые и цепи управления прокладывать раздельно по каналам.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником ПВ3 6 мм².
3. Обеспечить свободный доступ к аппаратам и клеммам.
4. Маркировка аппаратов и проводов по BOM и схеме проекта.
5. N и PE не объединять после точки разделения.
6. После сборки: затяжка, PE-непрерывность, изоляция, механика двери/замка.

НЕ ЗАПУСКАТЬ РЕЗКУ КОРПУСА ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЙ.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-3 650x500x220 IP31	719-15901	TEKSAN F	1	шт
2	MCCB NXM-125S/3P 50A 25кА	844302	CHINT	1	шт
3	MCB NXB-63S 1P C6 4.5кА	296708	CHINT	1	шт
4	Контактор NXC-40 40A 220В	836780	CHINT	1	шт
5	Тепловое реле NXR-100 30-40A	837123	CHINT	1	шт
6	Кнопка Пуск NP8-10BN/3	667232	CHINT	1	шт
7	Кнопка Стоп NP8-01BN/4	667231	CHINT	1	шт
8	Индикатор Работа ND16-22D/2 зел.	593077	CHINT	1	шт
9	Шина N 8x12 ШНИ 8-КС-С	130200365	UNIT	1	шт
10	Шина PE 8x12 ШНИ 6-КС-С	130200364	UNIT	1	шт
11	ПВ3 1x1.5	151.01.PV3.01,5	HARMONY	9.1	м
12	ПВ3 1x6	151.01.PV3.06	HARMONY	2	м
13	ПВ3 1x10	151.01.PV3.10	HARMONY	1.7	м
14	ПВ3 1x6 (PE двери)	151.01.PV3.06	HARMONY	0.5	м

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

- Корпус: ЩМП-3 650x500x220.
- Дверь открывается вправо; петли справа.
- Замок установлен на левой свободной кромке.
- Все двери и съёмные металлические части заземлены.
- N и PE выполнены раздельно.
- Кабельный ввод снизу; отверстия после подтверждения кабелей.
- Аппараты закреплены, маркировка читаема, доступ к клеммам сохранён.
- Проверить момент затяжки силовых соединений.
- Выполнить проверку изоляции и PE-непрерывности.
- Выполнить механическую проверку двери, замка, вентиляции.

СТОП-ПУНКТ


ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: в строке корпуса IP31, в примечании к BOM указан IP54.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЯУО9601-3474

управление освещением

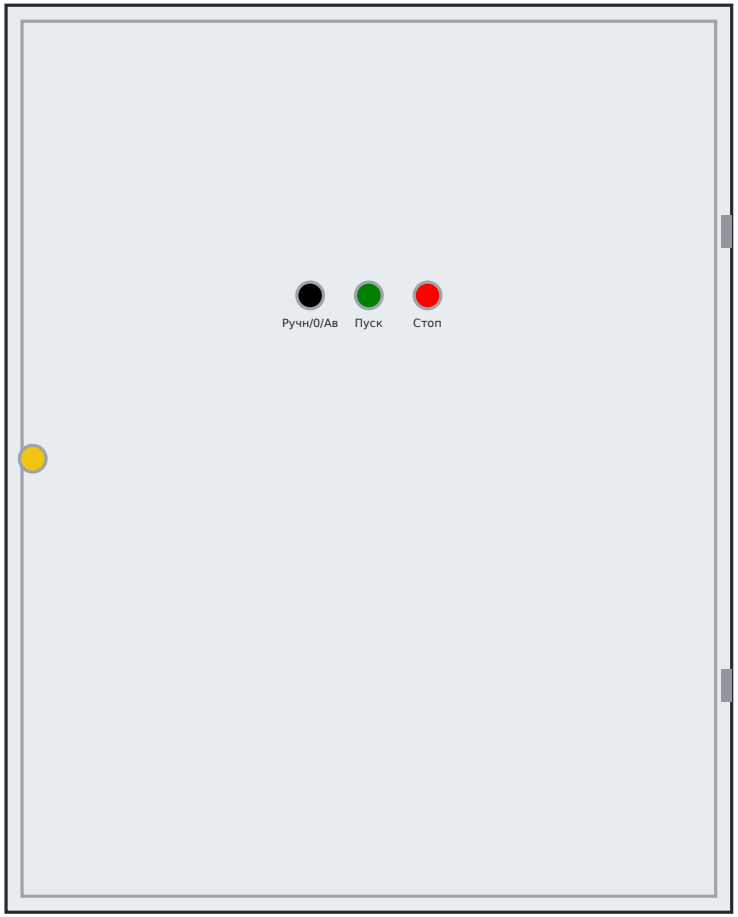

ЩМП-2 500x400x220 IP54

Объект	BATYS TEHNO, Актау
Наименование щита	ЯУО9601-3474 - управление освещением
Тип корпуса	ЩМП-2 500x400x220 IP54
Габариты (ВхШхГ)	500 x 400 x 220 мм
Монтаж	навесной
Степень защиты / цвет	IP54 / RAL 7035
Сеть / ввод	3P+N+PE, 400/230 В, 50 Гц
Главный аппарат	NXB-63S 3P C32 4.5кА
Количество	1 компл.
Источник данных	BOM 260925_Aktau_RahmiBey_CHINT_BOM - recete.xlsx

КЛЮЧЕВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ


КОРПУС УВЕЛИЧЕН: проект 400x300x200 не обеспечивает размещение с резервом; BOM принят 500x400x220.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	ОТК		Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	**ЯУО9601-3474** Титульный лист и исходные данные	**1**	**R0**	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ЗАКРЫТА

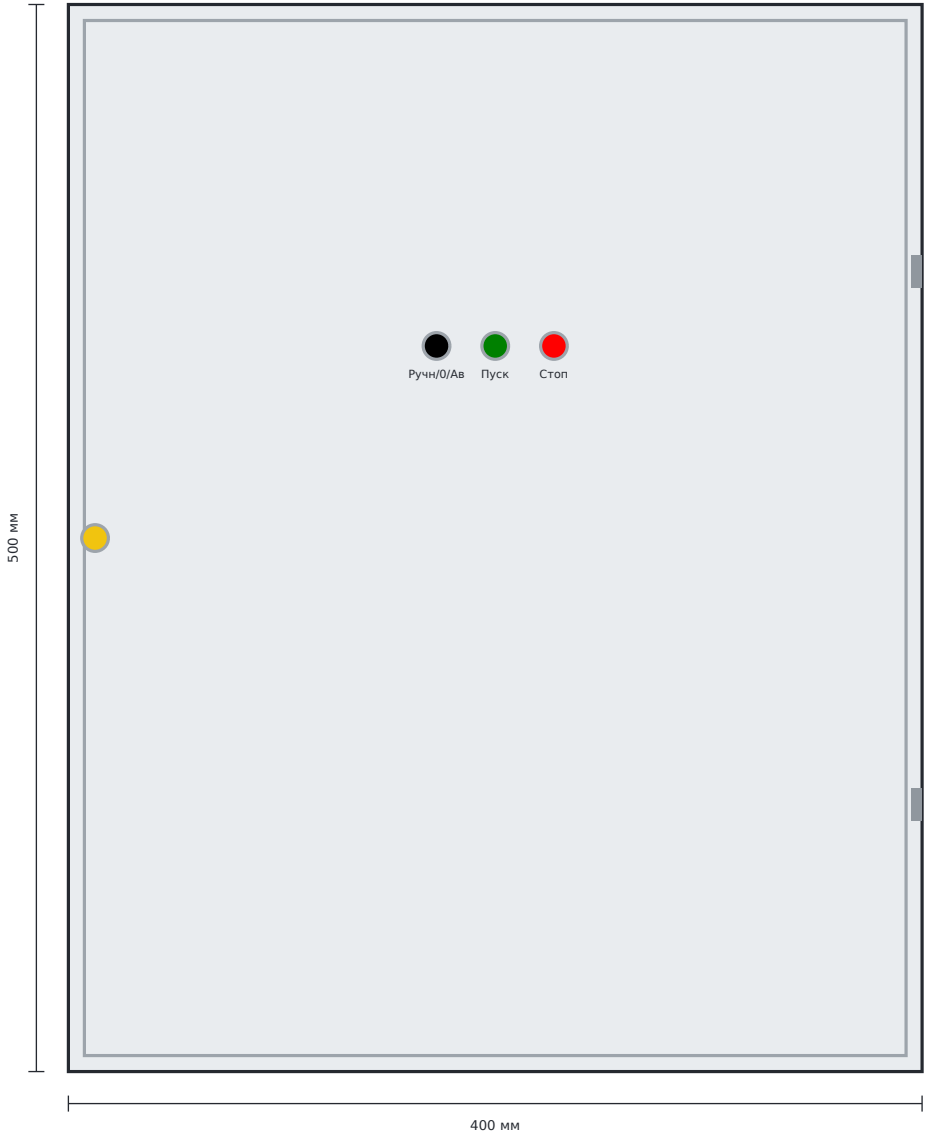


ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ - КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД




Монтаж	навесной
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо.
Замок	Замок на левой свободной кромке двери.
Кабельный ввод	Снизу; отверстия выполнять после подтверждения диаметров кабелей.
PE двери	Гибкий провод ПВ3 6 мм².
Важно	КОРПУС УВЕЛИЧЕН: проект 400x300x200 не обеспечивает размещение с резервом; BOM принят 500x400x220.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК		Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	**ЯУО9601-3474** Габаритные виды: спереди, сбоку, сверху и снизу	**2**	**R0**	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ОТКРЫТА

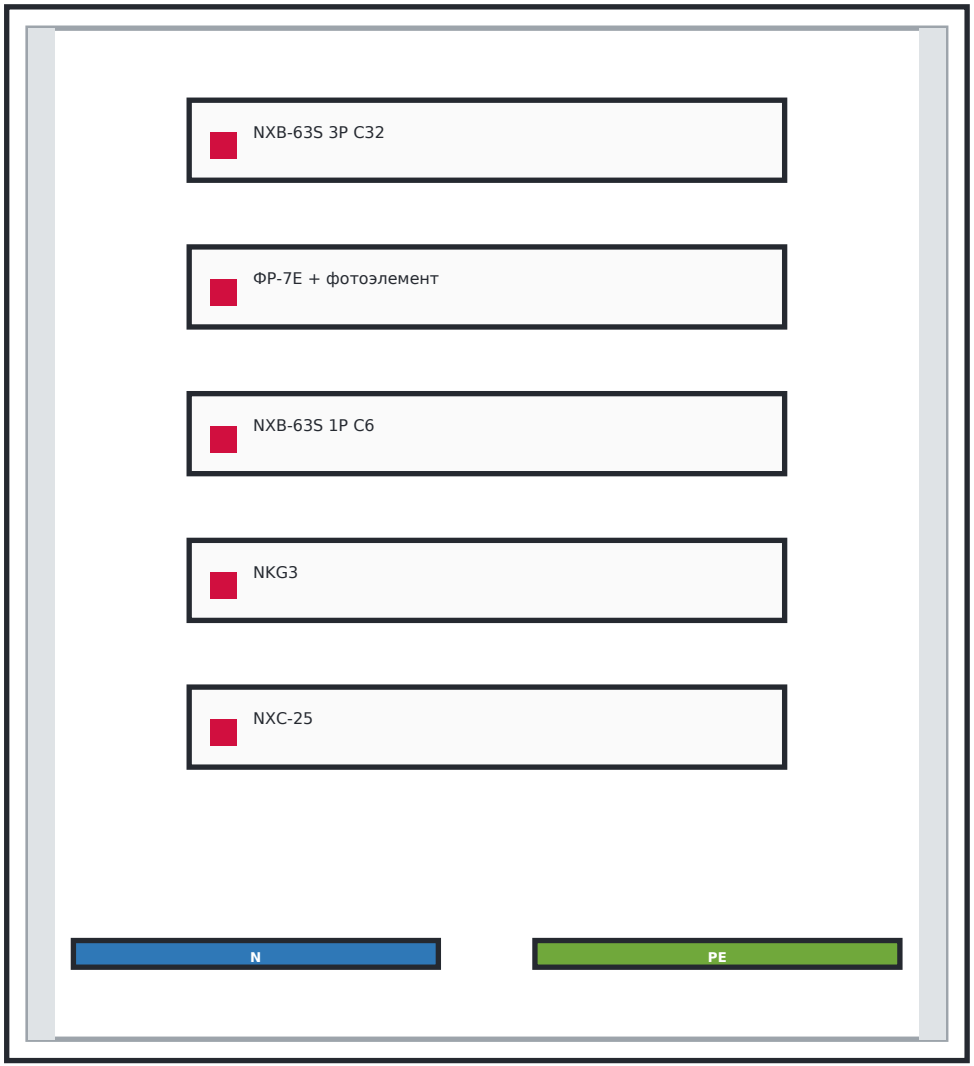

Зона / оборудование	
1.	NXB-63S 3P C32
2.	ФР-7E + фотоэлемент
3.	NXB-63S 1P C6
4.	NKG3
5.	NXC-25
6.	N / PE

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые и цепи управления прокладывать раздельно по каналам.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником ПВ3 6 мм².
3. Обеспечить свободный доступ к аппаратам и клеммам.
4. Маркировка аппаратов и проводов по BOM и схеме проекта.
5. N и PE не объединять после точки разделения.
6. После сборки: затяжка, PE-непрерывность, изоляция, механика двери/замка.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА

Проект 260925 | Актау | BATYS TEHNO | ЯУ…601…74

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-2 500x400x220 IP54	719-15425	TEKSAN F	1	шт
2	MCB NXB-63S 3P C32 4.5кА	296830	CHINT	1	шт
3	Фотореле ФР-7Е с выносным фотоэлементом	130300434	EKT	1	шт
4	MCB NXB-63S 1P C6 4.5кА	296708	CHINT	1	шт
5	Контактор NXC-25 25A 220В	836851	CHINT	1	шт
6	Таймер электронный NKG3 AC230B	310024	CHINT	1	шт
7	Переключатель NP8-11X/312 3 поз.	667137	CHINT	1	шт
8	Кнопка Пуск NP8-10BN/3	667232	CHINT	1	шт
9	Кнопка Стоп NP8-01BN/4	667231	CHINT	1	шт
10	Шина N 8x12 ШНИ 8-КС-С	130200365	UNIT	1	шт
11	Шина PE 8x12 ШНИ 6-КС-С	130200364	UNIT	1	шт
12	ПВ3 1x1.5	151.01.PV3.01,5	HARMONY	14.4	м
13	ПВ3 1x4	151.01.PV3.04	HARMONY	2	м
14	ПВ3 1x6	151.01.PV3.06	HARMONY	0.8	м
15	ПВ3 1x6 (PE двери)	151.01.PV3.06	HARMONY	0.5	м

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ


- Корпус: ЩМП-2 500x400x220 IP54.
- Дверь открывается вправо; петли справа.
- Замок установлен на левой свободной кромке.
- Все двери и съёмные металлические части заземлены.
- N и PE выполнены раздельно.
- Кабельный ввод снизу; отверстия после подтверждения кабелей.
- Аппараты закреплены, маркировка читаема, доступ к клеммам сохранён.
- Проверить момент затяжки силовых соединений.
- Выполнить проверку изоляции и PE-непрерывности.
- Выполнить механическую проверку двери, замка, вентиляции.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	ЯУО9601-3474	Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Комплектация по BOM и контроль производства	4	R0	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ЩР

проект: ЩМП 800x800x205 IP65 УХЛ1



ЩРн-7-2 PR 1320x750x300 IP54 (строка BOM)


Объект	BATYS TEHNO, Актау
Наименование щита	ЩР - проект: ЩМП 800x800x205 IP65 УХЛ1
Тип корпуса	ЩРн-7-2 PR 1320x750x300 IP54 (строка BOM)
Габариты (ВхШхГ)	1320 x 750 x 300 мм
Монтаж	навесной / уточнить
Степень защиты / цвет	BOM-корпус IP54; проект IP65 / RAL 7035
Сеть / ввод	3P+N+PE, 400/230 В, 50 Гц
Главный аппарат	NXM-250S 3P 160A 36кА
Количество	1 компл.
Источник данных	BOM 260925_Aktau_RahmiBey_CHINT_BOM - recete.xlsx

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	**ЩР**	Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Титульный лист и исходные данные	**1**	**R0**	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ЗАКРЫТА

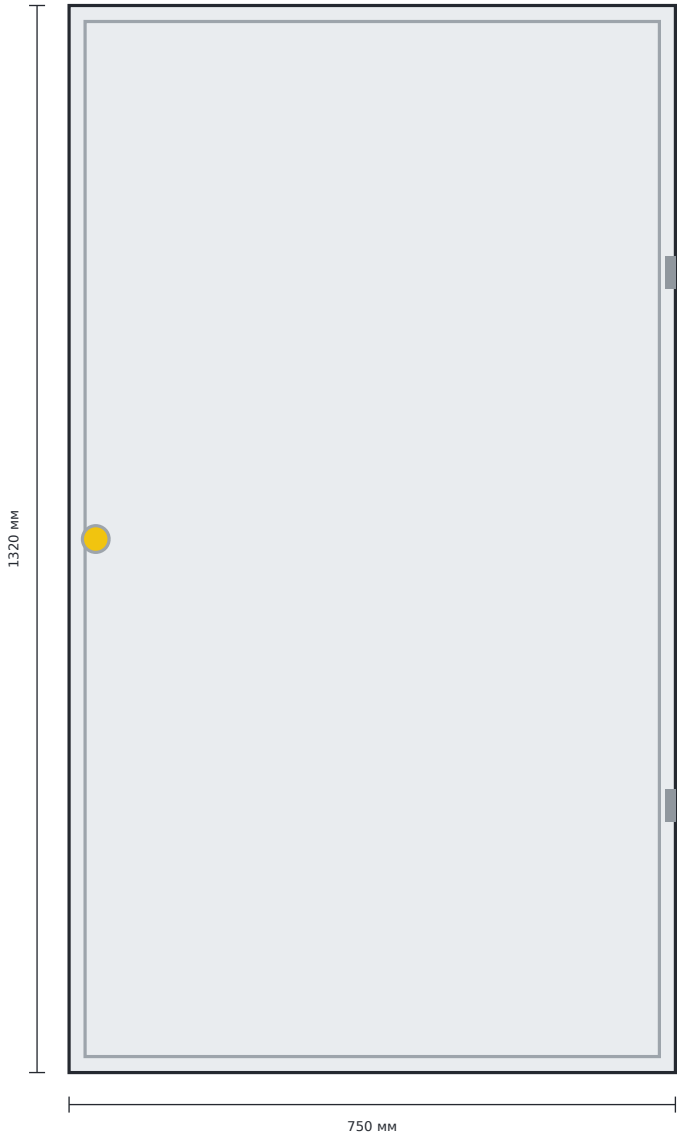


ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ - КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД




Монтаж	навесной / уточнить
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо.
Замок	Замок на левой свободной кромке двери.
Кабельный ввод	Снизу; отверстия выполнять после подтверждения диаметров кабелей.
PE двери	Гибкий провод ПВ3 6 мм².
Важно	КРИТИЧЕСКОЕ РАСХОЖДЕНИЕ: наименование проекта 800x800x205 IP65; строка BOM 1320x750x300 IP54; примечание указывает TITAN 5 800x800x200 IP66. ДО РЕЗКИ НЕ ЗАПУСКАТЬ.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	ЩР	Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Габаритные виды: спереди, сбоку, сверху и снизу	2	R0	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ОТКРЫТА

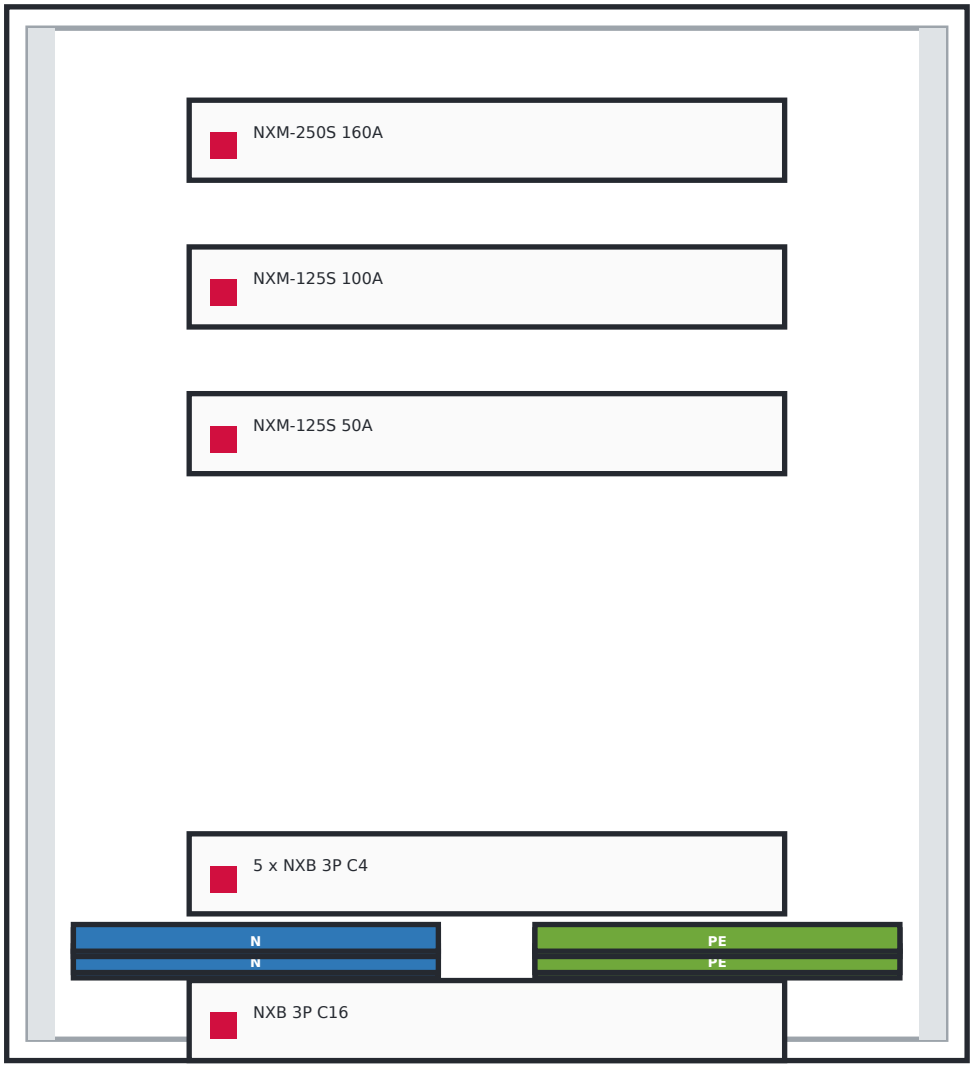

Зона / оборудование	
1.	NXM-250S 160A
2.	NXM-125S 100A
3.	NXM-125S 50A
4.	2 x NXM-125S 40A
5.	2 x NXM-125S 32A
6.	5 x NXB 3P C4

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые и цепи управления прокладывать раздельно по каналам.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником ПВ3 6 мм².
3. Обеспечить свободный доступ к аппаратам и клеммам.
4. Маркировка аппаратов и проводов по BOM и схеме проекта.
5. N и PE не объединять после точки разделения.
6. После сборки: затяжка, PE-непрерывность, изоляция, механика двери/замка.

НЕ ЗАПУСКАТЬ РЕЗКУ КОРПУСА ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЙ.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА

Проект 260925 | Актау | BATYS… INO… ЦР

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩРн-7-2 PR 1320x750x300 IP54	714-15112	EKT	1	шт
2	MCCB NXM-250S/3P 160A 36кА	131365	CHINT	1	шт
3	MCCB NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	CHINT	1	шт
4	MCCB NXM-125S/3P 50A 25кА	844302	CHINT	1	шт
5	MCCB NXM-125S/3P 40A 25кА	844301	CHINT	2	шт
6	MCCB NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	CHINT	2	шт
7	MCB NXB-63S 3P C4 4.5кА	296824	CHINT	5	шт
8	MCB NXB-63S 3P C16 4.5кА	296827	CHINT	1	шт
9	MCB NXB-63S 1P C16 4.5кА	296710	CHINT	2	шт
10	Шина Cu 3x20	130300473	EKT	3.85	м
11	Изолятор ИО101-30	32101DEK	DEKRAFT	15	шт
12	ПВ3 1x1.5	151.01.PV3.01,5	HARMONY	3.9	м
13	ПВ3 1x2.5	151.01.PV3.02,5	HARMONY	1.4	м
14	ПВ3 1x6	151.01.PV3.06	HARMONY	6.6	м
15	ПВ3 1x10	151.01.PV3.10	HARMONY	1.7	м
16	ПВ3 1x25	151.01.PV3.25	HARMONY	1.7	м
17	ПВ3 1x50	151.01.PV3.50	HARMONY	1.7	м

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

- Корпус: ЩРн-7-2 PR 1320x750x300 IP54 (строка BOM).
- Дверь открывается вправо; петли справа.
- Замок установлен на левой свободной кромке.
- Все двери и съёмные металлические части заземлены.
- N и PE выполнены раздельно.
- Кабельный ввод снизу; отверстия после подтверждения кабелей.
- Аппараты закреплены, маркировка читаема, доступ к клеммам сохранён.
- Проверить момент затяжки силовых соединений.
- Выполнить проверку изоляции и PE-непрерывности.
- Выполнить механическую проверку двери, замка, вентиляции.

СТОП-ПУНКТ

КРИТИЧЕСКОЕ РАСХОЖДЕНИЕ: наименование проекта 800x800x205 IP65; строка BOM 1320x750x300 IP54; примечание указывает TITAN 5 800x800x200 IP66. ДО РЕЗКИ НЕ ЗАПУСКАТЬ.


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	ЩР	Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Комплектация по BOM и контроль производства	4	R0	25.09.26

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЩЭО обогрев

проект: ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1



ЩМП-5 1000x650x300 IP31 (строка BOM)

Объект	BATYS TEHNO, Актау
Наименование щита	ЩЭО обогрев - проект: ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1
Тип корпуса	ЩМП-5 1000x650x300 IP31 (строка BOM)
Габариты (ВхШхГ)	1000 x 650 x 300 мм
Монтаж	навесной / уточнить
Степень защиты / цвет	BOM-корпус IP31; проект IP66 / RAL 7035
Сеть / ввод	1P+N+PE / 230 В (цепи обогрева); ввод уточнить
Главный аппарат	24 x NXBLE-63YH 1P+N C25 30мА + NXC-100
Количество	1 компл.
Источник данных	BOM 260925_Aktau_RahmiBey_CHINT_BOM - recete.xlsx

КОНТРОЛЬ ДО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО


КРИТИЧЕСКОЕ РАСХОЖДЕНИЕ: проект 1000x600x250 IP66; строка BOM 1000x650x300 IP31; примечание указывает TITAN 5. Также BOM отмечает превышение высоты компоновки.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	ОТК		Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	**ЩЭО обогрев** Титульный лист и исходные данные	**1**	**R0**	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ЗАКРЫТА

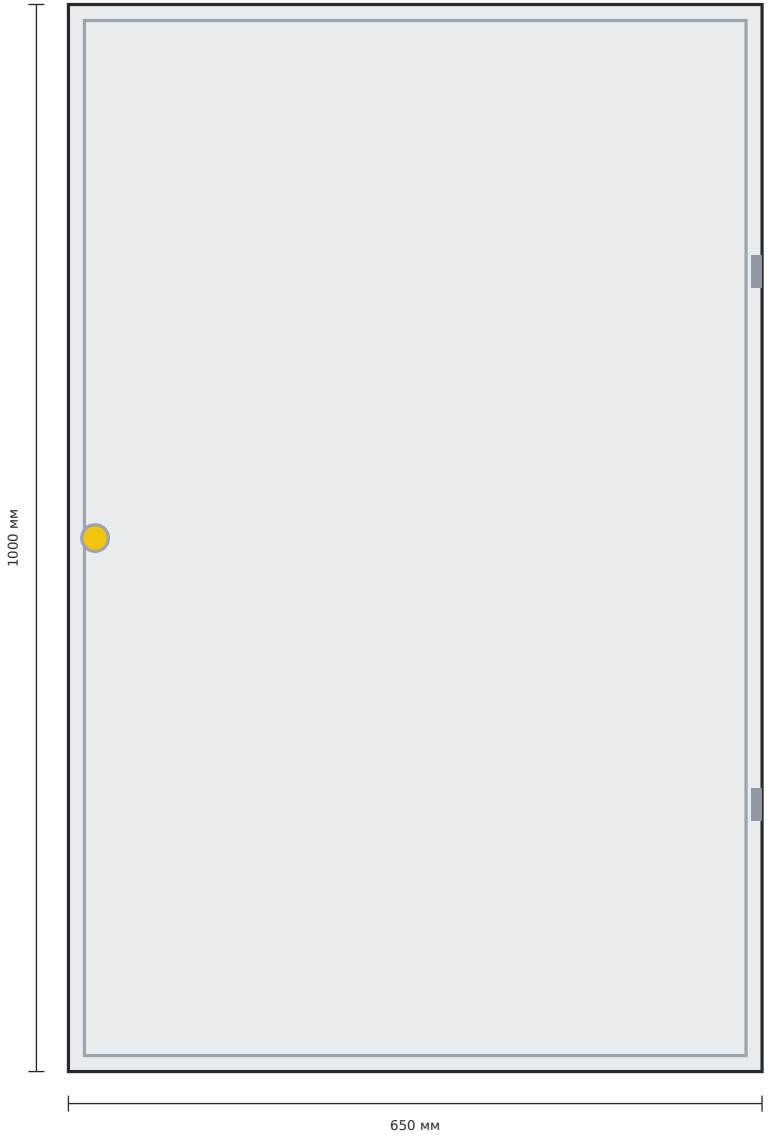


ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ - КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД




Монтаж	навесной / уточнить
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо.
Замок	Замок на левой свободной кромке двери.
Кабельный ввод	Снизу; отверстия выполнять после подтверждения диаметров кабелей.
PE двери	Гибкий провод ПВ3 6 мм².
Важно	КРИТИЧЕСКОЕ РАСХОЖДЕНИЕ: проект 1000x600x250 IP66; строка BOM 1000x650x300 IP31; примечание указывает TITAN 5. Также BOM отмечает превышение высоты компоновки.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК		Лист	Рев.	Дата
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	**ЩЭО обогрев** Габаритные виды: спереди, сбоку, сверху и снизу	**2**	**R0**	25.09.26

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРЬ ОТКРЫТА

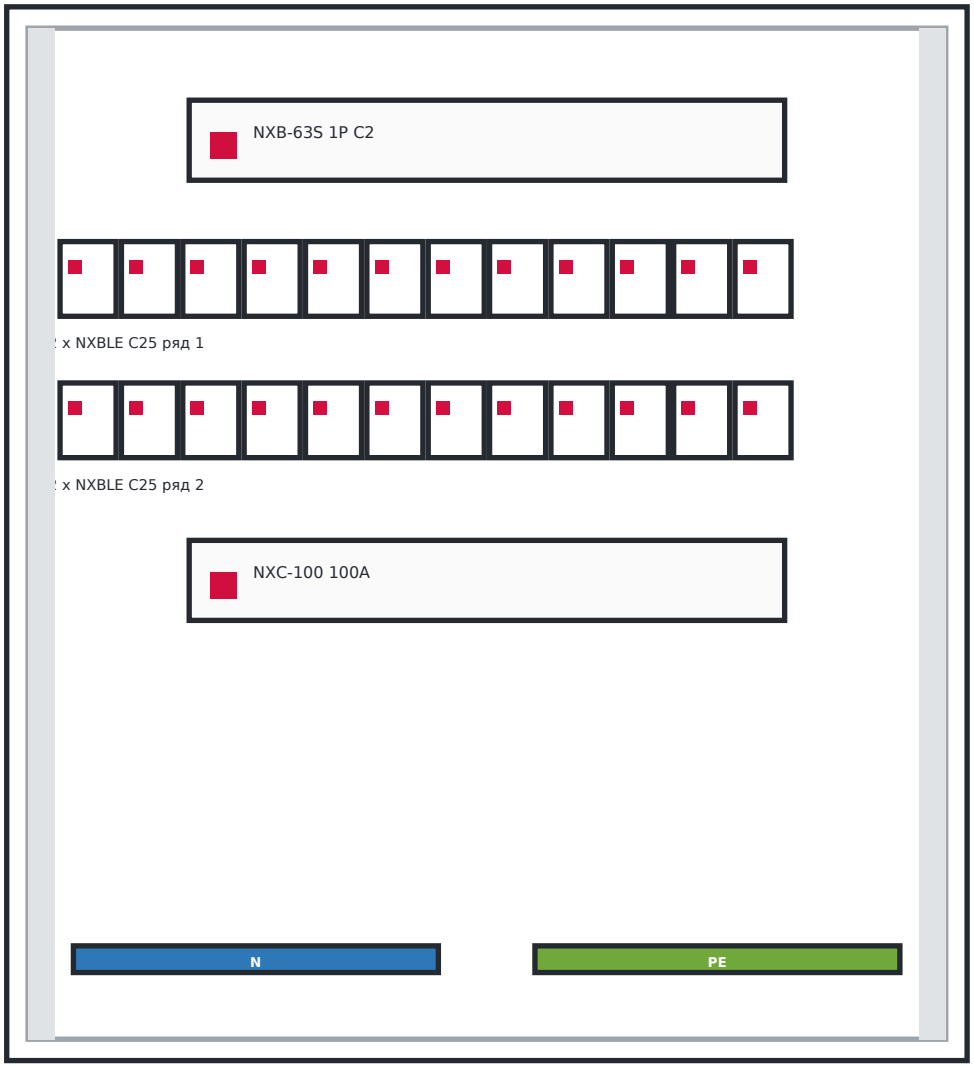

Зона / оборудование	
1.	NXB-63S 1P C2
2.	12 x NXBLE C25 ряд 1
3.	12 x NXBLE C25 ряд 2
4.	NXC-100 100A
5.	2 x N + 2 x PE

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые и цепи управления прокладывать раздельно по каналам.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником ПВ3 6 мм².
3. Обеспечить свободный доступ к аппаратам и клеммам.
4. Маркировка аппаратов и проводов по BOM и схеме проекта.
5. N и PE не объединять после точки разделения.
6. После сборки: затяжка, PE-непрерывность, изоляция, механика двери/замка.

НЕ ЗАПУСКАТЬ РЕЗКУ КОРПУСА ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЙ.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-5 1000x650x300 IP31	719-15445	EKT	1	шт
2	MCB NXB-63S 1P C2 4.5кА	296705	CHINT	1	шт
3	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	24	шт
4	Контактор NXC-100 100A 220В	836824	CHINT	1	шт
5	Шина N 8x12 ШНИ 14-КС-С	130200363	UNIT	2	шт
6	Шина PE 8x12 ШНИ 14-КС-С	130200363	UNIT	2	шт
7	ПВ3 1x1.5	151.01.PV3.01,5	HARMONY	0.3	м
8	ПВ3 1x4	151.01.PV3.04	HARMONY	11.9	м
9	ПВ3 1x25	151.01.PV3.25	HARMONY	2	м
10	ПВ3 1x6 (PE двери)	151.01.PV3.06	HARMONY	0.5	м

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

- Корпус: ЩМП-5 1000x650x300 IP31 (строка BOM).
- Дверь открывается вправо; петли справа.
- Замок установлен на левой свободной кромке.
- Все двери и съёмные металлические части заземлены.
- N и PE выполнены раздельно.
- Кабельный ввод снизу; отверстия после подтверждения кабелей.
- Аппараты закреплены, маркировка читаема, доступ к клеммам сохранён.
- Проверить момент затяжки силовых соединений.
- Выполнить проверку изоляции и PE-непрерывности.
- Выполнить механическую проверку двери, замка, вентиляции.

СТОП-ПУНКТ

КРИТИЧЕСКОЕ РАСХОЖДЕНИЕ: проект 1000x600x250 IP66; строка BOM 1000x650x300 IP31; примечание указывает TITAN 5. Также BOM отмечает превышение высоты компоновки.
