ВРУ И АВР — ГАБАРИТЫ И ФАСАДЫ

Комплект для согласования корпусов, дверей и внешнего исполнения. Электрическая комплектация приведена по переданному BOM; внутренние монтажные и электрические схемы в этот комплект не входят.

Параметр	Данные
Объект	Поликлиника, г. Тараз
Пано-группы / корпуса	28 групп / 32 корпусов
Комплектация	CHINT; счётчики SAIMAN; корпуса TEKSAN F; прочие позиции согласно BOM
Размеры	Высота x ширина x глубина, мм. Цоколь отдельно, где указан в BOM.
Источник	260930_Taraz_Laura_VRU-AVR_CHINT_BOM_rev1 cl abl++ -onay dosyasi icin.xlsx; лист BOM, строки 2–683
Статус	R1 — на согласование. Неподтверждённые данные перечислены в листе замечаний.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____
Номер заказа: _____ Срок поставки: _____

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

РЕЕСТР ЩИТОВ

Группы 1–14. Количество по строкам BOM, без умножения по номеру блока.

№	Обозначение	В х Ш х Г, мм	Цоколь	Корпуса	Лист
1	Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10)	2000x700x600 + 2000x700x600	0/0	2	6
2	Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00)	2000x700x600	100	1	7
3	Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У)	1600x700x400	100	1	8
4	Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100A)	1600x700x400	100	1	9
5	Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)	1600x700x400	100	1	10
6	Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10)	2000x800x450	100	1	11
7	Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00)	2000x800x450	100	1	12
8	Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У)	1600x700x400	100	1	13
9	Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2)	1600x700x400	100	1	14
10	Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)	1600x700x400	100	1	15
11	Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10)	2000x800x600	100	1	16
12	Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00)	2000x700x600	100	1	17
13	Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У)	1600x700x400	100	1	18
14	Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2)	1600x700x400	100	1	19

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

РЕЕСТР ЩИТОВ

Группы 15–28. Количество по строкам BOM, без умножения по номеру блока.

№	Обозначение	В х Ш х Г, мм	Цоколь	Корпуса	Лист
15	Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)	1600x700x400	100	1	20
16	Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000А)	2000x800x600	100	1	21
17	Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО)	2000x800x600 + 2000x800x600	100/100	2	22
18	Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У)	1600x700x400	100	1	23
19	Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)	1600x700x400	100	1	24
20	Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000А)	2000x800x600	100	1	25
21	Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2)	2000x800x450 + 2000x700x450	100/100	2	26
22	Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2)	2000x800x450 + 2000x800x450	100/100	2	27
23	Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У)	1600x700x400	100	1	28
24	Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)	1600x700x400	100	1	29
25	Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630А)	2000x800x600	100	1	30
26	Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00)	2000x800x600	100	1	31
27	Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У)	1600x700x400	100	1	32
28	Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)	1600x700x400	100	1	33

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Конкретные расхождения источника и незаданные производственные параметры

Пункт	Требуется согласовать
Размеры, выбранные ранее автоматически	Для ВРУ-1 блоков 1; 2,3; 4,5; ВРУ-1.1 блоков 6 и 8,9 в BOM указано, что размеры выбраны роботом. На чертежах сохранены размеры BOM; требуется подтверждение.
Блок 1 / ВРУ-1	Два корпуса шириной 700+700 мм, высота 2000 мм, глубина 600 мм. Цоколь не задан; в габарит не добавлен. Конденсаторы: 6 шт., тип и мощность не указаны.
Блок 2,3 / ВРУ-1	Конденсаторы 6 шт. без типа и мощности. Примечание к рубильнику содержит исходное NH40-1000 и Ip=400A; номенклатура BOM — NH40-400/3CS.
Блок 4,5 / ВРУ-1	В заголовке указаны 6 конденсаторов, отдельная строка комплектации отсутствует. Требуется уточнить тип, мощность и включение в спецификацию.
Блок 10 / ВРУ-1	В заголовке ТТ 630/5А; в строке 600 — 600/5А, 6 шт. До закупки и схемы учёта согласовать коэффициент трансформации.
Блок 8,9 / ВРУ-1.2	Строка БАУО-16-F имеет количество 0, а примечание — 1 шт. В перечень установленного оборудования не включена; требуется решение.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Конкретные расхождения источника и незаданные производственные параметры


Пункт	Требуется согласовать
Блок 6 / ВРУ-1.2	В заголовке «10А 2шт». Проверить, к каким аппаратам относится; не добавлять аппараты по одному текстовому примечанию.
Блоки 6 и 8,9 / ВРУ-1.1	Реализация АВР по BOM: моторные приводы, расцепители, блокировка и реле АВР. Блок NXZM не указан; фасадный экран не добавлен.
Фасад и механика	Однодверный корпус: петли справа, ручка слева. Два соседних корпуса: две двери, стык совпадает с границей корпусов, ручки у центрального стыка. Ручки рубильников, окна счётчиков и выносной интерфейс NXZM требуют согласования размеров и исполнения.
Не задано в BOM	Толщина металла, цвет RAL, IP для большинства корпусов, расположение вводов кабеля и вентиляции. Не приняты как подтверждённые параметры. Не выполнять отверстия без согласования.
Внутренний монтаж	Посадочные размеры устройств и тепловой расчёт не проверены по паспортам. Наружные виды не являются монтажной картой. Распределение аппаратуры между двумя корпусами требует отдельной схемы.
Сверка комплектующих	Для ряда аппаратов NXM-125S 40A примечание ссылается на NM8N. Для шин встречаются ошибочные поля роли / примечания. Для заказа использовать согласованную номенклатуру и артикул, не текст примечаний.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 1 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10)

BOM: строки 2–28 | Корпуса: 2 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

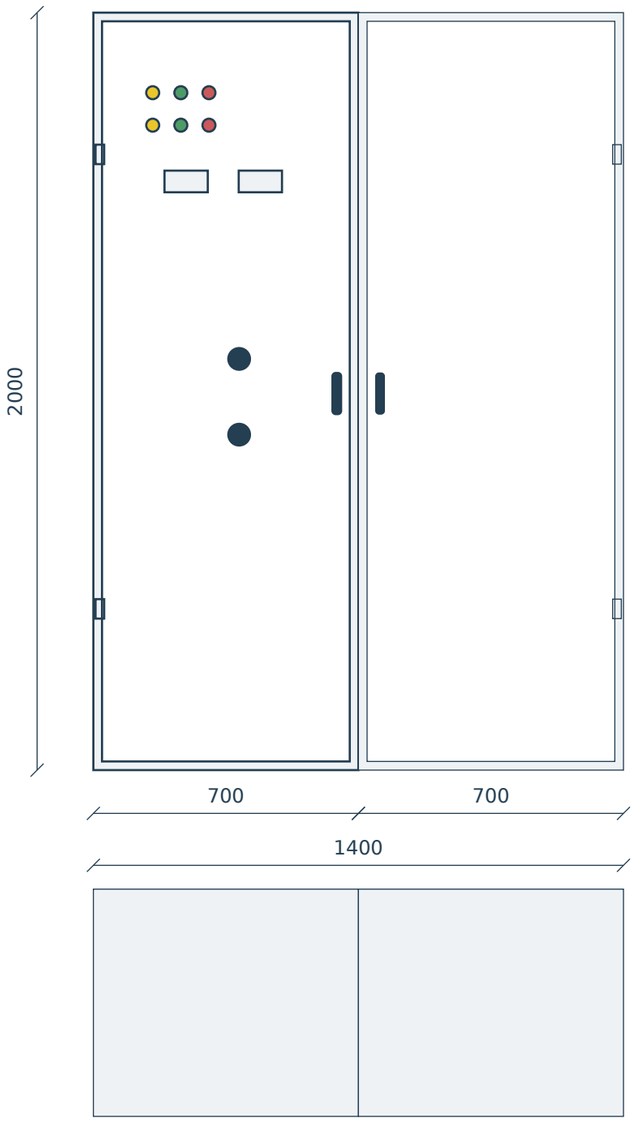

ВИД СПРАВА

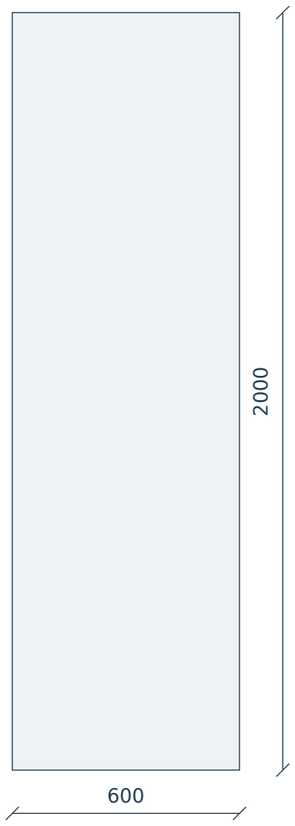

ВИД СВЕРХУ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Перекидной рубильник NH40-1000/3CS, 3P, 1000A, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | арт. 393377

6 шт. | Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400A | арт. 521218

2 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | арт. IA

6 шт. | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK | арт. 270300025_

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

6 шт. | Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A | арт. 521368

2 шт. | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | арт. 989-100-1757

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

6 шт. | condencator | арт. Не задан

МАСШТАБ 1:16

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 1 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00)

BOM: строки 29–53 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

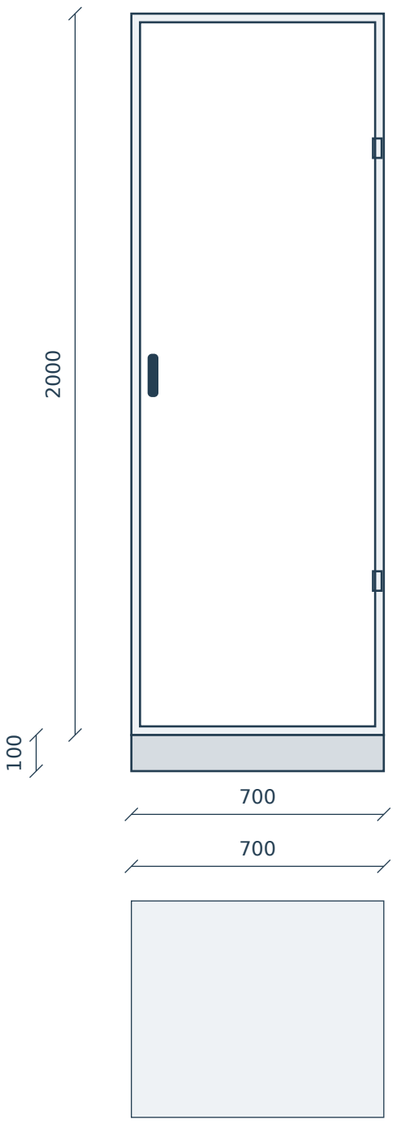

ВИД СПРАВА

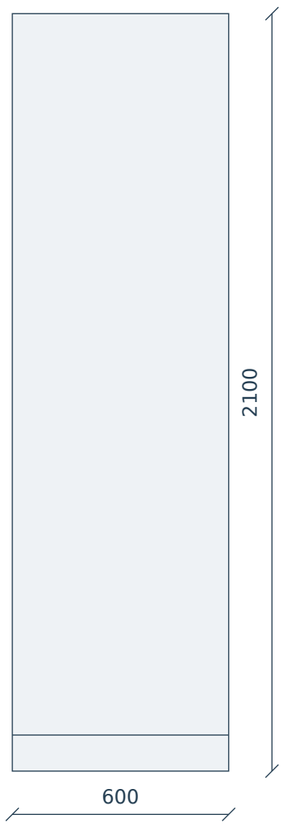

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 160A 36кА (R) | арт. 131364

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 125A 36кА (R) | арт. 844326

3 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кА (R) | арт. 146338

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) | арт. 146337

4 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 63A 36кА (R) | арт. 146336

1 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) | арт. 844301

ВИД СВЕРХУ

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP31. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 1 АВР-1 (АВР-3-160-2-У)

BOM: строки 54–80 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

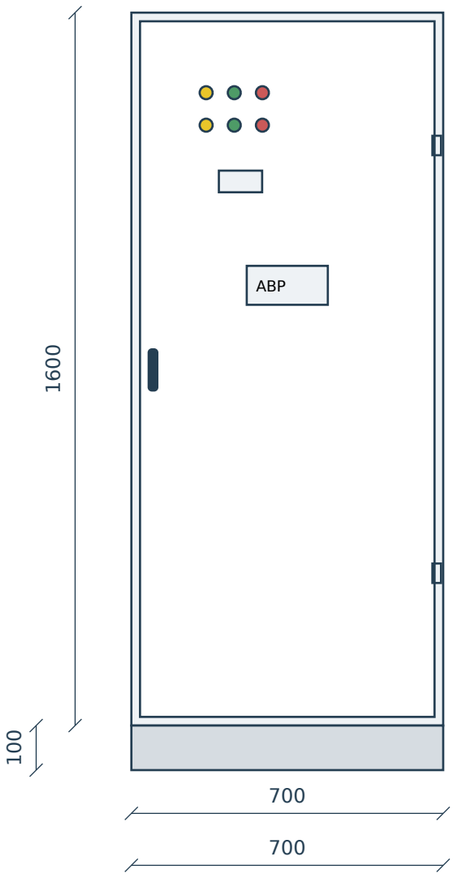

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 160A 36кА (R) | арт. 131364

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R) | арт. 256790

1 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | арт. IA

6 шт. | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK | арт. 270300101

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | арт. 989-100-1757

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 1 АВР-2 (АВР-3-160-2, Ip=100А)

BOM: строки 81–103 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

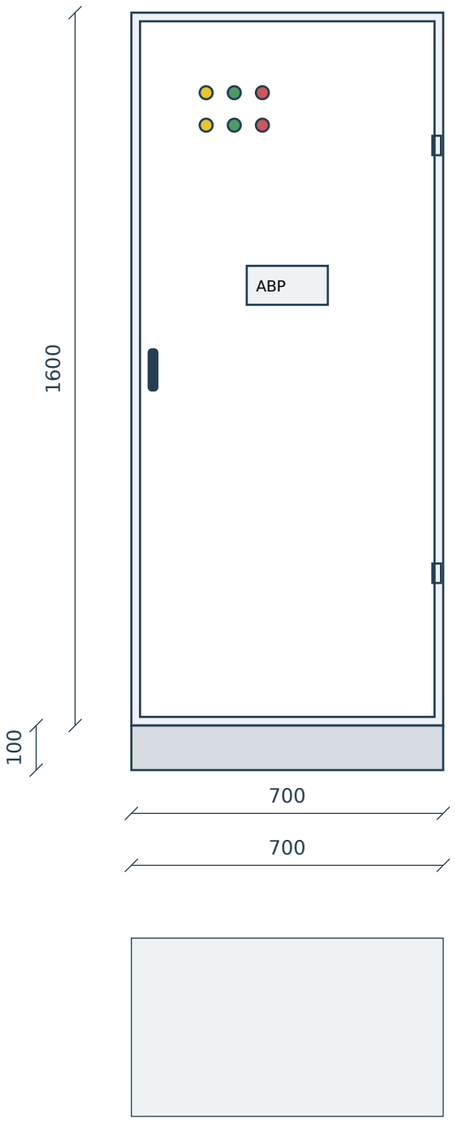

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 160A 36кA (R) | арт. 131364

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A (R) | арт. 256790

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 1 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)

BOM: строки 104–122 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

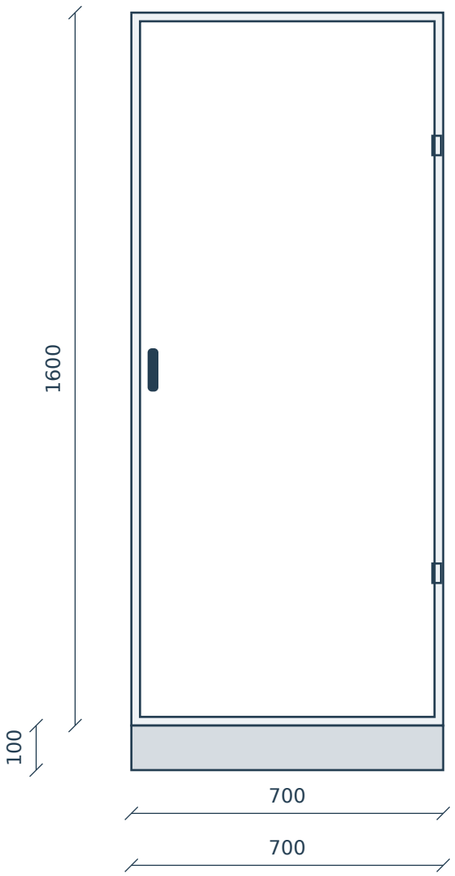

ВИД СПРАВА



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

1 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296833

3 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296831

5 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296830

1 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296829

ВИД СВЕРХУ



МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 2,3 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10)

BOM: строки 123–149 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

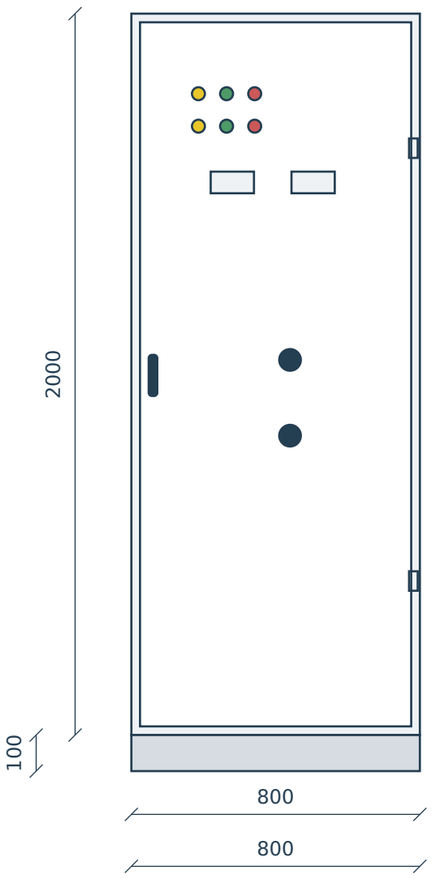

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Перекидной рубильник NH40-400/3CS, 3P, 400A, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | арт. 393375

6 шт. | Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200A | арт. 521188

2 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | арт. IA

6 шт. | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK | арт. 270300101

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

6 шт. | Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A | арт. 521367

2 шт. | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | арт. 989-100-1757

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

6 шт. | condencator | арт. Не задан

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 2,3 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00)

BOM: строки 150–167 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

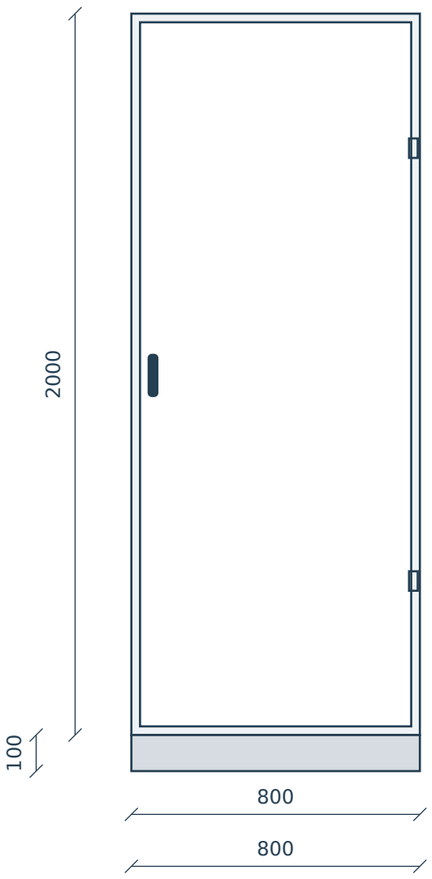

ВИД СПРАВА



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) | арт. 146337

4 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 50A 36кА (R) | арт. 146335

7 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) | арт. 844301

ВИД СВЕРХУ



МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 2,3 АВР-1 (АВР-3-100-2-У)

BOM: строки 168–191 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

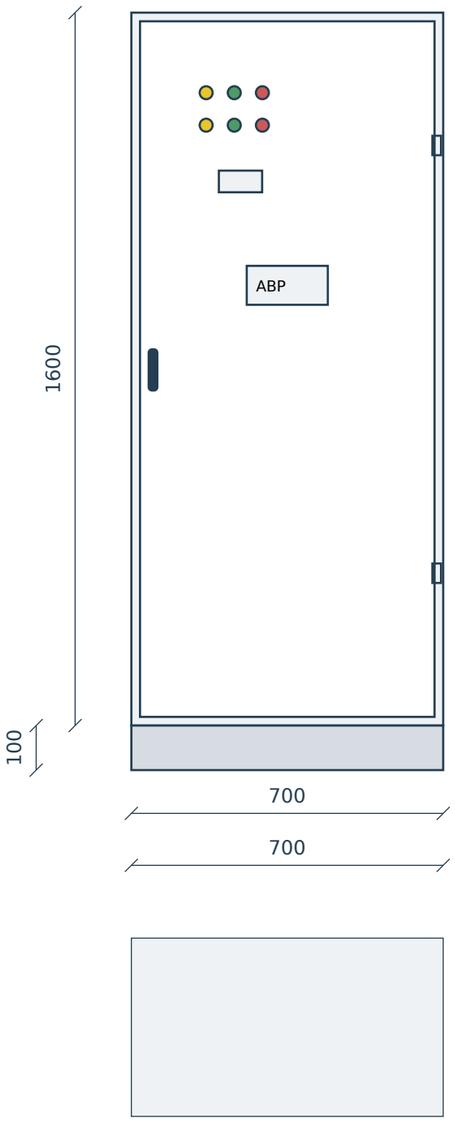

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кА (R) | арт. 146338

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | арт. 256781

3 шт. | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | арт. 270300099_

1 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | арт. IA

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 2,3 АВР-2 (АВР-3-100-2)

BOM: строки 192–211 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

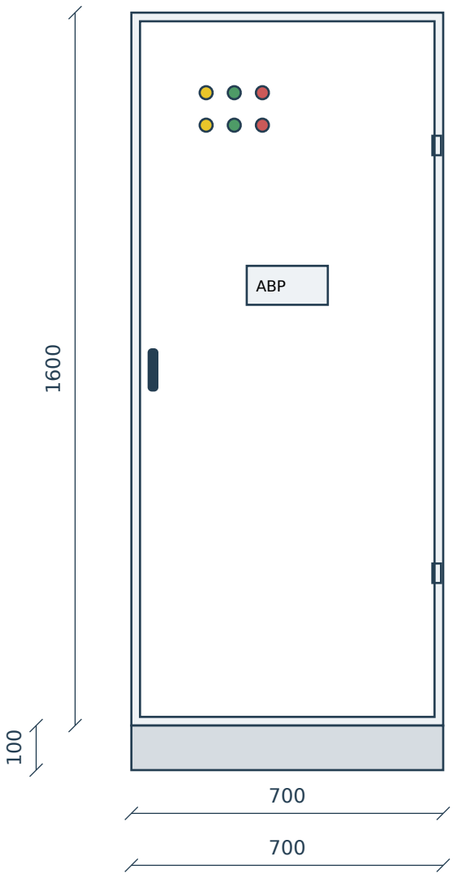

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кА (R) | арт. 146338

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | арт. 256781

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 2,3 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)

ВОМ: строки 212–230 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

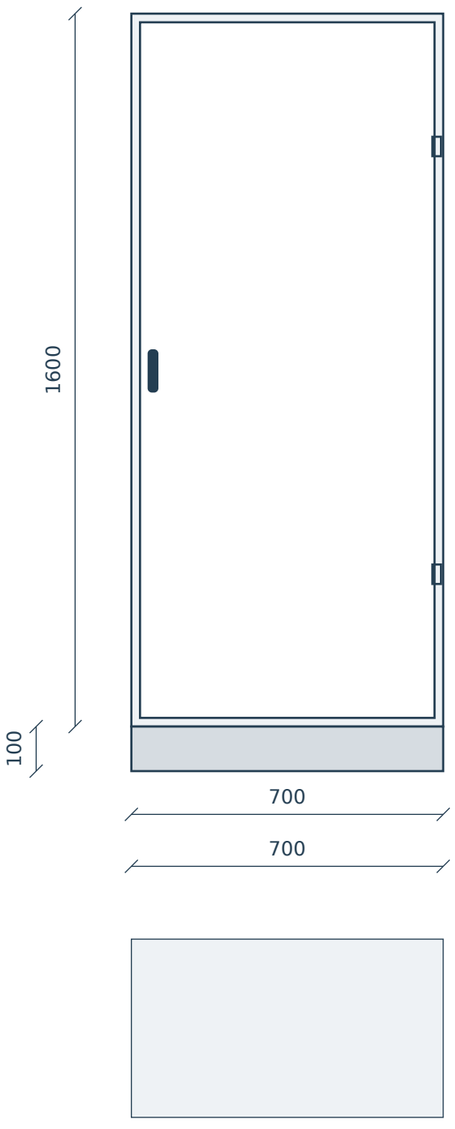

ВИД СПРАВА



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ВОМ

1 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296832

3 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296831

3 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296830

1 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296829

ВИД СВЕРХУ

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в ВОМ. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из ВОМ; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 4,5 ВРУ-1 (ВРУ1-13-10)

BOM: строки 231–256 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

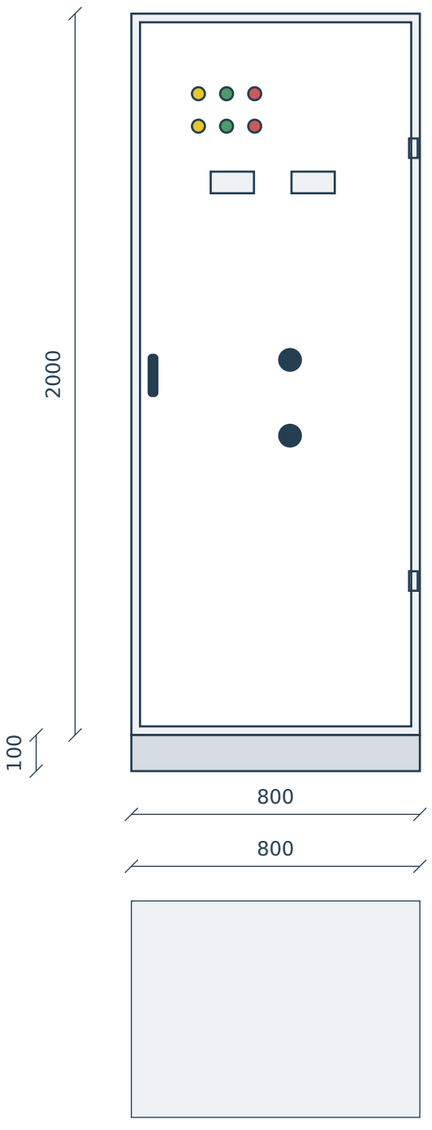

ВИД СПРАВА

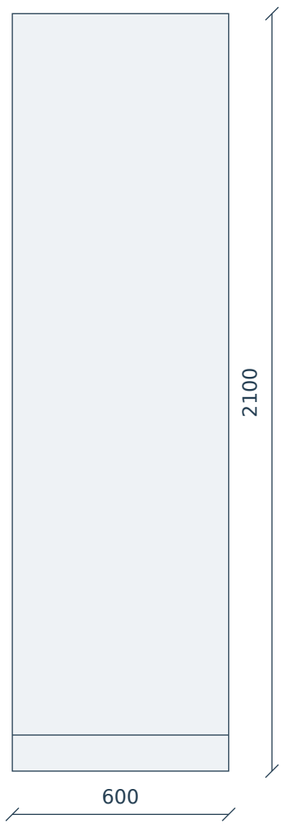

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Перекидной рубильник NH40-630/3CS, 3P, 630A, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | арт. 393376

6 шт. | Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 630A | арт. 521202

2 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | арт. IA

6 шт. | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5 IEK | арт. 270300035_

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

6 шт. | Держатель плавкой вставки RT36-3-630, габарит 3, 630A | арт. 521369

2 шт. | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | арт. 989-100-1757

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

ВИД СВЕРХУ

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 4,5 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00)

BOM: строки 257–285 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

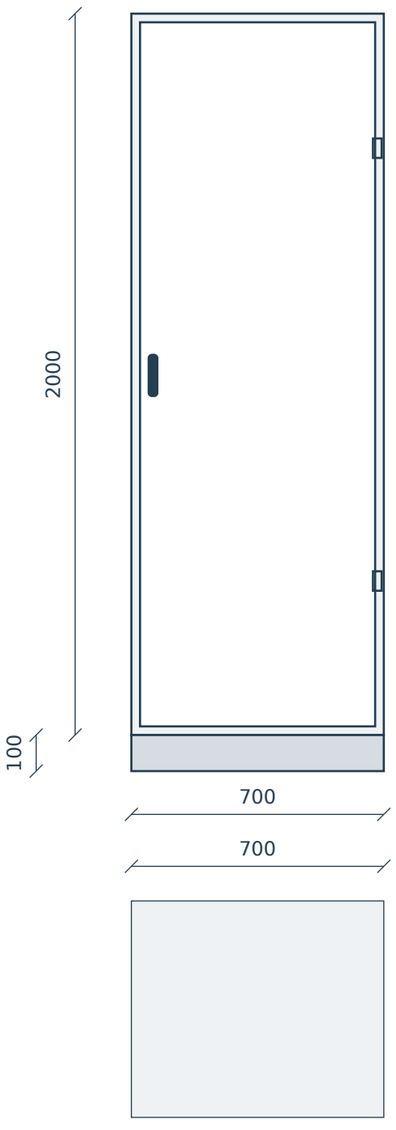

ВИД СПРАВА

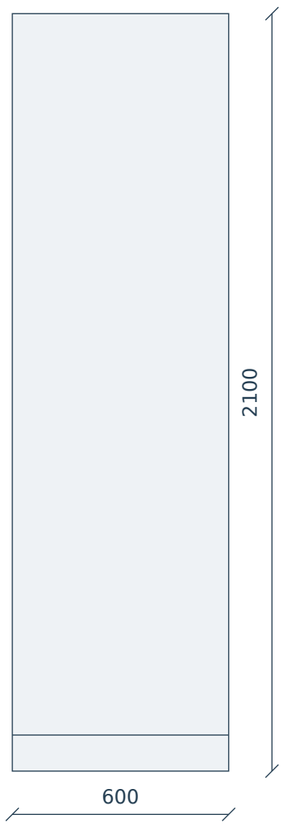

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

1 шт. | Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) | арт. 131367
1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 125A 36кА (R) | арт. 844326
1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кА (R) | арт. 146338
1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) | арт. 146337
3 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 63A 36кА (R) | арт. 146336
1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 50A 36кА (R) | арт. 146335
2 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) | арт. 844301
2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 32A 36кА (R) | арт. 146333

ВИД СВЕРХУ

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP31. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 4,5 АВР-1 (АВР-3-100-2-У)

BOM: строки 286–309 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

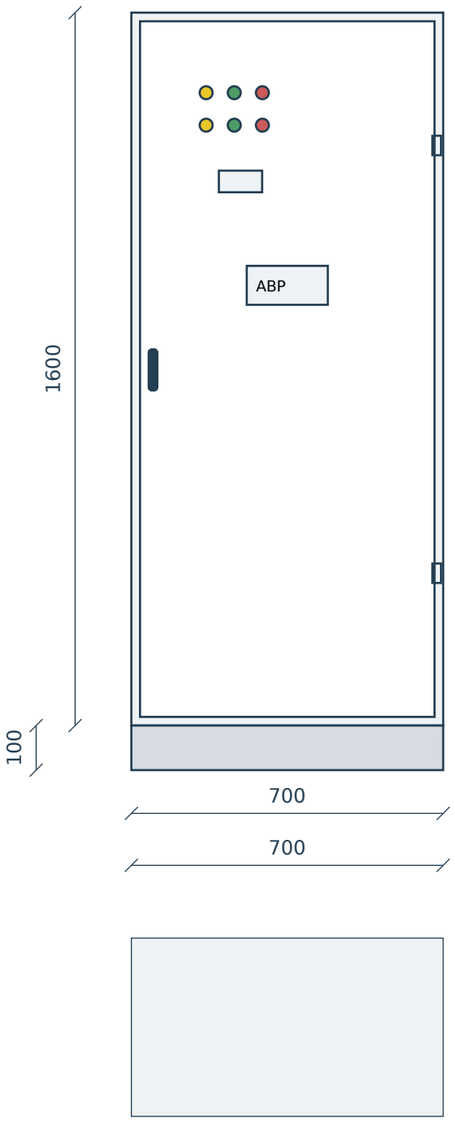

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кA (R) | арт. 146338

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | арт. 256781

3 шт. | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK | арт. 270300099_

1 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | арт. IA

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 4,5 АВР-2 (АВР-3-100-2)

BOM: строки 310–329 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

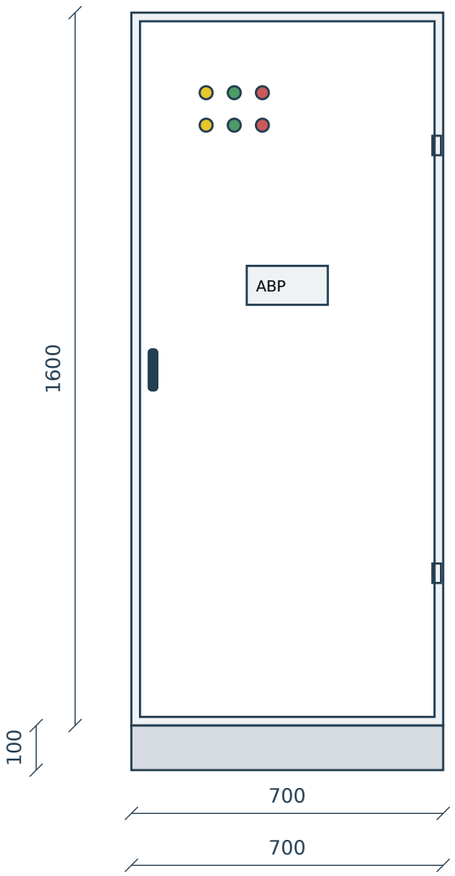

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кА (R) | арт. 146338

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | арт. 256781

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 4,5 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)

BOM: строки 330–345 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

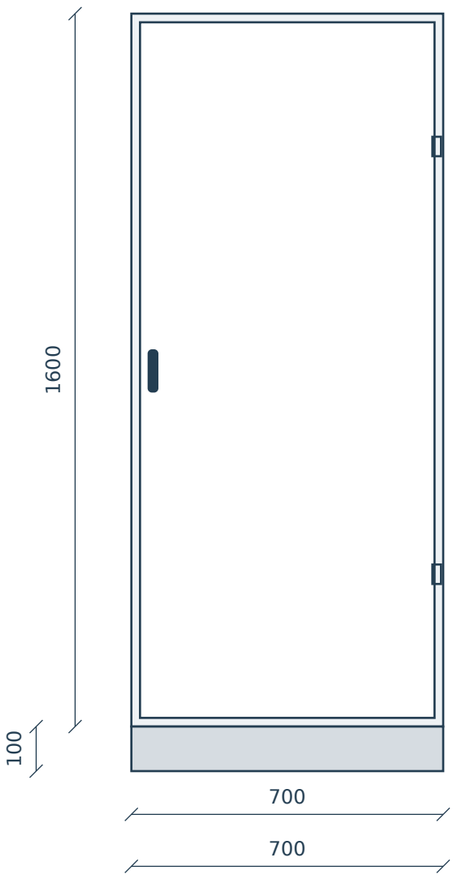

ВИД СПРАВА



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

1 шт. | Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R) | арт. 816139

2 шт. | Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) | арт. 813875

4 шт. | Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) | арт. 813874

ВИД СВЕРХУ



МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 6 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000А)

BOM: строки 346–376 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

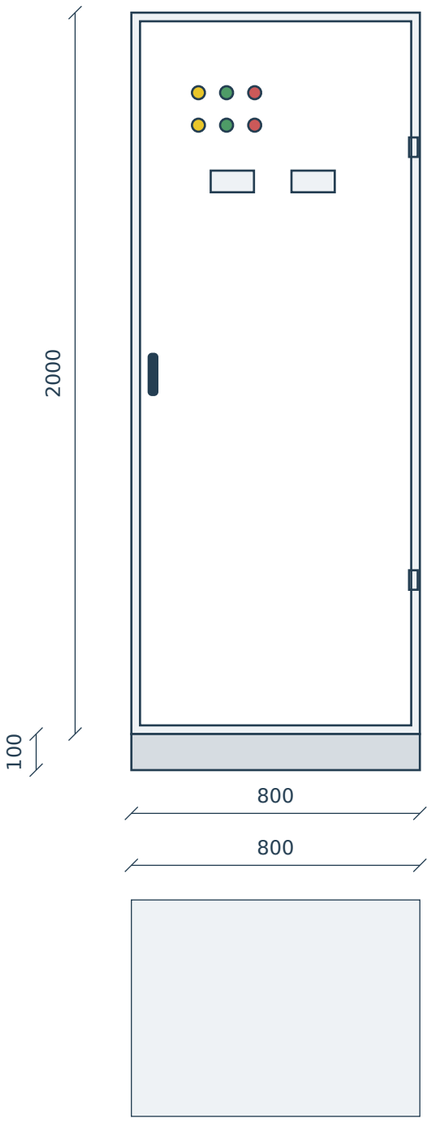

ВИД СПРАВА

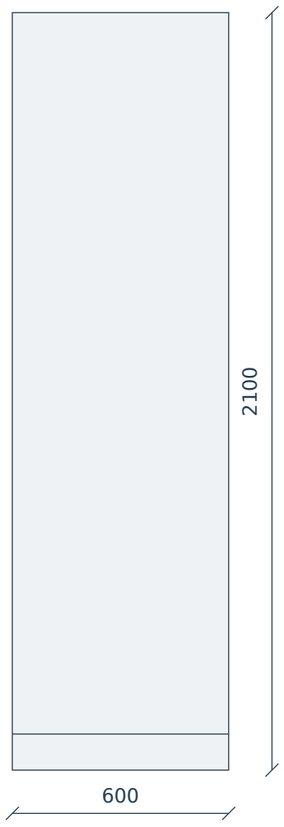

ВИД СВЕРХУ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-1000S/3P 1000A 50кA (R) | арт. 131377

2 шт. | Моторный привод MD-M6 D3/A1 для NXM(S)-1000 DC220V/AC230V (R) | арт. 946916

2 шт. | Независимый расцепитель SHT-M6 A1 R для NXM-1000 AC230V (правый) (R) | арт. 946988

1 шт. | Механическая блокировка для NXM-1000 (2 выключателя) | арт. PYS-002

1 шт. | m1m10 VAF meter | арт. 1syg235081r4051

2 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | арт. IA

6 шт. | Трансформатор тока ТТИ-А 1000\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | арт. ст-9951313

3 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

3 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M5 L LE для NXM-1000 (левый) (R) | арт. 946930

1 шт. | Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02-G NEW | арт. 311100898

2 шт. | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | арт. 989-100-1757

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 6 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2, с БАУО)

BOM: строки 377–412 | Корпуса: 2 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

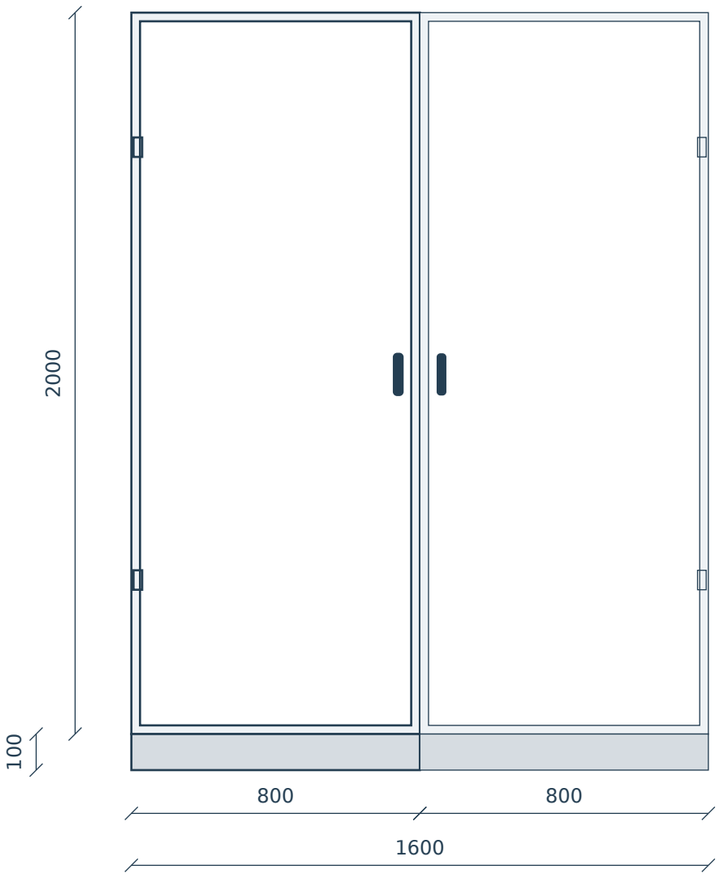

ВИД СПРАВА

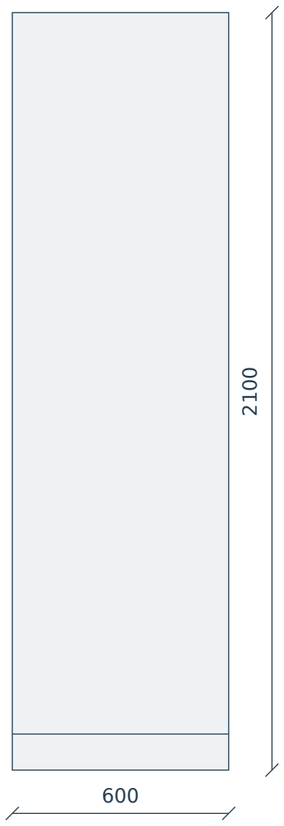

ВИД СВЕРХУ



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

1 шт. | Авт. выкл. NXM-630S/3P 630A 50кА (R) | арт. 131375

2 шт. | Авт. выкл. NXM-400S/3P 315A 50кА (R) | арт. 131371

1 шт. | Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) | арт. 131367

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 125A 36кА (R) | арт. 844326

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 63A 36кА (R) | арт. 146336

16 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) | арт. 844301

5 шт. | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | арт. 205883

5 шт. | Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R) | арт. 813793

2 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296709

1 шт. | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | арт. 256235

1 шт. | photocell switch mh-602, 25A | арт. 732-32150

1 шт. | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | арт. 574849

1 шт. | Блок автоматического управления освещением БАУО-16-F на 16 групп | арт. PYS-004

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 6 АВР-1 (АВР-3-100-2-У)

BOM: строки 413–435 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

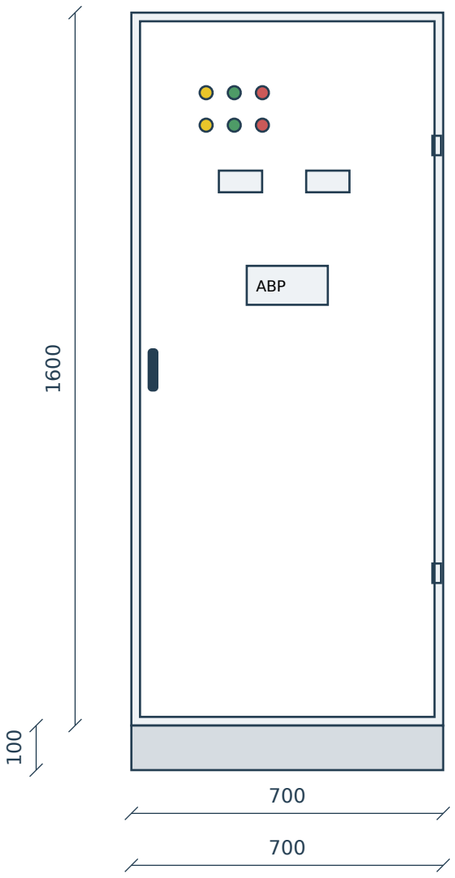

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кА (R) | арт. 146338

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | арт. 256781

2 шт. | ДАЛА CA4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | арт. IB

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 6 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)

BOM: строки 436–451 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

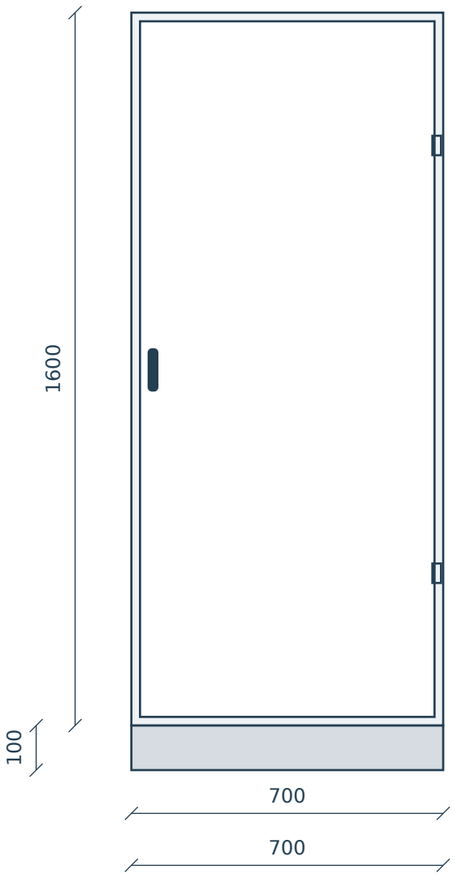

ВИД СПРАВА



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

3 шт. | Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) | арт. 813873

3 шт. | Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка C (R) | арт. 813871

1 шт. | Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R) | арт. 813793

ВИД СВЕРХУ



МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 8,9 ВРУ-1.1 (ВРУ1-17-70, АВР 1000А)

BOM: строки 452–482 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

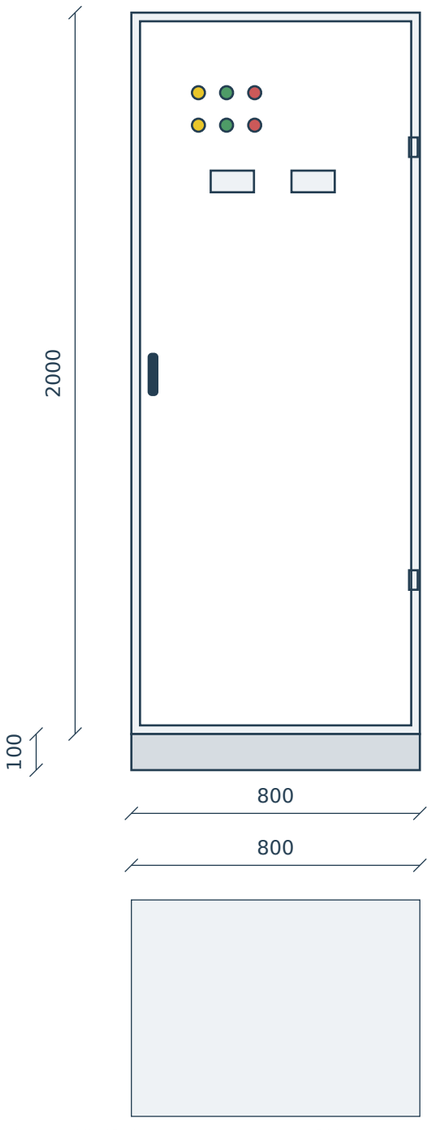

ВИД СПРАВА

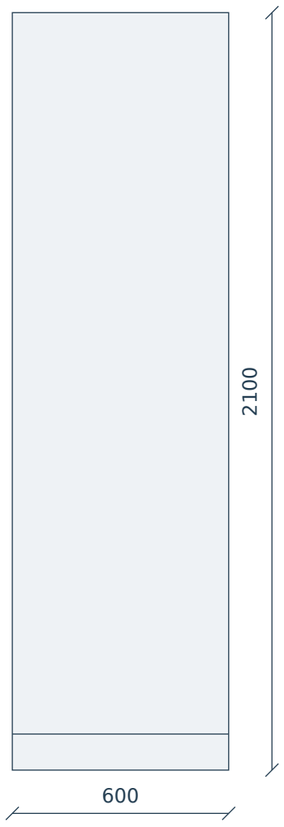

ВИД СВЕРХУ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-1000S/3P 1000A 50кА (R) | арт. 131377

2 шт. | Моторный привод MD-M6 D3/A1 для NXM(S)-1000 DC220V/AC230V (R) | арт. 946916

2 шт. | Независимый расцепитель SHT-M6 A1 R для NXM-1000 AC230V (правый) (R) | арт. 946988

1 шт. | Механическая блокировка для NXM-1000 (2 выключателя) | арт. PYS-002

1 шт. | m1m10 VAF meter | арт. 1syg235081r4051

2 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX ОР П RS1 Д W (3х220/380V 5-7,5А) | арт. IA

6 шт. | Трансформатор тока ТТИ-А 1000\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! | арт. ст-9951313

3 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

3 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M5 L LE для NXM-1000 (левый) (R) | арт. 946930

1 шт. | Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02-G NEW | арт. 311100898

2 шт. | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | арт. 989-100-1757

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 8,9 ВРУ-1.2 (ВРУ1-50-00 ×2)

BOM: строки 483–524 | Корпуса: 2 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

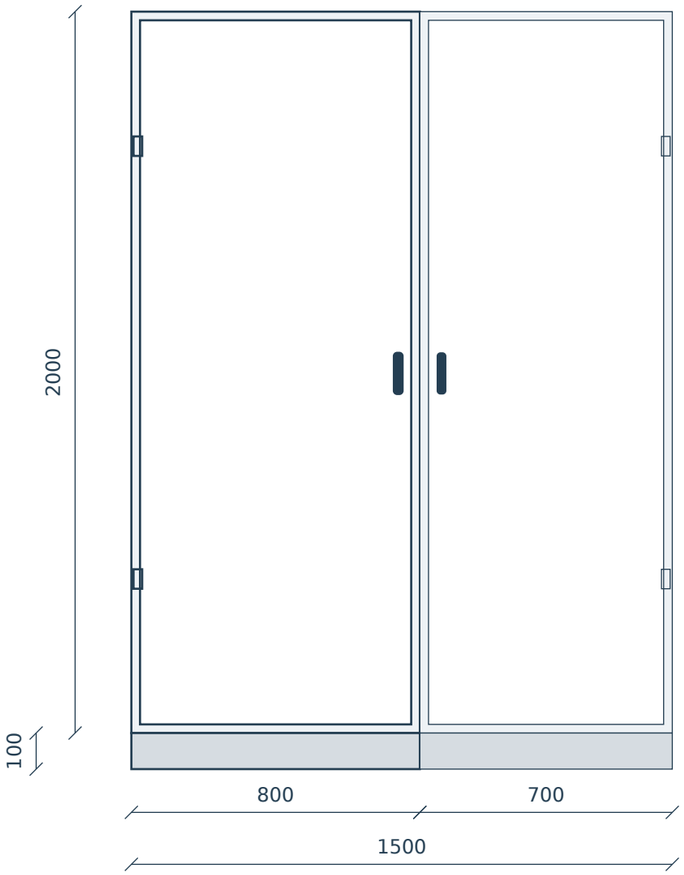

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

1 шт. | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | арт. 205883

8 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R) | арт. 844299

2 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) | арт. 844301

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 50A 36кА (R) | арт. 146335

3 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 63A 36кА (R) | арт. 146336

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) | арт. 146337

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кА (R) | арт. 146338

2 шт. | Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) | арт. 131367

1 шт. | Авт. выкл. NXM-400S/3P 315A 50кА (R) | арт. 131371

5 шт. | Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R) | арт. 813793

2 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296709

1 шт. | Контактор модульный NCH8-25/20 25A 2НО AC220/230В 50Гц (R) | арт. 256235

1 шт. | photocell switch mh-602, 25A | арт. 732-32150

1 шт. | Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 | арт. 574849

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP31. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 8,9 ВРУ-1.3 (ВРУ1-50-00 ×2)

BOM: строки 525–551 | Корпуса: 2 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

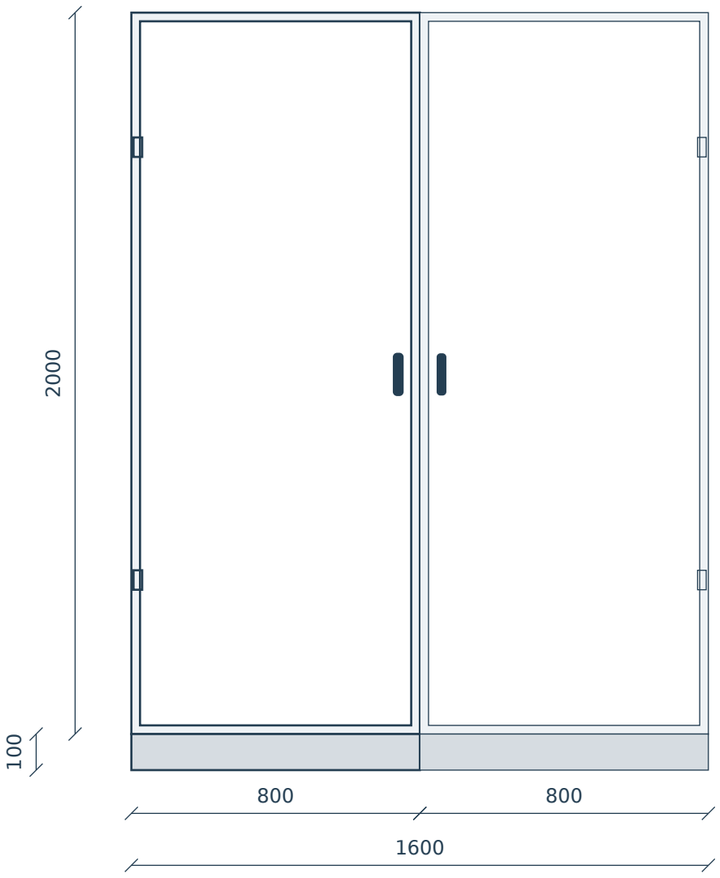

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

13 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R) | арт. 844299

3 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) | арт. 844301

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 63A 36кА (R) | арт. 146336

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кА (R) | арт. 146338

1 шт. | Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) | арт. 131367

1 шт. | Авт. выкл. NXM-400S/3P 400A 50кА (R) | арт. 131373

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 8,9 АВР (АВР-3-250-2-У)

BOM: строки 552–578 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

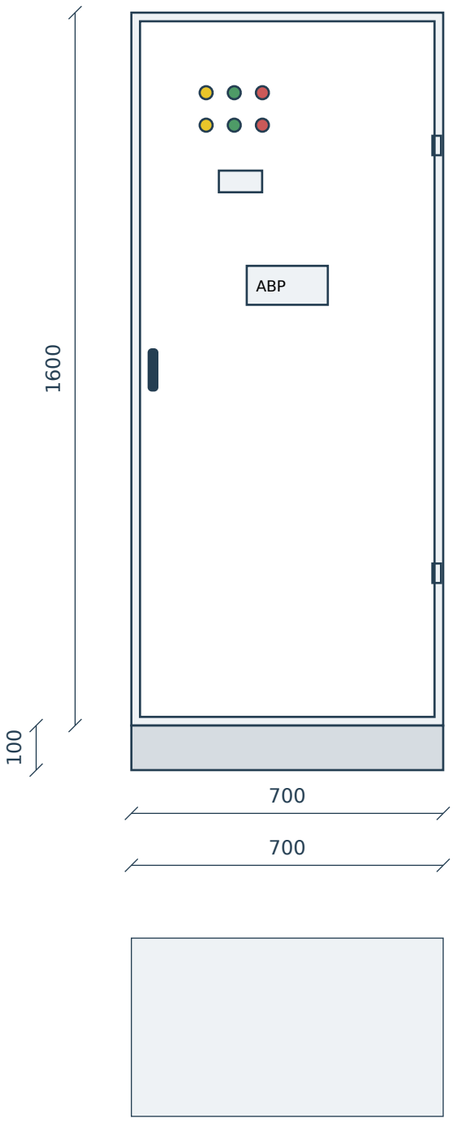

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R) | арт. 131369

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R) | арт. 256796

1 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | арт. IA

6 шт. | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А 5ВА класс 0,5 IEK | арт. 270300132

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | арт. 989-100-1757

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 8,9 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)

BOM: строки 579–594 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

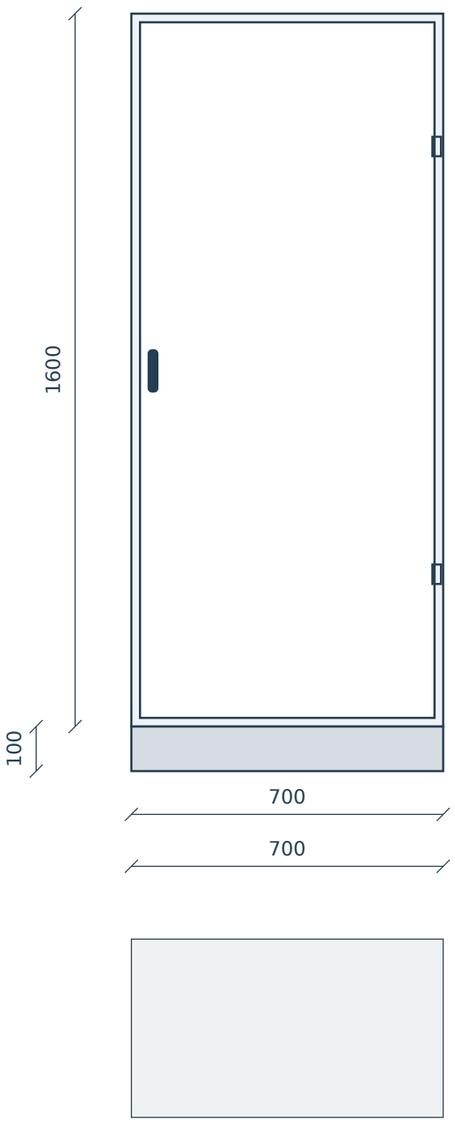

ВИД СПРАВА



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

3 шт. | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | арт. 205883

2 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R) | арт. 844299

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 125A 36кА (R) | арт. 844326

ВИД СВЕРХУ

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 10 ВРУ-1 (ВРУ1-17-70, АВР 630А)

BOM: строки 595–619 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

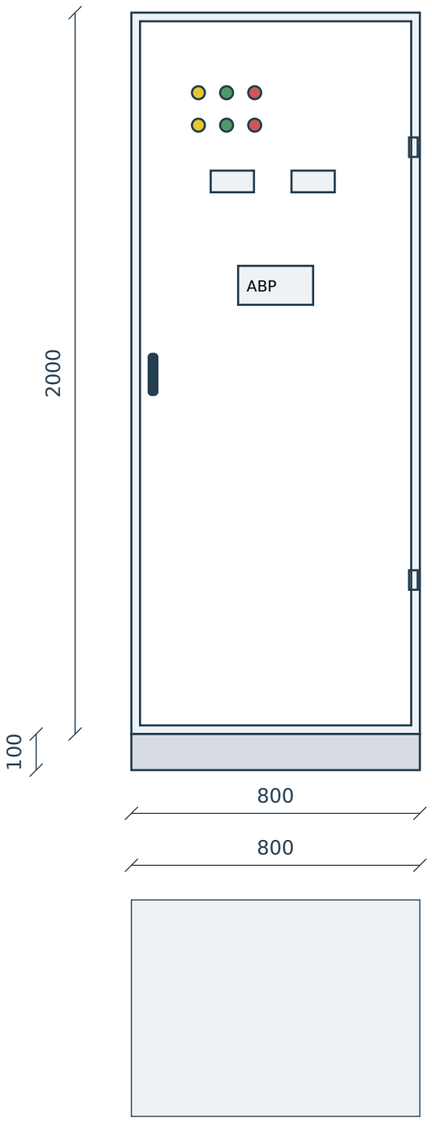

ВИД СПРАВА

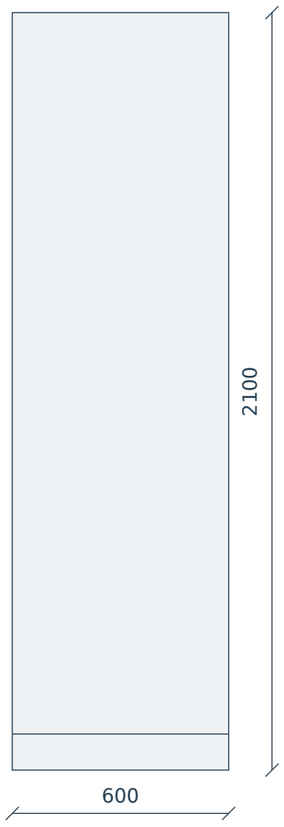

ВИД СВЕРХУ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-630S/3P 630A 50кA (R) | арт. 131375

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-630S/3B 630A (R) | арт. 256823

2 шт. | ДАЛА СА4У-Э720 R TX OP П RS1 Д W (3x220/380V 5-7,5A) | арт. IA

6 шт. | Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5 IEK | арт. 270300035_

2 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Клеммная коробка для счетчиков (испытательная) | арт. 989-100-1757

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 10 ВРУ-2 (ВРУ1-50-00)

BOM: строки 620–643 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

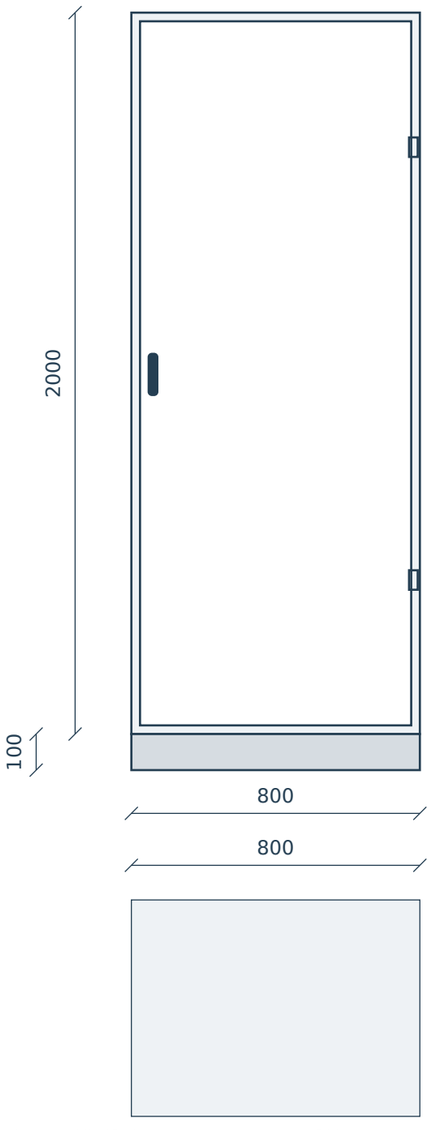

ВИД СПРАВА

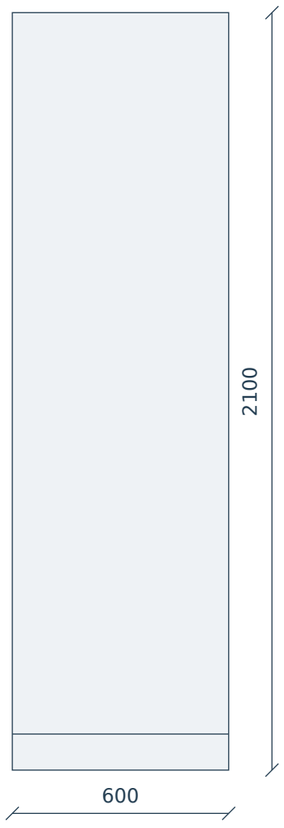

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

4 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R) | арт. 844299

2 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) | арт. 844301

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 63A 36кА (R) | арт. 146336

1 шт. | Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R) | арт. 131369

1 шт. | Авт. выкл. NXM-630S/3P 500A 50кА (R) | арт. 131374

ВИД СВЕРХУ

МАСШТАБ 1:17

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 10 АВР (АВР-3-100-2-У)

BOM: строки 644–666 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

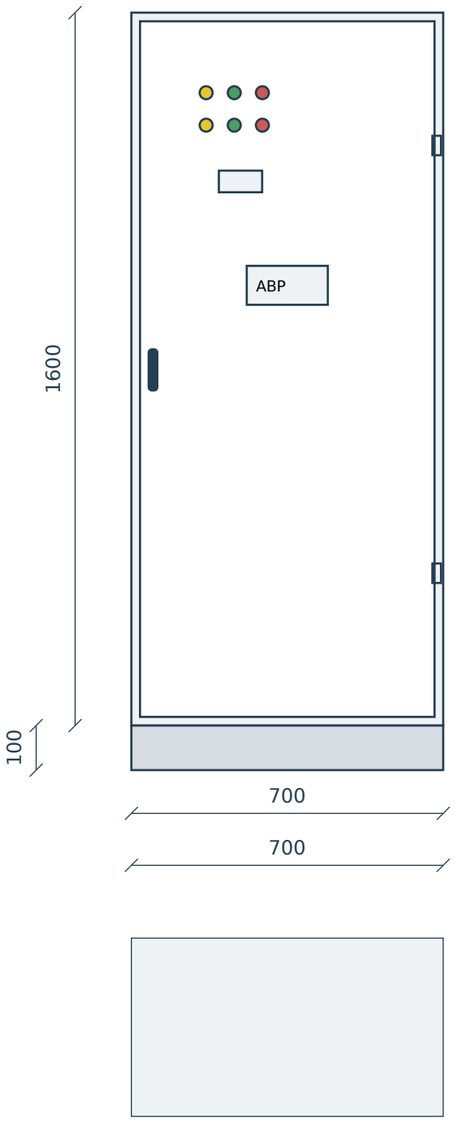

ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

2 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 100A 36кА (R) | арт. 146338

1 шт. | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (R) | арт. 256781

1 шт. | ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W (3x220/380V 5-100A) | арт. IB

6 шт. | Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C (R) | арт. 296708

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) | арт. 593076

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) | арт. 593077

2 шт. | Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) | арт. 593075

МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.


Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата


Блок 10 ВРУ-3 (ВРУ1-41-00)

BOM: строки 667–683 | Корпуса: 1 | Высота x ширина x глубина

ВИД СПЕРЕДИ

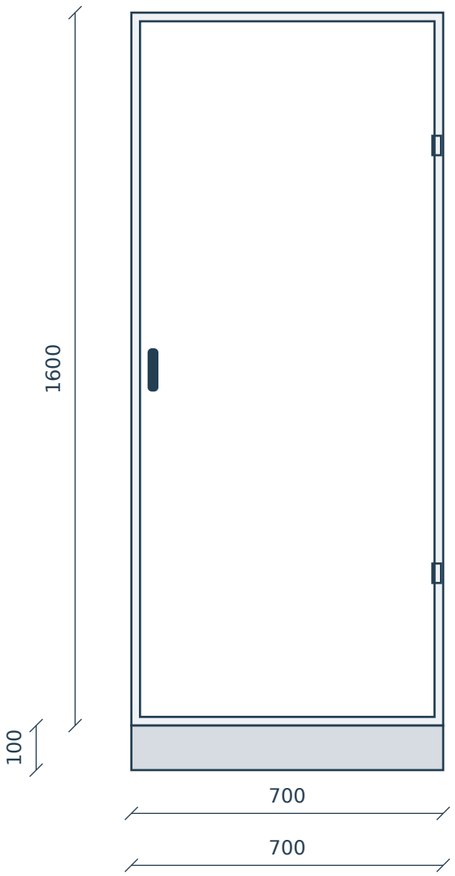

ВИД СПРАВА



ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

1 шт. | Авт. выкл. NXM-63S/3P 25кА 16A (R) | арт. 205883

1 шт. | Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) | арт. 844301

1 шт. | Авт. выкл. NXM-160S/3P 63A 36кА (R) | арт. 146336

ВИД СВЕРХУ



МАСШТАБ 1:14

Размеры в мм.
Кабельные вводы не заданы.
Положение фасадных элементов условное;
размеры вырезов согласовать.

Корпус TEKSAN F. IP: не задан в BOM. Цвет / металл: согласовать. Фасадные элементы только из BOM; окна и интерфейс показаны как зоны согласования.

Разработал	Проверил	Производство	Монтаж	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата
