SENSATA

261005 | Алматы | Baiqadam / Rozybakieva

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ - КОМПЛЕКТ ЩИТОВ

№	Щит	Габариты В х Ш х Г	Кол.
1	ШУФО - пятно 1,2 (Baiqadam)	800 x 650 x 250 мм	Уточнить
2	ШУФО - пятно 3,4 (Baiqadam)	800 x 650 x 250 мм	Уточнить
3	ШУФО - пятно 5,6 (Baiqadam)	800 x 650 x 250 мм	Уточнить
4	ШУФО - пятно 8,9 (Rozybakieva)	800 x 650 x 250 мм	Уточнить
5	ШУФО - пятно 10 (Rozybakieva)	800 x 650 x 250 мм	Уточнить
6	ШУФО - пятно 11 (Rozybakieva)	800 x 650 x 250 мм	Уточнить

В комплекте 6 позиций ШУФО. Для каждого щита представлены паспорт, габаритные виды, внутренняя компоновка и комплектация. Количество изделий по каждой позиции - по исходному заказу.

Основа: PDF R0. Открытые технические вопросы и контроль перед выпуском - лист 26. Статус: проект на согласование.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

SF-01 | ШУФО, пятно 1,2 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШУФО (Пятна 1,2) (sensata baiqadam)
Корпус / монтаж	EKT ЩМП-4 / настенный, однодверный
Габариты (В x Ш x Г)	800 x 650 x 250 мм
Защита	IP54 корпуса; IP собранного щита требует проверки
Ввод / сеть	NXB-63H 3P C16, 10 кА / 400-230 В
Учёт	CE308 S34.746.OPR1, 3ф, 5(100) А
Аппаратура / управление	CHINT; NKG3; SA1 + SB1 + SB2 на двери
Материал шин	Требует уточнения; маркировка и размеры в перечне
Резерв	Цель: 20% свободного DIN-пространства; расчёт не закрыт
Источник	PDF R0, листы 1-4; количества на один щит

Фасад: петли справа, отдельный замок слева, открывание вправо. Смотровое окно и дополнительные сигнальные лампы в R0 не указаны. Внутренняя защитная маска требует проверки по конструкции.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-01 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


SF-01 | ШУФО, пятно 1,2 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / М 1:8

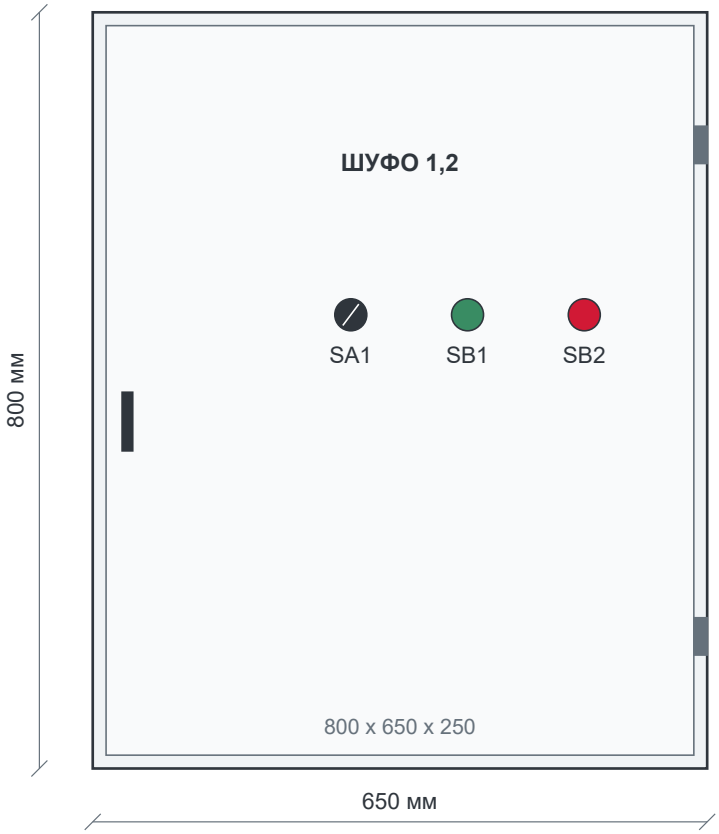


СБОКУ / М 1:8

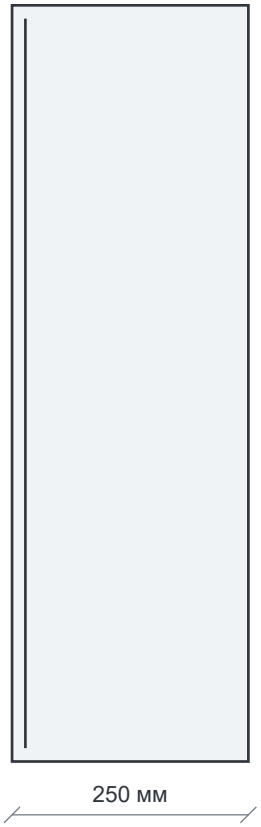

СВЕРХУ / М 1:8



СНИЗУ / ВВОД / М 1:8

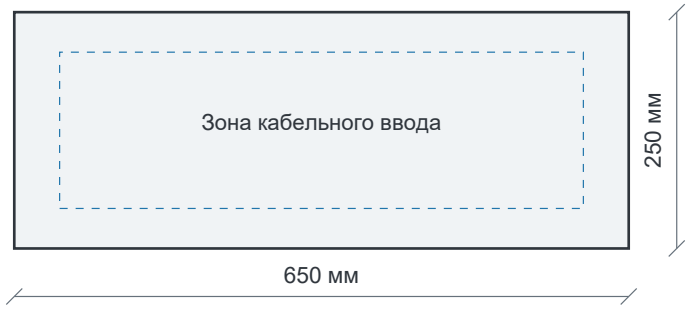

Единицы: мм. Размеры по PDF R0. Печать 100% для указанного масштаба. Петли и колодки показаны условно; отверстия и крепёжные координаты не назначены.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____


Проект: 261005 | Щит: SF-01 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

SF-01 | ШУФО, пятно 1,2 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

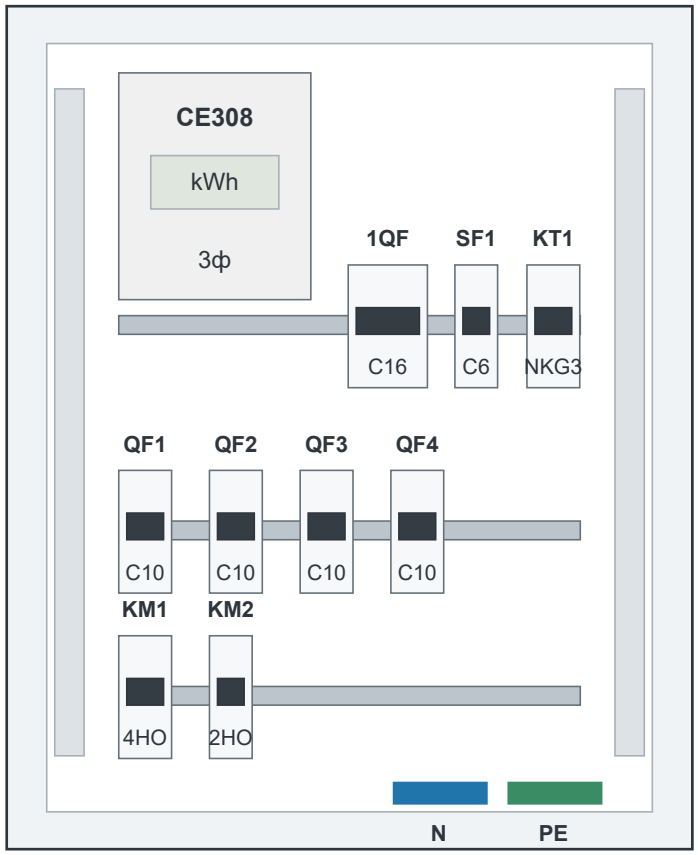

Условная компоновка / NTS

Зона	Обозначение / установка	Кол.
Верхняя	Счётчик CE308 / CE208	1
Ввод / управление	1QF C16 + SF1 C6 + KT1 NKG3	1+1+1
Распределение	QF1-QF4	4
Коммутация	NCH8-20/40: 1; NCH8-20/20: 1	2
Дверь	SA1 + SB1 зелёная + SB2 красная	1+1+1
Низ	Раздельные N и PE; клеммы по рабочей схеме	Уточнить

• Каждый QF и KM показан отдельно; количество совпадает с перечнем на следующем листе.

• Расположение зон - предложение к согласованию. Габариты счётчика, монтажной панели и аппаратов сверить до выпуска рабочего чертежа.

• Для NCH8-20: 4P - 36 мм, 2P - 18 мм по каталогу CHINT. Геометрия других моделей и полезная длина реек пока не подтверждены.

• Цель резерва: F / C >= 0,20; C - доступная ширина DIN, F - свободная ширина. Фактический процент не заявлен.

• N после разных диф. автоматов не объединять. Клеммы, проводники PE, сечения и маркировку назначить по рабочей схеме.

• Открывание двери вправо; жгут управления с сервисной петлёй. Сверление, кабельные отверстия и подключение по этому эскизу не выполнять.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-01 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

SF-01 | ШУФО, пятно 1,2 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество на один щит. Источник: PDF R0, лист 4.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-4, 800 x 650 x 250 мм, IP54	719-15420	EKT	1	шт
2	Счётчик CE308 S34.746.OPR1, 3ф, 5(100) A, PLC + радио	PYS-001	Энергомера / PYS	1	шт
3	ОТО NXB-63H, 3P, C16, 10 кА	813871	CHINT	1	шт
4	ОТО NXB-63, 1P, C6, 6 кА	814012	CHINT	1	шт
5	Диф. NXBLE-63YH, 1P+N, C10, 30 мА, тип A, 6 кА [1]	515374	CHINT	4	шт
6	Контактор NCH8-20/40, 20 A, 4НО, AC220/230 В	256085	CHINT	1	шт
7	Контактор NCH8-20/20, 20 A, 2НО, AC220/230 В	256054	CHINT	1	шт
8	Таймер NKG3, AC220 В, 8-ON / 8-OFF [2]	310024	CHINT	1	шт
9	SA1: NP2-BD33, 3 положения, 2НО, IP40	574849	CHINT	1	шт
10	SB1: NP2-BA35, зелёная, 1НЗ + 1НО, IP40	573763	CHINT	1	шт
11	SB2: NP2-BA42, красная, 1НЗ, IP40	574843	CHINT	1	шт
12	Шина N ШНИ 10-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200361	UNIT / EKT	1	шт
13	Шина N ШНИ 10-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200361	UNIT / EKT	1	шт
14	Соединительная шина PIN 3P, 63 A, L = 1000 мм [4]	811002	CHINT	1	шт

[1] Пара код/характеристика RCBO требует сверки с оригинальным Excel и каталогом. [2] Для 310024 официальная карточка CHINT KZ указывает AC220 В, 8 включений/8 отключений; питание проверить по паспорту.

[3] В R0 обе позиции названы N; назначение и комплект PE не подтверждены. [4] Совместимость PIN с выбранными автоматами и схемой фаз проверить до монтажа. Общий контроль и открытые вопросы - лист 26.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-01 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

SF-02 | ШУФО, пятно 3,4 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШУФО (Пятна 3,4) (sensata baiqadam)
Корпус / монтаж	EKT ЩМП-4 / настенный, однодверный
Габариты (В x Ш x Г)	800 x 650 x 250 мм
Защита	IP54 корпуса; IP собранного щита требует проверки
Ввод / сеть	NXB-63H 3P C16, 10 кА / 400-230 В
Учёт	CE308 S34.746.OPR1, 3ф, 5(100) А
Аппаратура / управление	CHINT; NKG3; SA1 + SB1 + SB2 на двери
Материал шин	Требует уточнения; маркировка и размеры в перечне
Резерв	Цель: 20% свободного DIN-пространства; расчёт не закрыт
Источник	PDF R0, листы 5-8; количества на один щит

Фасад: петли справа, отдельный замок слева, открывание вправо. Смотровое окно и дополнительные сигнальные лампы в R0 не указаны. Внутренняя защитная маска требует проверки по конструкции.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-02 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


SF-02 | ШУФО, пятно 3,4 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / М 1:8

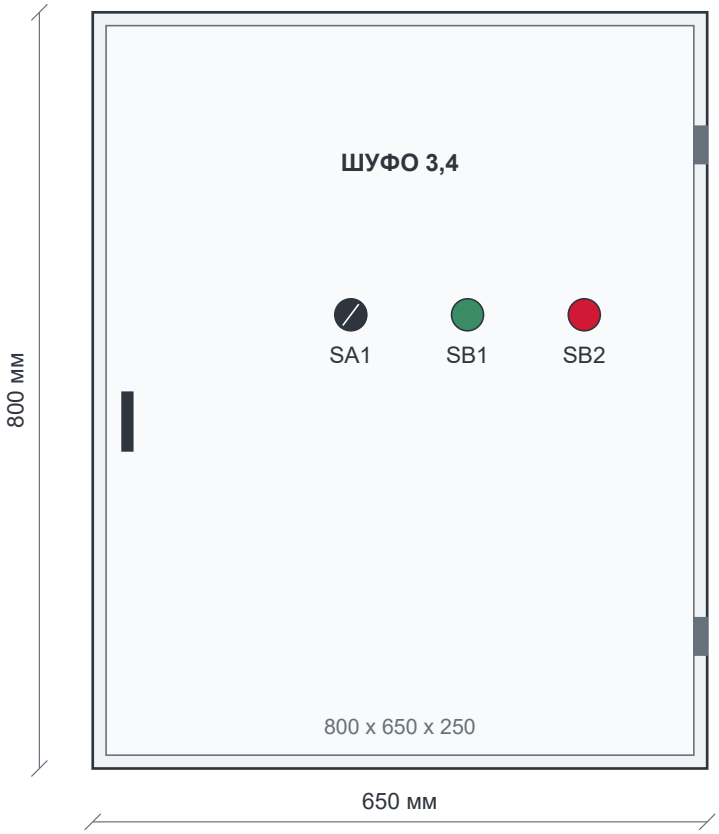


СБОКУ / М 1:8

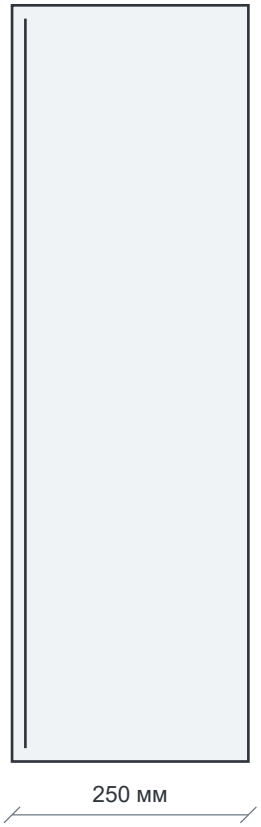

СВЕРХУ / М 1:8



СНИЗУ / ВВОД / М 1:8

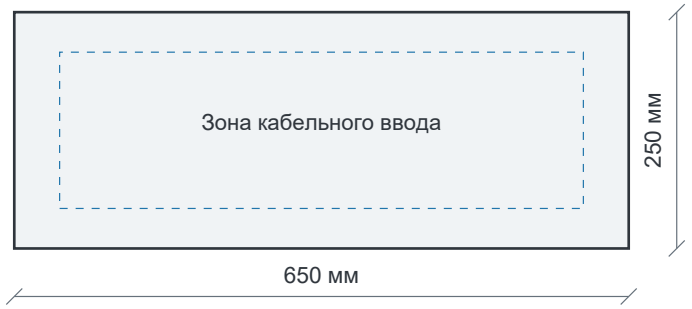

Единицы: мм. Размеры по PDF R0. Печать 100% для указанного масштаба. Петли и колодки показаны условно; отверстия и крепёжные координаты не назначены.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____


Проект: 261005 | Щит: SF-02 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

SF-02 | ШУФО, пятно 3,4 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

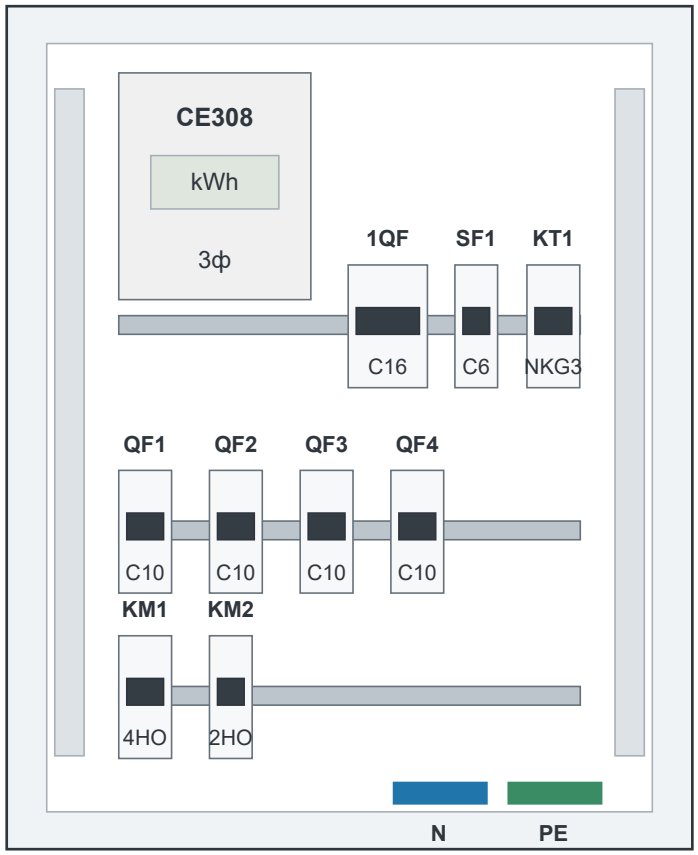

Условная компоновка / NTS

Зона	Обозначение / установка	Кол.
Верхняя	Счётчик CE308 / CE208	1
Ввод / управление	1QF C16 + SF1 C6 + KT1 NKG3	1+1+1
Распределение	QF1-QF4	4
Коммутация	NCH8-20/40: 1; NCH8-20/20: 1	2
Дверь	SA1 + SB1 зелёная + SB2 красная	1+1+1
Низ	Раздельные N и PE; клеммы по рабочей схеме	Уточнить

• Каждый QF и KM показан отдельно; количество совпадает с перечнем на следующем листе.

• Расположение зон - предложение к согласованию. Габариты счётчика, монтажной панели и аппаратов сверить до выпуска рабочего чертежа.

• Для NCH8-20: 4P - 36 мм, 2P - 18 мм по каталогу CHINT. Геометрия других моделей и полезная длина реек пока не подтверждены.

• Цель резерва: F / C >= 0,20; C - доступная ширина DIN, F - свободная ширина. Фактический процент не заявлен.

• N после разных диф. автоматов не объединять. Клеммы, проводники PE, сечения и маркировку назначить по рабочей схеме.

• Открывание двери вправо; жгут управления с сервисной петлёй. Сверление, кабельные отверстия и подключение по этому эскизу не выполнять.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-02 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

SF-02 | ШУФО, пятно 3,4 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество на один щит. Источник: PDF R0, лист 8.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-4, 800 x 650 x 250 мм, IP54	719-15420	EKT	1	шт
2	Счётчик CE308 S34.746.OPR1, 3ф, 5(100) A, PLC + радио	PYS-001	Энергомера / PYS	1	шт
3	ОТО NXB-63H, 3P, C16, 10 кА	813871	CHINT	1	шт
4	ОТО NXB-63, 1P, C6, 6 кА	814012	CHINT	1	шт
5	Диф. NXBLE-63YH, 1P+N, C10, 30 мА, тип A, 6 кА [1]	515374	CHINT	4	шт
6	Контактор NCH8-20/40, 20 A, 4НО, AC220/230 В	256085	CHINT	1	шт
7	Контактор NCH8-20/20, 20 A, 2НО, AC220/230 В	256054	CHINT	1	шт
8	Таймер NKG3, AC220 В, 8-ON / 8-OFF [2]	310024	CHINT	1	шт
9	SA1: NP2-BD33, 3 положения, 2НО, IP40	574849	CHINT	1	шт
10	SB1: NP2-BA35, зелёная, 1НЗ + 1НО, IP40	573763	CHINT	1	шт
11	SB2: NP2-BA42, красная, 1НЗ, IP40	574843	CHINT	1	шт
12	Шина N ШНИ 10-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200361	UNIT / EKT	1	шт
13	Шина N ШНИ 10-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200361	UNIT / EKT	1	шт
14	Соединительная шина PIN 3P, 63 A, L = 1000 мм [4]	811002	CHINT	1	шт

[1] Пара код/характеристика RCBO требует сверки с оригинальным Excel и каталогом. [2] Для 310024 официальная карточка CHINT KZ указывает AC220 В, 8 включений/8 отключений; питание проверить по паспорту.

[3] В R0 обе позиции названы N; назначение и комплект PE не подтверждены. [4] Совместимость PIN с выбранными автоматами и схемой фаз проверить до монтажа. Общий контроль и открытые вопросы - лист 26.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-02 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

SF-03 | ШУФО, пятно 5,6 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

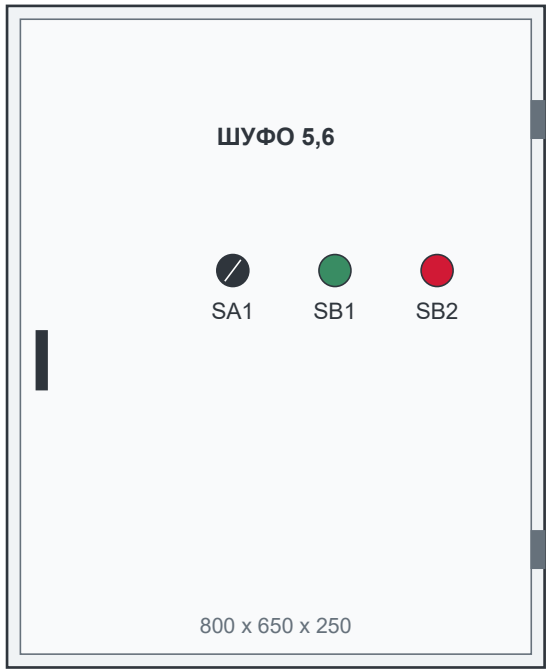

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШУФО (Пятна 5,6) (sensata baiqadam)
Корпус / монтаж	EKT ЩМП-4 / настенный, однодверный
Габариты (В x Ш x Г)	800 x 650 x 250 мм
Защита	IP54 корпуса; IP собранного щита требует проверки
Ввод / сеть	NXB-63H 3P C16, 10 кА / 400-230 В
Учёт	CE308 S34.746.OPR1, 3ф, 5(100) А
Аппаратура / управление	CHINT; NKG3; SA1 + SB1 + SB2 на двери
Материал шин	Требует уточнения; маркировка и размеры в перечне
Резерв	Цель: 20% свободного DIN-пространства; расчёт не закрыт
Источник	PDF R0, листы 9-12; количества на один щит

Фасад: петли справа, отдельный замок слева, открывание вправо. Смотровое окно и дополнительные сигнальные лампы в R0 не указаны. Внутренняя защитная маска требует проверки по конструкции.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-03 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


SF-03 | ШУФО, пятно 5,6 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / М 1:8

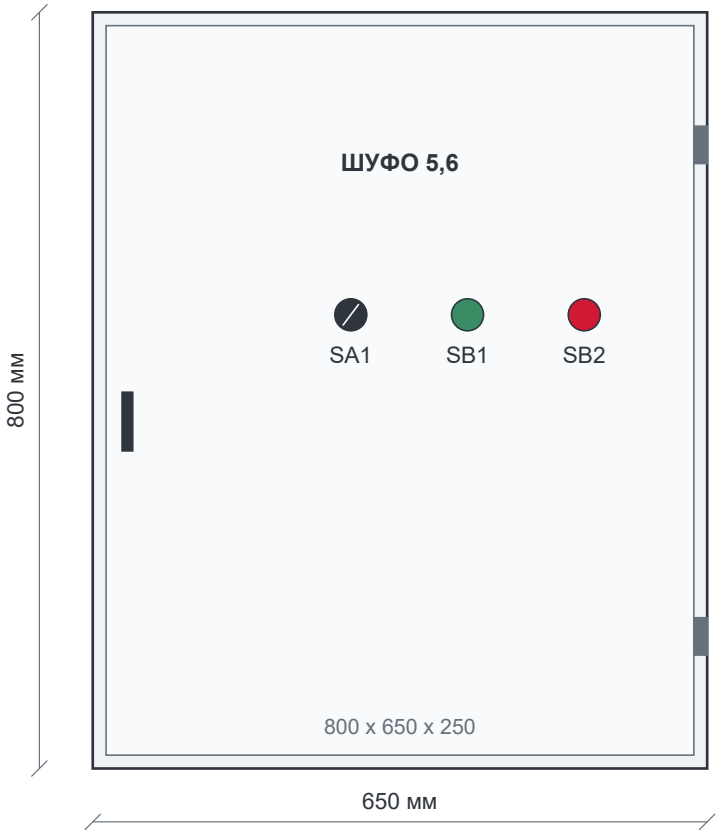


СБОКУ / М 1:8

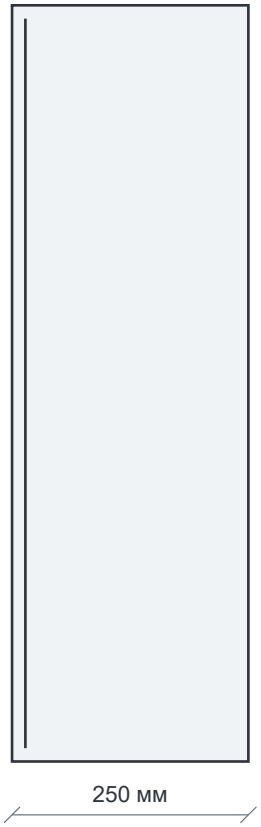

СВЕРХУ / М 1:8



СНИЗУ / ВВОД / М 1:8

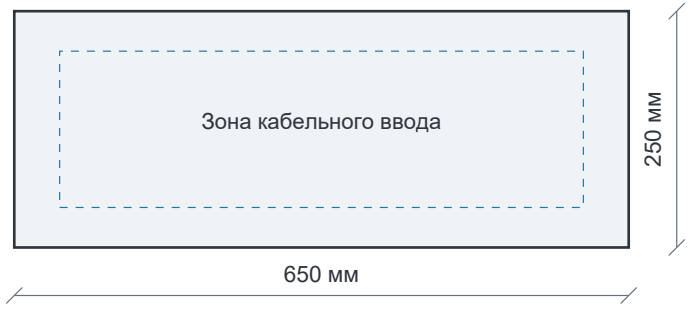

Единицы: мм. Размеры по PDF R0. Печать 100% для указанного масштаба. Петли и колодки показаны условно; отверстия и крепёжные координаты не назначены.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-03 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

SF-03 | ШУФО, пятно 5,6 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

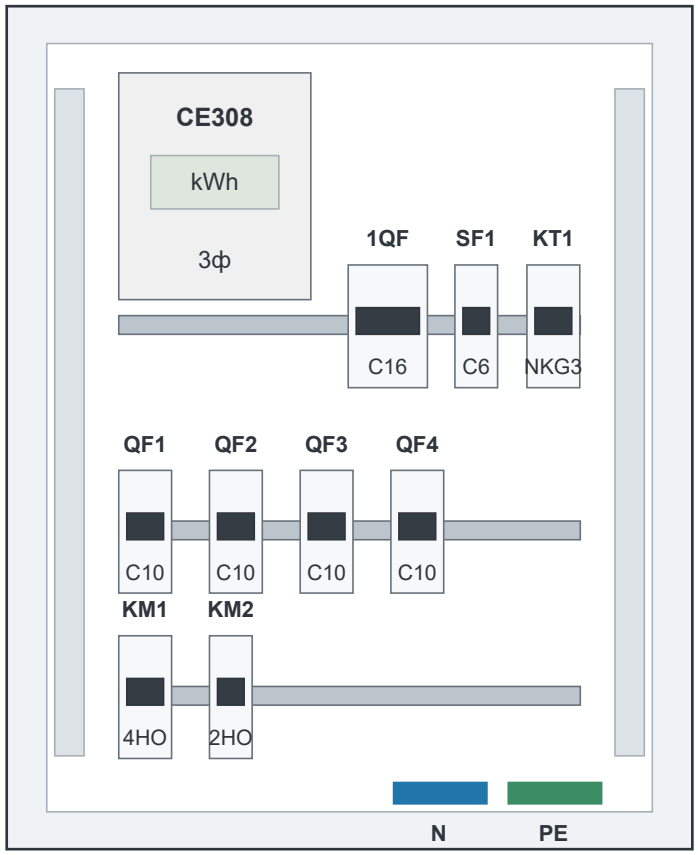

Условная компоновка / NTS

Зона	Обозначение / установка	Кол.
Верхняя	Счётчик CE308 / CE208	1
Ввод / управление	1QF C16 + SF1 C6 + KT1 NKG3	1+1+1
Распределение	QF1-QF4	4
Коммутация	NCH8-20/40: 1; NCH8-20/20: 1	2
Дверь	SA1 + SB1 зелёная + SB2 красная	1+1+1
Низ	Раздельные N и PE; клеммы по рабочей схеме	Уточнить

• Каждый QF и KM показан отдельно; количество совпадает с перечнем на следующем листе.

• Расположение зон - предложение к согласованию. Габариты счётчика, монтажной панели и аппаратов сверить до выпуска рабочего чертежа.

• Для NCH8-20: 4P - 36 мм, 2P - 18 мм по каталогу CHINT. Геометрия других моделей и полезная длина реек пока не подтверждены.

• Цель резерва: F / C >= 0,20; C - доступная ширина DIN, F - свободная ширина. Фактический процент не заявлен.

• N после разных диф. автоматов не объединять. Клеммы, проводники PE, сечения и маркировку назначить по рабочей схеме.

• Открывание двери вправо; жгут управления с сервисной петлёй. Сверление, кабельные отверстия и подключение по этому эскизу не выполнять.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

SF-03 | ШУФО, пятно 5,6 | Baiqadam

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество на один щит. Источник: PDF R0, лист 12.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-4, 800 x 650 x 250 мм, IP54	719-15420	EKT	1	шт
2	Счётчик CE308 S34.746.OPR1, 3ф, 5(100) A, PLC + радио	PYS-001	Энергомера / PYS	1	шт
3	ОТО NXB-63H, 3P, C16, 10 кА	813871	CHINT	1	шт
4	ОТО NXB-63, 1P, C6, 6 кА	814012	CHINT	1	шт
5	Диф. NXBLE-63YH, 1P+N, C10, 30 мА, тип A, 6 кА [1]	515374	CHINT	4	шт
6	Контактор NCH8-20/40, 20 A, 4НО, AC220/230 В	256085	CHINT	1	шт
7	Контактор NCH8-20/20, 20 A, 2НО, AC220/230 В	256054	CHINT	1	шт
8	Таймер NKG3, AC220 В, 8-ON / 8-OFF [2]	310024	CHINT	1	шт
9	SA1: NP2-BD33, 3 положения, 2НО, IP40	574849	CHINT	1	шт
10	SB1: NP2-BA35, зелёная, 1НЗ + 1НО, IP40	573763	CHINT	1	шт
11	SB2: NP2-BA42, красная, 1НЗ, IP40	574843	CHINT	1	шт
12	Шина N ШНИ 10-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200361	UNIT / EKT	1	шт
13	Шина N ШНИ 10-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200361	UNIT / EKT	1	шт
14	Соединительная шина PIN 3P, 63 A, L = 1000 мм [4]	811002	CHINT	1	шт

[1] Пара код/характеристика RCBO требует сверки с оригинальным Excel и каталогом. [2] Для 310024 официальная карточка CHINT KZ указывает AC220 В, 8 включений/8 отключений; питание проверить по паспорту.

[3] В R0 обе позиции названы N; назначение и комплект PE не подтверждены. [4] Совместимость PIN с выбранными автоматами и схемой фаз проверить до монтажа. Общий контроль и открытые вопросы - лист 26.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-03 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

SF-04 | ШУФО, пятно 8,9 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

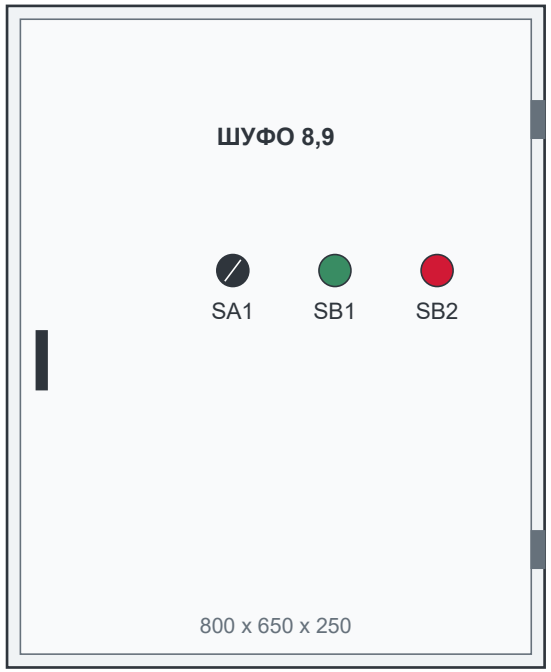

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШУФО (Пятна 8,9) (rozybakieva)
Корпус / монтаж	EKT ЩМП-4 / настенный, однодверный
Габариты (В x Ш x Г)	800 x 650 x 250 мм
Защита	IP54 корпуса; IP собранного щита требует проверки
Ввод / сеть	NXB-63H 3P C16, 10 кА / 400-230 В
Учёт	CE308 S34.746.OPR1, 3ф, 5(100) А
Аппаратура / управление	CHINT; NKG3; SA1 + SB1 + SB2 на двери
Материал шин	Требует уточнения; маркировка и размеры в перечне
Резерв	Цель: 20% свободного DIN-пространства; расчёт не закрыт
Источник	PDF R0, листы 13-16; количества на один щит

Фасад: петли справа, отдельный замок слева, открывание вправо. Смотровое окно и дополнительные сигнальные лампы в R0 не указаны. Внутренняя защитная маска требует проверки по конструкции.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-04 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


SF-04 | ШУФО, пятно 8,9 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / М 1:8

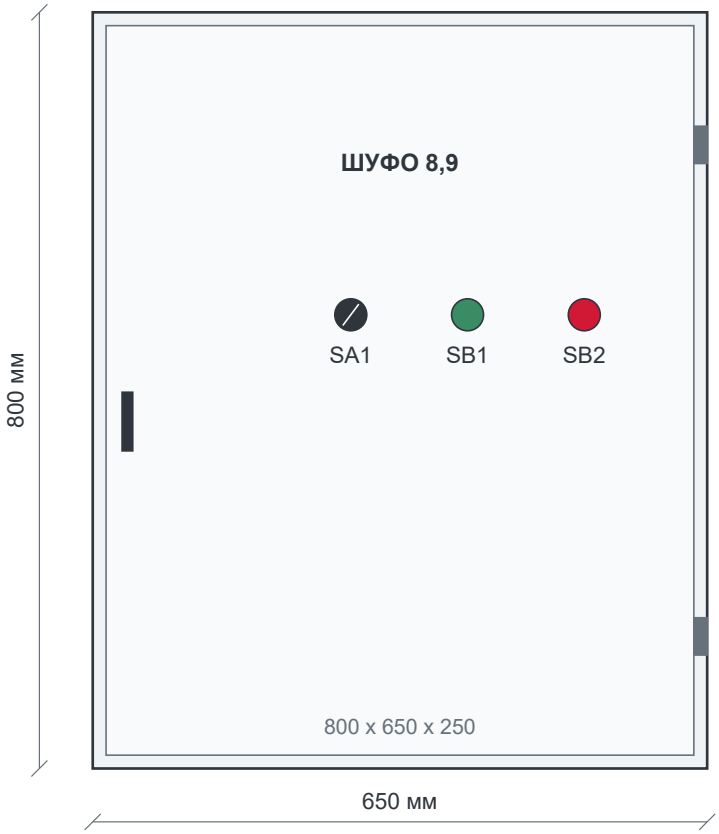


СБОКУ / М 1:8

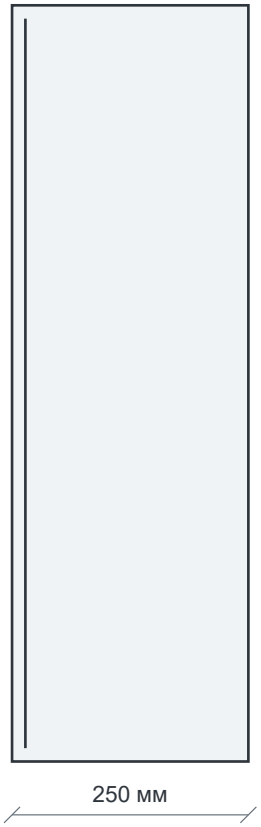

СВЕРХУ / М 1:8



СНИЗУ / ВВОД / М 1:8

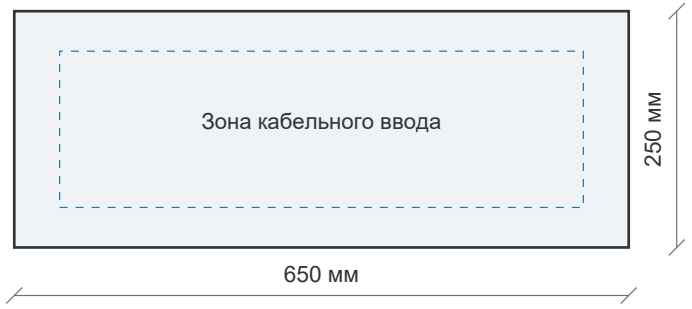

Единицы: мм. Размеры по PDF R0. Печать 100% для указанного масштаба. Петли и колодки показаны условно; отверстия и крепёжные координаты не назначены.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____


Проект: 261005 | Щит: SF-04 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

SF-04 | ШУФО, пятно 8,9 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

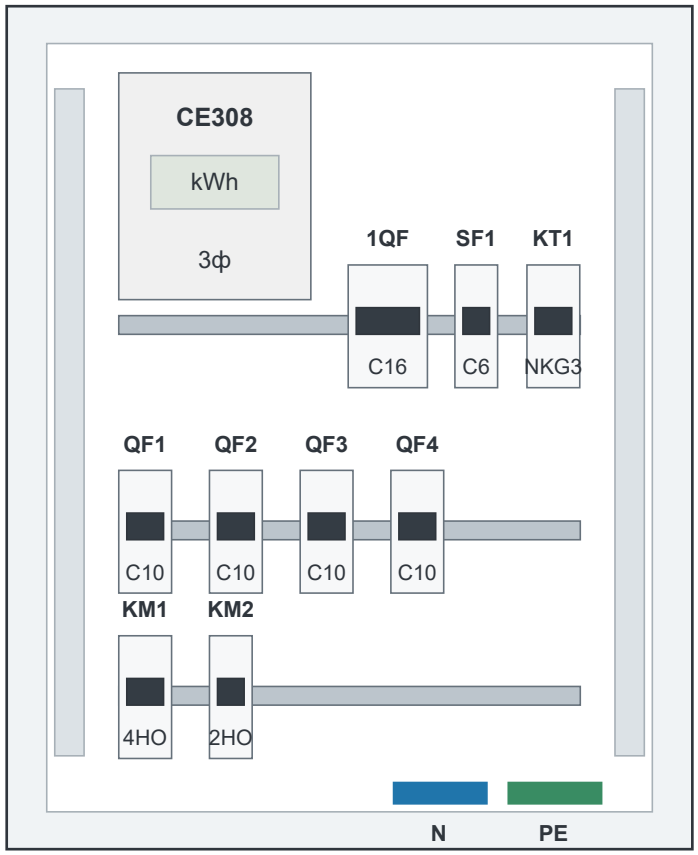

Условная компоновка / NTS

Зона	Обозначение / установка	Кол.
Верхняя	Счётчик CE308 / CE208	1
Ввод / управление	1QF C16 + SF1 C6 + KT1 NKG3	1+1+1
Распределение	QF1-QF4	4
Коммутация	NCH8-20/40: 1; NCH8-20/20: 1	2
Дверь	SA1 + SB1 зелёная + SB2 красная	1+1+1
Низ	Раздельные N и PE; клеммы по рабочей схеме	Уточнить

• Каждый QF и KM показан отдельно; количество совпадает с перечнем на следующем листе.

• Расположение зон - предложение к согласованию. Габариты счётчика, монтажной панели и аппаратов сверить до выпуска рабочего чертежа.

• Для NCH8-20: 4P - 36 мм, 2P - 18 мм по каталогу CHINT. Геометрия других моделей и полезная длина реек пока не подтверждены.

• Цель резерва: F / C >= 0,20; C - доступная ширина DIN, F - свободная ширина. Фактический процент не заявлен.

• N после разных диф. автоматов не объединять. Клеммы, проводники PE, сечения и маркировку назначить по рабочей схеме.

• Открывание двери вправо; жгут управления с сервисной петлёй. Сверление, кабельные отверстия и подключение по этому эскизу не выполнять.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

SF-04 | ШУФО, пятно 8,9 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество на один щит. Источник: PDF R0, лист 16.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-4, 800 x 650 x 250 мм, IP54	719-15420	EKT	1	шт
2	Счётчик CE308 S34.746.OPR1, 3ф, 5(100) A, PLC + радио	PYS-001	Энергомера / PYS	1	шт
3	ОТО NXB-63H, 3P, C16, 10 кА	813871	CHINT	1	шт
4	ОТО NXB-63, 1P, C6, 6 кА	814012	CHINT	1	шт
5	Диф. NXBLE-63YH, 1P+N, C10, 30 мА, тип A, 6 кА [1]	515374	CHINT	4	шт
6	Контактор NCH8-20/40, 20 A, 4НО, AC220/230 В	256085	CHINT	1	шт
7	Контактор NCH8-20/20, 20 A, 2НО, AC220/230 В	256054	CHINT	1	шт
8	Таймер NKG3, AC220 В, 8-ON / 8-OFF [2]	310024	CHINT	1	шт
9	SA1: NP2-BD33, 3 положения, 2НО, IP40	574849	CHINT	1	шт
10	SB1: NP2-BA35, зелёная, 1НЗ + 1НО, IP40	573763	CHINT	1	шт
11	SB2: NP2-BA42, красная, 1НЗ, IP40	574843	CHINT	1	шт
12	Шина N ШНИ 10-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200361	UNIT / EKT	1	шт
13	Шина N ШНИ 10-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200361	UNIT / EKT	1	шт
14	Соединительная шина PIN 3P, 63 A, L = 1000 мм [4]	811002	CHINT	1	шт

[1] Пара код/характеристика RCBO требует сверки с оригинальным Excel и каталогом. [2] Для 310024 официальная карточка CHINT KZ указывает AC220 В, 8 включений/8 отключений; питание проверить по паспорту.

[3] В R0 обе позиции названы N; назначение и комплект PE не подтверждены. [4] Совместимость PIN с выбранными автоматами и схемой фаз проверить до монтажа. Общий контроль и открытые вопросы - лист 26.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-04 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

SF-05 | ШУФО, пятно 10 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШУФО (Пятно 10) (rozybakieva)
Корпус / монтаж	EKT ЩМП-4 / настенный, однодверный
Габариты (В x Ш x Г)	800 x 650 x 250 мм
Защита	IP54 корпуса; IP собранного щита требует проверки
Ввод / сеть	NXB-63 1P C16, 6 кА / 230 В
Учёт	CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ, 1ф, 5(80) А
Аппаратура / управление	CHINT; NKG3; SA1 + SB1 + SB2 на двери
Материал шин	Требует уточнения; маркировка и размеры в перечне
Резерв	Цель: 20% свободного DIN-пространства; расчёт не закрыт
Источник	PDF R0, листы 17-20; количества на один щит

Фасад: петли справа, отдельный замок слева, открывание вправо. Смотровое окно и дополнительные сигнальные лампы в R0 не указаны. Внутренняя защитная маска требует проверки по конструкции.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-05 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


SF-05 | ШУФО, пятно 10 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / М 1:8

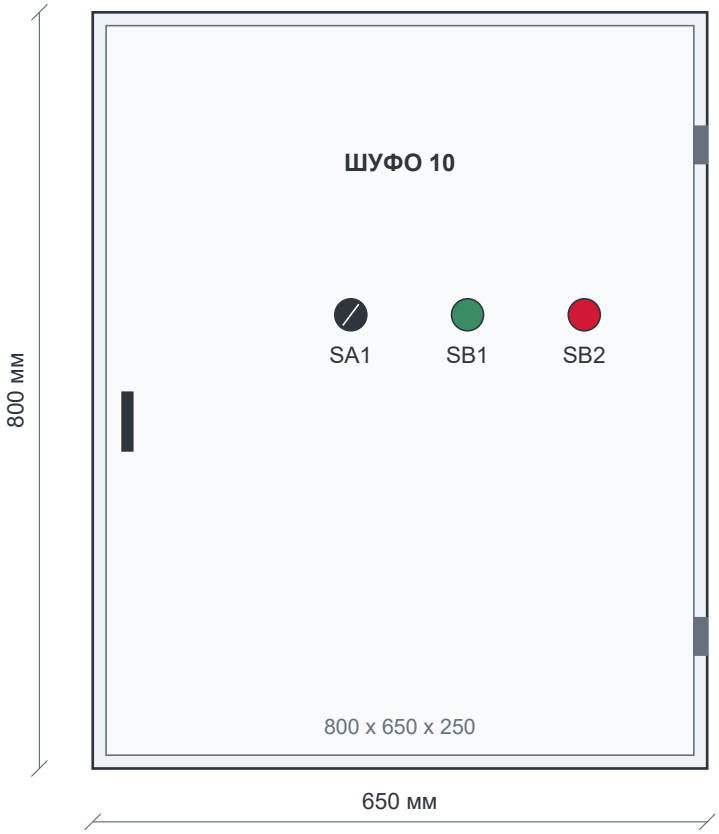


СБОКУ / М 1:8

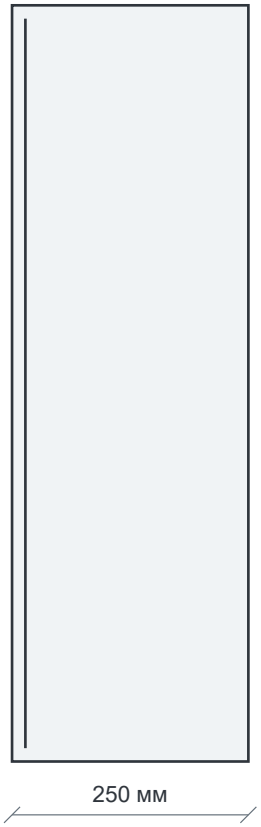

СВЕРХУ / М 1:8



СНИЗУ / ВВОД / М 1:8

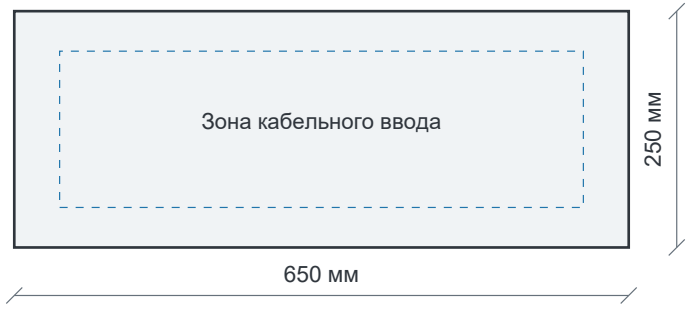

Единицы: мм. Размеры по PDF R0. Печать 100% для указанного масштаба. Петли и колодки показаны условно; отверстия и крепёжные координаты не назначены.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-05 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

SF-05 | ШУФО, пятно 10 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

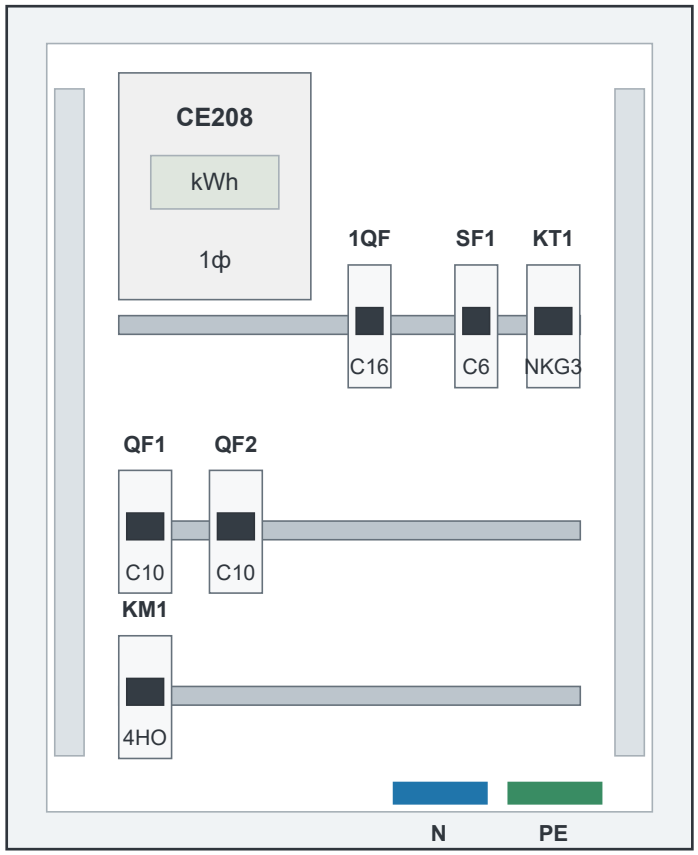

Условная компоновка / NTS

Зона	Обозначение / установка	Кол.
Верхняя	Счётчик CE308 / CE208	1
Ввод / управление	1QF C16 + SF1 C6 + KT1 NKG3	1+1+1
Распределение	QF1-QF2	2
Коммутация	NCH8-20/40: 1; NCH8-20/20: 0	1
Дверь	SA1 + SB1 зелёная + SB2 красная	1+1+1
Низ	Раздельные N и PE; клеммы по рабочей схеме	Уточнить

• Каждый QF и KM показан отдельно; количество совпадает с перечнем на следующем листе.

• Расположение зон - предложение к согласованию. Габариты счётчика, монтажной панели и аппаратов сверить до выпуска рабочего чертежа.

• Для NCH8-20: 4P - 36 мм, 2P - 18 мм по каталогу CHINT. Геометрия других моделей и полезная длина реек пока не подтверждены.

• Цель резерва: F / C >= 0,20; C - доступная ширина DIN, F - свободная ширина. Фактический процент не заявлен.

• N после разных диф. автоматов не объединять. Клеммы, проводники PE, сечения и маркировку назначить по рабочей схеме.

• Открывание двери вправо; жгут управления с сервисной петлёй. Сверление, кабельные отверстия и подключение по этому эскизу не выполнять.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

SF-05 | ШУФО, пятно 10 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество на один щит. Источник: PDF R0, лист 20.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-4, 800 x 650 x 250 мм, IP54	719-15420	EKT	1	шт
2	Счётчик CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ, 1ф, 5(80) A, PLC + радио	PYS-002	Энергомера / PYS	1	шт
3	ОТО NXB-63, 1P, C16, 6 кА	814014	CHINT	1	шт
4	ОТО NXB-63, 1P, C6, 6 кА	814012	CHINT	1	шт
5	Диф. NXBLE-63YH, 1P+N, C10, 30 мА, тип A, 6 кА [1]	515374	CHINT	2	шт
6	Контактор NCH8-20/40, 20 A, 4НО, AC220/230 В	256085	CHINT	1	шт
7	Таймер NKG3, AC220 В, 8-ON / 8-OFF [2]	310024	CHINT	1	шт
8	SA1: NP2-BD33, 3 положения, 2НО, IP40	574849	CHINT	1	шт
9	SB1: NP2-BA35, зелёная, 1НЗ + 1НО, IP40	573763	CHINT	1	шт
10	SB2: NP2-BA42, красная, 1НЗ, IP40	574843	CHINT	1	шт
11	Шина N ШНИ 8-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200365	UNIT / EKT	1	шт
12	Шина N ШНИ 6-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200364	UNIT / EKT	1	шт
13	Соединительная шина PIN 1P, 100 A, L = 1000 мм [4]	811004	CHINT	1	шт

[1] Пара код/характеристика RCBO требует сверки с оригинальным Excel и каталогом. [2] Для 310024 официальная карточка CHINT KZ указывает AC220 В, 8 включений/8 отключений; питание проверить по паспорту.

[3] В R0 обе позиции названы N; назначение и комплект PE не подтверждены. [4] Совместимость PIN с выбранными автоматами и схемой фаз проверить до монтажа. Общий контроль и открытые вопросы - лист 26.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-05 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

SF-06 | ШУФО, пятно 11 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШУФО (Пятно 11) (rozybakieva)
Корпус / монтаж	EKT ЩМП-4 / настенный, однодверный
Габариты (В x Ш x Г)	800 x 650 x 250 мм
Защита	IP54 корпуса; IP собранного щита требует проверки
Ввод / сеть	NXB-63 1P C16, 6 кА / 230 В
Учёт	CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ, 1ф, 5(80) А
Аппаратура / управление	CHINT; NKG3; SA1 + SB1 + SB2 на двери
Материал шин	Требует уточнения; маркировка и размеры в перечне
Резерв	Цель: 20% свободного DIN-пространства; расчёт не закрыт
Источник	PDF R0, листы 21-24; количества на один щит

Фасад: петли справа, отдельный замок слева, открывание вправо. Смотровое окно и дополнительные сигнальные лампы в R0 не указаны. Внутренняя защитная маска требует проверки по конструкции.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


SF-06 | ШУФО, пятно 11 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / М 1:8

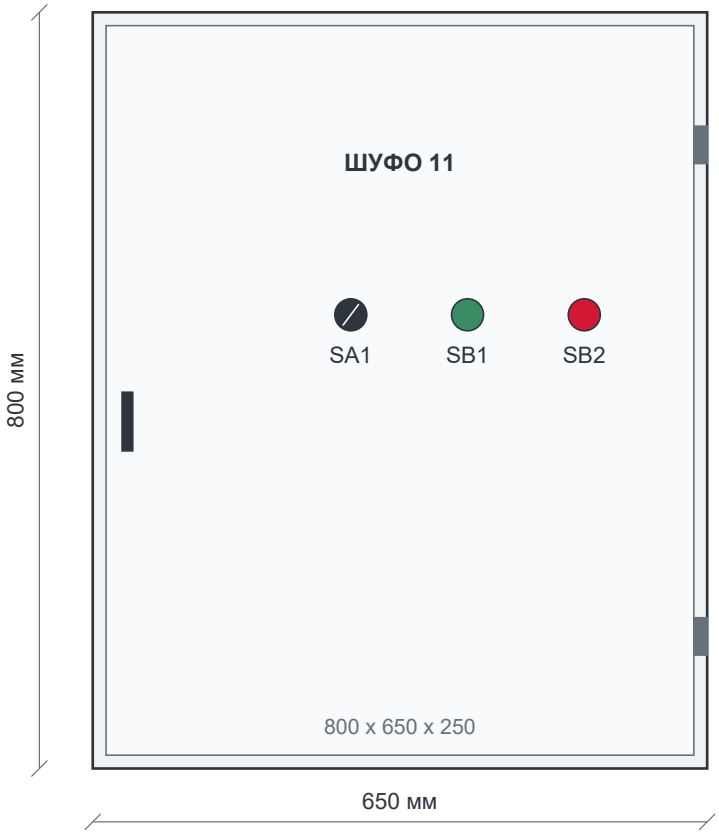


СБОКУ / М 1:8

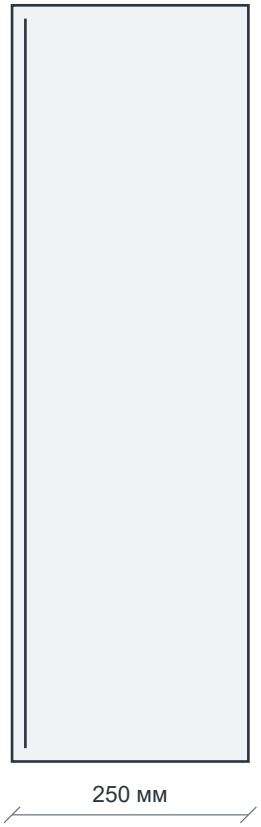

СВЕРХУ / М 1:8



СНИЗУ / ВВОД / М 1:8

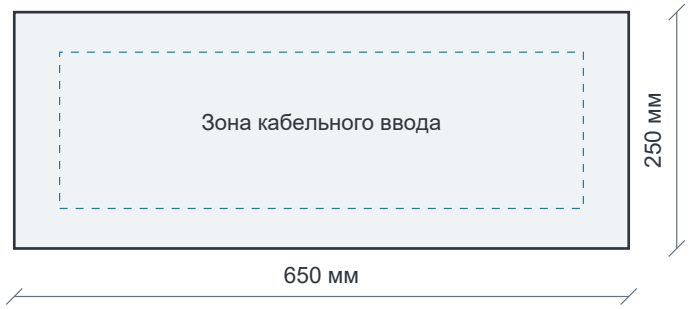

Единицы: мм. Размеры по PDF R0. Печать 100% для указанного масштаба. Петли и колодки показаны условно; отверстия и крепёжные координаты не назначены.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-06 | Рабочий заказ: _____


Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

SF-06 | ШУФО, пятно 11 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

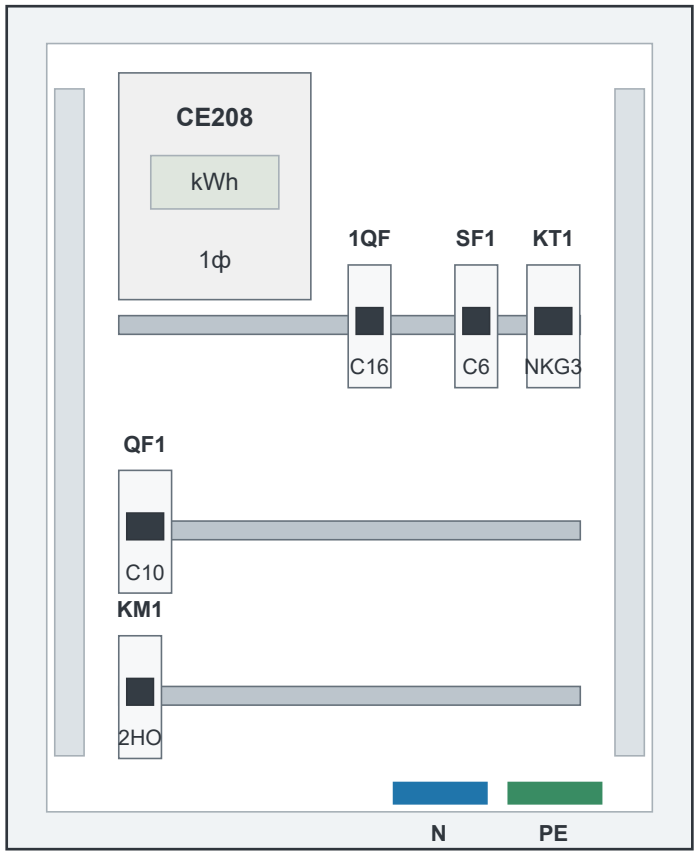

Условная компоновка / NTS

Зона	Обозначение / установка	Кол.
Верхняя	Счётчик CE308 / CE208	1
Ввод / управление	1QF C16 + SF1 C6 + KT1 NKG3	1+1+1
Распределение	QF1	1
Коммутация	NCH8-20/40: 0; NCH8-20/20: 1	1
Дверь	SA1 + SB1 зелёная + SB2 красная	1+1+1
Низ	Раздельные N и PE; клеммы по рабочей схеме	Уточнить

• Каждый QF и KM показан отдельно; количество совпадает с перечнем на следующем листе.

• Расположение зон - предложение к согласованию. Габариты счётчика, монтажной панели и аппаратов сверить до выпуска рабочего чертежа.

• Для NCH8-20: 4P - 36 мм, 2P - 18 мм по каталогу CHINT. Геометрия других моделей и полезная длина реек пока не подтверждены.

• Цель резерва: F / C >= 0,20; C - доступная ширина DIN, F - свободная ширина. Фактический процент не заявлен.

• N после разных диф. автоматов не объединять. Клеммы, проводники PE, сечения и маркировку назначить по рабочей схеме.

• Открывание двери вправо; жгут управления с сервисной петлёй. Сверление, кабельные отверстия и подключение по этому эскизу не выполнять.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-06 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

SF-06 | ШУФО, пятно 11 | Rozybakieva

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество на один щит. Источник: PDF R0, лист 24.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-4, 800 x 650 x 250 мм, IP54	719-15420	EKT	1	шт
2	Счётчик CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ, 1ф, 5(80) A, PLC + радио	PYS-002	Энергомера / PYS	1	шт
3	ОТО NXB-63, 1P, C16, 6 кА	814014	CHINT	1	шт
4	ОТО NXB-63, 1P, C6, 6 кА	814012	CHINT	1	шт
5	Диф. NXBLE-63YH, 1P+N, C10, 30 мА, тип A, 6 кА [1]	515374	CHINT	1	шт
6	Контактор NCH8-20/20, 20 A, 2НО, AC220/230 В	256054	CHINT	1	шт
7	Таймер NKG3, AC220 В, 8-ON / 8-OFF [2]	310024	CHINT	1	шт
8	SA1: NP2-BD33, 3 положения, 2НО, IP40	574849	CHINT	1	шт
9	SB1: NP2-BA35, зелёная, 1НЗ + 1НО, IP40	573763	CHINT	1	шт
10	SB2: NP2-BA42, красная, 1НЗ, IP40	574843	CHINT	1	шт
11	Шина N ШНИ 8-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200365	UNIT / EKT	1	шт
12	Шина N ШНИ 6-КС-С, UNIT, 8 x 12 мм [3]	130200364	UNIT / EKT	1	шт
13	Соединительная шина PIN 1P, 100 A, L = 1000 мм [4]	811004	CHINT	1	шт

[1] Пара код/характеристика RCBO требует сверки с оригинальным Excel и каталогом. [2] Для 310024 официальная карточка CHINT KZ указывает AC220 В, 8 включений/8 отключений; питание проверить по паспорту.

[3] В R0 обе позиции названы N; назначение и комплект PE не подтверждены. [4] Совместимость PIN с выбранными автоматами и схемой фаз проверить до монтажа. Общий контроль и открытые вопросы - лист 26.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261005 | Щит: SF-06 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

Дата: 06.10.2026

КОНТРОЛЬ РЕВИЗИИ И ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

№	Пункт проверки	Решение / недостающие данные
1	Источники проекта	Требуются исходный Excel и актуальные силовая/управляющая схемы. Данные R0 - вторичный источник; прежние утверждения о расхождениях со схемой не проверены.
2	Корпус / исполнение	800 x 650 x 250 мм EKT сохранён по R0. Проверить выбор корпуса, полезную панель, направление двери, условия среды и итоговый IP.
3	IP фасада	В R0 у SA1, SB1, SB2 указан IP40. Совместимость с целевым IP54 подтвердить: уплотнения/защитные элементы или согласованная замена.
4	N / PE / PIN	Обе шинные строки исходника названы N. Уточнить отдельный комплект PE, способ крепления и артикулы. PIN 3P нельзя назначать RCBO без проверки схемы и совместимости.
5	RCBO / таймер / управление	RCBO 515374 и характеристики сверить. NKG3 310024: описание питания исправлено по CHINT KZ; функциональную эквивалентность и цепи контакторов проверить.
6	Резерв / геометрия	20% - требование, не результат проверки. Для точного чертежа нужны размеры конкретных аппаратов и полезная монтажная площадь корпуса.
7	Логотип / количество изделий	Красно-серый логотип TEKLED из предоставленного образца размещён на всех листах. Шесть позиций сохранены; количество изделий каждой позиции - по заказу.
8	Выпуск / испытания	Подписи и результаты не заполнены. Проверить затяжку по паспортам, PE-непрерывность, изоляцию, диф. защиту, ручной/автоматический режим и работу двери.

R1: единая сквозная нумерация; полный блок функций и идентификации; пропорциональный фасад; передний/боковой/верхний/нижний виды M 1:8; отдельные аппараты в эскизе; нет неподтверждённого заявления об обеспеченном резерве и готовности к производству.

Проверочные источники (05.10.2026): CHINT KZ, карточка NKG3 310024; CHINT global, NCH8 Modular AC Contactor, таблица габаритов.

https://chint.kz/products/taimer_elektronnyi_nkg3_8-on_8-off_ac220v__r_

https://www.chintglobal.com/tr/tr/products/low-voltage/iec/industrial-control/nch8.html

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**Изготовление**	**Монтаж**	**ОТК / качество**
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____
