ATYRAU - GULDANA

261006 | Атырау | Guldana

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ - КОМПЛЕКТ ЩИТОВ

№	Щит	Габариты В × Ш × Г	Кол.
1	1ВРУ	1700+100 × 2200 × 450 мм	1 компл.
2	ЯАВР	800 × 650 × 250 мм	1 компл.
3	ШРС	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
4	ШР1	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
5	ШР2	398 × 312 × 120 мм	1 компл.
6	ШР3	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
7	ШР4	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
8	ШР5	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
9	ШРб-1	1000 × 500 × 180 мм	1 компл.
10	ШРб-2	1000 × 500 × 180 мм	1 компл.
11	Щс	313 × 268 × 120 мм	1 компл.
12	ЩО-1	48M NEXUS, габарит по каталогу	1 компл.
13	ЩО-2	32M NEXUS, габарит по каталогу	1 компл.
14	ЩО-3	48M NEXUS, габарит по каталогу	1 компл.
15	ЩО-4	48M + 18M NEXUS, габарит по каталогу	1 компл.
16	Я-Нц	1×500×400×220 + 1×500×400×220 мм	1 компл.
17	Яз1	500 × 400 × 220 мм	1 компл.


Комплект: 17 позиций по исходному Excel BOM. Для каждого щита представлены паспорт, габаритные виды, условная внутренняя компоновка и комплектация.

TEKSAN / NEXUS; аппаратура CHINT - по BOM. Неуказанные каталожные габариты NEXUS проверить перед выпуском. Статус: на согласование.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

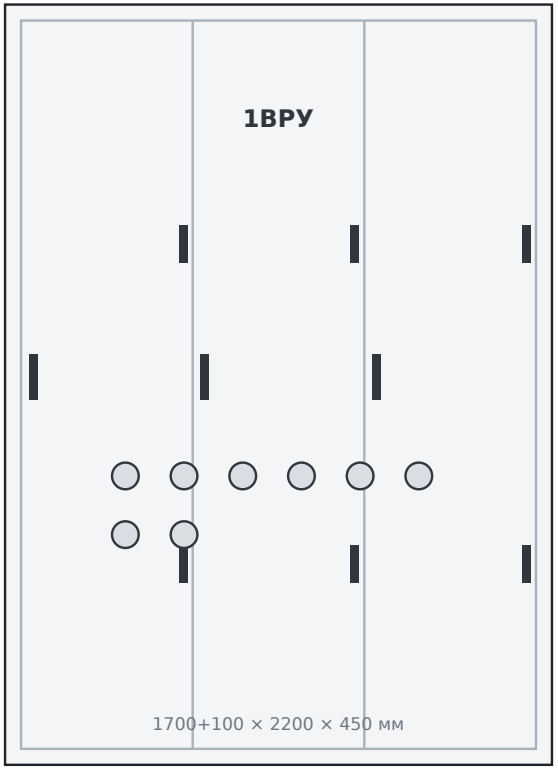

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)
Корпус / монтаж	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База ×1; Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31 ×2
Габариты (В × Ш × Г)	1700+100 × 2200 × 450 мм
Защита	IP31, уточнить
Ввод / сеть	Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) ×2
Учёт	Отан САР4У-Э712 ТХ RS2 ОР П Д (3x57,7/100V 5-7,5A) ×2; Трансформатор Т-0,66 200\5 (9) ×3; Трансформатор Т-0,66 150\5 (9) ×3
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

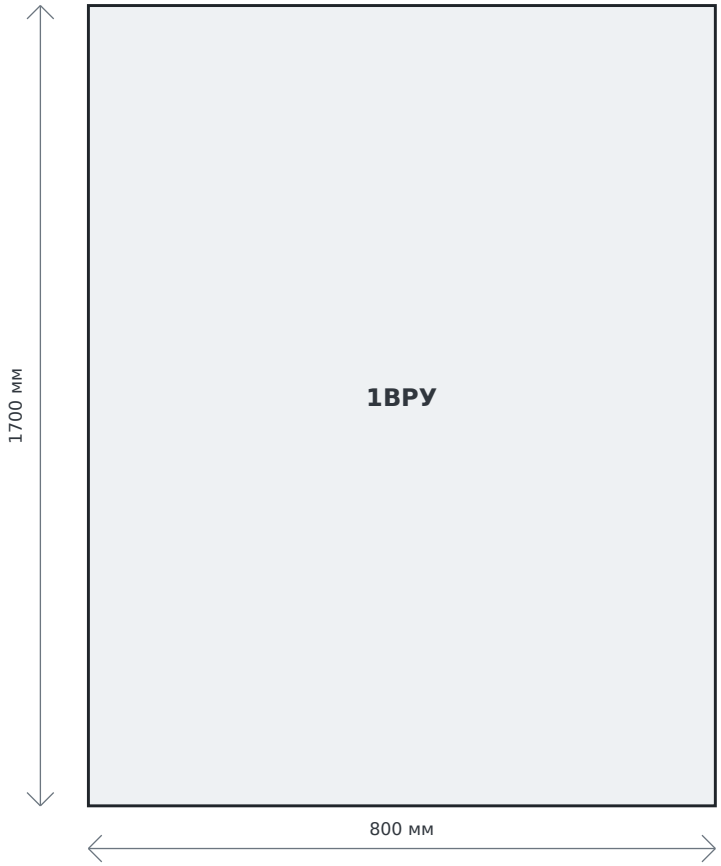


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

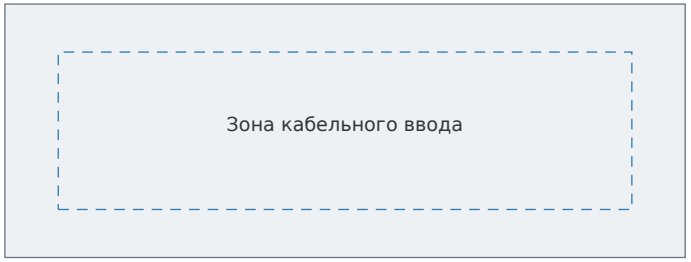

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-01 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

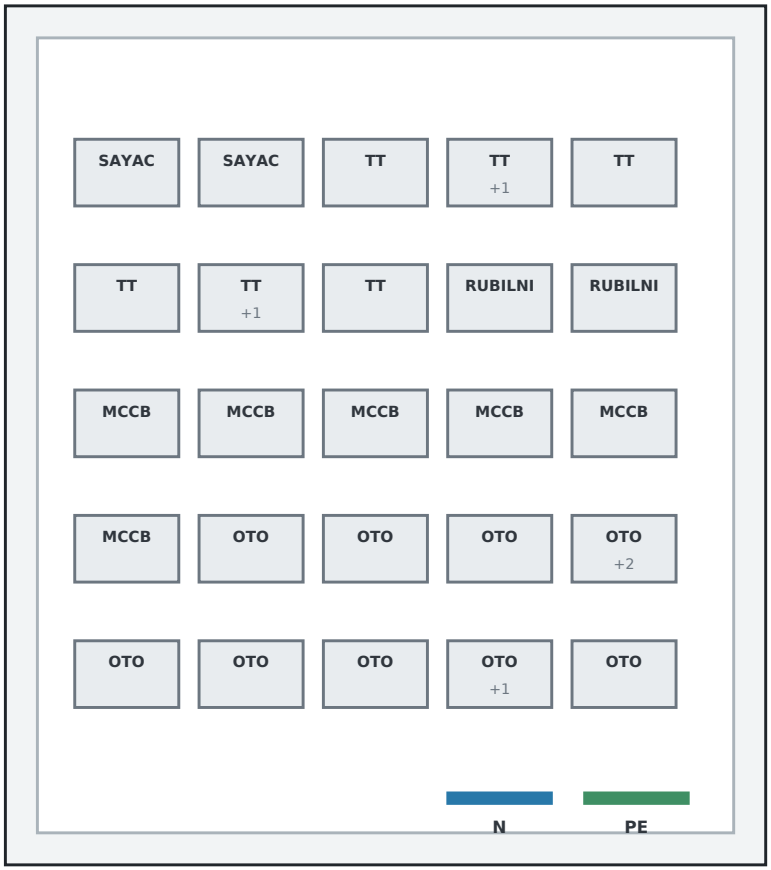

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Учёт	Отан САР4У-Э712 ТХ RS2 ОР П Д (3x57,7/100V 5-7,5A) ×2; Трансформатор Т-0,66 200\5 (9) ×3; Трансформатор Т-0,66 150\5 (9) ×3; Конденсатор К3-500 0,5 мкФ (помехоподавляющий, узел учета) ×2	10
Ввод	Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) ×2	2
Распределение	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) ×1; Авт. выкл. NXM-160S/3P 160A 36кА (R) ×1; Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) ×2; Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R) ×1; Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R) ×1; Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) ×3; Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) ×2; Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) ×4	15
Резерв	Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) ×2; Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) ×1; Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) ×2	5

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены. Часть 1/2.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	719-15043	TEKSAN F	1	шт
2	Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31	719-15085	TEKSAN F	2	шт
3	Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6)	270100161_	PYS	2	шт
4	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R)	131367	CHINT	1	шт
5	Авт. выкл. NXM-160S/3P 160A 36кА (R)	131364	CHINT	1	шт
6	Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R)	146337	CHINT	2	шт
7	Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R)	146337	CHINT	2	шт
8	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	814989	CHINT	2	шт
9	Отан САР4У-Э712 ТХ RS2 ОР П Д (3х57,7/100V 5-7,5А)	KR	SAIMAN	2	шт
10	Трансформатор Т-0,66 200\5 (9)	989-101-0134	TEKSAN F	3	шт
11	Трансформатор Т-0,66 150\5 (9)	989-101-0123	TEKSAN F	3	шт
12	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	296709	CHINT	2	шт
13	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R)	813877	CHINT	1	шт

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены. Часть 2/2.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
14	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R)	813876	CHINT	1	шт
15	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R)	813875	CHINT	3	шт
16	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R)	813875	CHINT	1	шт
17	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R)	813873	CHINT	2	шт
18	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R)	813873	CHINT	2	шт
19	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R)	813874	CHINT	4	шт
20	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	296825	CHINT	2	шт
21	Конденсатор КЗ-500 0,5 мкФ (помехоподавляющий, узел учета)	PYS-003	PYS	2	шт
22	Клеммная коробка для счетчиков (испытательная)	989-100-1757	TEKSAN F	2	шт
23	Индикатор ND16-22D/2 белый AC/DC230B (R)	593073	CHINT	2	шт
24	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	593076	CHINT	2	шт
25	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	593077	CHINT	2	шт
26	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	593075	CHINT	2	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-01 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-02 | ЯВР (ЯВР3-40-2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЯВР (ЯВР3-40-2)
Корпус / монтаж	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	800 × 650 × 250 мм
Защита	IP54
Ввод / сеть	Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) ×1
Учёт	Дала ТХ П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) ×1
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-02 | ЯАВР (ЯАВР3-40-2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

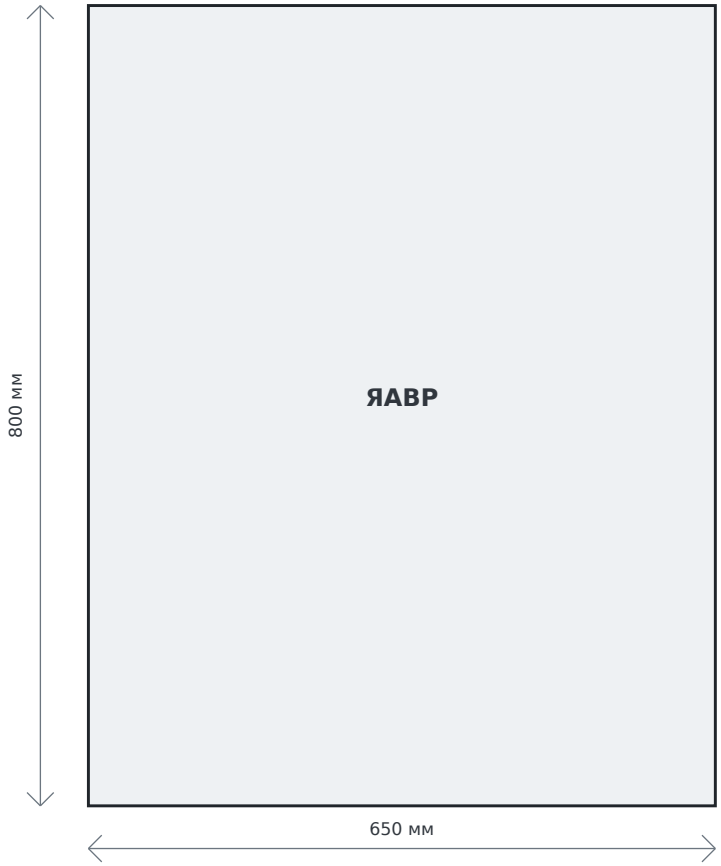


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

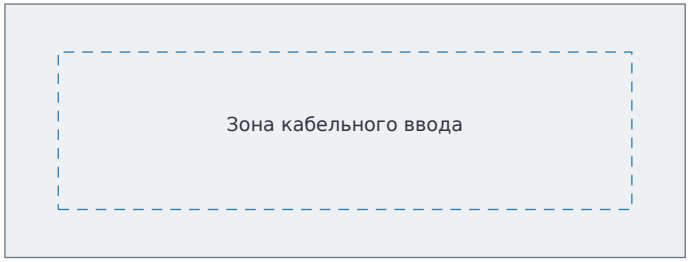


Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-02 | ЯАВР (ЯАВР3-40-2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

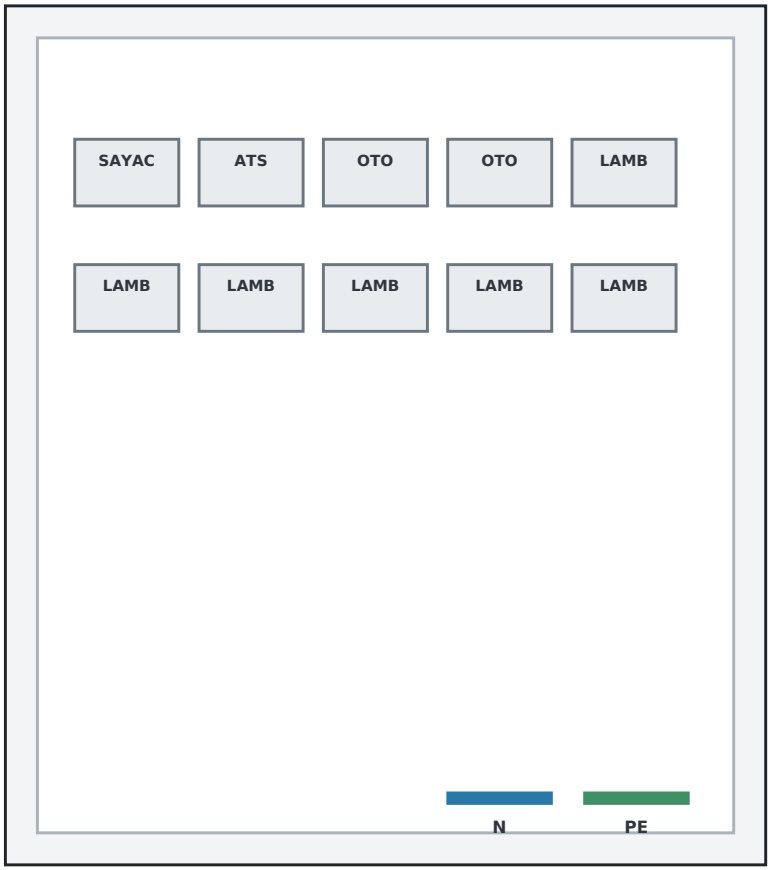

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Учёт	Дала ТХ П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) ×1	1
Ввод	Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) ×1	1
Управление	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×2; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×2; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×2	8

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-02 | ЯАВР (ЯАВР3-40-2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54	719-15420	TEKSAN F	1	шт
2	Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R)	171631	CHINT	1	шт
3	Дала ТХ П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A)	NY	SAIMAN	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	296825	CHINT	2	шт
5	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	593076	CHINT	2	шт
6	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	593077	CHINT	2	шт
7	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	593075	CHINT	2	шт


• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-03 | ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

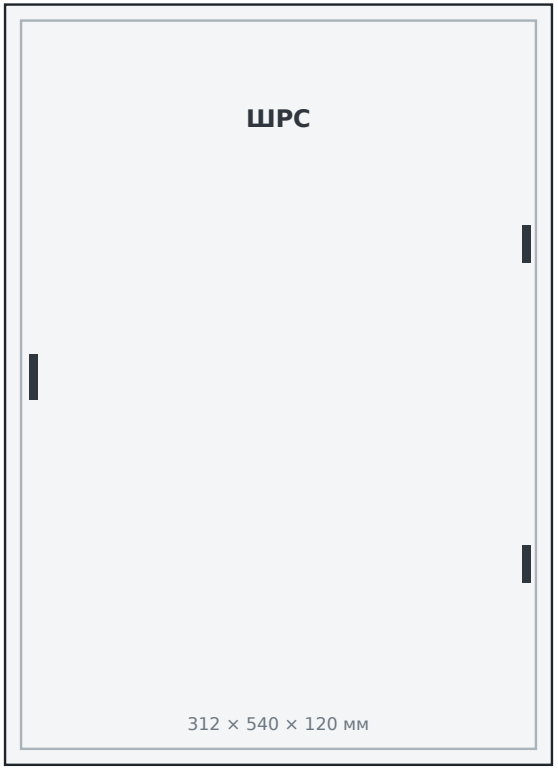

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	—
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-03 | ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

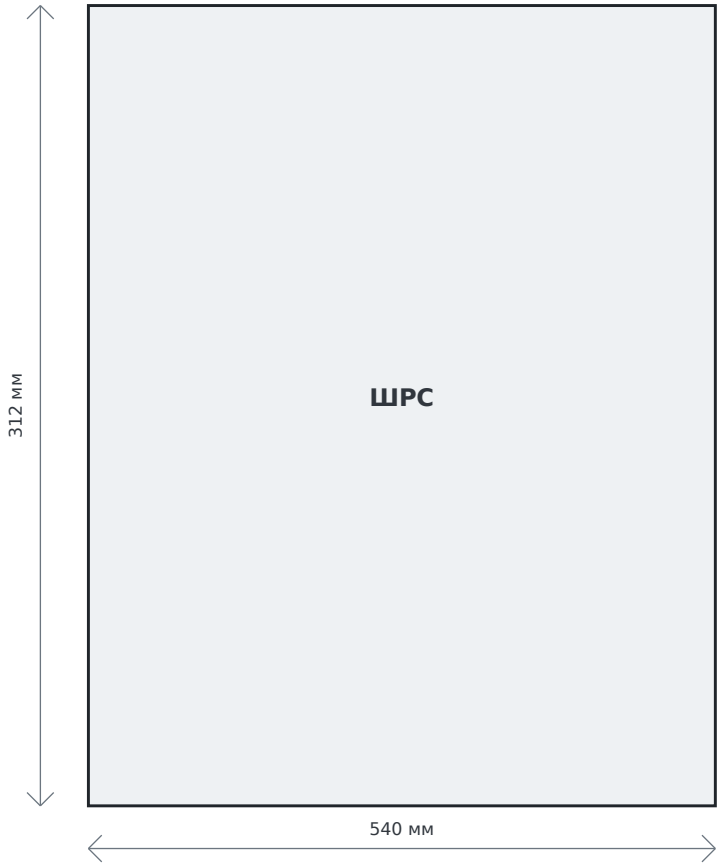


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

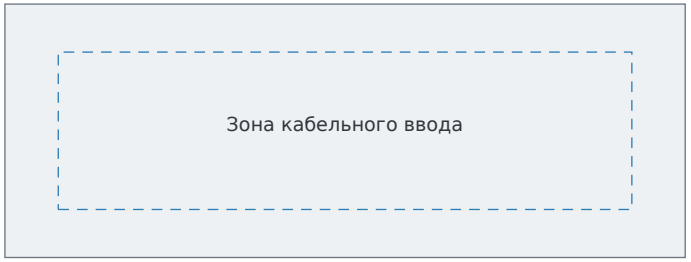


Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-03 | ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

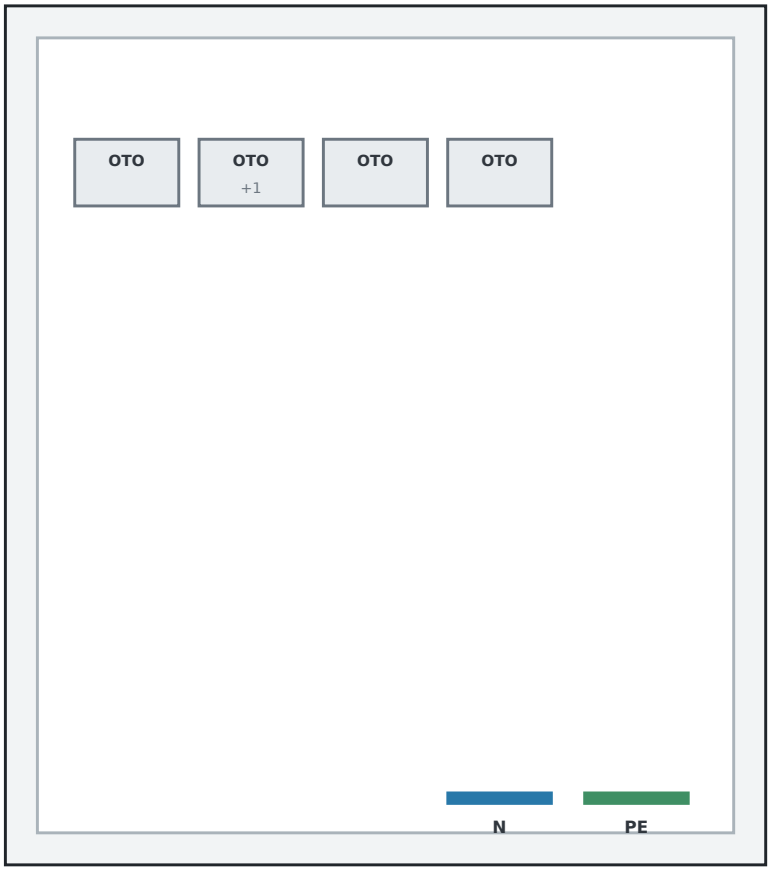

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1	4

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-03 | ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	296829	CHINT	2	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	296829	CHINT	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт


• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-04 | ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

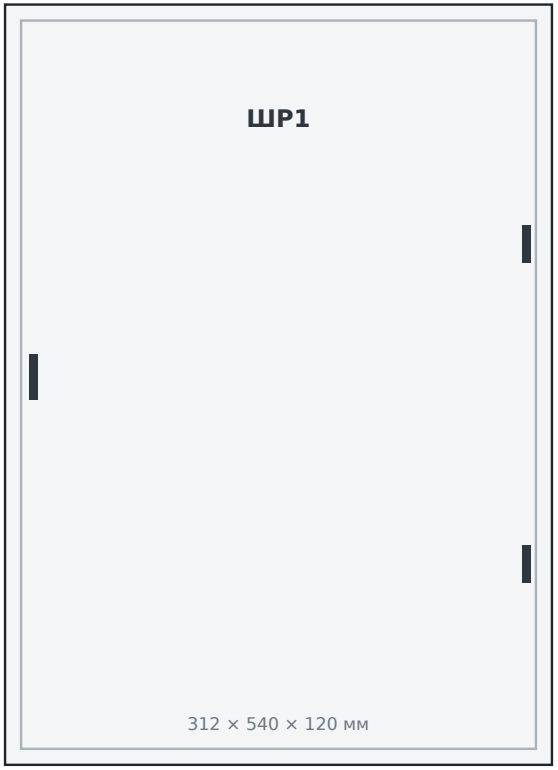

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-04 | ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

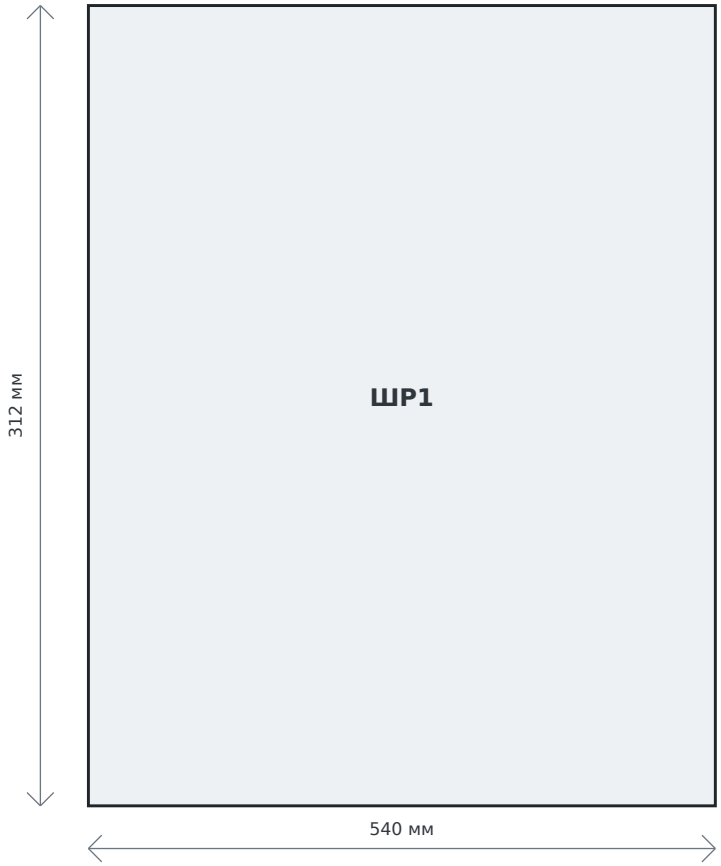


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

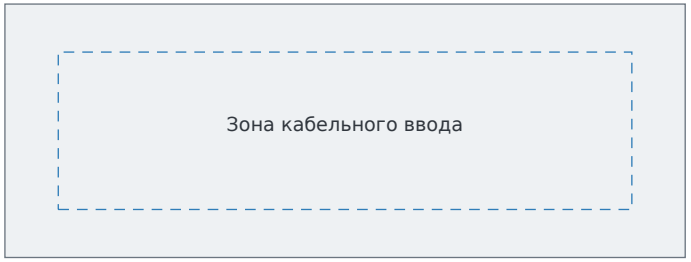


Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-04 | ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

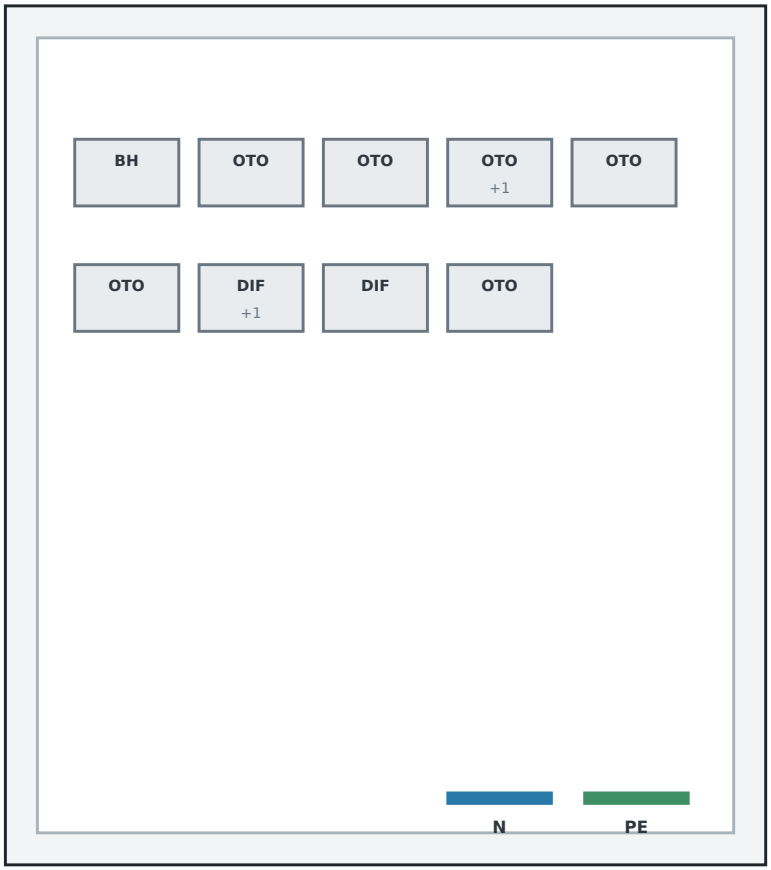

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1	1
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) ×2	7
Резерв	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1	1

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-04 | ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	193185	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	296831	CHINT	2	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	296831	CHINT	1	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
6	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
7	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
8	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	2	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-04 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-05 | ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

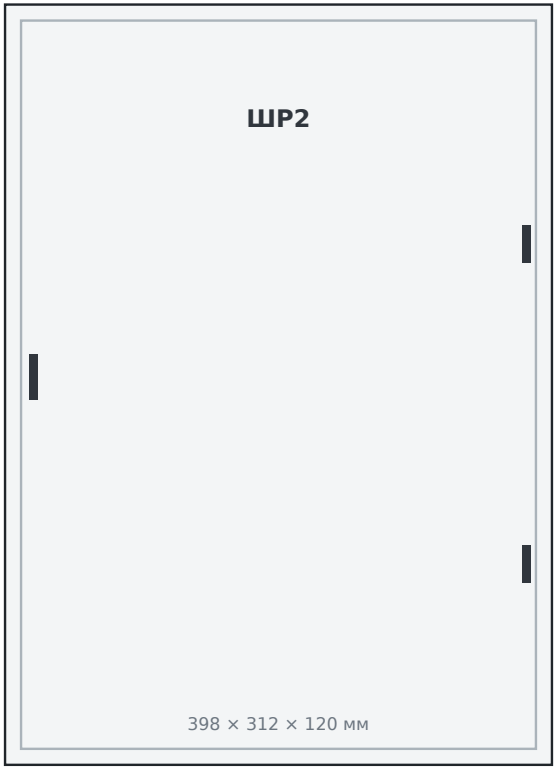

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	398 × 312 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-05 | ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

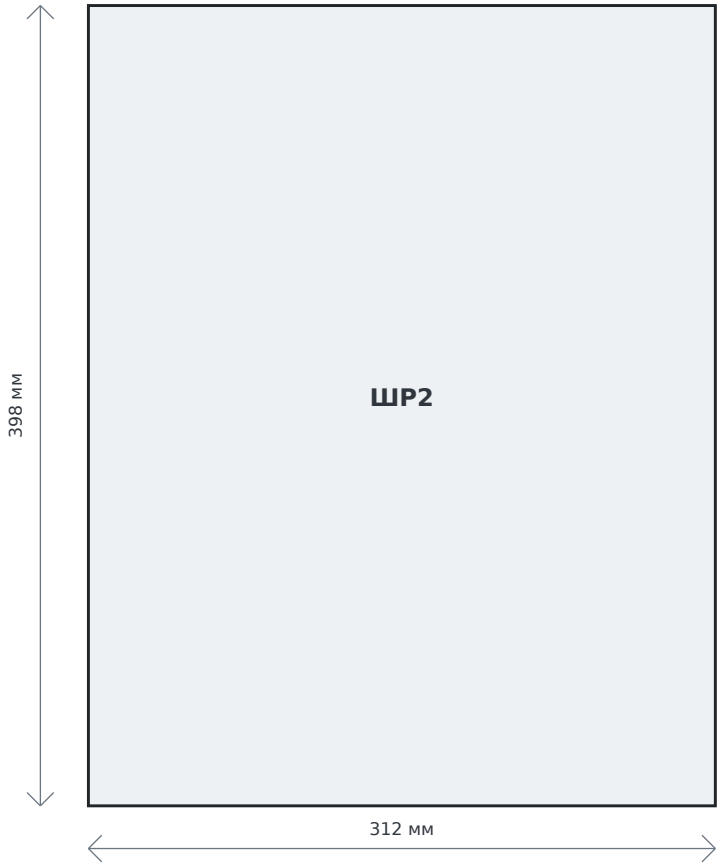


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

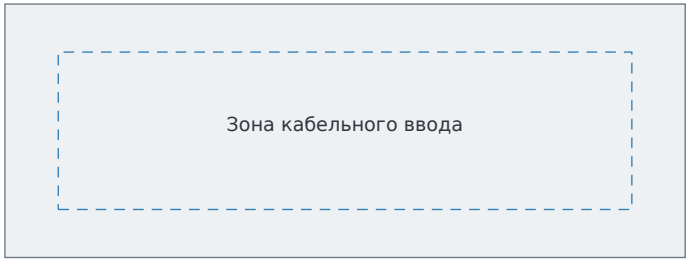


Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-05 | ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

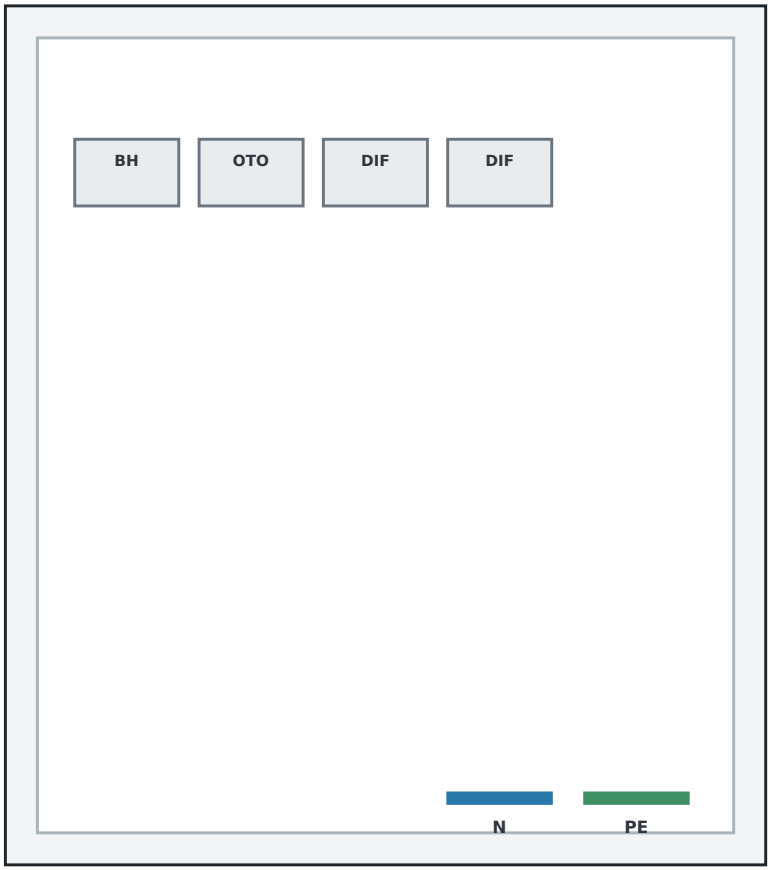

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1	1
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) ×2	3

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-05 | ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15010	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
4	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	2	шт


- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-06 | ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

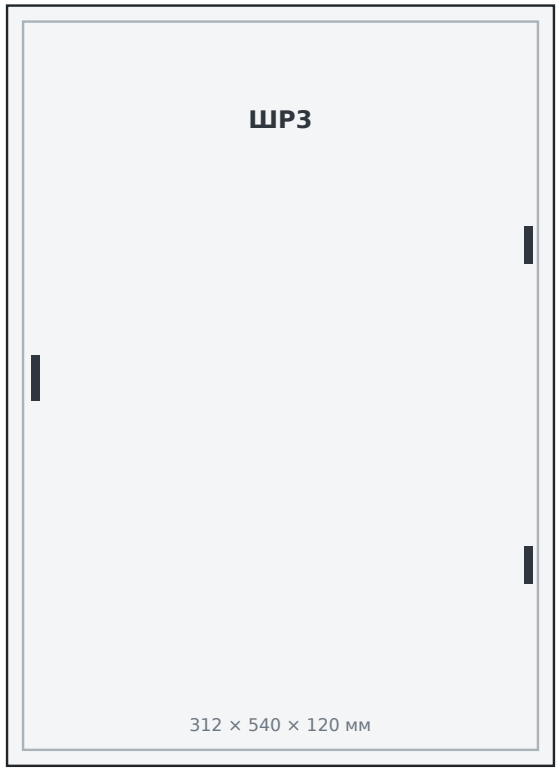

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-06 | ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

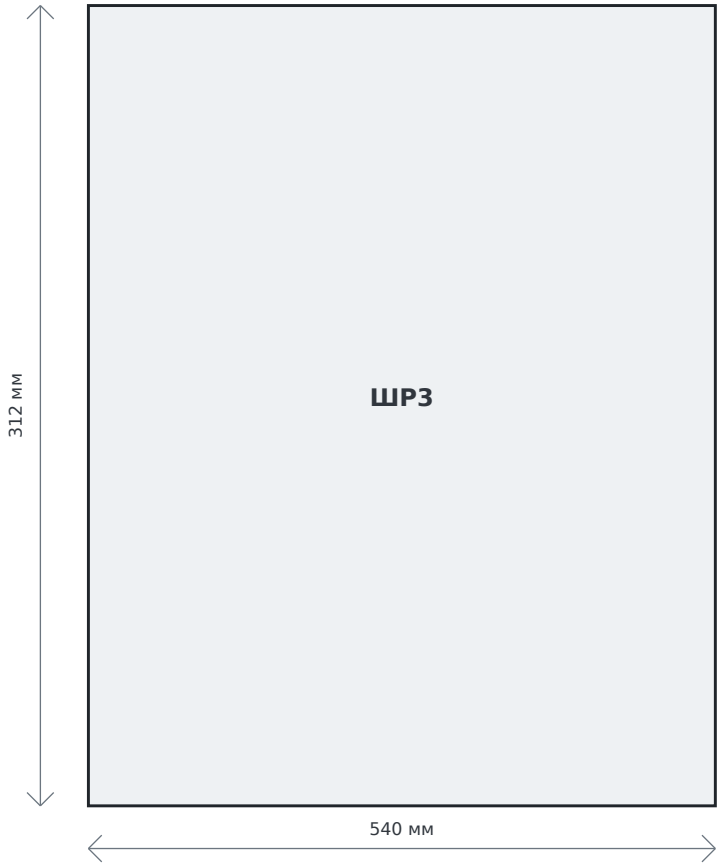


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

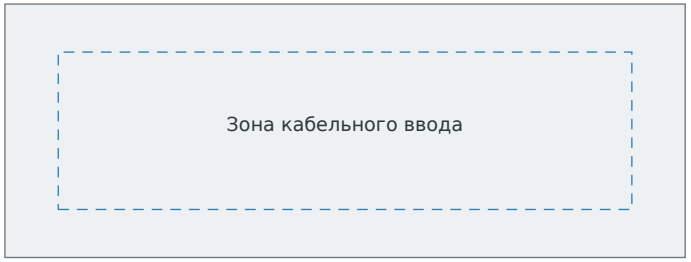


Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-06 | ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

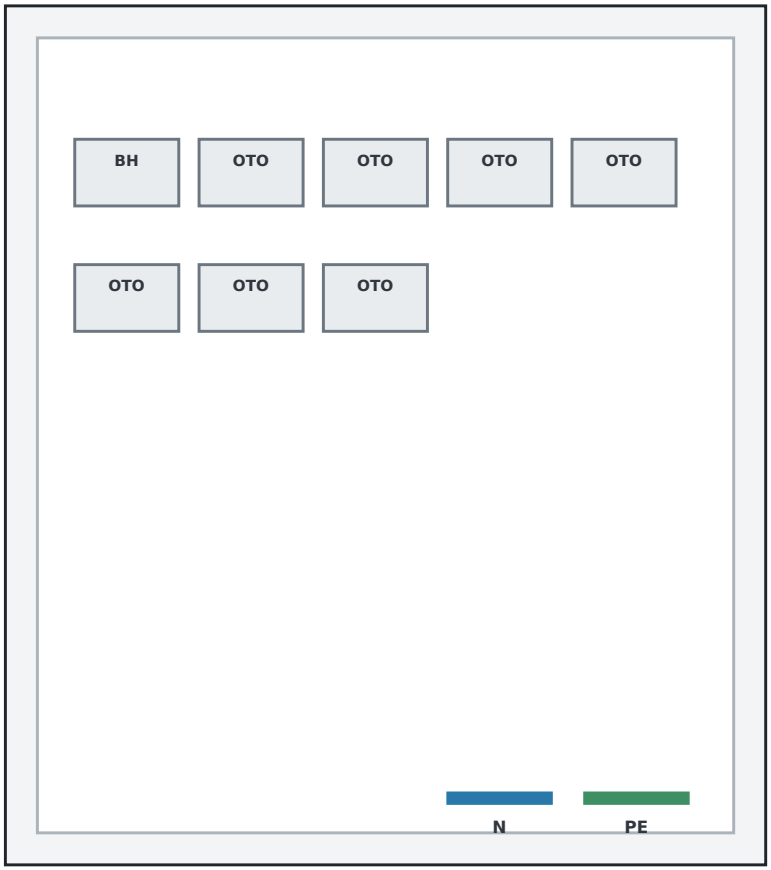

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1	1
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C (R) ×2; Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R) ×2; Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA x-ка C (R) ×1	5
Резерв	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R) ×2	2

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-06 | ШРЗ (ЩРн-24з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	193185	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	2	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	296829	CHINT	2	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	296830	CHINT	1	шт
6	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	2	шт


• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-07 | ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

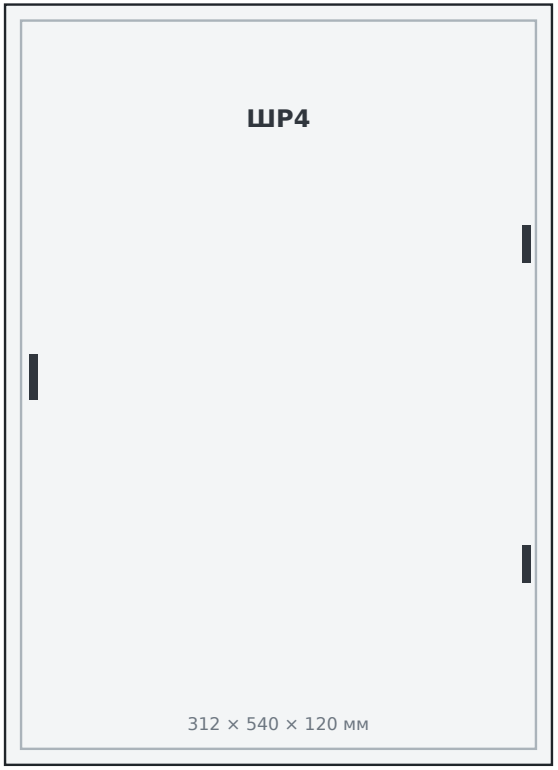

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-07 | ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS




СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

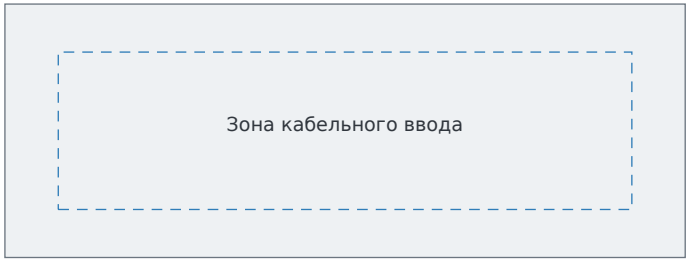

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-07 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-07 | ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

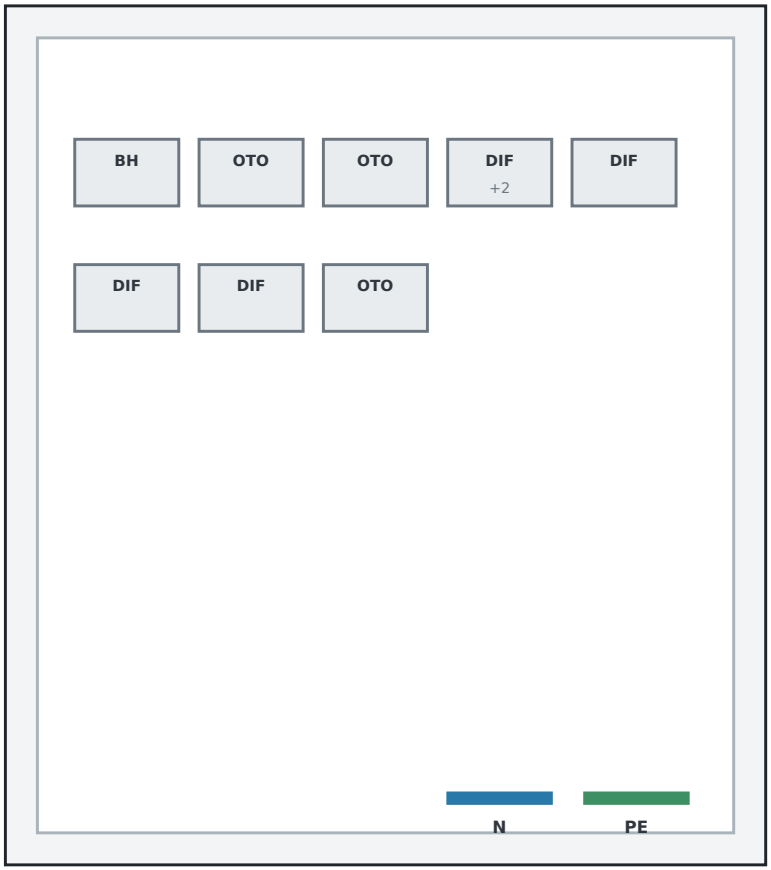

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1	1
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) ×3; Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) ×1	6
Резерв	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1	1

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-07 | ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
6	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	3	шт
7	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	539848	CHINT	1	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-08 | ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-08 | ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

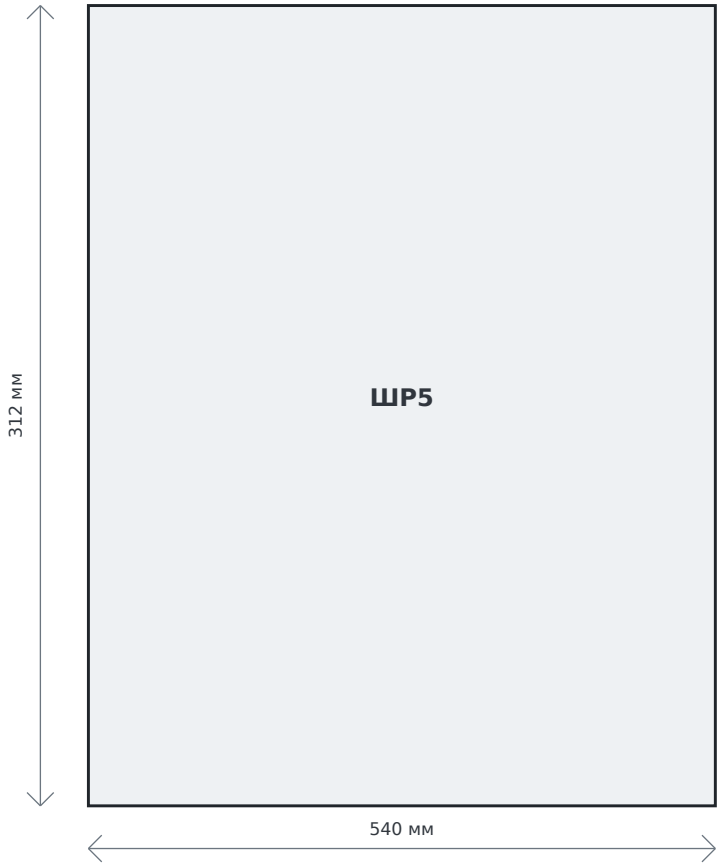


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

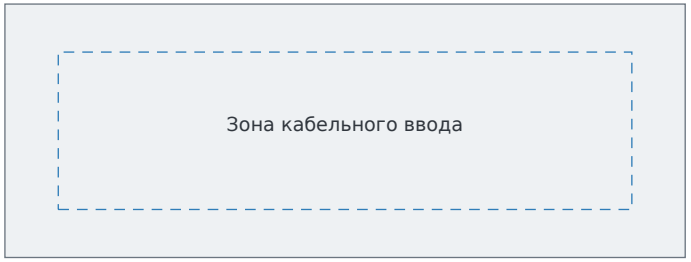


Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-08 | ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

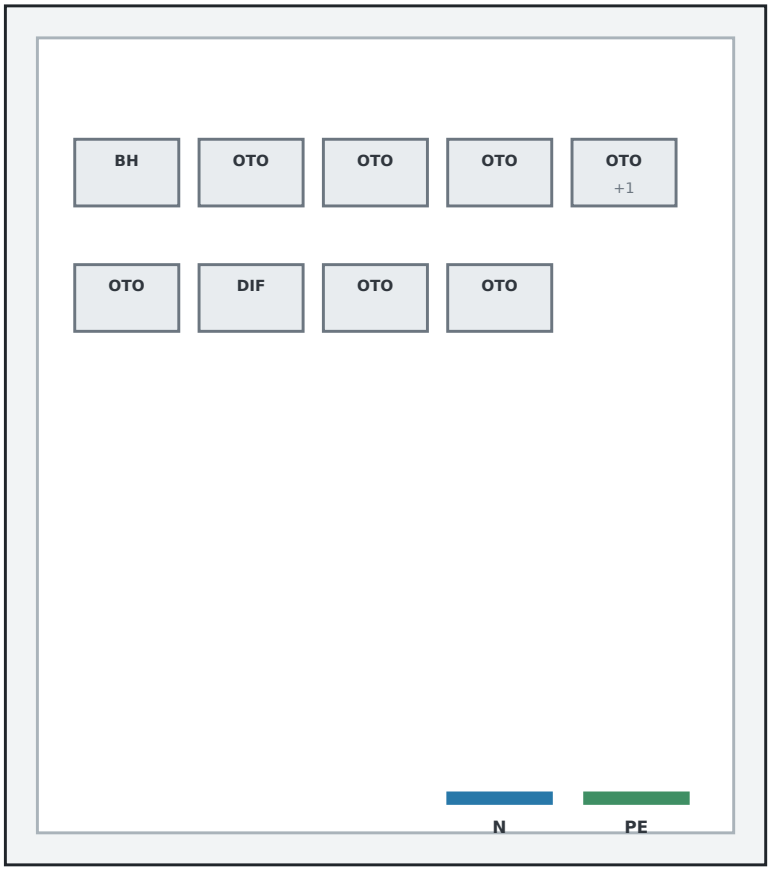

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1	1
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×3; Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Авт. выкл. NXB-63S 1P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) ×1	6
Резерв	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×2	2

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-08 | ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	3	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	2	шт
6	Авт. выкл. NXB-63S 1P 32A 4.5kA х-ка C (R)	296713	CHINT	1	шт
7	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	1	шт


- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-09 | ШРб-1 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

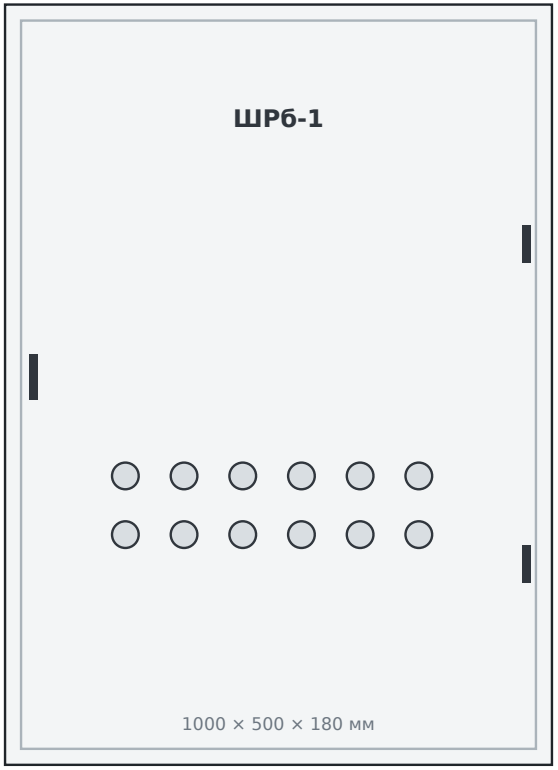

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШРб-1 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	Met. Щит Щит ЩРв инд (1000x500x180mm) S/A IP31 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	1000 × 500 × 180 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-09 | ШРб-1 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

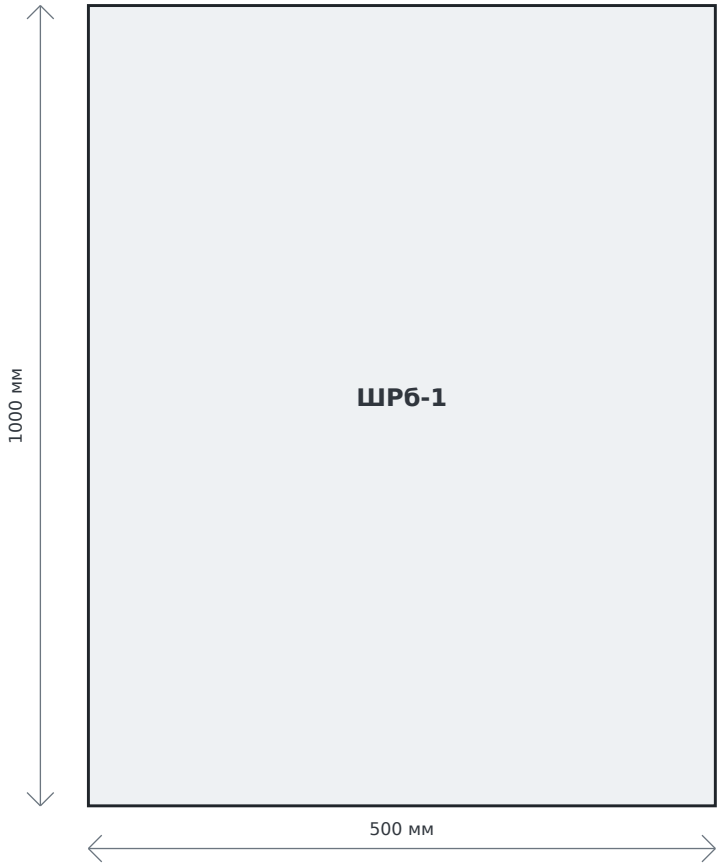


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

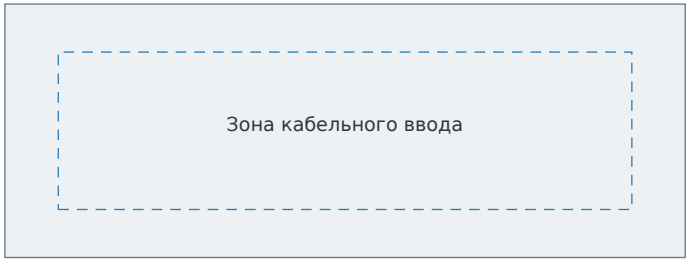

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-09 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-09 | ШРб-1 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

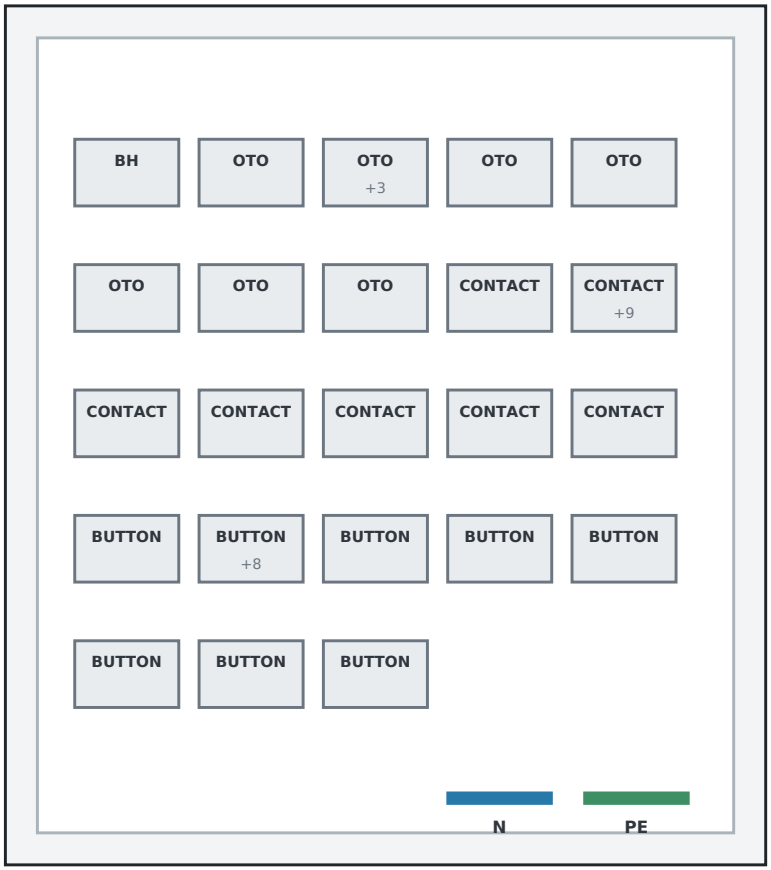

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1	1
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×5; Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1	6
Резерв	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1	1
Управление	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B 50Гц (R) ×11; Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4HO AC220/230B 50Гц (R) ×1; Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144) ×10; Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144) ×2	24

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-09 | ШРб-1 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Met. Щит Щит ЩРв инд (1000x500x180mm) S/A IP31	713-15050	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	5	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
6	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230В 50Гц (R)	256054	CHINT	11	шт
7	Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4HO AC220/230В 50Гц (R)	256089	CHINT	1	шт
8	Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144)	130200085	EKT	10	шт
9	Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144)	130200085	EKT	2	шт


- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-10 | ШРб-2 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

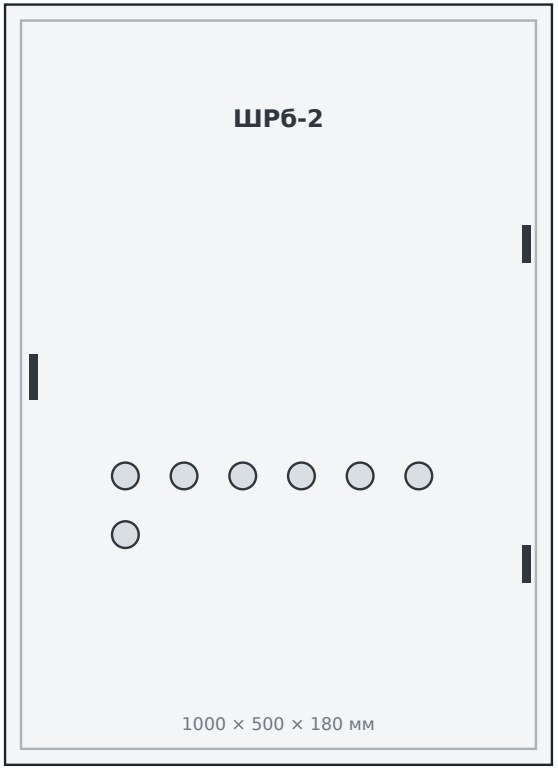

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШРб-2 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	Met. Щит Щит ЩРв инд (1000x500x180mm) S/A IP31 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	1000 × 500 × 180 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-10 | ШРб-2 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

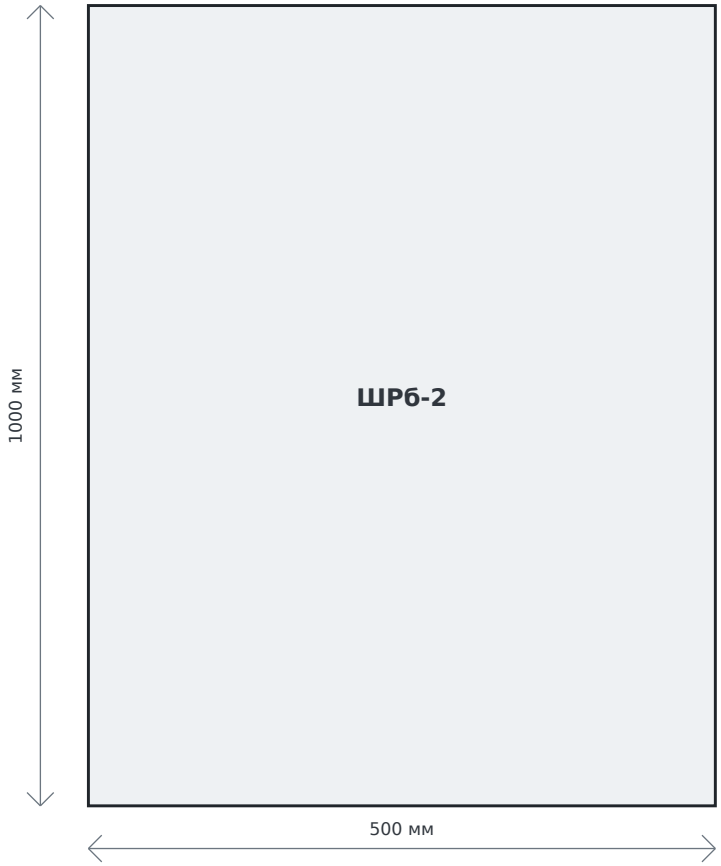


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

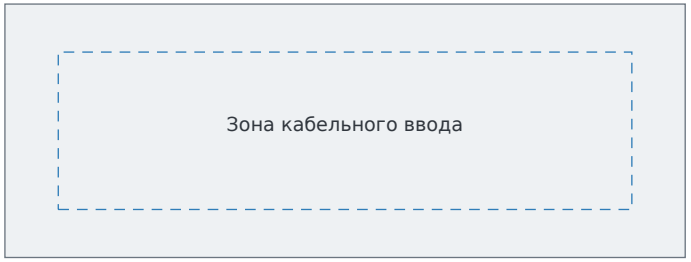

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-10 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-10 | ШРб-2 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

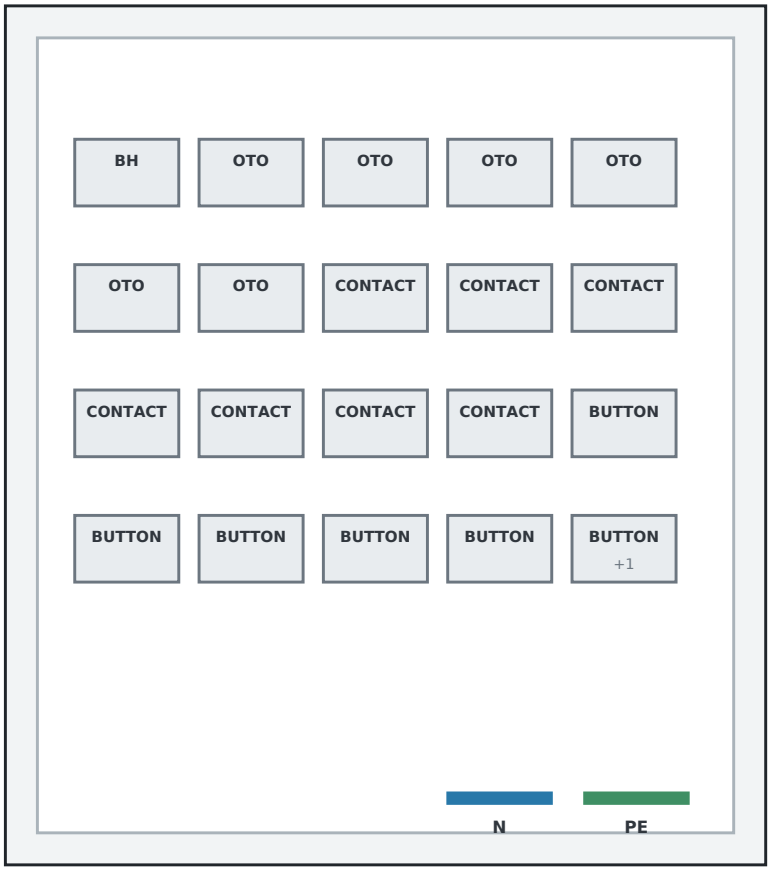

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1	1
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×3; Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1	4
Резерв	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×2	2
Управление	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B 50Гц (R) ×6; Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4HO AC220/230B 50Гц (R) ×1; Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144) ×7	14

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-10 | ШРб-2 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Met. Щит Щит ЩРв инд (1000x500x180mm) S/A IP31	713-15050	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	3	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	2	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
6	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230В 50Гц (R)	256054	CHINT	6	шт
7	Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4HO AC220/230В 50Гц (R)	256089	CHINT	1	шт
8	Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144)	130200085	EKT	7	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____


Проект: 261006 | Щит: P-10 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-11 | Щс (ЩРн-12з-1 36)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

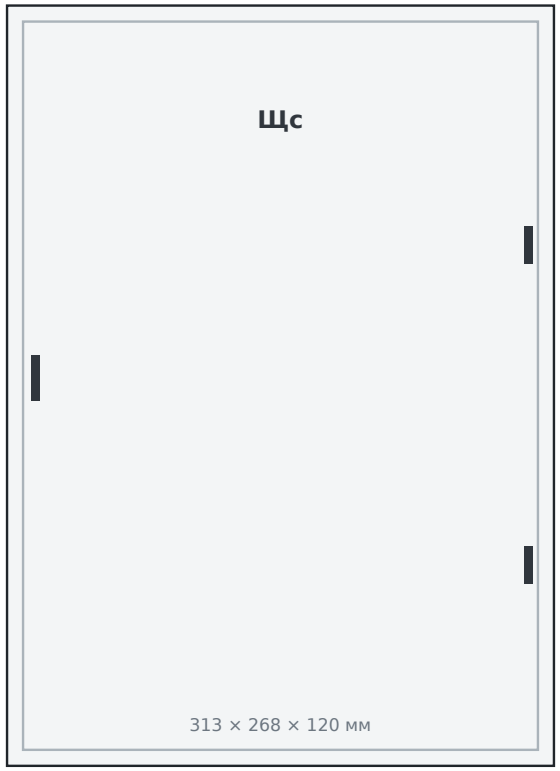

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	Щс (ЩРн-12з-1 36)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	313 × 268 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-11 | Щс (ЩРн-12з-1 36)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

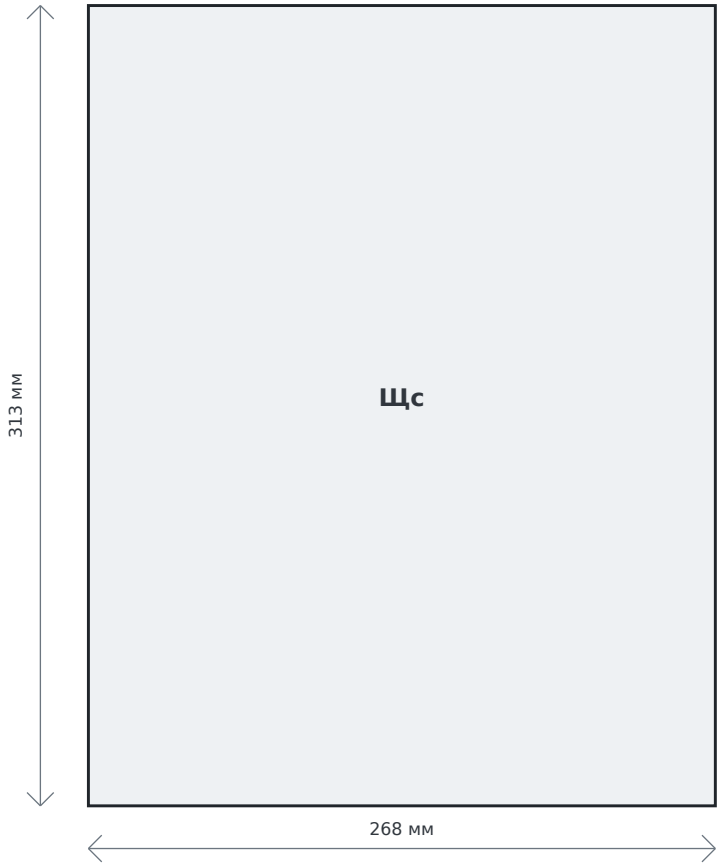


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

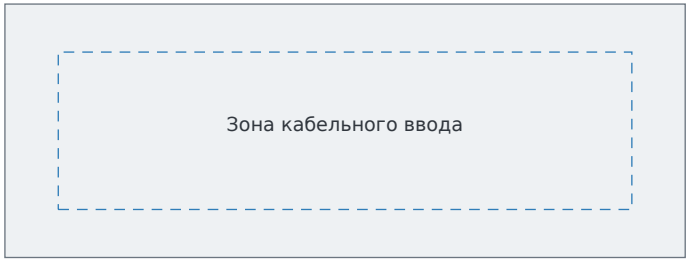

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-11 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-11 | Щс (ЩРн-12з-1 36)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

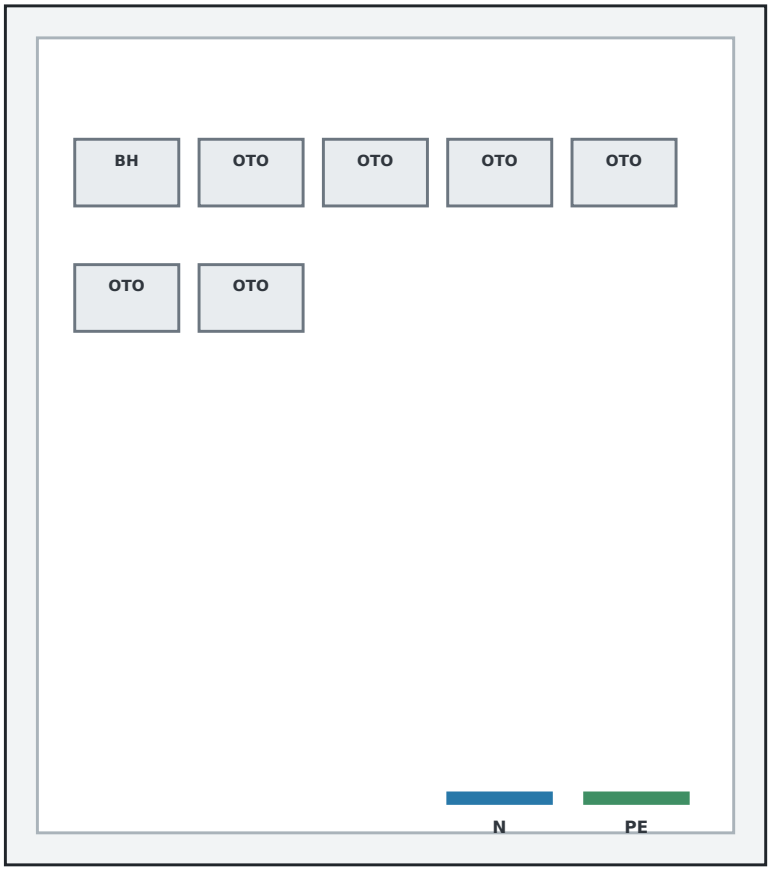

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1	1
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×6	6

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-11 | Щс (ЩРн-12з-1 36)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15005	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	6	шт


- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-12 | ЩО-1 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

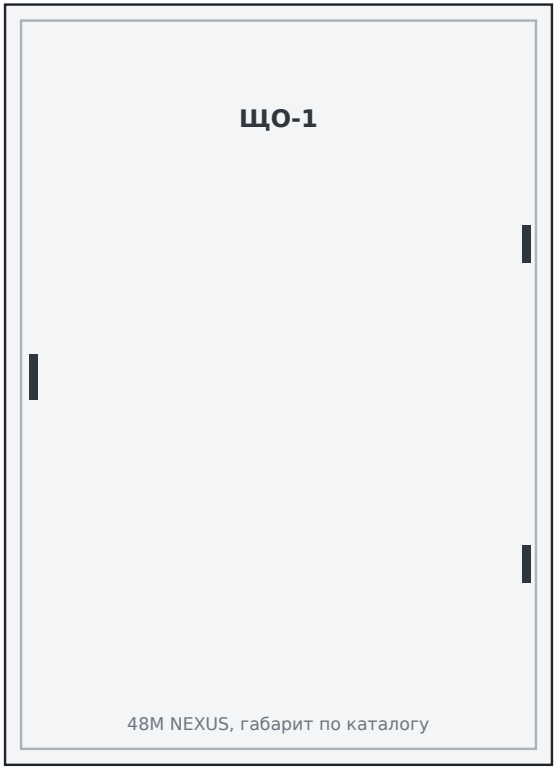

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЩО-1 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	48M NEXUS, габарит по каталогу
Защита	IP30
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-12 | ЩО-1 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

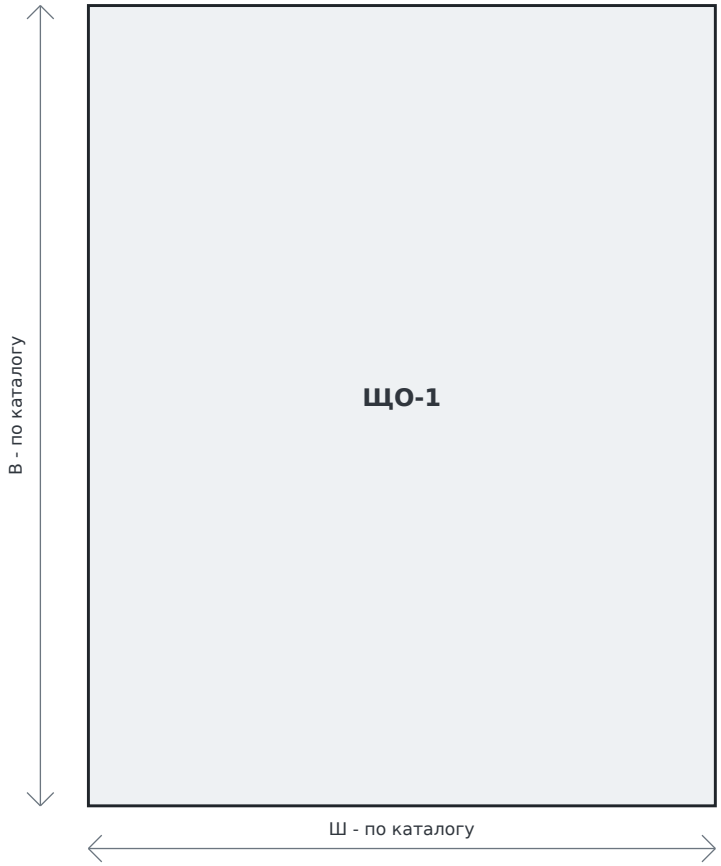


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

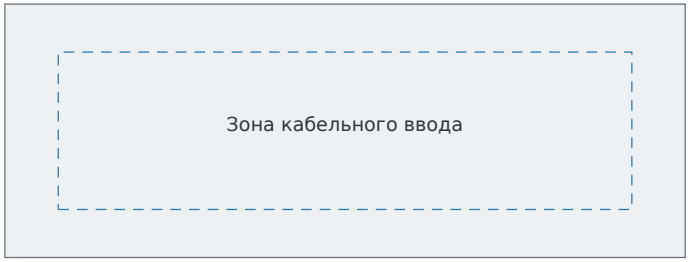

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-12 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-12 | ЩО-1 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

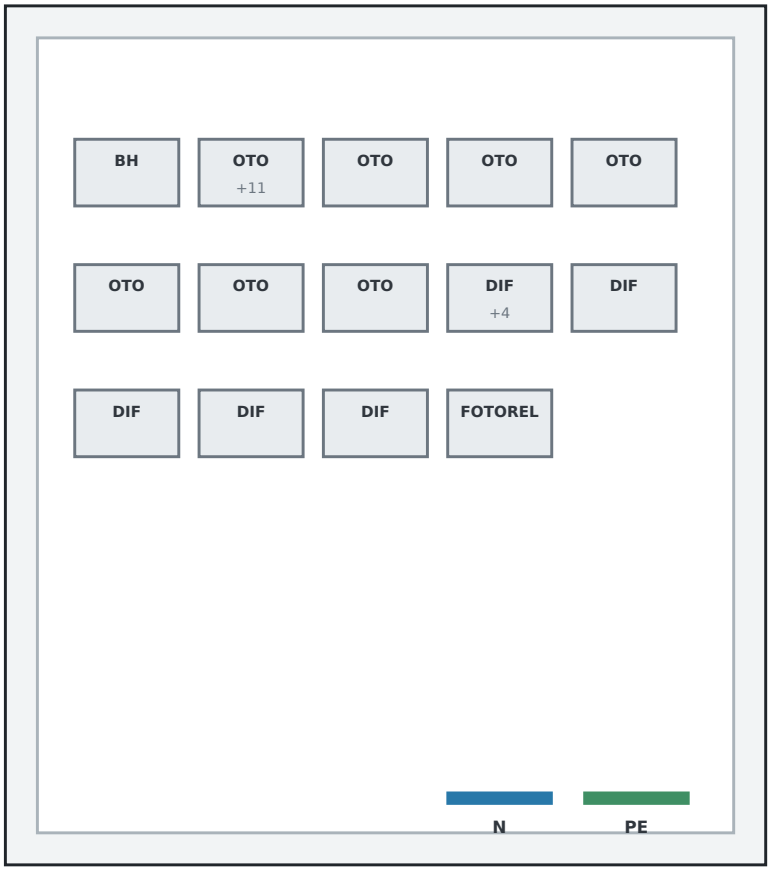

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1	1
Распределение	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25A 3000Вт EKF ×1; Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×12; Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) ×5	19

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-12 | ЩО-1 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1	711-03016	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF	fr-din-1-25	EKF	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	12	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
6	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	5	шт


• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-13 | ЩО-2 (КМПб 4/28)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

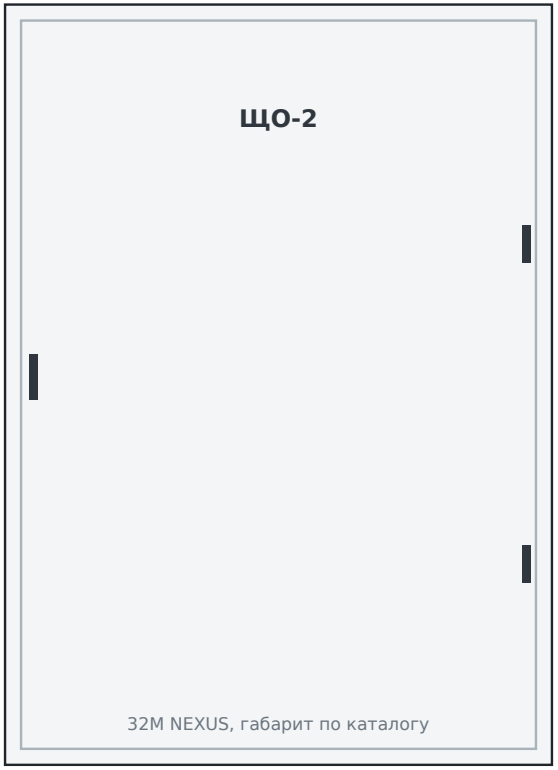

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЩО-2 (КМПб 4/28)
Корпус / монтаж	DX10-A32SWB V10 32 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	32M NEXUS, габарит по каталогу
Защита	IP30
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-13 | ЩО-2 (КМПб 4/28)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

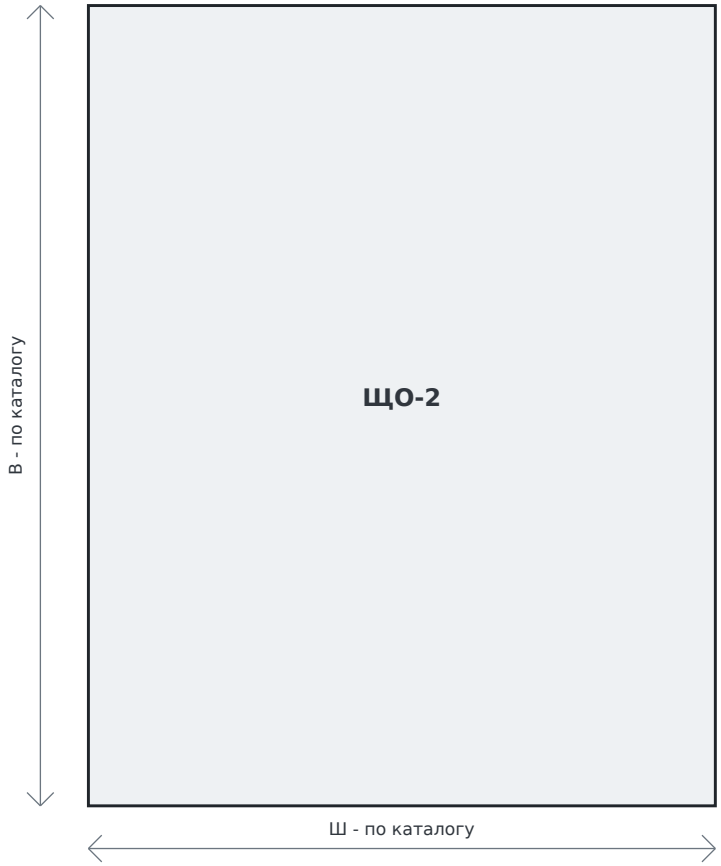


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

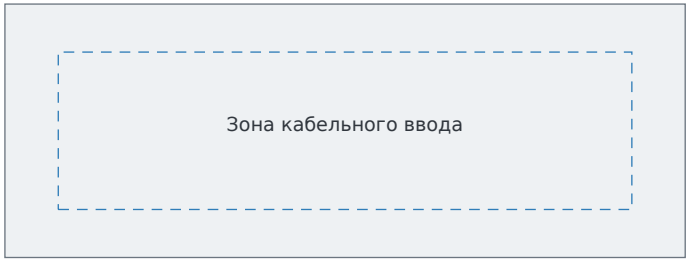

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-13 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-13 | ЩО-2 (КМПб 4/28)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

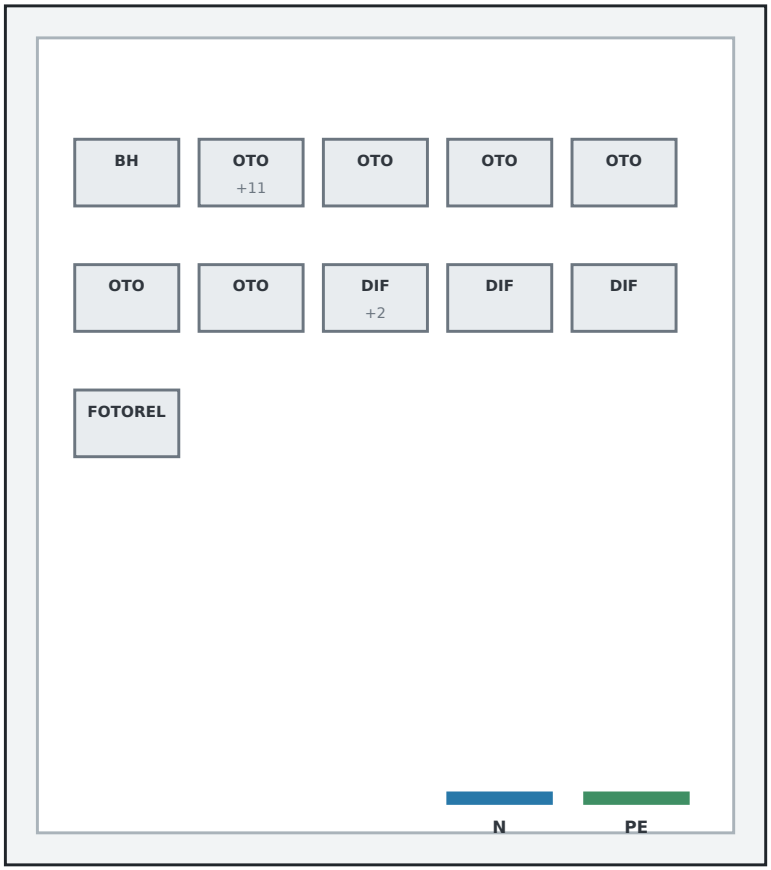

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1	1
Распределение	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25A 3000Вт EKF ×1; Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×12; Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) ×3	16

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-13 | ЩО-2 (КМПб 4/28)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	DX10-A32SWB V10 32 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	711-03014	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
3	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25A 3000Вт EKF	fr-din-1-25	EKF	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	12	шт
5	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	3	шт


- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-14 | ЩО-3 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

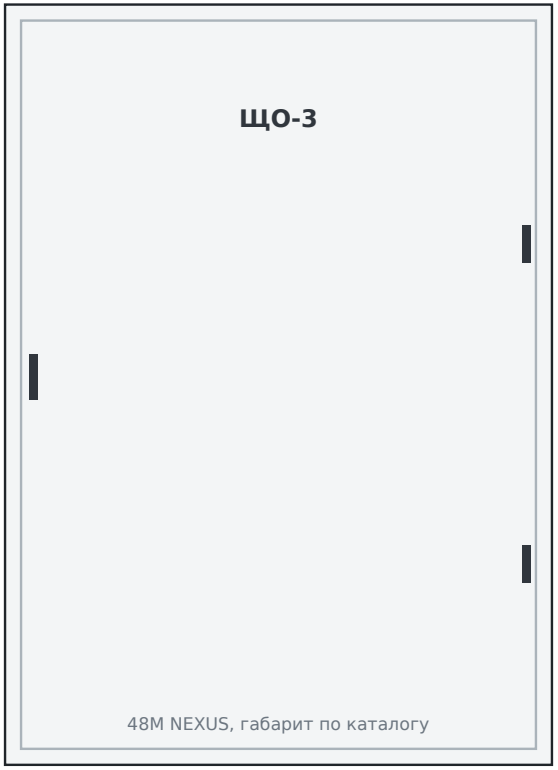

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЩО-3 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	48M NEXUS, габарит по каталогу
Защита	IP30
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-14 | ЩО-3 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

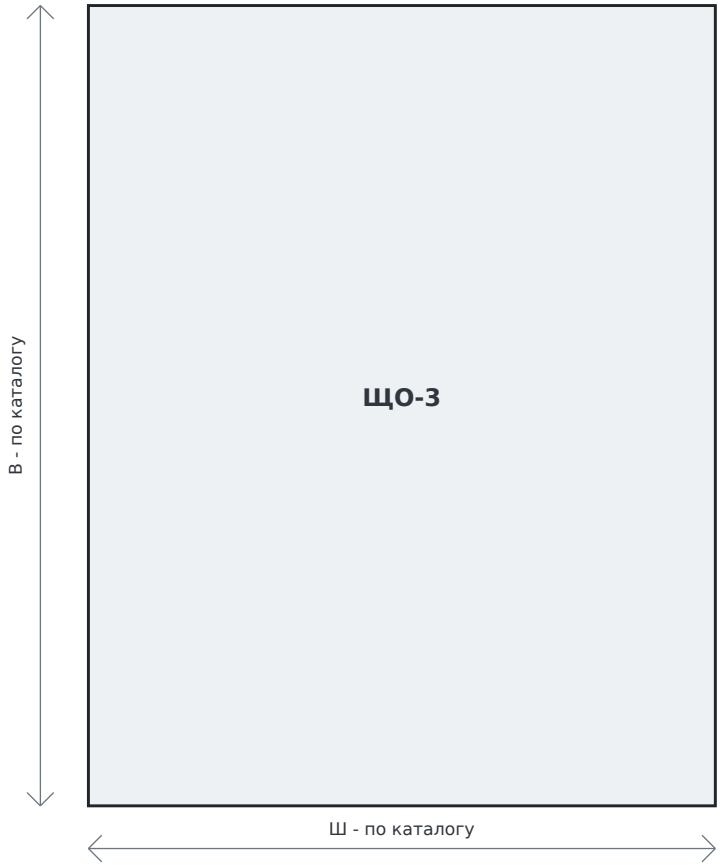


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

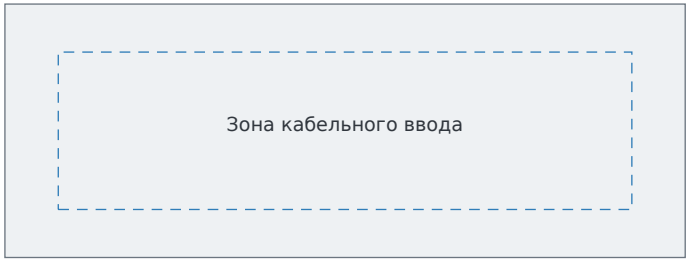

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-14 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-14 | ЩО-3 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

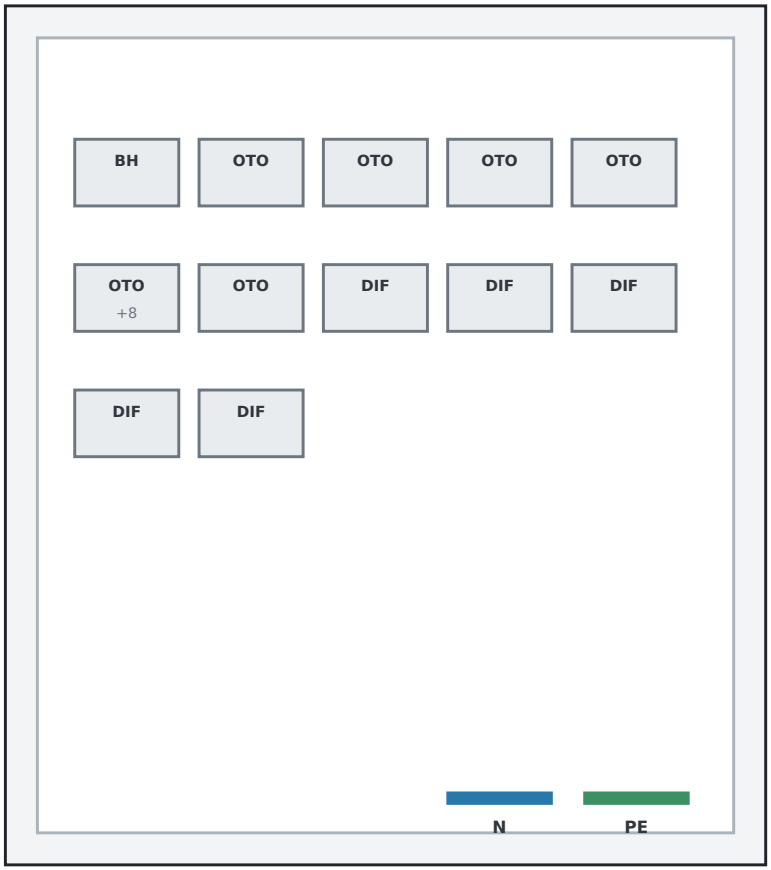

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1	1
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×13; Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) ×5	18

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-14 | ЩО-3 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1	711-03016	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	13	шт
4	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	5	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-14 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-15 | ЩО-4 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

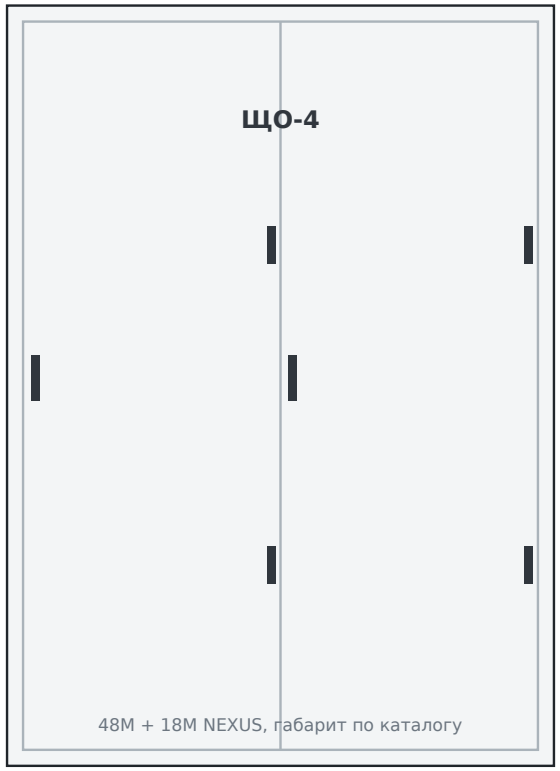

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЩО-4 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 ×1; DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	48M + 18M NEXUS, габарит по каталогу
Защита	IP30
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-15 | ЩО-4 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

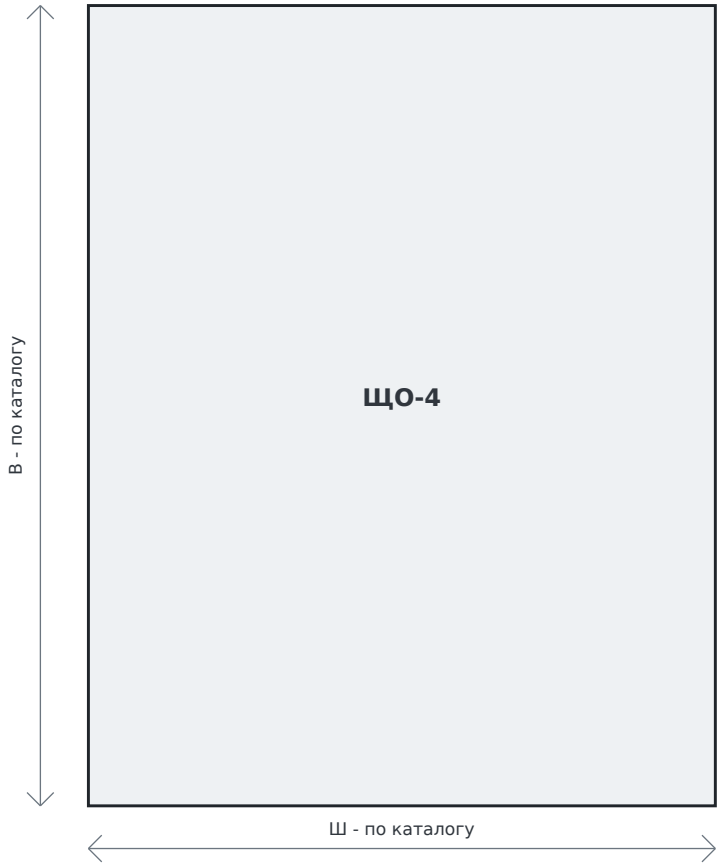


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

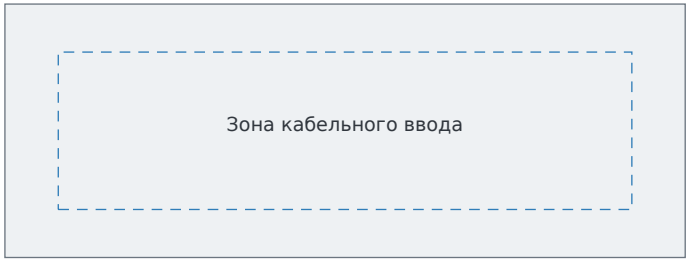


Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-15 | ЩО-4 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

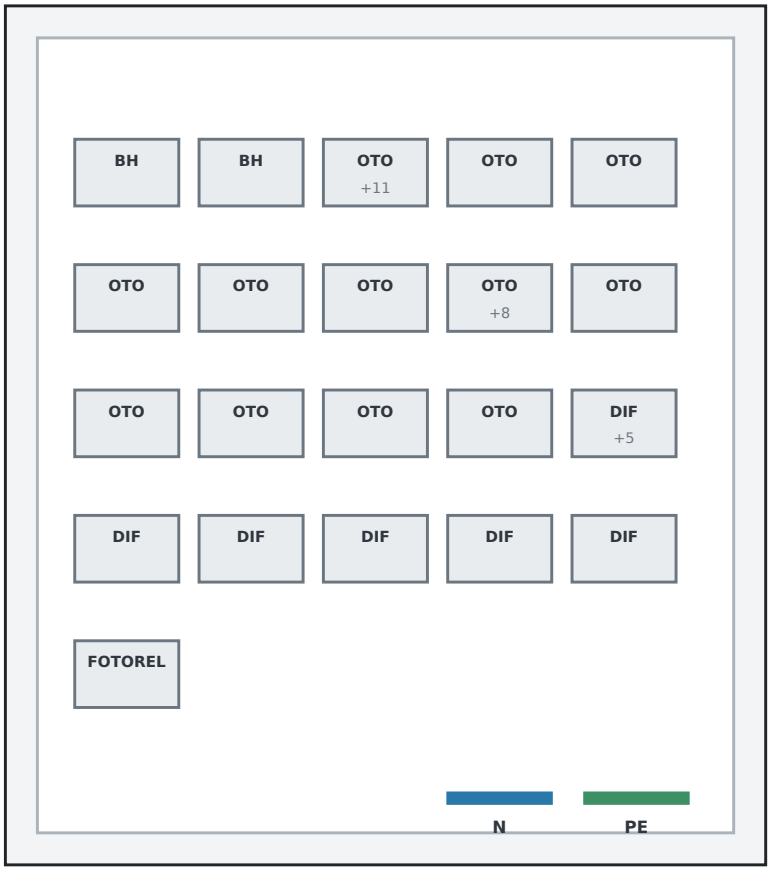

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1	2
Распределение	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×12; Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R) ×6; Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×9; Сумеречный выключатель Legrand 0412623 (с выносным датчиком) ×1	28

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-15 | ЩО-4 (КМПб 4/42)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1	711-03016	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	12	шт
4	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	6	шт
5	DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	711-03010	TEKSAN F	1	шт
6	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
7	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	9	шт
8	Сумеречный выключатель Legrand 0412623 (с выносным датчиком)	PYS-004	PYS	1	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-15 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-16 | Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

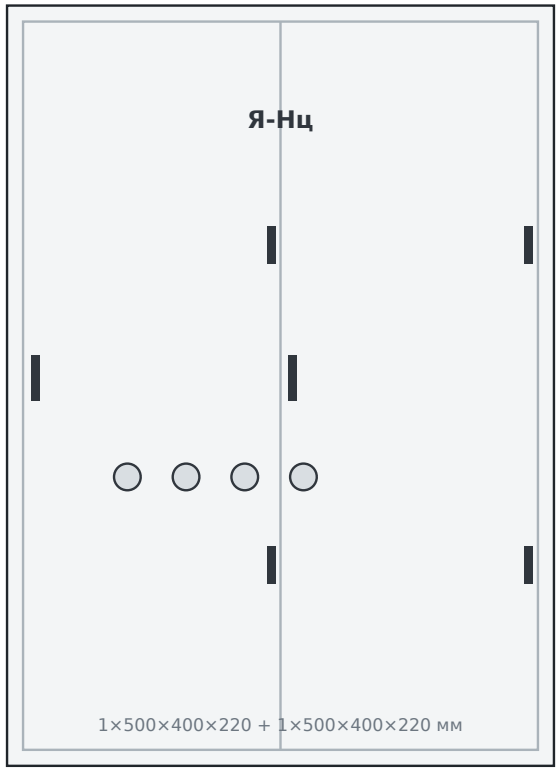

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)
Корпус / монтаж	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 ×1; Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	1×500×400×220 + 1×500×400×220 мм
Защита	IP54
Ввод / сеть	Пускатель NS2-25 1-1.6A (R) ×1; Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-16 | Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

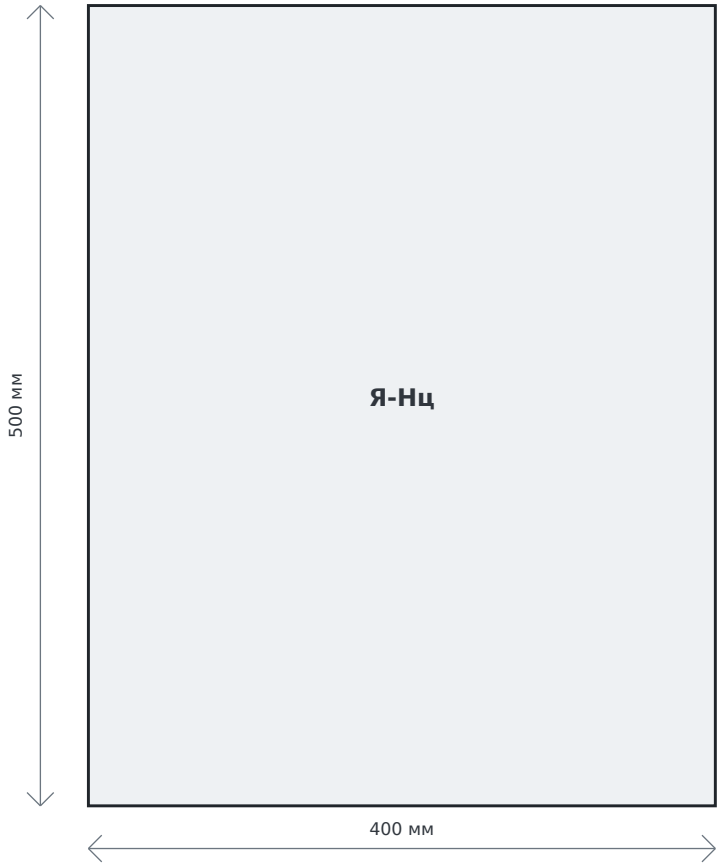


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

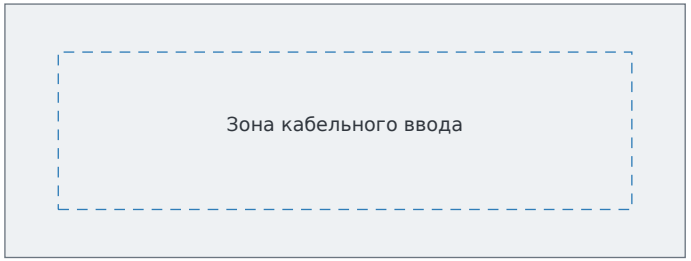

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-16 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-16 | Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

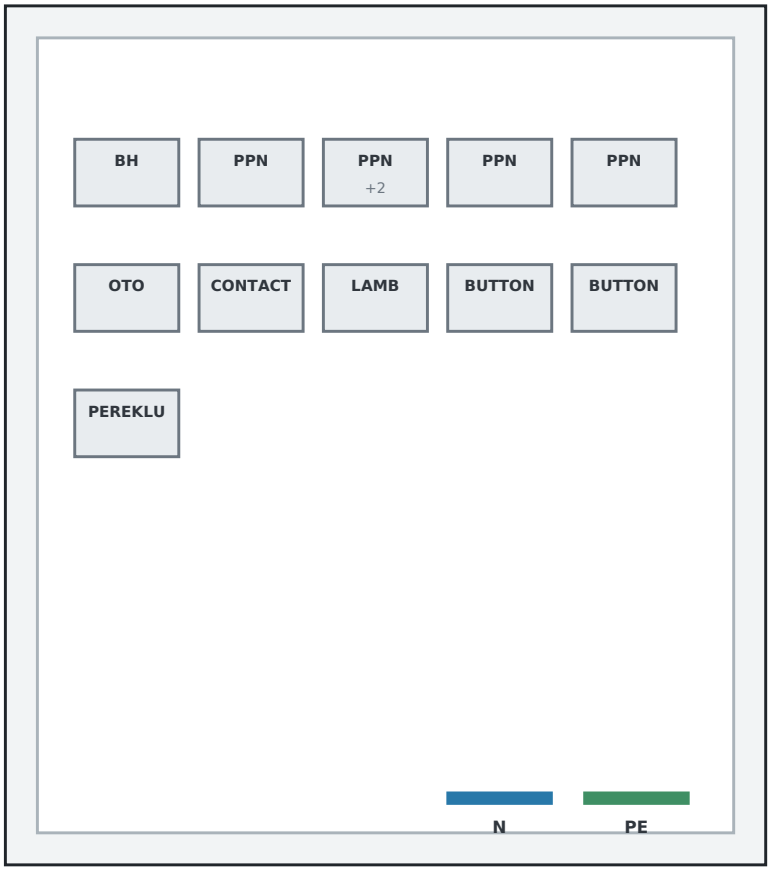

Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Пускатель NS2-25 1-1.6A (R) ×1; Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1	2
Распределение	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R) ×1; Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10x38 3П (R) ×1; Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 25A 10x38 ×3	5
Управление	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×1; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) ×1; Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) ×1; Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) ×1	4

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-16 | Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	719-15425	TEKSAN F	1	шт
2	Пускатель NS2-25 1-1.6A (R)	495077	CHINT	1	шт
3	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	836704	CHINT	1	шт
4	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	574849	CHINT	1	шт
5	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	593075	CHINT	1	шт
6	Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R)	667113	CHINT	1	шт
7	Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R)	667114	CHINT	1	шт
8	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	719-15425	TEKSAN F	1	шт
9	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
10	Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10x38 3П (R)	520488	CHINT	1	шт
11	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 25A 10x38	520259	CHINT	3	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-16 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-17 | Яз1 (Я5411-3074)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

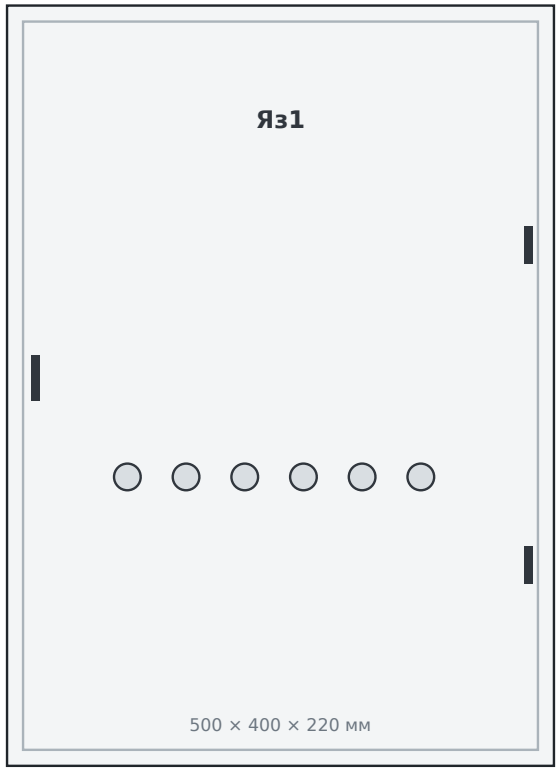

Фасад / пропорции корпуса

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	Яз1 (Я5411-3074)
Корпус / монтаж	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	500 × 400 × 220 мм
Защита	IP54
Ввод / сеть	Пускатель NS2-25 6-10A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____


Проект: 261006 | Щит: P-17 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-17 | Яз1 (Я5411-3074)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / NTS

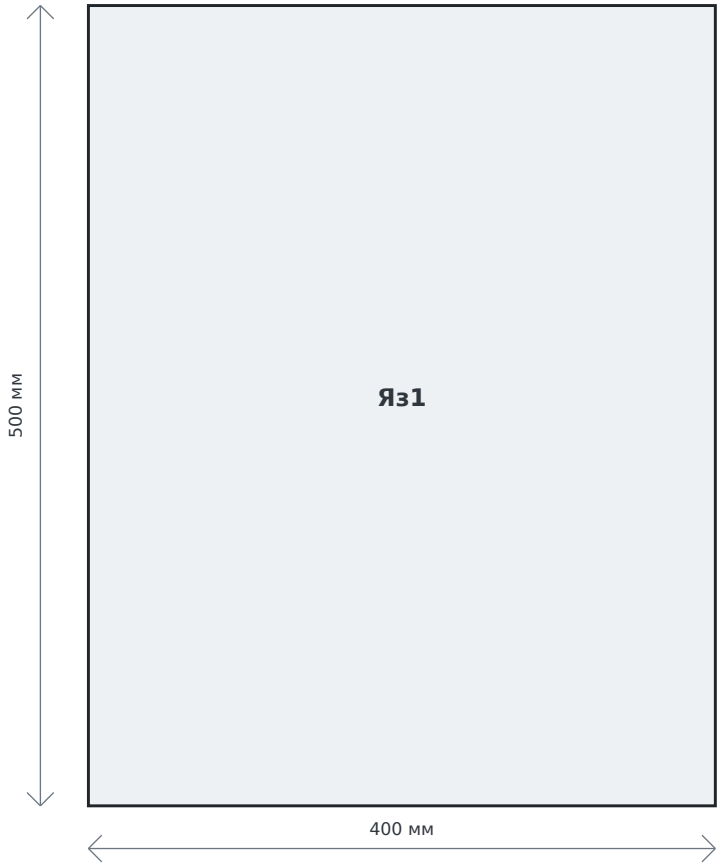


СБОКУ / NTS



СВЕРХУ / NTS



СНИЗУ / ВВОД / NTS

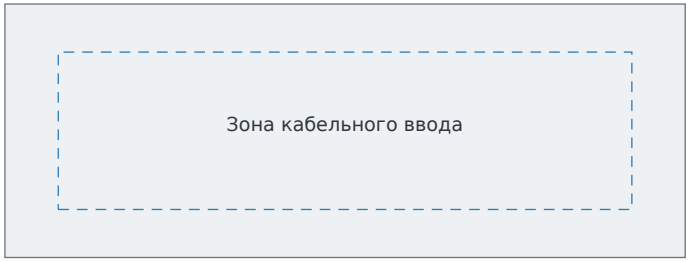

Единицы: мм. Для корпусов с каталожными размерами проверить фактический габарит по паспорту изделия до сверления. Петли справа, отдельный замок слева; одиночная дверь открывается вправо.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-17 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

P-17 | Яз1 (Я5411-3074)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Условная компоновка / NTS

Зона	Оборудование / установка	Кол.
Ввод	Пускатель NS2-25 6-10A (R) ×1	1
Распределение	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R) ×2	2
Управление	Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R) ×1; Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R) ×1; Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R) ×1; Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×1; Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×1; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1; Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R) ×2; Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R) ×1	10

• Компоновка условная: окончательные координаты назначить после проверки фактических габаритов аппаратов и монтажной панели.

• Счётчики - верхняя зона; трансформаторы тока - ниже счётчиков; затем вводные аппараты и распределение, если предусмотрены BOM.

• N и PE не объединять. Клеммы, сечения, маркировку и перемычки выполнять по утверждённой рабочей схеме.

• Цель резерва: не менее 20% доступного DIN/монтажного пространства, где конструктивно применимо.

• Дверные органы устанавливать только по BOM. На стык дверей устройства не устанавливать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-17 | Яз1 (Я5411-3074)

R1 | 06.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	719-15425	TEKSAN F	1	шт
2	Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R)	256717	CHINT	1	шт
3	Пускатель NS2-25 6-10A (R)	495081	CHINT	1	шт
4	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	836704	CHINT	2	шт
5	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	837108	CHINT	1	шт
6	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	CHINT	1	шт
7	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	CHINT	1	шт
8	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	574849	CHINT	1	шт
9	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	593077	CHINT	1	шт
10	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	593075	CHINT	1	шт
11	Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R)	667113	CHINT	2	шт
12	Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R)	667114	CHINT	1	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-17 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____
