ATYRAU - GULDANA

261006 | Атырау | Guldana

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ - КОМПЛЕКТ ЩИТОВ R4 | ИСПРАВЛЕНИЕ КОМПОНОВКИ И СОСТАВА


№	Щит	Габариты В × Ш × Г	Кол.
1	1ВРУ	1700+100 × 2200 × 450 мм (700 + 800 + 700)	1 компл.
2	ЯАВР	800 × 650 × 250 мм	1 компл.
3	ШРС	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
4	ШР1	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
5	ШР2	398 × 312 × 120 мм	1 компл.
6	ШР3	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
7	ШР4	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
8	ШР5	312 × 540 × 120 мм	1 компл.
9	ШРб-1	1000 × 500 × 180 мм	1 компл.
10	ШРб-2	1000 × 500 × 180 мм	1 компл.
11	Щс	313 × 268 × 120 мм	1 компл.
12	ЩО-1	48M NEXUS, габарит по каталогу	1 компл.
13	ЩО-2	32M NEXUS, габарит по каталогу	1 компл.
14	ЩО-3	48M NEXUS, габарит по каталогу	1 компл.
15	ЩО-4	48M NEXUS, габарит по каталогу	1 компл.
16	ЩОА-1, ЩОА-2	18M NEXUS, габарит по каталогу	2 компл.
17	Я-Нц	500 × 400 × 220 мм	1 компл.
18	Я1, Я2	500 × 400 × 220 мм	2 компл.
19	Яз1	500 × 400 × 220 мм	1 компл.

R4: 1ВРУ — вводная панель 800 мм (ВРУ1-13-20) в центре, Секция 1 и Секция 2 (ВРУ1М-44-00, 700 мм) по сторонам; аппараты распределены по панелям.
R4: ЩОА-1/ЩОА-2 и Я1/Я2 выделены из ЩО-4 и Я-Нц в отдельные щиты (по 2 компл.); цвета кнопок SB на Я-Нц и Яз1 приведены к BOM.
NEXUS без размеров: условный фасад и состав оборудования; привязки требуют подтверждения изделия.
Пометка КОНТРОЛЬ — позиции, требующие подтверждения по однолинейной схеме до изготовления.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

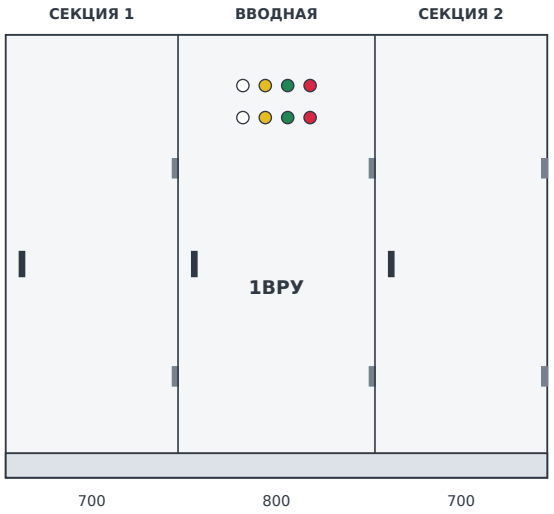

ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

слева направо: Секция 1 — Вводная — Секция 2

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)
Корпус / монтаж	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База ×1; Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31 ×2
Габариты (В × Ш × Г)	1700+100 × 2200 × 450 мм
Защита	IP31, уточнить
Ввод / сеть	Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) ×2
Учёт	Отан САР4У-Э712 ТХ RS2 ОР П Д (3x57,7/100V 5-7,5A) ×2; Трансформатор Т-0,66 200\5 (9) ×3; Трансформатор Т-0,66 150\5 (9) ×3
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

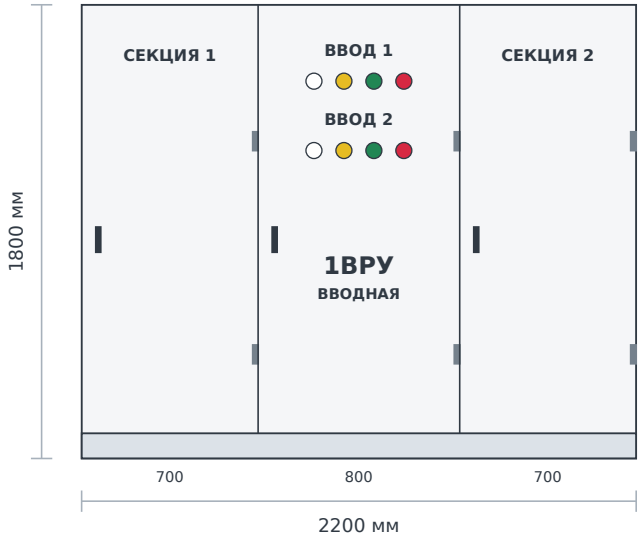

СБОКУ



СВЕРХУ



СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Корпус 1700 + цоколь 100; слева направо: Секция 1 — 700, Вводная — 800, Секция 2 — 700 мм.

Единый масштаб видов: 1:30.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

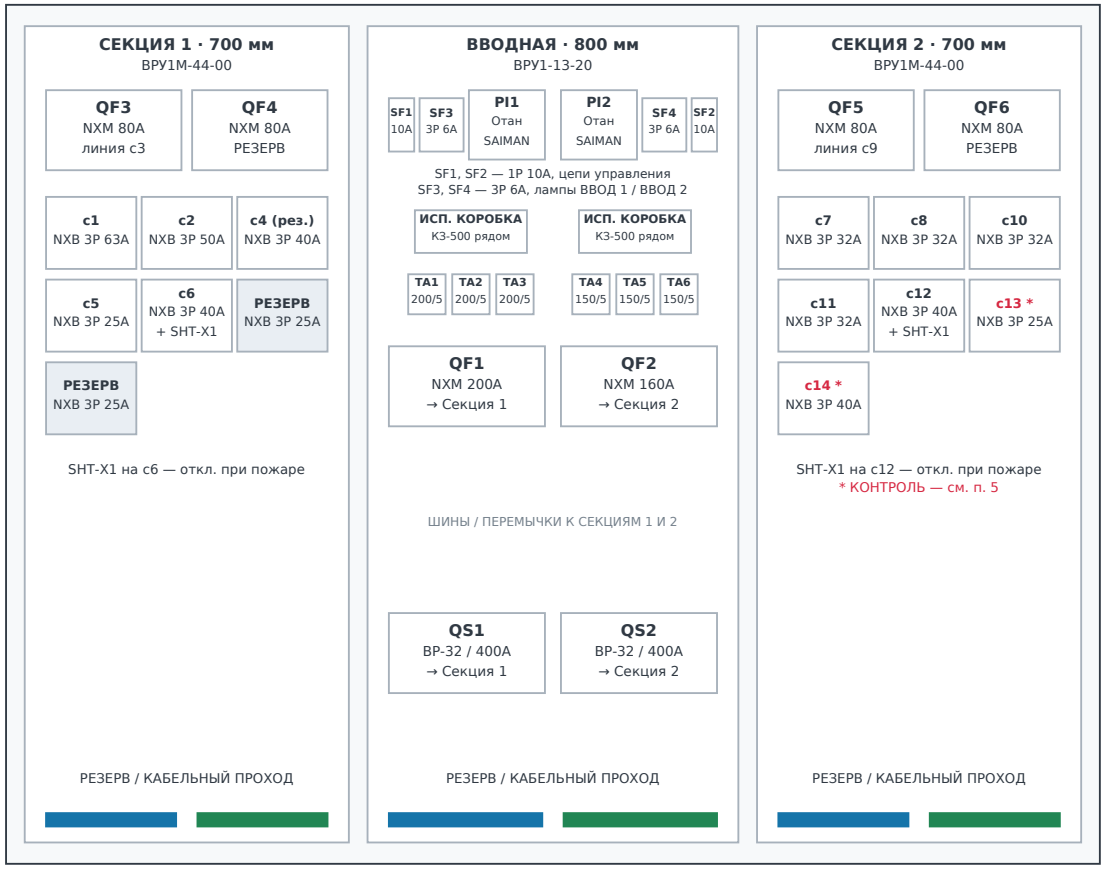


Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

СОСТАВ И РАЗДЕЛЕНИЕ СЕКЦИЙ

1. Порядок слева направо: Секция 1 (ВРУ1М-44-00, 700 мм) — Вводная панель (ВРУ1-13-20, 800 мм) — Секция 2 (ВРУ1М-44-00, 700 мм).
2. Вводная панель (сверху вниз): счётчики PI1 (ТТ 200/5) и PI2 (ТТ 150/5) с SF1–SF4 по бокам → 2 испыт. коробки + 2 КЗ-500 → ТТ TA1–TA6 → QF1 NXM 200A (Секция 1), QF2 NXM 160A (Секция 2) → рубильники QS1/QS2 ВР-32 400A внизу.
3. Секции 1 и 2: по 2 NXM 80A (рабочий + резерв) и по 7 NXB; SHT-X1 на линиях c6 и c12 (отключение при пожаре).
4. 8 ламп — на двери вводной панели: ВВОД 1 и ВВОД 2 — белая, жёлтая, зелёная, красная.
5. КОНТРОЛЬ: линии c13 (3P 25A) и c14 (3P 40A) отнесены к Секции 2 по нумерации групп; подтвердить по однолинейной схеме до сборки.
6. Межпанельные шинные перемычки, габариты аппаратов, каналов и резерв подтвердить по монтажным чертежам.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены. Размещение по панелям. Часть 1/2.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ — ВРУ1-13-20, 800 мм (в центре)				
1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	719-15043	TEKSAN F	1	шт
2	Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6) — QS1, QS2	270100161_	PYS	2	шт
3	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) — QF1, питание Секции 1	131367	CHINT	1	шт
4	Авт. выкл. NXM-160S/3P 160A 36кА (R) — QF2, питание Секции 2	131364	CHINT	1	шт
5	Отан САР4У-Э712 ТХ RS2 ОР П Д (3x57,7/100V 5-7,5A) — PI1, PI2	KR	SAIMAN	2	шт
6	Трансформатор Т-0,66 200\5 (9) — ТА1–ТА3 (PI1)	989-101-0134	TEKSAN F	3	шт
7	Трансформатор Т-0,66 150\5 (9) — ТА4–ТА6 (PI2)	989-101-0123	TEKSAN F	3	шт
8	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) — SF1, SF2 цепи управления	296709	CHINT	2	шт
9	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R) — SF3, SF4 сигнальные лампы	296825	CHINT	2	шт
10	Конденсатор КЗ-500 0,5 мкФ (помехоподавляющий, узел учета)	PYS-003	PYS	2	шт
11	Клеммная коробка для счетчиков (испытательная)	989-100-1757	TEKSAN F	2	шт
12	Индикатор ND16-22D/2 белый AC/DC230В (R) — дверь, ВВОД 1/2	593073	CHINT	2	шт
13	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) — дверь, ВВОД 1/2	593076	CHINT	2	шт
14	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) — дверь, ВВОД 1/2	593077	CHINT	2	шт
15	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) — дверь, ВВОД 1/2	593075	CHINT	2	шт

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**Изготовление**	**Монтаж**	**ОТК / качество**
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-01 | 1ВРУ (ВРУ1-13-20 УХЛ4 + 2×ВРУ1М-44-00 УХЛ4)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены. Размещение по панелям. Часть 2/2.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
	СЕКЦИЯ 1 — ВРУ1М-44-00, 700 мм (слева)				
16	Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31	719-15085	TEKSAN F	1	шт
17	Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) — QF3, линия c3	146337	CHINT	1	шт
18	Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) — QF4, резерв	146337	CHINT	1	шт
19	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R) — c1	813877	CHINT	1	шт
20	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R) — c2	813876	CHINT	1	шт
21	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) — c6	813875	CHINT	1	шт
22	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) — c4 резерв	813875	CHINT	1	шт
23	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) — c5	813873	CHINT	1	шт
24	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) — резерв	813873	CHINT	2	шт
25	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) — на c6	814989	CHINT	1	шт
	СЕКЦИЯ 2 — ВРУ1М-44-00, 700 мм (справа)				
26	Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31	719-15085	TEKSAN F	1	шт
27	Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) — QF5, линия c9	146337	CHINT	1	шт
28	Авт. выкл. NXM-160S/3P 80A 36кА (R) — QF6, резерв	146337	CHINT	1	шт
29	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R) — c7, c8, c10, c11	813874	CHINT	4	шт
30	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) — c12	813875	CHINT	1	шт
31	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R) — c13 (КОНТРОЛЬ: секция по схеме)	813873	CHINT	1	шт
32	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R) — c14 (КОНТРОЛЬ: секция по схеме)	813875	CHINT	1	шт
33	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) — на c12	814989	CHINT	1	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____


Проект: 261006 | Щит: P-01 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-02 | ЯАВР (ЯАВР3-40-2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

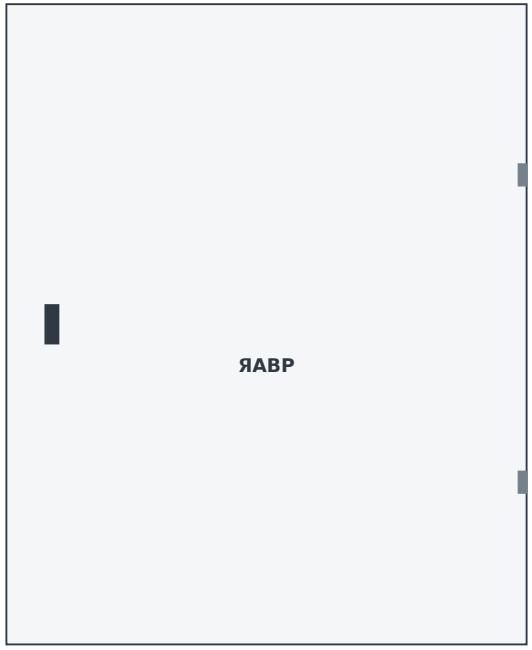

ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЯАВР (ЯАВР3-40-2)
Корпус / монтаж	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	800 × 650 × 250 мм
Защита	IP54
Ввод / сеть	Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R) ×1
Учёт	Дала ТХ П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A) ×1
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-02 | ЯАВР (ЯАВРЗ-40-2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

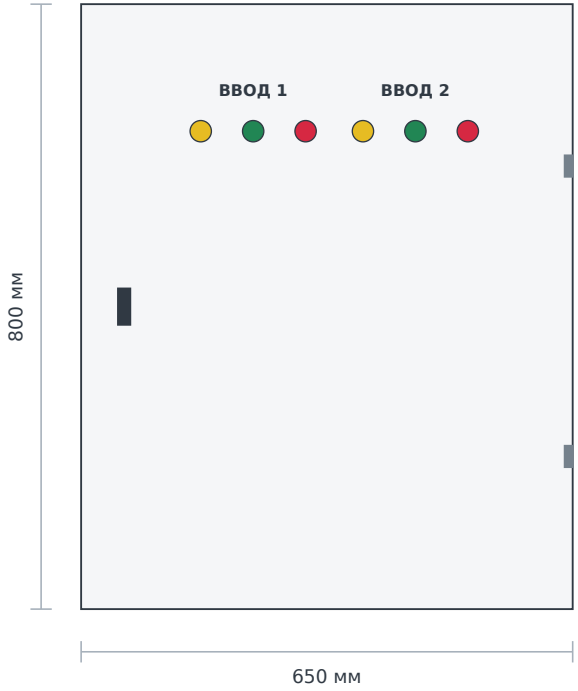


СБОКУ



СВЕРХУ

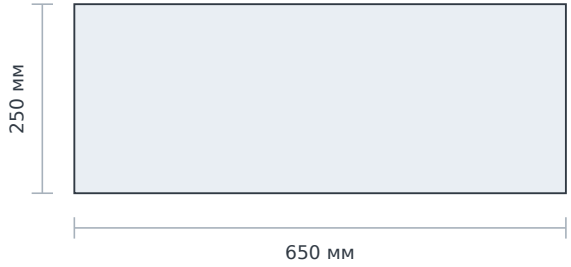

СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:10.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-02 | ЯАВР (ЯАВРЗ-40-2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ



ПРИМЕЧАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ

1. Счётчик сверху, блок АВР ниже; два автомата 3P 6A в нижней зоне.
2. 6 ламп на двери: две группы по жёлтой, зелёной и красной.
3. Экран/лицевой блок АВР на двери — только при предусмотренном заводском выносном исполнении; отдельный прибор в BOM отсутствует.
4. Проходы для проводки и обслуживание оставлены между аппаратами. Размеры аппаратов и резерв требуют монтажной проверки.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-02 | ЯАВР (ЯАВР3-40-2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54	719-15420	TEKSAN F	1	шт
2	Устройство автоматического ввода резерва NXZB-63H/4C 40A D40 (R)	171631	CHINT	1	шт
3	Дала ТХ П СА4-Э720 (3x220/380V 10-100A)	NY	SAIMAN	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	296825	CHINT	2	шт
5	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	593076	CHINT	2	шт
6	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	593077	CHINT	2	шт
7	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	593075	CHINT	2	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-03 | ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	—
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

Уточнение: корпус в комплектации — ShRn-36, 312 × 540 × 120 мм. Проектное имя ЩРн-24 требует сверки с исходной схемой.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-03 | ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ



СБОКУ



СВЕРХУ



СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:8.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-03 | ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ



АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QF — NXB 3P 25A × 3

QF — NXB 3P 16A × 1

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. Корпус 36М — по строке комплектации; обозначение ЩРн-24 в имени исходного щита сохранено как проектное.
2. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
3. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
4. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-03 | ШРС (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	296829	CHINT	2	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	296829	CHINT	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-04 | ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-04 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-04 | ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ



СБОКУ



СВЕРХУ



СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:8.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-04 | ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ



АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QS — NXHB 100A × 1

QF — NXB 3P 40A × 3

QF — NXB 3P 16A × 1

QF — NXB 1P 16A × 1

QD — RCBO 1P+N C16 × 2

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
2. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
3. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-04 | ШР1 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	193185	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	296831	CHINT	2	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	296831	CHINT	1	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
6	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
7	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
8	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	2	шт


• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-05 | ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	398 × 312 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-05 | ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

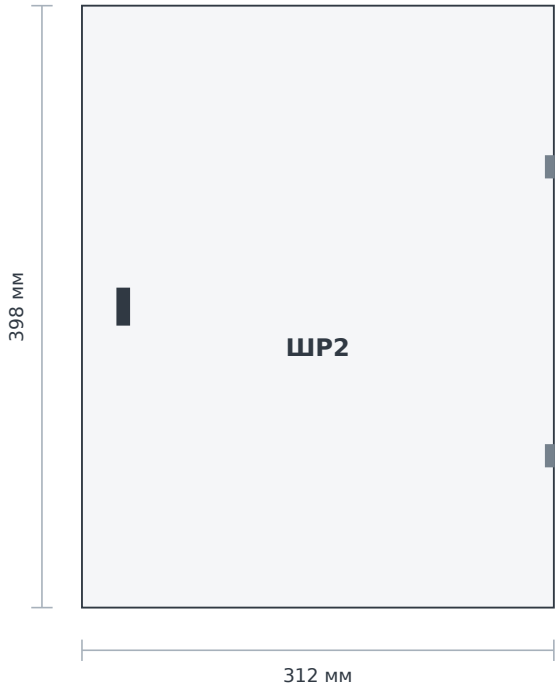


СБОКУ



СВЕРХУ

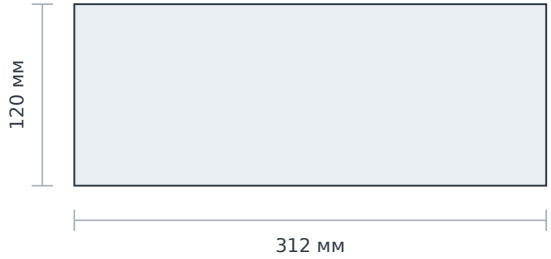

СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:5.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-05 | ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

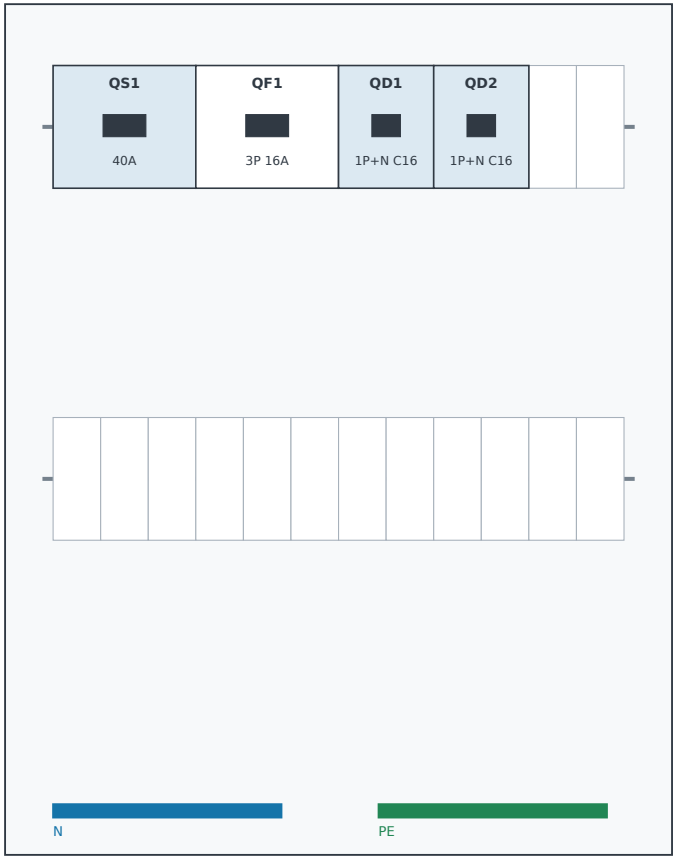

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QS — NXHB 40A × 1

QF — NXB 3P 16A × 1

QD — RCBO 1P+N C16 × 2

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
2. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
3. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-05 | ШР2 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15010	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
4	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	2	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-06 | ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-06 | ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ



СБОКУ



СВЕРХУ



СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:8.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-06 | ШР3 (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ



АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QS — NXHB 100A × 1

QF — NXB 3P 16A × 2

QF — NXB 3P 25A × 2

QF — NXB 3P 32A × 1

QF — NXB 1P 16A × 2

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
2. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
3. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-06 | ШРЗ (ЩРн-24з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	193185	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	2	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	296829	CHINT	2	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	296830	CHINT	1	шт
6	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	2	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-07 | ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-07 | ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ



СБОКУ



СВЕРХУ



СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:8.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-07 | ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ



АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QS — NXHB 40A × 1

QF — NXB 3P 16A × 1

QF — NXB 1P 16A × 2

QD — RCBO 1P+N C16 × 3

QD — RCBO 3P+N C16 × 1

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
2. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
3. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-07 | ШР4 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
6	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	3	шт
7	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	539848	CHINT	1	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-08 | ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	312 × 540 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-08 | ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

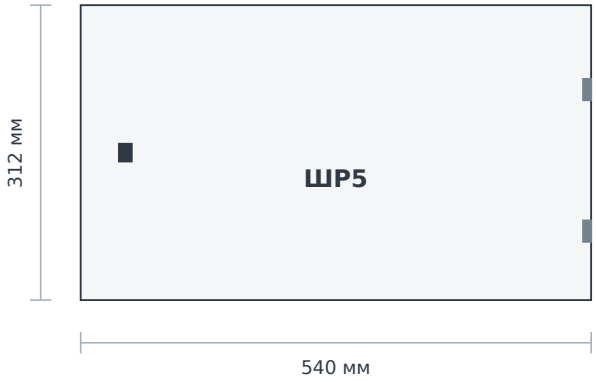

СБОКУ



СВЕРХУ



СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:8.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-08 | ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ



АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QS — NXHB 40A × 1

QF — NXB 3P 16A × 3

QF — NXB 1P 16A × 3

QF — NXB 1P 32A × 1

QD — RCBO 1P+N C16 × 1

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
2. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
3. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-08 | ШР5 (ЩРн-36з-0 74 У2)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15015	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	3	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	2	шт
6	Авт. выкл. NXB-63S 1P 32A 4.5kA х-ка C (R)	296713	CHINT	1	шт
7	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	1	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-09 | ШРб-1 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШРб-1 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	Met. Щит Щит ЩРв инд (1000x500x180mm) S/A IP31 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	1000 × 500 × 180 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-09 | ШРб-1 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ



СБОКУ



СВЕРХУ



СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:12.5 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-09 | ШРб-1 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

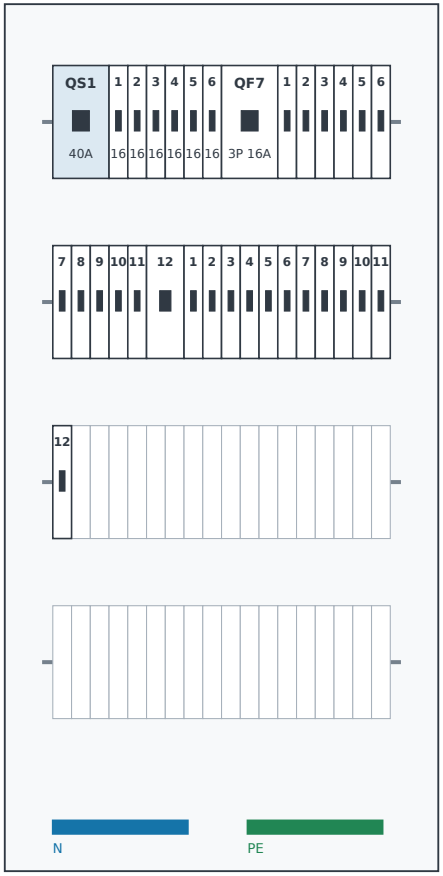

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QS — NXHB 40A × 1

QF — NXB 1P 16A × 6

QF — NXB 3P 16A × 1

KM — NCH8 2NO × 11

KM — NCH8 4NO × 1

SB — КМУ 11 / DIN × 12

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. Четыре DIN-зоны — предварительный вариант для корпуса 1000 × 500 × 180. Штатные рейки и доступ к КМУ проверить.
2. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
3. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
4. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-09 | ШРб-1 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Met. Щит Щит ЩРв инд (1000x500x180mm) S/A IP31	713-15050	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	5	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
6	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230В 50Гц (R)	256054	CHINT	11	шт
7	Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4HO AC220/230В 50Гц (R)	256089	CHINT	1	шт
8	Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144)	130200085	EKT	10	шт
9	Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144)	130200085	EKT	2	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-10 | ШРб-2 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ШРб-2 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	Met. Щит Щит ЩРв инд (1000x500x180mm) S/A IP31 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	1000 × 500 × 180 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-10 | ШРб-2 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ



СБОКУ



СВЕРХУ



СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:12.5 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-10 | ШРб-2 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

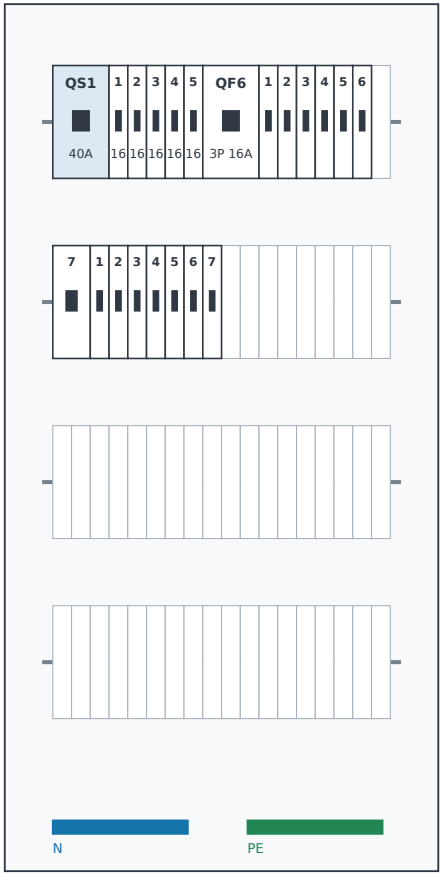

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QS — NXHB 40A × 1

QF — NXB 1P 16A × 5

QF — NXB 3P 16A × 1

KM — NCH8 2NO × 6

KM — NCH8 4NO × 1

SB — КМУ 11 / DIN × 7

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. Четыре DIN-зоны — предварительный вариант для корпуса 1000 × 500 × 180. Штатные рейки и доступ к КМУ проверить.
2. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
3. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
4. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-10 | ШРб-2 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Met. Щит Щит ЩРв инд (1000x500x180mm) S/A IP31	713-15050	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	3	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	2	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296827	CHINT	1	шт
6	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230В 50Гц (R)	256054	CHINT	6	шт
7	Контактор модульный NCH8-25/40 25A 4HO AC220/230В 50Гц (R)	256089	CHINT	1	шт
8	Кнопка управления модульная КМУ-11 IEK (12/144)	130200085	EKT	7	шт


- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-11 | Щс (ЩРн-12з-1 36)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	Щс (ЩРн-12з-1 36)
Корпус / монтаж	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) ×1
Габариты (В × Ш × Г)	313 × 268 × 120 мм
Защита	IP31
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-11 | Щс (ЩРн-12з-1 36)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

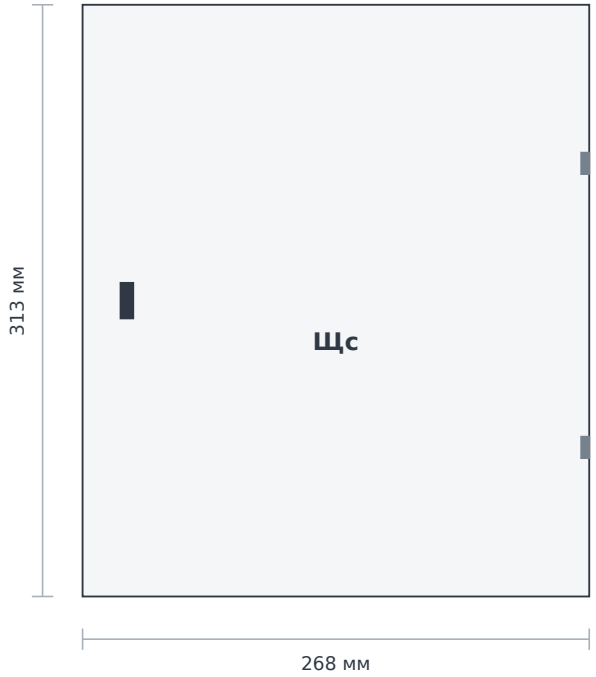


СБОКУ



СВЕРХУ

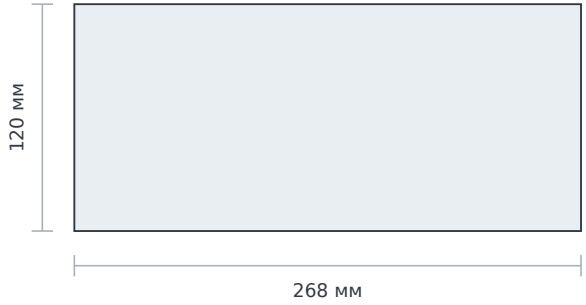

СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:4.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-11 | Щс (ЩРн-12з-1 36)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

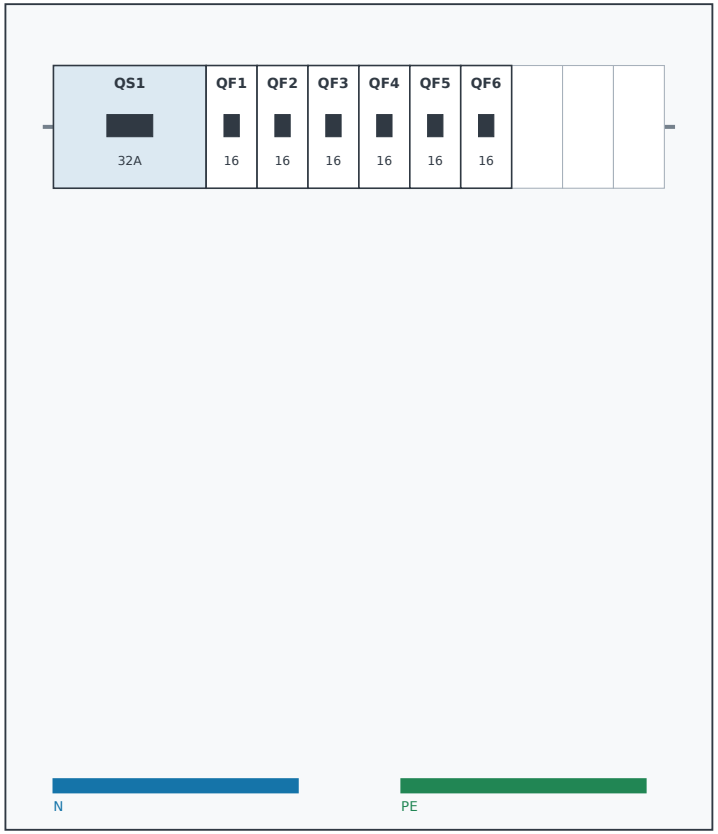

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QS — NXHB 32A × 1

QF — NXB 1P 16A × 6

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
2. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
3. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-11 | Щс (ЩРн-12з-1 36)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	714-15005	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	6	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-12 | ЩО-1 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

NEXUS

48M

ФАСАД УСЛОВНЫЙ / БЕЗ МАСШТАБА

Габариты подтвердить по изделию

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЩО-1 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	48M NEXUS, габарит по каталогу
Защита	IP30
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-12 | ЩО-1 (NEXUS 48M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ЗАВОДСКИЕ КОРПУСА NEXUS / МОНТАЖ В НИШУ



УСЛОВНЫЙ ФАСАД

ПРИМЕЧАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ

1. DX10-A48TWB; артикулы и количество — в комплектации.
2. Габариты В × Ш × Г и монтажная ниша в исходном PDF не указаны. Масштаб фасада не задан.
3. Боковой, верхний и нижний виды без размеров не выпускаются как монтажные чертежи.
4. Подтвердить модель, число рядов и размеры фактического изделия; затем оформить привязку ввода.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ФАСАД — НЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ НИШИ И ОТВЕРСТИЙ

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-12 | ЩО-1 (NEXUS 48M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

NEXUS 48M
Распределение по BOM; физические ряды не заданы

NXHB 40A
Количество: 1

ФР EKF
Количество: 1

NXB 1P 16A
Количество: 13

RCBO 1P+N C16
Количество: 5

ГРУППЫ ОБОРУДОВАНИЯ / БЕЗ МАСШТАБА

1. На рисунке показаны реальные группы и количества аппаратов из комплектации PDF.
2. Пустые одинаковые блоки R2 заменены составом оборудования.
3. Число рядов 48M и межрядовые расстояния не определены исходником. Разводку по рейкам выполнять после подтверждения корпуса.
4. Ширину RCBO и фотореле сверить по фактическим изделиям; резерв 20% подтвердить расчётом.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-12 | ЩО-1 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1	711-03016	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF	fr-din-1-25	EKF	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	12	шт
5	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	1	шт
6	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	5	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-13 | ЩО-2 (КМПб 4/28)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

NEXUS

32M

ФАСАД УСЛОВНЫЙ / БЕЗ МАСШТАБА

Габариты подтвердить по изделию

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЩО-2 (КМПб 4/28)
Корпус / монтаж	DX10-A32SWB V10 32 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	32M NEXUS, габарит по каталогу
Защита	IP30
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-13 | ЩО-2 (NEXUS 32M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ЗАВОДСКИЕ КОРПУСА NEXUS / МОНТАЖ В НИШУ



УСЛОВНЫЙ ФАСАД

ПРИМЕЧАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ

1. DX10-A32SWB; артикулы и количество — в комплектации.
2. Габариты В × Ш × Г и монтажная ниша в исходном PDF не указаны. Масштаб фасада не задан.
3. Боковой, верхний и нижний виды без размеров не выпускаются как монтажные чертежи.
4. Подтвердить модель, число рядов и размеры фактического изделия; затем оформить привязку ввода.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ФАСАД — НЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ НИШИ И ОТВЕРСТИЙ


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-13 | ЩО-2 (NEXUS 32M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

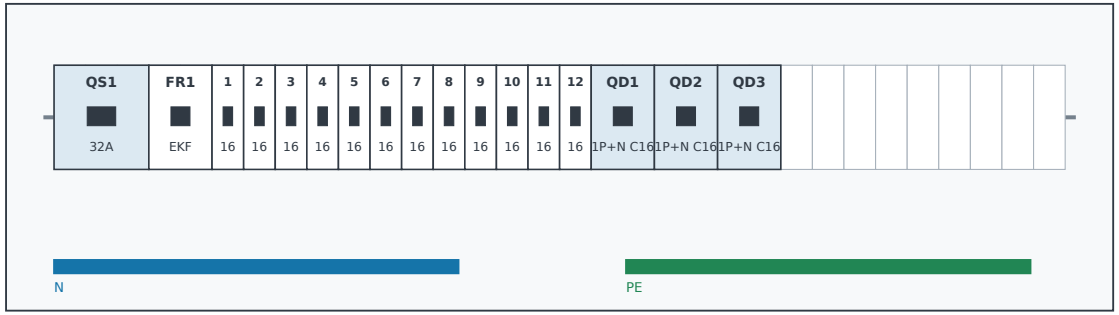

АППАРАТЫ В РАЗМЕЩЕНИИ

QS — NXHB 32A × 1

FR — ФР EKF × 1

QF — NXB 1P 16A × 12

QD — RCBO 1P+N C16 × 3

ПРОВЕРКА МОНТАЖА

1. 32M показан одной DIN-линией. Габариты и исполнение DX10-A32SWB подтвердить до разметки.
2. Аппараты показаны по количествам и полюсности BOM. Пустые места — резерв.
3. Контуры аппаратов условные. Ширины RCBO, контакторов, кнопок и фотореле проверить по паспортам.
4. N и PE раздельно; клеммы и каналы уточняются в производственном BOM.

Количество модулей и рядность — предварительные монтажные допущения, не подтверждение заводской компоновки.
Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-13 | ЩО-2 (КМПб 4/28)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	DX10-A32SWB V10 32 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	711-03014	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
3	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25A 3000Вт EKF	fr-din-1-25	EKF	1	шт
4	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	12	шт
5	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	3	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-14 | ЩО-3 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

NEXUS

48M

ФАСАД УСЛОВНЫЙ / БЕЗ МАСШТАБА

Габариты подтвердить по изделию

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЩО-3 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	48M NEXUS, габарит по каталогу
Защита	IP30
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-14 | ЩО-3 (NEXUS 48M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ЗАВОДСКИЕ КОРПУСА NEXUS / МОНТАЖ В НИШУ



УСЛОВНЫЙ ФАСАД

ПРИМЕЧАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ

1. DX10-A48TWB; артикулы и количество — в комплектации.
2. Габариты В × Ш × Г и монтажная ниша в исходном PDF не указаны. Масштаб фасада не задан.
3. Боковой, верхний и нижний виды без размеров не выпускаются как монтажные чертежи.
4. Подтвердить модель, число рядов и размеры фактического изделия; затем оформить привязку ввода.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ФАСАД — НЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ НИШИ И ОТВЕРСТИЙ

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-14 | ЩО-3 (NEXUS 48M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

NEXUS 48M
Распределение по BOM; физические ряды не заданы

NXHB 40A
Количество: 1

NXB 1P 16A
Количество: 13

RCBO 1P+N C16
Количество: 5

ГРУППЫ ОБОРУДОВАНИЯ / БЕЗ МАСШТАБА

1. На рисунке показаны реальные группы и количества аппаратов из комплектации PDF.
2. Пустые одинаковые блоки R2 заменены составом оборудования.
3. Число рядов 48M и межрядовые расстояния не определены исходником. Разводку по рейкам выполнять после подтверждения корпуса.
4. Ширину RCBO и фотореле сверить по фактическим изделиям; резерв 20% подтвердить расчётом.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-14 | ЩО-3 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1	711-03016	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	193182	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	13	шт
4	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	5	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-14 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-15 | ЩО-4 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД УСЛОВНЫЙ / БЕЗ МАСШТАБА

Габариты подтвердить по изделию

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЩО-4 (КМПб 4/42)
Корпус / монтаж	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	48M NEXUS, габарит по каталогу
Защита	IP30
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; NXB 1P 16A ×12, RCBO NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA ×6
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-15 | ЩО-4 (NEXUS 48M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ЗАВОДСКИЕ КОРПУСА NEXUS / МОНТАЖ В НИШУ



УСЛОВНЫЙ ФАСАД

ПРИМЕЧАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ

1. DX10-A48TWB; артикул и количество — в комплектации.
2. Габариты В × Ш × Г и монтажная ниша в исходном PDF не указаны. Масштаб фасада не задан.
3. Боковой, верхний и нижний виды без размеров не выпускаются как монтажные чертежи.
4. Подтвердить модель, число рядов и размеры фактического изделия; затем оформить привязку ввода.
5. R4: щит освещения ЩОА-1/ЩОА-2 (NEXUS 18M) выделен в отдельный лист P-16.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ФАСАД — НЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ НИШИ И ОТВЕРСТИЙ

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-15 | ЩО-4 (NEXUS 48M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

NEXUS 48M
Распределение по BOM; физические ряды не заданы

NXHB 32A
Количество: 1

NXB 1P 16A
Количество: 12

RCBO 1P+N C16
Количество: 6

ГРУППЫ ОБОРУДОВАНИЯ / БЕЗ МАСШТАБА

1. На рисунке показаны реальные группы и количества аппаратов из комплектации PDF.
2. Пустые одинаковые блоки R2 заменены составом оборудования.
3. Число рядов 48M и межрядовые расстояния не определены исходником. Разводку по рейкам выполнять после подтверждения корпуса.
4. Ширину RCBO и фотореле сверить по фактическим изделиям; резерв 20% подтвердить расчётом.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-15 | ЩО-4 (КМПб 4/42)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	DX10-A48TWB V10 48 Modules Distribution Box,Flush,Metal Back Box NEXUS (TEKL ELECTR)1	711-03016	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	12	шт
4	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	515381	CHINT	6	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-16 | ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД УСЛОВНЫЙ / БЕЗ МАСШТАБА

Габариты подтвердить по изделию

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14)
Количество щитов	2 компл. (ЩОА-1, ЩОА-2); состав ниже — на 1 щит
Корпус / монтаж	DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	18M NEXUS, габарит по каталогу
Защита	IP30
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; NXB 1P 16A ×9; сумеречный выключатель Legrand 0412623 с выносным датчиком ×1
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-16 | ЩОА-1, ЩОА-2 (NEXUS 18M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ЗАВОДСКИЕ КОРПУСА NEXUS / МОНТАЖ В НИШУ



УСЛОВНЫЙ ФАСАД

ЩОА-1, ЩОА-2 — 2 шт.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ФАСАД — НЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ НИШИ И ОТВЕРСТИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ

1. DX10-A18SWB; артикул и количество — в комплектации (на 1 щит; всего 2 щита).
2. Габариты В × Ш × Г и монтажная ниша в исходном PDF не указаны. Масштаб фасада не задан.
3. Боковой, верхний и нижний виды без размеров не выпускаются как монтажные чертежи.
4. Выносной датчик сумеречного выключателя — монтаж по месту; трассу кабеля датчика согласовать.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-16 | ЩОА-1, ЩОА-2 (NEXUS 18M)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

NEXUS 18M
Распределение по BOM; физические ряды не заданы

NXHB 32A
Количество: 1

NXB 1P 16A
Количество: 9

ФОТОРЕЛЕ Legrand 0412623
Количество: 1 (+ выносной датчик)

Состав — на 1 щит; изготавливается 2 щита (ЩОА-1, ЩОА-2)

ГРУППЫ ОБОРУДОВАНИЯ / БЕЗ МАСШТАБА

1. На рисунке показаны реальные группы и количества аппаратов из комплектации.
2. Число рядов 18M и межрядовые расстояния не определены исходником. Разводку по рейкам выполнять после подтверждения корпуса.
3. Ширину фотореле сверить по фактическому изделию; резерв 20% подтвердить расчётом.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-16 | ЩОА-1, ЩОА-2 (КМПб 4/14)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы не включены. Количество — на 1 щит; всего 2 щита (ЩОА-1, ЩОА-2).

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	DX10-A18SWB V10 18 Modules Distribution Box,Flush NEXUS (TEKLED ELECTR)5	711-03010	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
3	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	296710	CHINT	9	шт
4	Сумеречный выключатель Legrand 0412623 (с выносным датчиком)	PYS-004	PYS	1	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-17 | Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)
Корпус / монтаж	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	500 × 400 × 220 мм
Защита	IP54
Ввод / сеть	Пускатель NS2-25 1-1.6A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; NXC-09 ×1; на двери SA1, HL1 (красная), SB1 стоп (красная), SB2 пуск (зелёная)
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-17 | Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

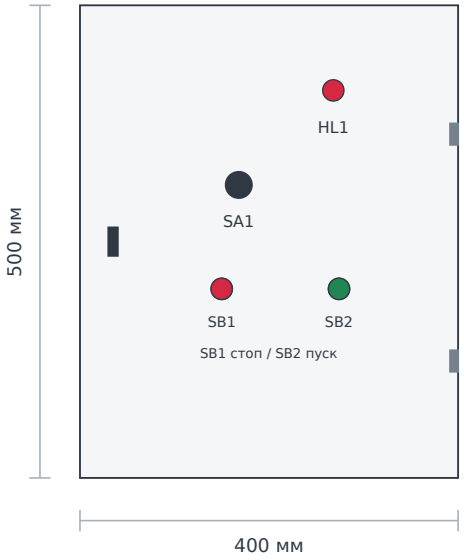


СБОКУ



СВЕРХУ

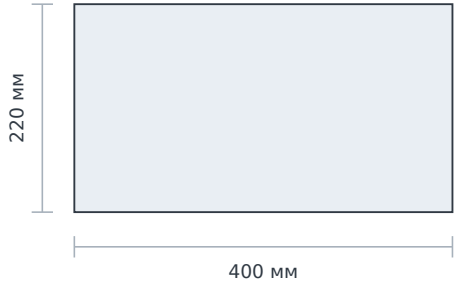

СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:8.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-17 | Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

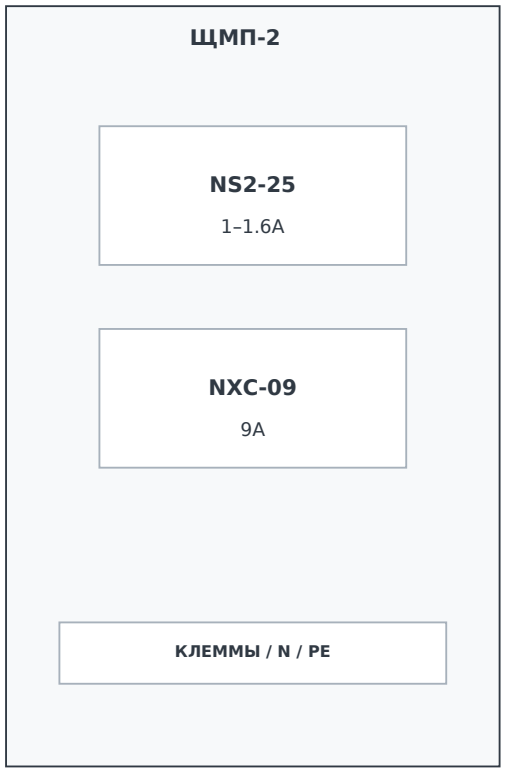

ПРИМЕЧАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ

1. Один корпус ЩМП-2 500 × 400 × 220 мм, IP54.
2. Монтажная панель: NS2-25 1–1.6A, NXC-09. На двери: SA1, красная HL1, красная SB1 (стоп) и зелёная SB2 (пуск).
3. R4: Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ) выделены в отдельный лист P-18 (2 компл.).
4. Связи уточнить по принципиальной схеме.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-17 | Я-Нц (Я5111-2274 УХЛ4)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	719-15425	TEKSAN F	1	шт
2	Пускатель NS2-25 1-1.6A (R)	495077	CHINT	1	шт
3	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	836704	CHINT	1	шт
4	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	574849	CHINT	1	шт
5	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	593075	CHINT	1	шт
6	Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R)	667113	CHINT	1	шт
7	Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R)	667114	CHINT	1	шт

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-17 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

Р-18 | Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

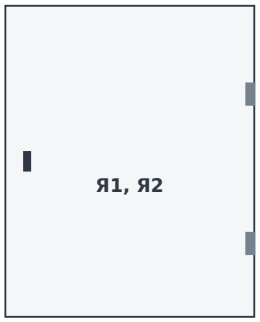

×2 щита

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ)
Количество щитов	2 компл. (Я1, Я2); состав ниже — на 1 щит
Корпус / монтаж	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	500 × 400 × 220 мм
Защита	IP54
Ввод / сеть	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1 (ЯРП-25: 25A нет — ближайший 32A)
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; держатель RT28N-32X 3P ×1, вставки RT28-32 25A ×3; дверь без приборов
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-18 | Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

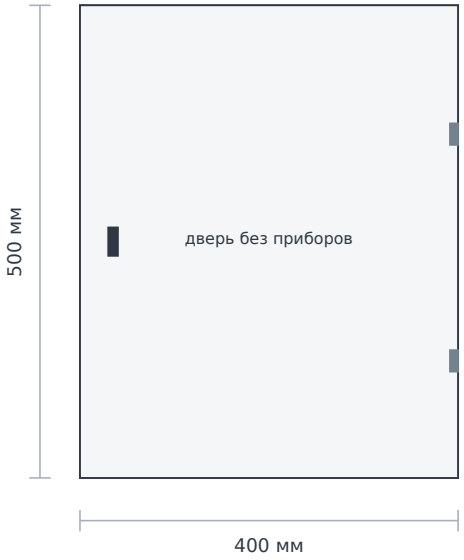


СБОКУ



СВЕРХУ

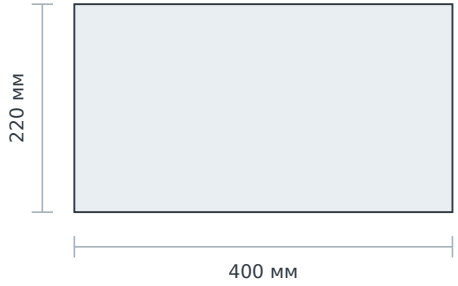

СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

1 КОРПУС 500 × 400 × 220 мм; Я1, Я2 — 2 шт.

Единый масштаб видов: 1:8.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-18 | Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ



ПРИМЕЧАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ

1. Корпус ЩМП-2 500 × 400 × 220 мм, IP54; дверь без приборов.
2. NXHB-125 3P 32A, держатель RT28N-32X 3P с тремя вставками RT28-32 25A.
3. Состав — на 1 щит; изготавливается 2 щита (Я1, Я2).
4. Связи уточнить по принципиальной схеме.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-18 | Я1, Я2 (ЯРП-25-УЗ)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы не включены. Количество — на 1 щит; всего 2 щита (Я1, Я2).

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	719-15425	TEKSAN F	1	шт
2	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	193181	CHINT	1	шт
3	Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10x38 3П (R)	520488	CHINT	1	шт
4	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 25A 10x38	520259	CHINT	3	шт


• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
• Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-19 | Яз1 (Я5411-3074)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ



ФАСАД / ВЕРНАЯ ПРОПОРЦИЯ

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	Яз1 (Я5411-3074)
Корпус / монтаж	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54 ×1
Габариты (В × Ш × Г)	500 × 400 × 220 мм
Защита	IP54
Ввод / сеть	Пускатель NS2-25 6-10A (R) ×1
Учёт	—
Аппаратура / управление	CHINT; управление и индикация - по BOM
Материал шин	по BOM / рабочей схеме
Резерв	TEKLED R1: целевой резерв 20% по DIN/монтажному пространству
Источник	Excel BOM 261006 Atyrau Guldana; рабочую схему сверить перед выпуском

Основание R4: Excel BOM 261006 Atyrau Guldana (на согласование) + PDF R3; количества и артикулы сверены с BOM.

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

P-19 | Яз1 (Я5411-3074)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

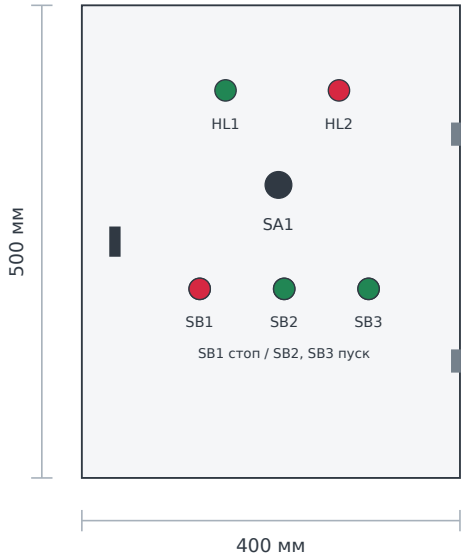


СБОКУ



СВЕРХУ

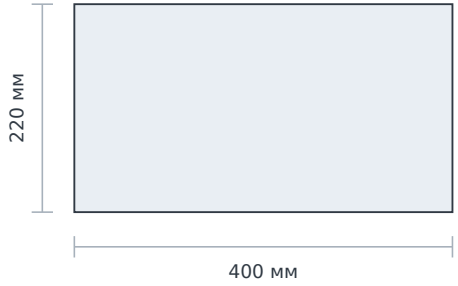

СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Единый масштаб видов: 1:8.0 при печати 100%. Размеры в мм; формат A4.

Масштаб относится к корпусу. Дверные приборы показаны условно; петли справа, ручка слева.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-19 | Яз1 (Я5411-3074)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ВНУТРЕННИЙ ВИД / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

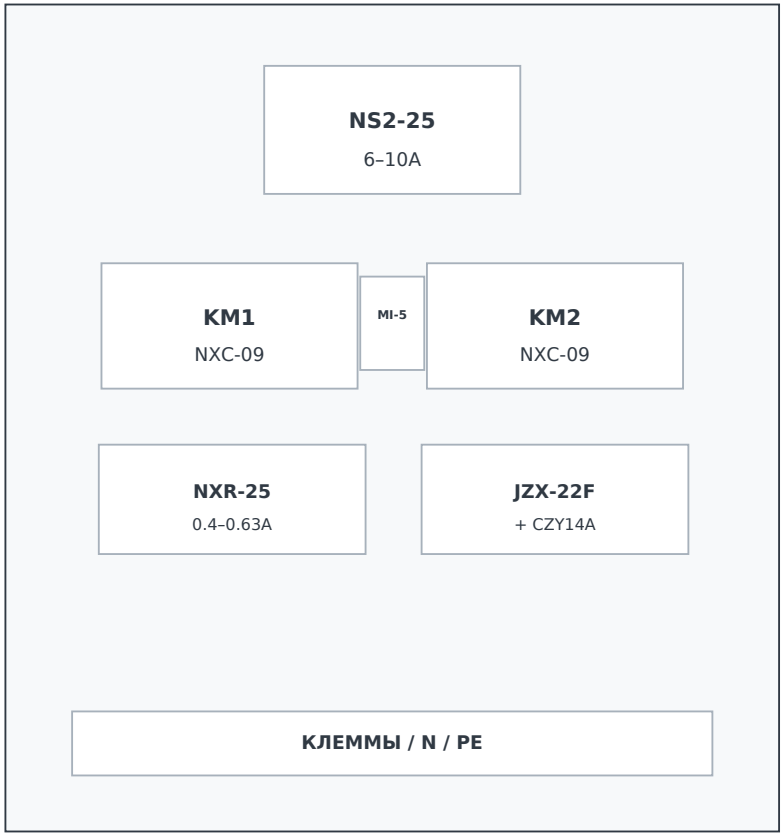


Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки аппаратов — после проверки паспортов.

ПРИМЕЧАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ

1. Контакторы KM1/KM2 размещены совместно с механической блокировкой MI-5.
2. Реле JZX-22F с розеткой CZY14A, тепловое реле NXR-25 показаны отдельно.
3. На двери: SA1, 2 лампы и 3 кнопки; приборы вне линии замка и петель.
4. NS2 6–10A и NXR 0.4–0.63A указаны в BOM. Соответствие току двигателя и функции реле проверить по принципиальной схеме.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-19 | Яз1 (Я5411-3074)

R4 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество - по текущему Excel BOM. Монтажные расходные материалы в согласовательную таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка / источник	Кол.	Ед.
1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	719-15425	TEKSAN F	1	шт
2	Механическая блокировка MI-5 для NC1-09-32, NXC-09-38 (R)	256717	CHINT	1	шт
3	Пускатель NS2-25 6-10A (R)	495081	CHINT	1	шт
4	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	836704	CHINT	2	шт
5	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	837108	CHINT	1	шт
6	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	CHINT	1	шт
7	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	CHINT	1	шт
8	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	574849	CHINT	1	шт
9	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	593077	CHINT	1	шт
10	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	593075	CHINT	1	шт
11	Кнопка управления NP8-11BN/3 без подсветки, зелёная 1НО+1НЗ IP65 (R)	667113	CHINT	2	шт
12	Кнопка управления NP8-11BN/4 без подсветки, красная 1НО+1НЗ IP65 (R)	667114	CHINT	1	шт

- Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
- Кабельный ввод, маркировка, наконечники, DIN-рейки, кабель-канал и монтажные материалы - по производственному BOM.
- Для NEXUS без габаритов в исходном BOM фактические размеры подтвердить по каталогу/складу до изготовления отверстий.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261006 | Щит: P-19 | Рабочий заказ: _____

Заказ / срок передачи: _____
