Согласование изготовления электрощитов

Строительство общежития на 100 мест в вахтовом поселке «Каспий Самалы», Жилойский район Атырауской области

10 щитов / 10 комплектов

Комплектация: CNC. Корпуса: TEKSAN / NEXUS по актуальному BOM.
Статус: НА СОГЛАСОВАНИЕ. Подписи заказчика и изготовителя не проставлены.

Состав: реестр щитов; спецификации; исходные однолинейные схемы; предварительные компоновки; перечень вопросов и лист согласования.
Для каждого щита: спецификация → однолинейная схема → компоновка.

Основа комплектации: предоставленный BOM «cl dla uod». Количества восстановлены из полного BOM «cl» после построчного совпадения наименований, артикулов и описаний. Исходные схемы сохранены как проектная ссылка; обозначения аппаратов на них не заменены на CNC.

Реестр щитов и состав документа

Щит	Кол-во	Корпус / исполнение	Ввод по BOM	Страницы
ВРУ	1	Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база)	Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300	3 / 4 / 5
ЩС	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 25A 4.5kA х-ка C	6 / 7 / 8
ЩО1.1	1	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	9 / 10 / 11
ЩО1.2	1	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	12 / 13 / 14
ЩО2.1	1	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	15 / 16 / 17
ЩО2.2	1	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	18 / 19 / 20
ЩВ1.1	1	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	21 / 22 / 23
ЩВ1.2	1	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	24 / 25 / 26
ЩВ2.1	1	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	27 / 28 / 29
ЩВ2.2	1	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	30 / 31 / 32

Страницы указаны в порядке: спецификация / исходная схема / предварительная компоновка.
Количество в спецификациях приведено на один щит. В данном заказе каждый щит - 1 комплект.

ВРУ | Спецификация


Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 2-32 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
3	719-15437	Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база)	1	шт	teksan f	Корпус
4	B000096	Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300	2	шт	cnc	Ввод
5	296831	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	6	шт	cnc	Выход
6	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Выход
7	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
8	296827	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
9	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
10	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Выход
11	296825	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 6A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Управление
12	E010209	Индикатор желтый AC/DC230B AD22-22D Y	2	шт	cnc	Управление
13	E010207	Индикатор зеленый AC/DC230B AD22-22D G	2	шт	cnc	Управление
14	E010208	Индикатор красный AC/DC230B AD22-22D R	2	шт	cnc	Управление
15	130300473	Шина медн.3x20x4000	5.35	м	ekt	Монтаж
16	130300473	Шина медн.3x20x4000	1.78	м	ekt	Монтаж
17	130300473	Шина медн.3x20x4000	1.78	м	ekt	Монтаж
18	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	24	шт	ekt	Монтаж
19	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
20	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	2	шт	ekt	Монтаж
21	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
22	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
23	280100020	Кабель.канал перф. 40x40 ИМПАКТ IEK (36)	6.1	м	ekt	Монтаж
24	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	10.6	м	harmony	Монтаж
25	151.01.PV3.70	HARMONY ПВ3 1*70	3.3	м	harmony	Монтаж
26	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
27	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
28	260100169	Наконечник медно-луженный JG - 70 IEK (50)	12	шт	ekt	Монтаж
29	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
30	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
31	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
32	монтажная работа	монтажная работа	609	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ВРУ | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 2. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

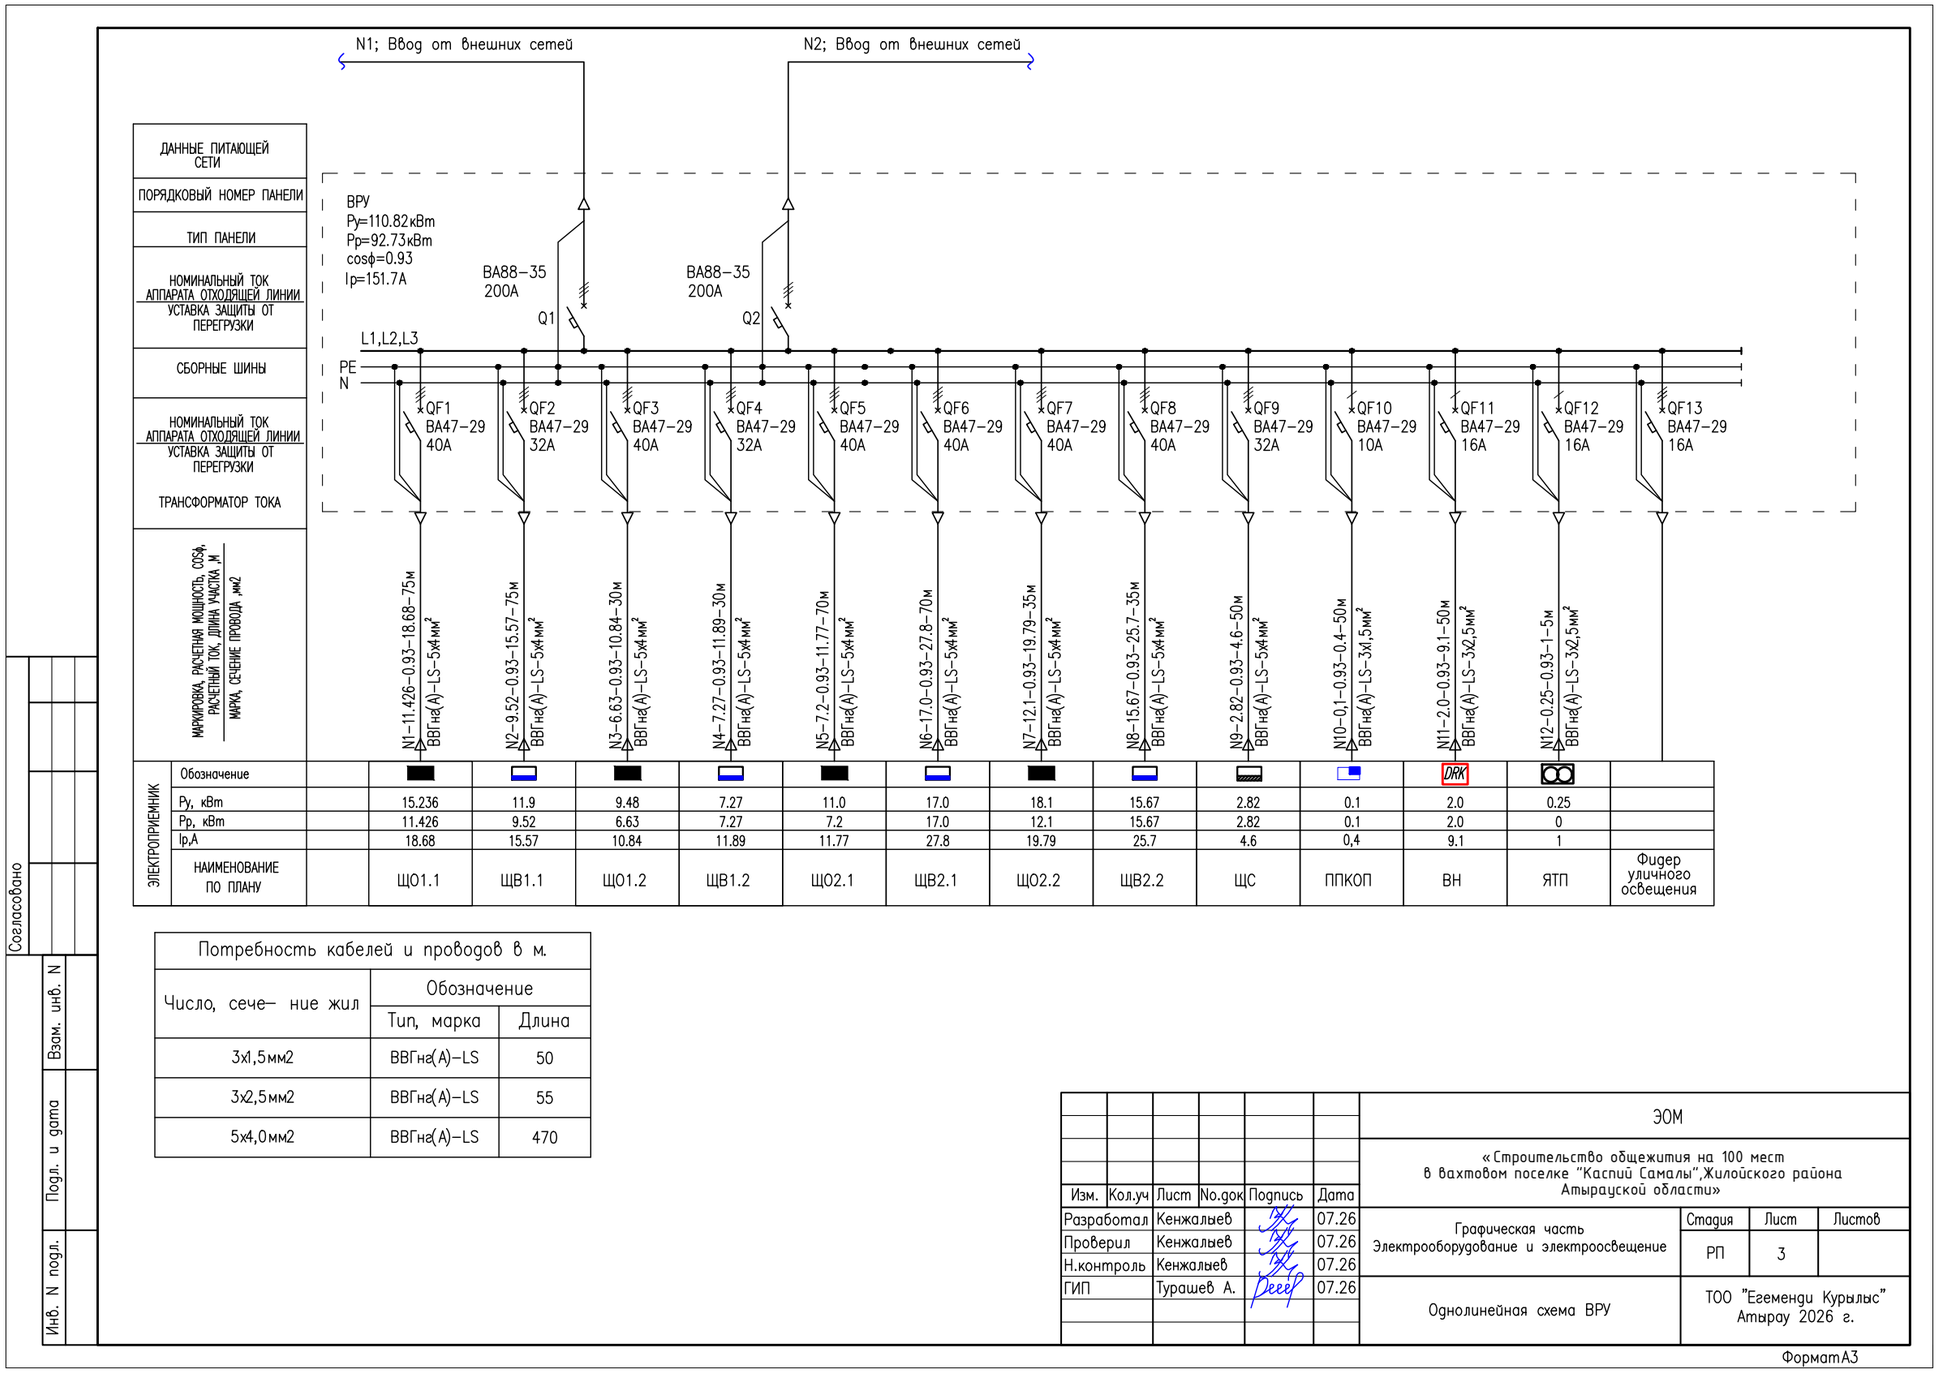

Потребность кабелей и проводов в м.		
Число, сече– ние жил	Обозначение	
	Тип, марка	Длина
3х1,5мм2	ВВГнг(А)–LS	50
3х2,5мм2	ВВГнг(А)–LS	55
5х4,0мм2	ВВГнг(А)–LS	470

Изм.	Кол.уч	Лист	No.док	Подпись	Дата
Разработал		Кенжальев			07.26
Проверил		Кенжальев			07.26
Н.контроль		Кенжальев			07.26
ГИП		Турашев А.			07.26

ЭОМ

«Строительство общежития на 100 мест в вахтовом поселке "Каспий Самалы",Жилойского района Атырауской области»

Графическая часть Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	3	
Однолинейная схема ВРУ	ТОО "Егеменди Курылыс" Атырау 2026 г.		

Формат А3

Схема проектная: марки IEK / BA и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ВРУ | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база)

Ряд 1

Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300	**Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300**

Ряд 2

40A	**40A**	**40A**	**40A**	**40A**	**40A**	**32A**	**32A**
5	5	5	5	5	5	6	6

Занято: 24 мод. (по данным BOM)

Ряд 3

32A	**16A**	**10A**	**16A**	**16A**	**6A**	**6A**
7	8	9	10	10	11	11

Занято: 15 мод. (по данным BOM)

Дверь: сигнализация двух вводов



• Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.

• Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.

• Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.

• Два ввода 200 А: определить переключение, блокировку и допустимость параллельной работы. В BOM нет отдельного АВР/переключателя.

• Шины Cu 3×20: проверить нагрев и ток короткого замыкания; длины в BOM - расчетный расход.

ЩС | Спецификация

Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 34-49 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
35	719-15425	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	1	шт	teksan f	Корпус
36	296829	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 25A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
37	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
38	814183	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кА х-ка D	2	шт	cnc	Выход
39	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
40	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
41	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
42	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
43	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	0.8	м	harmony	Монтаж
44	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
45	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
46	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
47	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
48	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
49	монтажная работа	монтажная работа	47.4	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ЩС | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 3. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

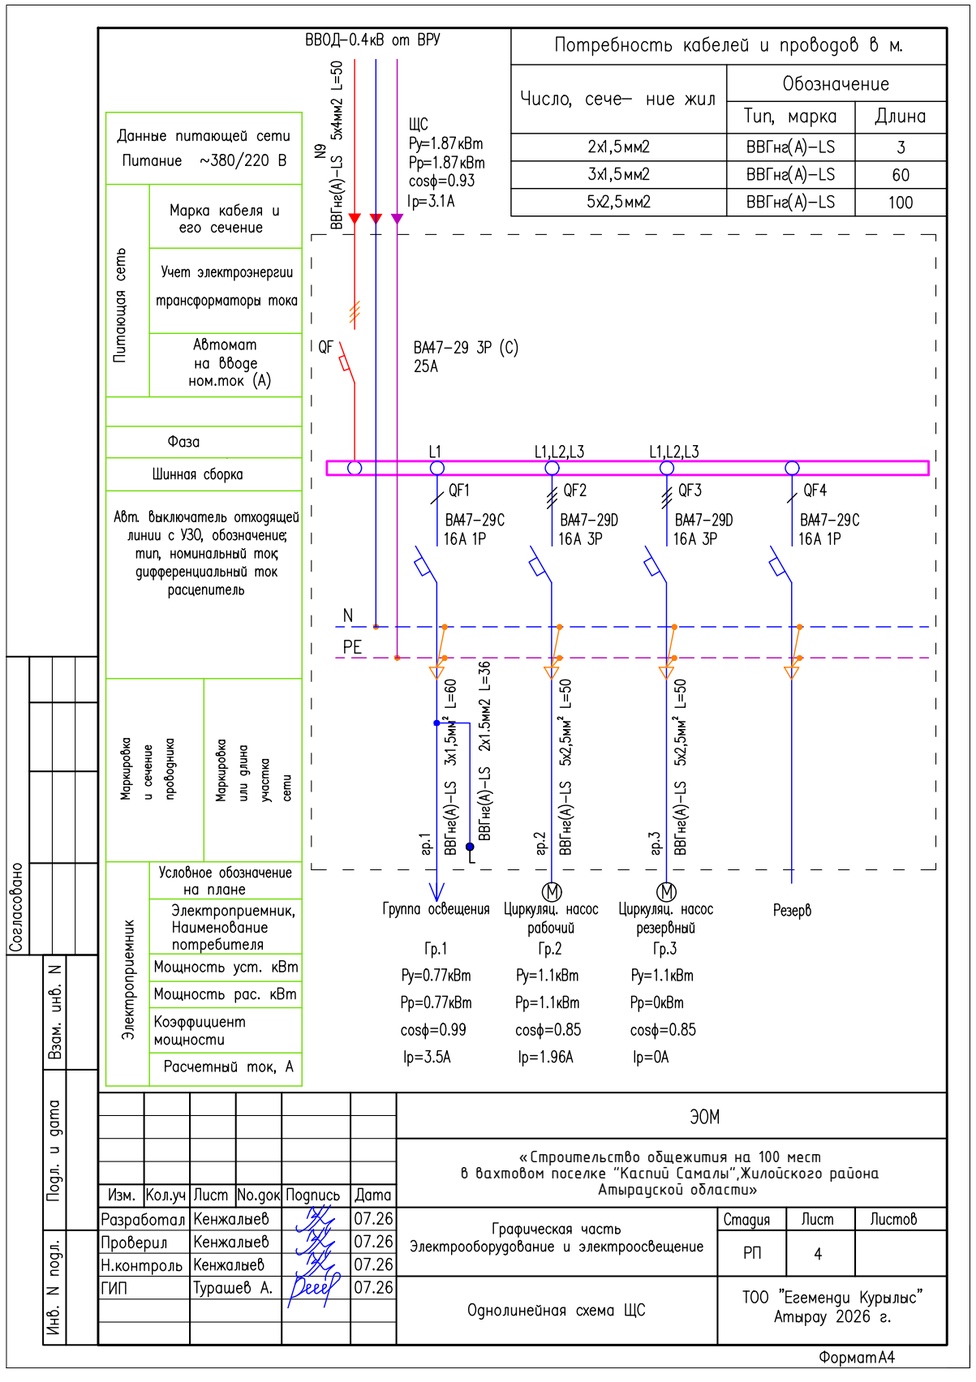


Схема проектная: марки IEK / ВА и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ЩС | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54

Ряд 1

25A 36	**16A** 37	**16A** 38	**16A** 38	**16A** 39

Занято: 11 мод. (по данным BOM)

• Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.

• Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.

• Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.

• Корпус 500×400×220, IP54 по BOM. Проверить полезную ширину DIN-рейки и кабельное пространство.

ЩО1.1 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 51-68 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
52	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
53	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
54	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	5	шт	cnc	Выход
55	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	4	шт	cnc	Выход
56	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
57	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
58	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
59	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
60	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
61	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
62	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
63	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
64	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
65	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
66	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
67	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
68	монтажная работа	монтажная работа	75.6	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ЩО1.1 | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 4. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

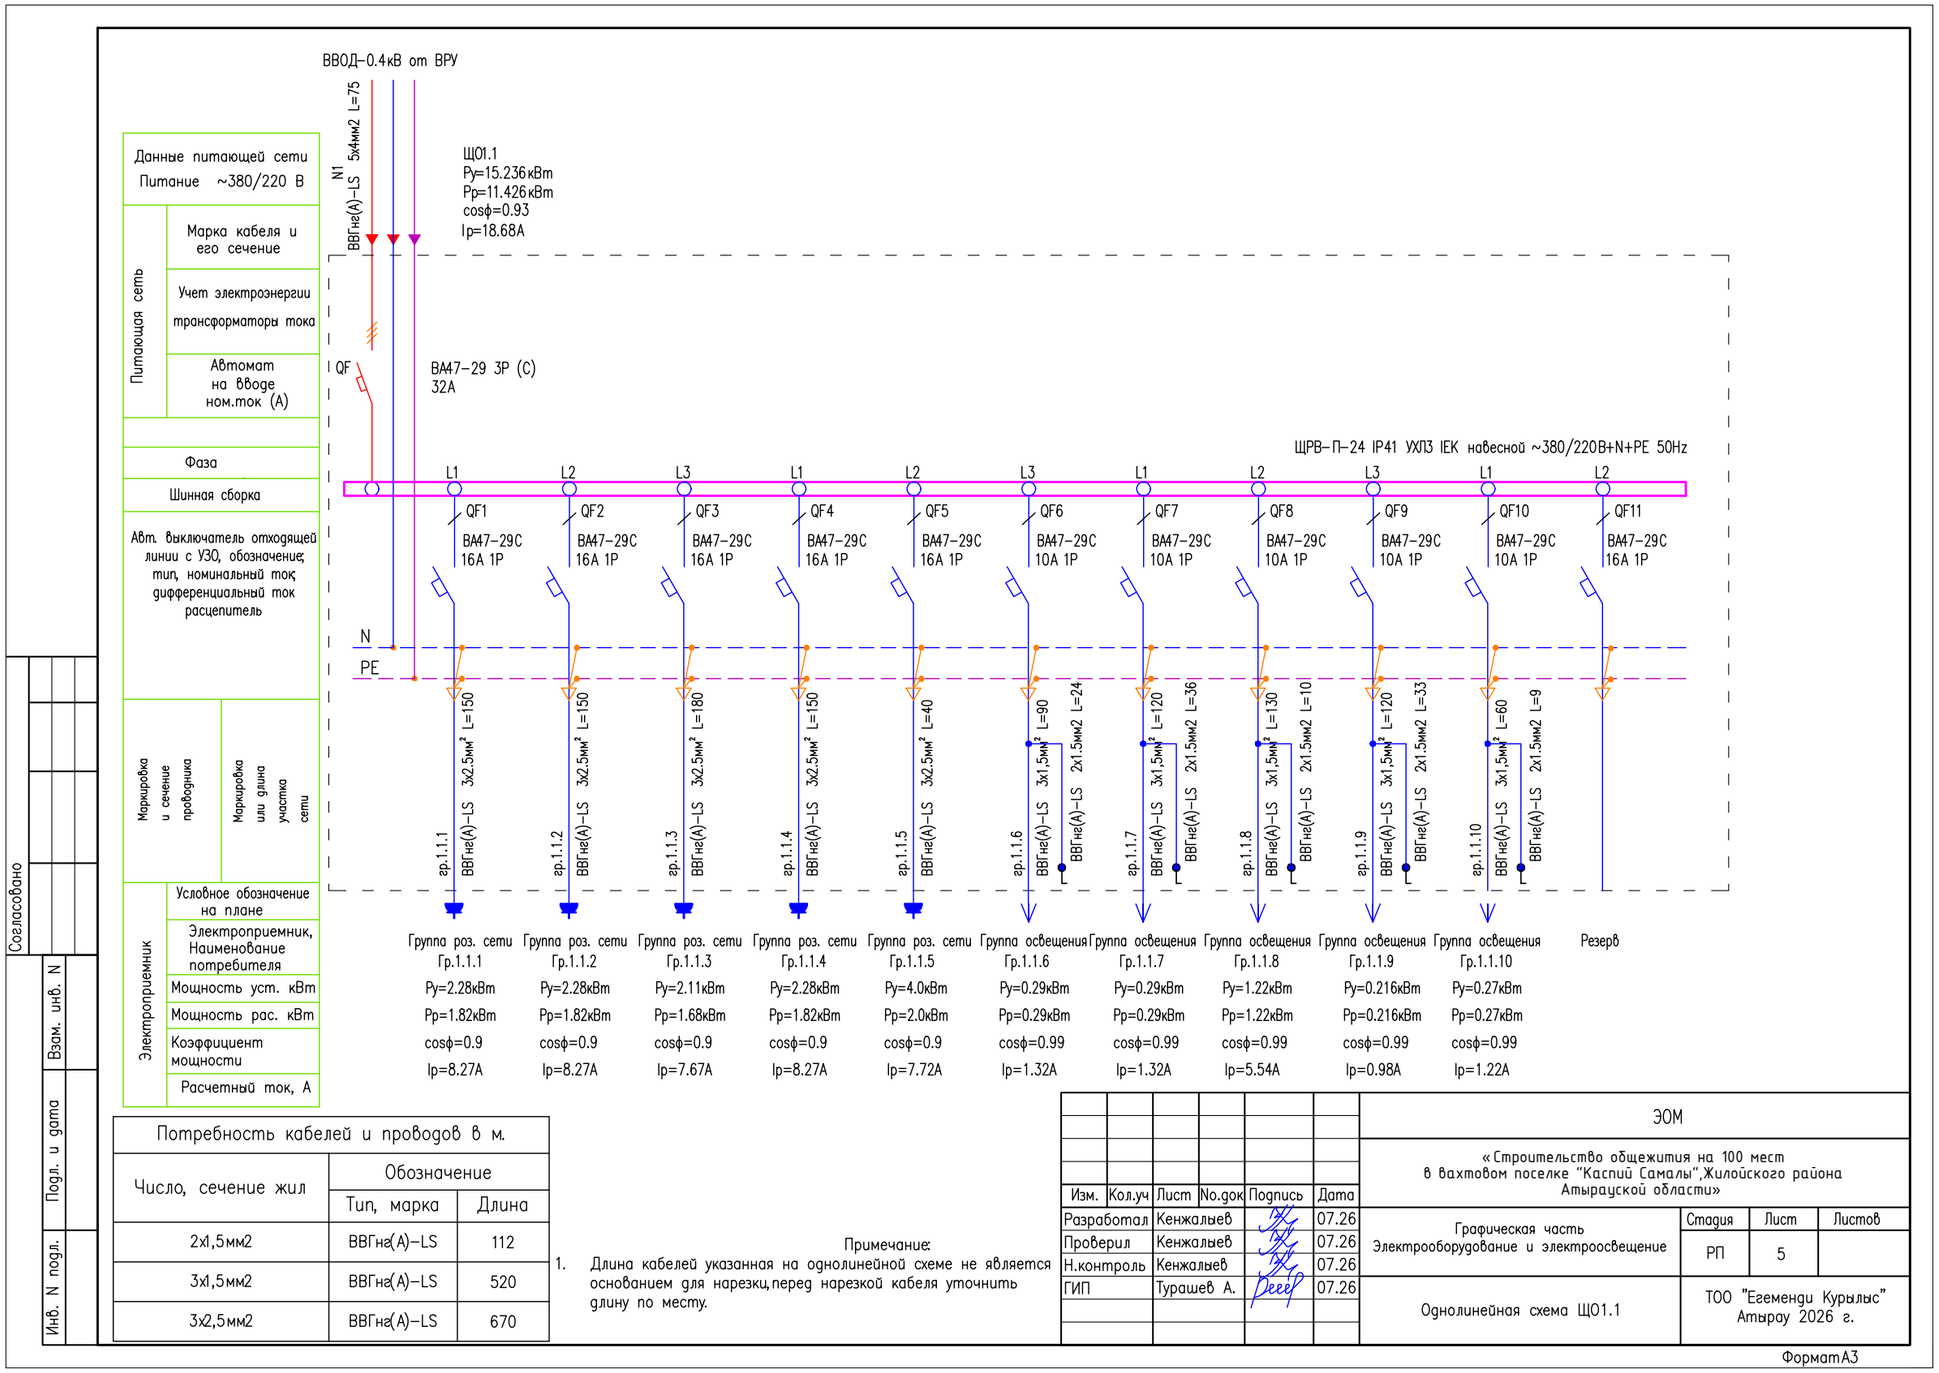


Схема проектная: марки IEK / BA и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ЩО1.1 | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5

Ряд 1

32A	16A	16A	16A	16A	16A	10A	10A	10A	10A
53	54	54	54	54	54	55	55	55	55

Занято: 12 мод. (по данным BOM)

Ряд 2

10A	16A
56	57

Занято: 2 мод. (по данным BOM)

• Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.

• Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.

• Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.

• Корпус NEXUS 24 модуля. Внешние размеры и фактическое расположение двух рядов не заданы в исходном BOM.

ЩО1.2 | Спецификация


Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 70-85 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
71	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
72	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
73	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	6	шт	cnc	Выход
74	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	3	шт	cnc	Выход
75	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
76	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
77	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
78	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
79	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
80	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
81	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
82	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
83	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
84	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
85	монтажная работа	монтажная работа	71.4	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ЩО1.2 | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 5. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

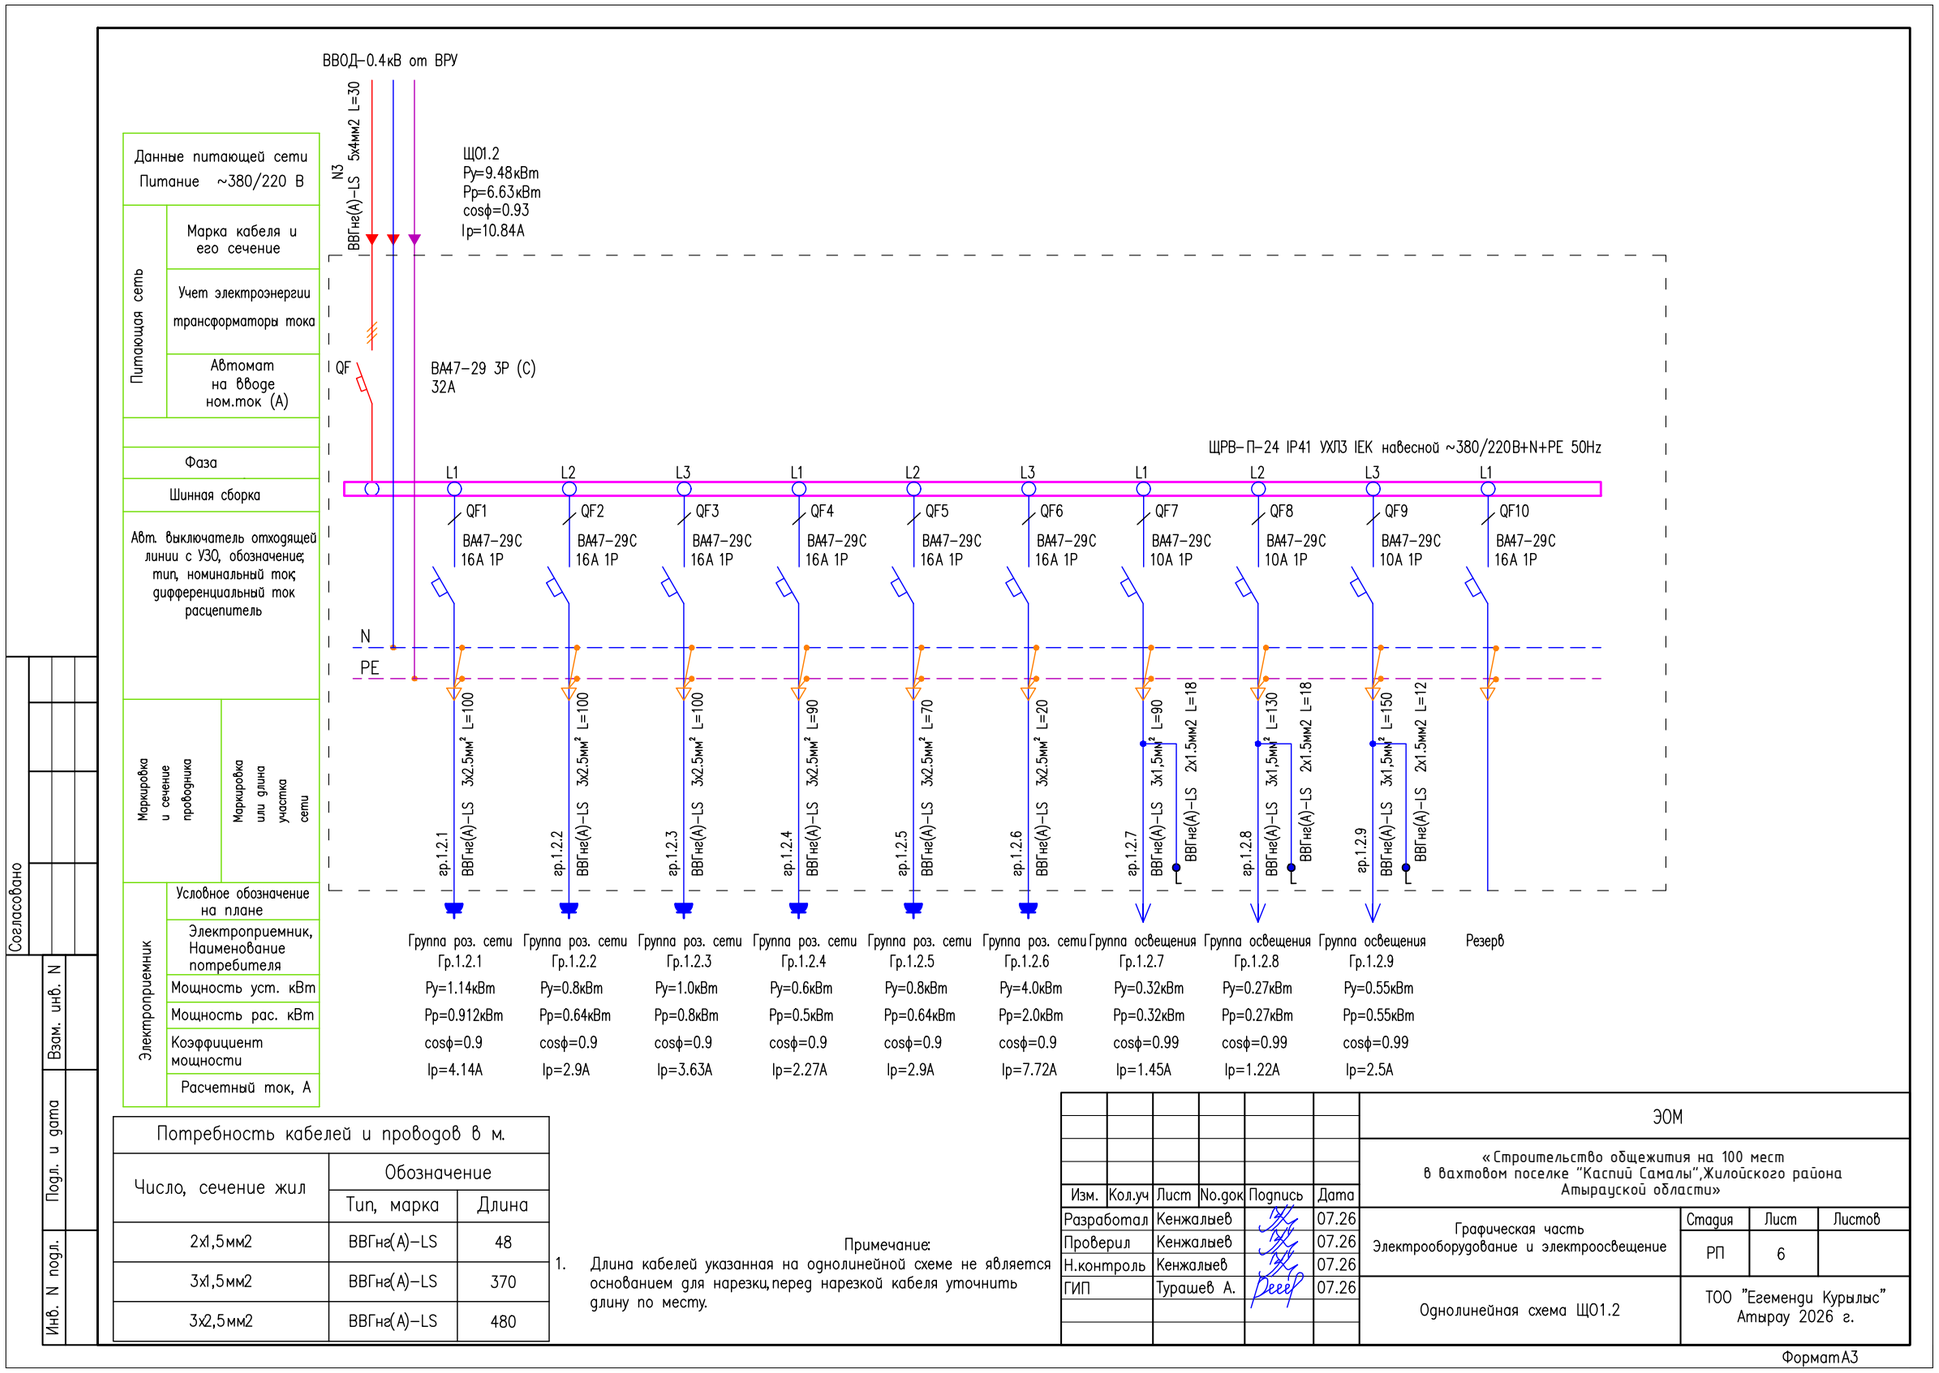

Потребность кабелей и проводов в м.		
Число, сечение жил	Обозначение	
	Тип, марка	Длина
2х1,5мм2	ВВГнг(А)–LS	48
3х1,5мм2	ВВГнг(А)–LS	370
3х2,5мм2	ВВГнг(А)–LS	480

Примечание:
1. Длина кабелей указанная на однолинейной схеме не является основанием для нарезки, перед нарезкой кабеля уточнить длину по месту.

Изм.	Кол.уч	Лист	No.док	Подпись	Дата
Разработал		Кенжалыев			07.26
Проверил		Кенжалыев			07.26
Н.контроль		Кенжалыев			07.26
ГИП		Турашев А.			07.26

ЭОМ

«Строительство общежития на 100 мест в вахтовом поселке "Каспий Самалы", Жылойского района Атырауской области»

Графическая часть Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	6	
Однолинейная схема ЩО1.2	ТОО "Егеменди Курылыс" Атырау 2026 г.		

Формат А3

Схема проектная: марки IEK / BA и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ЩО1.2 | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5

Ряд 1

32A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	10A	10A	10A
72	73	73	73	73	73	73	74	74	74

Занято: 12 мод. (по данным BOM)

Ряд 2

16A
75

Занято: 1 мод. (по данным BOM)

• Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.

• Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.

• Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.

• Корпус NEXUS 24 модуля. Внешние размеры и фактическое расположение двух рядов не заданы в исходном BOM.

ЩО2.1 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 87-104 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
88	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
89	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
90	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	6	шт	cnc	Выход
91	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	3	шт	cnc	Выход
92	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Выход
93	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
94	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
95	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
96	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
97	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
98	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
99	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
100	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
101	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
102	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
103	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
104	монтажная работа	монтажная работа	79.2	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ЩО2.1 | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 6. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

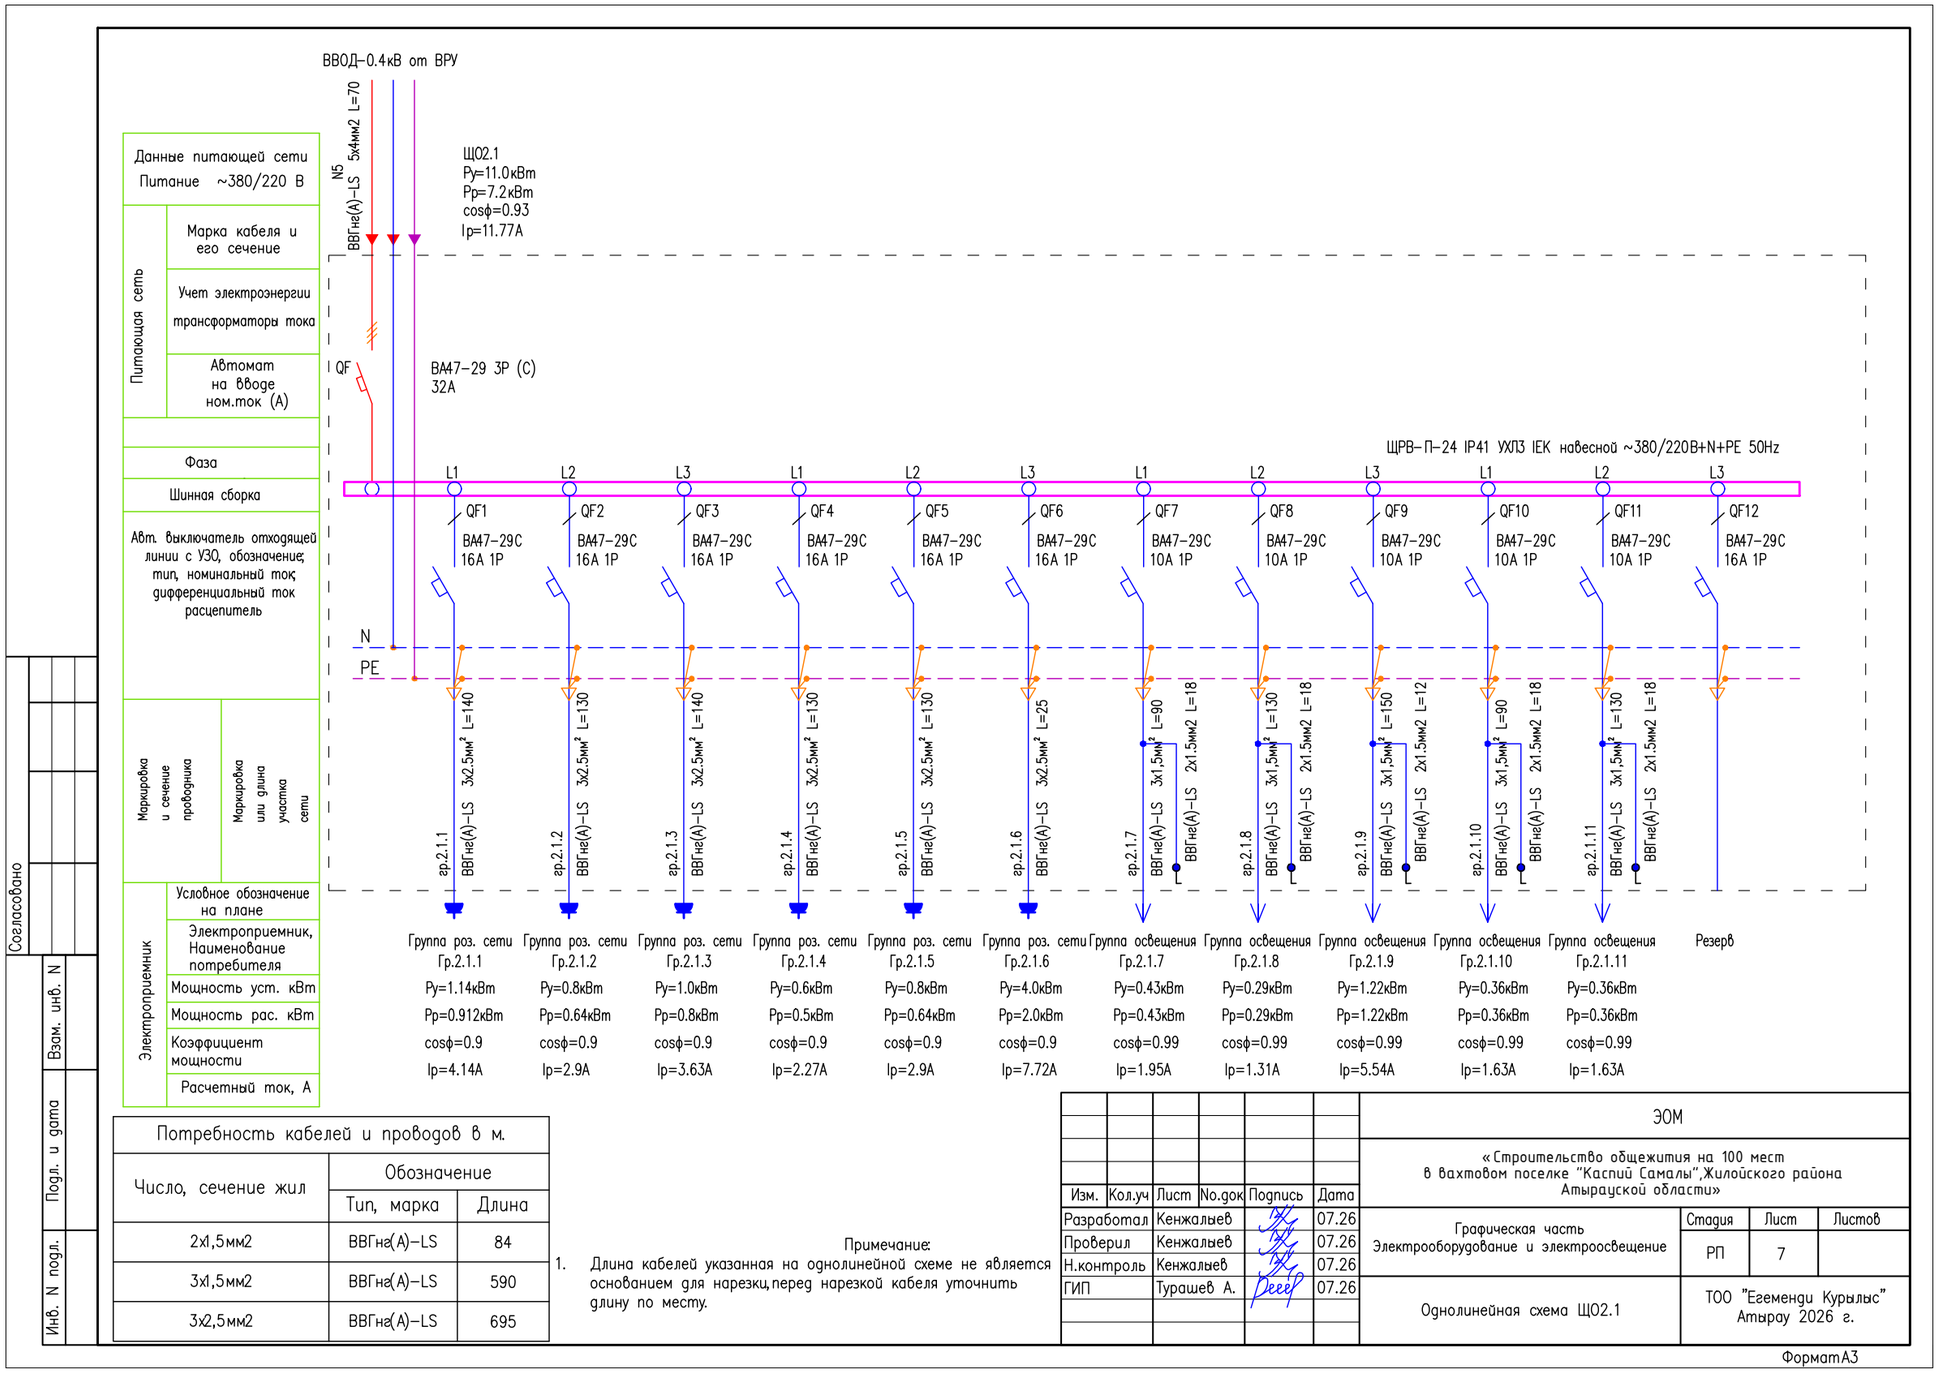


Схема проектная: марки IEK / BA и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ЩО2.1 | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5

Ряд 1

32A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	10A	10A	10A
89	90	90	90	90	90	90	91	91	91

Занято: 12 мод. (по данным BOM)

Ряд 2

10A	10A	16A
92	92	93

Занято: 3 мод. (по данным BOM)

- Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.
- Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.
- Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.
- Корпус NEXUS 24 модуля. Внешние размеры и фактическое расположение двух рядов не заданы в исходном BOM.

ЩО2.2 | Спецификация


Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 106-123 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
107	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
108	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Ввод
109	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	6	шт	cnc	Выход
110	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	3	шт	cnc	Выход
111	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
112	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
113	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
114	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
115	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
116	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
117	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
118	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
119	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
120	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
121	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
122	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
123	монтажная работа	монтажная работа	75.6	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ЩО2.2 | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 7. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

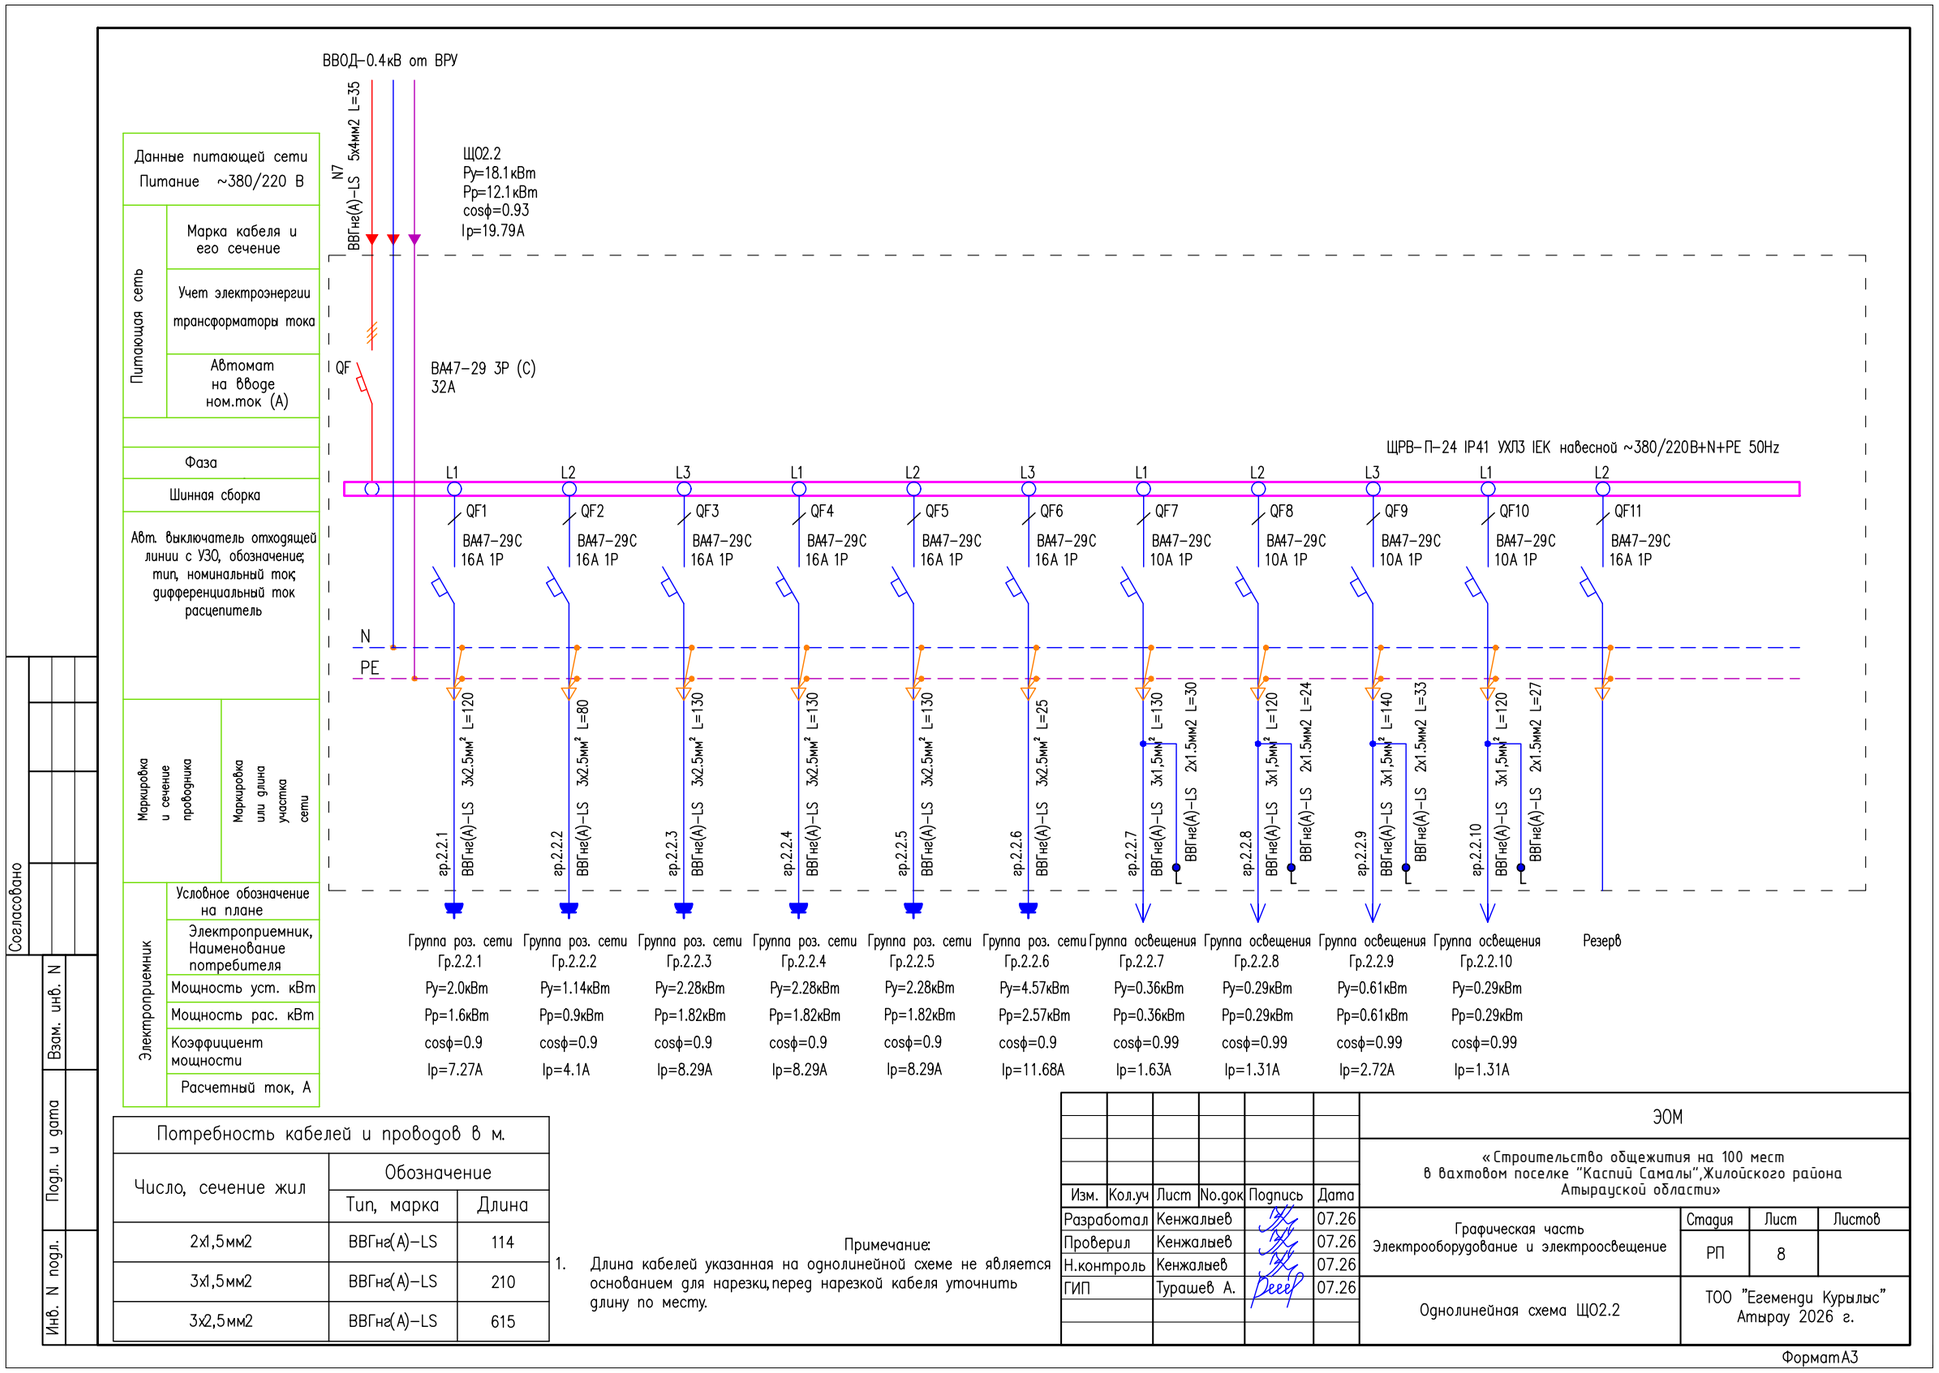

Потребность кабелей и проводов в м.		
Число, сечение жил	Обозначение	
	Тип, марка	Длина
2х1,5мм2	ВВГнг(А)–LS	114
3х1,5мм2	ВВГнг(А)–LS	210
3х2,5мм2	ВВГнг(А)–LS	615

Примечание:
1. Длина кабелей указанная на однолинейной схеме не является основанием для нарезки, перед нарезкой кабеля уточнить длину по месту.

Изм.	Кол.уч	Лист	No.док	Подпись	Дата
Разработал		Кенжалыев			07.26
Проверил		Кенжалыев			07.26
Н.контроль		Кенжалыев			07.26
ГИП		Турашев А.			07.26

ЭОМ

«Строительство общежития на 100 мест в вахтовом поселке "Каспий Самалы", Жылойского района Атырауской области»

Графическая часть Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	8	
Однолинейная схема ЩО2.2	ТОО "Егеменди Курылыс" Атырау 2026 г.		

Формат А3

Схема проектная: марки IEK / BA и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ЩО2.2 | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5

Ряд 1

32A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	10A	10A	10A
108	109	109	109	109	109	109	110	110	110

Занято: 12 мод. (по данным BOM)

Ряд 2

10A	16A
111	112

Занято: 2 мод. (по данным BOM)

- Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.
- Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.
- Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.
- Корпус NEXUS 24 модуля. Внешние размеры и фактическое расположение двух рядов не заданы в исходном BOM.

ЩВ1.1 | Спецификация


Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 125-143 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
126	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
127	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	шт	cnc	Управление
128	814185	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	1	шт	cnc	Ввод
129	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Управление
130	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	5	шт	cnc	Выход
131	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
132	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
133	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
134	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
135	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	1.8	м	harmony	Монтаж
136	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	0.8	м	harmony	Монтаж
137	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
138	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
139	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
140	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
141	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
142	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
143	монтажная работа	монтажная работа	73.2	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ЩВ1.1 | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 8. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

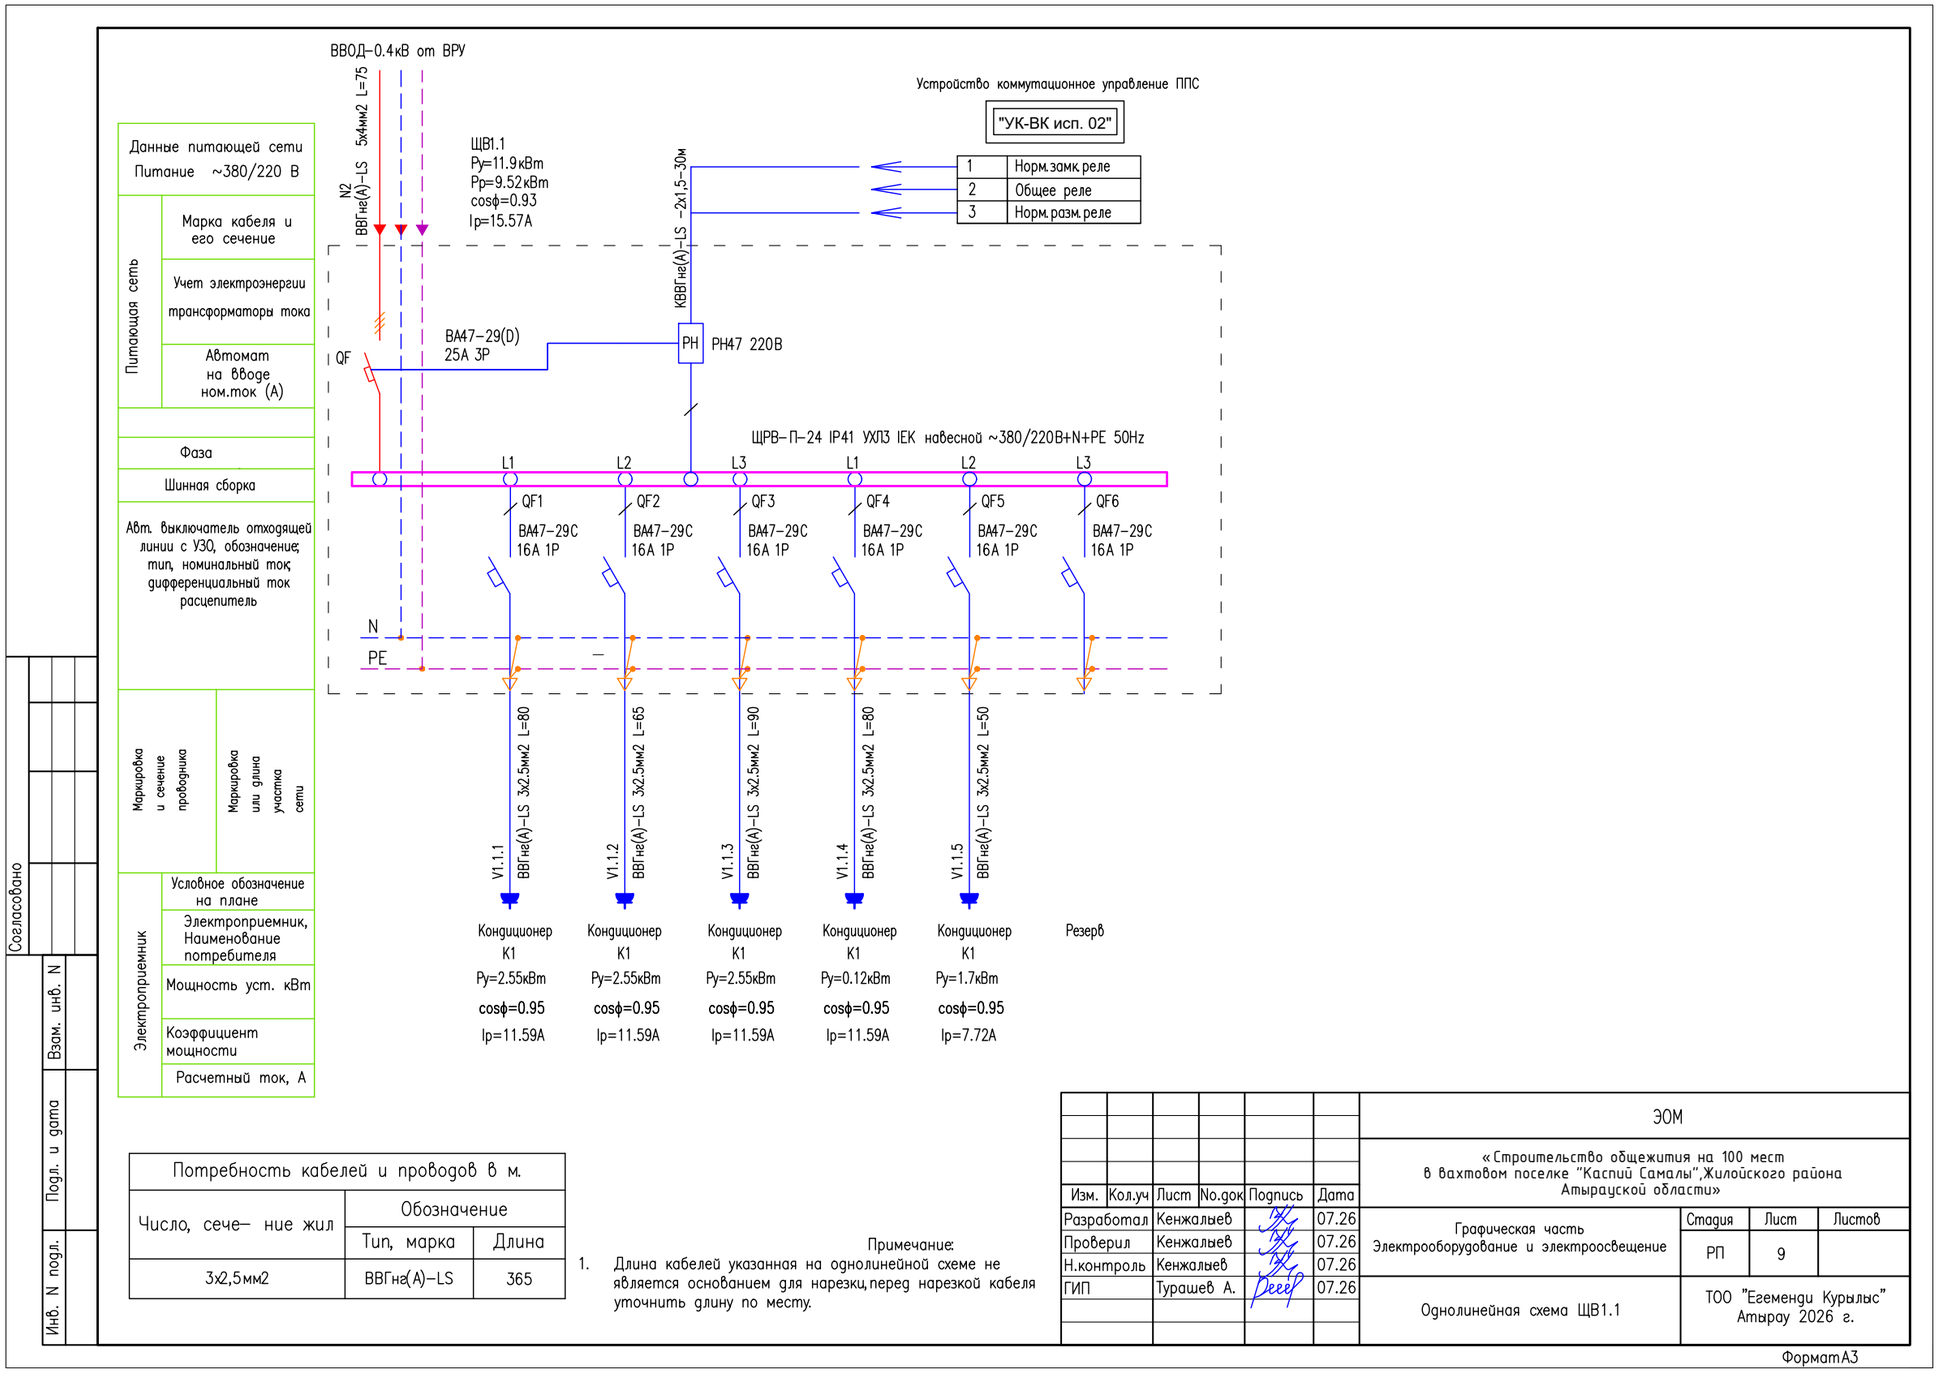

Потребность кабелей и проводов в м.		
Число, сече– ние жил	Обозначение	
	Тип, марка	Длина
3х2,5мм2	ВВГнг(А)–LS	365

Примечание:
1. Длина кабелей указанная на однолинейной схеме не является основанием для нарезки, перед нарезкой кабеля уточнить длину по месту.

Изм.	Кол.уч	Лист	No.док	Подпись	Дата
Разработал		Кенжалыев			07.26
Проверил		Кенжалыев			07.26
Н.контроль		Кенжалыев			07.26
ГИП		Турашев А.			07.26

ЭОМ

«Строительство общежития на 100 мест в вахтовом поселке "Каспий Самалы",Жилойского района Атырауской области»

Графическая часть Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	9	
Однолинейная схема ЩВ1.1	ТОО "Егеменди Курылыс" Атырау 2026 г.		

Формат А3

Схема проектная: марки IEK / BA и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ЩВ1.1 | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5

Ряд 1

PH	25A	6A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
127	128	129	130	130	130	130	130	131

Занято: 11 мод. (по данным BOM)

• Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.

• Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.

• Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.

• Корпус NEXUS 24 модуля. Внешние размеры и фактическое расположение двух рядов не заданы в исходном BOM.

• Расцепитель A011130 установить на ввод YCB7-63N; подтвердить совместимость, ширину и цепь управления от ППС.

ЩВ1.2 | Спецификация


Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 145-164 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
146	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
147	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	шт	cnc	Управление
148	814185	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	1	шт	cnc	Ввод
149	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Управление
150	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	3	шт	cnc	Выход
151	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	2	шт	cnc	Выход
152	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
153	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
154	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	1	шт	ekt	Монтаж
155	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
156	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	1.8	м	harmony	Монтаж
157	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	0.8	м	harmony	Монтаж
158	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
159	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
160	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
161	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
162	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
163	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
164	монтажная работа	монтажная работа	73.2	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ЩВ1.2 | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 9. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

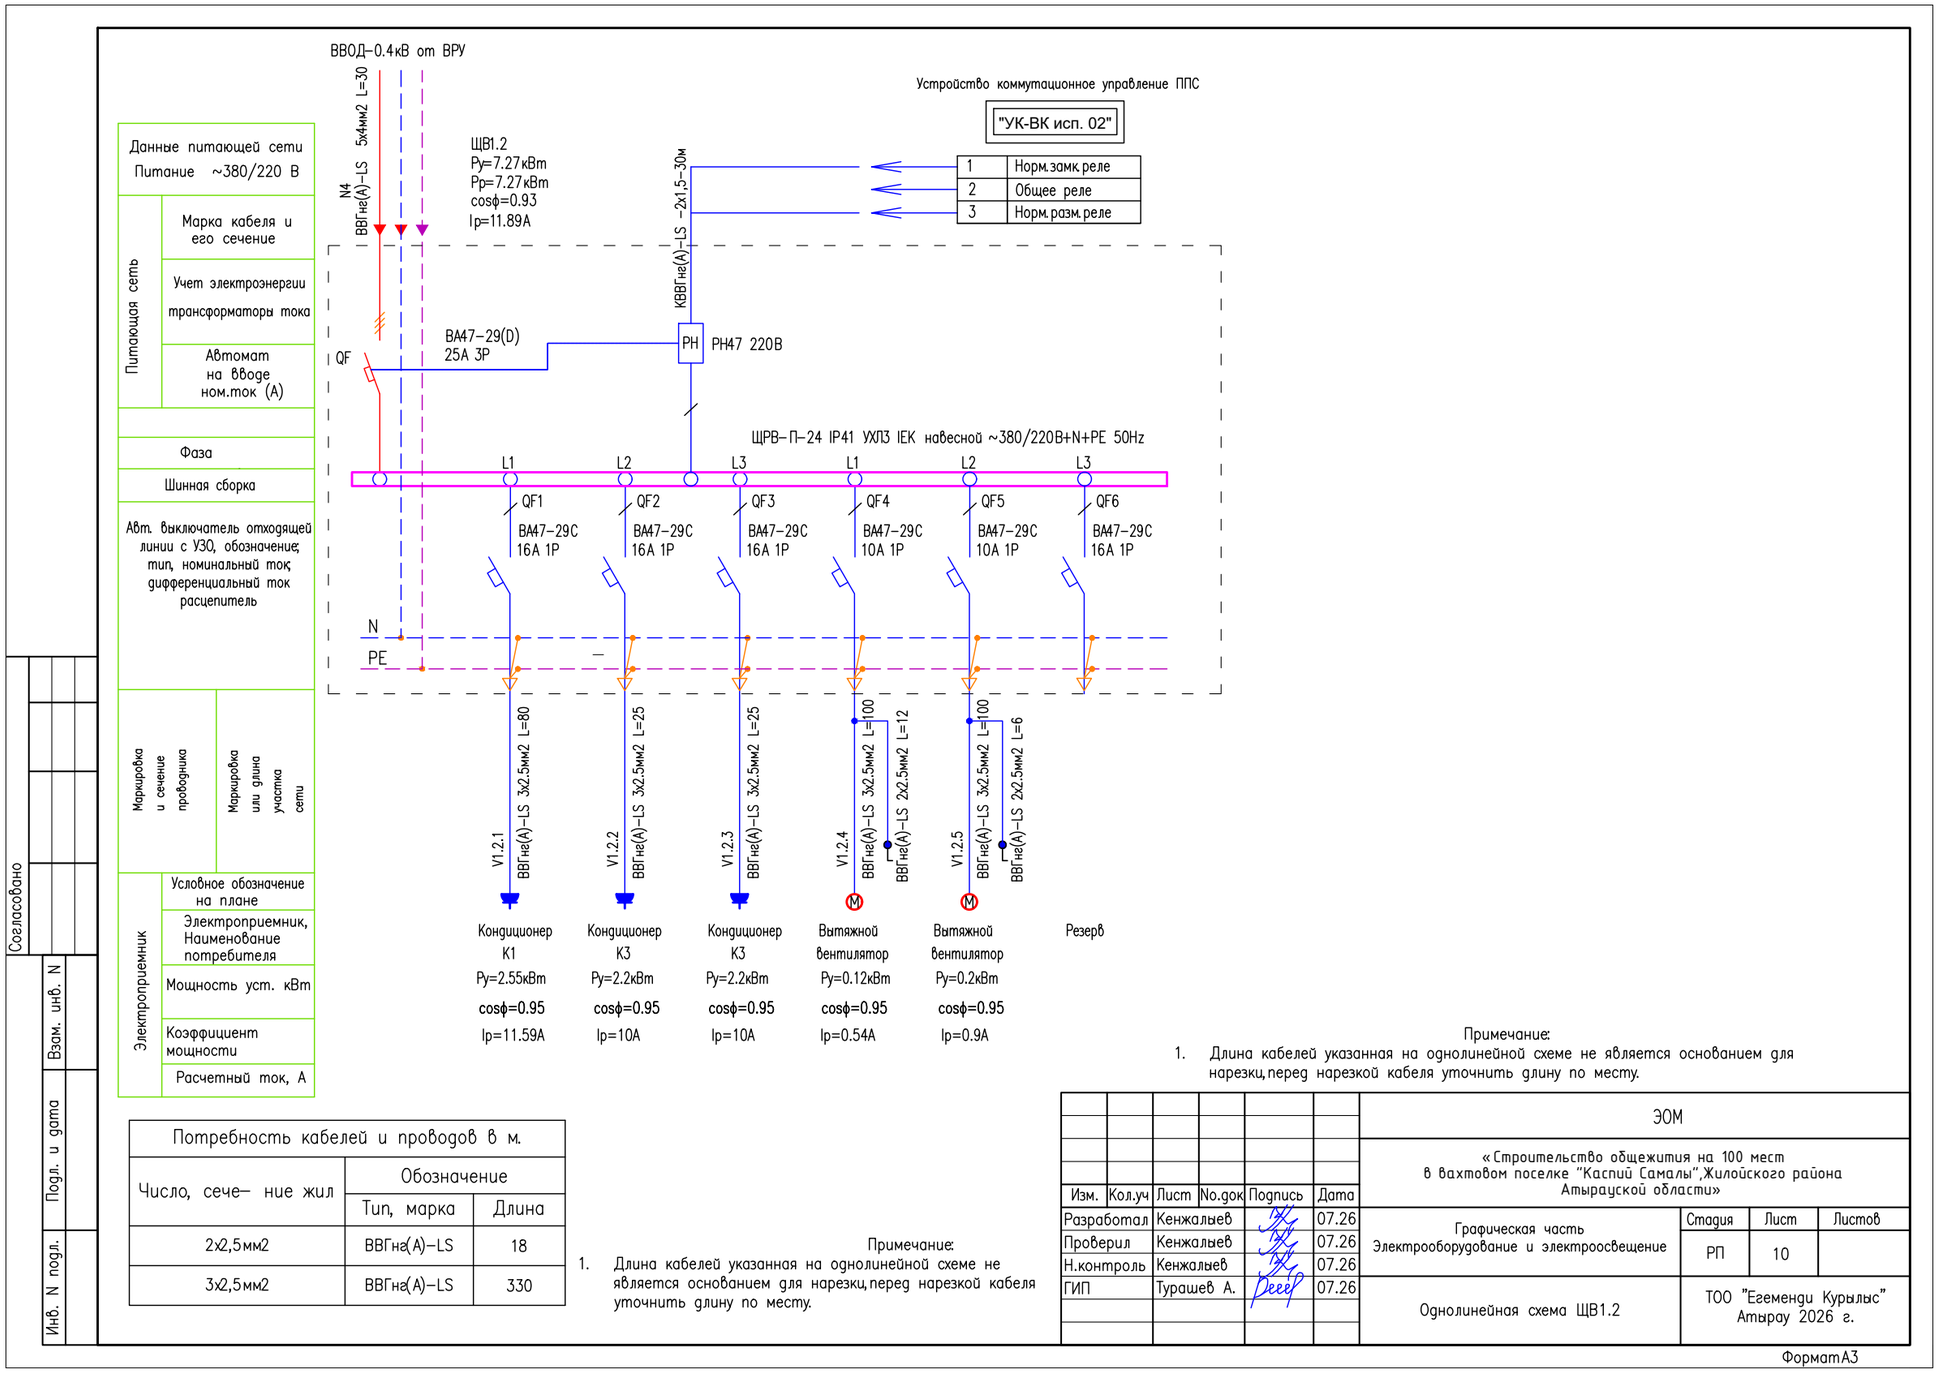

Потребность кабелей и проводов в м.		
Число, сече– ние жил	Обозначение	
	Тип, марка	Длина
2х2,5мм2	ВВГнг(А)–LS	18
3х2,5мм2	ВВГнг(А)–LS	330

Примечание:
1. Длина кабелей указанная на однолинейной схеме не является основанием для нарезки, перед нарезкой кабеля уточнить длину по месту.

Примечание:
1. Длина кабелей указанная на однолинейной схеме не является основанием для нарезки, перед нарезкой кабеля уточнить длину по месту.

Изм.	Кол.уч	Лист	No.док	Подпись	Дата
Разработал		Кенжалиев			07.26
Проверил		Кенжалиев			07.26
Н.контроль		Кенжалиев			07.26
ГИП		Турашев А.			07.26

ЭОМ

«Строительство общежития на 100 мест в вахтовом поселке "Каспий Самалы", Жилойского района Атырауской области»

Графическая часть Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	10	
Однолинейная схема ЩВ1.2	ТОО "Егеменди Курылыс" Атырау 2026 г.		

Формат А3

Схема проектная: марки IEK / BA и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ЩВ1.2 | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5

Ряд 1

PH	25A	6A	16A	16A	16A	10A	10A	16A
147	148	149	150	150	150	151	151	152

Занято: 11 мод. (по данным BOM)

• Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.

• Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.

• Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.

• Корпус NEXUS 24 модуля. Внешние размеры и фактическое расположение двух рядов не заданы в исходном BOM.

• Расцепитель A011130 установить на ввод YCB7-63N; подтвердить совместимость, ширину и цепь управления от ППС.

ЩВ2.1 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 166-186 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
167	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
168	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	шт	cnc	Управление
169	814186	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	1	шт	cnc	Ввод
170	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Управление
171	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	7	шт	cnc	Выход
172	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
173	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
174	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
175	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
176	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
177	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
178	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	1.8	м	harmony	Монтаж
179	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
180	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
181	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
182	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
183	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
184	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
185	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
186	монтажная работа	монтажная работа	85.2	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ЩВ2.1 | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 10. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

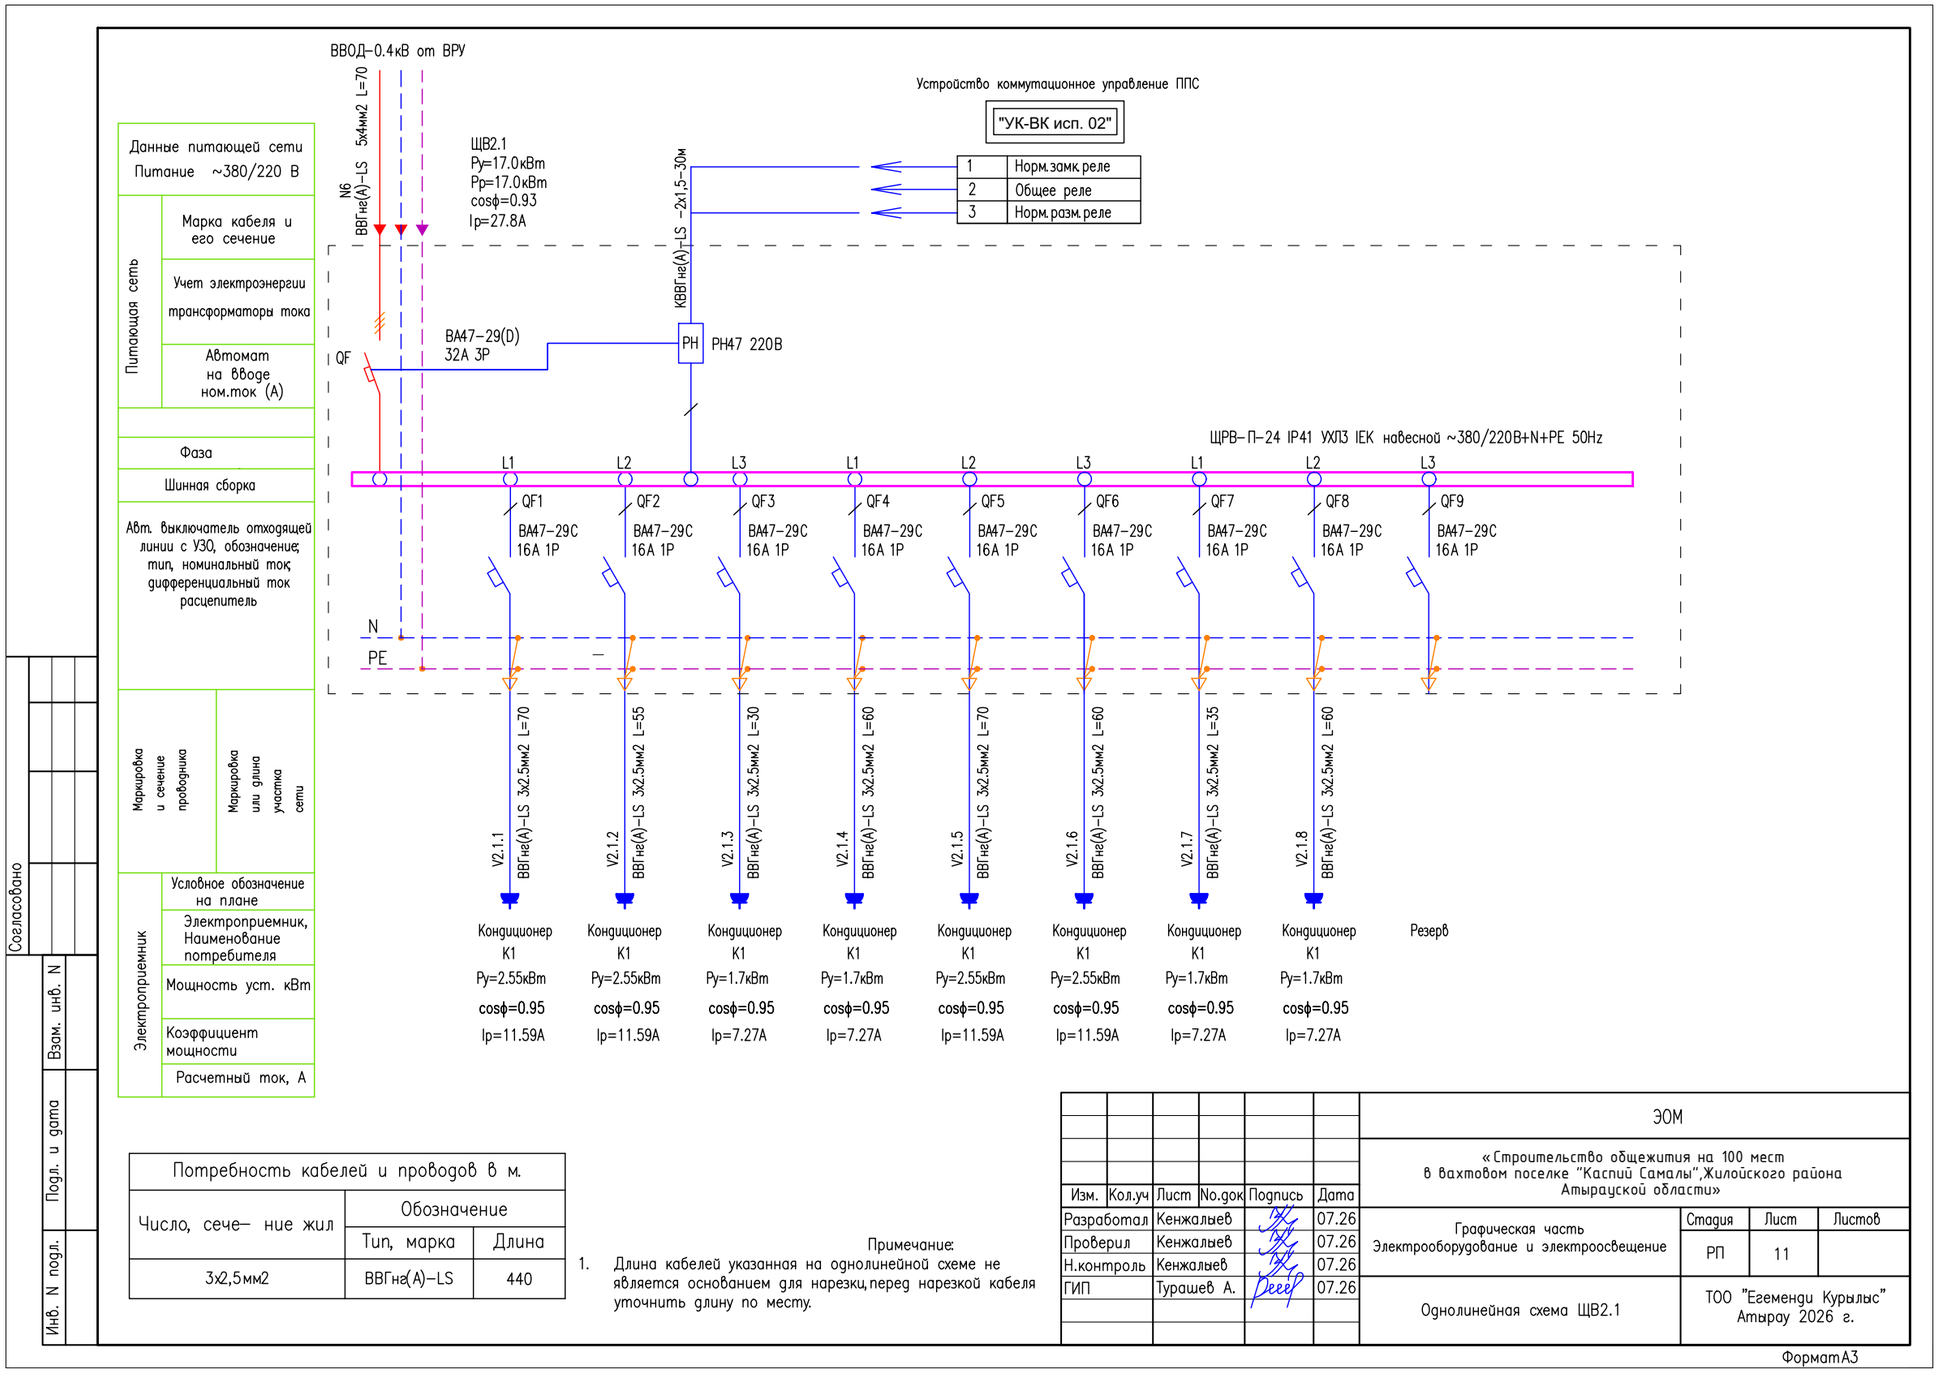


Схема проектная: марки IEK / BA и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ЩВ2.1 | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5

Ряд 1

PH	32A	6A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
168	169	170	171	171	171	171	171	171	171

Занято: 12 мод. (по данным BOM)

Ряд 2

16A	16A
172	173

Занято: 2 мод. (по данным BOM)

• Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.

• Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.

• Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.

• Корпус NEXUS 24 модуля. Внешние размеры и фактическое расположение двух рядов не заданы в исходном BOM.

• Расцепитель A011130 установить на ввод YCB7-63N; подтвердить совместимость, ширину и цепь управления от ППС.

ЩВ2.2 | Спецификация

Количество щитов: 1 | Источник: BOM, строки 188-208 | Количество на 1 щит

BOM	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Производитель	Роль
189	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	шт	teksan f	Корпус
190	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	шт	cnc	Управление
191	814186	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	1	шт	cnc	Ввод
192	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Управление
193	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	7	шт	cnc	Выход
194	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Выход
195	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	шт	cnc	Резерв
196	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
197	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	1	шт	ekt	Монтаж
198	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
199	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	1	шт	chint	Монтаж
200	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	1.8	м	harmony	Монтаж
201	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.8	м	harmony	Монтаж
202	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	0.5	м	harmony	Монтаж
203	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
204	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	1	упак	ekt	Монтаж
205	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	2	шт	ekt	Монтаж
206	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	1	упак	ekt	Монтаж
207	монтажный материал	монтажный материал	1	шт	монтажный материал	Работы
208	монтажная работа	монтажная работа	85.2	мин	монтажная работа	Работы

Артикулы и марки - из предоставленного BOM; количества - из совпадающих строк полного BOM.

ЩВ2.2 | Исходная однолинейная схема

Проект ЭОМ, PDF «dla bom», страница 11. Комплектация CNC приведена на предыдущей странице.

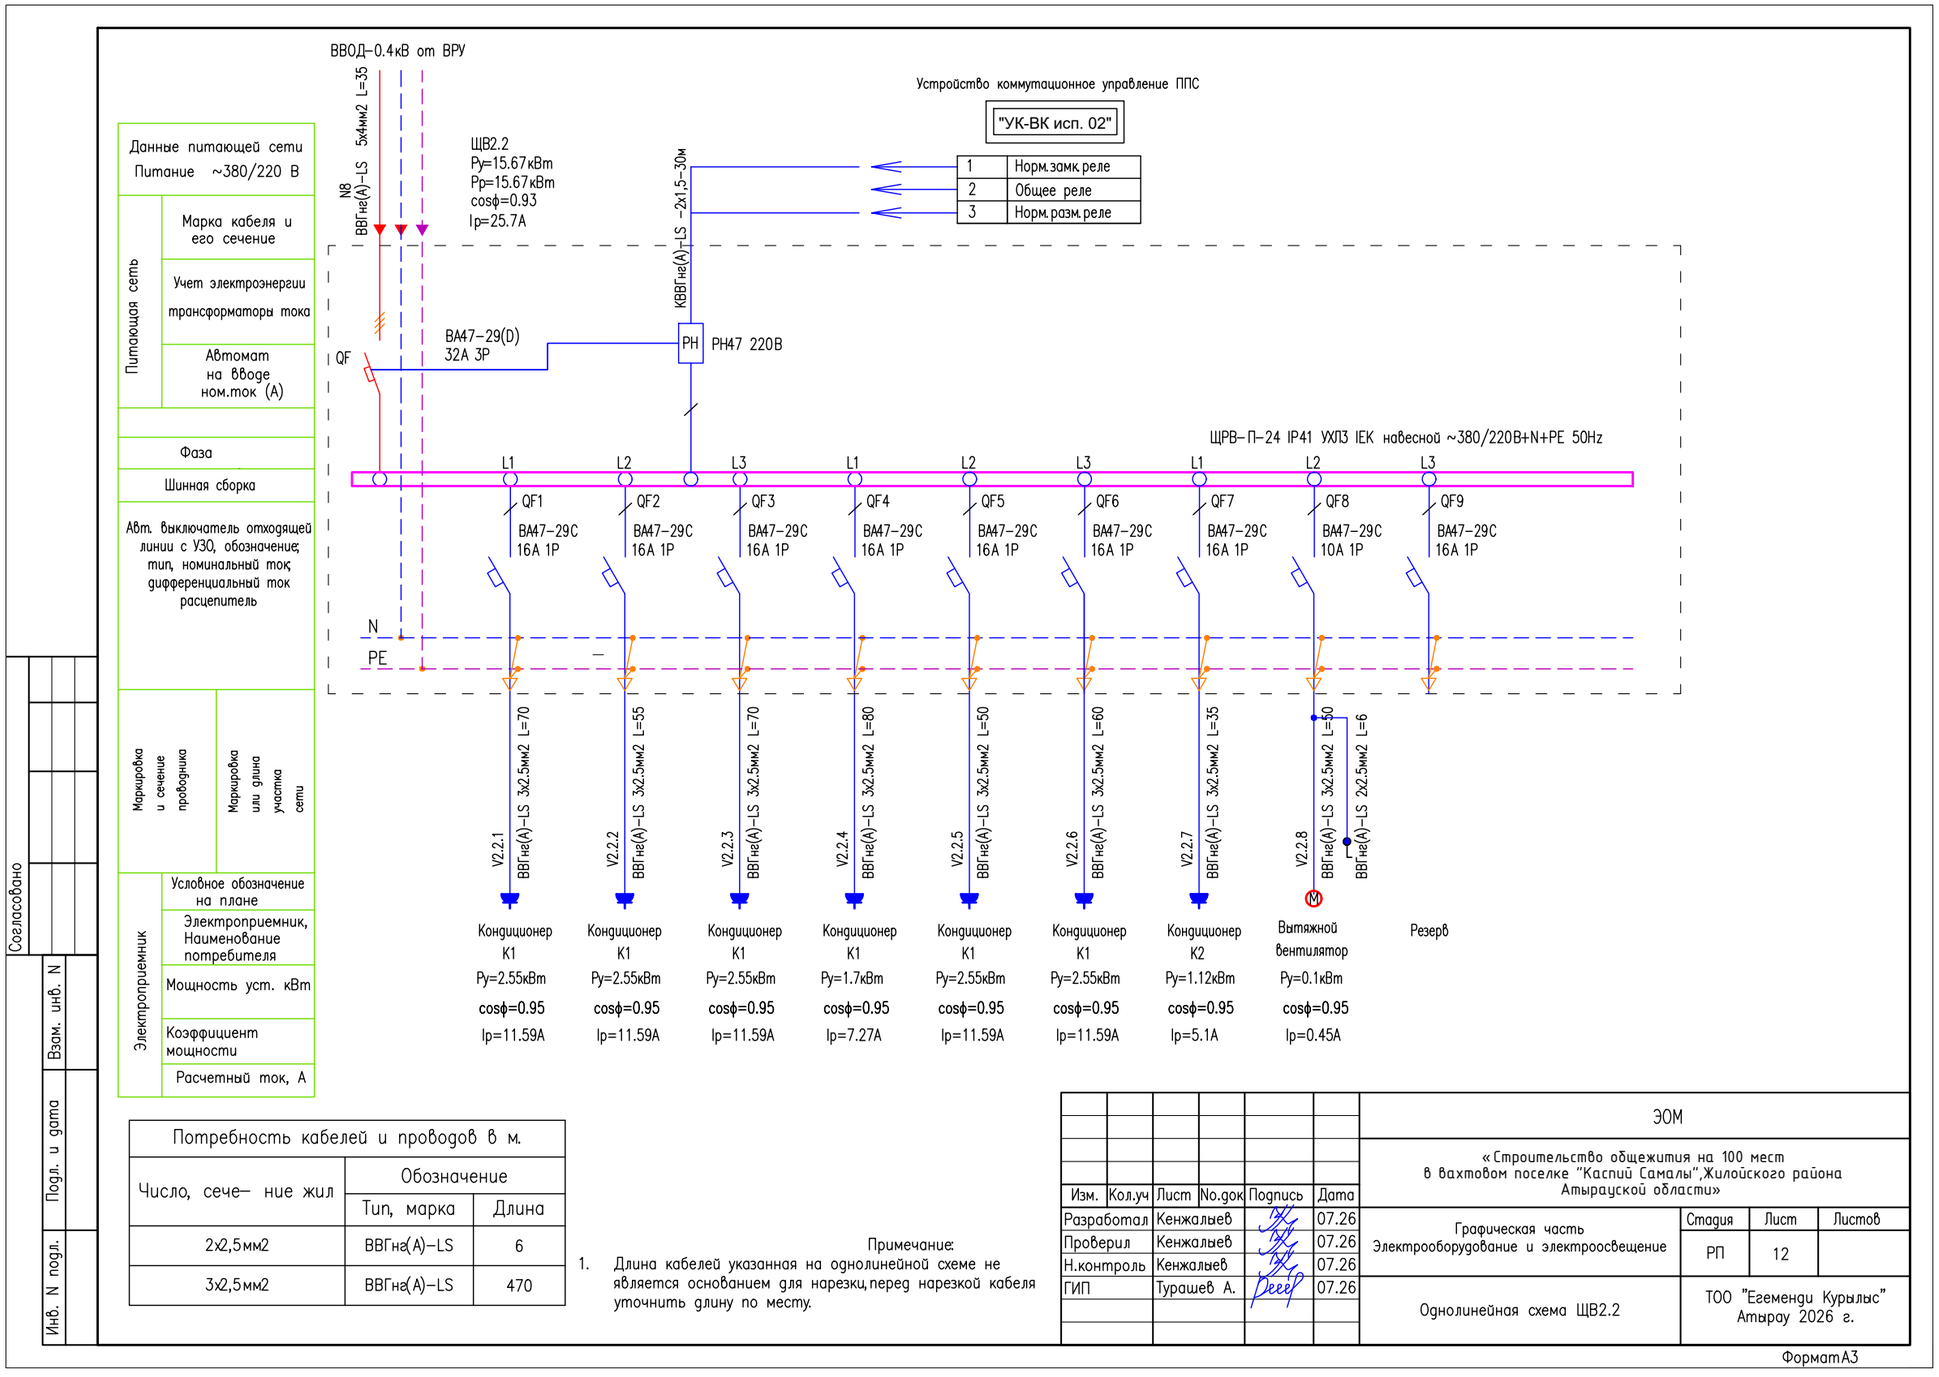


Схема проектная: марки IEK / BA и другие обозначения сохранены. Дополнительные цепи индикации и защиты расцепителя по BOM требуют отдельной рабочей схемы.

ЩВ2.2 | Предварительная компоновка

Условное расположение по рядам BOM. Не является монтажным чертежом; масштаб не задан.

DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5

Ряд 1

PH	32A	6A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
190	191	192	193	193	193	193	193	193	193

Занято: 12 мод. (по данным BOM)

Ряд 2

10A	16A
194	195

Занято: 2 мод. (по данным BOM)

• Числа внутри блоков: номера строк BOM. Каждый блок соответствует одному аппарату.

• Шины N и PE: отдельные узлы по спецификации. Размещение клемм, каналов и вводов уточняется после выбора монтажной платы.

• Габариты аппаратов и зазоры не подтверждены каталогом; компоновка показывает только состав и порядок рядов.

• Корпус NEXUS 24 модуля. Внешние размеры и фактическое расположение двух рядов не заданы в исходном BOM.

• Расцепитель A011130 установить на ввод YCB7-63N; подтвердить совместимость, ширину и цепь управления от ППС.

Вопросы для согласования и запуска в производство

№	Область	Решение / подтверждение
01	Все щиты	Одобрить марки и артикулы CNC / TEKSAN / NEXUS вместо проектных IEK и BA. Проектные схемы приложены без изменения.
02	ВРУ	Подтвердить схему двух вводов Q1/Q2, порядок переключения и блокировки. Не допускать неоговоренного параллельного включения источников.
03	ВРУ	Одобрить добавленные 2 × 3P C6 и 6 фазных индикаторов. Выпустить рабочую схему защиты и подключения индикации.
04	ЩВ1.1–ЩВ2.2	Подтвердить расцепитель A011130 и его напряжение управления; выпустить схему ППС/УК-ВК и защиты 1P C6, добавленной в BOM.
05	Все щиты	Проверить отключающую способность 4,5/6 кА по расчетному току КЗ и селективность защит. Расчет КЗ не представлен.
06	ВРУ	Подтвердить тепловую и электродинамическую стойкость медных шин 3×20, количество полос, опоры и соединения.
07	Все щиты	Утвердить монтажные чертежи после проверки размеров аппаратов, каналов, клемм и кабельного пространства. Компоновки в этом файле предварительные.
08	ЩО / ЩВ	Подтвердить NEXUS DX10-M24SBB: габариты, IP, исполнение монтажа, полезные размеры и посадку расцепителя.
09	Все щиты	Количество сверено с полным BOM cl. Метраж проводов и шин, монтажные материалы и труд - расчетные значения, уточняются в рабочей документации.

Источники и лист согласования

S1 | Актуальная комплектация

261009_Atyrau_KaspiySamaly_Obshejitie_CNC_BOM cl dla uod.xlsx; BOM, 209 строк. Предоставлен пользователем. Приоритет для артикулов, описаний, марок, ролей и примечаний.

S2 | Количества и порядок рядов

261009_Atyrau_KaspiySamaly_Obshejitie_CNC_BOM cl.xlsx; BOM, H - количество, T - ряд, U - ширина, AK - модули. Все 208 строк после заголовка совпадают с S1 по A:D.

S3 | Проектные схемы

ЭОМ Общежитие - dla bom.pdf; 14 страниц. Страницы 2–11: ВРУ, ЩС, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2. Исходные модели сохранены.

Согласование действительно для R1 после закрытия вопросов 01–09. Изменения артикулов, количества, корпуса или схемы оформляются новой ревизией.

Решение заказчика	Отметка
Согласовано после закрытия замечаний	☐
Согласовано с замечаниями (приложить перечень)	☐
Требуется корректировка	☐

Заказчик: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Изготовитель: _____ Подпись: _____ Дата: _____
