TEKLED

Согласование изготовления

КАСПИЙ САМАЛЫ

Общежитие на 100 мест | Атырауская область

261009	10	R4
ПРОЕКТ	ЩИТОВ	РЕВИЗИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕ РАЗРЕШЕНО

Сначала закройте вопросы STOP. Затем подпишите допуск на странице 48.

В комплекте: оборудование, схемы, внешний вид и монтаж.
Решения заказчика: страницы 3-6. Чертежи щитов: страницы 7-46.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-00-TITLE | R4 | 1 / 48

Реестр щитов и навигация

Щит	Кол.	Ввод BOM	Перечень	Схема EL	Вид GA	Монтаж PL
ВРУ	1	3P 200 A / 3P 200 A	7	8	9	10
ЩС	1	3P C25 A	11	12	13	14
ЩО1.1	1	3P C32 A	15	16	17	18
ЩО1.2	1	3P C32 A	19	20	21	22
ЩО2.1	1	3P C32 A	23	24	25	26
ЩО2.2	1	3P C32 A	27	28	29	30
ЩВ1.1	1	3P D25 A	31	32	33	34
ЩВ1.2	1	3P D25 A	35	36	37	38
ЩВ2.1	1	3P D32 A	39	40	41	42
ЩВ2.2	1	3P D32 A	43	44	45	46

3-6: вопросы и ответы заказчика. 47: источники и нормативная база. 48: решение и допуск.
Для каждого щита перечень сразу сопровождается его схемой. Черные крышки NEXUS - по BOM; внешние размеры не назначены.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-00-INDEX | R4 | 2 / 48

Решения до изготовления | 1 / 4

STOP: заполните все решения до изготовления.

№	Щит / цепь	Решение заказчика	Ответ / документ / дата
01	Все щиты	Укажите систему заземления, место разделения PEN и подключение N/PE.	_____ _____
02	ВРУ	Укажите InA, расчетную нагрузку и режим работы двух вводов ВРУ.	_____ _____
03	Все щиты	Укажите Ik. Проверьте CNC: YCB6 4,5 кА; YCB7 6 кА; YCM1 по паспорту. Подтвердите замену BA88-35 35 кА и селективность.	_____ _____
04	ЩО	Выберите ввод ЩО: C25 или C32. Схема и BOM: C32; ЭОМ.СО: C25.	_____ _____
05	8 щитов NEXUS	Укажите размеры и IP NEXUS. Подтвердите рейки, глубину и размещение 2×12 модулей.	_____ _____
06	8 щитов NEXUS	Выберите монтаж NEXUS: встраиваемый или навесной. Подтвердите замену IEK на NEXUS.	_____ _____

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Решения до изготовления | 2 / 4

STOP: заполните все решения до изготовления.

№	Щит / цепь	Решение заказчика	Ответ / документ / дата
07	ВРУ QF13	Выберите назначение QF13: уличное освещение или резерв. Для освещения укажите нагрузку и кабель.	_____ _____
08	ВРУ Q1/Q2	Выберите режим переключения Q1/Q2. Подтвердите блокировку или АВР, исключающие недопустимую параллельную работу.	_____ _____
09	4 щита ЩВ	Подтвердите A011130 с YCB7-63N: BOM AC230/400V; проект PH47 220 В. Укажите ширину, сторону монтажа и схему подключения.	_____ _____
10	ЩВ / ППС	Укажите питание SF1 и контакт УК-ВК. Определите отключение ЩВ при пожаре и потере питания.	_____ _____
11	ВРУ / ЩС	Подтвердите монтажные платы и IP корпусов ВРУ/ЩС. Размеры плат 500×1500 и 300×400 предложены.	_____ _____
12	Все щиты	Укажите применимые нормы Казахстана и часть серии IEC 61439. Согласуйте проверки и протоколы.	_____ _____

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-00-Q2 | R4 | 4 / 48

Проверки перед допуском | 3 / 4

КОНТРОЛЬ: подтвердите или укажите исправление до допуска.

№	Щит / цепь	Решение заказчика	Ответ / документ / дата
13	ВРУ N1-N9	Подтвердите защиту кабелей 5×4 мм² автоматами C40/C32 с учетом прокладки и падения напряжения.	_____ _____
14	ЩС / ЩВ	Подтвердите защиту от перегрузки насосов ЩС гр.2/3 и вентиляторов V1.2.4/5, V2.2.8.	_____ _____
15	ВРУ HL1-HL6	Подтвердите 6 ламп и 2 автомата 3P C6. Выберите подключение до или после Q1/Q2; укажите N.	_____ _____
16	ВРУ дверь	Подтвердите центры отверстий двери: x=180/300/420, y=250/450 от левого/верхнего края; Ø22. Проверьте глубину до сверления.	_____ _____
17	ВРУ шины	Подтвердите шины Cu 3×20: число полос, ток, нагрев, стойкость КЗ, опоры и изоляцию.	_____ _____
18	ВРУ / ЩС	Подтвердите внутреннее размещение и кабельные зазоры. Канал ЩС 30 мм отсутствует в BOM и предложен.	_____ _____

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Проверки перед допуском | 4 / 4

КОНТРОЛЬ: подтвердите или укажите исправление до допуска.

№	Щит / цепь	Решение заказчика	Ответ / документ / дата
19	Все щиты	Выберите прямое подключение или клеммники. Укажите кабельные вводы: сторону, количество, диаметры и обозначения N/PE.	_____ _____
20	Все щиты	Укажите RAL, замок, надписи и условия среды. IP нового ВРУ уточнить; ЩС: IP54 по BOM.	_____ _____
21	CNC / NEXUS	Подтвердите размеры закупаемых CNC/NEXUS. Ширина A011130 18 мм условная; вместимость NEXUS не подтверждена.	_____ _____
22	ЩВ1.1 V1.1.4	Уточните V1.1.4: в проекте 0,12 кВт, cosφ=0,95 и 11,59 А. Значения не согласуются.	_____ _____
23	ВРУ / ЩС	Уточните нагрузку ЩС: ВРУ N9 — 2,82 кВт / 4,6 А; лист ЩС — 1,87 кВт / 3,1 А.	_____ _____
24	Защита людей	Подтвердите необходимость УЗО/дифавтоматов по условиям объекта. В BOM они отсутствуют.	_____ _____

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

ВРУ | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
3	719-15437	Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база)	1	Корпус
4	B000096	Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300	2	Ввод
5	296831	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	6	Отходящий
6	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	2	Отходящий
7	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	Отходящий
8	296827	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв
9	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	Отходящий
10	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	2	Отходящий
11	296825	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 6A 4.5kA х-ка C	2	Управление
12	E010209	Индикатор желтый AC/DC230B AD22-22D Y	2	Управление
13	E010207	Индикатор зеленый AC/DC230B AD22-22D G	2	Управление
14	E010208	Индикатор красный AC/DC230B AD22-22D R	2	Управление

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P 200 A; 3P 200 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	600×1600×400 + база100; IP ?
Установка	ВРУ: напольный
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.2, проектный лист 3
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 07-11

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.


Геометрия C: каталог CNC. Координаты, монтажная плата и кабельные зоны D: предложения для согласования.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-01-BOM | R4 | 7 / 48

ВРУ | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

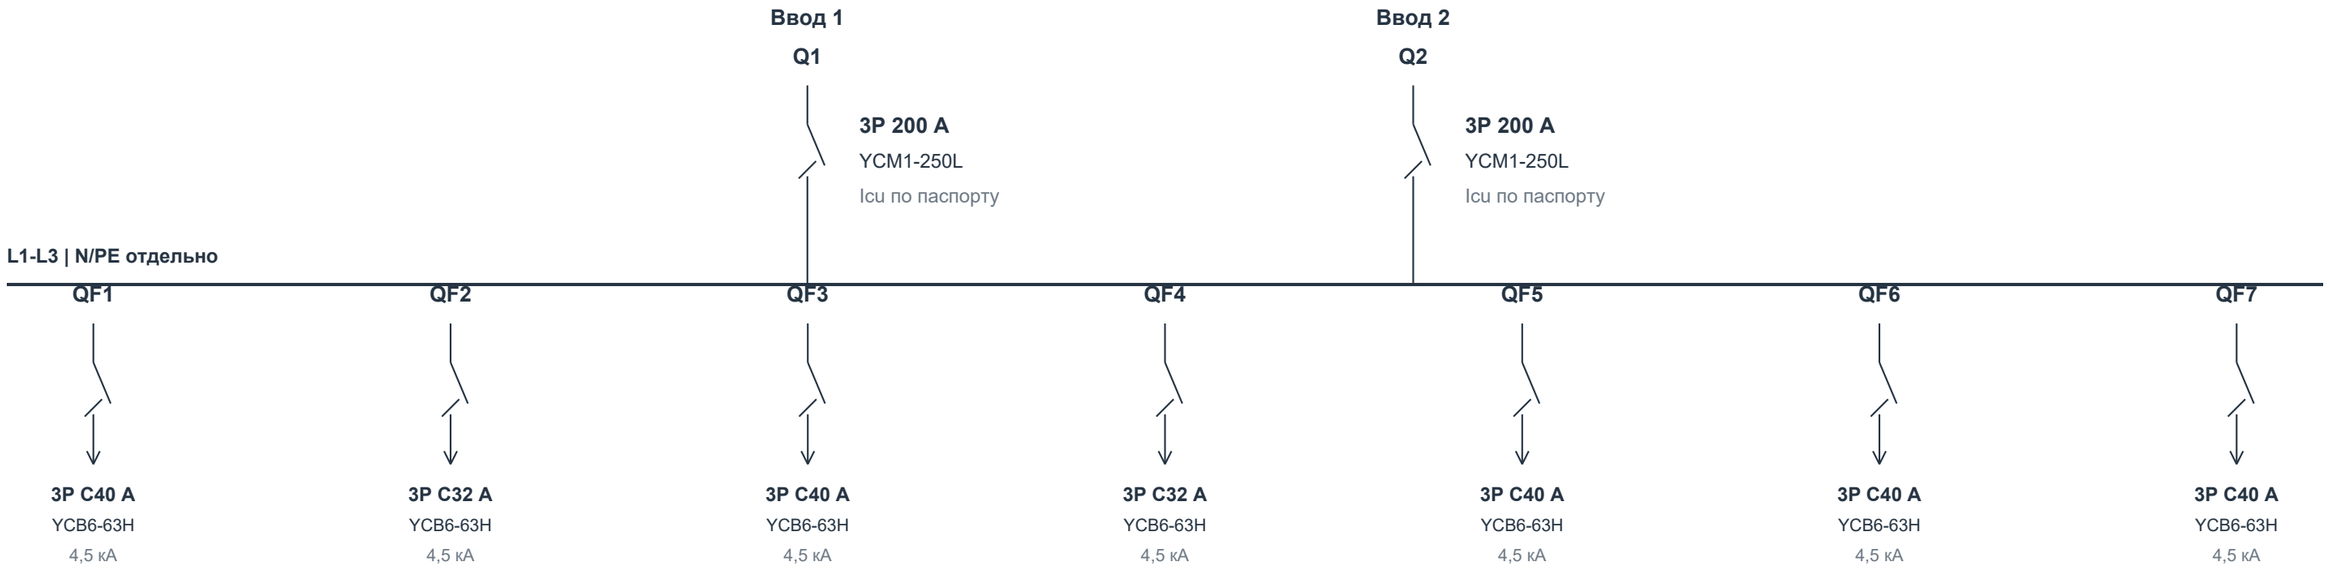

N1 | 3P
ЩО1.1
5×4 мм²
Ру 15,236 кВт | Ip 18,68 А

N2 | 3P
ЩВ1.1
5×4 мм²
Ру 11,9 кВт | Ip 15,57 А

N3 | 3P
ЩО1.2
5×4 мм²
Ру 9,48 кВт | Ip 10,84 А

N4 | 3P
ЩВ1.2
5×4 мм²
Ру 7,27 кВт | Ip 11,89 А

N5 | 3P
ЩО2.1
5×4 мм²
Ру 11 кВт | Ip 11,77 А

N6 | 3P
ЩВ2.1
5×4 мм²
Ру 17 кВт | Ip 27,8 А

N7 | 3P
ЩО2.2
5×4 мм²
Ру 18,1 кВт | Ip 19,79 А



N8 | 3P
ЩВ2.2
5×4 мм²
Ру 15,67 кВт | Ip 25,7 А

N9 | 3P
ЩС
5×4 мм²
Ру 2,82 кВт | Ip 4,6 А

N10 | L?
ППКОП
3×1,5 мм²
Ру 0,1 кВт | Ip 0,4 А

N11 | L?
ВН
3×2,5 мм²
Ру 2 кВт | Ip 9,1 А

N12 | L?
ЯТП
3×2,5 мм²
Ру 0,25 кВт | Ip 1 А

QF13 | 3P
Улица / резерв: 07
? мм²
Ру - кВт | Ip - А

SF1/SF2: 3P C6 → HL1-HL3 / HL4-HL6 (L1/L2/L3), возврат N. Отбор до/после Q1/Q2: 15. QF13: уличное освещение / резерв, решение STOP 07.

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.2. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-01-EL | R4 | 8 / 48


ВРУ | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ВИД СПЕРЕДИ

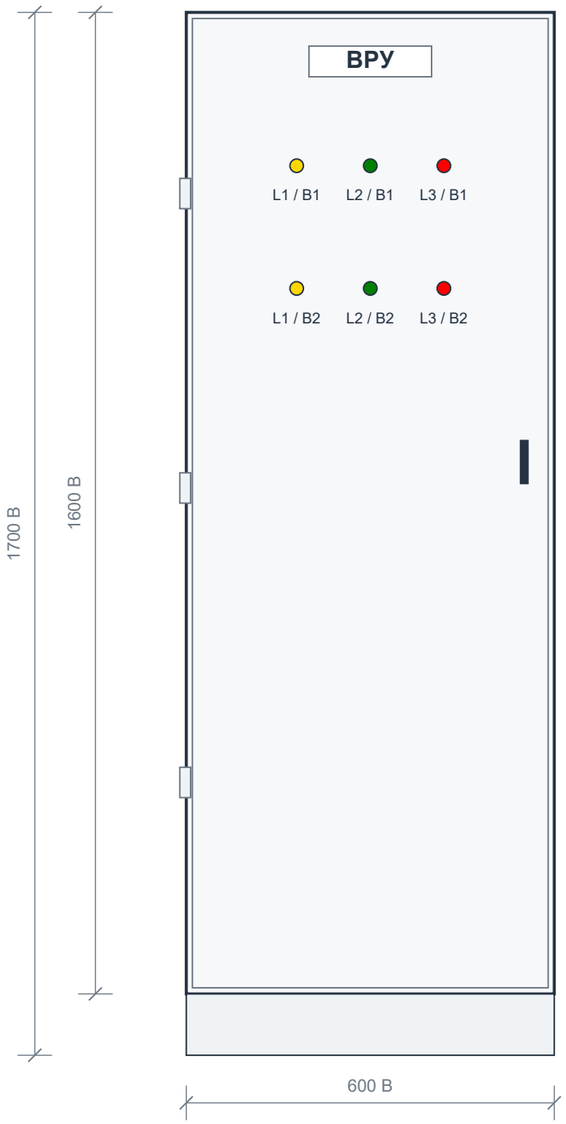

ВИД СБОКУ

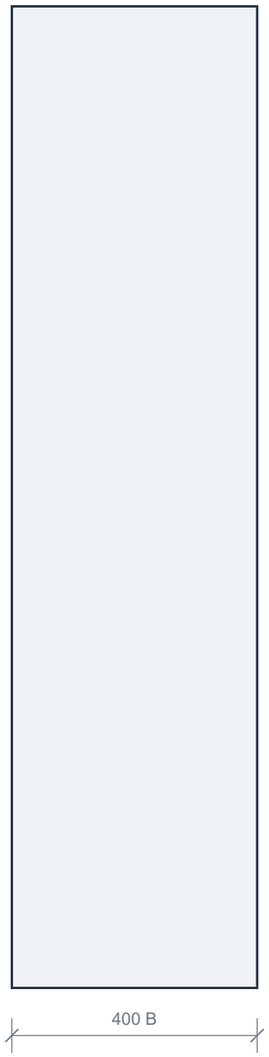

• Корпус: Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база)

• Все внешние размеры B взяты из BOM. Контур двери, петли и замок показаны условно; отверстия крепления корпуса не заданы.

• 6 индикаторов AD22-22D: два ряда по три фазы. Центры D: x = 180 / 300 / 420; y = 250 / 450 от верхнего левого угла двери.

• Отверстия индикаторов Ø22 по каталогу AD22; проверить исполнение приобретенного изделия и заднюю глубину перед сверлением.


• База 100 B. Исполнение IP корпуса требует подтверждения; в проекте IP31.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-01-GA | R4 | 9 / 48

ВРУ | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

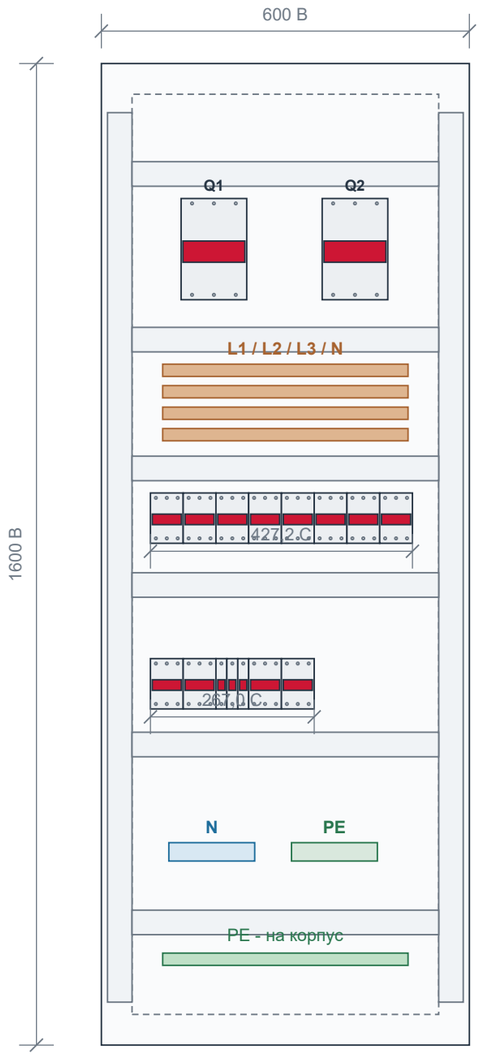

Аппарат	Модель	BOM	x D	y D	Габарит C
Q1	YCM1-250L	4	130	220	107 × 165
Q2	YCM1-250L	4	360	220	107 × 165
QF1	YCB6-63H	5	80	700	53.4 × 82
QF3	YCB6-63H	5	133.4	700	53.4 × 82
QF5	YCB6-63H	5	186.8	700	53.4 × 82
QF6	YCB6-63H	5	240.2	700	53.4 × 82
QF7	YCB6-63H	5	293.6	700	53.4 × 82
QF8	YCB6-63H	5	347	700	53.4 × 82
QF2	YCB6-63H	6	400.4	700	53.4 × 82
QF4	YCB6-63H	6	453.8	700	53.4 × 82
QF9	YCB6-63H	7	80	970	53.4 × 82
QF13	YCB6-63H	8	133.4	970	53.4 × 82
QF10	YCB6-63H	9	186.8	970	17.8 × 82
QF11	YCB6-63H	10	204.6	970	17.8 × 82
QF12	YCB6-63H	10	222.4	970	17.8 × 82
SF1	YCB6-63H	11	240.2	970	53.4 × 82
SF2	YCB6-63H	11	293.6	970	53.4 × 82

• Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Все координаты D - предложение для согласования.

• Пунктир: монтажная плата по расчетным данным KURALLAR. Положение каналов - проектное; сверление корпуса/платы не задано.


• Канал ВРУ 40×40 - по BOM; для ЩС зоны 30 мм зарезервированы условно и требуют согласования комплектации.

• YCM1-250L: 107×165×86 C. Проверить клеммные барьеры и запас изгиба провода 70 мм².

• Ряд 2 = 427,2 мм, ряд 3 = 267,0 мм. Каталог: 17,8 мм на полюс; в BOM применено 17,5 мм.


• Шины: Cu 3×20 по BOM. Отдельно подтвердить опоры, полосы, изоляцию и тепловой расчет.

DIN 2: увеличенный вид 1:3



Ширина 427,2 мм C

DIN 3: увеличенный вид 1:3



Ширина 267,0 мм C

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-01-PL | R4 | 10 / 48

ЩС | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
35	719-15425	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	1	Корпус
36	296829	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 25A 4.5kA х-ка C	1	Ввод
37	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Отходящий
38	814183	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кA х-ка D	2	Отходящий
39	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P C25 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	400×500×220; IP54 по BOM
Установка	Способ монтажа подтвердить
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.3, проектный лист 4
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 11,23

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).


Геометрия C: каталог CNC. Координаты, монтажная плата и кабельные зоны D: предложения для согласования.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-02-BOM | R4 | 11 / 48

ЩС | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

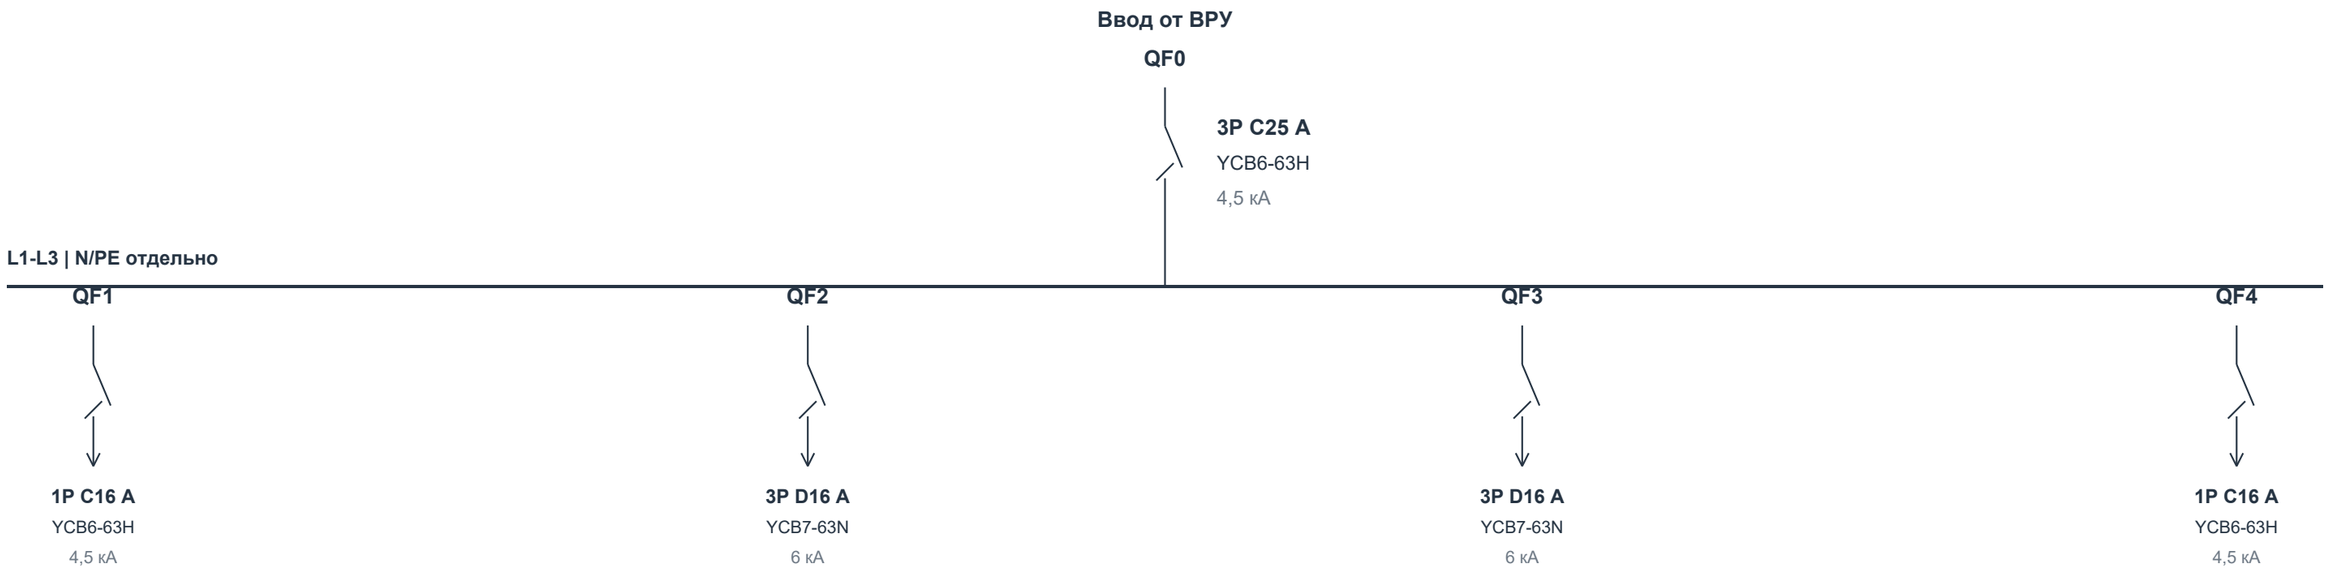

гр.1 | L1
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,77 кВт | Ip 3,5 А

гр.2 | 3P
Цирк. насос рабочий
5×2,5 мм²
Ру 1,1 кВт | Ip 1,96 А

гр.3 | 3P
Цирк. насос резервный
5×2,5 мм²
Ру 1,1 кВт | Ip 0 А

Резерв | L1
Резерв
- мм²
Ру - кВт | Ip - А

N и PE - отдельные шины по BOM. Тип сети и фазировку резервной линии подтвердить. Клеммная схема не назначена (19).

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.3. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-02-EL | R4 | 12 / 48


ЩС | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ВИД СПЕРЕДИ

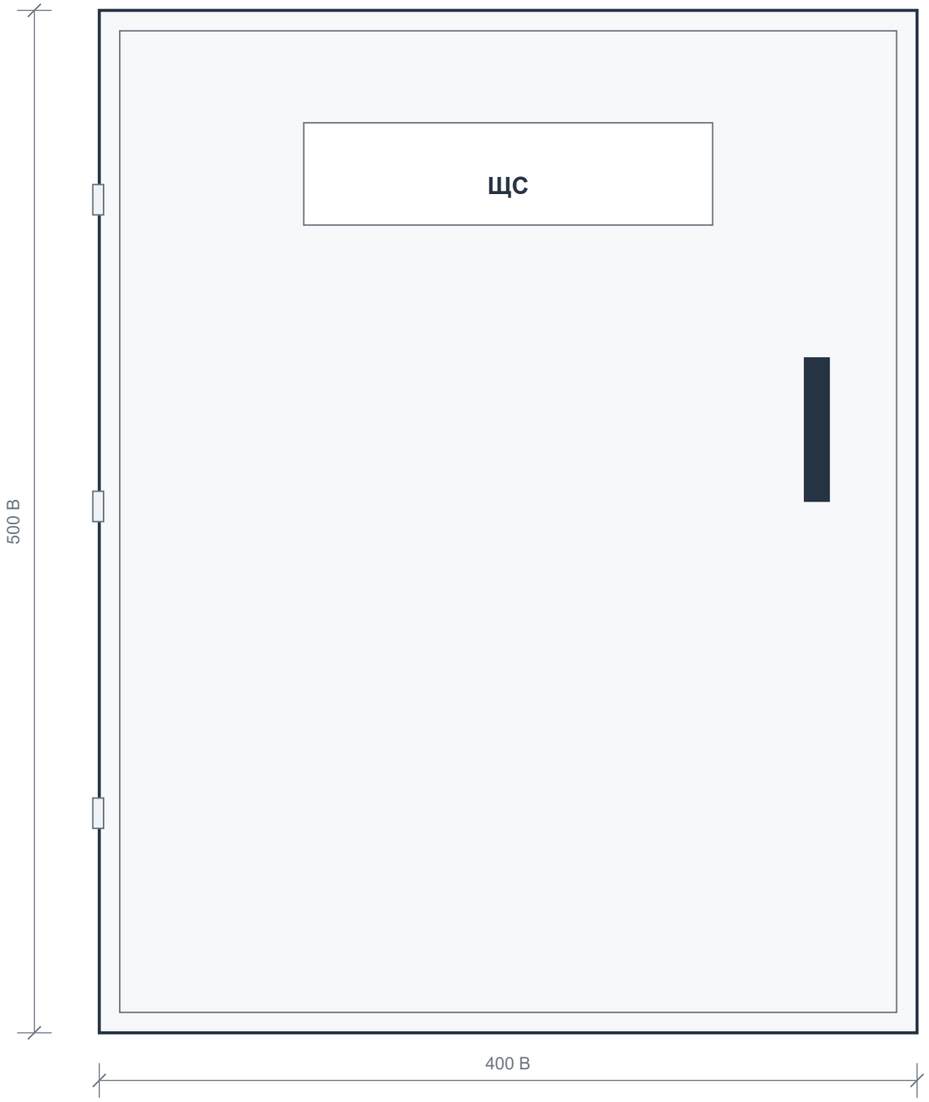

ВИД СБОКУ



• Корпус: Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54

• Все внешние размеры В взяты из BOM. Контур двери, петли и замок показаны условно; отверстия крепления корпуса не заданы.

• IP54 по BOM. На дверь не добавлены приборы управления, отсутствующие в BOM.


• Надпись щита размещена по центру. Габариты таблички и расположение замка согласовать.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-02-GA | R4 | 13 / 48

ЩС | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

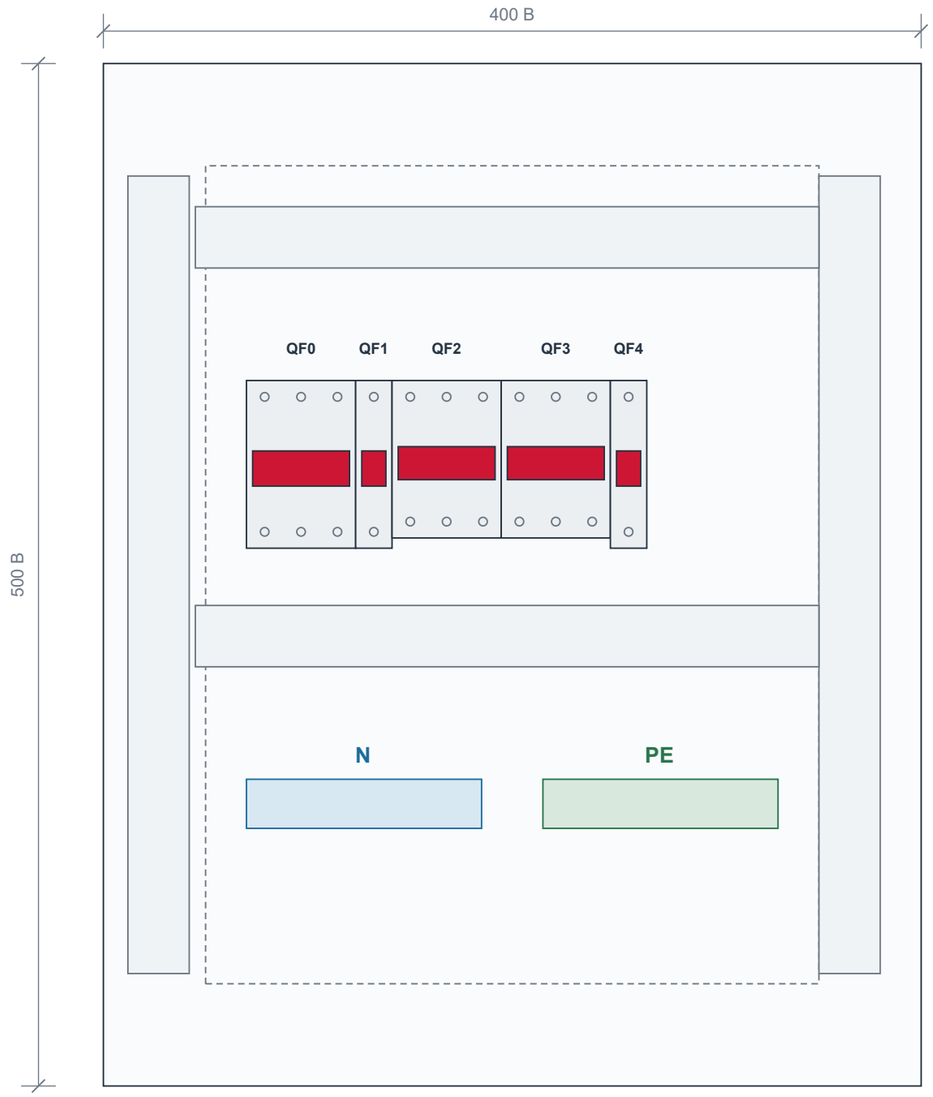

Аппарат	Модель	BOM	x D	y D	Габарит C
QF0	YCB6-63H	36	70	155	53.4 × 82
QF1	YCB6-63H	37	123.4	155	17.8 × 82
QF2	YCB7-63N	38	141.2	155	53.4 × 77
QF3	YCB7-63N	38	194.6	155	53.4 × 77
QF4	YCB6-63H	39	248	155	17.8 × 82

• Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Все координаты D - предложение для согласования.

• Пунктир: монтажная плата по расчетным данным KURALLAR. Положение каналов - проектное; сверление корпуса/платы не задано.

• Канал ВРУ 40×40 - по BOM; для ЩС зоны 30 мм зарезервированы условно и требуют согласования комплектации.

• Ряд 1 = 195,8 мм C. Клеммы N/PE показаны как зоны, размеры изделия не подтверждены.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-02-PL | R4 | 14 / 48

ЩО1.1 | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
52	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	Корпус
53	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	Ввод
54	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	5	Отходящий
55	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	4	Отходящий
56	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	Отходящий
57	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P C32 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	NEXUS 24 модуля; W/H/D/IP ?
Установка	Способ монтажа подтвердить
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.4, проектный лист 5
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 04-06

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).


Модульная оценка: 14 занято / 24 всего; 10 свободно. Физическая вместимость и 2×12 требуют паспорта корпуса.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-03-BOM | R4 | 15 / 48

ЩО1.1 | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

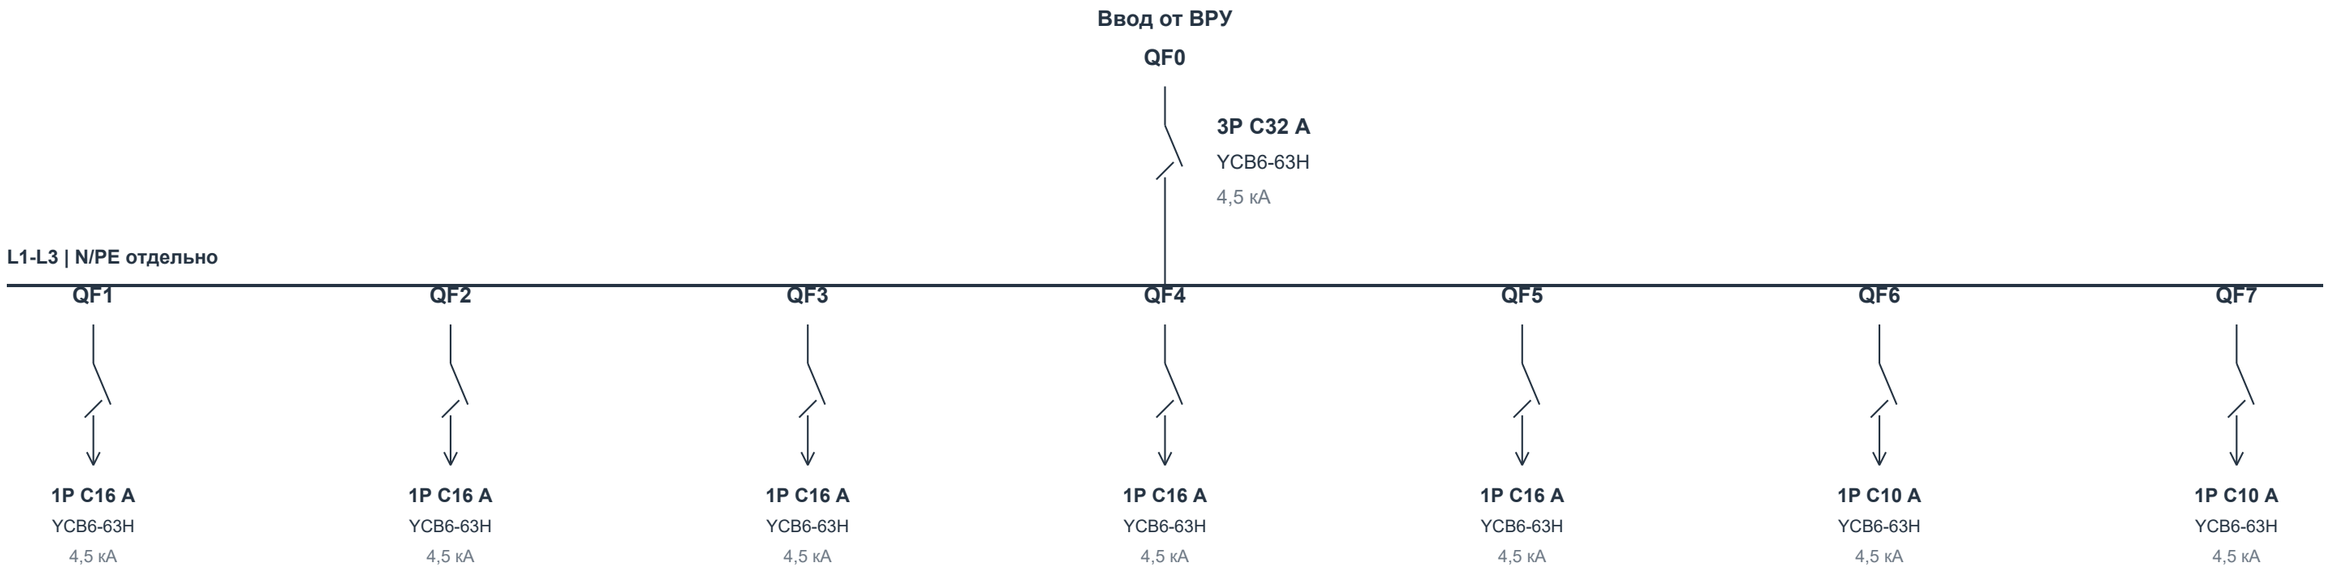

гр.1.1.1 | L1
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 2,28 кВт | Ip 8,27 А

гр.1.1.2 | L2
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 2,28 кВт | Ip 8,27 А

гр.1.1.3 | L3
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 2,1 кВт | Ip 7,67 А

гр.1.1.4 | L1
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 2,28 кВт | Ip 8,27 А

гр.1.1.5 | L2
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 4 кВт | Ip 7,72 А

гр.1.1.6 | L3
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,29 кВт | Ip 1,32 А

гр.1.1.7 | L1
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,29 кВт | Ip 1,32 А

гр.1.1.8 | L2
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 1,22 кВт | Ip 5,54 А

гр.1.1.9 | L3
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,216 кВт | Ip 0,98 А

гр.1.1.10 | L1
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,27 кВт | Ip 1,22 А

Резерв | L2
Резерв
- мм²
Ру - кВт | Ip - А

N и PE - отдельные шины по BOM. Тип сети и фазировку резервной линии подтвердить. Клеммная схема не назначена (19).

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.4. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-03-EL | R4 | 16 / 48

ЩО1.1 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.

• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-03-GA | R4 | 17 / 48

ЩО1.1 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)

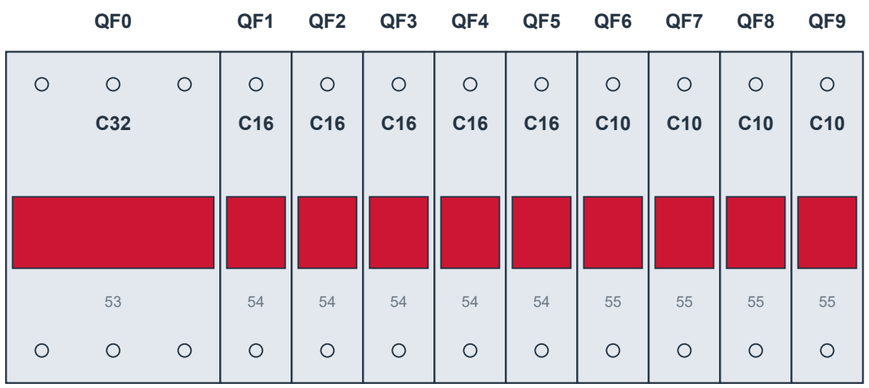

Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 2; свободно 10. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
QF0	YCB6-63H	53	1	1–3	53.4 C
QF1	YCB6-63H	54	1	4–4	17.8 C
QF2	YCB6-63H	54	1	5–5	17.8 C
QF3	YCB6-63H	54	1	6–6	17.8 C
QF4	YCB6-63H	54	1	7–7	17.8 C
QF5	YCB6-63H	54	1	8–8	17.8 C
QF6	YCB6-63H	55	1	9–9	17.8 C
QF7	YCB6-63H	55	1	10–10	17.8 C
QF8	YCB6-63H	55	1	11–11	17.8 C
QF9	YCB6-63H	55	1	12–12	17.8 C
QF10	YCB6-63H	56	2	1–1	17.8 C
QF11	YCB6-63H	57	2	2–2	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• Шины N/PE и кабельные проходы разместить в штатных зонах корпуса после получения паспорта.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-03-PL | R4 | 18 / 48

ЩО1.2 | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
71	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	Корпус
72	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	Ввод
73	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	6	Отходящий
74	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	3	Отходящий
75	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P C32 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	NEXUS 24 модуля; W/H/D/IP ?
Установка	Способ монтажа подтвердить
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.5, проектный лист 6
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 04-06

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).


Модульная оценка: 13 занято / 24 всего; 11 свободно. Физическая вместимость и 2×12 требуют паспорта корпуса.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-04-BOM | R4 | 19 / 48

ЩО1.2 | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

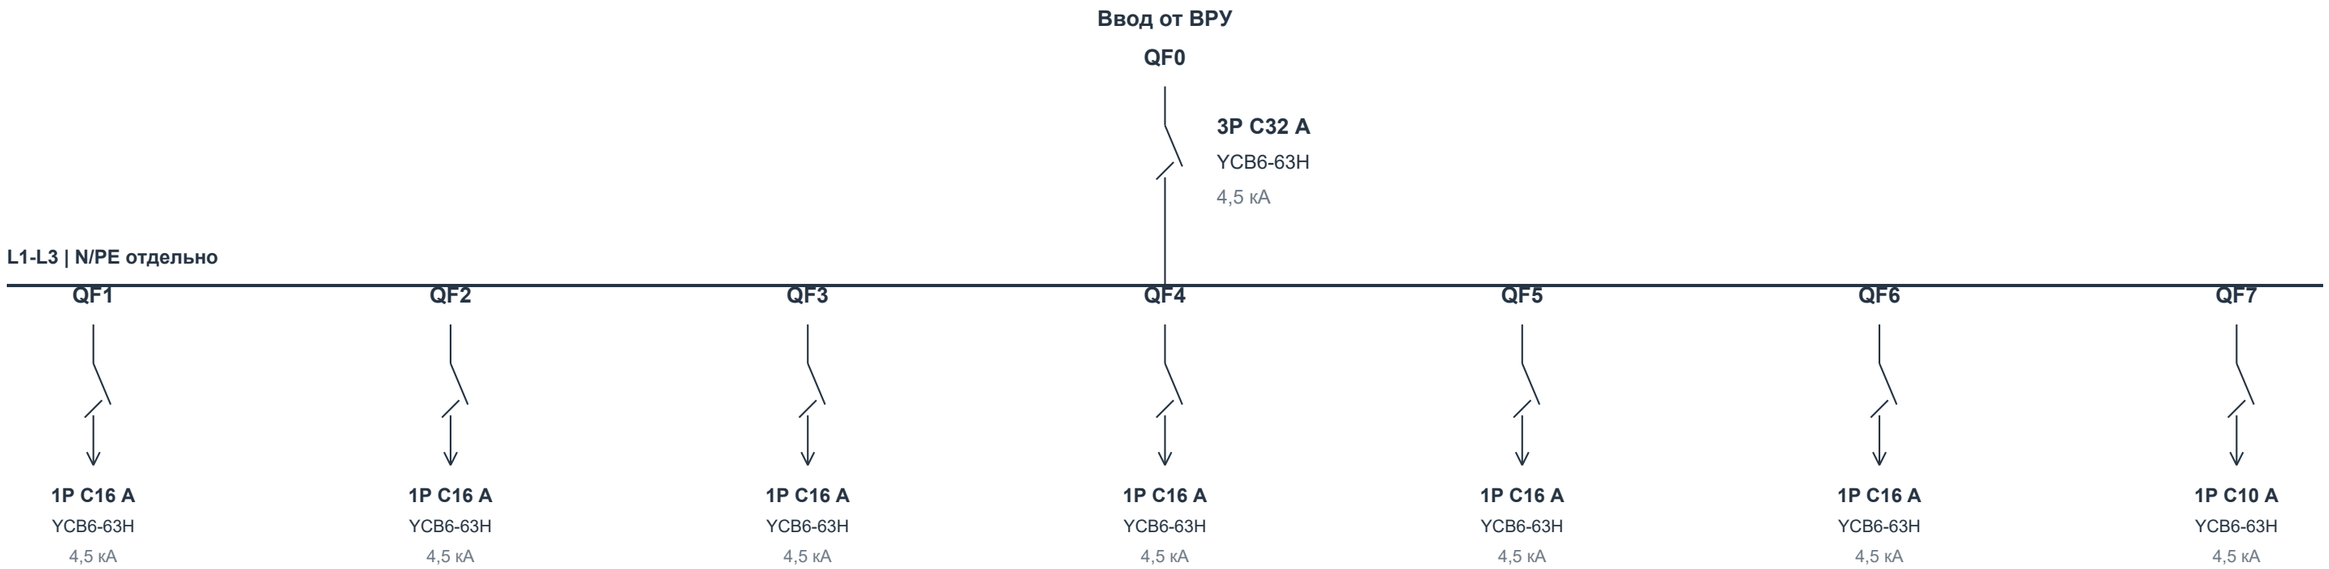

гр.1.2.1 | L1
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 1,14 кВт | Ip 4,14 А

гр.1.2.2 | L2
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 0,8 кВт | Ip 2,9 А


гр.1.2.3 | L3
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 1 кВт | Ip 3,63 А

гр.1.2.4 | L1
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 0,6 кВт | Ip 2,27 А

гр.1.2.5 | L2
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 0,8 кВт | Ip 2,9 А

гр.1.2.6 | L3
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 4 кВт | Ip 7,72 А

гр.1.2.7 | L1
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,32 кВт | Ip 1,45 А

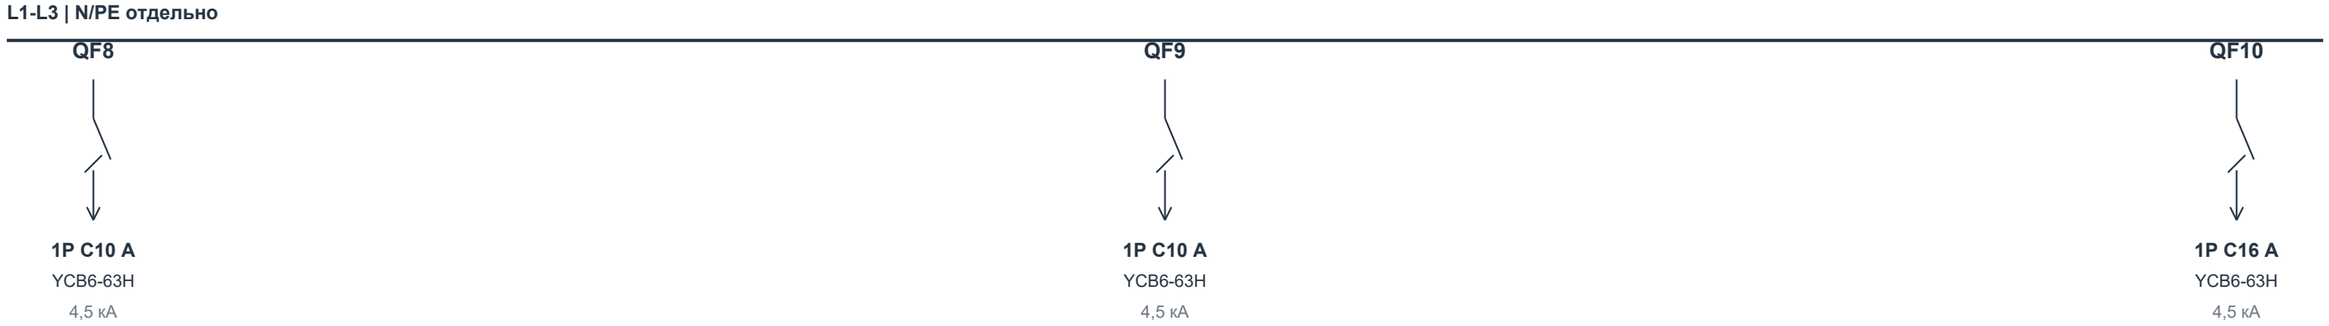

гр.1.2.8 | L2
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,27 кВт | Ip 1,22 А

гр.1.2.9 | L3
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,55 кВт | Ip 2,5 А

Резерв | L1
Резерв
- мм²
Ру - кВт | Ip - А

N и PE - отдельные шины по BOM. Тип сети и фазировку резервной линии подтвердить. Клеммная схема не назначена (19).

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.5. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-04-EL | R4 | 20 / 48

ЩО1.2 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.

• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-04-GA | R4 | 21 / 48

ЩО1.2 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)

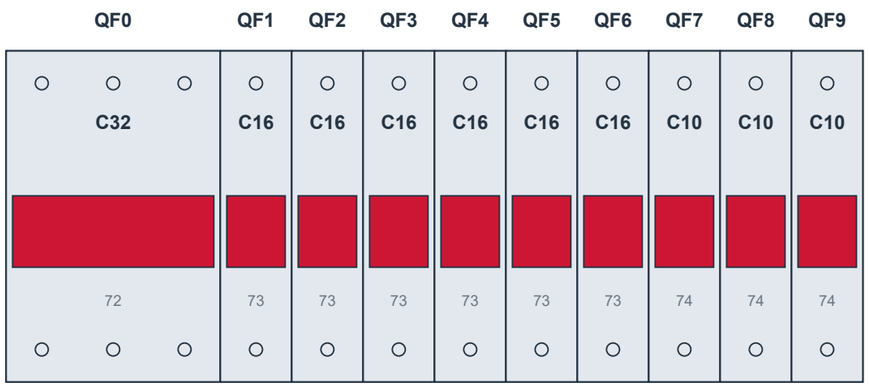

Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
QF0	YCB6-63H	72	1	1–3	53.4 C
QF1	YCB6-63H	73	1	4–4	17.8 C
QF2	YCB6-63H	73	1	5–5	17.8 C
QF3	YCB6-63H	73	1	6–6	17.8 C
QF4	YCB6-63H	73	1	7–7	17.8 C
QF5	YCB6-63H	73	1	8–8	17.8 C
QF6	YCB6-63H	73	1	9–9	17.8 C
QF7	YCB6-63H	74	1	10–10	17.8 C
QF8	YCB6-63H	74	1	11–11	17.8 C
QF9	YCB6-63H	74	1	12–12	17.8 C
QF10	YCB6-63H	75	2	1–1	17.8 C

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 1; свободно 11. Свободные позиции закрыть заглушками.

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• Шины N/PE и кабельные проходы разместить в штатных зонах корпуса после получения паспорта.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-04-PL | R4 | 22 / 48

ЩО2.1 | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
88	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	Корпус
89	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	Ввод
90	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	6	Отходящий
91	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	3	Отходящий
92	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	2	Отходящий
93	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P C32 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	NEXUS 24 модуля; W/H/D/IP ?
Установка	Способ монтажа подтвердить
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.6, проектный лист 7
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 04-06

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).


Модульная оценка: 15 занято / 24 всего; 9 свободно. Физическая вместимость и 2×12 требуют паспорта корпуса.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-05-BOM | R4 | 23 / 48

ЩО2.1 | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

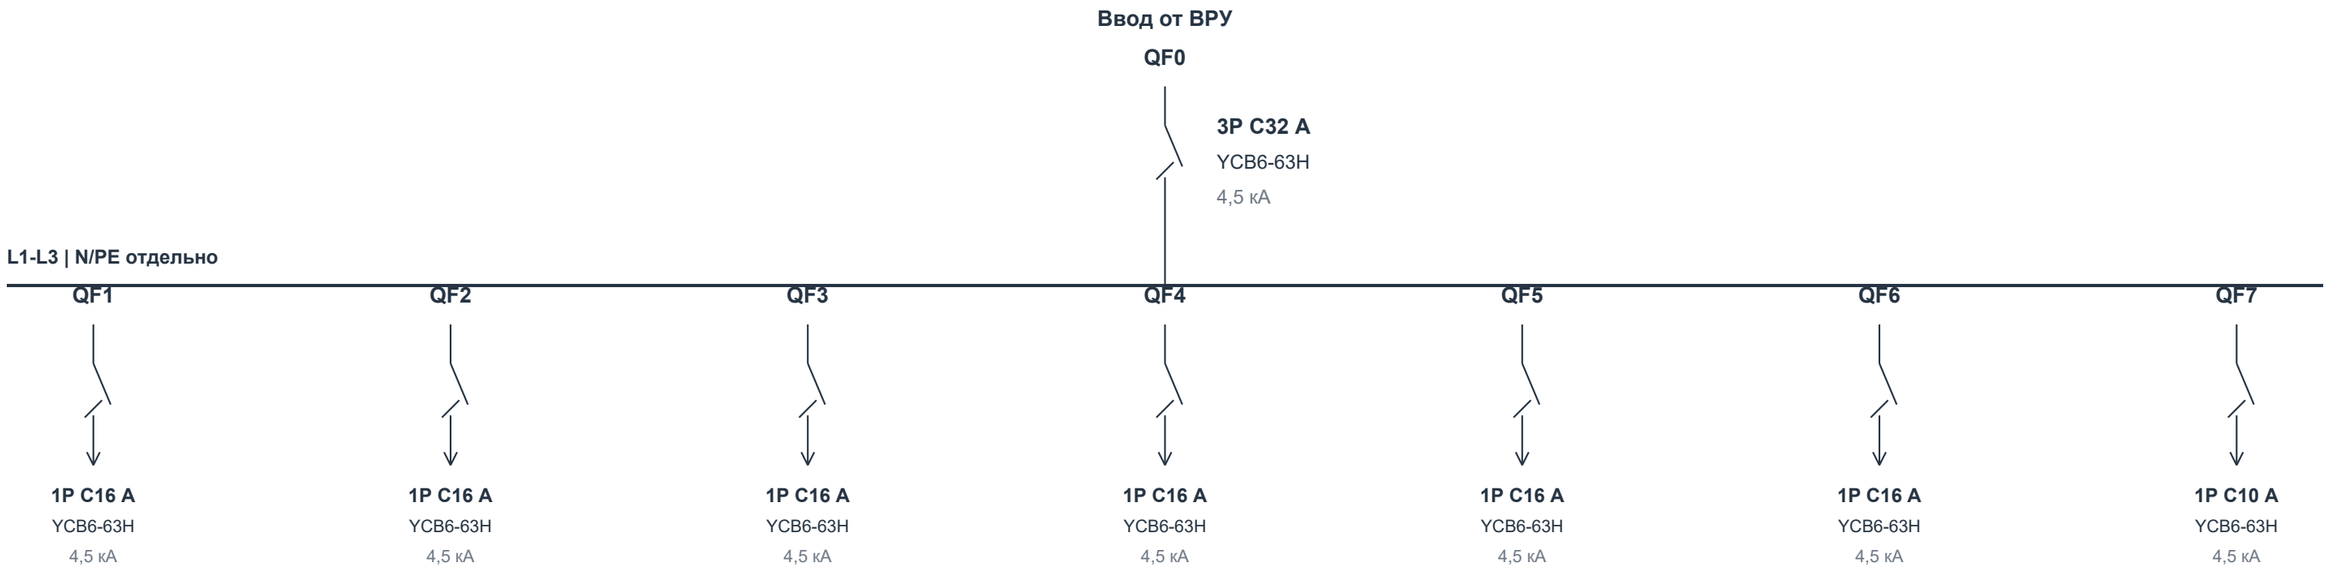

гр.2.1.1 | L1
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 1,14 кВт | Ip 4,14 А

гр.2.1.2 | L2
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 0,8 кВт | Ip 2,9 А


гр.2.1.3 | L3
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 1 кВт | Ip 3,63 А

гр.2.1.4 | L1
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 0,6 кВт | Ip 2,27 А

гр.2.1.5 | L2
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 0,8 кВт | Ip 2,9 А

гр.2.1.6 | L3
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 4 кВт | Ip 7,72 А

гр.2.1.7 | L1
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,43 кВт | Ip 1,95 А

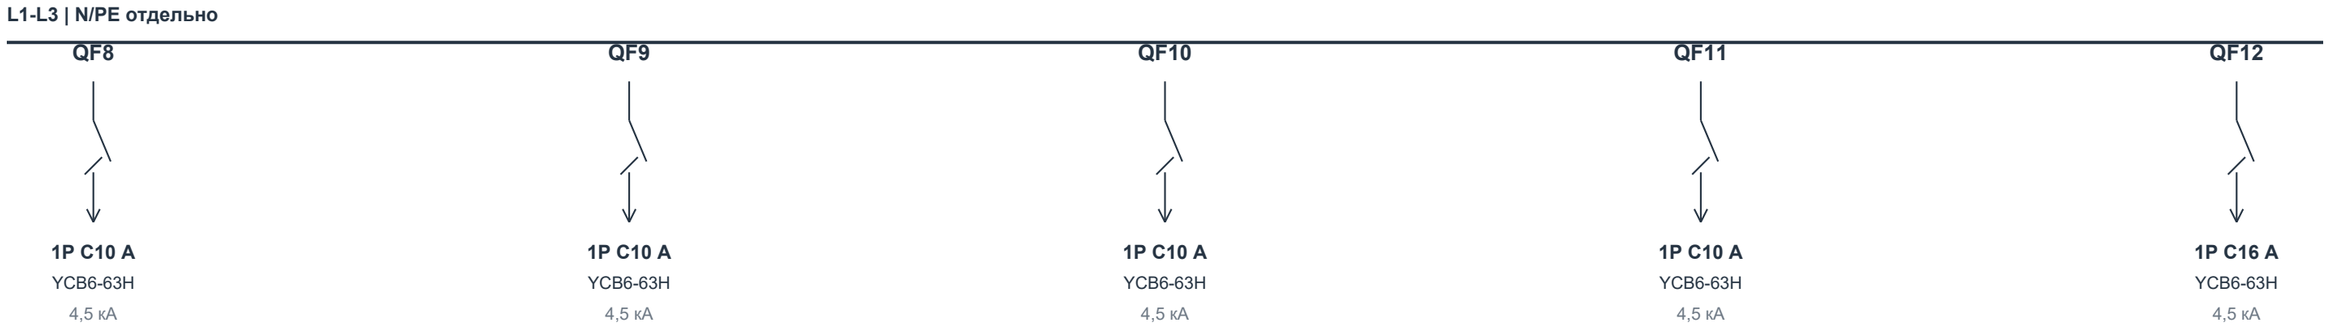

гр.2.1.8 | L2
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,29 кВт | Ip 1,31 А

гр.2.1.9 | L3
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 1,22 кВт | Ip 5,54 А

гр.2.1.10 | L1
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,36 кВт | Ip 1,63 А

гр.2.1.11 | L2
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,36 кВт | Ip 1,63 А

Резерв | L3
Резерв
- мм²
Ру - кВт | Ip - А

N и PE - отдельные шины по BOM. Тип сети и фазировку резервной линии подтвердить. Клеммная схема не назначена (19).

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.6. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-05-EL | R4 | 24 / 48

ЩО2.1 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.

• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-05-GA | R4 | 25 / 48

ЩО2.1 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)

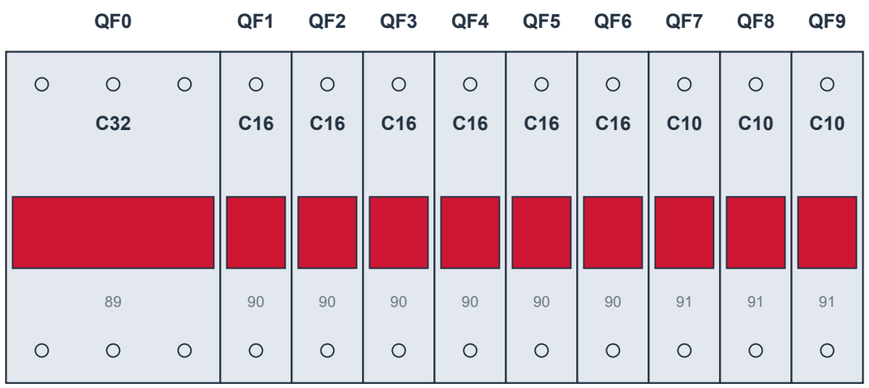

Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 3; свободно 9. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
QF0	YCB6-63H	89	1	1–3	53.4 C
QF1	YCB6-63H	90	1	4–4	17.8 C
QF2	YCB6-63H	90	1	5–5	17.8 C
QF3	YCB6-63H	90	1	6–6	17.8 C
QF4	YCB6-63H	90	1	7–7	17.8 C
QF5	YCB6-63H	90	1	8–8	17.8 C
QF6	YCB6-63H	90	1	9–9	17.8 C
QF7	YCB6-63H	91	1	10–10	17.8 C
QF8	YCB6-63H	91	1	11–11	17.8 C
QF9	YCB6-63H	91	1	12–12	17.8 C
QF10	YCB6-63H	92	2	1–1	17.8 C
QF11	YCB6-63H	92	2	2–2	17.8 C
QF12	YCB6-63H	93	2	3–3	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• Шины N/PE и кабельные проходы разместить в штатных зонах корпуса после получения паспорта.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-05-PL | R4 | 26 / 48

ЩО2.2 | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
107	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	Корпус
108	296830	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	1	Ввод
109	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	6	Отходящий
110	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	3	Отходящий
111	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	Отходящий
112	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P C32 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	NEXUS 24 модуля; W/H/D/IP ?
Установка	Способ монтажа подтвердить
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.7, проектный лист 8
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 04-06

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).


Модульная оценка: 14 занято / 24 всего; 10 свободно. Физическая вместимость и 2×12 требуют паспорта корпуса.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-06-BOM | R4 | 27 / 48

ЩО2.2 | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

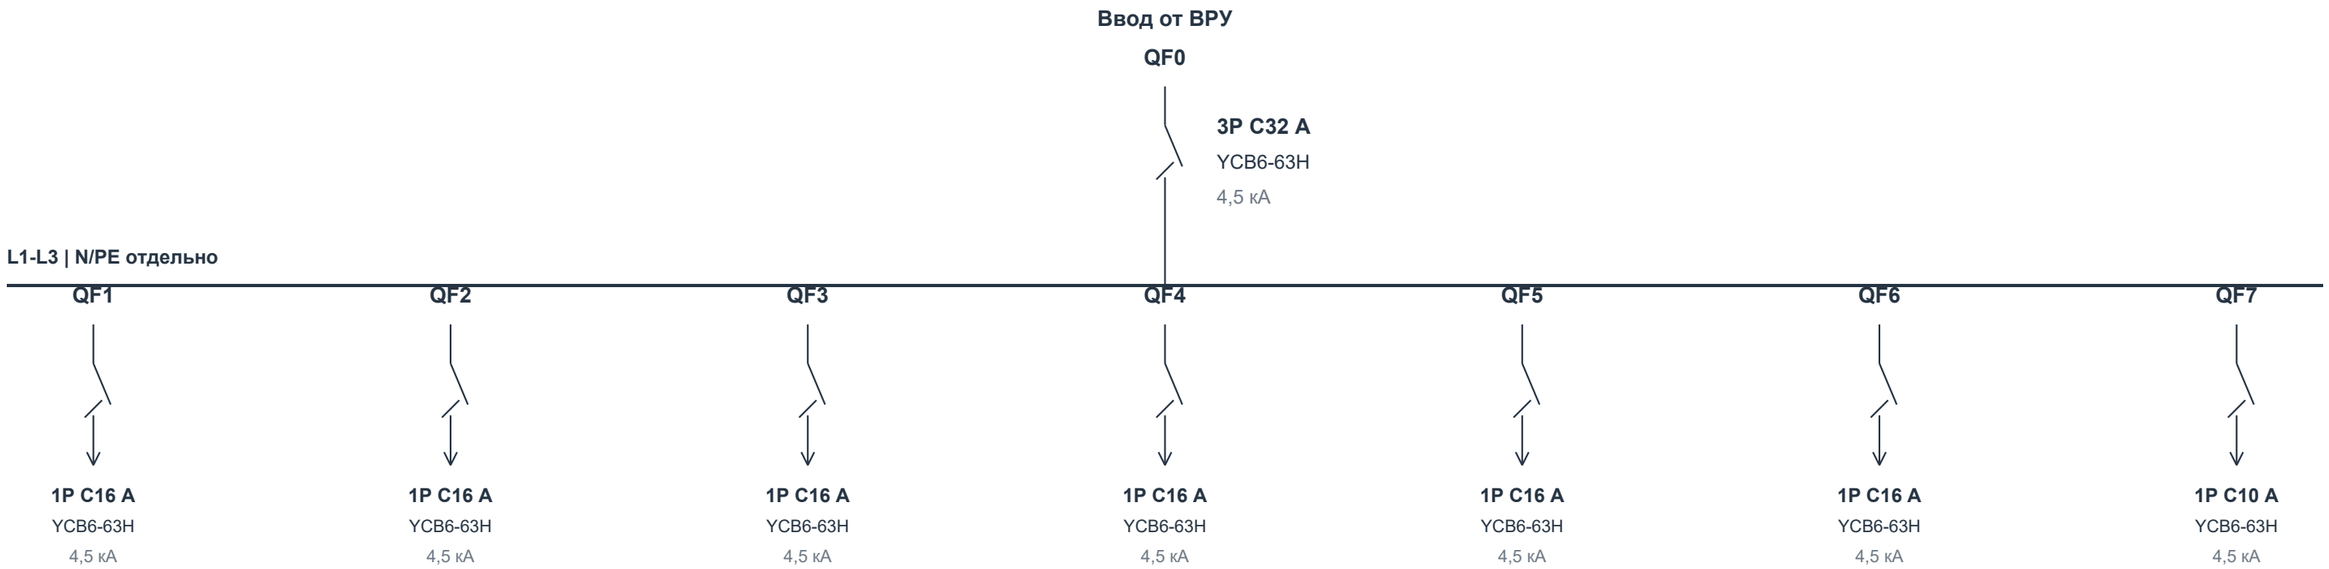

гр.2.2.1 | L1
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 2 кВт | Ip 7,27 А

гр.2.2.2 | L2
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 1,14 кВт | Ip 4,1 А

гр.2.2.3 | L3
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 2,28 кВт | Ip 8,29 А

гр.2.2.4 | L1
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 2,28 кВт | Ip 8,29 А

гр.2.2.5 | L2
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 2,28 кВт | Ip 8,29 А

гр.2.2.6 | L3
Розетки
3×2,5 мм²
Ру 4,57 кВт | Ip 11,68 А

гр.2.2.7 | L1
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,36 кВт | Ip 1,63 А



гр.2.2.8 | L2
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,29 кВт | Ip 1,31 А

гр.2.2.9 | L3
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,61 кВт | Ip 2,72 А

гр.2.2.10 | L1
Освещение
3×1,5 мм²
Ру 0,29 кВт | Ip 1,31 А

Резерв | L2
Резерв
- мм²
Ру - кВт | Ip - А

N и PE - отдельные шины по BOM. Тип сети и фазировку резервной линии подтвердить. Клеммная схема не назначена (19).

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.7. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-06-EL | R4 | 28 / 48

ЩО2.2 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.

• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-06-GA | R4 | 29 / 48

ЩО2.2 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)

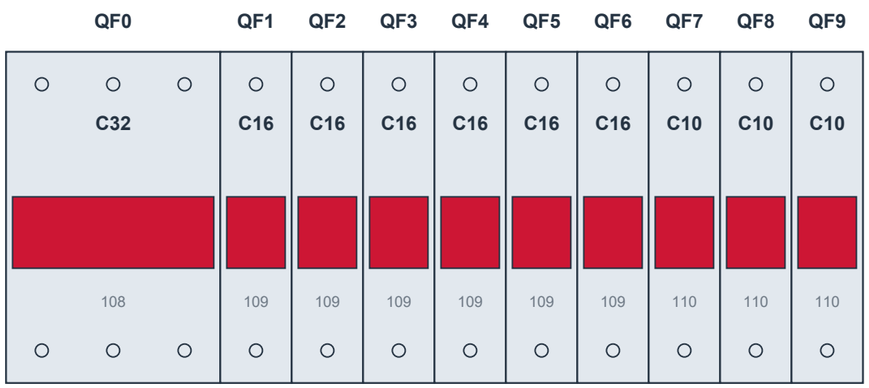

Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 2; свободно 10. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
QF0	YCB6-63H	108	1	1–3	53.4 C
QF1	YCB6-63H	109	1	4–4	17.8 C
QF2	YCB6-63H	109	1	5–5	17.8 C
QF3	YCB6-63H	109	1	6–6	17.8 C
QF4	YCB6-63H	109	1	7–7	17.8 C
QF5	YCB6-63H	109	1	8–8	17.8 C
QF6	YCB6-63H	109	1	9–9	17.8 C
QF7	YCB6-63H	110	1	10–10	17.8 C
QF8	YCB6-63H	110	1	11–11	17.8 C
QF9	YCB6-63H	110	1	12–12	17.8 C
QF10	YCB6-63H	111	2	1–1	17.8 C
QF11	YCB6-63H	112	2	2–2	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• Шины N/PE и кабельные проходы разместить в штатных зонах корпуса после получения паспорта.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-06-PL | R4 | 30 / 48

ЩВ1.1 | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
126	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	Корпус
127	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	Управление
128	814185	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	1	Ввод
129	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	Управление
130	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	5	Отходящий
131	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P D25 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	NEXUS 24 модуля; W/H/D/IP ?
Установка	Способ монтажа подтвердить
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.8, проектный лист 9
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 05-06,09-10

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).


Модульная оценка: 11 занято / 24 всего; 13 свободно. Ширина MX0 условная. Физическая вместимость и 2×12 требуют паспорта корпуса.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-07-BOM | R4 | 31 / 48

ЩВ1.1 | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

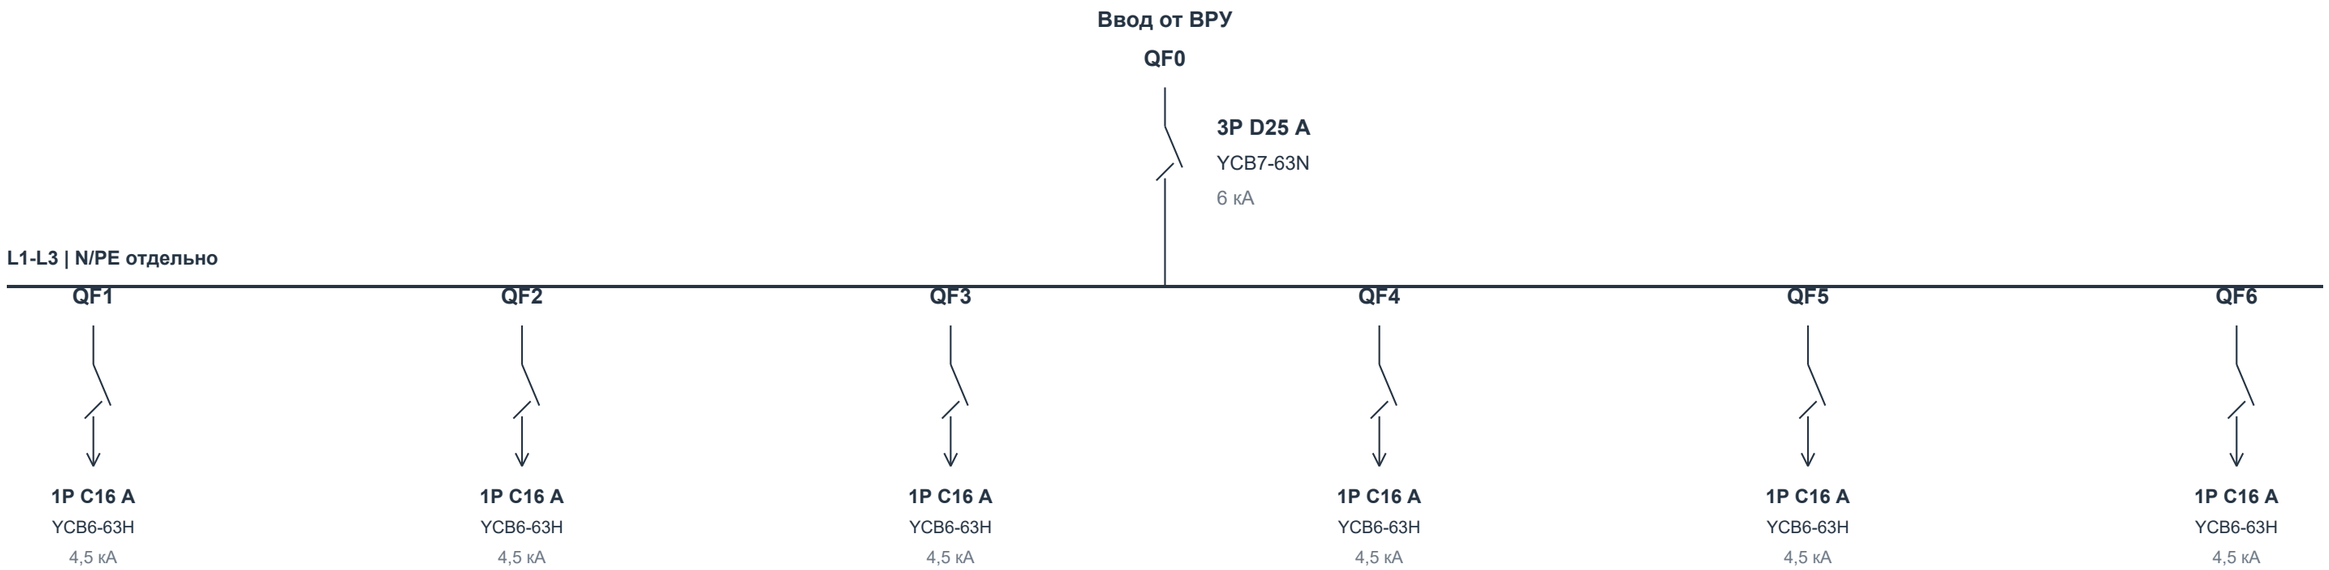

V1.1.1 | L1
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V1.1.2 | L2
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V1.1.3 | L3
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V1.1.4 | L1
Кондиционер K1 / 22
3×2,5 мм²
Ру 0,12 кВт | Ip 11,59 А

V1.1.5 | L2
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 1,7 кВт | Ip 7,72 А

Резерв | L3
Резерв
- мм²
Ру - кВт | Ip - А

Цепь ППС: L? → SF1 C6 → контакт УК-ВК? → MX0 A011130 → N. MX0 связан с QF0. Источник, катушка, выводы и контакт: STOP 09-10.

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.8. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-07-EL | R4 | 32 / 48

ЩВ1.1 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.

• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-07-GA | R4 | 33 / 48

ЩВ1.1 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)

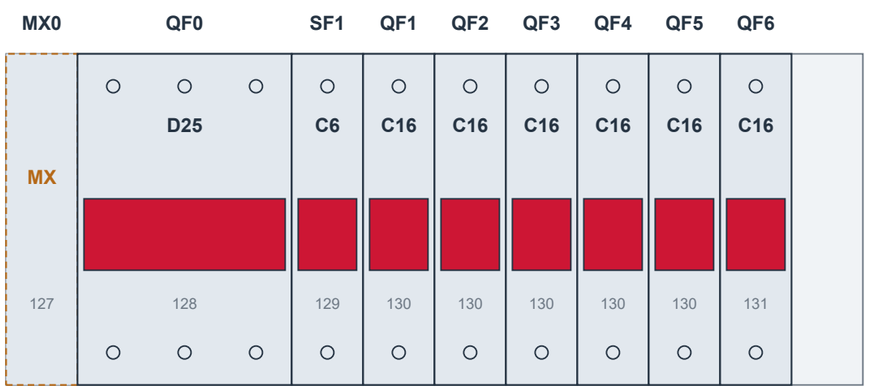

Занято 11; свободно 1. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
MX0	A011130	127	1	1–1	18 ?
QF0	YCB7-63N	128	1	2–4	53.4 C
SF1	YCB6-63H	129	1	5–5	17.8 C
QF1	YCB6-63H	130	1	6–6	17.8 C
QF2	YCB6-63H	130	1	7–7	17.8 C
QF3	YCB6-63H	130	1	8–8	17.8 C
QF4	YCB6-63H	130	1	9–9	17.8 C
QF5	YCB6-63H	130	1	10–10	17.8 C
QF6	YCB6-63H	131	1	11–11	17.8 C

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 0; свободно 12. Свободные позиции закрыть заглушками.

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• A011130: в BOM 1 модуль. Зарезервирована ширина 18 D; фактическую ширину и сторону установки подтвердить.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.

MX0 пристыкован к QF0; цепь ППС - на листе EL.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-07-PL | R4 | 34 / 48

ЩВ1.2 | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
146	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	Корпус
147	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	Управление
148	814185	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	1	Ввод
149	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	Управление
150	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	3	Отходящий
151	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	2	Отходящий
152	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P D25 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	NEXUS 24 модуля; W/H/D/IP ?
Установка	Способ монтажа подтвердить
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.9, проектный лист 10
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 05-06,09-10

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).


Модульная оценка: 11 занято / 24 всего; 13 свободно. Ширина MX0 условная. Физическая вместимость и 2×12 требуют паспорта корпуса.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-08-BOM | R4 | 35 / 48

ЩВ1.2 | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

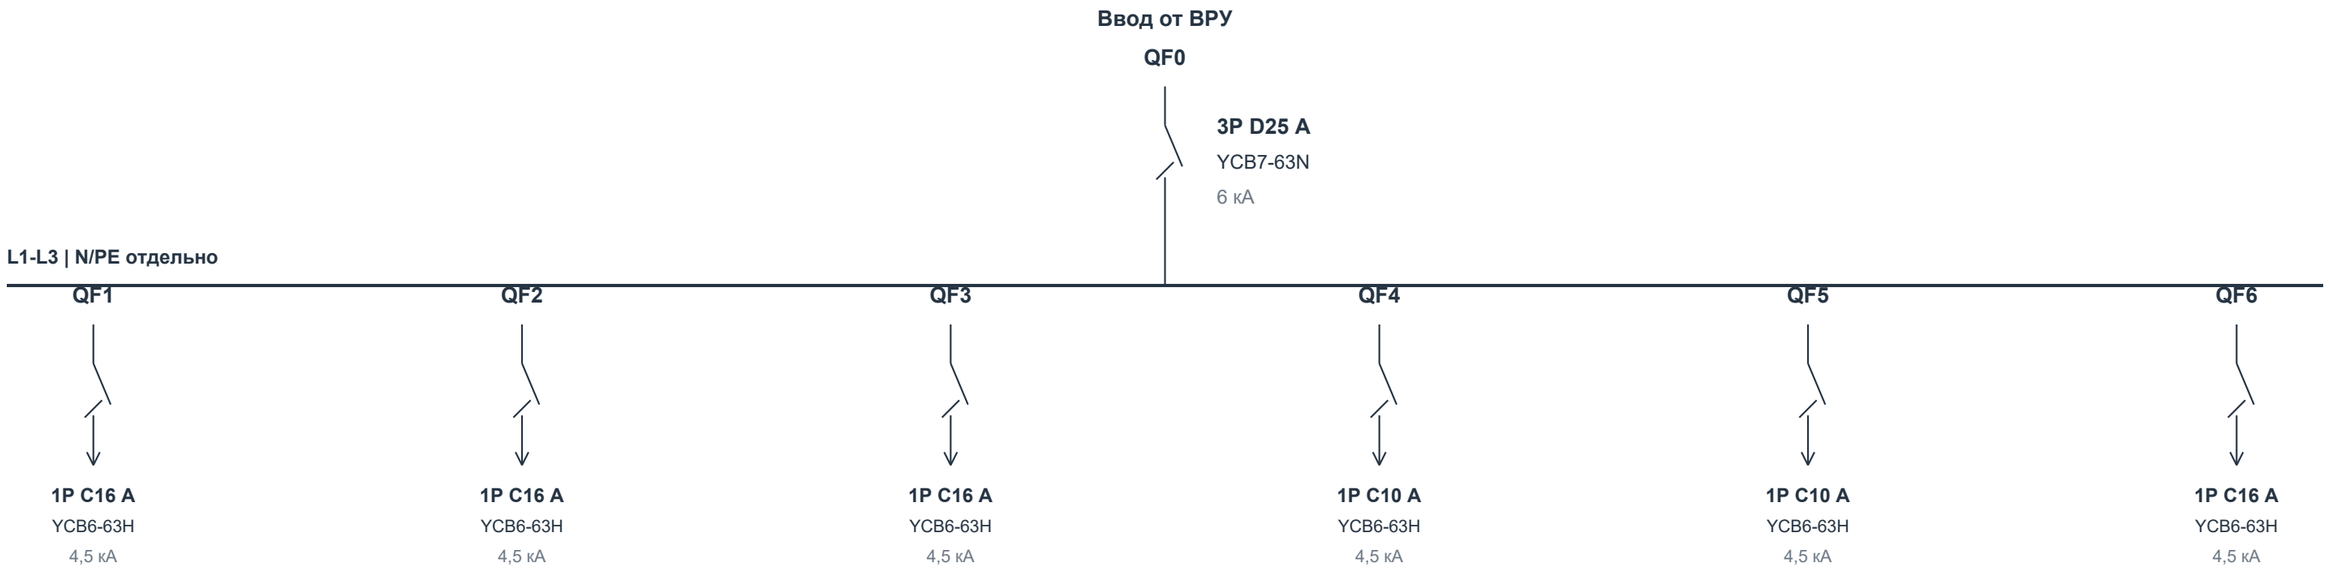

Цепь ППС: L? → SF1 C6 → контакт УК-ВК? → MX0 A011130 → N. MX0 связан с QF0. Источник, катушка, выводы и контакт: STOP 09-10.

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.9. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-08-EL | R4 | 36 / 48

ЩВ1.2 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.

• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-08-GA | R4 | 37 / 48

ЩВ1.2 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)

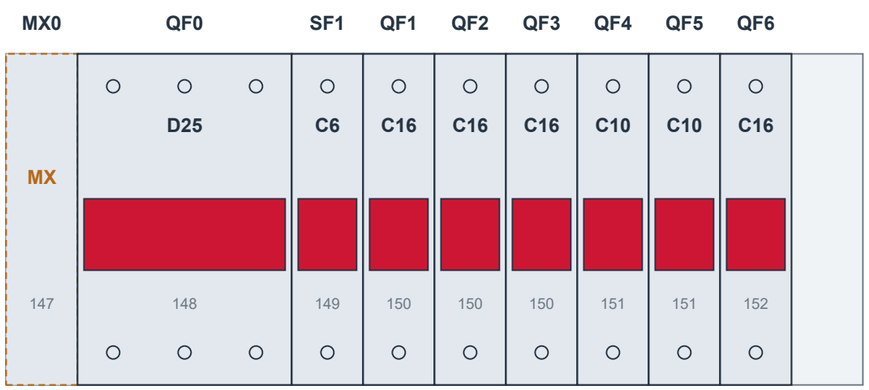

Занято 11; свободно 1. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
MX0	A011130	147	1	1–1	18 ?
QF0	YCB7-63N	148	1	2–4	53.4 C
SF1	YCB6-63H	149	1	5–5	17.8 C
QF1	YCB6-63H	150	1	6–6	17.8 C
QF2	YCB6-63H	150	1	7–7	17.8 C
QF3	YCB6-63H	150	1	8–8	17.8 C
QF4	YCB6-63H	151	1	9–9	17.8 C
QF5	YCB6-63H	151	1	10–10	17.8 C
QF6	YCB6-63H	152	1	11–11	17.8 C

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 0; свободно 12. Свободные позиции закрыть заглушками.

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• A011130: в BOM 1 модуль. Зарезервирована ширина 18 D; фактическую ширину и сторону установки подтвердить.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.

MX0 пристыкован к QF0; цепь ППС - на листе EL.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-08-PL | R4 | 38 / 48

ЩВ2.1 | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
167	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	Корпус
168	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	Управление
169	814186	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	1	Ввод
170	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	Управление
171	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	7	Отходящий
172	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Отходящий
173	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P D32 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	NEXUS 24 модуля; W/H/D/IP ?
Установка	Способ монтажа подтвердить
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.10, проектный лист 11
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 05-06,09-10

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).


Модульная оценка: 14 занято / 24 всего; 10 свободно. Ширина MX0 условная. Физическая вместимость и 2×12 требуют паспорта корпуса.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-09-BOM | R4 | 39 / 48

ЩВ2.1 | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

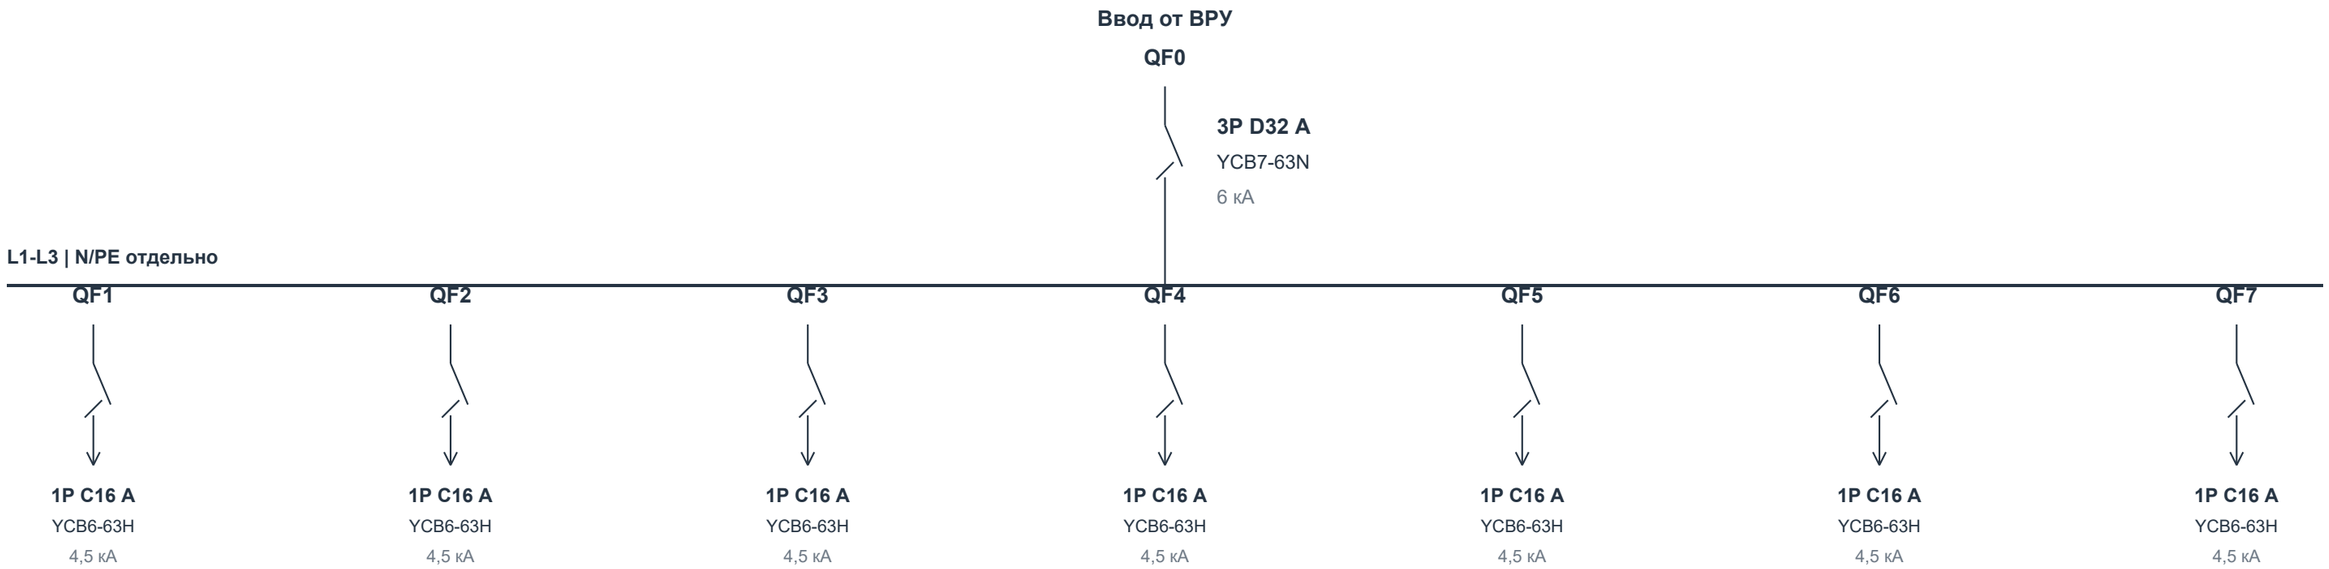

V2.1.1 | L1
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V2.1.2 | L2
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V2.1.3 | L3
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 1,7 кВт | Ip 7,27 А

V2.1.4 | L1
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 1,7 кВт | Ip 7,27 А

V2.1.5 | L2
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V2.1.6 | L3
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V2.1.7 | L1
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 1,7 кВт | Ip 7,27 А



V2.1.8 | L2
Кондиционер K1
3×2,5 мм²
Ру 1,7 кВт | Ip 7,27 А

Резерв | L3
Резерв
- мм²
Ру - кВт | Ip - А

Цепь ППС: L? → SF1 C6 → контакт УК-ВК? → MX0 A011130 → N. MX0 связан с QF0. Источник, катушка, выводы и контакт: STOP 09-10.

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.10. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-09-EL | R4 | 40 / 48

ЩВ2.1 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



• Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.

• Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.

• До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.

• Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.

• На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-09-GA | R4 | 41 / 48

ЩВ2.1 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)

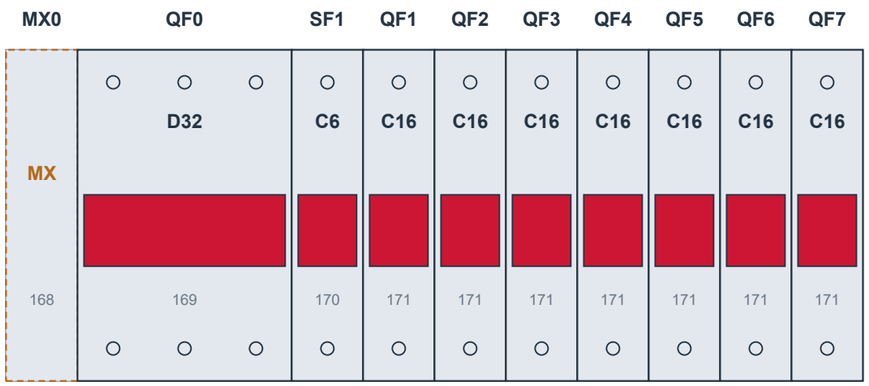

Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 2; свободно 10. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
MX0	A011130	168	1	1–1	18 ?
QF0	YCB7-63N	169	1	2–4	53.4 C
SF1	YCB6-63H	170	1	5–5	17.8 C
QF1	YCB6-63H	171	1	6–6	17.8 C
QF2	YCB6-63H	171	1	7–7	17.8 C
QF3	YCB6-63H	171	1	8–8	17.8 C
QF4	YCB6-63H	171	1	9–9	17.8 C
QF5	YCB6-63H	171	1	10–10	17.8 C
QF6	YCB6-63H	171	1	11–11	17.8 C
QF7	YCB6-63H	171	1	12–12	17.8 C
QF8	YCB6-63H	172	2	1–1	17.8 C
QF9	YCB6-63H	173	2	2–2	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• A011130: в BOM 1 модуль. Зарезервирована ширина 18 D; фактическую ширину и сторону установки подтвердить.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.
MX0 пристыкован к QF0; цепь ППС - на листе EL.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-09-PL | R4 | 42 / 48

ЩВ2.2 | Перечень оборудования и технические данные

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

BOM	Артикул	Оборудование	Кол.	Роль
189	712-03052	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	1	Корпус
190	A011130	Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	1	Управление
191	814186	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	1	Ввод
192	296708	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	Управление
193	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	7	Отходящий
194	296709	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	1	Отходящий
195	296710	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	1	Резерв

Количество на 1 щит. В заказе каждый щит - 1 комплект.

Параметр	Принято / требуется подтвердить
Питание	380/220 В, 50 Гц по проекту
Ввод	3P D32 A
Сеть / InA / Ik	STOP 01-03: требуется подтверждение
Корпус / IP	NEXUS 24 модуля; W/H/D/IP ?
Установка	Способ монтажа подтвердить
Источник схемы	ЭОМ: PDF стр.11, проектный лист 12
Статус	НЕ ЗАПУСКАТЬ до подтверждения
Открытые вопросы	01-03,12-24; 05-06,09-10

Состав оборудования - по текущему BOM CNC. Проектные IEK/BA заменены только по BOM. Расхождения назначения/номиналов сохранены в вопросах. Клеммники не назначены: способ внешнего подключения согласовать (19).


Модульная оценка: 14 занято / 24 всего; 10 свободно. Ширина MX0 условная. Физическая вместимость и 2×12 требуют паспорта корпуса.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-10-BOM | R4 | 43 / 48

ЩВ2.2 | Однолинейная схема CNC и данные линий

Без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

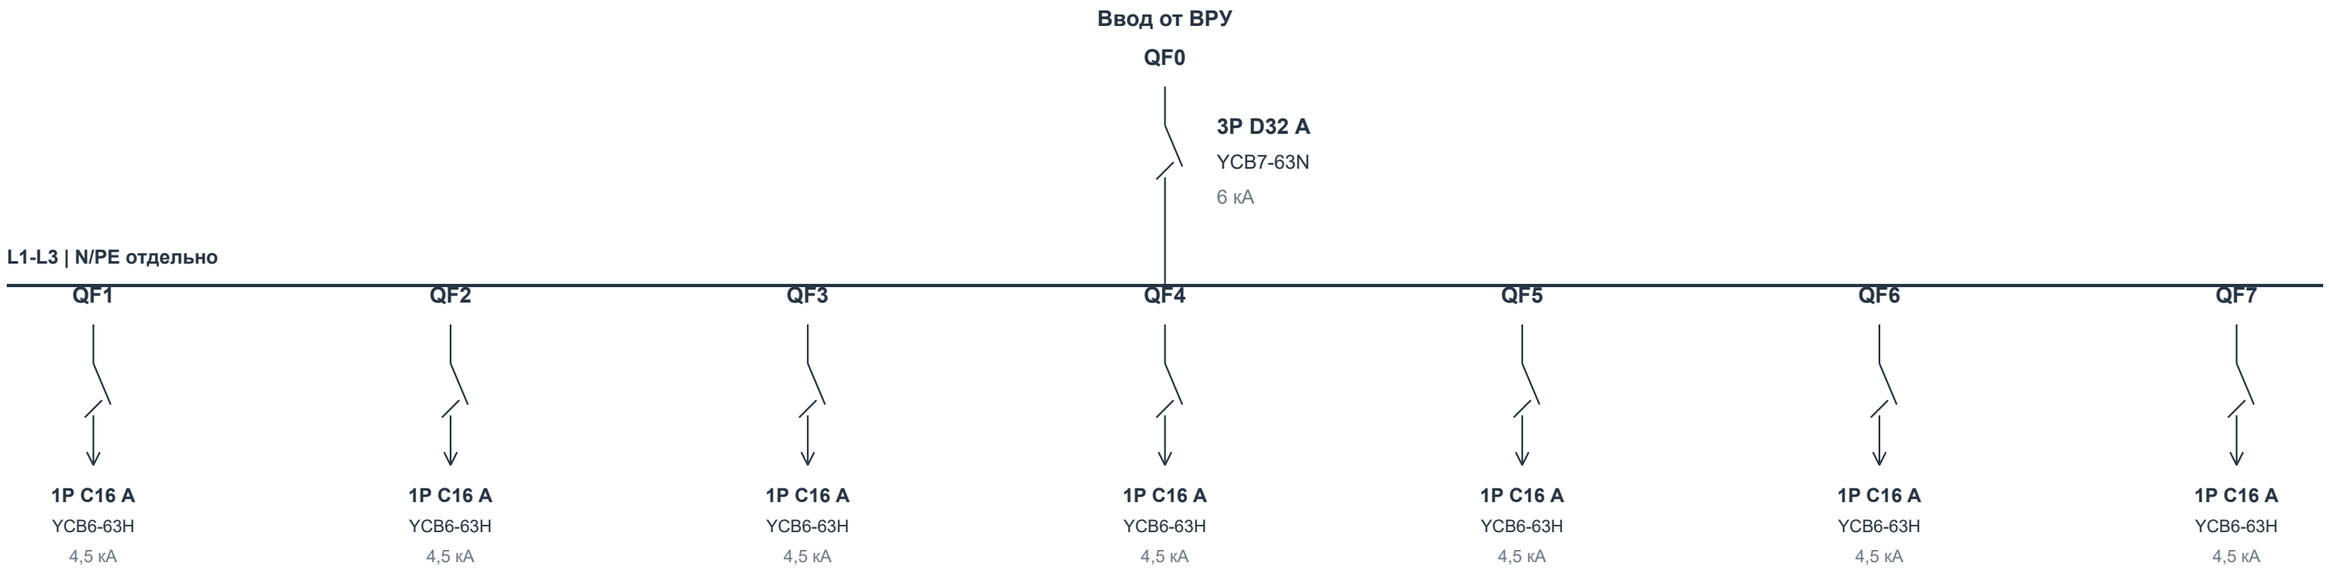

V2.2.1 | L1
Кондиционер К1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V2.2.2 | L2
Кондиционер К1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V2.2.3 | L3
Кондиционер К1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V2.2.4 | L1
Кондиционер К1
3×2,5 мм²
Ру 1,7 кВт | Ip 7,27 А

V2.2.5 | L2
Кондиционер К1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V2.2.6 | L3
Кондиционер К1
3×2,5 мм²
Ру 2,55 кВт | Ip 11,59 А

V2.2.7 | L1
Кондиционер К2
3×2,5 мм²
Ру 1,12 кВт | Ip 5,1 А



V2.2.8 | L2
Вентилятор
3×2,5 мм²
Ру 0,1 кВт | Ip 0,45 А

Резерв | L3
Резерв
- мм²
Ру - кВт | Ip - А

Цепь ППС: L? → SF1 C6 → контакт УК-ВК? → MX0 A011130 → N. MX0 связан с QF0. Источник, катушка, выводы и контакт: STOP 09-10.

Марки/номиналы: BOM; группы, фазы, Ру и Ip: исходный ЭОМ, PDF стр.11. Кабель: ВВГнг(А)-LS, сечение по проекту. Данные нагрузки не пересчитаны; спорные значения - вопросы 04,07,22,23. Функциональная схема не заменяет проводную.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-10-EL | R4 | 44 / 48

ЩВ2.2 | Вид спереди и сбоку

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - условный вид | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

ЧЕРНАЯ КРЫШКА - ПО BOM



- Корпус NEXUS DX10-M24SBB V10, 24 модуля, наружная установка (о/у) по BOM.
- Внешние W/H/D в источниках отсутствуют. Контур - условный вид без масштаба; размер не назначен.
- До утверждения монтажа получить паспорт корпуса: внешние размеры, расстояние между рейками, глубину, IP и отверстия крепления.
- Проектное IP41 не перенесено на NEXUS как подтвержденная характеристика.
- На крышку не добавлены лампы или кнопки: в BOM данного щита их нет.


НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-10-GA | R4 | 45 / 48

ЩВ2.2 | Внутренний монтаж и координаты

ВРУ 1:10; ЩС 1:3; NEXUS - модульная раскладка, без масштаба | B: BOM; C: каталог; D: предложение; ?: подтвердить. Размеры в мм.

Ряд 1 - 12 позиций (предложение)

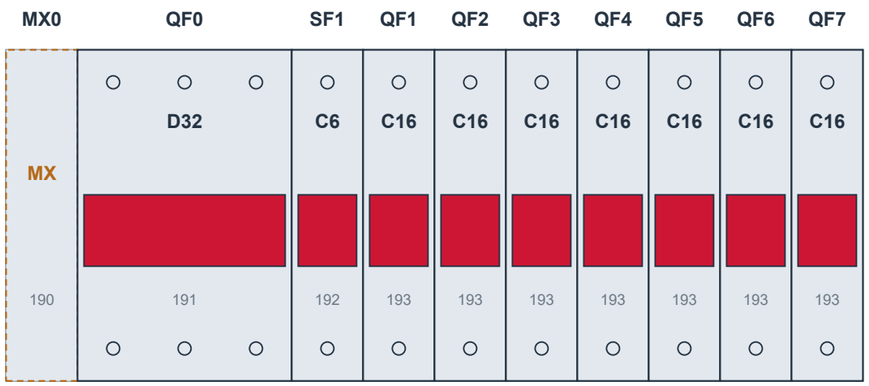

Занято 12; свободно 0. Свободные позиции закрыть заглушками.

Ряд 2 - 12 позиций (предложение)



Занято 2; свободно 10. Свободные позиции закрыть заглушками.

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	Позиция	Ширина
MX0	A011130	190	1	1–1	18 ?
QF0	YCB7-63N	191	1	2–4	53.4 C
SF1	YCB6-63H	192	1	5–5	17.8 C
QF1	YCB6-63H	193	1	6–6	17.8 C
QF2	YCB6-63H	193	1	7–7	17.8 C
QF3	YCB6-63H	193	1	8–8	17.8 C
QF4	YCB6-63H	193	1	9–9	17.8 C
QF5	YCB6-63H	193	1	10–10	17.8 C
QF6	YCB6-63H	193	1	11–11	17.8 C
QF7	YCB6-63H	193	1	12–12	17.8 C
QF8	YCB6-63H	194	2	1–1	17.8 C
QF9	YCB6-63H	195	2	2–2	17.8 C

• Внешние размеры корпуса и шаг между рейками не заданы. Предложено два ряда по 12 позиций; проверить паспорт NEXUS.

• CNC YCB6: 17,8 мм/полюс, высота 82; YCB7: 17,8 мм/полюс, высота 77. Для ряда из 12 полюсов - 213,6 мм без аксессуара.

• A011130: в BOM 1 модуль. Зарезервирована ширина 18 D; фактическую ширину и сторону установки подтвердить.

• Пластиковый корпус: не применять схему заземления металлической двери. Отдельная PE-шина остается по BOM.
MX0 пристыкован к QF0; цепь ППС - на листе EL.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-10-PL | R4 | 46 / 48

Источники, размеры и нормативная база

Источник	Основание	Ограничение / контроль
Текущий BOM cl dla uod; полный BOM cl	Состав и артикулы; количества H, совпадение A:D по 208 строкам.	Состав не изменен без решения; расход/работы не входят в перечень заказчика.
Исходный ЭОМ, PDF стр.2-11 / ЭОМ.СО	Топология, группы, фазы, кабели, Ру и Iр.	Исходные противоречия отмечены 04,06,07,22,23.
CNC YCM1, официальный каталог	YCM1-250L: 107×165×86 (W×H×D).	Клеммные крышки, конкретный артикул и изгиб кабеля проверить.
CNC YCB6 A05 / YCB7-63N A26	17,8 мм/полюс; 3P 53,4. YCB6 H82/D79,2; YCB7 H77/D77,6.	Каталог C; точный поставляемый артикул/допуски проверить. MX0 ширина не подтверждена.
CNC AD22	Ø22 монтажное отверстие.	Центры D; глубина и конструкция двери подлежат согласованию.
ГОСТ IEC 61439-1-2024 / -2-2024; IEC 61439-3:2024	Общие требования и профильная часть серии по типу сборки.	Часть и применимость в Казахстане согласовать (12). Не является заявлением о соответствии.

https://www.cncele.com/ycm1-molded-case-circuit-breaker-product/

https://www.cncele.com/uploads/YCB6-63-Mini-Circuit-Breaker-Catalogue.pdf

https://www.cncele.com/uploads/MCB-Miniature-circuit-breaker-YCB7-63N-Catalogue-2024.07.29.pdf

https://www.cncele.com/ad22-indicator-light-product/

https://protect.gost.ru/gost/details/0d99df96-e3e1-4371-b9e7-804d48ea306d

https://protect.gost.ru/gost/details/d033e6d7-e3ee-4915-bb71-f7333832b862

https://webstore.iec.ch/en/publication/68496

B/C - источник данных, D - предложение, ? - отсутствующие/неподтвержденные данные. Клеммники не назначены; отдельный пустой раздел исключен. Отверстия, раскрой, проводная схема и итоговые проверки выпускаются после технических решений.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-00-REF | R4 | 47 / 48

Решение заказчика и допуск к изготовлению

Решение по внешнему виду и составу

Решение	Отметка
Согласовано с приложенными техническими решениями	[ ]
Согласовано с замечаниями; выпуск после внесения исправлений	[ ]
На доработку	[ ]

Приложенные решения / документы: _____
Замечания: _____
Заказчик: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Допуск к изготовлению (заполняется отдельно)

[ ] STOP 01-12 закрыты; решения КОНТРОЛЬ 13-24 внесены, влияющие изменения выпущены.
[ ] Подтверждены корпуса/аппараты и рабочие отверстия, кабельные вводы, проводная схема.
[ ] Расчеты и программа проверок согласованы, комплект рабочих документов указан ниже.
Рабочая ревизия / документы: _____
Ответственный изготовителя: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Подпись внешнего вида без отдельного допуска не разрешает изготовление. Незакрытые вопросы не считаются подтвержденными молчанием.

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ЗАКРЫТИЯ STOP И ПОДПИСАНИЯ ЛИСТА ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик	Документ
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	261009-KS-00-APPROVAL | R4 | 48 / 48
