
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

KASPIY SAMALY

Общежитие на 100 мест, п. «Каспий Самалы» | Атырау

10 щитов | 10 типоисполнений

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

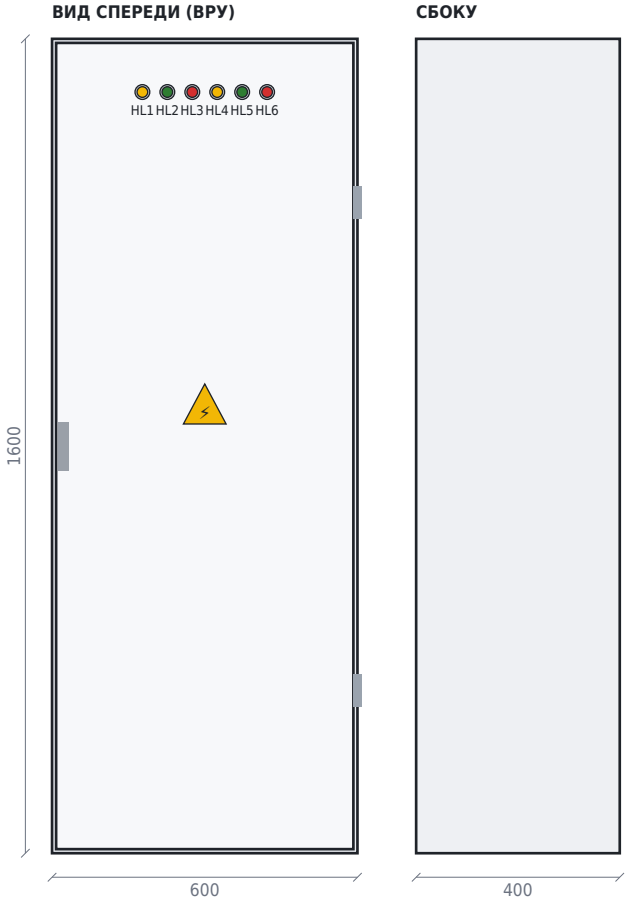

М 1:15 при печати 100%. Размеры в мм. Размещение элементов на двери — предварительное.

Параметр	ВРУ	ЩС	ЩО1.1	ЩО1.2
Количество	1 компл.			
Назначение / нагрузка	Вводно-распределительное устройство, 2 ввода (N1, N2), 13 отходящих линий	Щит силовой: освещение, циркуляционные насосы	Щит освещения и розеточной сети	Щит освещения и розеточной сети
Корпус	Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база), арт. 719-15437, TEKSAN	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54, арт. 719-15425, TEKSAN	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5, арт. 712-03052, TEKSAN	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5, арт. 712-03052, TEKSAN
В × Ш × Г / IP	1600 × 600 × 400 мм / IP31	500 × 400 × 220 мм / IP54	**СТОП: не задано**	**СТОП: не задано**
Монтаж / цвет	напольный, на цоколе 100 мм	**КОНТРОЛЬ**	**КОНТРОЛЬ**	**КОНТРОЛЬ**
Дверь	**КОНТРОЛЬ**			
Ввод кабелей	**КОНТРОЛЬ**			
На двери	HL1: AD22-22D жёлтый ~230 В «N1 L1»; HL2: AD22-22D зелёный ~230 В «N1 L2»; HL3: AD22-22D красный ~230 В «N1 L3»; HL4: AD22-22D жёлтый ~230 В «N2 L1»; HL5: AD22-22D зелёный ~230 В «N2 L2»; HL6: AD22-22D красный ~230 В «N2 L3»	**КОНТРОЛЬ**	**КОНТРОЛЬ**	**КОНТРОЛЬ**
Питание	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE, управление ~230 В (сигнальные лампы)	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE
Ввод	Q1 3P 200 A, Q2 3P 200 A	QF 3P 25 A	QF 3P 32 A	QF 3P 32 A
InA / Ik	**СТОП: не задано**	25 A	32 A	32 A
Исполнение	УХЛ3 (по проекту)	У2 (по проекту)	УХЛ3 (по проекту)	УХЛ3 (по проекту)
Норматив	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015			

СОДЕРЖАНИЕ

1–3 — Титульный лист и технические данные
4–5 — Вопросы для согласования и решение заказчика
6–10 — Функциональные однолинейные схемы
11–14 — Клеммники и внешние подключения
15–25 — Компоновки и перечни аппаратов

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 261009 | KASPIY SAMALY** ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Основание: BOM 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261009**	**1 / 25**	**R0**	**09.10.2026**

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (продолжение)

Параметр	ЩО2.1	ЩО2.2	ЩВ1.1	ЩВ1.2
Количество	1 компл.			
Назначение / нагрузка	Щит освещения и розеточной сети	Щит освещения и розеточной сети	Щит питания кондиционеров и вентиляции, отключение по сигналу ППС	Щит питания кондиционеров и вентиляции, отключение по сигналу ППС
Корпус	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5, арт. 712-03052, TEKSAN			
В × Ш × Г / IP	**СТОП: не задано**			
Монтаж / цвет	**КОНТРОЛЬ**			
Дверь	**КОНТРОЛЬ**			
Ввод кабелей	**КОНТРОЛЬ**			
На двери	**КОНТРОЛЬ**			
Питание	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE, управление ~230 В (незав. расцепитель)	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE, управление ~230 В (незав. расцепитель)
Ввод	QF 3P 32 A	QF 3P 32 A	QF 3P 25 A	QF 3P 25 A
InA / Ik	32 A	32 A	25 A	25 A
Исполнение	УХЛ3 (по проекту)			
Норматив	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015			

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (продолжение)

Параметр	ЩВ2.1	ЩВ2.2
Количество	1 компл.	
Назначение / нагрузка	Щит питания кондиционеров и вентиляции, отключение по сигналу ППС	
Корпус	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5, арт. 712-03052, TEKSAN	
В × Ш × Г / IP	**СТОП: не задано**	
Монтаж / цвет	**КОНТРОЛЬ**	
Дверь	**КОНТРОЛЬ**	
Ввод кабелей	**КОНТРОЛЬ**	
На двери	**КОНТРОЛЬ**	
Питание	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE, управление ~230 В (незав. расцепитель)	
Ввод	QF 3P 32 A	
InA / Ik	32 A	
Исполнение	УХЛ3 (по проекту)	
Норматив	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015	

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Ниже перечислены только вопросы, влияющие на состав, схему и изготовление. Ответ вносится в правую колонку. СТОП — изготовление не начинать до ответа; КОНТРОЛЬ — подтвердить или исправить.

№	Вопрос	Уровень	Что требуется подтвердить	Ответ / подтверждение заказчика
1	**Ввод и система сети**	**СТОП**	• **ВРУ:** Определить: система заземления (TN-S / TN-C-S / TN-C), номинальный ток щита InA. **[СТОП]** • **ВРУ:** Два ввода Q1 (N1) и Q2 (N2) на одну сборную шину: блокировка (механическая / электрическая) или АВР в проекте и BOM не показана. Определить режим работы вводов (ПУЭ, II категория). **[СТОП]** • **ЩС, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** Определить: система заземления (TN-S / TN-C-S / TN-C). **[СТОП]** • **Все щиты:** Ожидаемый ток КЗ Ik в точке установки (для проверки Icu аппаратов 6 кА).	
2	**Аппараты (BOM)**	**СТОП**	• **ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2:** Вводной QF: однолинейная схема — BA47-29 3P C32, спецификация ЭОМ.СО — 3P C25; в BOM принят 32 А. Подтвердить номинал. **[СТОП]** • **ВРУ:** Q1, Q2: по проекту BA88-35 3P 200 A 35 кА; по BOM CNC YCM1-250L 200A/3300 — подтвердить Icu ≥ 35 кА и тип расцепителя.	
3	**Корпус**	**СТОП**	• **ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** Не заданы данные корпуса: высота, ширина, глубина. **[СТОП]** • **ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** NEXUS DX10-M24SBB: габариты В×Ш×Г и IP не заданы; способ установки: спецификация ЭОМ.СО — встраиваемый, схема — навесной, BOM — о/у (открытой установки). Определить. **[СТОП]** • **ВРУ:** Уточнить: цвет RAL, кабельные вводы (кол-во, Ø, сторона). • **ВРУ:** Корпус-аналог 1600×600×400 (BOM 719-15437) вместо ЩМП-16.6.4-0 IEK: подтвердить IP31, УХЛ3 и замену. • **ЩС, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** Уточнить: способ установки, цвет RAL, кабельные вводы (кол-во, Ø, сторона).	
4	**Нагрузки и защита**	**КОНТРОЛЬ**	• **ВРУ:** QF1, QF3, QF5–QF8 C40 и QF2, QF4, QF9 C32 защищают кабели ВВГнг(А)-LS 5×4 мм² (проект) — проверить Iдоп кабеля ≥ In (ПУЭ гл. 1.3). • **ВРУ:** QF13 3P C16: по схеме — «Фидер уличного освещения» (кабель не указан), по BOM — резерв. Подтвердить назначение. • **ЩС:** гр.2 Циркул. насос рабочий, 5×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩС:** гр.3 Циркул. насос резервный, 5×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩВ1.2:** V1.2.4 Вытяжной вентилятор, L1, 3×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩВ1.2:** V1.2.5 Вытяжной вентилятор, L2, 3×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩВ2.2:** V2.2.8 Вытяжной вентилятор, L2, 3×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту.	
5	**Схема управления**	**КОНТРОЛЬ**	• **ЩВ1.1, ЩВ1.2:** QF7 1P C6 (защита цепи независимого расцепителя) добавлен TEKLED, в проекте нет. Расцепитель — CNC A011130 вместо PH47: подтвердить; питание цепи — от вводного или от УК-ВК? • **ЩВ2.1, ЩВ2.2:** QF10 1P C6 (защита цепи независимого расцепителя) добавлен TEKLED, в проекте нет. Расцепитель — CNC A011130 вместо PH47: подтвердить; питание цепи — от вводного или от УК-ВК?	
6	**Элементы на двери**	**КОНТРОЛЬ**	• **ВРУ:** QF14, QF15 3P C6 + HL1–HL6 (сигнализация фаз вводов N1 / N2) добавлены TEKLED, в проекте нет. Подключение — до Q1/Q2 (наличие напряжения на вводе): подтвердить.	

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (продолжение)

№	Вопрос	Уровень	Что требуется подтвердить	Ответ / подтверждение заказчика
7	**Компоновка**	**КОНТРОЛЬ**	• **ВРУ:** Монтажная панель корпуса 719-15437: размеры не заданы — зона принята 540 × 1540 мм (Ш−60 / В−60). Сверить с паспортом. • **ВРУ:** Нет габаритов в библиотеке parca_db: Q1, Q2, QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6, QF7, QF8, QF9, QF10, QF11, QF12, QF13, QF14, QF15. • **ЩС:** Монтажная панель корпуса 719-15425: размеры не заданы — зона принята 340 × 440 мм (Ш−60 / В−60). Сверить с паспортом. • **ЩС:** Резерв на DIN-рейках 6% < 20%. • **ЩС:** Нет габаритов в библиотеке parca_db: QF, QF1, QF2, QF3, QF4. • **ЩО1.1, ЩО2.2:** Нет габаритов в библиотеке parca_db: QF, QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6, QF7, QF8, QF9, QF10, QF11. • **ЩО1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** Нет габаритов в библиотеке parca_db: QF, QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6, QF7, QF8, QF9, QF10. • **ЩО2.1:** Резерв на DIN-рейках 14% < 20%. • **ЩО2.1:** Нет габаритов в библиотеке parca_db: QF, QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6, QF7, QF8, QF9, QF10, QF11, QF12. • **ЩВ1.1, ЩВ1.2:** Нет габаритов в библиотеке parca_db: QF, QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6, QF7.	

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ СОГЛАСОВАНО **☐ С ЗАМЕЧАНИЯМИ** **☐ НА ДОРАБОТКУ**

Ф.И.О. / должность _____ Подпись _____ Дата _____ М.П.


Согласование охватывает внешний вид, состав, функциональную схему, клеммы и предварительную компоновку. Изменения после согласования — новой ревизией.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ


Однолинейное представление силовых цепей по типоисполнениям. Ссылка на аппарат: «лист.колонка» (колонки 1–10 вверху листа). Назначение линий подлежит подтверждению на листе вопросов.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

=ВРУ 380/220 В 3P+N+PE

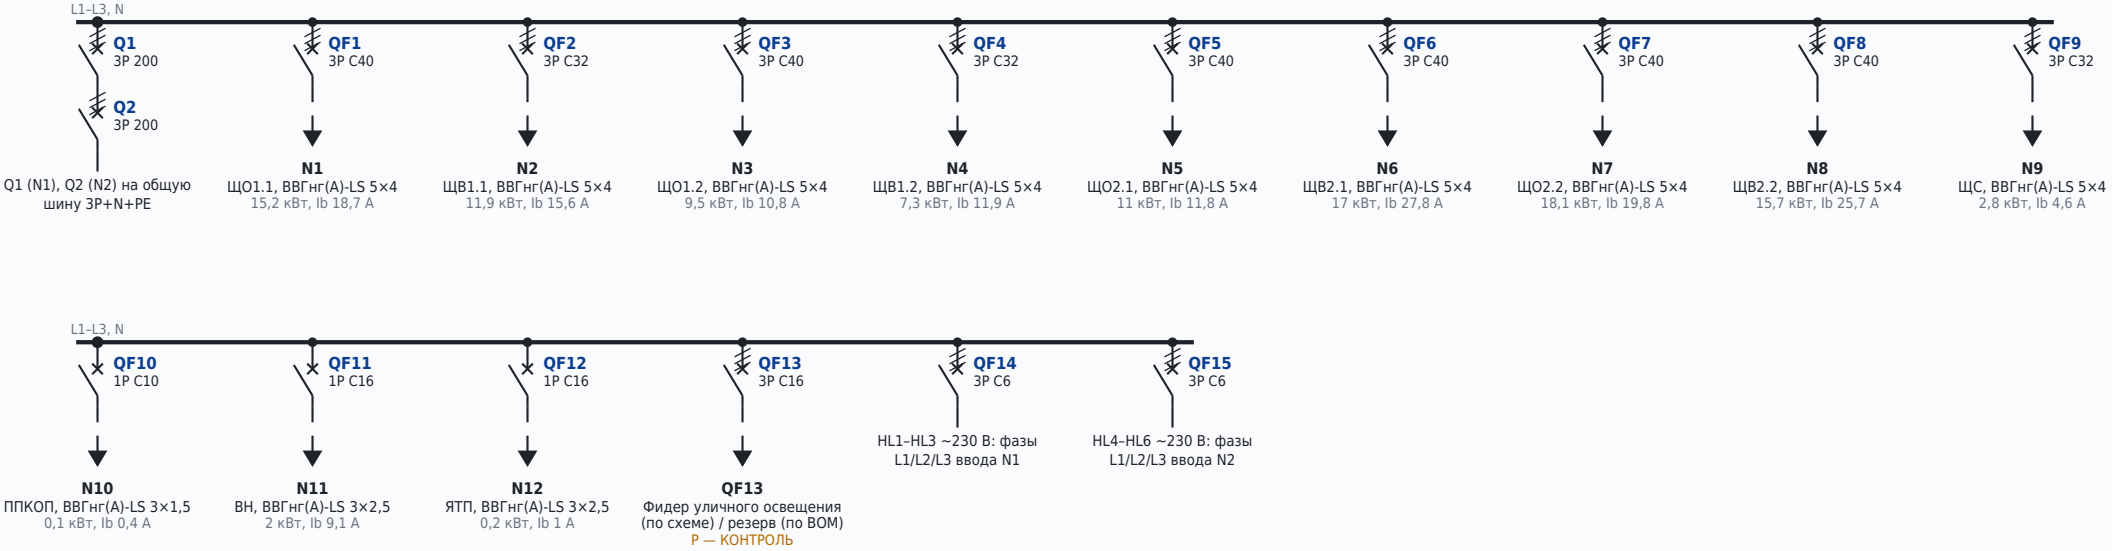

=ЩС 380/220 В 3P+N+PE




Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 261009 | KASPIY SAMALY** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ Основание: ВОМ 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261009**	**6 / 25**	**R0**	**09.10.2026**


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

=ЩО1.1 380/220 В 3P+N+PE

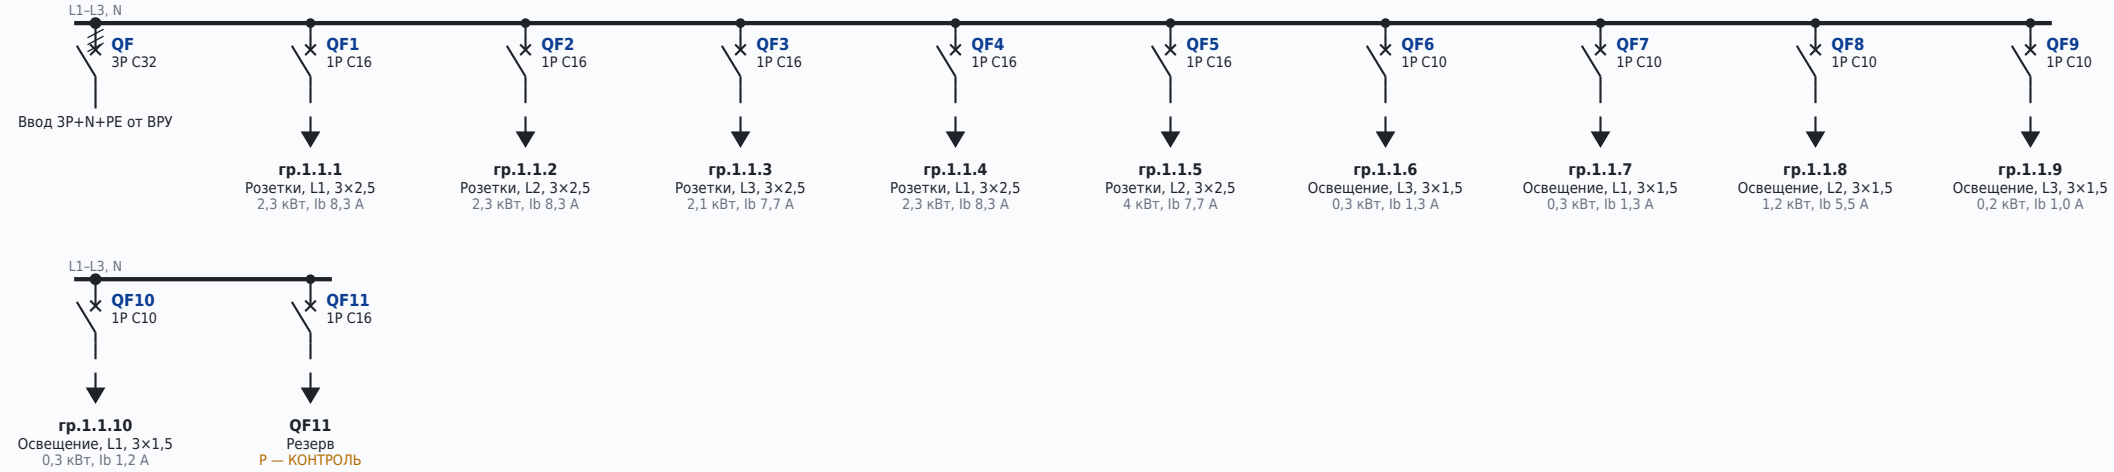

=ЩО1.2 380/220 В 3P+N+PE

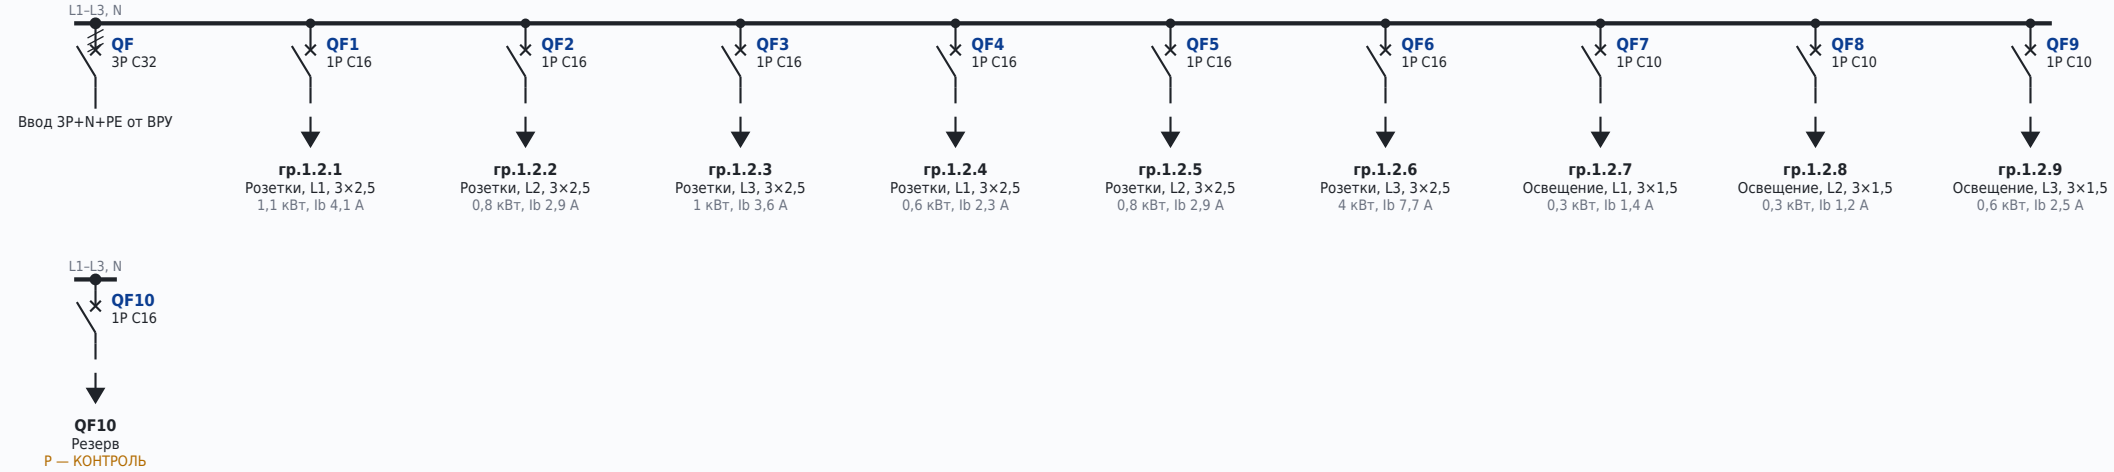


Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	Проект 261009 | KASPIY SAMALY ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение) Основание: ВОМ 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261009	7 / 25	R0	09.10.2026

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение)

=ЩО2.1 380/220 В 3P+N+PE

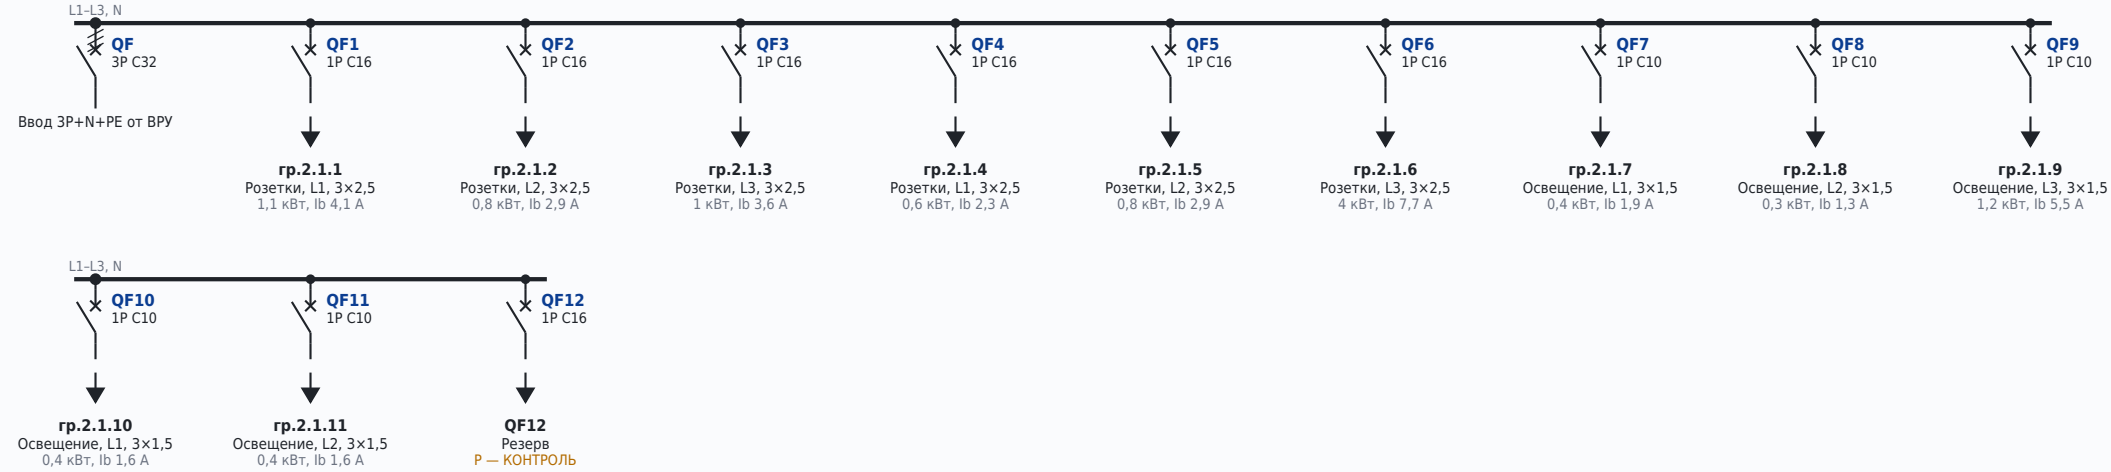

=ЩО2.2 380/220 В 3P+N+PE

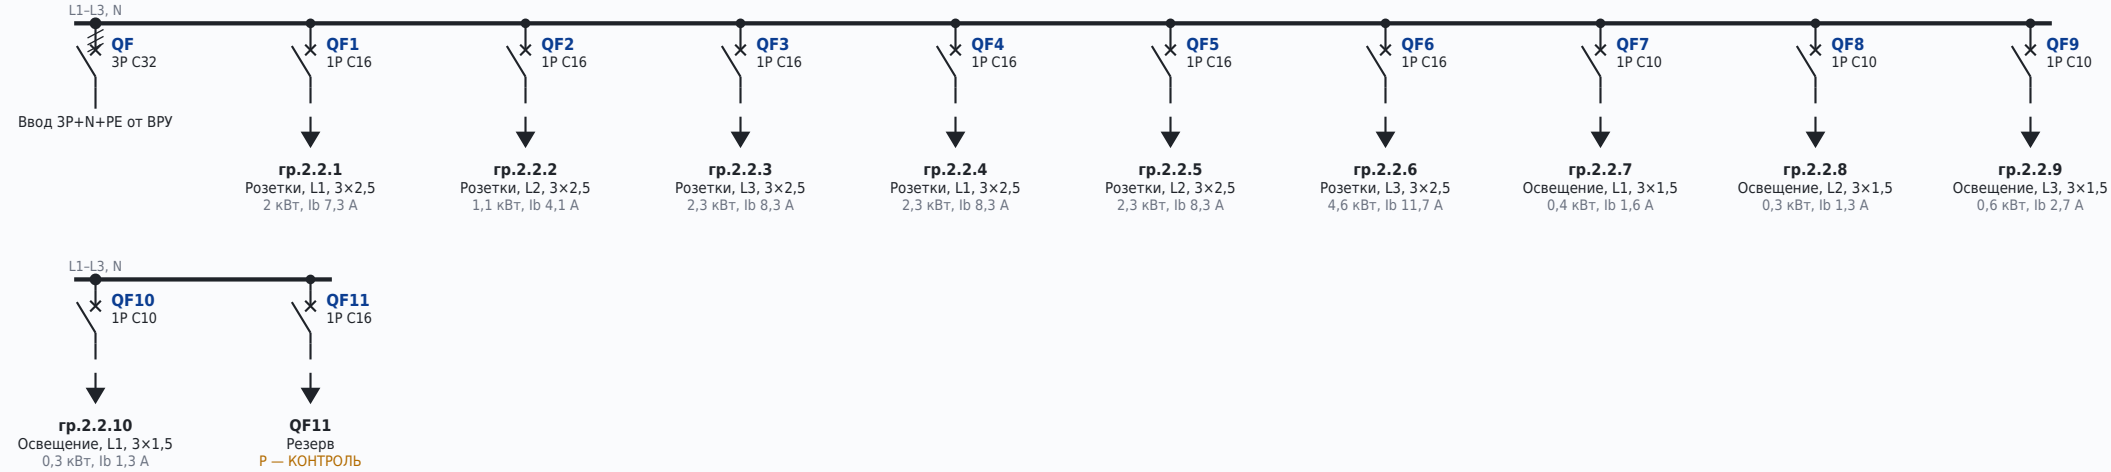


Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	Проект 261009 | KASPIY SAMALY ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение) Основание: ВОМ 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261009	8 / 25	R0	09.10.2026

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение)

=ЩВ1.1 380/220 В 3P+N+PE



=ЩВ1.2 380/220 В 3P+N+PE




Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 261009 | KASPIY SAMALY** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение) Основание: ВОМ 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261009**	**9 / 25**	**R0**	**09.10.2026**


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

=ЩВ2.1 380/220 В 3P+N+PE

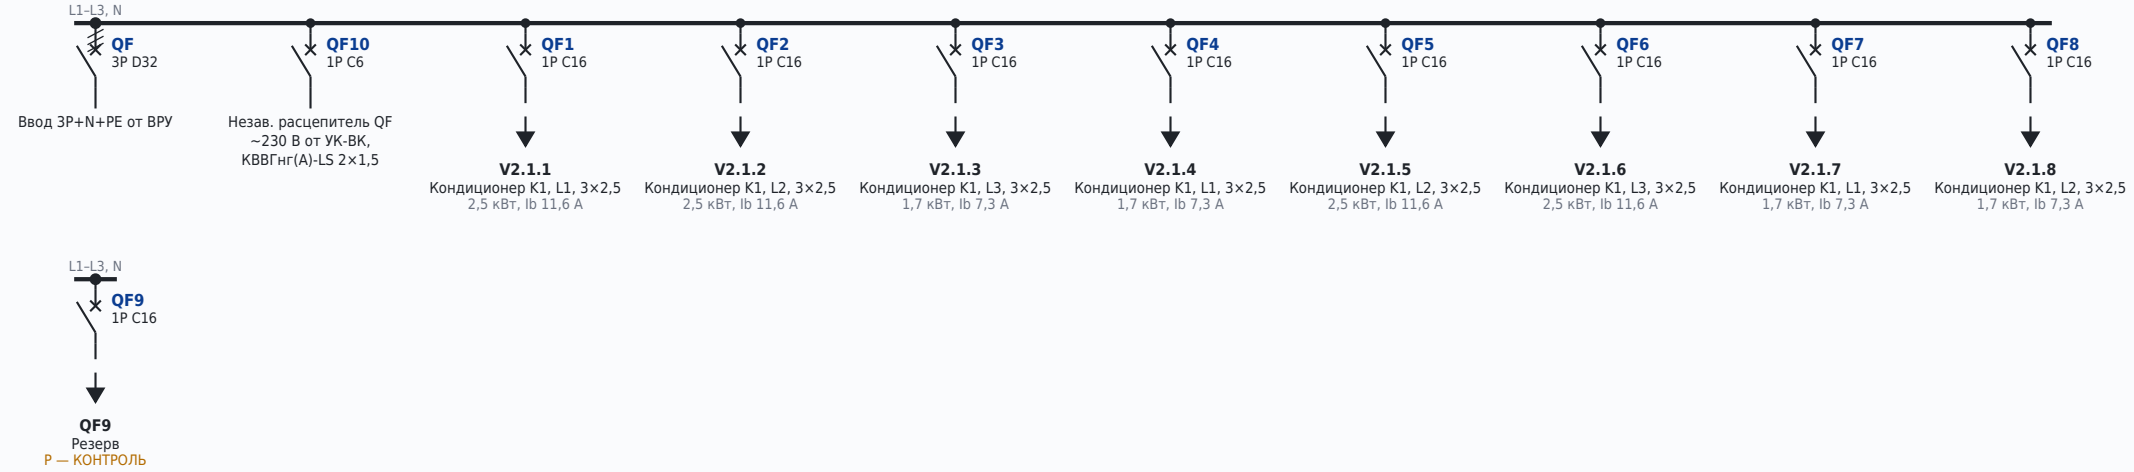

=ЩВ2.2 380/220 В 3P+N+PE

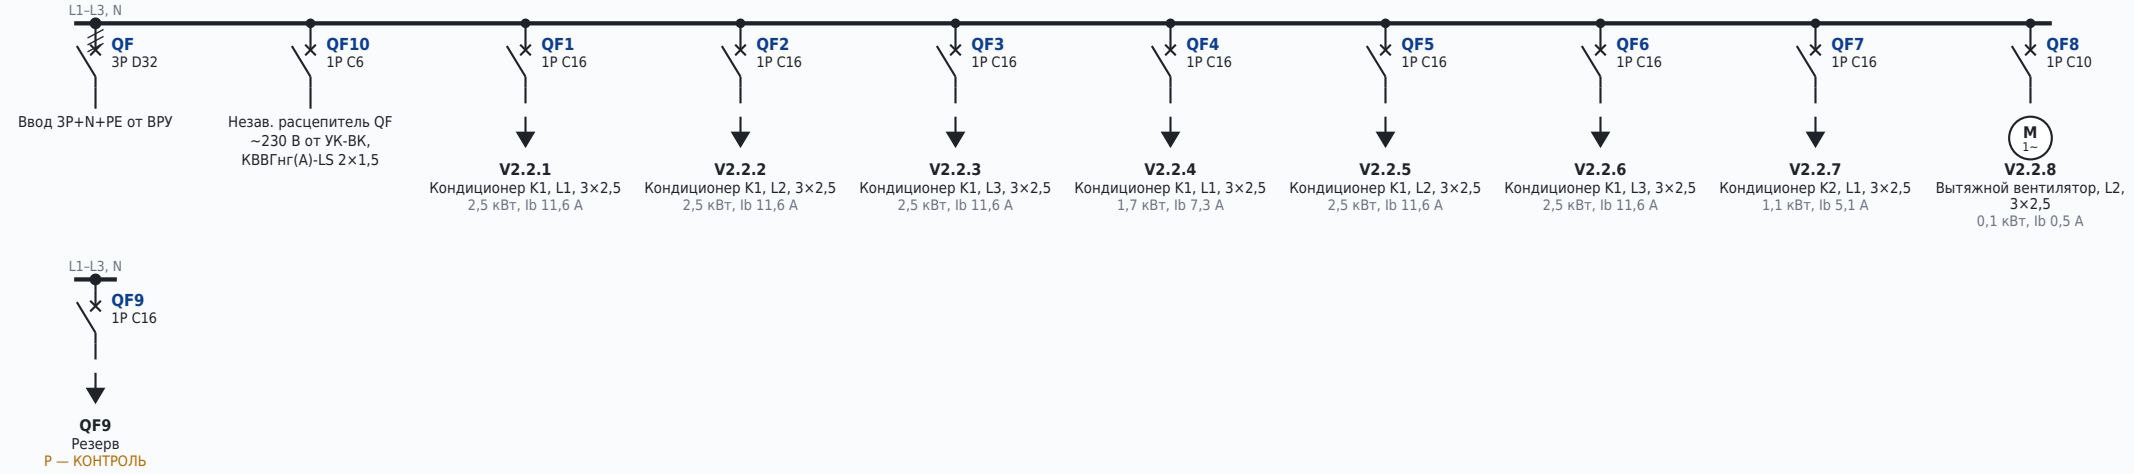

Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 261009 | KASPIY SAMALY** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение) Основание: BOM 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261009**	**10 / 25**	**R0**	**09.10.2026**

КЛЕММНИКИ И ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Клеммник XT1 по типоисполнениям (порядок слева направо на DIN-рейке). Назначение клемм — предварительное, по составу BOM и однолинейной схеме (лист схем).

=ВРУ XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.

Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

=ЩС XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.

Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

=ЩО1.1 XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.

Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

КЛЕММНИКИ И ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Клеммник XT1 по типоисполнениям (порядок слева направо на DIN-рейке). Назначение клемм — предварительное, по составу BOM и однолинейной схеме (лист схем).

=ЩО1.2 XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.

Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

=ЩО2.1 XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.

Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

=ЩО2.2 XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.

Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

КЛЕММНИКИ И ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Клеммник XT1 по типоисполнениям (порядок слева направо на DIN-рейке). Назначение клемм — предварительное, по составу BOM и однолинейной схеме (лист схем).

=ЩВ1.1 XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.

Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

=ЩВ1.2 XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.

Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

=ЩВ2.1 XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.

Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

КЛЕММНИКИ И ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Клеммник XT1 по типоисполнениям (порядок слева направо на DIN-рейке). Назначение клемм — предварительное, по составу BOM и однолинейной схеме (лист схем).

=ЩВ2.2 XT1

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: нет.


Требуется по схеме: —.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

ВРУ — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

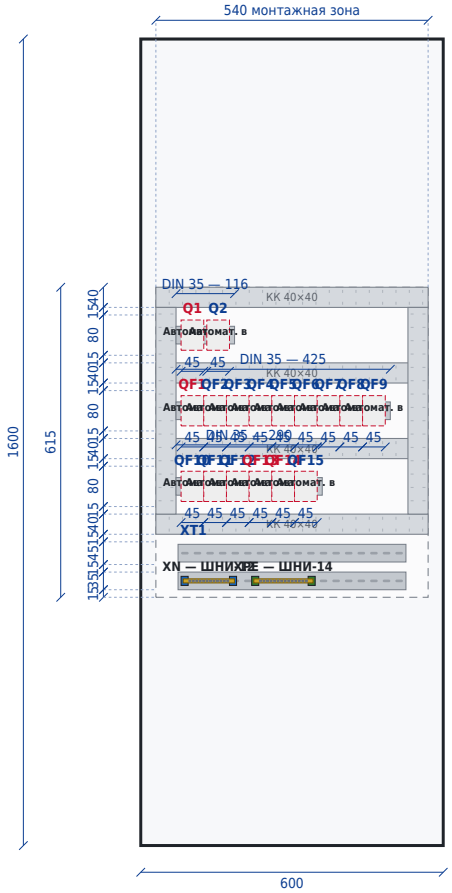

М 1:15. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	296831	40	3P C	N1 ЩО1.1, ВВГнг(A)-LS 5×4	6.2	КОНТРОЛЬ
QF2	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	32	3P C	N2 ЩВ1.1, ВВГнг(A)-LS 5×4	6.3	КОНТРОЛЬ
QF3	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	296831	40	3P C	N3 ЩО1.2, ВВГнг(A)-LS 5×4	6.4	КОНТРОЛЬ
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	32	3P C	N4 ЩВ1.2, ВВГнг(A)-LS 5×4	6.5	КОНТРОЛЬ
QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	296831	40	3P C	N5 ЩО2.1, ВВГнг(A)-LS 5×4	6.6	КОНТРОЛЬ
QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	296831	40	3P C	N6 ЩВ2.1, ВВГнг(A)-LS 5×4	6.7	КОНТРОЛЬ
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	296831	40	3P C	N7 ЩО2.2, ВВГнг(A)-LS 5×4	6.8	КОНТРОЛЬ
QF8	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	296831	40	3P C	N8 ЩВ2.2, ВВГнг(A)-LS 5×4	6.9	КОНТРОЛЬ
QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	32	3P C	N9 ЩС, ВВГнг(A)-LS 5×4	6.10	КОНТРОЛЬ
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	N10 ППКОП, ВВГнг(A)-LS 3×1,5	6.11	КОНТРОЛЬ
QF11	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	N11 ВН, ВВГнг(A)-LS 3×2,5	6.12	КОНТРОЛЬ
QF12	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	N12 ЯТП, ВВГнг(A)-LS 3×2,5	6.13	КОНТРОЛЬ
QF13	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	16	3P C	QF13 Фидер уличного освещения (по схеме) / резерв (по BOM)	6.14	КОНТРОЛЬ
QF14	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 6A 4.5kA х-ка C	296825	6	3P C	Сигнализация фаз ввода N1	6.15	КОНТРОЛЬ
QF15	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 6A 4.5kA х-ка C	296825	6	3P C	Сигнализация фаз ввода N2	6.16	КОНТРОЛЬ
Q1	Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300	B000096	200	3P	Вводы N1, N2 от внешних сетей	6.1	КОНТРОЛЬ
Q2	Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300	B000096	200	3P	Вводы N1, N2 от внешних сетей	6.1	КОНТРОЛЬ
HL1	AD22-22D жёлтый ~230 В	E010209	—	дверь	N1 L1	6.15	Ø22
HL2	AD22-22D зелёный ~230 В	E010207	—	дверь	N1 L2	6.15	Ø22
HL3	AD22-22D красный ~230 В	E010208	—	дверь	N1 L3	6.15	Ø22
HL4	AD22-22D жёлтый ~230 В	E010209	—	дверь	N2 L1	6.16	Ø22
HL5	AD22-22D зелёный ~230 В	E010207	—	дверь	N2 L2	6.16	Ø22

ВРУ — ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ (продолжение)

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
HL6	AD22-22D красный ~230 В	E010208	—	дверь	N2 L3	6.16	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база)	719-15437	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель (литой корпус) — 2 шт; Автомат. выключатель модульный — 15 шт; Сигнальная лампа — 6 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 96 мм; Ряд 2 — 405 мм; Ряд 3 — 270 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.


КОНТРОЛЬ: монтажная зона 540 × 1540 мм принята по корпусу 719-15437 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Корпус по проекту: ЩМП-16.6.4-0 УХЛ3 IP31 IEK (без монтажной панели); по BOM — аналог 1600×600×400 + цоколь 100 мм.

ЩС — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

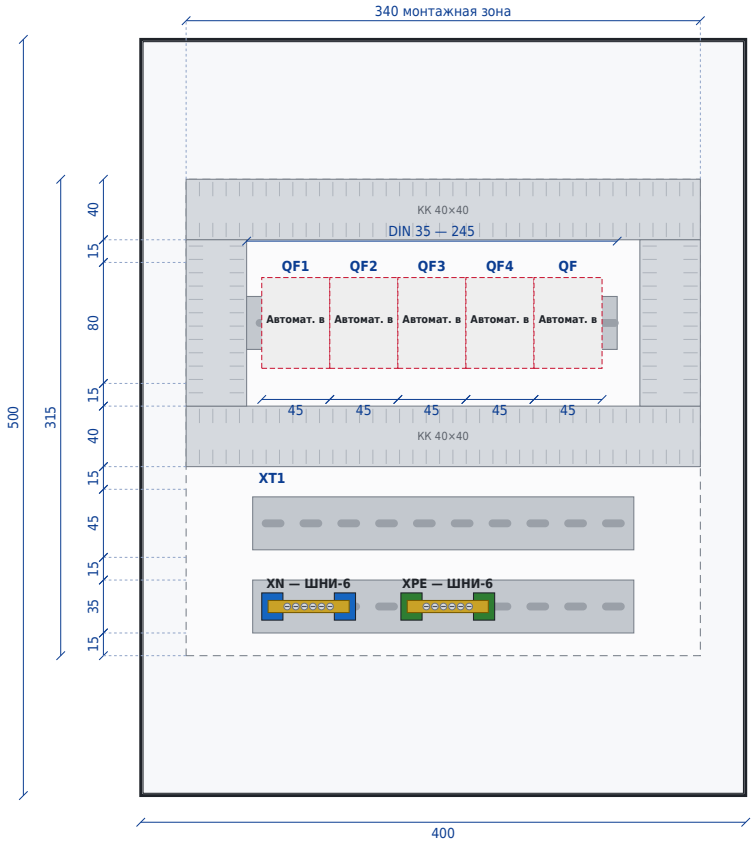

М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1 Группа освещения, L1, 3×1,5	6.2	**КОНТРОЛЬ**
QF2	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кA х-ка D	814183	16	3P D	гр.2 Циркул. насос рабочий, 5×2,5	6.3	**КОНТРОЛЬ**
QF3	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кA х-ка D	814183	16	3P D	гр.3 Циркул. насос резервный, 5×2,5	6.4	**КОНТРОЛЬ**
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	QF4 Резерв	6.5	**КОНТРОЛЬ**
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	25	3P C	Ввод от ВРУ (N9), ВВГнг(A)-LS 5×4	6.1	**КОНТРОЛЬ**

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	719-15425	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 225 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 340 × 440 мм принята по корпусу 719-15425 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**P-02 | =ЩС** ЩС — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Основание: BOM 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	**261009**	**17 / 25**	**R0**	**09.10.2026**

ЩО1.1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СТОП: габариты корпуса не заданы — компоновка не выполнена.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.1.1 Розетки, L1, 3×2,5	7.2	КОНТРОЛЬ
QF2	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.1.2 Розетки, L2, 3×2,5	7.3	КОНТРОЛЬ
QF3	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.1.3 Розетки, L3, 3×2,5	7.4	КОНТРОЛЬ
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.1.4 Розетки, L1, 3×2,5	7.5	КОНТРОЛЬ
QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.1.5 Розетки, L2, 3×2,5	7.6	КОНТРОЛЬ
QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.1.1.6 Освещение, L3, 3×1,5	7.7	КОНТРОЛЬ
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.1.1.7 Освещение, L1, 3×1,5	7.8	КОНТРОЛЬ
QF8	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.1.1.8 Освещение, L2, 3×1,5	7.9	КОНТРОЛЬ
QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.1.1.9 Освещение, L3, 3×1,5	7.10	КОНТРОЛЬ
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.1.1.10 Освещение, L1, 3×1,5	7.11	КОНТРОЛЬ
QF11	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	QF11 Резерв	7.12	КОНТРОЛЬ
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	32	3P C	Ввод от ВРУ, ВВГнг(А)-LS 5×4	7.1	КОНТРОЛЬ

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 12 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 315 мм; Ряд 2 — 225 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 600 мм принята по корпусу 712-03052 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Корпус по проекту: ЩРВ-П-24 IP41 УХЛ3 IEK; по BOM — NEXUS DX10-M24SBB о/у, 24 модуля.

ЩО1.2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СТОП: габариты корпуса не заданы — компоновка не выполнена.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.2.1 Розетки, L1, 3×2,5	7.2	КОНТРОЛЬ
QF2	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.2.2 Розетки, L2, 3×2,5	7.3	КОНТРОЛЬ
QF3	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.2.3 Розетки, L3, 3×2,5	7.4	КОНТРОЛЬ
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.2.4 Розетки, L1, 3×2,5	7.5	КОНТРОЛЬ
QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.2.5 Розетки, L2, 3×2,5	7.6	КОНТРОЛЬ
QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.1.2.6 Розетки, L3, 3×2,5	7.7	КОНТРОЛЬ
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.1.2.7 Освещение, L1, 3×1,5	7.8	КОНТРОЛЬ
QF8	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.1.2.8 Освещение, L2, 3×1,5	7.9	КОНТРОЛЬ
QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.1.2.9 Освещение, L3, 3×1,5	7.10	КОНТРОЛЬ
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	QF10 Резерв	7.11	КОНТРОЛЬ
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	32	3P C	Ввод от ВРУ, ВВГнг(А)-LS 5×4	7.1	КОНТРОЛЬ

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 11 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 315 мм; Ряд 2 — 180 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 600 мм принята по корпусу 712-03052 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Корпус по проекту: ЩРВ-П-24 IP41 УХЛ3 IEK; по BOM — NEXUS DX10-M24SBB о/у, 24 модуля.

ЩО2.1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СТОП: габариты корпуса не заданы — компоновка не выполнена.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.1.1 Розетки, L1, 3×2,5	8.2	КОНТРОЛЬ
QF2	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.1.2 Розетки, L2, 3×2,5	8.3	КОНТРОЛЬ
QF3	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.1.3 Розетки, L3, 3×2,5	8.4	КОНТРОЛЬ
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.1.4 Розетки, L1, 3×2,5	8.5	КОНТРОЛЬ
QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.1.5 Розетки, L2, 3×2,5	8.6	КОНТРОЛЬ
QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.1.6 Розетки, L3, 3×2,5	8.7	КОНТРОЛЬ
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.2.1.7 Освещение, L1, 3×1,5	8.8	КОНТРОЛЬ
QF8	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.2.1.8 Освещение, L2, 3×1,5	8.9	КОНТРОЛЬ
QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.2.1.9 Освещение, L3, 3×1,5	8.10	КОНТРОЛЬ
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.2.1.10 Освещение, L1, 3×1,5	8.11	КОНТРОЛЬ
QF11	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.2.1.11 Освещение, L2, 3×1,5	8.12	КОНТРОЛЬ
QF12	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	QF12 Резерв	8.13	КОНТРОЛЬ
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	32	3P C	Ввод от ВРУ, ВВГнг(А)-LS 5×4	8.1	КОНТРОЛЬ

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 13 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 315 мм; Ряд 2 — 270 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 600 мм принята по корпусу 712-03052 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Корпус по проекту: ЩРВ-П-24 IP41 УХЛ3 IEK; по BOM — NEXUS DX10-M24SBB о/у, 24 модуля.

ЩО2.2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СТОП: габариты корпуса не заданы — компоновка не выполнена.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.2.1 Розетки, L1, 3×2,5	8.2	КОНТРОЛЬ
QF2	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.2.2 Розетки, L2, 3×2,5	8.3	КОНТРОЛЬ
QF3	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.2.3 Розетки, L3, 3×2,5	8.4	КОНТРОЛЬ
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.2.4 Розетки, L1, 3×2,5	8.5	КОНТРОЛЬ
QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.2.5 Розетки, L2, 3×2,5	8.6	КОНТРОЛЬ
QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	гр.2.2.6 Розетки, L3, 3×2,5	8.7	КОНТРОЛЬ
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.2.2.7 Освещение, L1, 3×1,5	8.8	КОНТРОЛЬ
QF8	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.2.2.8 Освещение, L2, 3×1,5	8.9	КОНТРОЛЬ
QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.2.2.9 Освещение, L3, 3×1,5	8.10	КОНТРОЛЬ
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	гр.2.2.10 Освещение, L1, 3×1,5	8.11	КОНТРОЛЬ
QF11	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	QF11 Резерв	8.12	КОНТРОЛЬ
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	32	3P C	Ввод от ВРУ, ВВГнг(А)-LS 5×4	8.1	КОНТРОЛЬ

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 12 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 315 мм; Ряд 2 — 225 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 600 мм принята по корпусу 712-03052 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Корпус по проекту: ЩРВ-П-24 IP41 УХЛ3 IEK; по BOM — NEXUS DX10-M24SBB о/у, 24 модуля.

ЩВ1.1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СТОП: габариты корпуса не заданы — компоновка не выполнена.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V1.1.1 Кондиционер K1, L1, 3×2,5	9.3	КОНТРОЛЬ
QF2	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V1.1.2 Кондиционер K1, L2, 3×2,5	9.4	КОНТРОЛЬ
QF3	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V1.1.3 Кондиционер K1, L3, 3×2,5	9.5	КОНТРОЛЬ
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V1.1.4 Кондиционер K1, L1, 3×2,5	9.6	КОНТРОЛЬ
QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V1.1.5 Кондиционер K1, L2, 3×2,5	9.7	КОНТРОЛЬ
QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	QF6 Резерв	9.8	КОНТРОЛЬ
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	6	1P C	Отключение по сигналу ППС (УК-ВК исп.02)	9.2	КОНТРОЛЬ
QF	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6kA х-ка D	814185	25	3P D	Ввод от ВРУ, ВВГнг(A)-LS 5×4	9.1	КОНТРОЛЬ

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт
Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	A011130	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 8 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 315 мм; Ряд 2 — 45 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 600 мм принята по корпусу 712-03052 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Корпус по проекту: ЩРВ-П-24 IP41 УХЛ3 IEK; по BOM — NEXUS DX10-M24SBB о/у, 24 модуля.

ЩВ1.2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СТОП: габариты корпуса не заданы — компоновка не выполнена.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V1.2.1 Кондиционер K1, L1, 3×2,5	9.3	КОНТРОЛЬ
QF2	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V1.2.2 Кондиционер K3, L2, 3×2,5	9.4	КОНТРОЛЬ
QF3	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V1.2.3 Кондиционер K3, L3, 3×2,5	9.5	КОНТРОЛЬ
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	V1.2.4 Вытяжной вентилятор, L1, 3×2,5	9.6	КОНТРОЛЬ
QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	V1.2.5 Вытяжной вентилятор, L2, 3×2,5	9.7	КОНТРОЛЬ
QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	QF6 Резерв	9.8	КОНТРОЛЬ
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	6	1P C	Отключение по сигналу ППС (УК-ВК исп.02)	9.2	КОНТРОЛЬ
QF	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6kA х-ка D	814185	25	3P D	Ввод от ВРУ, ВВГнг(A)-LS 5×4	9.1	КОНТРОЛЬ

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт
Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	A011130	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 8 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 315 мм; Ряд 2 — 45 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 600 мм принята по корпусу 712-03052 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Корпус по проекту: ЩРВ-П-24 IP41 УХЛ3 IEK; по BOM — NEXUS DX10-M24SBB о/у, 24 модуля.

ЩВ2.1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СТОП: габариты корпуса не заданы — компоновка не выполнена.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.1.1 Кондиционер K1, L1, 3×2,5	10.3	КОНТРОЛЬ
QF2	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.1.2 Кондиционер K1, L2, 3×2,5	10.4	КОНТРОЛЬ
QF3	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.1.3 Кондиционер K1, L3, 3×2,5	10.5	КОНТРОЛЬ
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.1.4 Кондиционер K1, L1, 3×2,5	10.6	КОНТРОЛЬ
QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.1.5 Кондиционер K1, L2, 3×2,5	10.7	КОНТРОЛЬ
QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.1.6 Кондиционер K1, L3, 3×2,5	10.8	КОНТРОЛЬ
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.1.7 Кондиционер K1, L1, 3×2,5	10.9	КОНТРОЛЬ
QF8	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.1.8 Кондиционер K1, L2, 3×2,5	10.10	КОНТРОЛЬ
QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	QF9 Резерв	10.11	КОНТРОЛЬ
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	6	1P C	Отключение по сигналу ППС (УК-ВК исп.02)	10.2	КОНТРОЛЬ
QF	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6kA х-ка D	814186	32	3P D	Ввод от ВРУ, ВВГнг(А)-LS 5×4	10.1	КОНТРОЛЬ

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт
Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	A011130	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 11 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 315 мм; Ряд 2 — 180 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 600 мм принята по корпусу 712-03052 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Корпус по проекту: ЩРВ-П-24 IP41 УХЛ3 IEK; по BOM — NEXUS DX10-M24SBB о/у, 24 модуля.

ЩВ2.2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R0 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СТОП: габариты корпуса не заданы — компоновка не выполнена.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.2.1 Кондиционер K1, L1, 3×2,5	10.3	КОНТРОЛЬ
QF2	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.2.2 Кондиционер K1, L2, 3×2,5	10.4	КОНТРОЛЬ
QF3	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.2.3 Кондиционер K1, L3, 3×2,5	10.5	КОНТРОЛЬ
QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.2.4 Кондиционер K1, L1, 3×2,5	10.6	КОНТРОЛЬ
QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.2.5 Кондиционер K1, L2, 3×2,5	10.7	КОНТРОЛЬ
QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.2.6 Кондиционер K1, L3, 3×2,5	10.8	КОНТРОЛЬ
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	V2.2.7 Кондиционер K2, L1, 3×2,5	10.9	КОНТРОЛЬ
QF8	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	10	1P C	V2.2.8 Вытяжной вентилятор, L2, 3×2,5	10.10	КОНТРОЛЬ
QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	16	1P C	QF9 Резерв	10.11	КОНТРОЛЬ
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	6	1P C	Отключение по сигналу ППС (УК-ВК исп.02)	10.2	КОНТРОЛЬ
QF	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6kA х-ка D	814186	32	3P D	Ввод от ВРУ, ВВГнг(А)-LS 5×4	10.1	КОНТРОЛЬ

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт
Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	A011130	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 11 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 315 мм; Ряд 2 — 180 мм; XT1 — 0 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 600 мм принята по корпусу 712-03052 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

Корпус по проекту: ЩРВ-П-24 IP41 УХЛ3 IEK; по BOM — NEXUS DX10-M24SBB о/у, 24 модуля.
