
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

KASPIY SAMALY

Общежитие на 100 мест, п. «Каспий Самалы» | Атырау

10 щитов | 10 типоисполнений

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

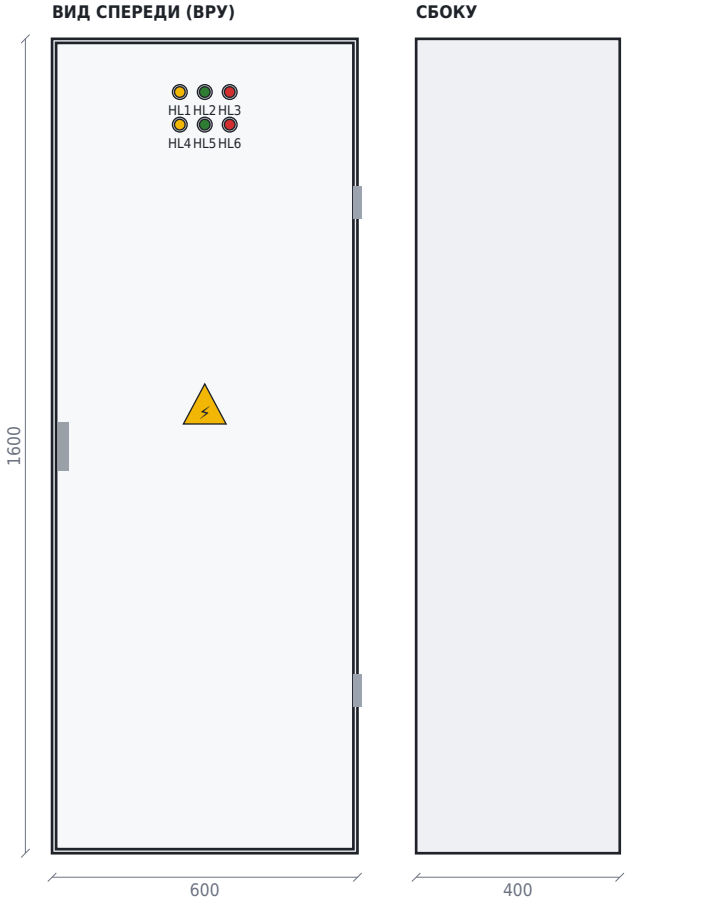

М 1:15 при печати 100%. Размеры в мм. Размещение элементов на двери — предварительное.

Параметр	ВРУ	ЩС	ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2	ЩВ1.1, ЩВ1.2	ЩВ2.1, ЩВ2.2
Количество	1 компл.	1 компл.	1 компл. × 4 щ.	1 компл. × 2 щ.	1 компл. × 2 щ.
Назначение / нагрузка	Вводно-распределительное устройство, 2 ввода (N1, N2), 13 отходящих линий	Щит силовой: освещение, циркуляционные насосы	Щит освещения и розеточной сети	Щит питания кондиционеров и вентиляции, отключение по сигналу ППС	Щит питания кондиционеров и вентиляции, отключение по сигналу ППС
Корпус	Мет.Корпус Щит (1600х600х400+10см база), арт. 719-15437, TEKSAN	Мет.Корпус ЩМП-2 (500х400х220) IP54, арт. 719-15425, TEKSAN	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5, арт. 712-03052, TEKSAN	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5, арт. 712-03052, TEKSAN	DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5, арт. 712-03052, TEKSAN
В × Ш × Г / IP	1600 × 600 × 400 мм / IP31	500 × 400 × 220 мм / IP54	**СТОП: не задано**	**СТОП: не задано**	**СТОП: не задано**
Монтаж / цвет	напольный, на цоколе 100 мм	**КОНТРОЛЬ**	**КОНТРОЛЬ**	**КОНТРОЛЬ**	**КОНТРОЛЬ**
Дверь	**КОНТРОЛЬ**				
Ввод кабелей	**КОНТРОЛЬ**				
На двери	HL1, HL4: AD22-22D жёлтый ~230 В (N1 L1 / N2 L1); HL2, HL5: AD22-22D зелёный ~230 В (N1 L2 / N2 L2); HL3, HL6: AD22-22D красный ~230 В (N1 L3 / N2 L3)	нет (по BOM)	нет (по BOM)	нет (по BOM)	нет (по BOM)
Питание	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE, управление ~230 В (сигнальные лампы)	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE, управление ~230 В (незав. расцепитель)	380/220 В, 50 Гц, 3P+N+PE, управление ~230 В (незав. расцепитель)
Ввод	Q1 3P 200 A, Q2 3P 200 A	QF 3P 25 A	QF 3P 32 A	QF 3P 25 A	QF 3P 32 A
InA / Ik	**СТОП: не задано**	25 A	32 A	25 A	32 A
Исполнение	УХЛ3 (по проекту)	У2 (по проекту)	УХЛ3 (по проекту)	УХЛ3 (по проекту)	УХЛ3 (по проекту)
Норматив	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015				

СОДЕРЖАНИЕ

1 — Титульный лист и технические данные
2–3 — Вопросы для согласования и решение заказчика
4–8 — Функциональные однолинейные схемы
9–19 — Компоновки и перечни аппаратов

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	Проект 261009 | KASPIY SAMALY	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Основание: BOM 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	**261009**	**1 / 19**	**R4**	**09.10.2026**

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Ниже перечислены только вопросы, влияющие на состав, схему и изготовление. Ответ вносится в правую колонку. СТОП — изготовление не начинать до ответа; КОНТРОЛЬ — подтвердить или исправить.

№	Вопрос	Уровень	Что требуется подтвердить	Ответ / подтверждение заказчика
1	**Ввод и система сети**	**СТОП**	• **ВРУ:** Определить: система заземления (TN-S / TN-C-S / TN-C), номинальный ток щита InA. **[СТОП]** • **ВРУ:** Два ввода Q1 (N1) и Q2 (N2) на одну сборную шину: блокировка (механическая / электрическая) или АВР в проекте и BOM не показана. Определить режим работы вводов (ПУЭ, II категория). **[СТОП]** • **ЩС, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** Определить: система заземления (TN-S / TN-C-S / TN-C). **[СТОП]** • **Все щиты:** Ожидаемый ток КЗ Ik в точке установки (для проверки Icu аппаратов 6 кА).	
2	**Аппараты (BOM)**	**СТОП**	• **ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2:** Вводной QF: однолинейная схема — BA47-29 3P C32, спецификация ЭОМ.СО — 3P C25; в BOM принят 32 А. Подтвердить номинал. **[СТОП]** • **ВРУ:** Q1, Q2: по проекту BA88-35 3P 200 A 35 кА; по BOM CNC YCM1-250L 200A/3300 — подтвердить Icu ≥ 35 кА и тип расцепителя.	
3	**Корпус**	**СТОП**	• **ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** Не заданы данные корпуса: высота, ширина, глубина. **[СТОП]** • **ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** NEXUS DX10-M24SBB: габариты В×Ш×Г и IP не заданы; способ установки: спецификация ЭОМ.СО — встраиваемый, схема — навесной, BOM — о/у (открытой установки). Определить. **[СТОП]** • **ВРУ:** Уточнить: цвет RAL, кабельные вводы (кол-во, Ø, сторона). • **ВРУ:** Корпус-аналог 1600×600×400 (BOM 719-15437) вместо ЩМП-16.6.4-0 IEK: подтвердить IP31, УХЛ3 и замену. • **ЩС, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** Уточнить: способ установки, цвет RAL, кабельные вводы (кол-во, Ø, сторона).	
4	**Нагрузки и защита**	**КОНТРОЛЬ**	• **ВРУ:** QF1, QF3, QF5–QF8 C40 и QF2, QF4, QF9 C32 защищают кабели ВВГнг(А)-LS 5×4 мм² (проект) — проверить Iдоп кабеля ≥ In (ПУЭ гл. 1.3). • **ВРУ:** QF13 3P C16: по схеме — «Фидер уличного освещения» (кабель не указан), по BOM — резерв. Подтвердить назначение. • **ЩС:** гр.2 Циркул. насос рабочий, 5×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩС:** гр.3 Циркул. насос резервный, 5×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩВ1.2:** V1.2.4 Вытяжной вентилятор, L1, 3×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩВ1.2:** V1.2.5 Вытяжной вентилятор, L2, 3×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩВ2.2:** V2.2.8 Вытяжной вентилятор, L2, 3×2,5: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту.	
5	**Схема управления**	**КОНТРОЛЬ**	• **ЩВ1.1, ЩВ1.2:** QF7 1P C6 (защита цепи независимого расцепителя) добавлен TEKLED, в проекте нет. Расцепитель — CNC A011130 вместо PH47 (в раскладке принят 1 мод.): подтвердить ширину; питание цепи — от вводного или от УК-ВК? • **ЩВ2.1, ЩВ2.2:** QF10 1P C6 (защита цепи независимого расцепителя) добавлен TEKLED, в проекте нет. Расцепитель — CNC A011130 вместо PH47 (в раскладке принят 1 мод.): подтвердить ширину; питание цепи — от вводного или от УК-ВК?	
6	**Элементы на двери**	**КОНТРОЛЬ**	• **ВРУ:** QF14, QF15 3P C6 + HL1–HL6 (сигнализация фаз вводов N1 / N2) добавлены TEKLED, в проекте нет. Подключение — до Q1/Q2 (наличие напряжения на вводе): подтвердить.	

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (продолжение)

№	Вопрос	Уровень	Что требуется подтвердить	Ответ / подтверждение заказчика
7	**Компоновка**	КОНТРОЛЬ	• **ВРУ:** Монтажная панель корпуса 719-15437: размеры не заданы — зона принята 540 × 1540 мм (Ш−60 / В−60). Сверить с паспортом. • **ЩС:** Монтажная панель корпуса 719-15425: размеры не заданы — зона принята 340 × 440 мм (Ш−60 / В−60). Сверить с паспортом. • **ЩС:** Резерв на DIN-рейках 18% < 20%. • **ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2:** Раскладка по 12 модулей в ряду — предварительно, по паспорту корпуса.	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ (для всех листов)

Клеммники в BOM и проекте не предусмотрены: отходящие кабели подключаются непосредственно к аппаратам и шинам N/PE.

ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩВ1.1, ЩВ1.2, ЩВ2.1, ЩВ2.2: Корпус по проекту: ЩРВ-П-24 IP41 УХЛ3 IEK; по BOM — NEXUS DX10-M24SBB о/у, 24 модуля.

* — размер аппарата по каталогу, сверить с паспортом.

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ **СОГЛАСОВАНО** ☐ **С ЗАМЕЧАНИЯМИ** ☐ **НА ДОРАБОТКУ**

Ф.И.О. / должность _____ Подпись _____ Дата _____ М.П.


Согласование охватывает внешний вид, состав, функциональную схему, клеммы и предварительную компоновку. Изменения после согласования — новой ревизией.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ


Однолинейное представление силовых цепей по типоисполнениям. Ссылка на аппарат: «лист.колонка» (колонки 1–13 вверху листа). Назначение линий подлежит подтверждению на листе вопросов.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

=ВРУ 380/220 В 3P+N+PE

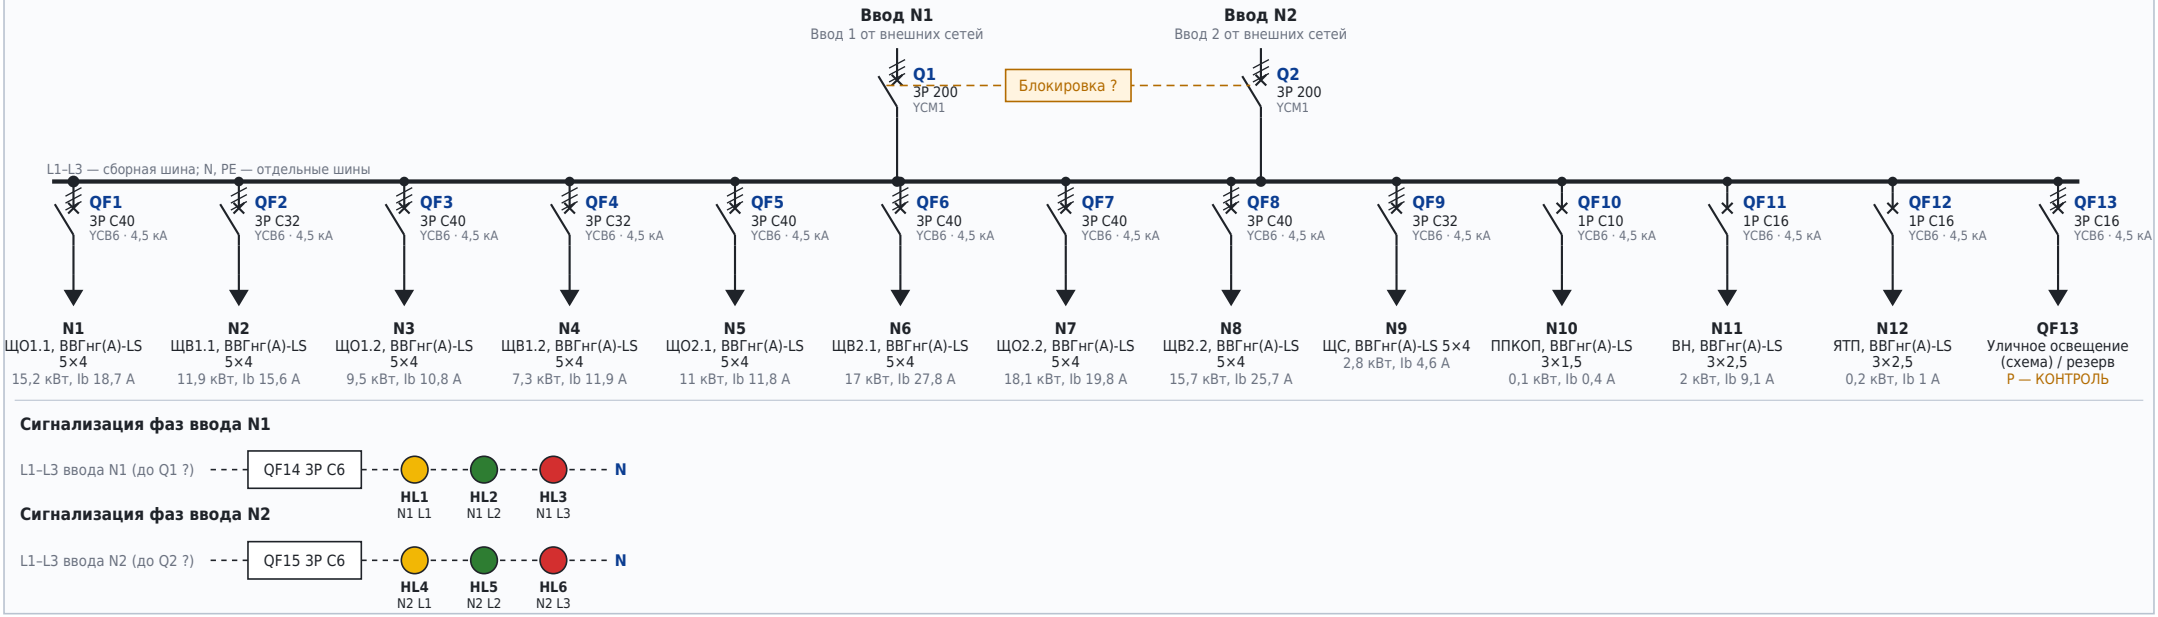

=ЩС 380/220 В 3P+N+PE

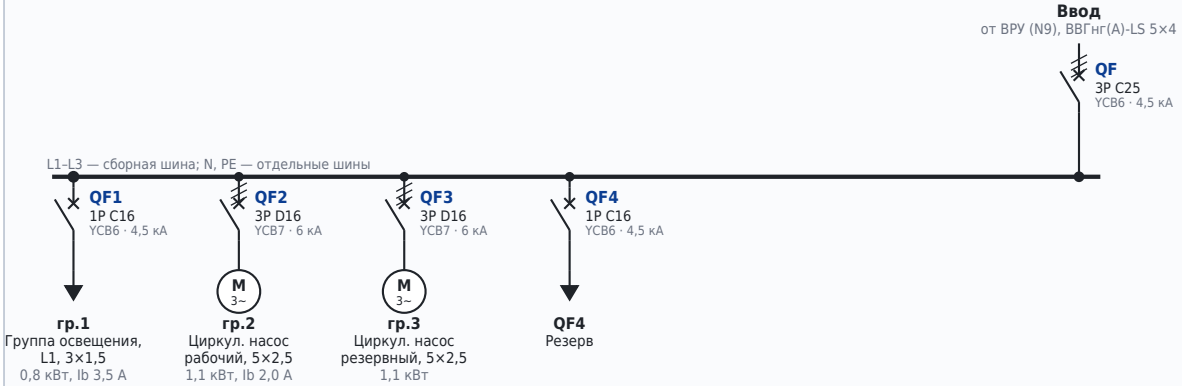


Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 261009 | KASPIY SAMALY** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ Основание: ВОМ 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261009**	**4 / 19**	**R4**	**09.10.2026**


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

=ЩО1.1 380/220 В 3P+N+PE

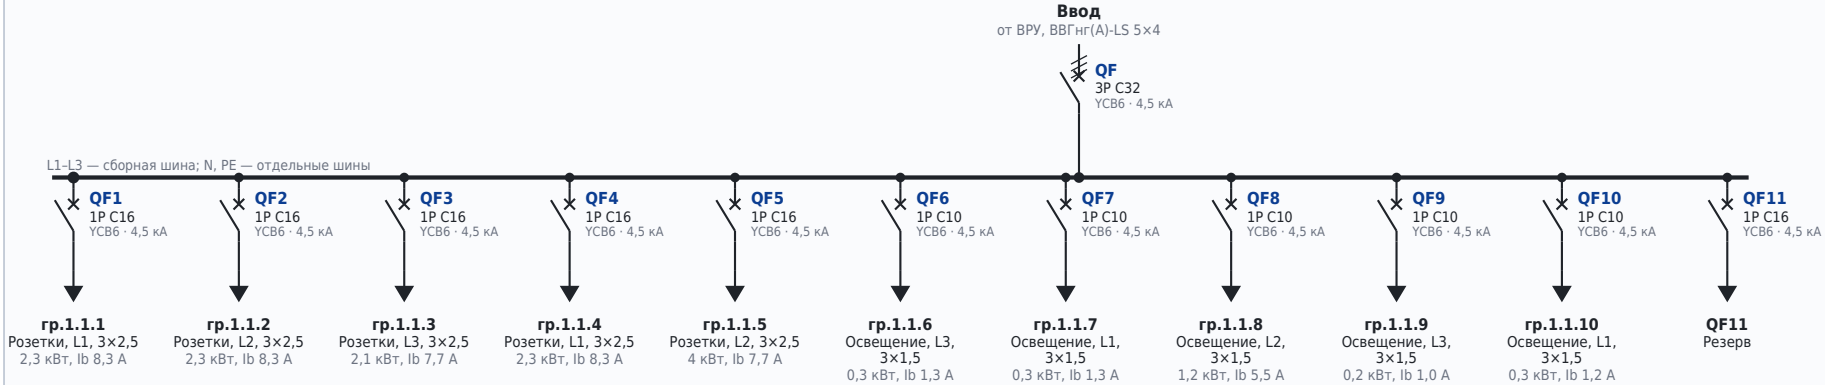

=ЩО1.2 380/220 В 3P+N+PE

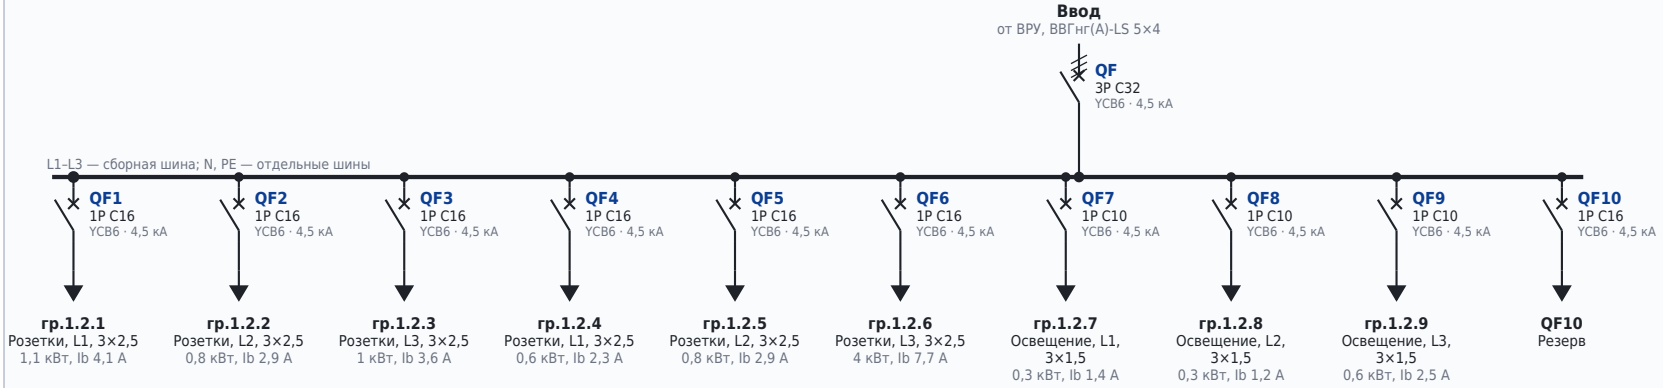


Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	Проект 261009 | KASPIY SAMALY ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение) Основание: ВОМ 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261009	5 / 19	R4	09.10.2026


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

=ЩО2.1 380/220 В 3P+N+PE

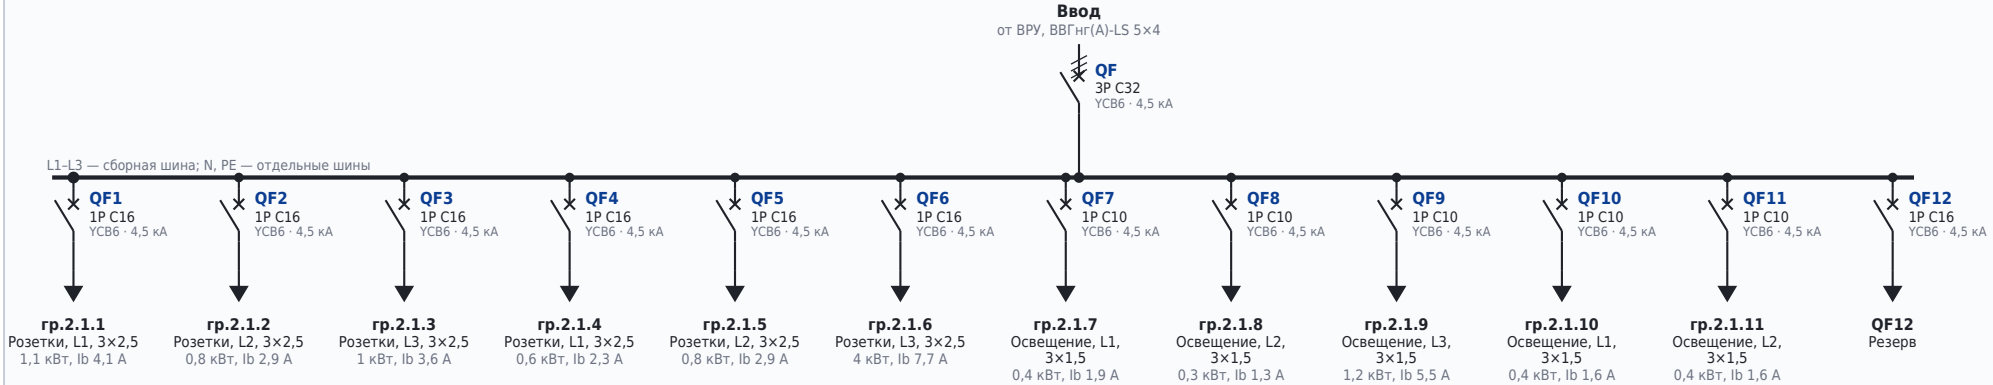

=ЩО2.2 380/220 В 3P+N+PE

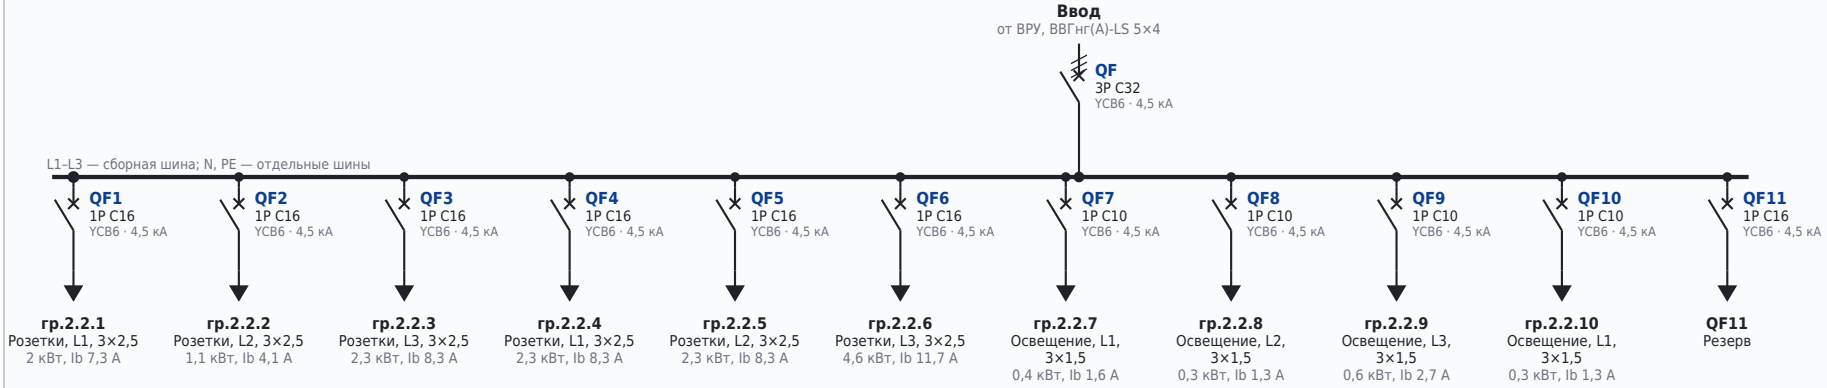


Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 261009 | KASPIY SAMALY** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение) Основание: ВОМ 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261009**	**6 / 19**	**R4**	**09.10.2026**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


=ЩВ1.1 380/220 В 3P+N+PE

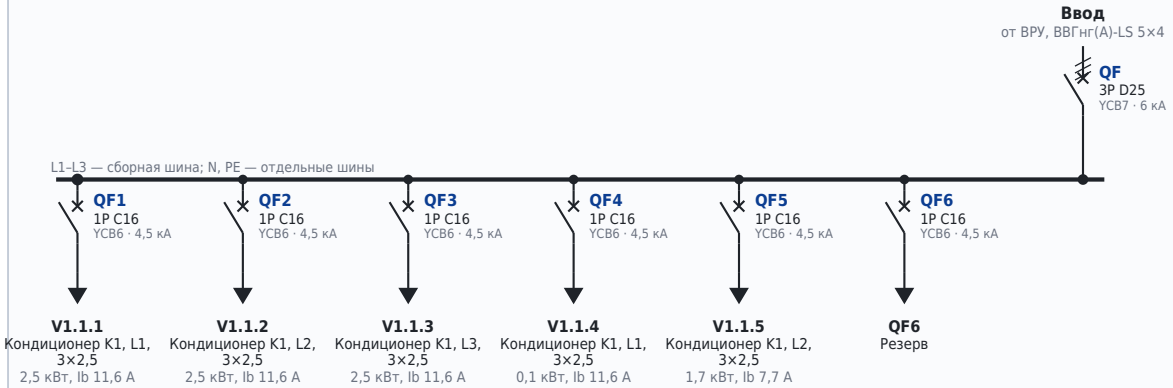

Отключение по сигналу ППС (УК-ВК исп.02)



=ЩВ1.2 380/220 В 3P+N+PE

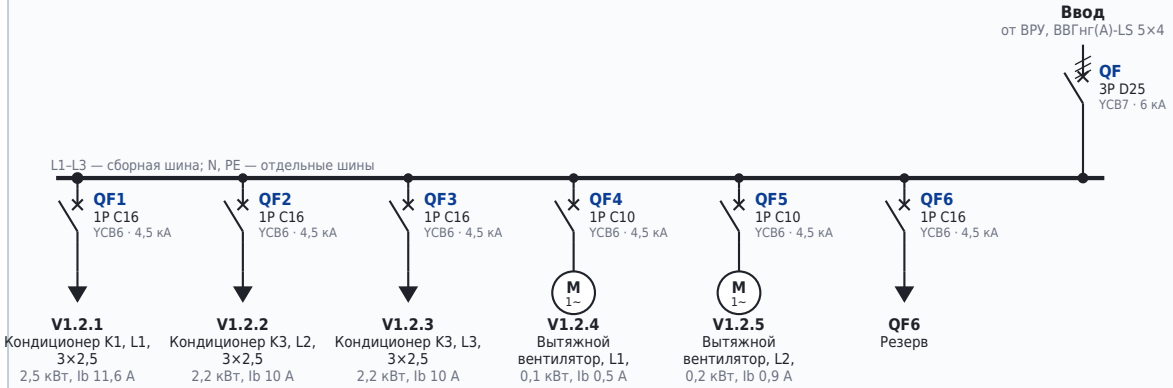

Отключение по сигналу ППС (УК-ВК исп.02)




Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 261009 | KASPIY SAMALY** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение) Основание: ВОМ 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261009**	**7 / 19**	**R4**	**09.10.2026**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


=ЩВ2.1 380/220 В 3P+N+PE

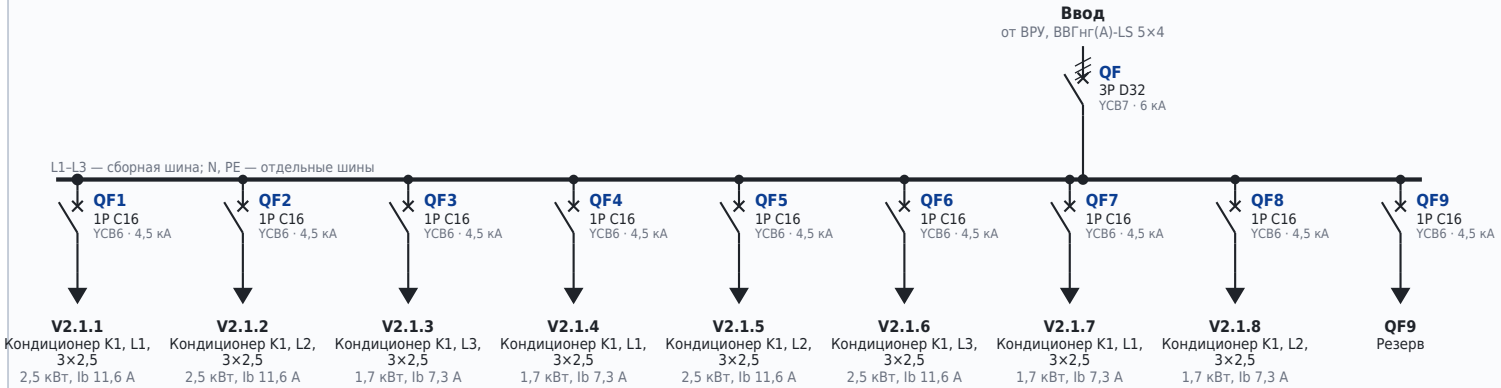

Отключение по сигналу ППС (УК-ВК исп.02)

L ? ---- QF10 1P C6 ---- ППС / УК-ВК исп.02: контакт ? ---- незав. расцепитель QF (A011130), катушка ~230 В ---- N

=ЩВ2.2 380/220 В 3P+N+PE

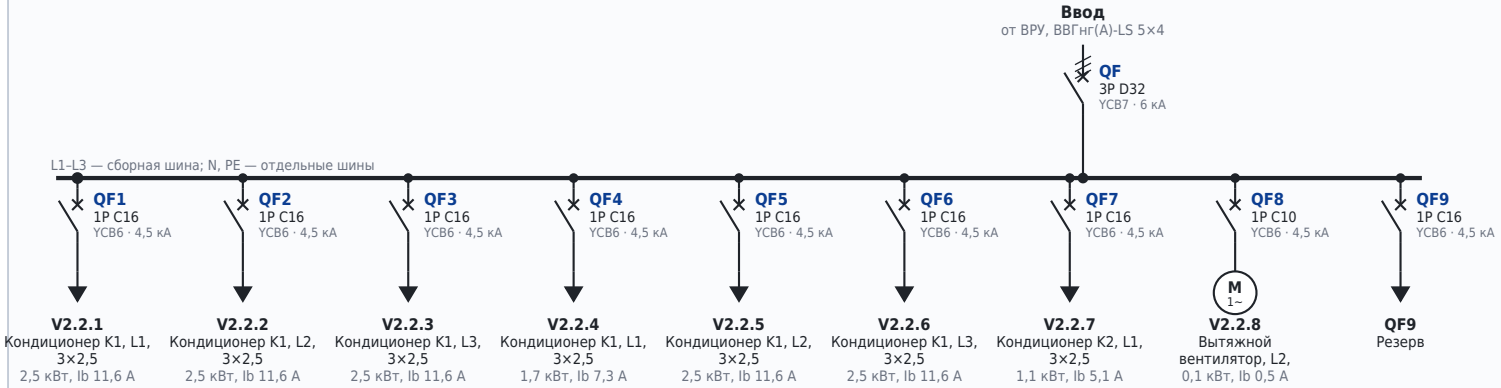

Отключение по сигналу ППС (УК-ВК исп.02)


L ? ---- QF10 1P C6 ---- ППС / УК-ВК исп.02: контакт ? ---- незав. расцепитель QF (A011130), катушка ~230 В ---- N

Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 261009 | KASPIY SAMALY** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ (продолжение) Основание: BOM 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261009**	**8 / 19**	**R4**	**09.10.2026**

ВРУ — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ


R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

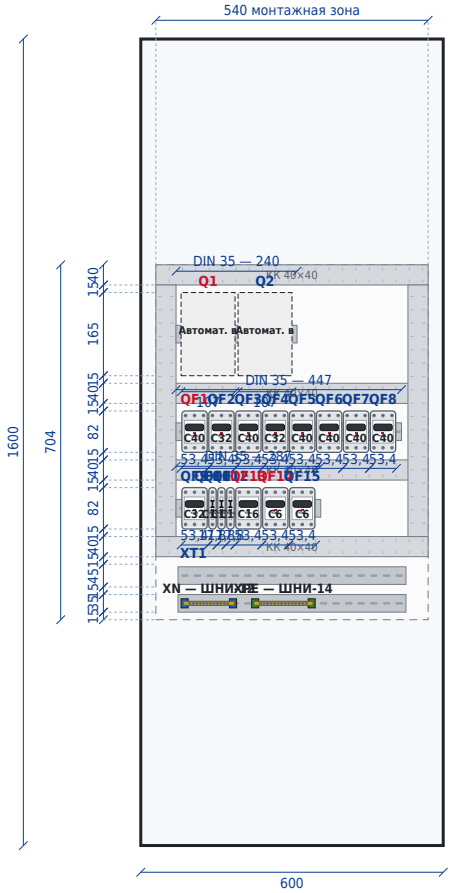


М 1:15. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

РЯДЫ АППАРАТОВ — УВЕЛИЧЕННЫЙ ВИД (М 1:4)


Ряд 1: 220 мм

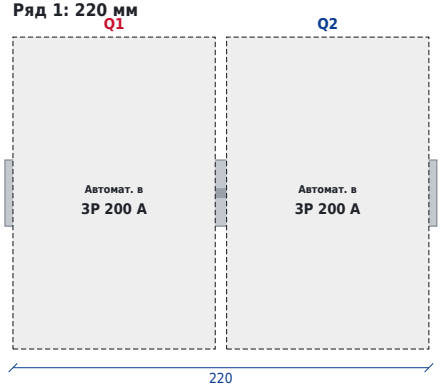

Ряд 2: 427 мм



Ряд 3: 267 мм



Размеры по каталогу (*) — сверить с паспортом. Порядок аппаратов в ряду — по номерам позиций.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-01 | =ВРУ ВРУ — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ Основание: BOM 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261009	9 / 19	R4	09.10.2026

ВРУ — ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1, QF3, QF5–QF8	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 40A 4.5kA х-ка C	296831	**6**	40	3P C	53,4×82*
QF2, QF4, QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	**3**	32	3P C	53,4×82*
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	**1**	10	1P C	17,8×82*
QF11, QF12	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	**2**	16	1P C	17,8×82*
QF13	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	**1**	16	3P C	53,4×82*
QF14, QF15	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 6A 4.5kA х-ка C	296825	**2**	6	3P C	53,4×82*
Q1, Q2	Авт. выкл. YCM1-250L 200A/3300	B000096	**2**	200	3P	107×165*
HL1, HL4	AD22-22D жёлтый ~230 В	E010209	**2**	—	дверь, N1 L1, N2 L1	Ø22
HL2, HL5	AD22-22D зелёный ~230 В	E010207	**2**	—	дверь, N1 L2, N2 L2	Ø22
HL3, HL6	AD22-22D красный ~230 В	E010208	**2**	—	дверь, N1 L3, N2 L3	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
Мет.Корпус Щит (1600x600x400+10см база)	719-15437	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Отверстия на двери Ø22 (центр от верхнего левого угла двери, x/y, мм): HL1 251/104,5; HL2 300/104,5; HL3 349/104,5; HL4 251/168,5; HL5 300/168,5; HL6 349/168,5. Предварительно — сверить с дверью до сверления.


Корпус по проекту: ЩМП-16.6.4-0 УХЛ3 IP31 IEK (без монтажной панели); по BOM — аналог 1600×600×400 + цоколь 100 мм.

ЩС — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1, QF4	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	**2**	16	1P C	17,8×82*
QF2, QF3	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 16A 6кА х-ка D	814183	**2**	16	3P D	53,4×77*
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	**1**	25	3P C	53,4×82*

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP54	719-15425	1 шт	1 шт

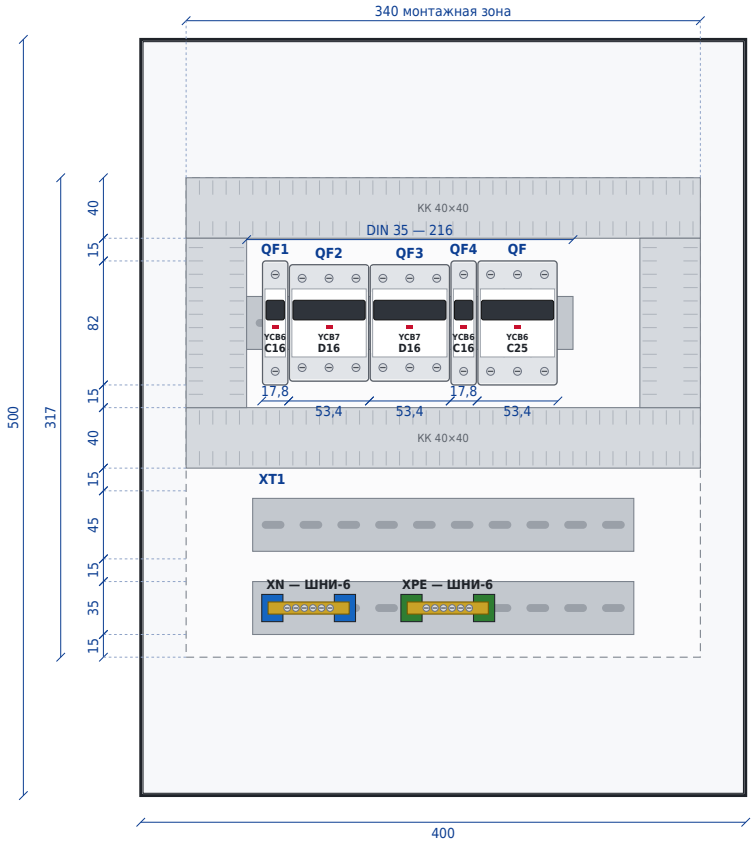

М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-02 | =ЩС ЩС — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Основание: BOM 261009 + однолинейные схемы ЭОМ л.3–12 и с…	**261009**	**11 / 19**	**R4**	**09.10.2026**


ЩО1.1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ


РАСКЛАДКА МОДУЛЕЙ (М 1:2) — 14 из 24 мод.

Габариты корпуса не заданы: показан только порядок аппаратов на DIN-рейках. 12 мод./ряд — предварительно.

Ряд 1: занято 12 из 12 мод.

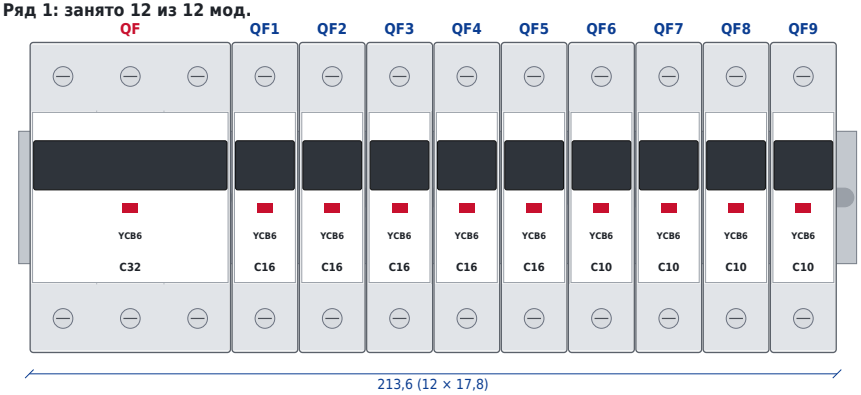

Ряд 2: занято 2 из 12 мод.

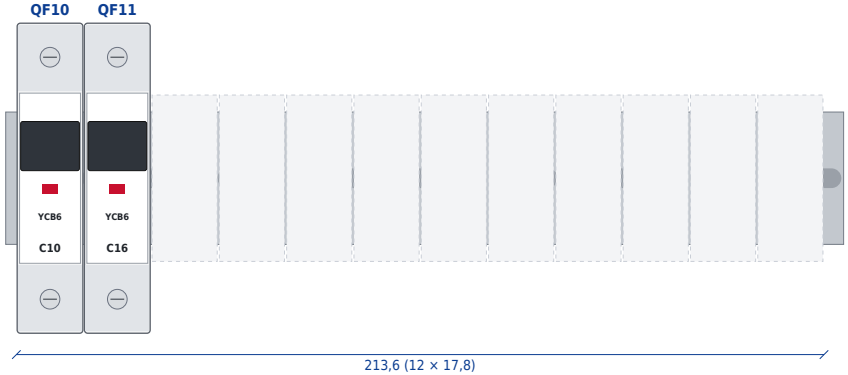

Пунктир — свободные модули (заглушки). Ширина по каталогу (*). Шины N/PE — штатные корпуса.

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1–QF5, QF11	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	**6**	16	1P C	17,8×82*
QF6–QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	**5**	10	1P C	17,8×82*
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	**1**	32	3P C	53,4×82*

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт


ЩО1.2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ


РАСКЛАДКА МОДУЛЕЙ (М 1:2) — 13 из 24 мод.

Габариты корпуса не заданы: показан только порядок аппаратов на DIN-рейках. 12 мод./ряд — предварительно.

Ряд 1: занято 12 из 12 мод.

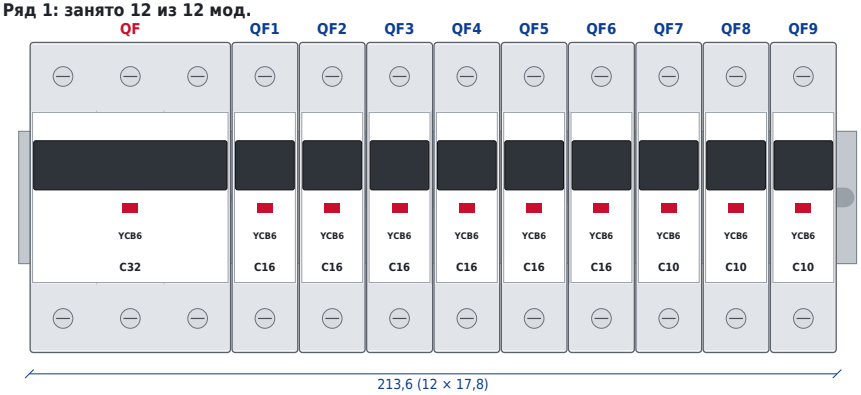

Ряд 2: занято 1 из 12 мод.

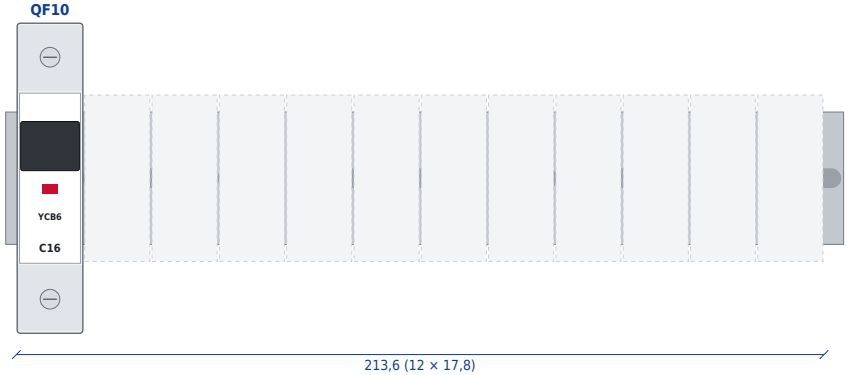

Пунктир — свободные модули (заглушки). Ширина по каталогу (*). Шины N/PE — штатные корпуса.

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1–QF6, QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	**7**	16	1P C	17,8×82*
QF7–QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	**3**	10	1P C	17,8×82*
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	**1**	32	3P C	53,4×82*

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт


ЩО2.1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ


РАСКЛАДКА МОДУЛЕЙ (М 1:2) — 15 из 24 мод.

Габариты корпуса не заданы: показан только порядок аппаратов на DIN-рейках. 12 мод./ряд — предварительно.

Ряд 1: занято 12 из 12 мод.

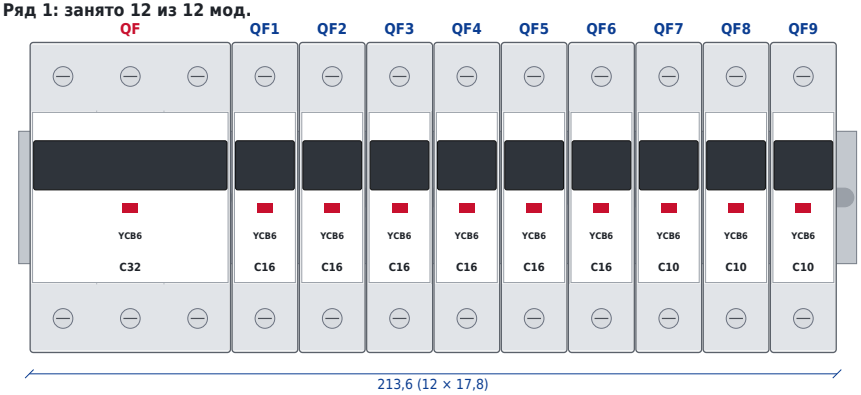

Ряд 2: занято 3 из 12 мод.

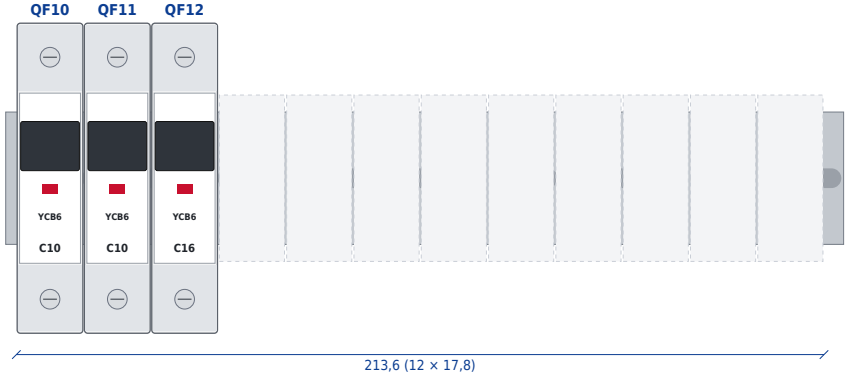

Пунктир — свободные модули (заглушки). Ширина по каталогу (*). Шины N/PE — штатные корпуса.

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1–QF6, QF12	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	7	16	1P C	17,8×82*
QF7–QF11	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	5	10	1P C	17,8×82*
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	1	32	3P C	53,4×82*

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт


ЩО2.2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ


РАСКЛАДКА МОДУЛЕЙ (М 1:2) — 14 из 24 мод.

Габариты корпуса не заданы: показан только порядок аппаратов на DIN-рейках. 12 мод./ряд — предварительно.

Ряд 1: занято 12 из 12 мод.

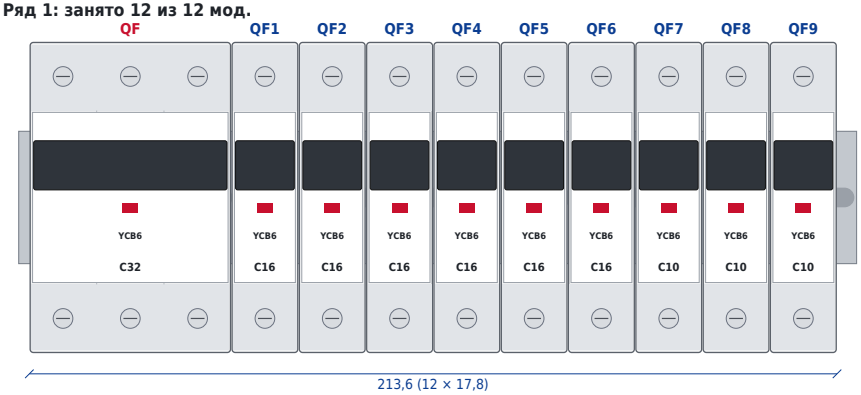

Ряд 2: занято 2 из 12 мод.

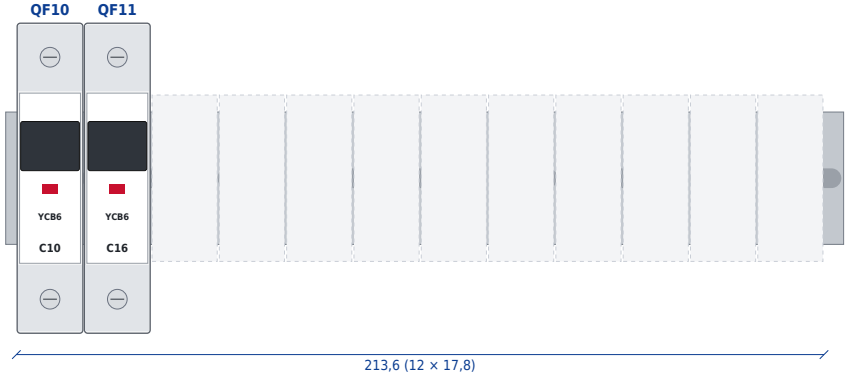

Пунктир — свободные модули (заглушки). Ширина по каталогу (*). Шины N/PE — штатные корпуса.

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1–QF6, QF11	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	**7**	16	1P C	17,8×82*
QF7–QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	**4**	10	1P C	17,8×82*
QF	Авт. выкл. YCB6-63H 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	**1**	32	3P C	53,4×82*

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт


ЩВ1.1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ


РАСКЛАДКА МОДУЛЕЙ (М 1:2) — 11 из 24 мод.

Габариты корпуса не заданы: показан только порядок аппаратов на DIN-рейках. 12 мод./ряд — предварительно.

Ряд 1: занято 11 из 12 мод.

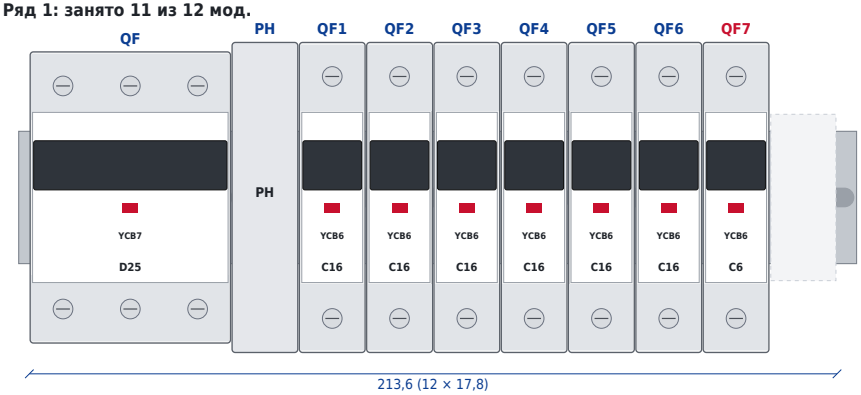

Ряд 2: занято 0 из 12 мод.



Пунктир — свободные модули (заглушки). Ширина по каталогу (*). Шины N/PE — штатные корпуса.

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1–QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	**6**	16	1P C	17,8×82*
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	**1**	6	1P C	17,8×82*
QF	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	814185	**1**	25	3P D	53,4×77*

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт
Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	A011130	1 шт	1 шт


ЩВ1.2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ


РАСКЛАДКА МОДУЛЕЙ (М 1:2) — 11 из 24 мод.

Габариты корпуса не заданы: показан только порядок аппаратов на DIN-рейках. 12 мод./ряд — предварительно.

Ряд 1: занято 11 из 12 мод.

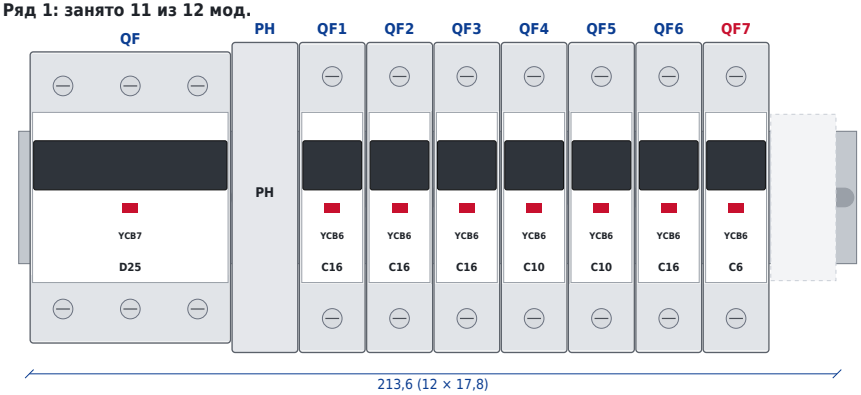

Ряд 2: занято 0 из 12 мод.

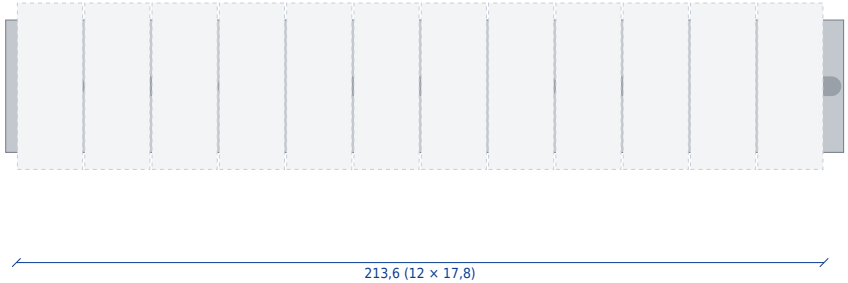

Пунктир — свободные модули (заглушки). Ширина по каталогу (*). Шины N/PE — штатные корпуса.

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1–QF3, QF6	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	**4**	16	1P C	17,8×82*
QF4, QF5	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	**2**	10	1P C	17,8×82*
QF7	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	**1**	6	1P C	17,8×82*
QF	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 25A 6кА х-ка D	814185	**1**	25	3P D	53,4×77*

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт
Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	A011130	1 шт	1 шт


ЩВ2.1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ


РАСКЛАДКА МОДУЛЕЙ (М 1:2) — 14 из 24 мод.

Габариты корпуса не заданы: показан только порядок аппаратов на DIN-рейках. 12 мод./ряд — предварительно.

Ряд 1: занято 12 из 12 мод.

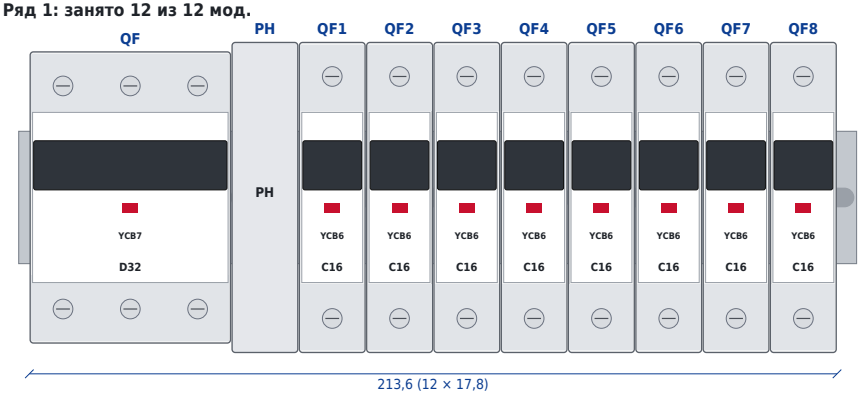

Ряд 2: занято 2 из 12 мод.

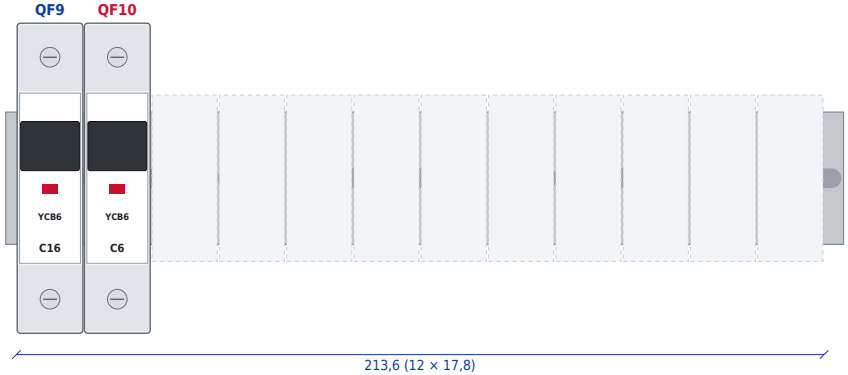

Пунктир — свободные модули (заглушки). Ширина по каталогу (*). Шины N/PE — штатные корпуса.

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1–QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	**9**	16	1P C	17,8×82*
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	**1**	6	1P C	17,8×82*
QF	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	814186	**1**	32	3P D	53,4×77*

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт
Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	A011130	1 шт	1 шт


ЩВ2.2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R4 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ


РАСКЛАДКА МОДУЛЕЙ (М 1:2) — 14 из 24 мод.

Габариты корпуса не заданы: показан только порядок аппаратов на DIN-рейках. 12 мод./ряд — предварительно.

Ряд 1: занято 12 из 12 мод.

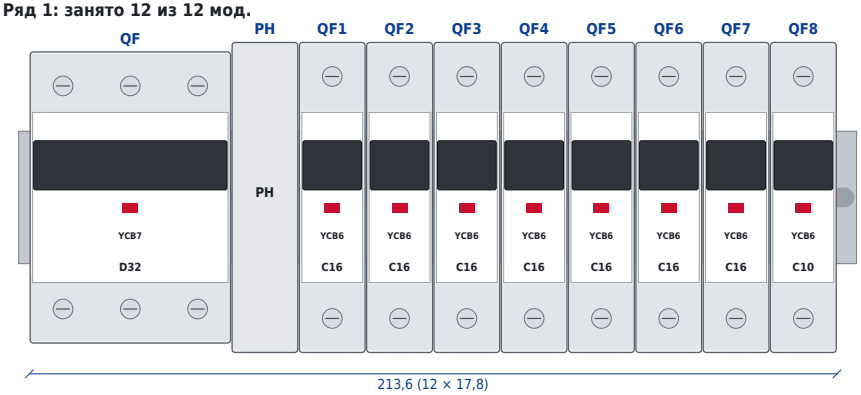

Ряд 2: занято 2 из 12 мод.

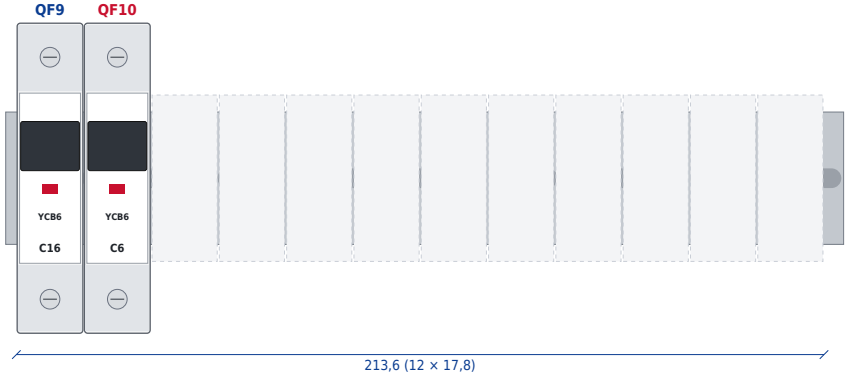

Пунктир — свободные модули (заглушки). Ширина по каталогу (*). Шины N/PE — штатные корпуса.

Поз.	Аппарат	Арт.	Кол.	In, A	Полюс / хар.	Ш×В, мм
QF1–QF7, QF9	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	**8**	16	1P C	17,8×82*
QF8	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	**1**	10	1P C	17,8×82*
QF10	Авт. выкл. YCB6-63H 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	**1**	6	1P C	17,8×82*
QF	Авт. выкл. YCB7-63N 3P 32A 6кА х-ка D	814186	**1**	32	3P D	53,4×77*

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
DX10-M24SBB V10 Щит пластиковый о/у X24 (крышка черная) NEXUS (TEKLED ELECTR)5	712-03052	1 шт	1 шт
Независимый расцепитель YCB7-63N Независимый расцепитель AC230V/400V	A011130	1 шт	1 шт
