01 | Комплект согласования R1

Заказчик: Caspian Servis | Объект: школа, Бесшокы, регион Актау

69 ЩИТОВ / 69 КОМПЛЕКТОВ

435 строк корпусов и основного оборудования

Основание: указанный заказчиком BOM для согласования от 13.10.2026. Количества взяты из полного BOM той же папки; 1533 строки данных сопоставлены по идентификатору щита, артикулу, описанию, единице и изготовителю.

Состав: реестр; замечания; для каждого щита - перечень основного оборудования, однолинейная схема CHINT, вид спереди / сбоку, внутренний монтаж и координаты; FAT и лист допуска.

Работы и монтажные расходники в перечнях не отображаются. Марки и количества основного оборудования - текущий BOM. Геометрия B - данные BOM; размещение D - предложение. Неизвестные размеры помечены ?. Рабочие соединения, вместимость и отверстия требуют подтверждения.

НА СОГЛАСОВАНИЕ / ÜRETİM ONAYI BEKLİYOR
Производственная готовность не подтверждена. Подписи не заполнены. До изготовления закрыть расхождения, подтвердить монтажные размеры и рабочие соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

02 | Реестр щитов

Часть 1/3 | 69 комплектов. Страницы относятся к этому документу.

№	Обозначение	Кол.	BOM стр.	Листы комплекта	Исходная схема
1	ПР-Х	1	2	6-9	ЭОМ, PDF стр. 6
2	ПРЛ-1	1	22	10-13	ЭОМ, PDF стр. 7
3	ПРЛ-2	1	45	14-17	ЭОМ, PDF стр. 8
4	ПРЛ-3	1	70	18-21	ЭОМ, PDF стр. 9
5	ПР-Тх1.1	1	93	22-25	ЭОМ, PDF стр. 10
6	ПРК-1	1	117	26-29	ЭОМ, PDF стр. 11
7	ПР-К1.1	1	140	30-33	ЭОМ, PDF стр. 12
8	ПР-Тх1.2	1	158	34-37	ЭОМ, PDF стр. 13
9	ПР-К1.2	1	181	38-41	ЭОМ, PDF стр. 14
10	ПР-Тх1.3	1	198	42-45	ЭОМ, PDF стр. 15
11	ПР-К1.3	1	220	46-49	ЭОМ, PDF стр. 16
12	ПРЛ-4	1	239	50-53	ЭОМ, PDF стр. 17
13	ПРЛ-5	1	262	54-57	ЭОМ, PDF стр. 18
14	ПР-Тх2.1	1	285	58-61	ЭОМ, PDF стр. 19
15	ПР-К2.1	1	308	62-65	ЭОМ, PDF стр. 20
16	ПРК-2	1	325	66-69	ЭОМ, PDF стр. 21
17	ПРК-3	1	348	70-73	ЭОМ, PDF стр. 22
18	ПР-А3	1	371	74-77	ЭОМ, PDF стр. 23
19	ПР-Тх2.2	1	389	78-81	ЭОМ, PDF стр. 24
20	ПР-К2.2	1	414	82-85	ЭОМ, PDF стр. 25
21	ПРК-4	1	435	86-89	ЭОМ, PDF стр. 26
22	ПРК-5	1	458	90-93	ЭОМ, PDF стр. 27
23	ПР-Тх2.3	1	481	94-97	ЭОМ, PDF стр. 28

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

02 | Реестр щитов

Часть 2/3 | 69 комплектов. Страницы относятся к этому документу.

№	Обозначение	Кол.	BOM стр.	Листы комплекта	Исходная схема
24	ПР-К2.3	1	505	98-101	ЭОМ, PDF стр. 29
25	ПРЛ-6	1	528	102-105	ЭОМ, PDF стр. 30
26	ПР-Тх3.1	1	551	106-109	ЭОМ, PDF стр. 31
27	ПР-К3.1	1	574	110-113	ЭОМ, PDF стр. 32
28	ПР-Тх3.2	1	591	114-117	ЭОМ, PDF стр. 33
29	ПРК-6	1	614	118-121	ЭОМ, PDF стр. 34
30	ПР-К3.2	1	637	122-125	ЭОМ, PDF стр. 35
31	ПРК-7	1	655	126-129	ЭОМ, PDF стр. 36
32	ПР-Тх3.3	1	678	130-133	ЭОМ, PDF стр. 37
33	ПР-К3.3	1	701	134-137	ЭОМ, PDF стр. 38
34	ЩО-0	1	721	138-141	ЭОМ, PDF стр. 39
35	ЩАО-0	1	739	142-145	ЭОМ, PDF стр. 40
36	ЩО-1.1	1	754	146-149	ЭОМ, PDF стр. 41
37	ЩО-1.2	1	775	150-153	ЭОМ, PDF стр. 42
38	ЩО-1.3	1	796	154-157	ЭОМ, PDF стр. 43
39	ЩО-Кх	1	814	158-161	ЭОМ, PDF стр. 44
40	ЩАО-1	1	829	162-165	ЭОМ, PDF стр. 45
41	ЩО-2.1	1	848	166-169	ЭОМ, PDF стр. 47
42	ЩО-2.2	1	867	170-173	ЭОМ, PDF стр. 48
43	ЩО-2.3	1	886	174-177	ЭОМ, PDF стр. 49
44	ЩАО-2	1	907	178-181	ЭОМ, PDF стр. 50
45	ЩО-3.1	1	923	182-185	ЭОМ, PDF стр. 51
46	ЩО-3.2	1	939	186-189	ЭОМ, PDF стр. 52

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

02 | Реестр щитов

Часть 3/3 | 69 комплектов. Страницы относятся к этому документу.

№	Обозначение	Кол.	BOM стр.	Листы комплекта	Исходная схема
47	ЩО-3.3	1	959	190-193	ЭОМ, PDF стр. 53
48	ЩАО-3	1	978	194-197	ЭОМ, PDF стр. 54
49	ЩСН	1	994	198-201	ЭОМ, PDF стр. 55
50	ЩС-НП	1	1014	202-205	ЭОМ, PDF стр. 57
51	ЩСВ-0	1	1033	206-209	ЭОМ, PDF стр. 58
52	ЩСВ-К	1	1056	210-213	ЭОМ, PDF стр. 59
53	ЩОВ-1	1	1079	214-217	ЭОМ, PDF стр. 61
54	ЩС-СС1	1	1100	218-221	ЭОМ, PDF стр. 62
55	ЩСВ-1	1	1120	222-225	ЭОМ, PDF стр. 63
56	ЩС-ПС1	1	1143	226-229	ЭОМ, PDF стр. 64
57	ЩС-СС2	1	1162	230-233	ЭОМ, PDF стр. 65
58	ЩС-ПС2	1	1179	234-237	ЭОМ, PDF стр. 66
59	ЩОВ-2	1	1194	238-241	ЭОМ, PDF стр. 67
60	ЩС-ПС3	1	1215	242-245	ЭОМ, PDF стр. 68
61	ВРУшк	1	1233	246-249	ЭОМ, PDF стр. 2
62	ВРУ-А	1	1272	250-253	ЭОМ, PDF стр. 2
63	ВРУст	1	1306	254-257	ЭОМ, PDF стр. 3
64	ПР-Кх1	1	1339	258-261	ЭОМ, PDF стр. 4
65	ПР-Кх2	1	1377	262-265	ЭОМ, PDF стр. 5
66	ЩУО	1	1407	266-269	ЭОМ, PDF стр. 46
67	ЩСВ-К1	1	1428	270-273	ЭОМ, PDF стр. 60
68	ЩСВ-3	1	1462	274-277	ЭОМ, PDF стр. 69
69	ЯУО	1	1505	278-282	ЭОФ, PDF стр. 3

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

03 | Замечания до запуска в производство

Все пункты открыты. Решение и подтверждение оформляются ответственными участниками.

№	Область	Необходимое решение
01	Все щиты	Сопоставить исходные схемы с текущим BOM; выпустить актуальные схемы с назначением каждого фидера. Измененные количества не восстановлены автоматически.
02	Все щиты	Подтвердить систему заземления, место разделения PEN, подключение N/PE и PE двери. Отдельные шины в BOM не устанавливают тип сети.
03	Все щиты	Предоставить расчетный Ik и защиту питающего фидера. Проверить аппараты 4,5/6/10 кА, координацию защиты и уставки.
04	Корпуса	Согласовать все замены NXW4 / ЩМП и монтаж навесной / встраиваемый. Утвердить габариты, глубину, плату, рейки, клеммы, вводы и запас.
05	ВРУ-А	Проектная ширина 1800 мм заменена на 1600 мм. Утвердить две секции и общий габарит. Для трех ВРУ требуется деталировка шин, опор, барьеров и кабельного пространства.
06	ВРУшк / ВРУ-А	Подтвердить режим двух вводов, АВР, исключение недопустимого параллельного включения; соединения и защиту учета, ТТ и испытательных клемм.
07	ПР-Х	Количества сверены: 3 диф. автомата и 3 автомата 3P C10 (BOM стр.5 + стр.6). Подтвердить замену корпуса и монтажное исполнение; габариты корпуса в BOM не заполнены.
08	ЯУО	ЭОФ: SF1 1 А / MH-600 16 А; BOM: SF1 2 А / MH-602 25 А. Проверить схему управления, характеристики реле и защиту NXR 17-25 А при вводе 16 А.
09	ЩУО / вентиляция	Подтвердить схемы управления, пожарные сигналы, катушки, уставки тепловых реле, режимы переключателей, индикацию и функции каждой цепи.
10	Все щиты	Согласовать применимую нормативную базу и программу проверки сборок: нагрев, прочность при КЗ, изоляция, защитная цепь, IP и функциональные испытания. Протоколы не предоставлены.
11	Все щиты	Проверить внутренние проводники, клеммы и гребенки по току, типу аппаратов, условиям монтажа и допустимым соединениям. Расчетные расходники BOM не подтверждают пригодность.
12	Готовые изделия	Назначить ответственных, закрыть замечания, выполнить FAT и подписать допуск. Пустые поля в этом документе означают отсутствие подтверждения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Актуальная спецификация

ПР-Х (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | ВОМ стр. 2 | ЭОМ, PDF стр. 6

ВОМ стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
3	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
4	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
5	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
7	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный ВОМ, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: ВОМ для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 6

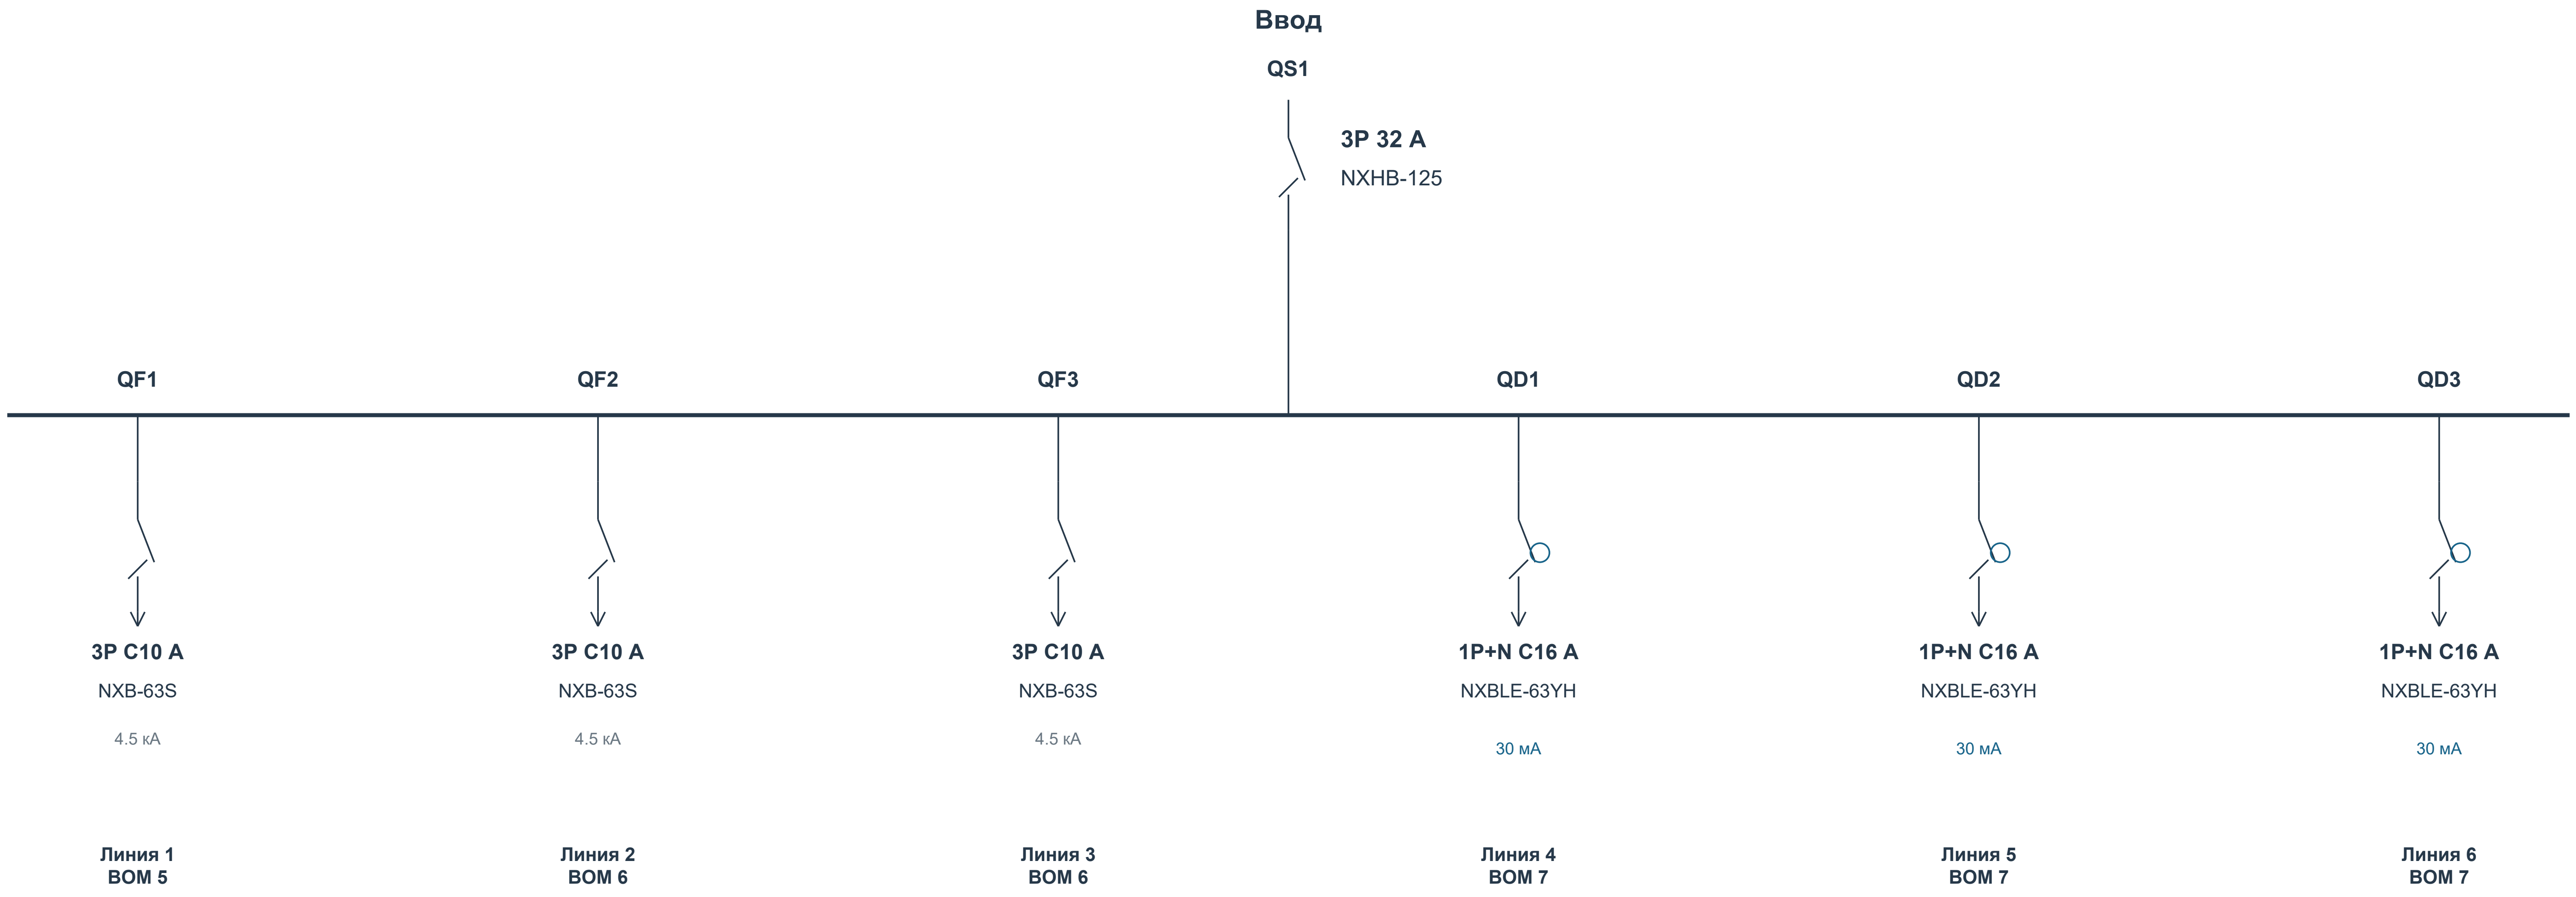
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QD1
QD2
QD3
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 5
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 6
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 6
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 7
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 7
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 7

Данные исходного проекта: Ру 10.4 кВт | Рр 6,0 кВт | Ip 12,9 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

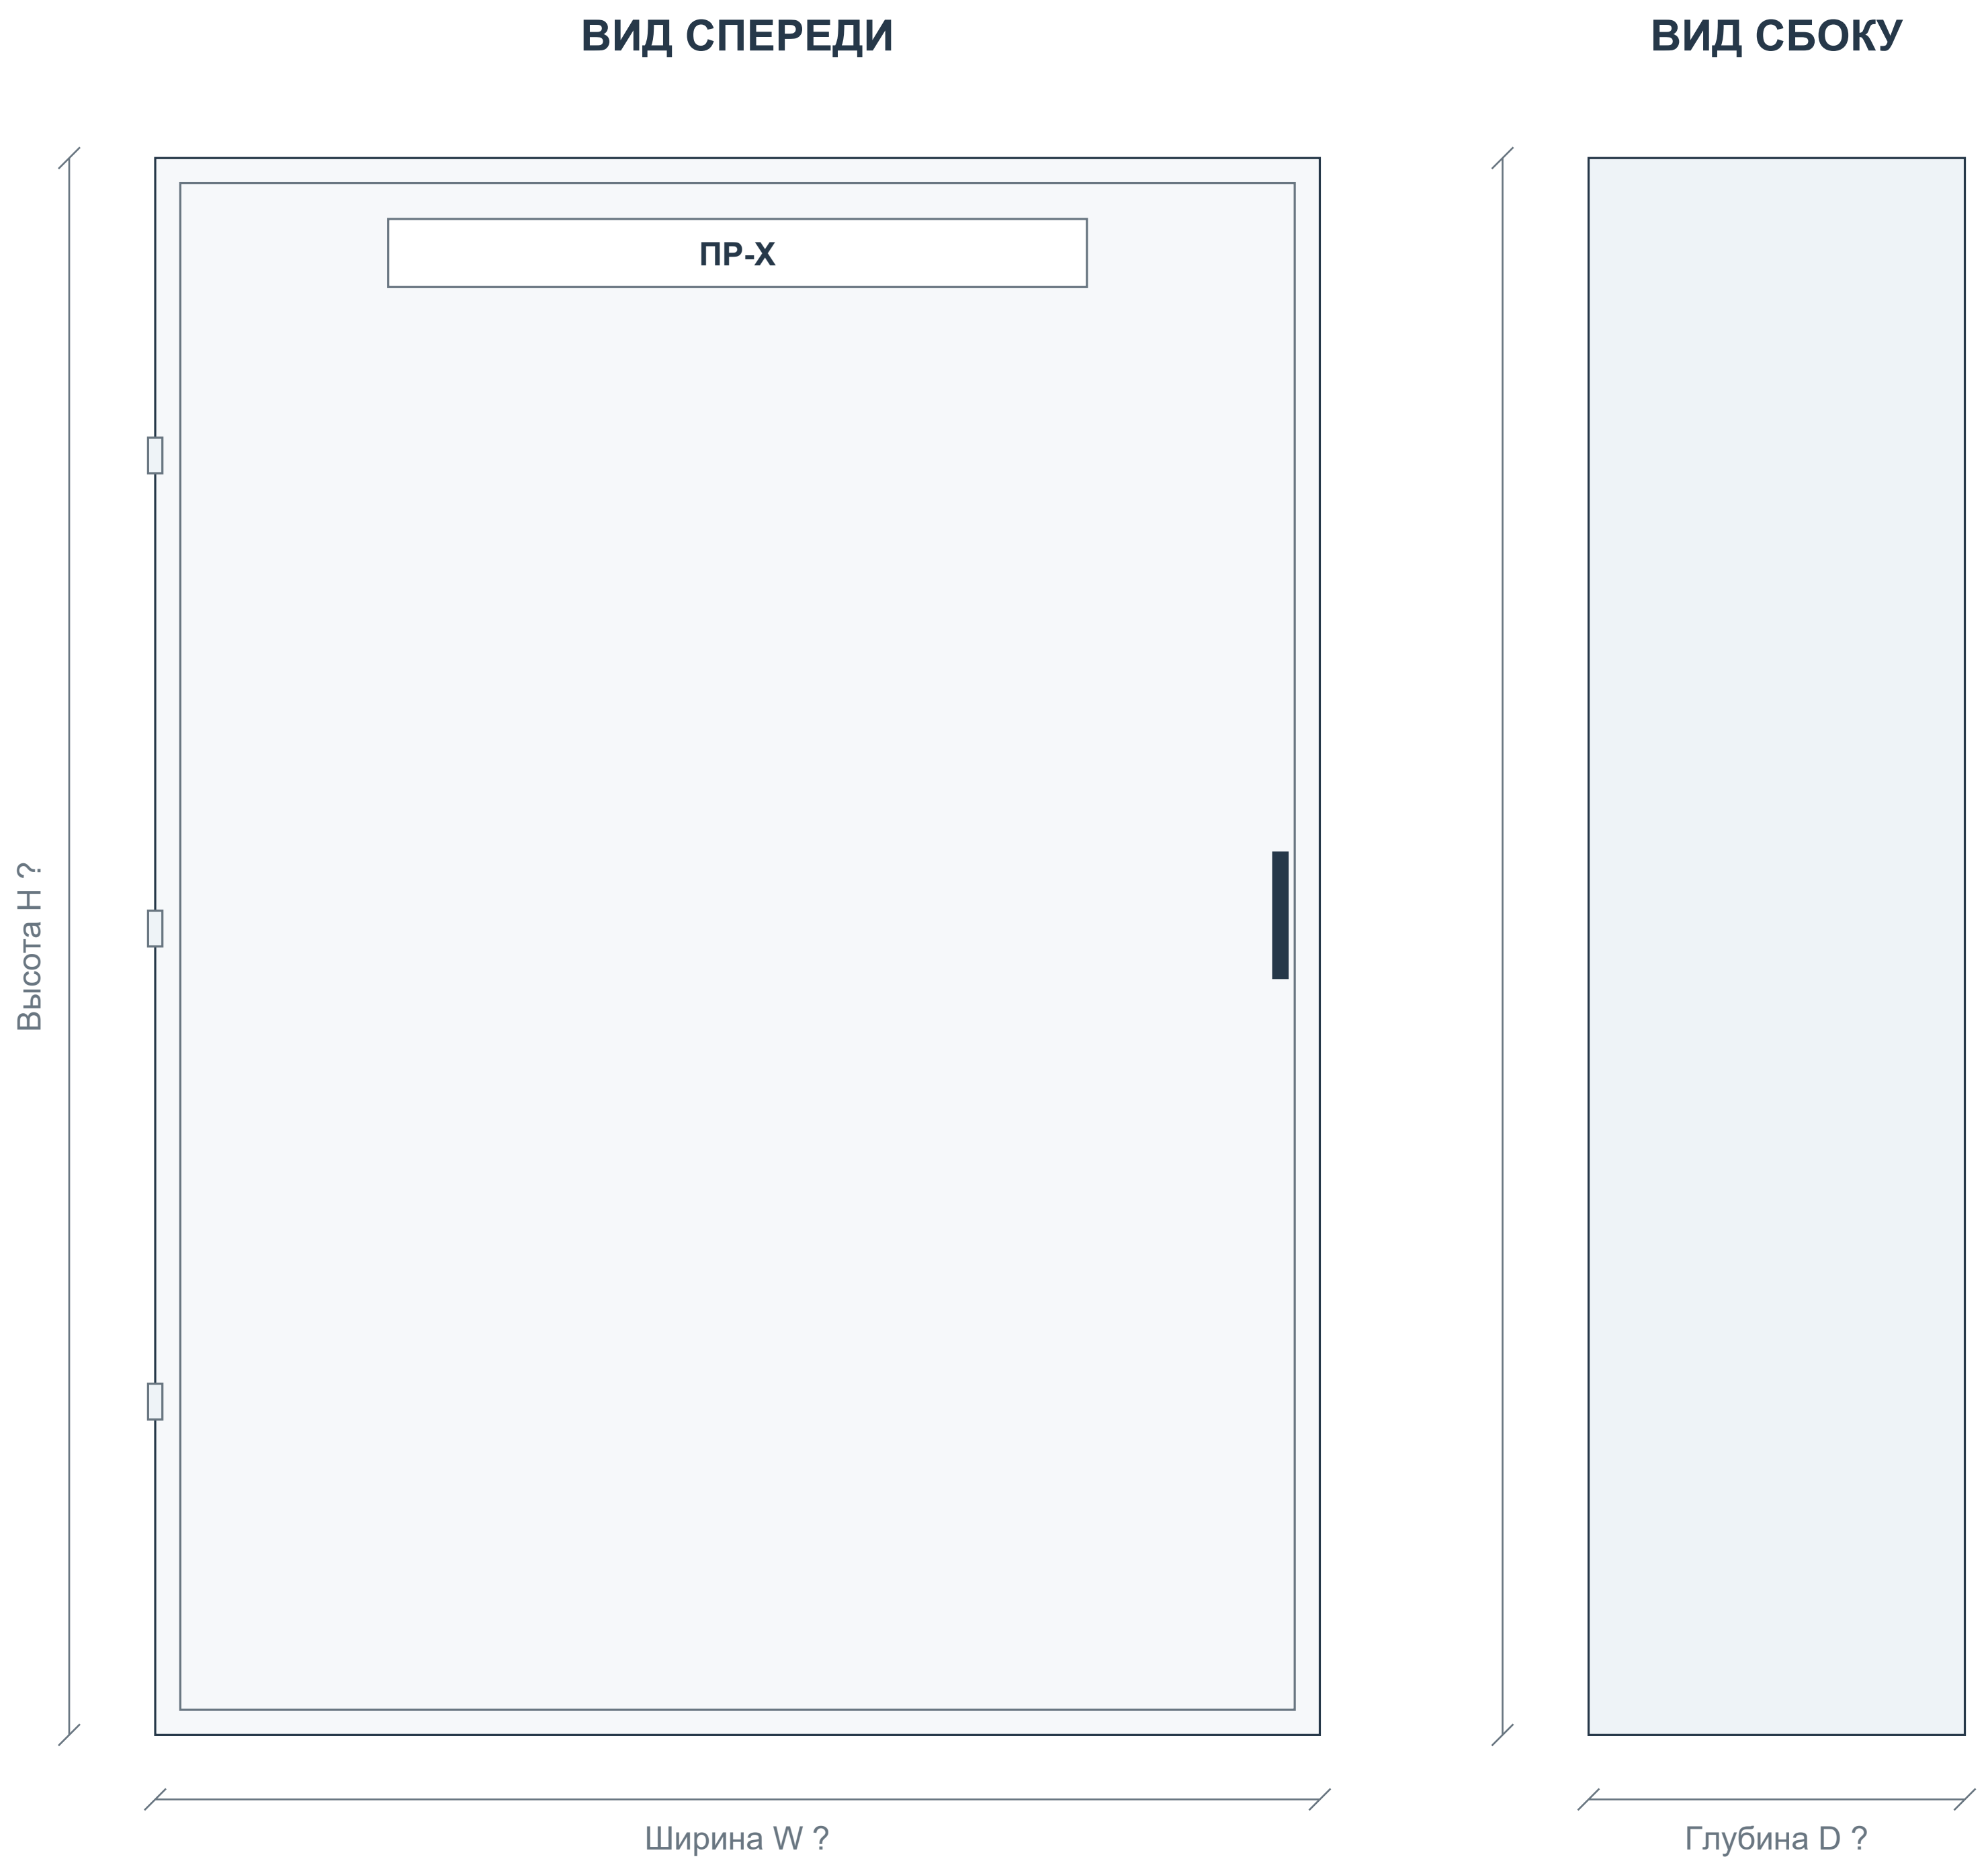

Корпус: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-X | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

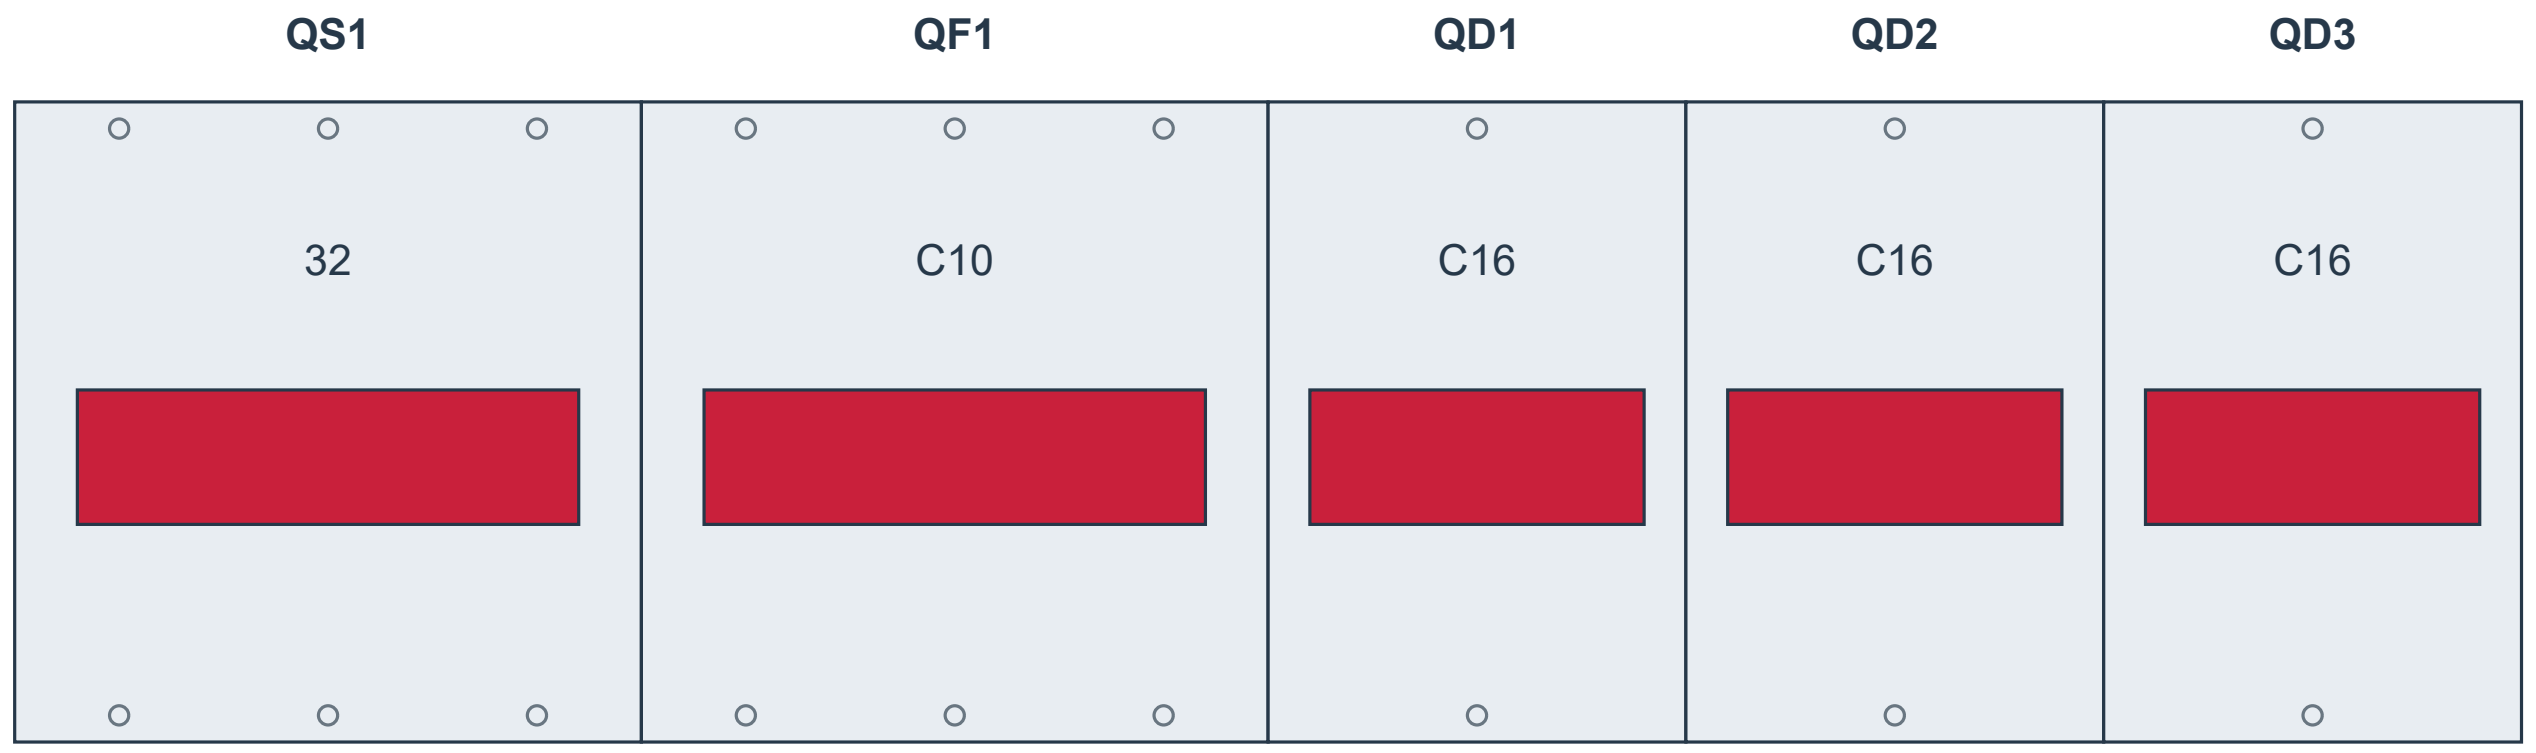

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

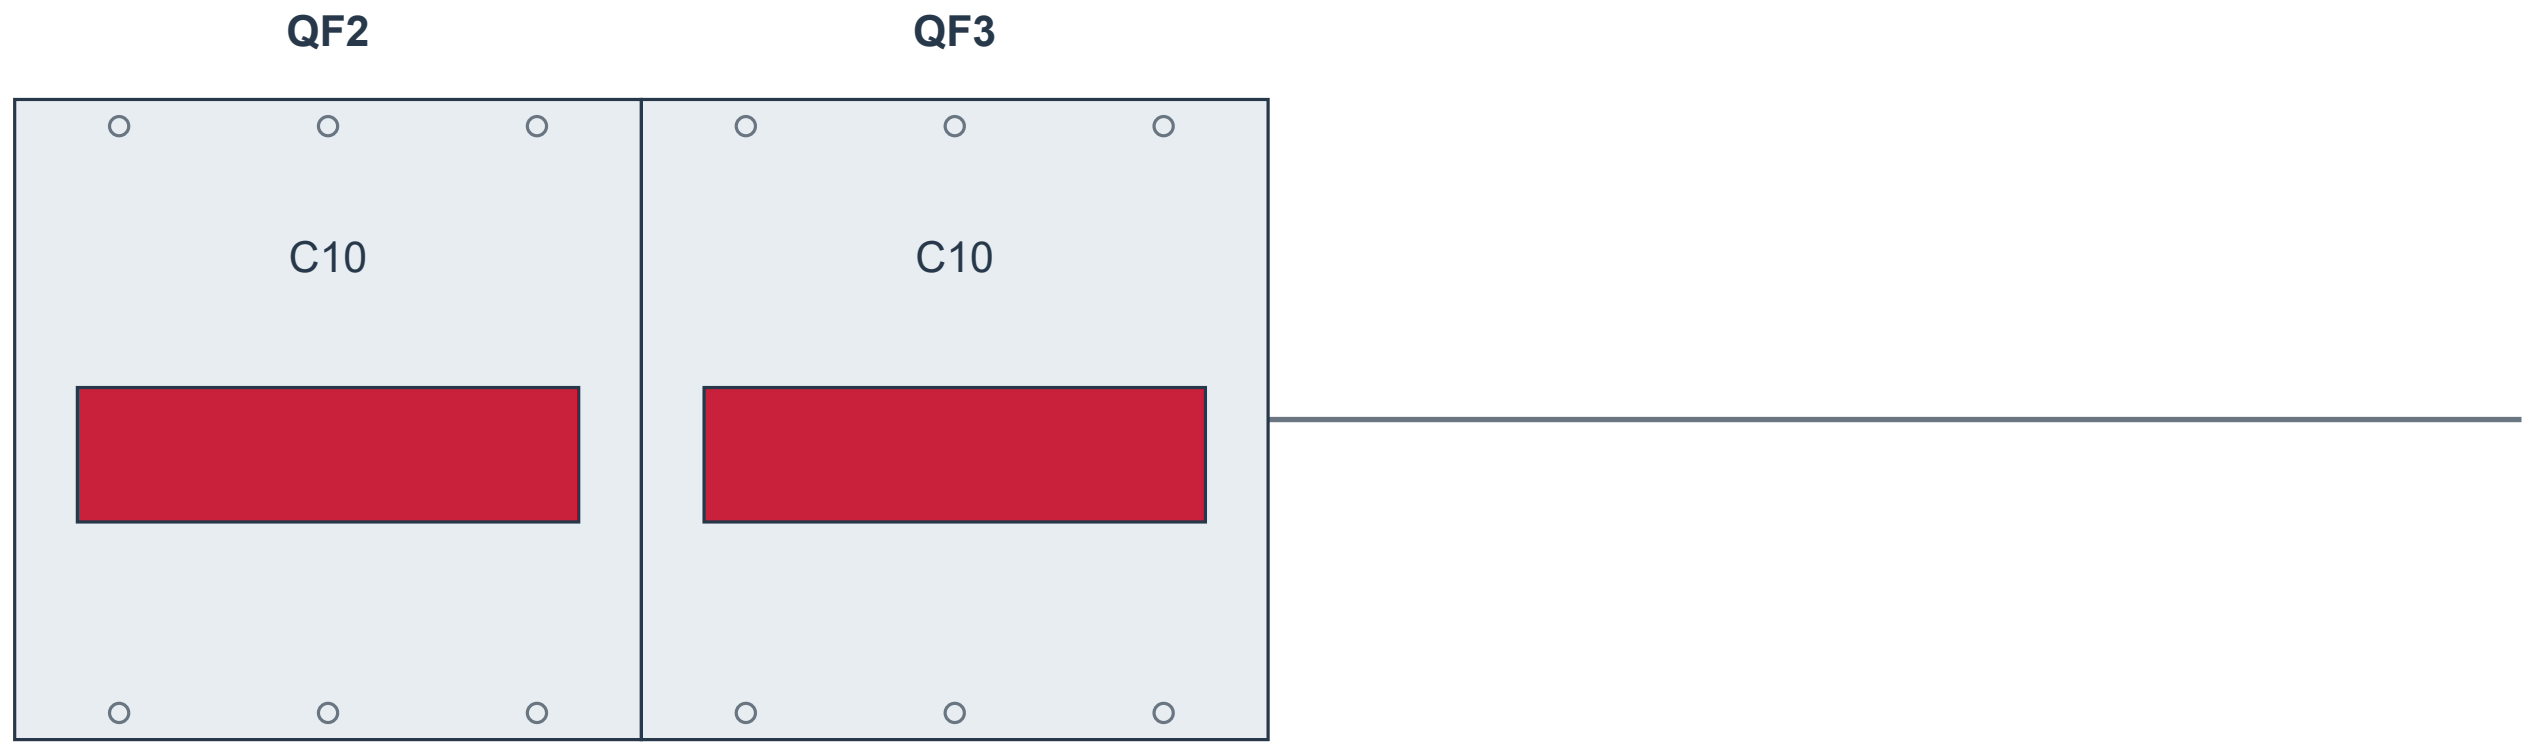

Сумма ширин: 108 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	4	1	0	?	54 B
QF1	NXB-63S	5	1	54	?	54 B
QF2 - QF3	NXB-63S	6	2	0...54	?	54 B
QD1 - QD3	NXBLE-63YH	7	1	108...180	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Актуальная спецификация

ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | ВОМ стр. 22 | ЭОМ, PDF стр. 7

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
23	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
24	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
25	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
26	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
27	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
28	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный ВОМ, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: ВОМ для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 7

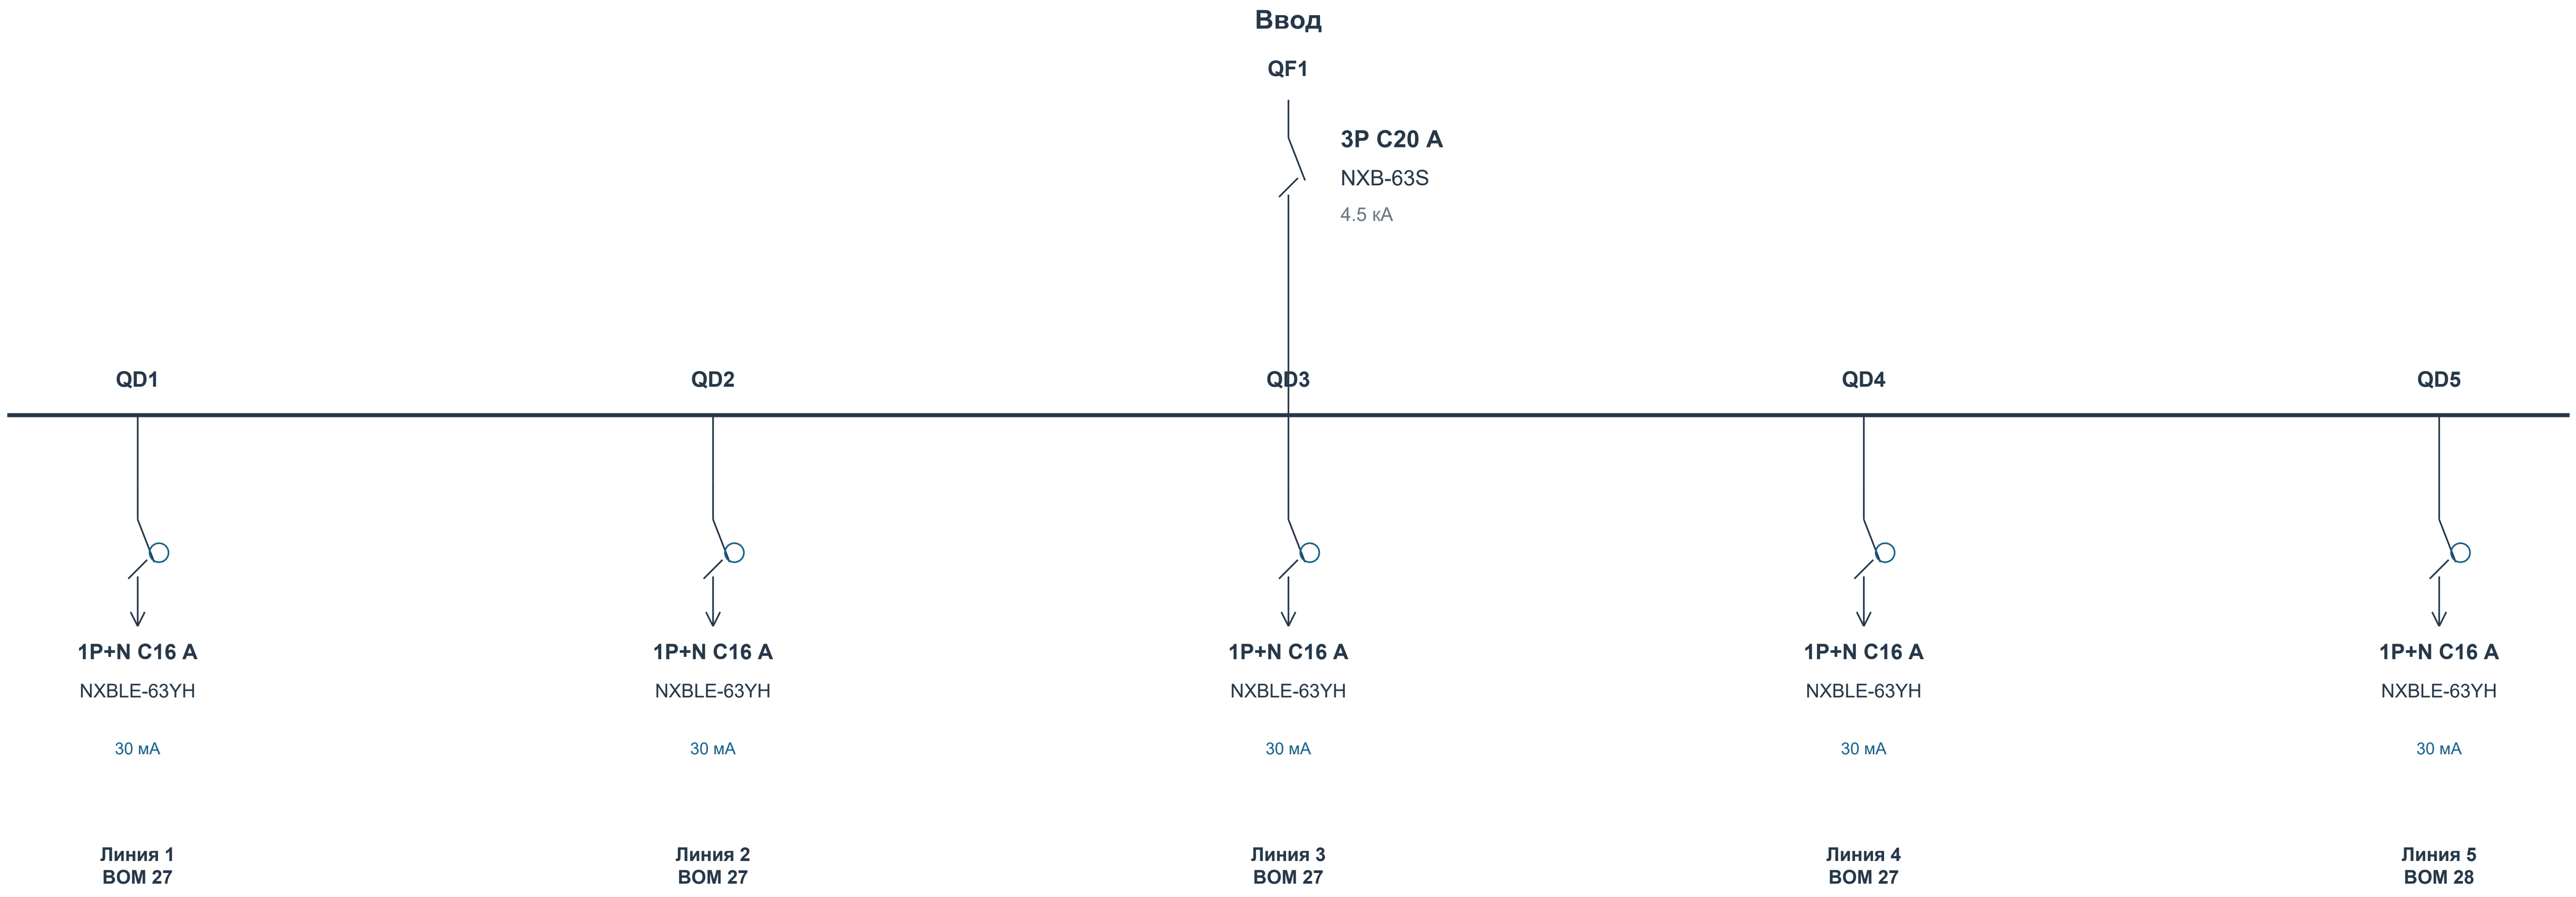
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 27
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 27
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 27
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 27
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 28

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Py 4.2 кВт | Pp 1,1 кВт | Ip 5,9 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

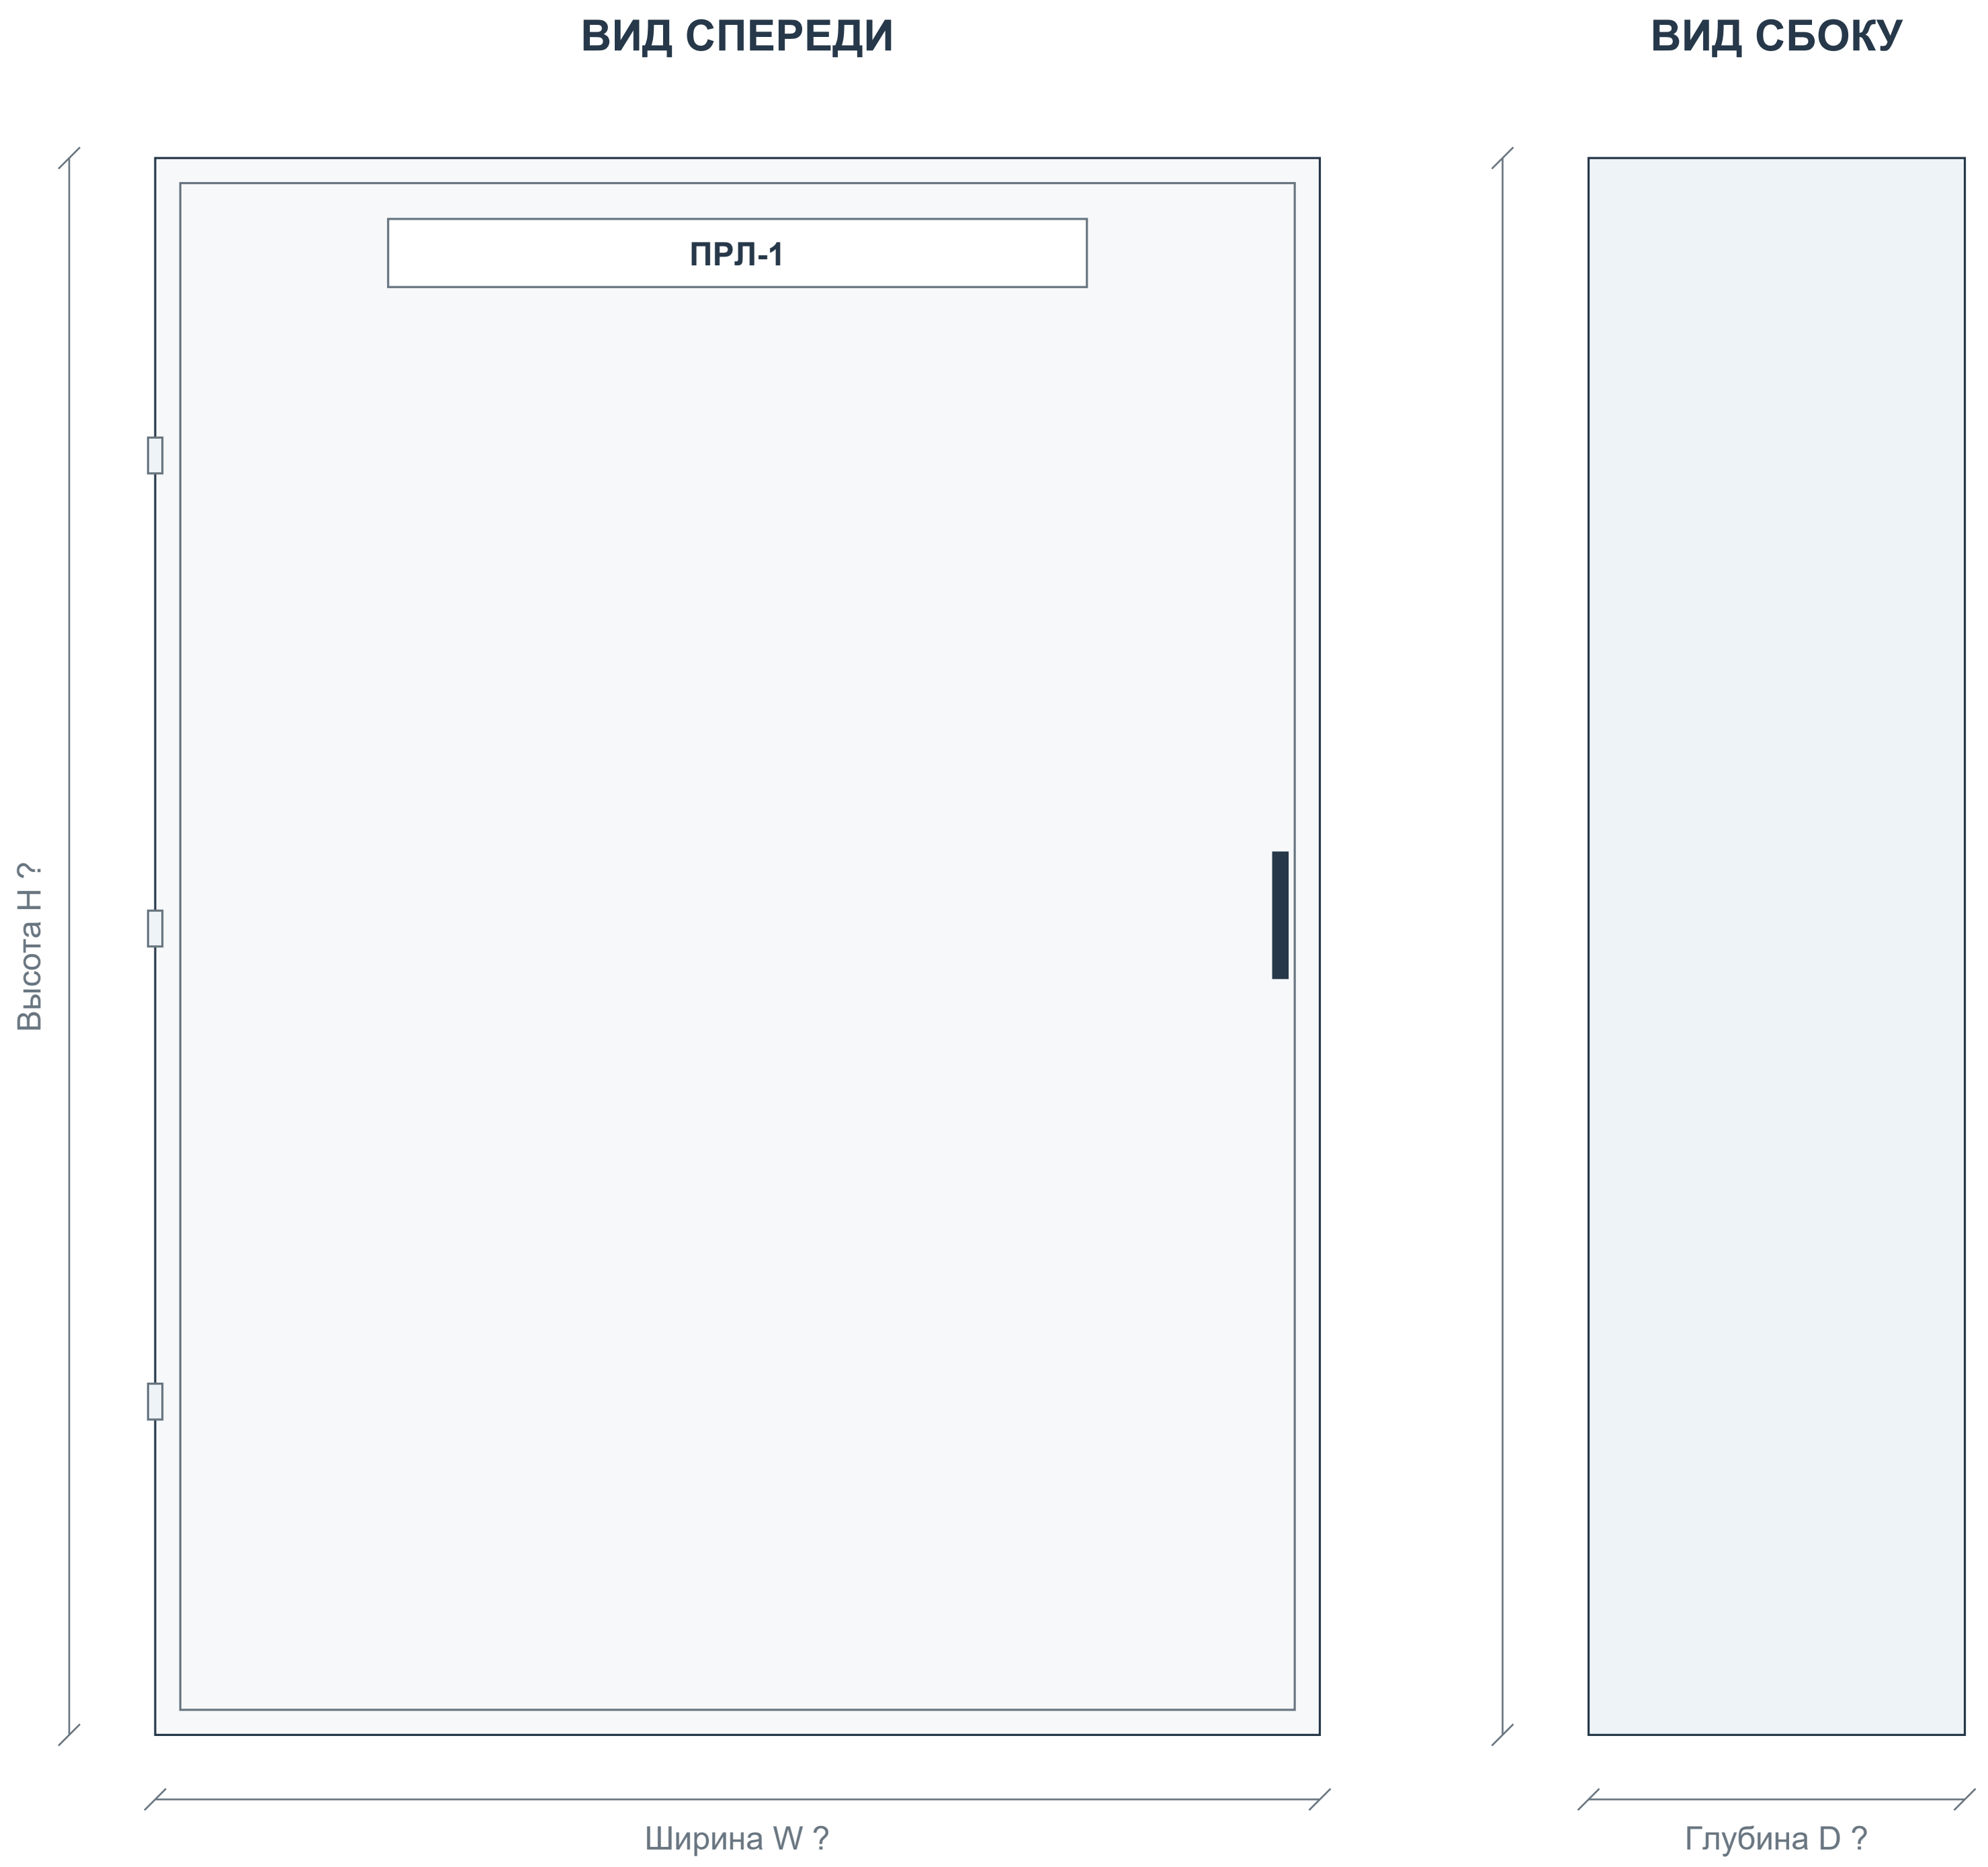

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

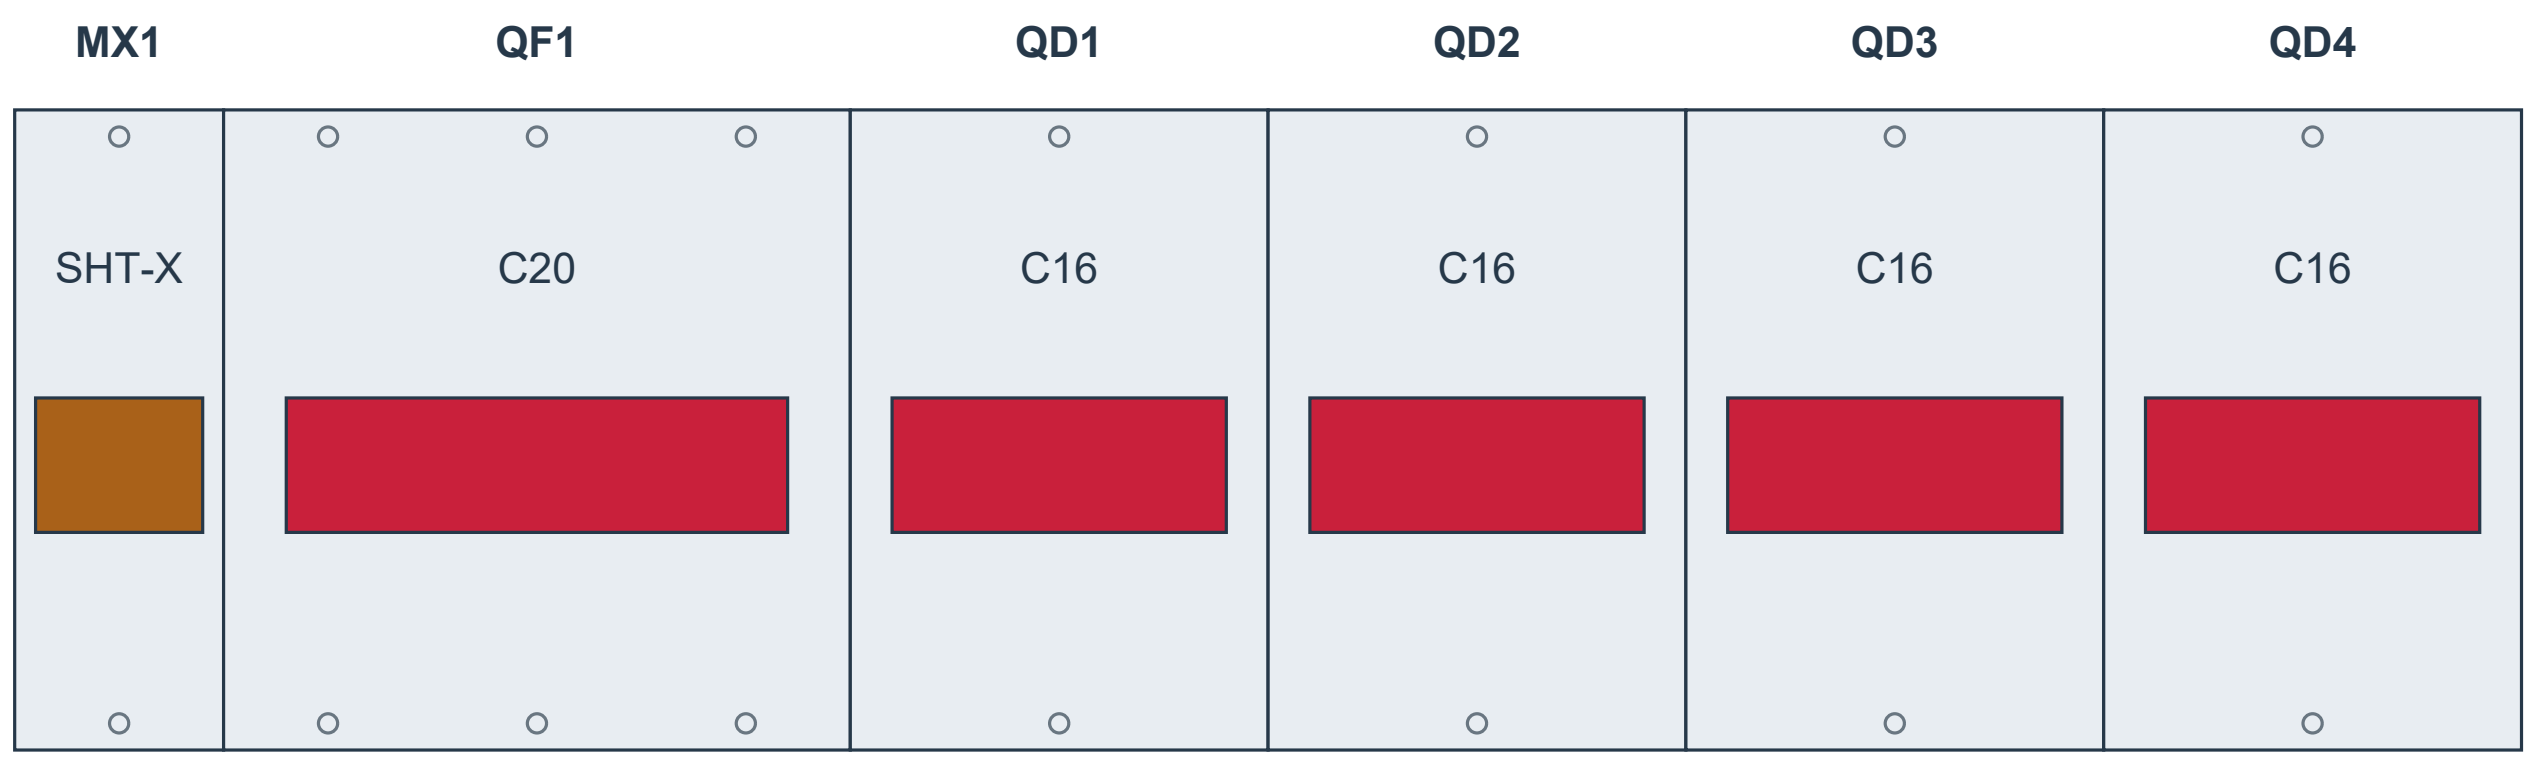

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

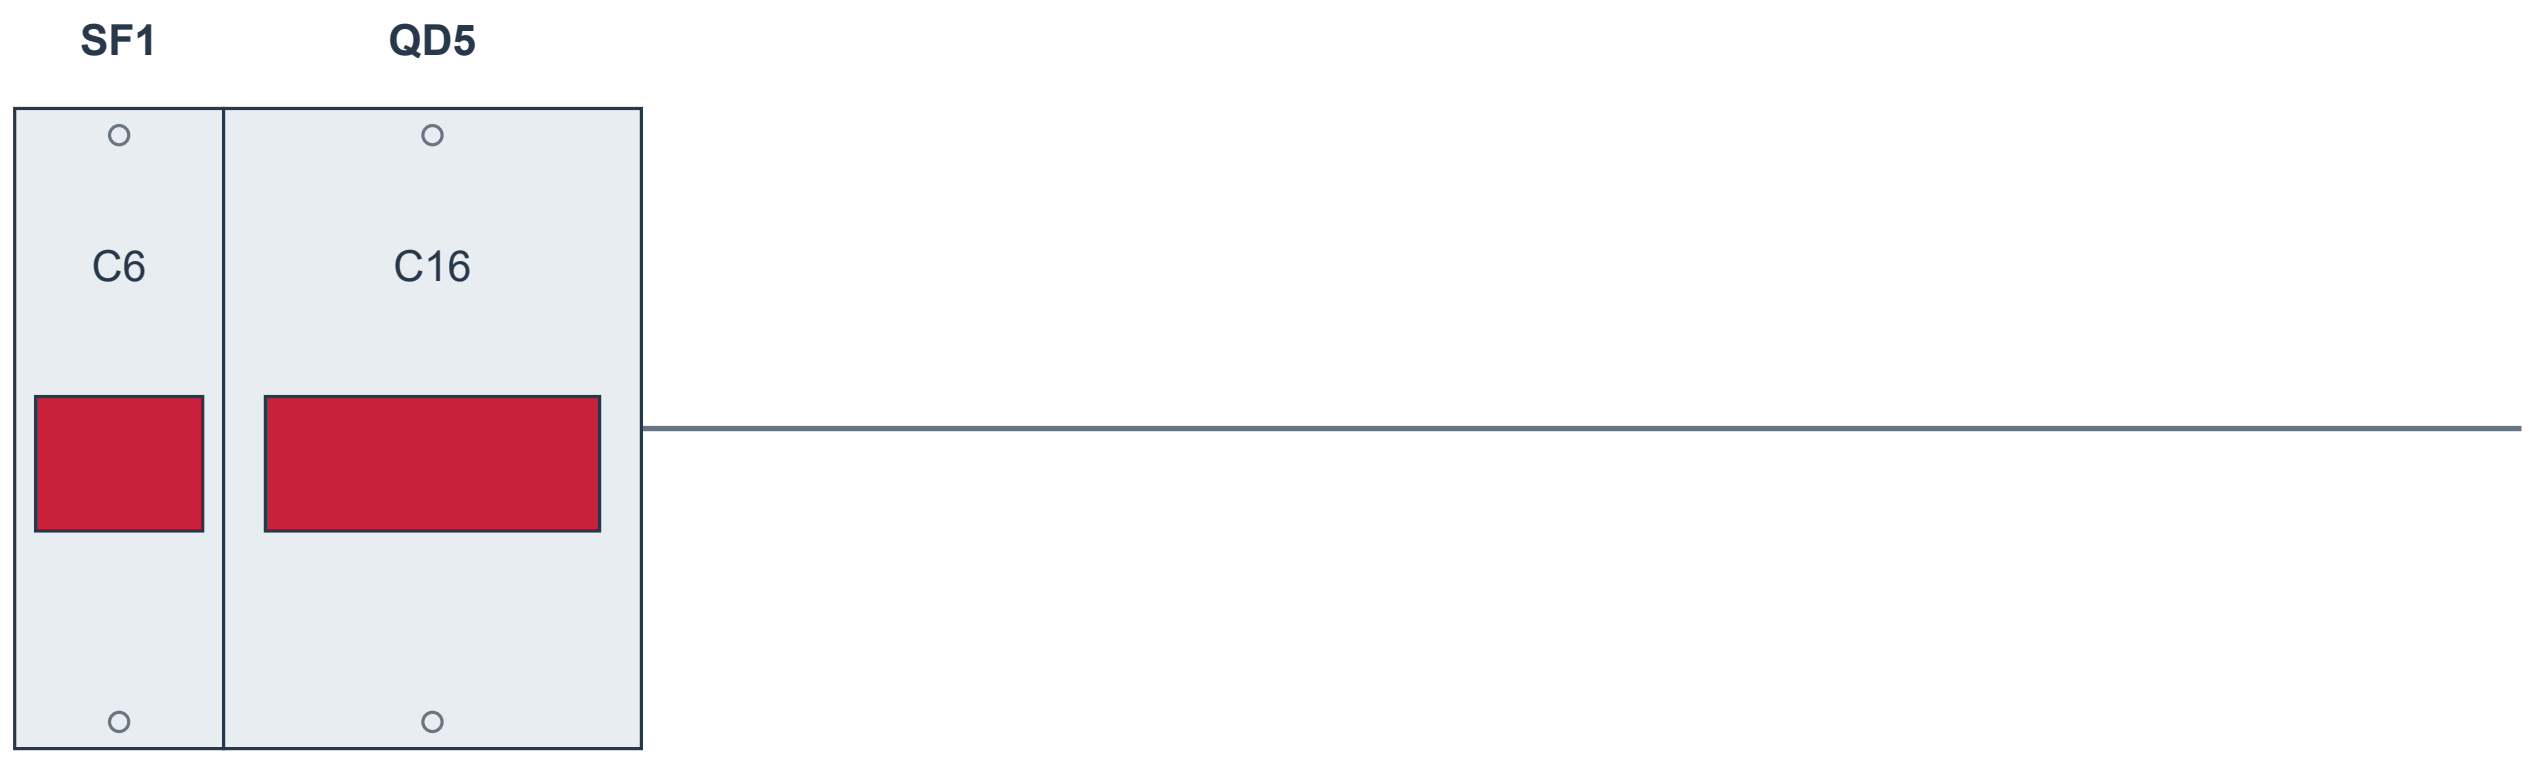

Сумма ширин: 54 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	24	1	0	?	18 B
QF1	NXB-63S	25	1	18	?	54 B
SF1	NXB-63S	26	2	0	?	18 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	27	1	72...180	?	36 B
QD5	NXBLE-63YH	28	2	18	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Актуальная спецификация

ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 45 | ЭОМ, PDF стр. 8

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
46	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
47	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
48	296832	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
49	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
50	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
51	515409	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 8

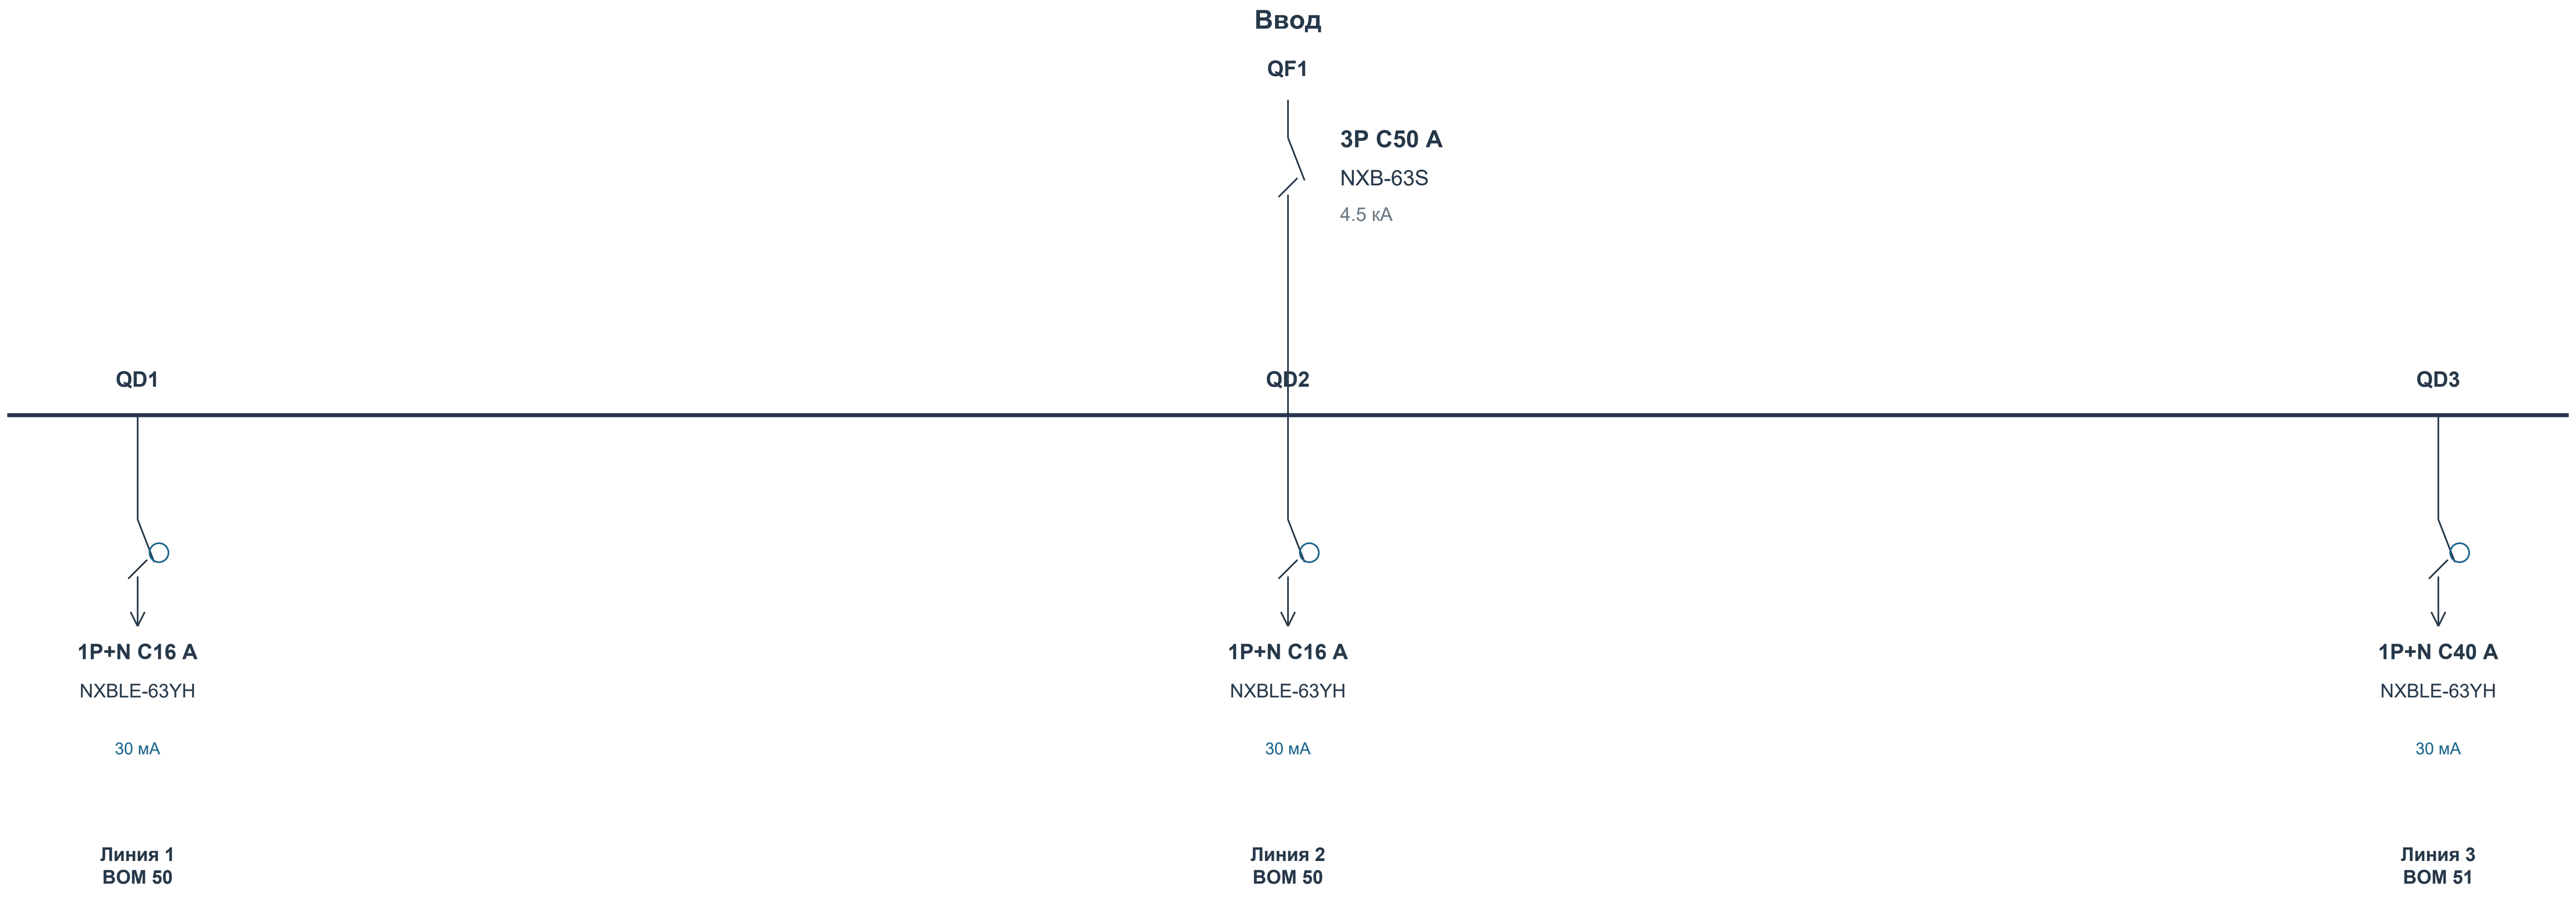
Ввод
QF1
3P C50 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 50
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 50
1P+N C40 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 51

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 11.6 кВт | Рр 8,3 кВт | Iр 39,7 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

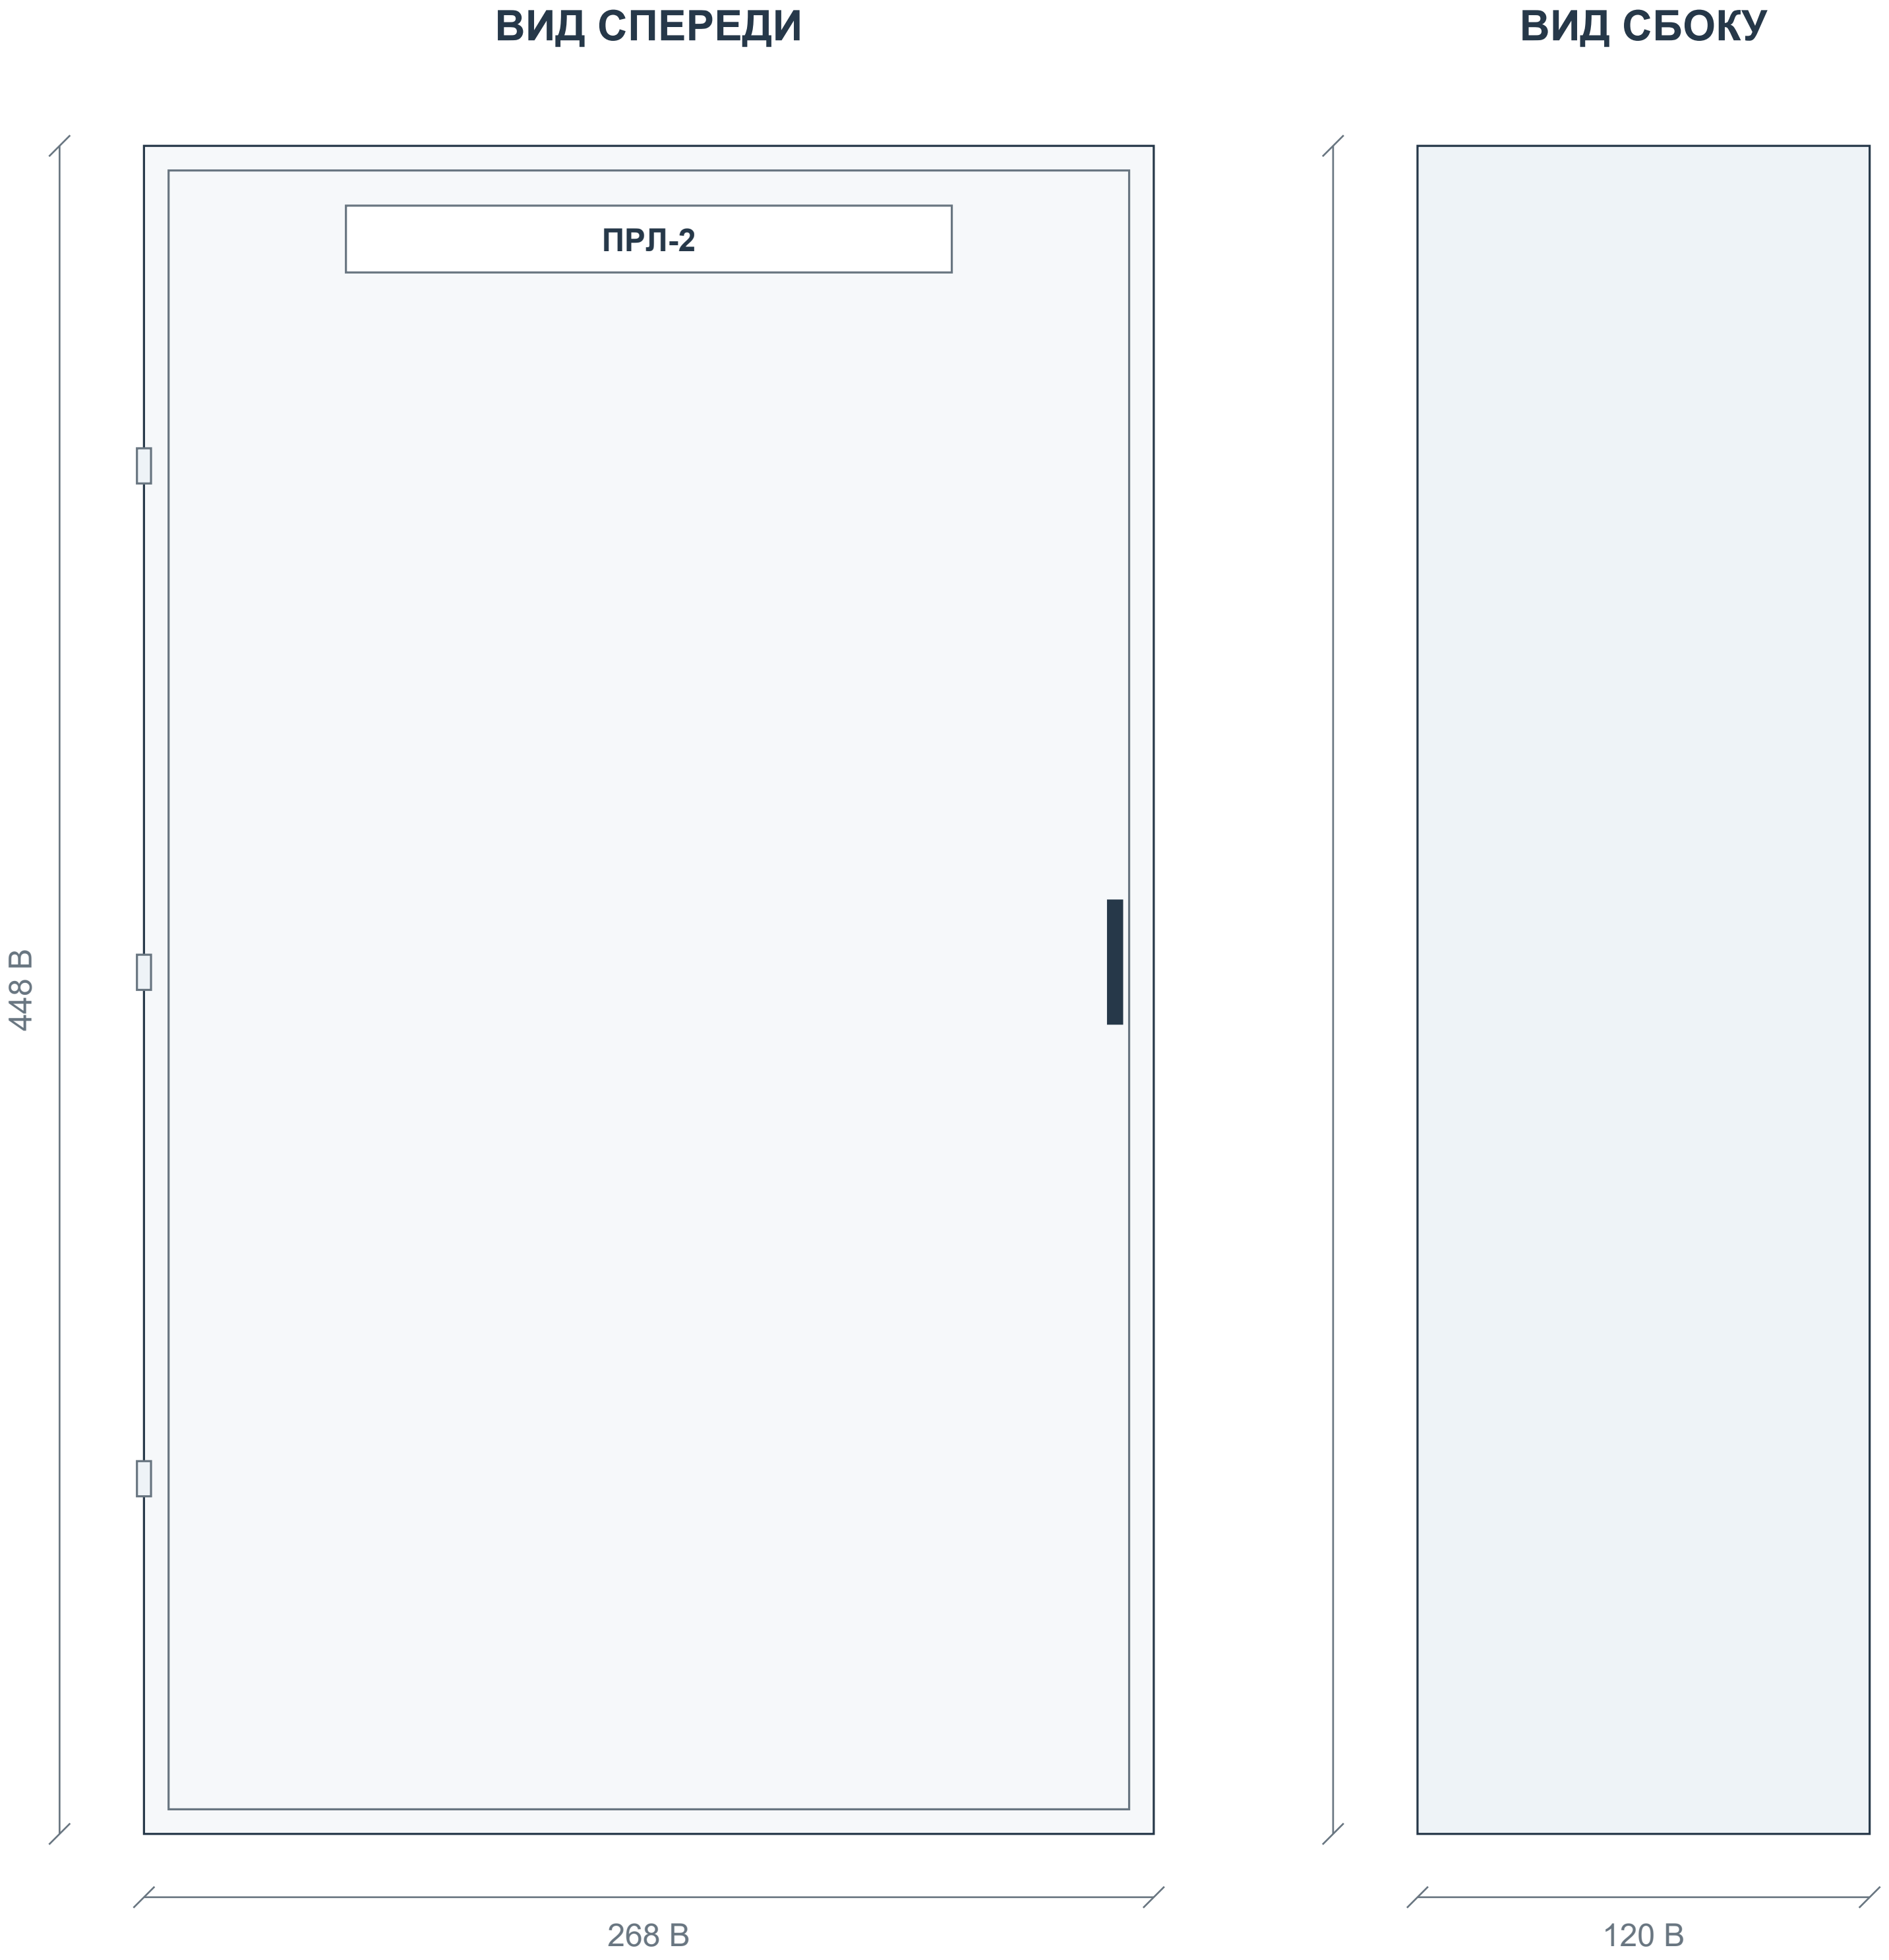

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

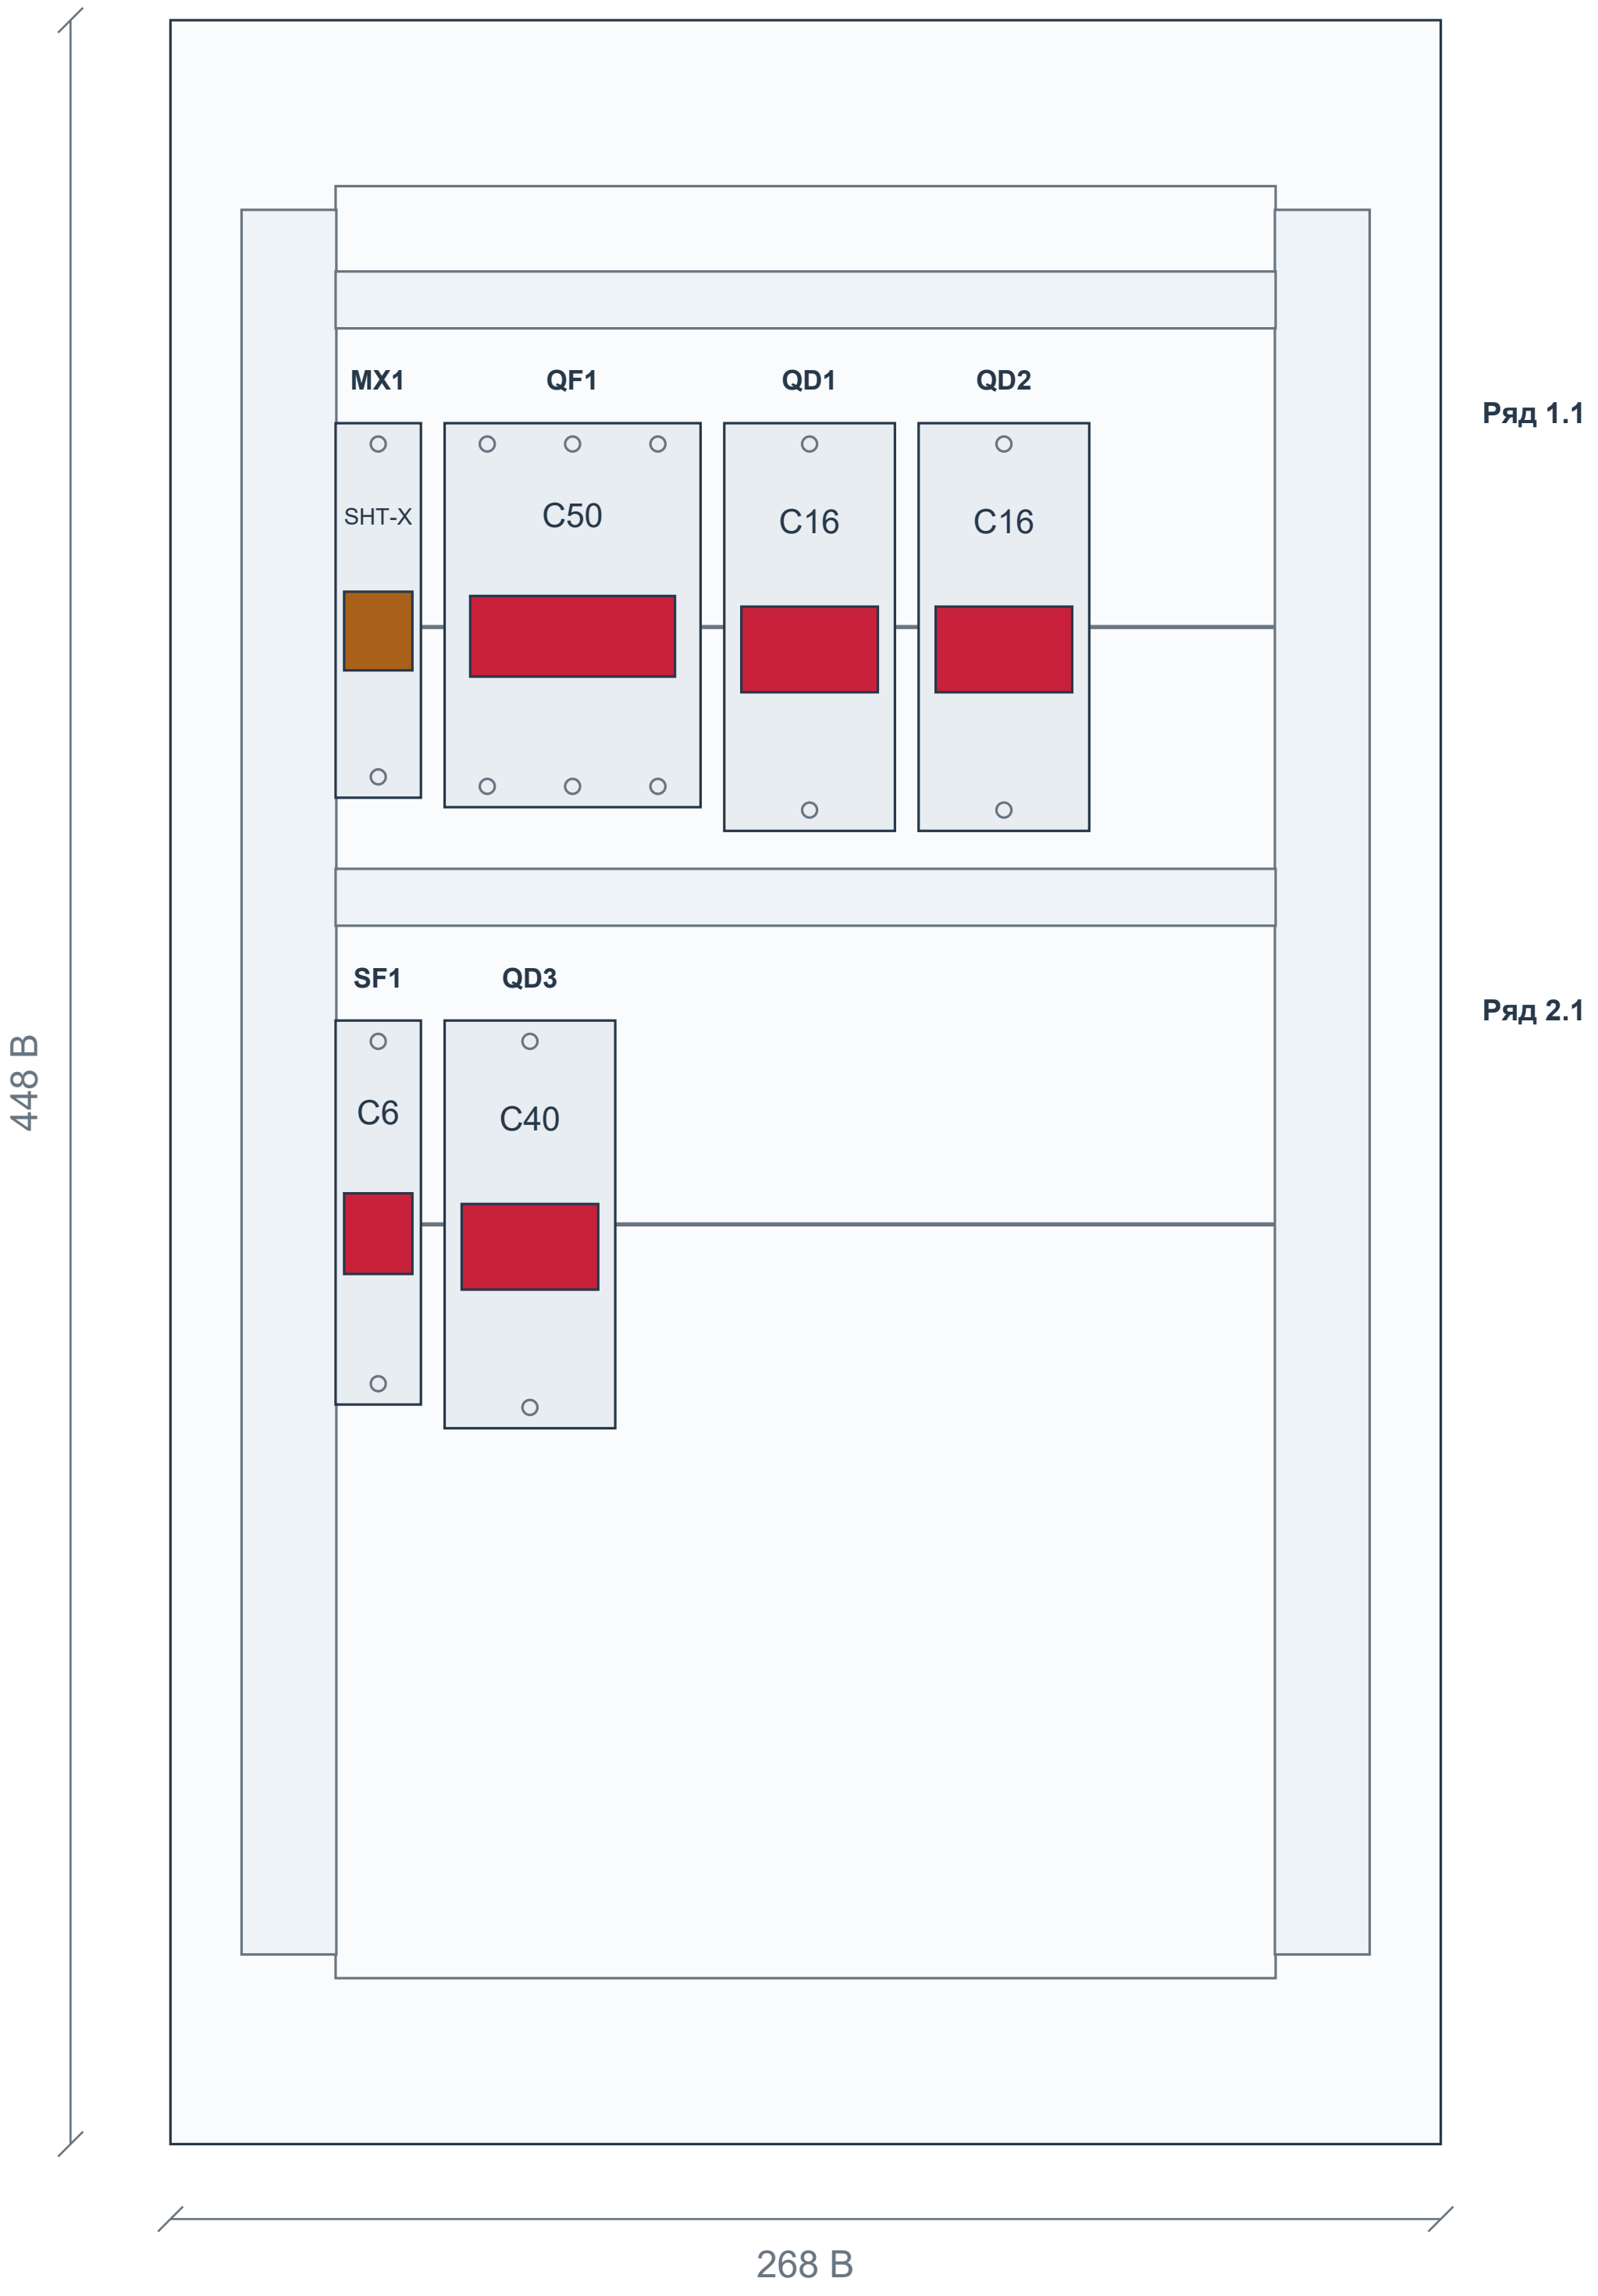

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	47	1.1	34.84	85	18 × 79
QF1	NXB-63S	48	1.1	57.84	85	54 × 81
SF1	NXB-63S	49	2.1	34.84	211	18 × 81
QD1 - QD2	NXBLE-63YH	50	1.1	116.84...157.84	85	36 × 86
QD3	NXBLE-63YH	51	2.1	57.84	211	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Актуальная спецификация

ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 70 | ЭОМ, PDF стр. 9

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
71	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
72	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
73	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
74	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
75	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
76	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 9

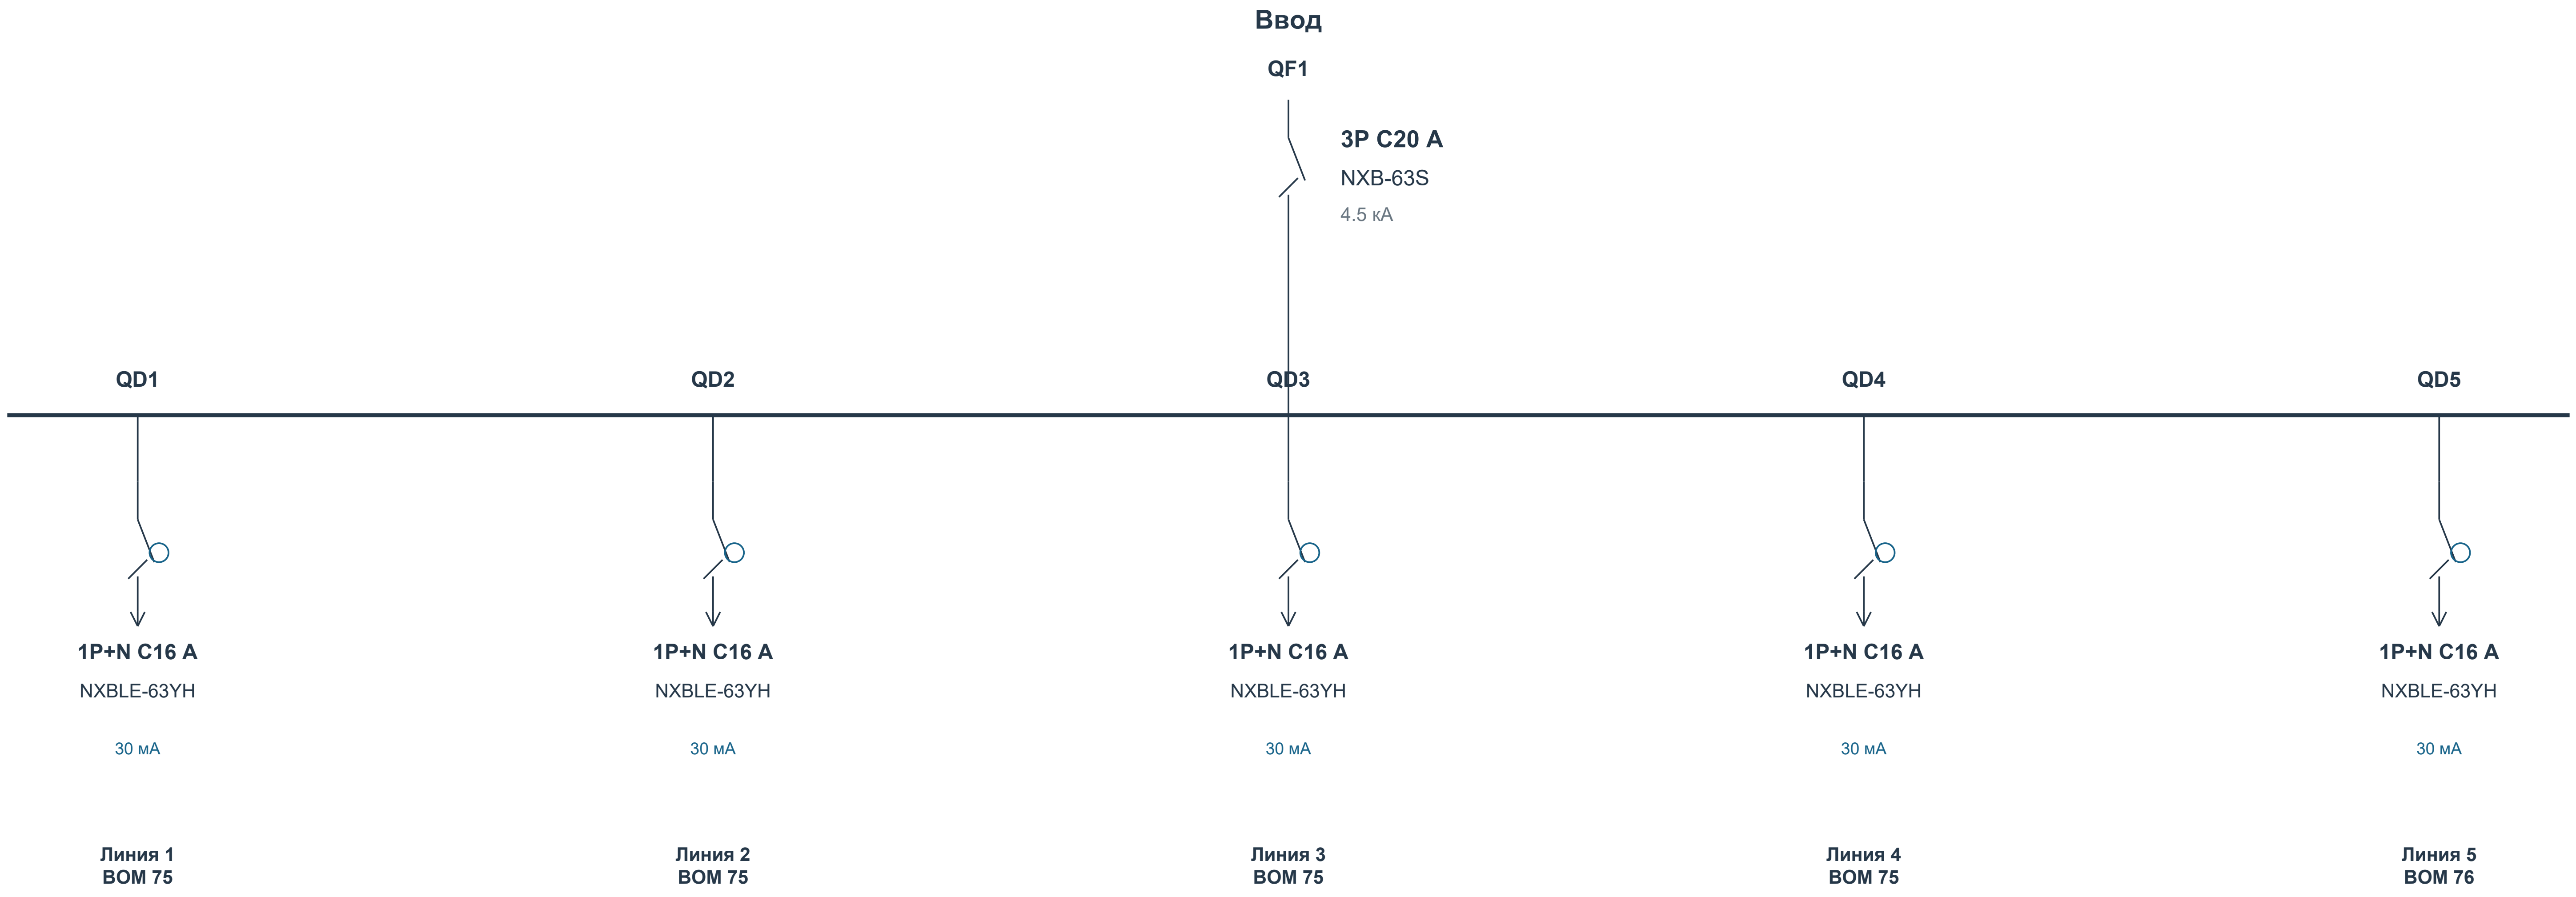
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 75
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 75
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 75
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 75
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 76

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Py 4.2 кВт | Pp 2,0 кВт | Ip 15,2 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

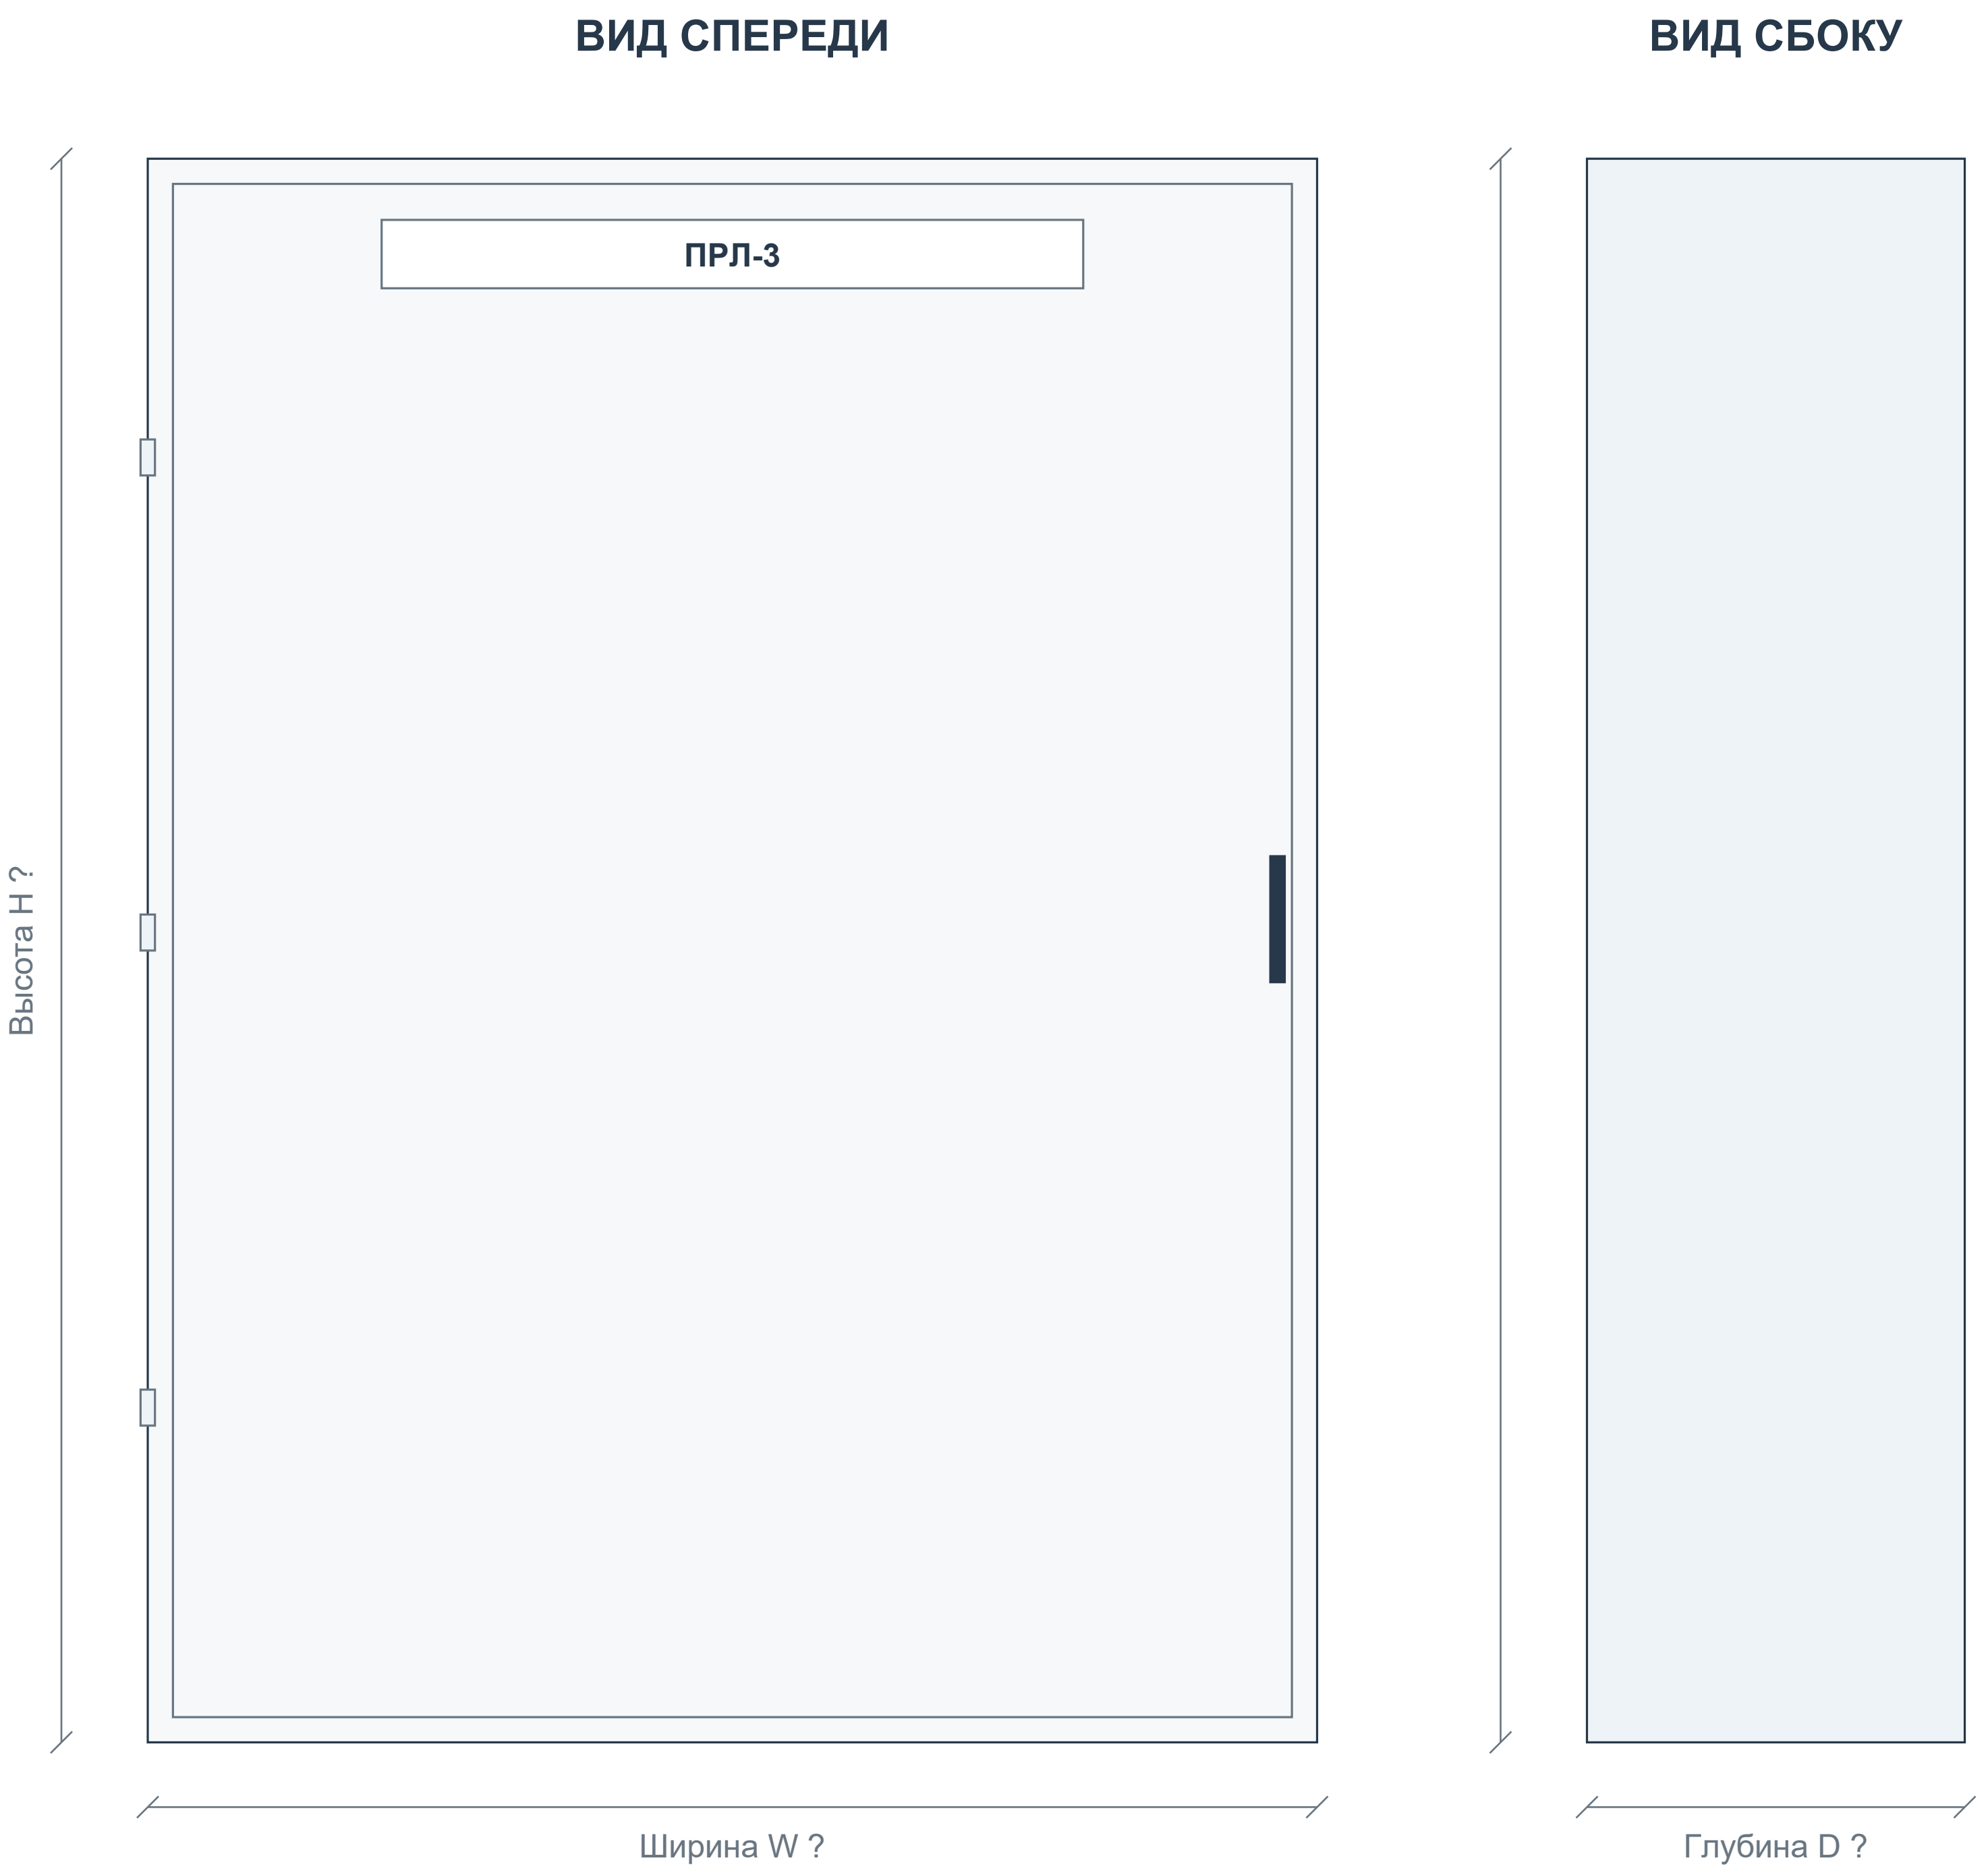

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

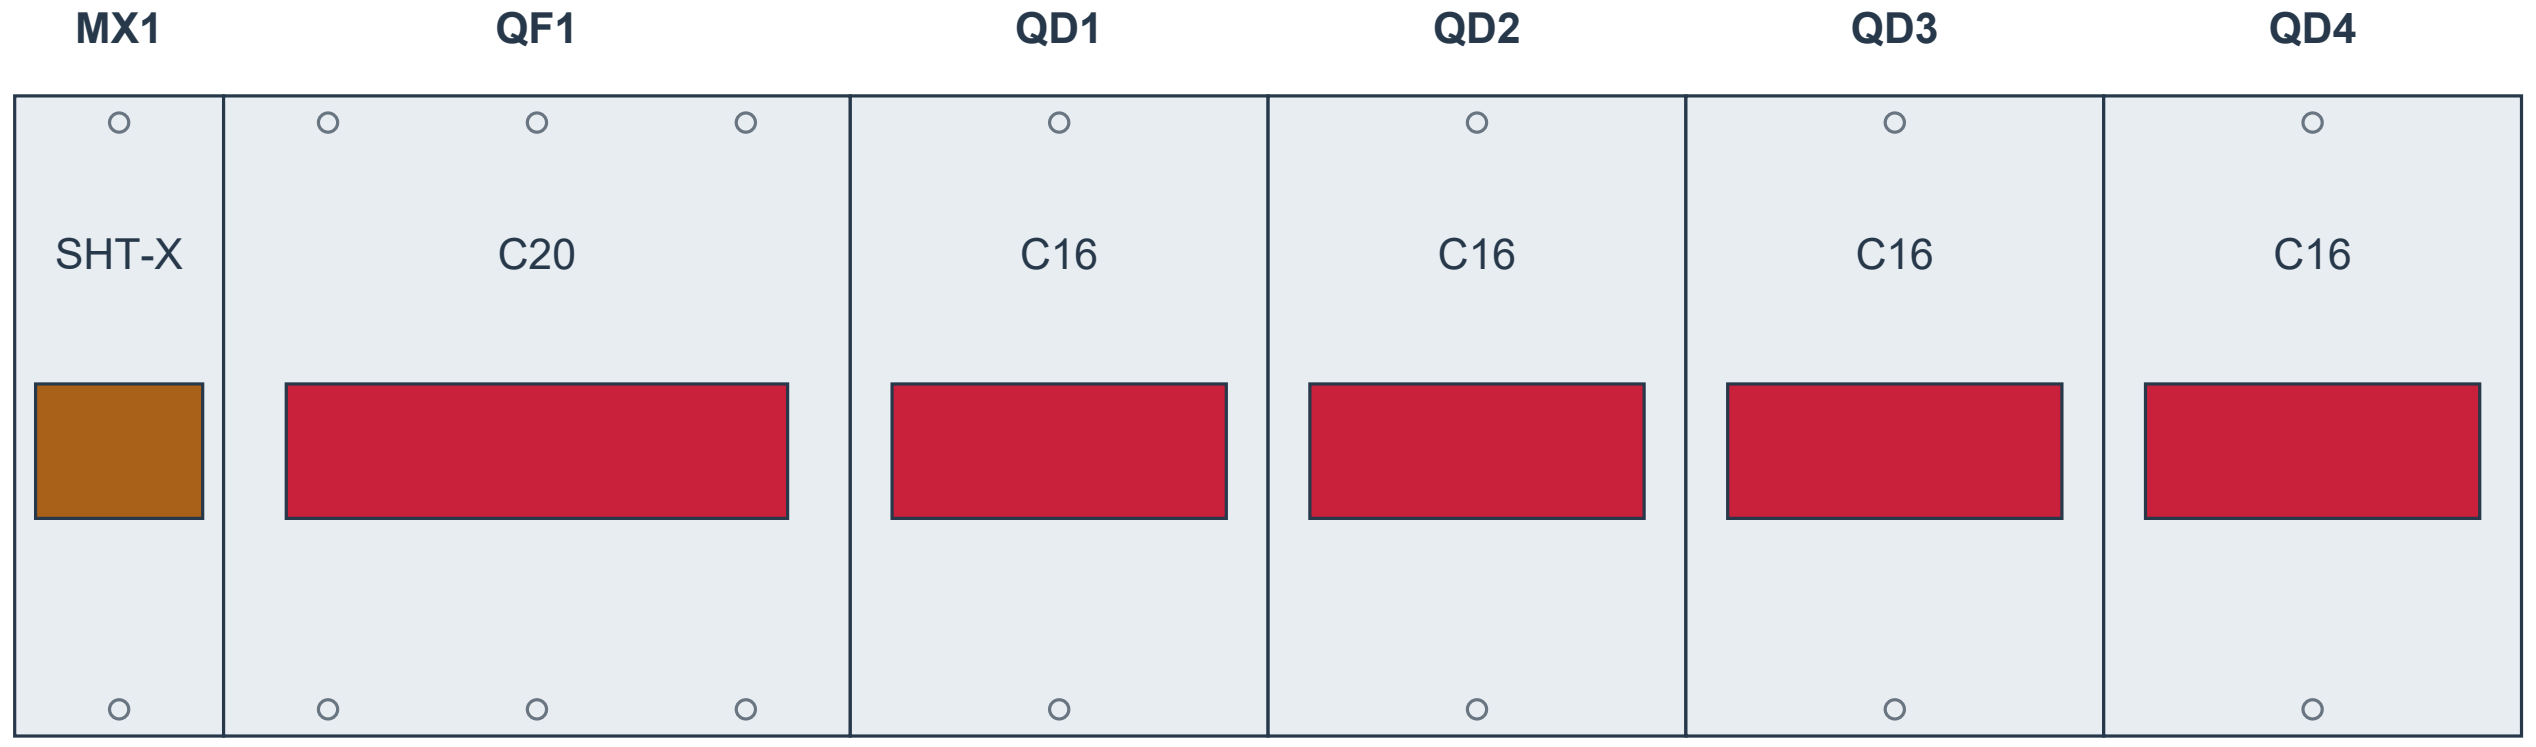

Сумма ширин: 216 мм В

Ряд 2 | модульная раскладка D

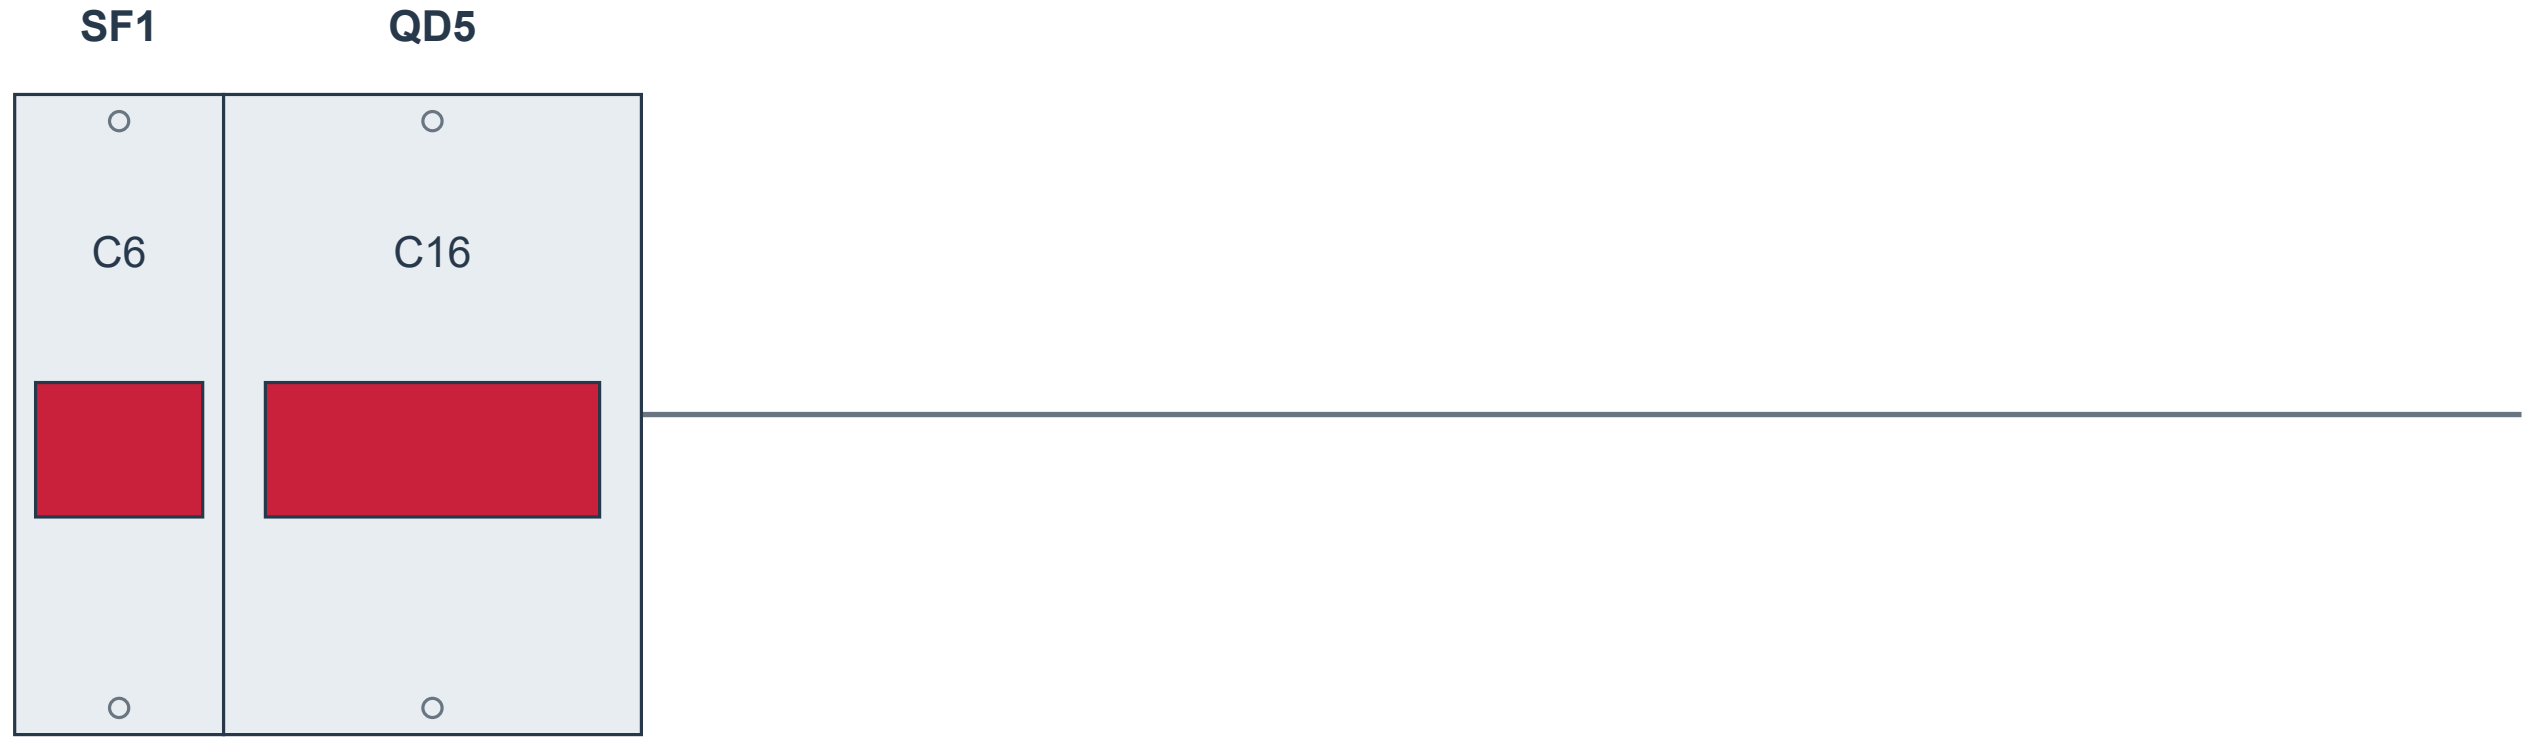

Сумма ширин: 54 мм В

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	72	1	0	?	18 B
QF1	NXB-63S	73	1	18	?	54 B
SF1	NXB-63S	74	2	0	?	18 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	75	1	72...180	?	36 B
QD5	NXBLE-63YH	76	2	18	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.1 | Актуальная спецификация

ПР-Тх1.1 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 93 | ЭОМ, PDF стр. 10

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
94	713-15060	Щит ЩРв-54-3 540х440х120мм	шт	1	1	teksan f	Корпус
95	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
96	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
97	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
98	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
99	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
100	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	6	6	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 10

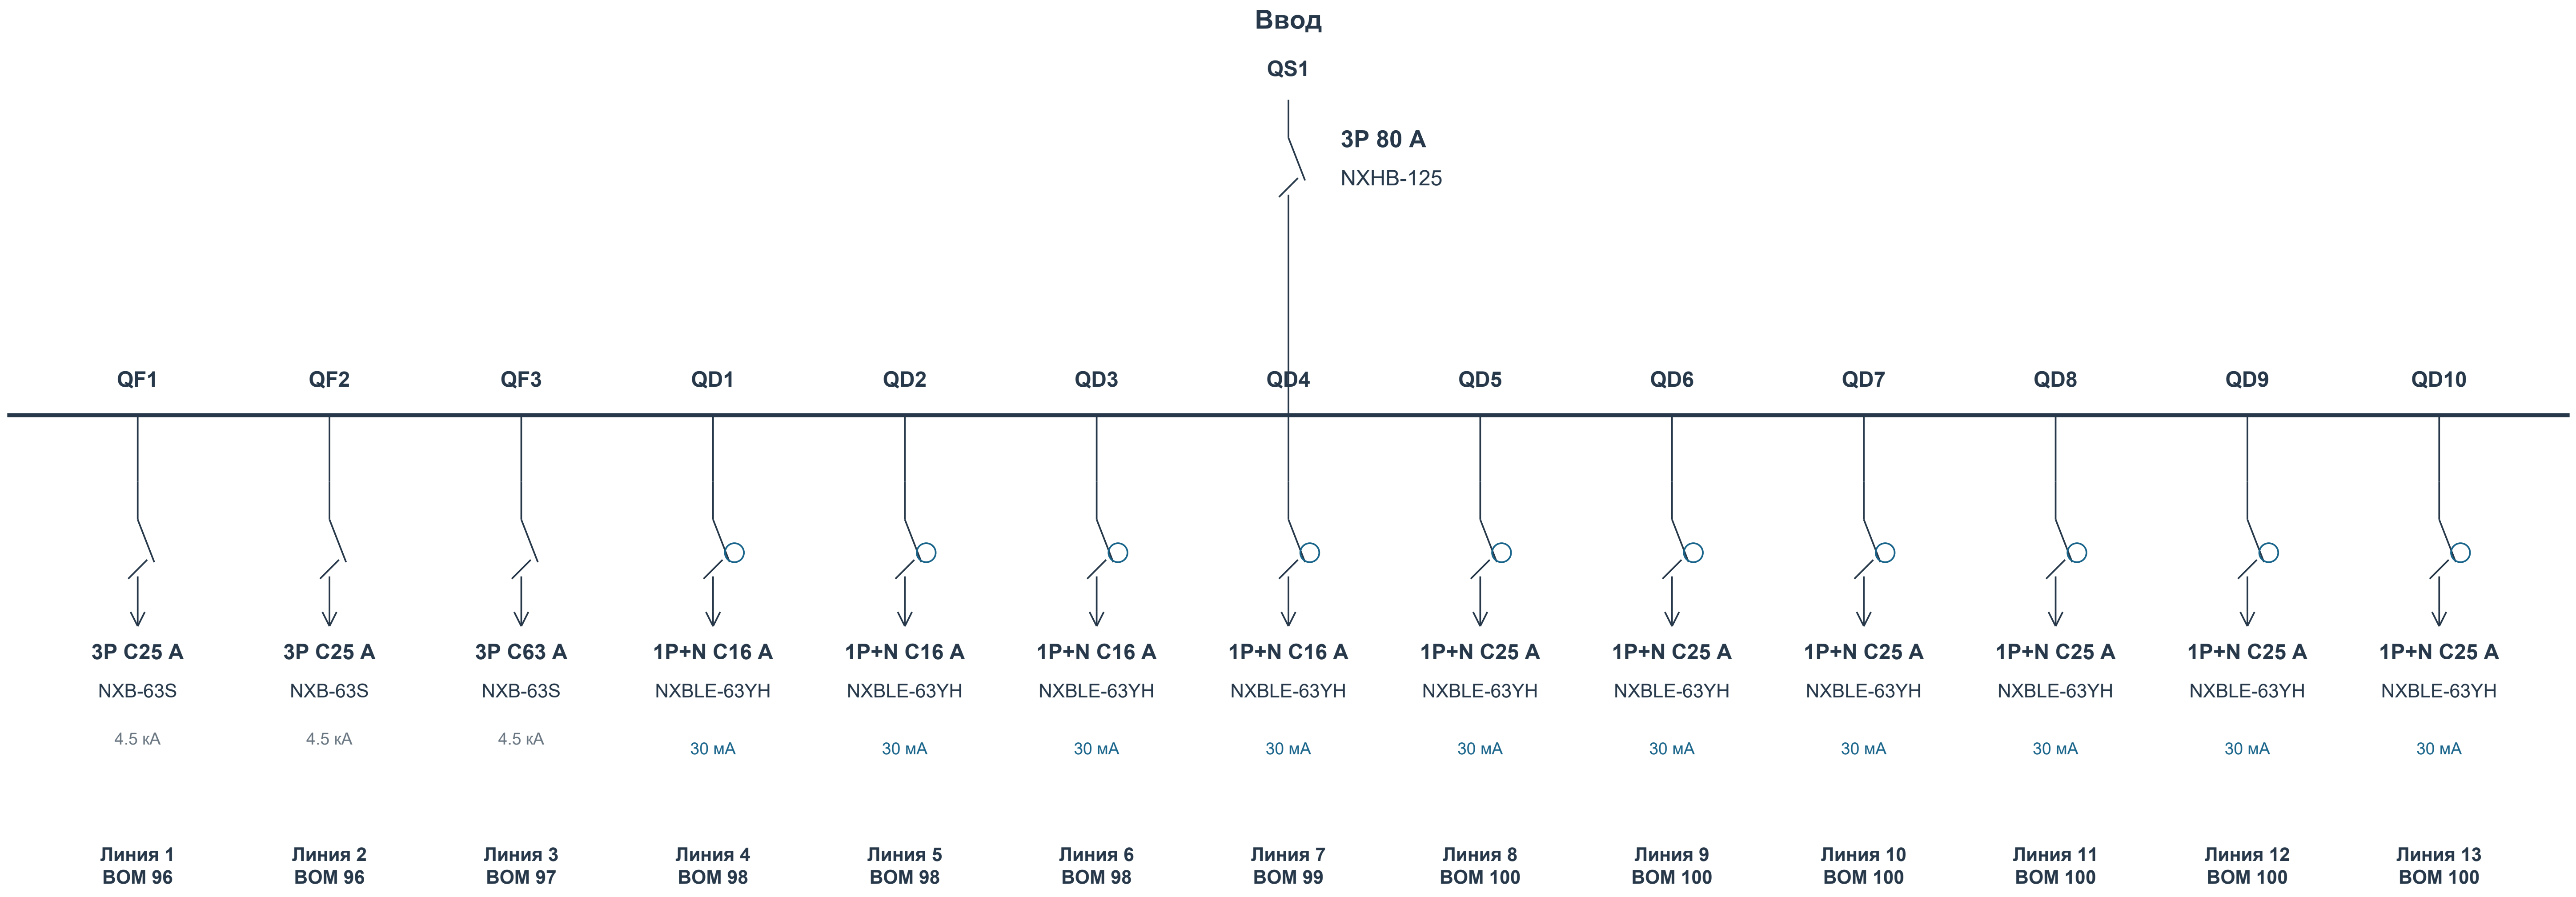
Ввод
QS1
3P 80 A
NXHB-125
QF1
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 96
QF2
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 96
QF3
3P C63 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 97
QD1
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 98
QD2
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 98
QD3
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 98
QD4
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 99
QD5
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 100
QD6
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 9
BOM 100
QD7
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 10
BOM 100
QD8
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 11
BOM 100
QD9
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 12
BOM 100
QD10
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 13
BOM 100

Данные исходного проекта: Ру 41.7 кВт | Рр 14,3 кВт | Ір 24,1 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

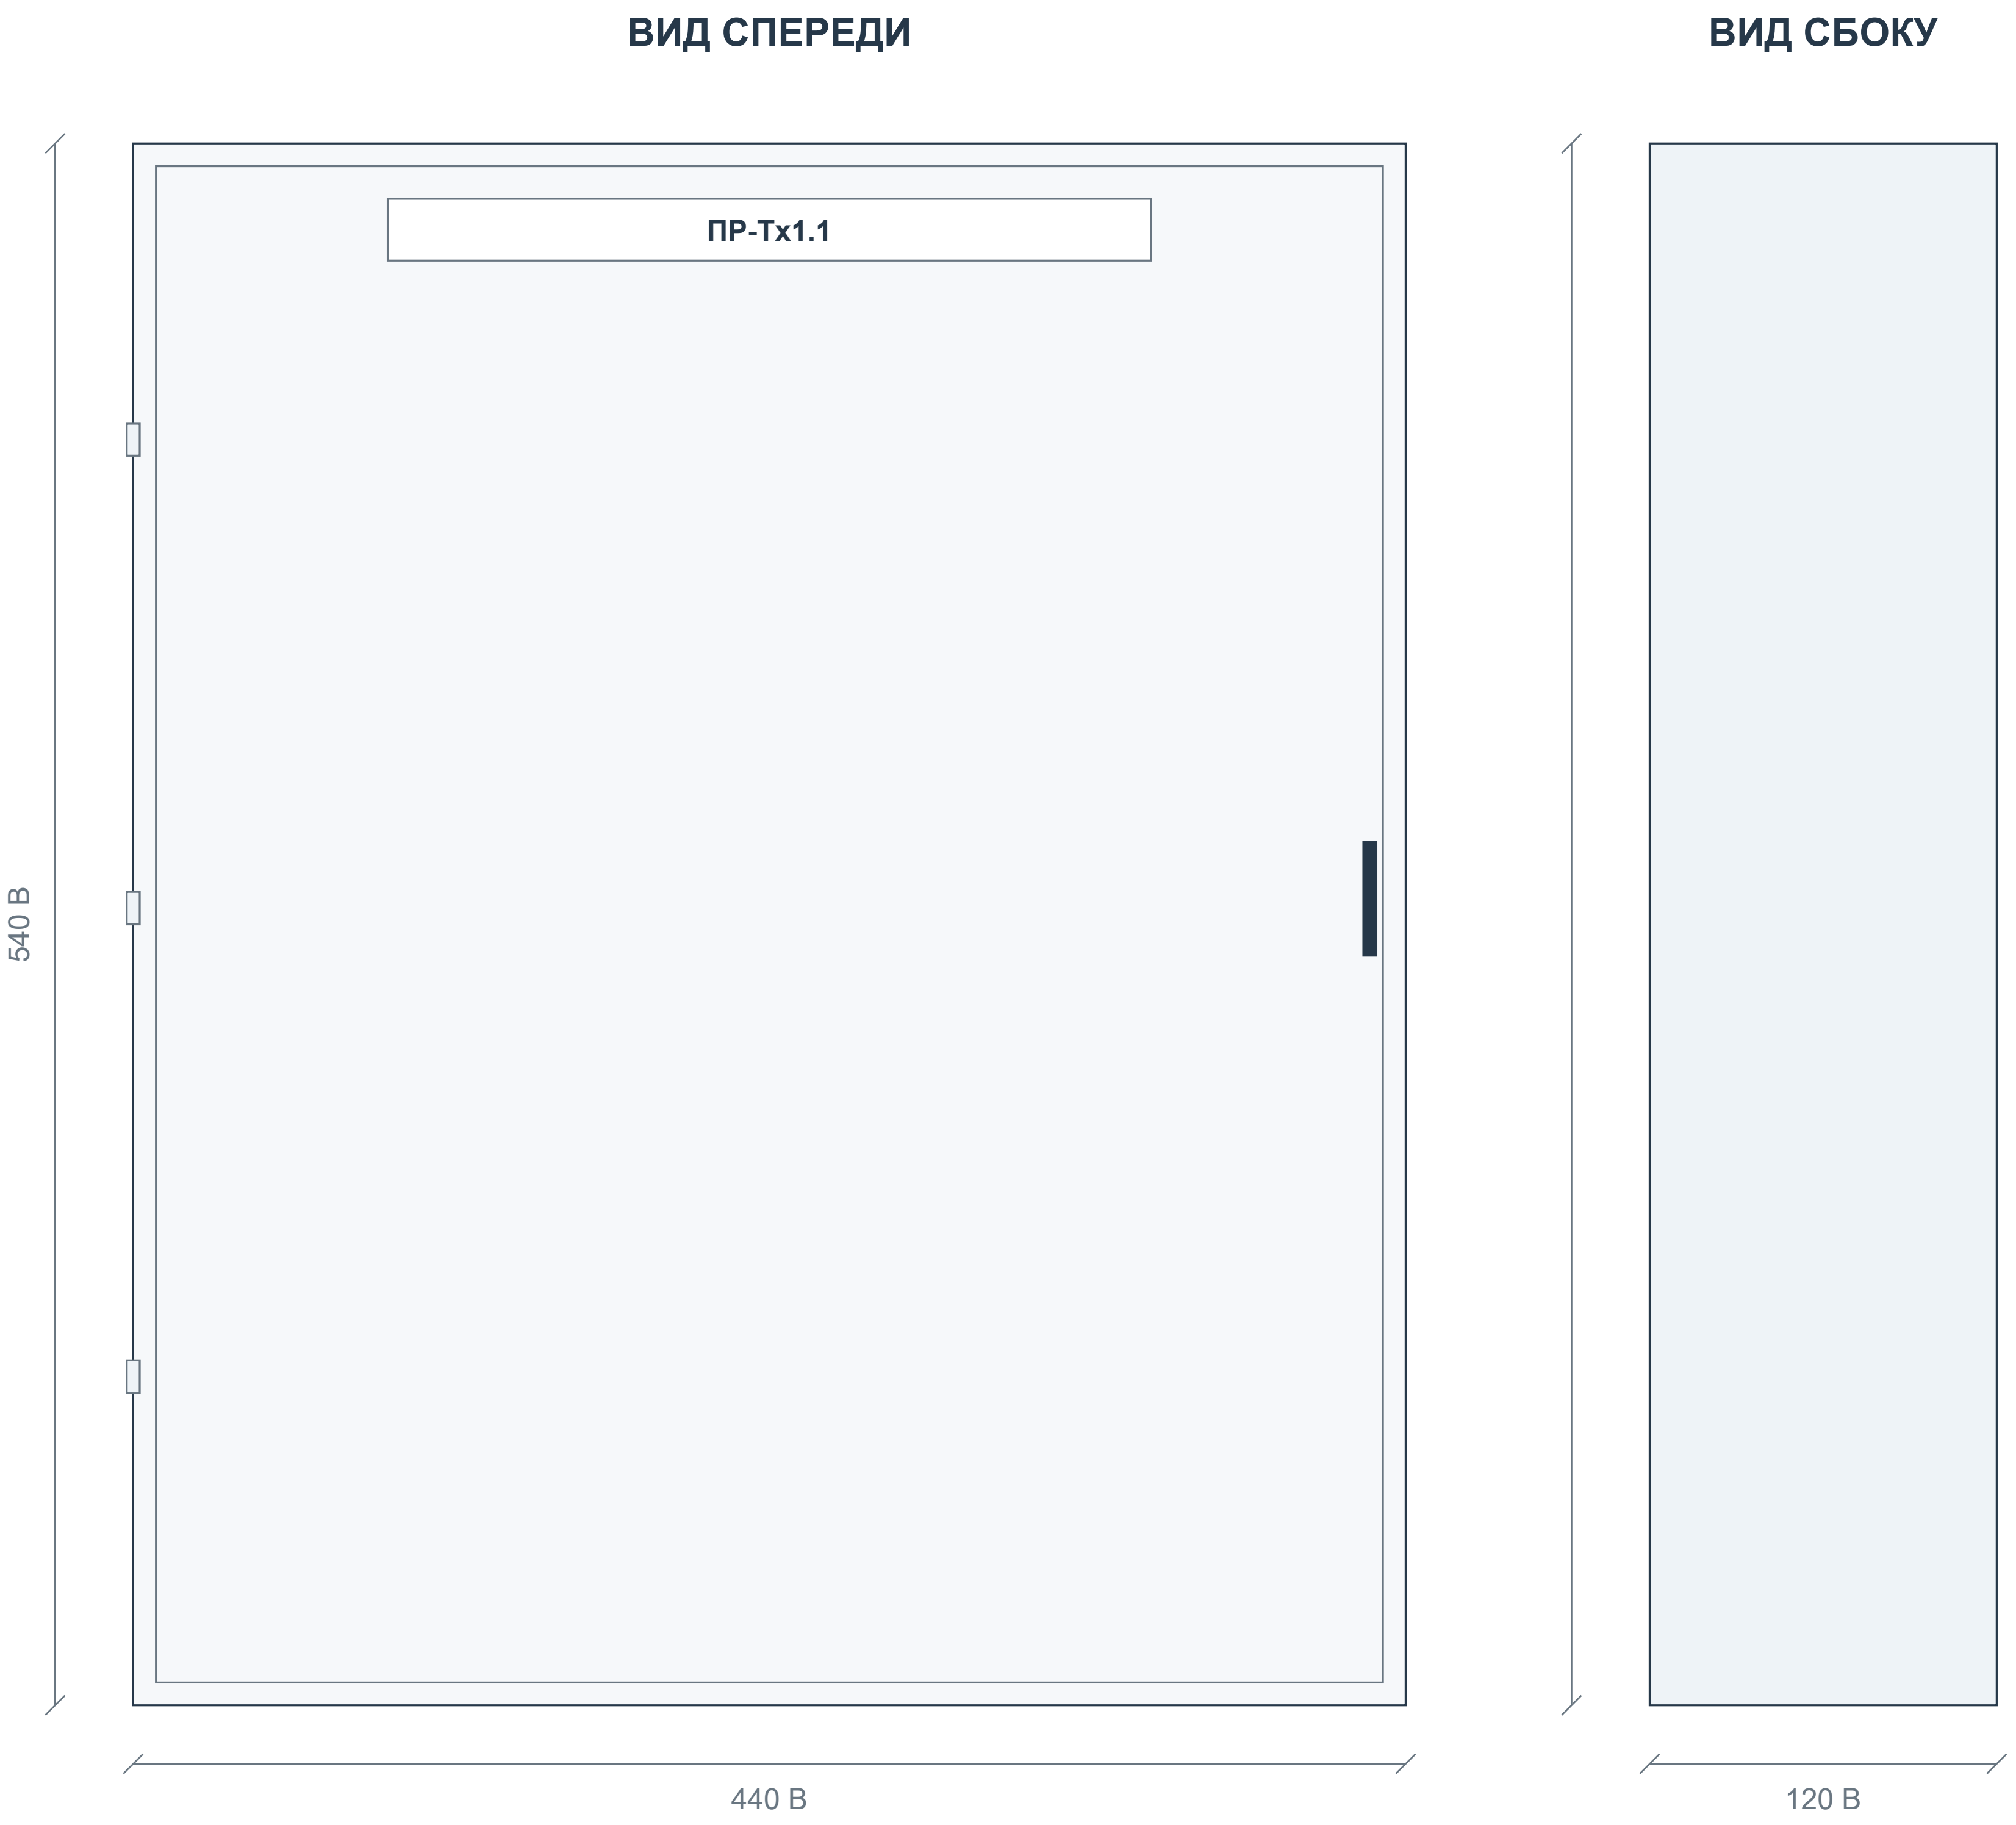

Корпус: Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.1 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

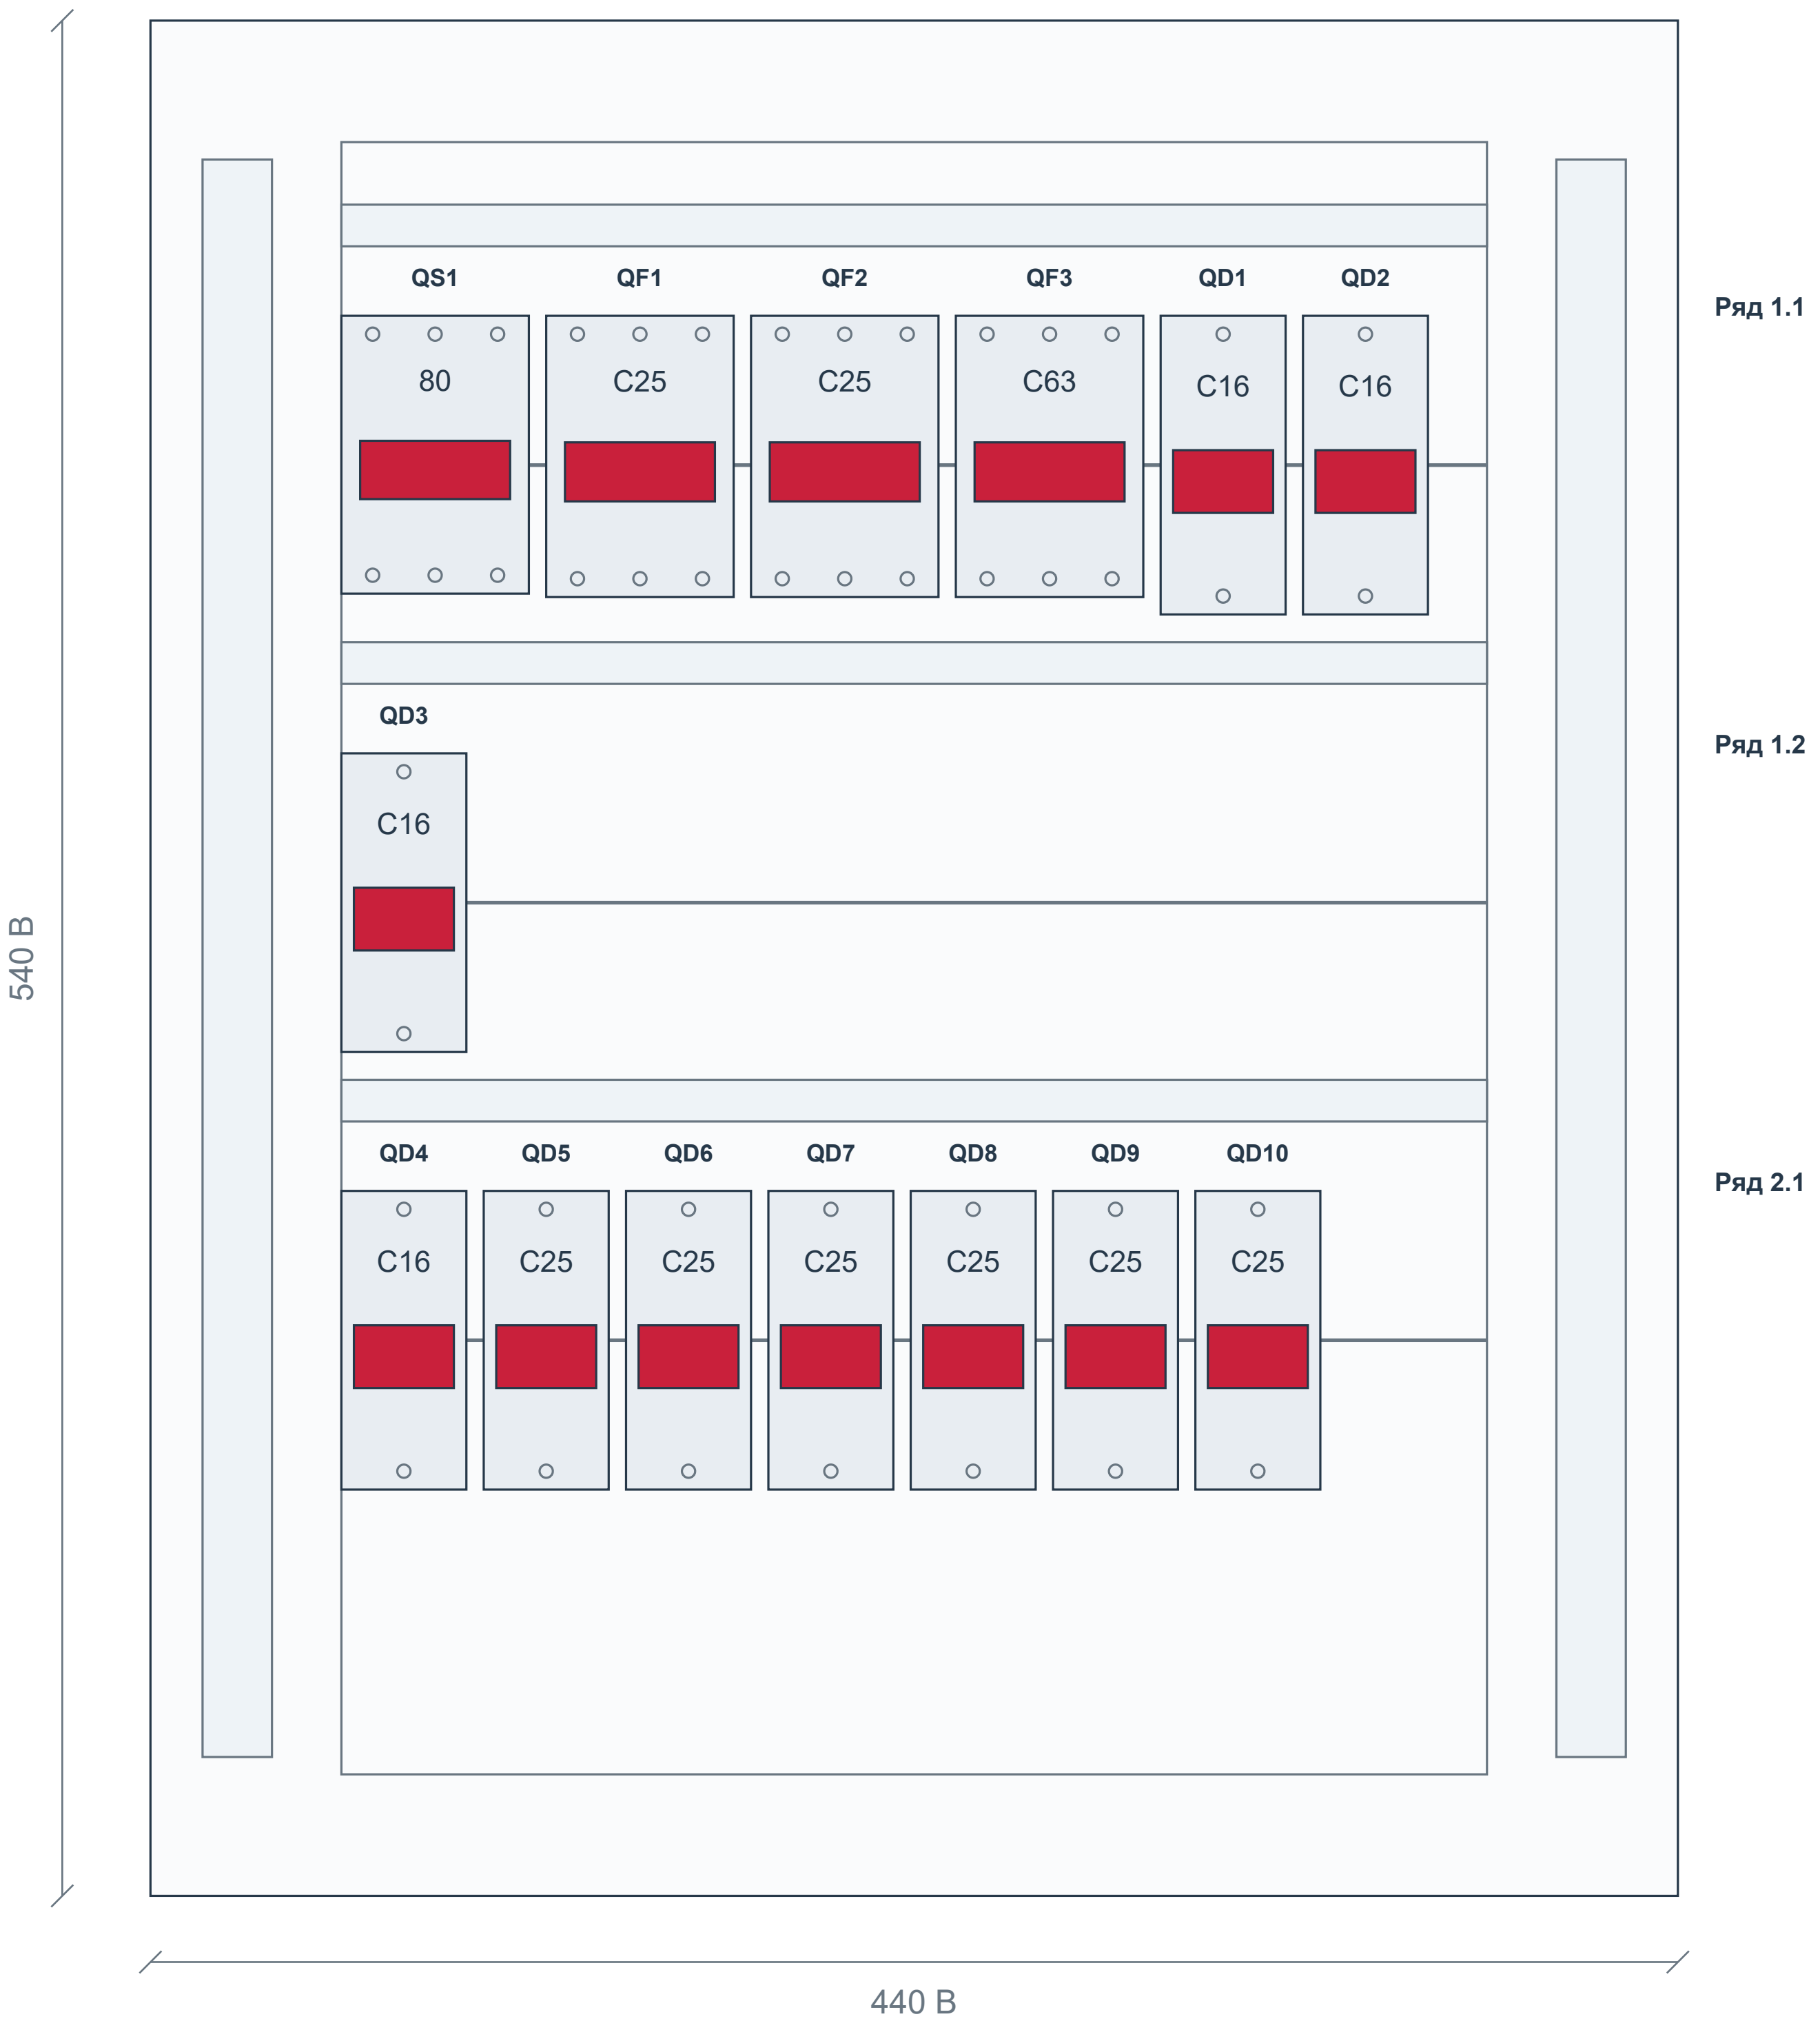
QS1
80
QF1
C25
QF2
C25
QF3
C63
QD1
C16
QD2
C16
Ряд 1.1
QD3
C16
Ряд 1.2
QD4
C16
QD5
C25
QD6
C25
QD7
C25
QD8
C25
QD9
C25
QD10
C25
Ряд 2.1
540 В
440 В

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	95	1.1	55	85	54 × 80
QF1 - QF2	NXB-63S	96	1.1	114...173	85	54 × 81
QF3	NXB-63S	97	1.1	232	85	54 × 81
QD1 - QD3	NXBLE-63YH	98	1.1/1.2	291...332 / 55	85/211	36 × 86
QD4	NXBLE-63YH	99	2.1	55	337	36 × 86
QD5 - QD10	NXBLE-63YH	100	2.1	96...301	337	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Ряды с недостаточной шириной разделены на подряды. Новые расстояния и способ крепления согласовать.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Актуальная спецификация

ПРК-1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 117 | ЭОМ, PDF стр. 11

BOM стр.	**Артикул**	**Наименование / характеристика**	**Ед.**	**На щит**	**На объект**	**Изготовитель**	**Роль**
118	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
119	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
120	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
121	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
122	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
123	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 11

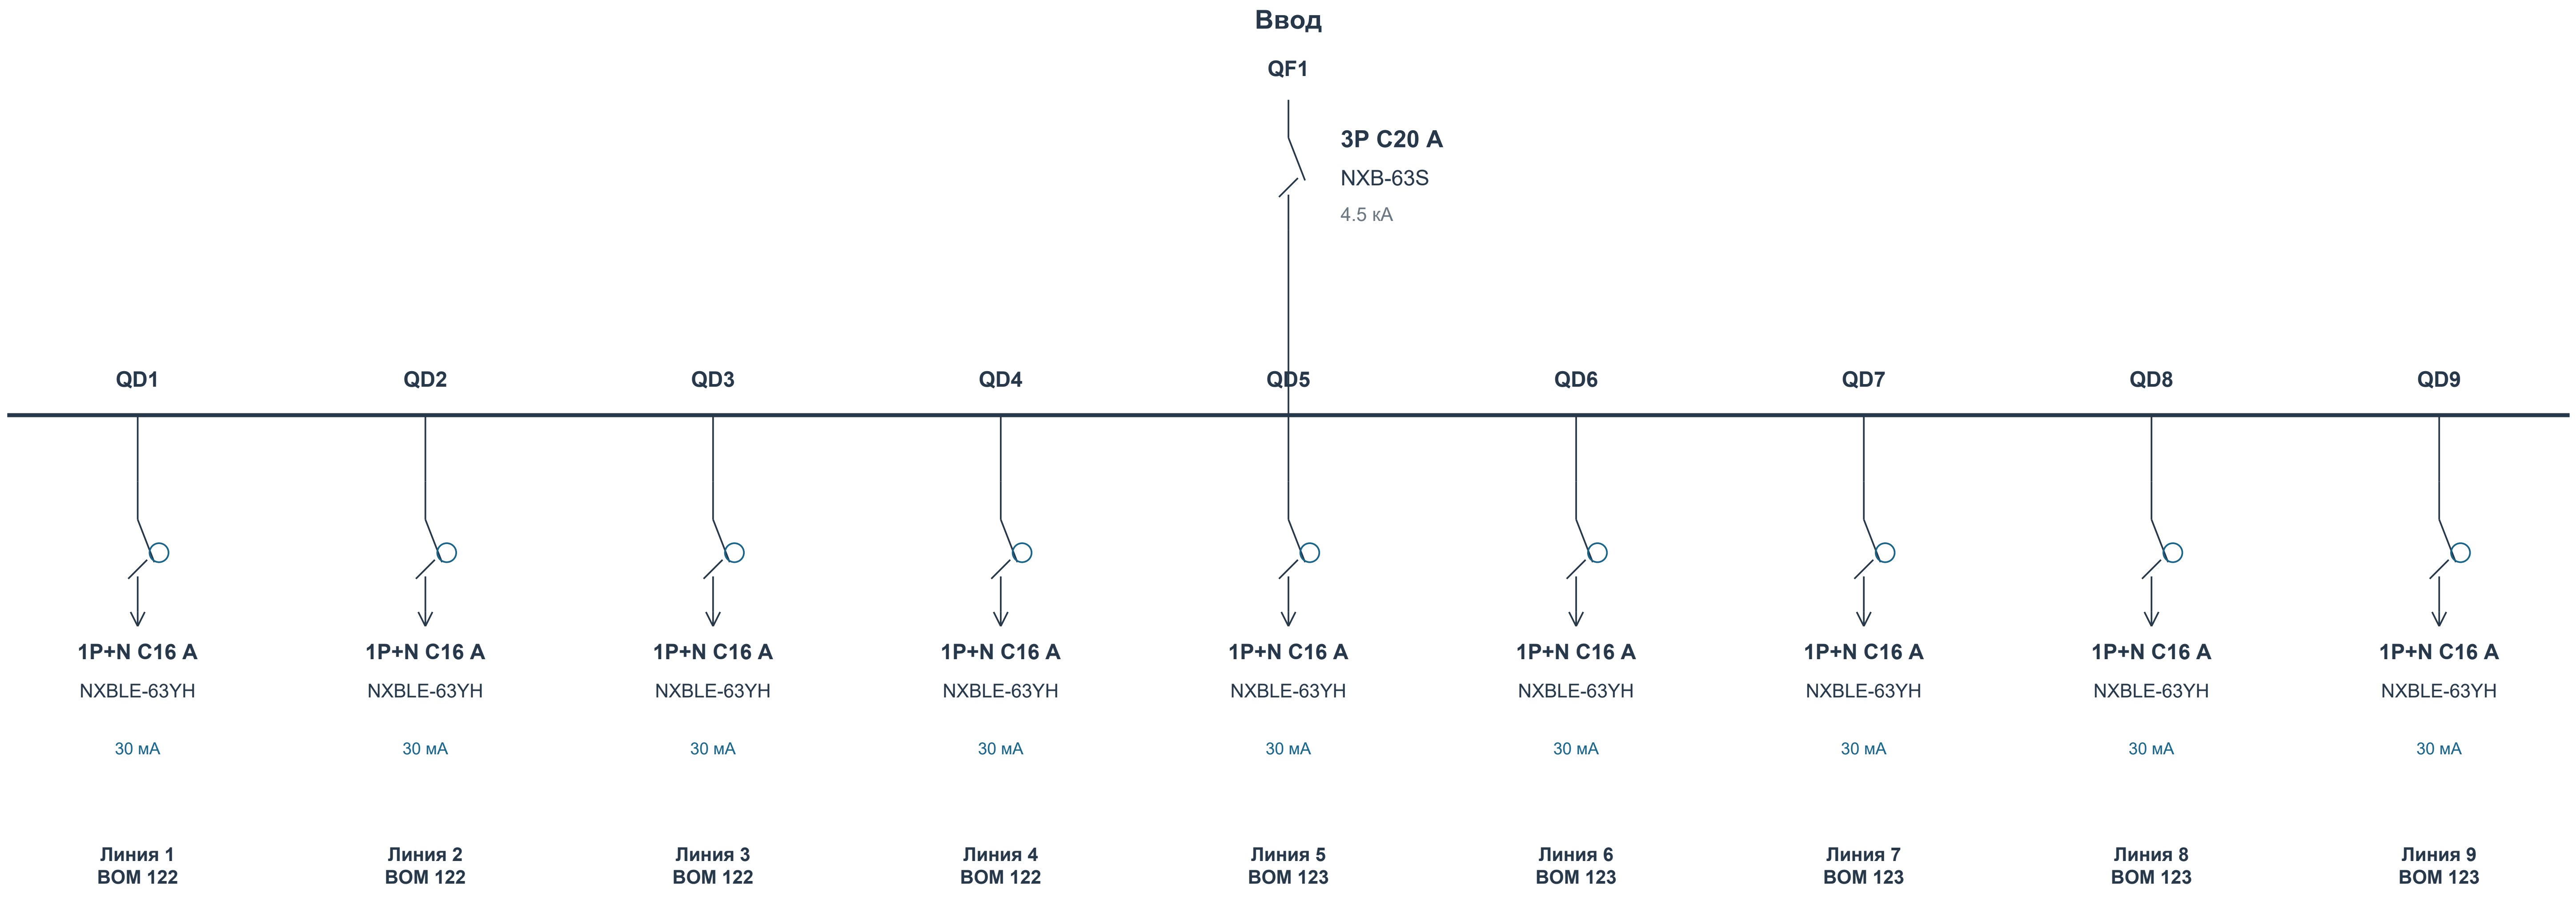
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
QD9
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 122
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 122
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 122
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 122
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 123
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 123
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 123
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 123
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 9
BOM 123

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 11.3 кВт | Рр 9,0 кВт | Ip 14,4 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

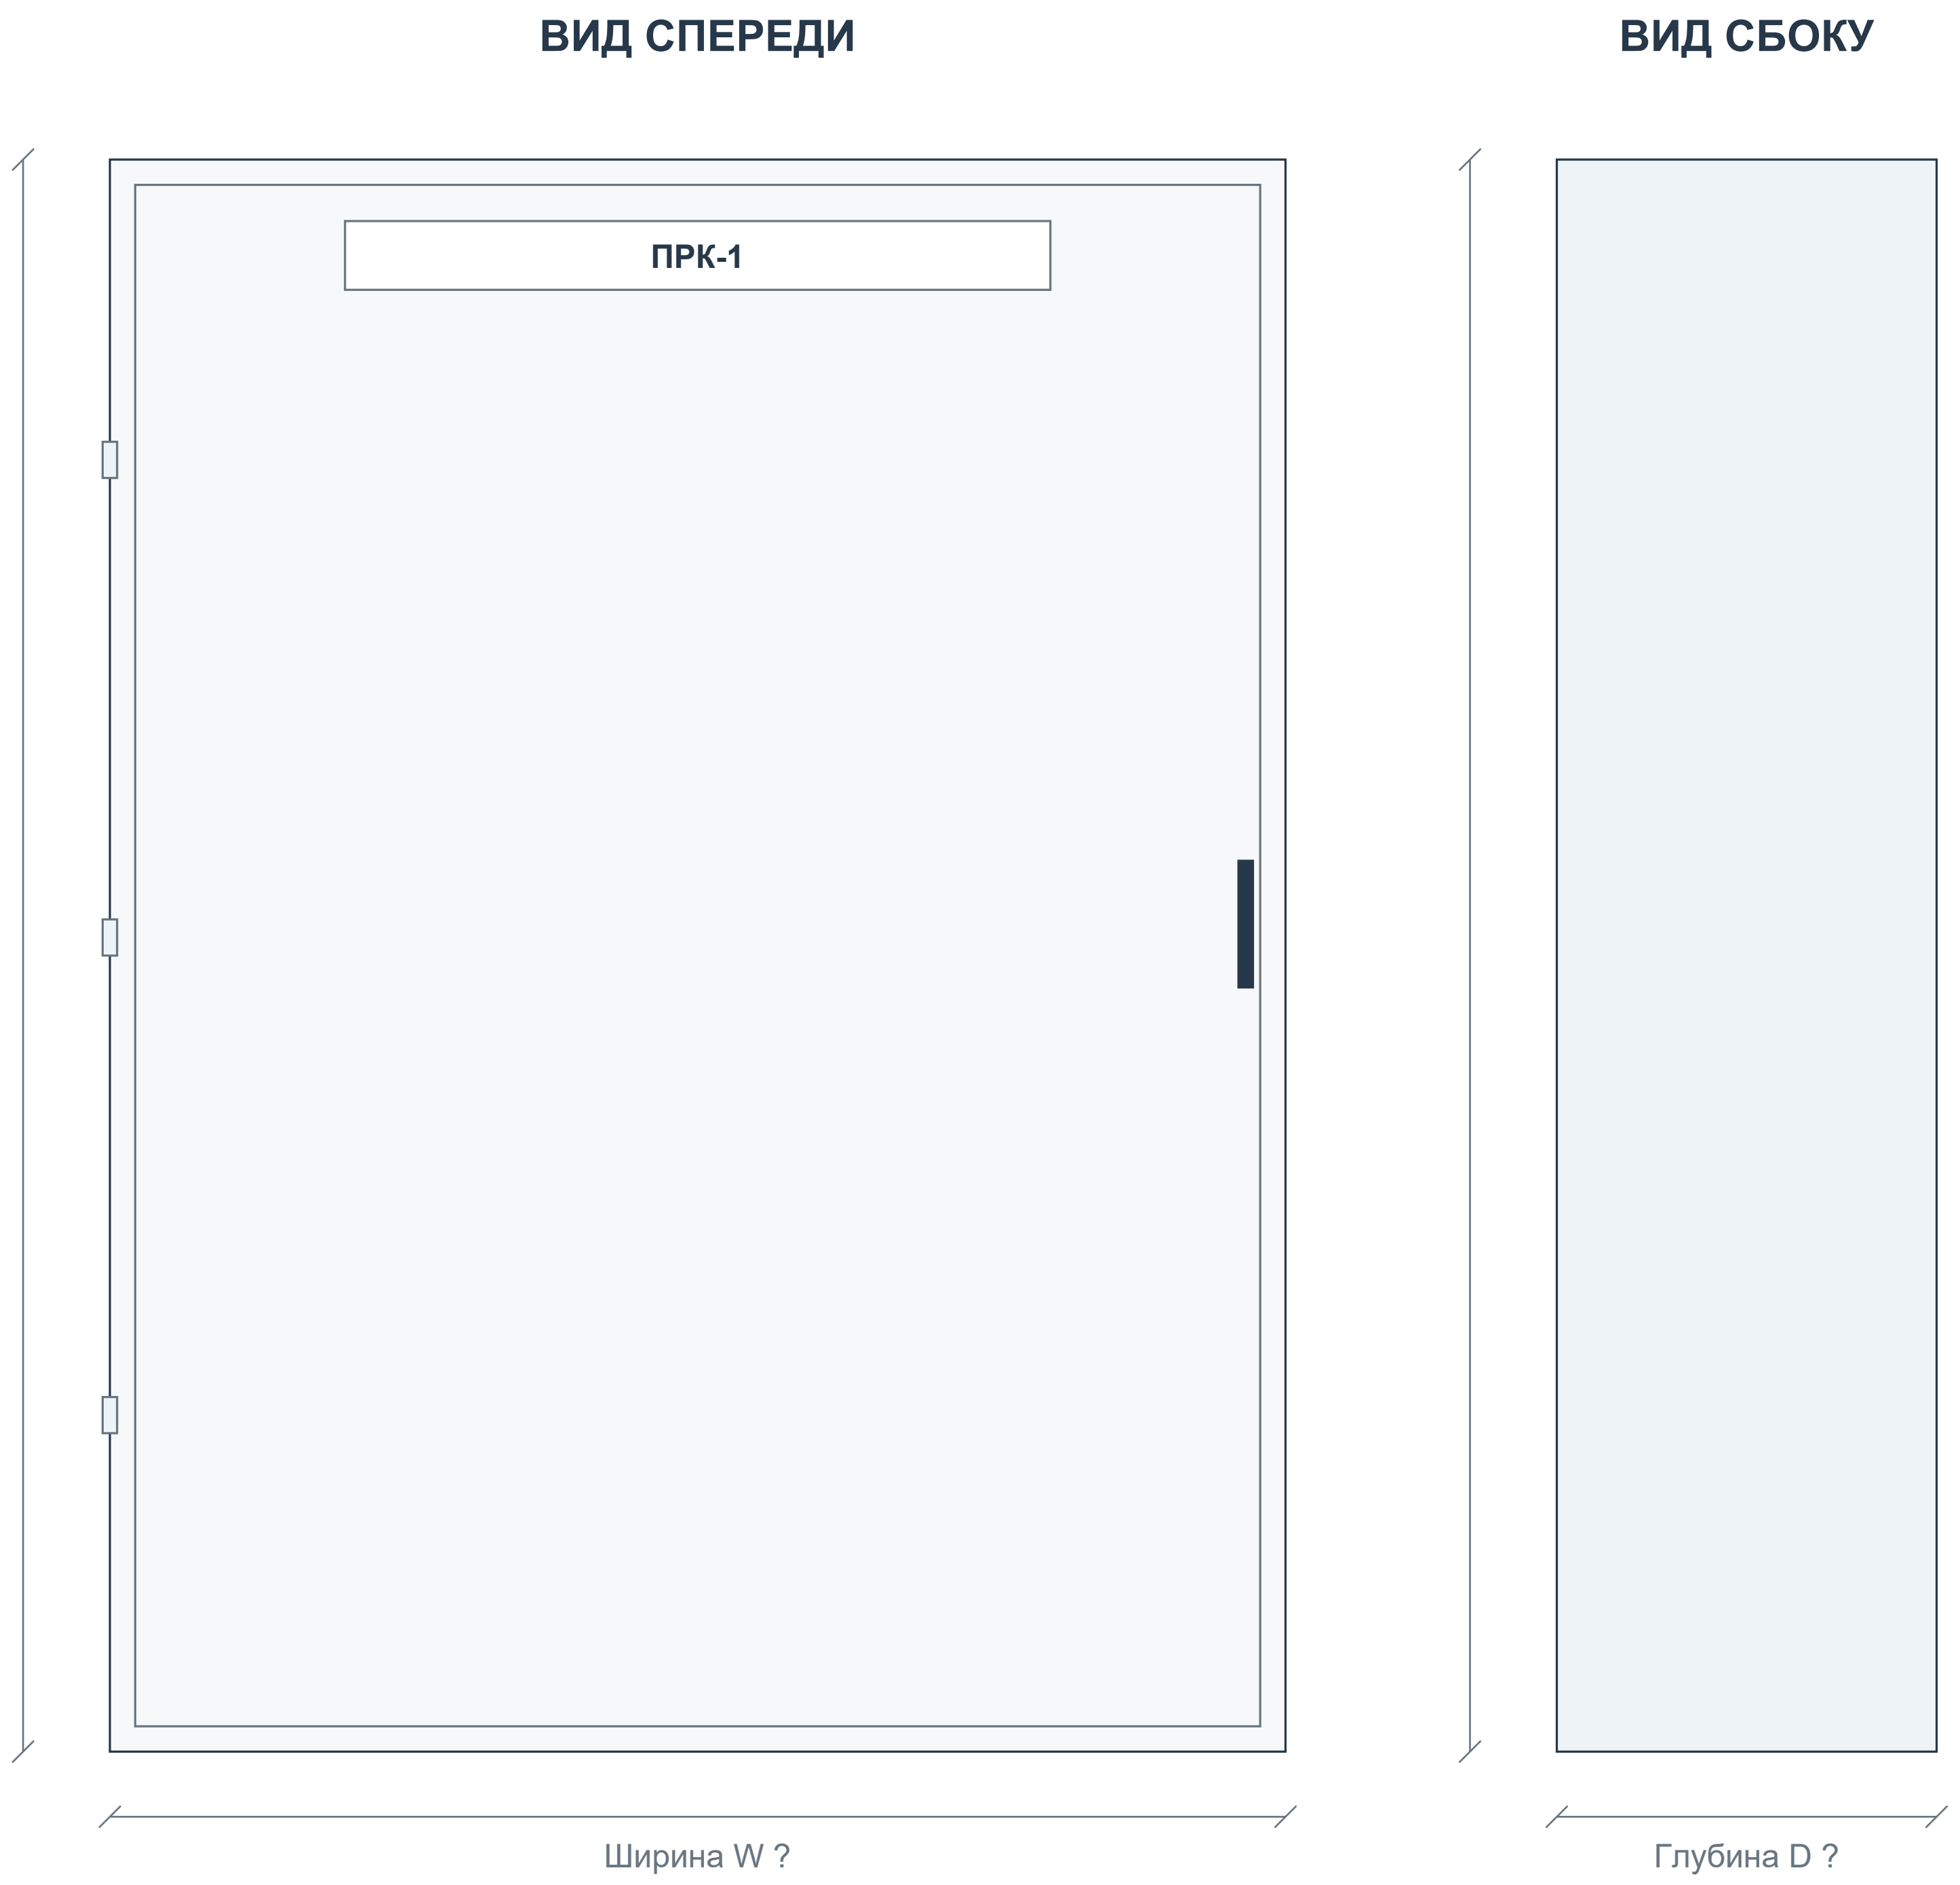

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

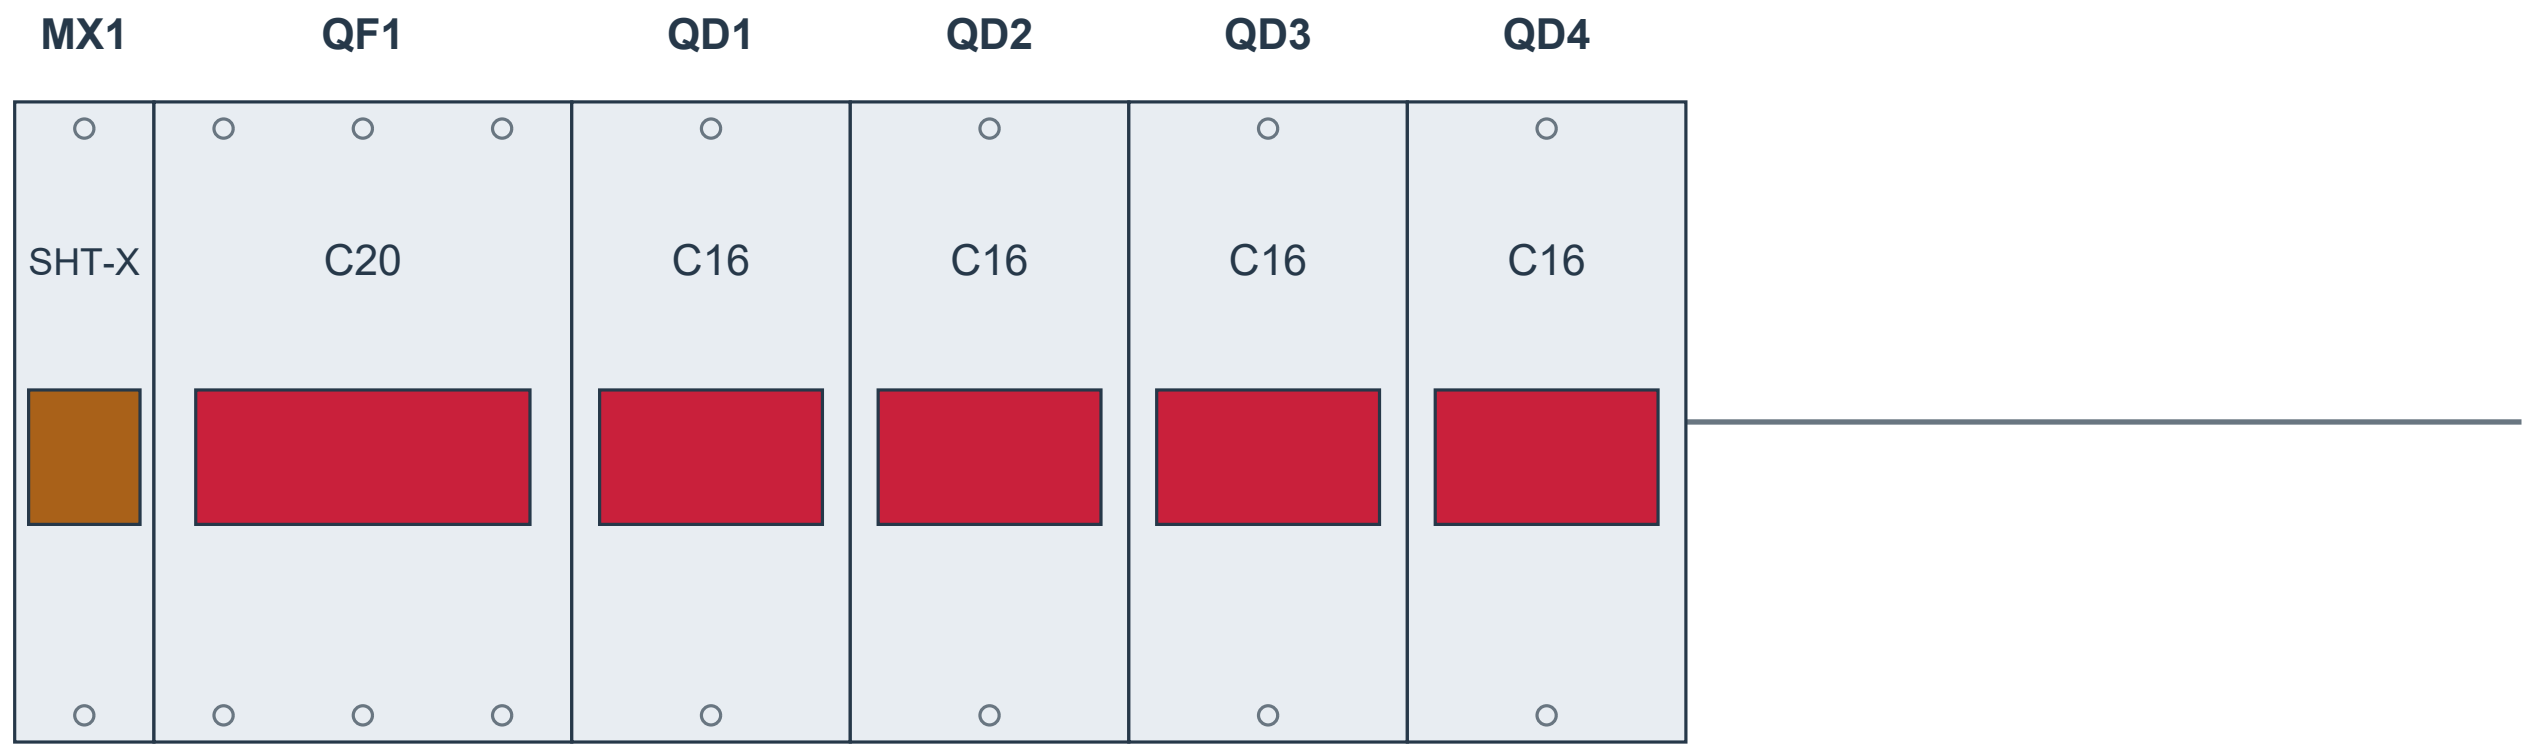

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

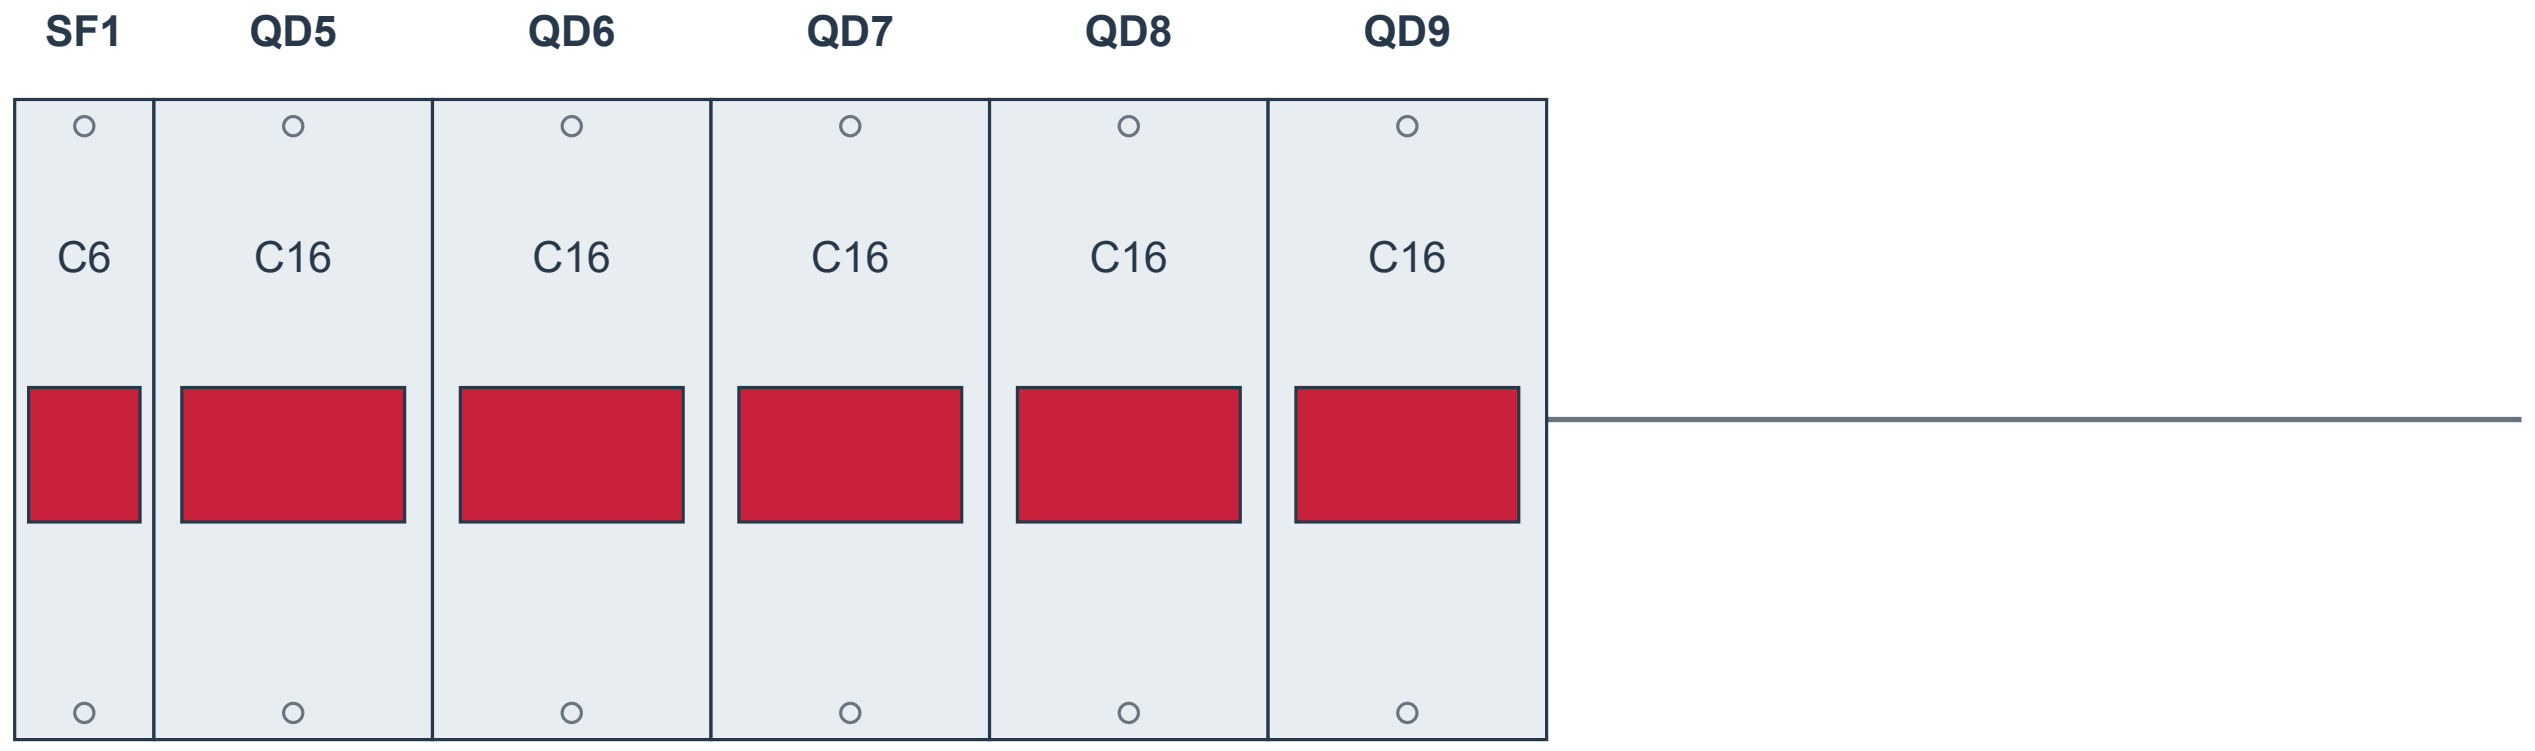

Сумма ширин: 198 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	119	1	0	?	18 B
QF1	NXB-63S	120	1	18	?	54 B
SF1	NXB-63S	121	2	0	?	18 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	122	1	72...180	?	36 B
QD5 - QD9	NXBLE-63YH	123	2	18...162	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Актуальная спецификация

ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 140 | ЭОМ, PDF стр. 12

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
141	713-09054	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
142	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
143	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
144	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 12

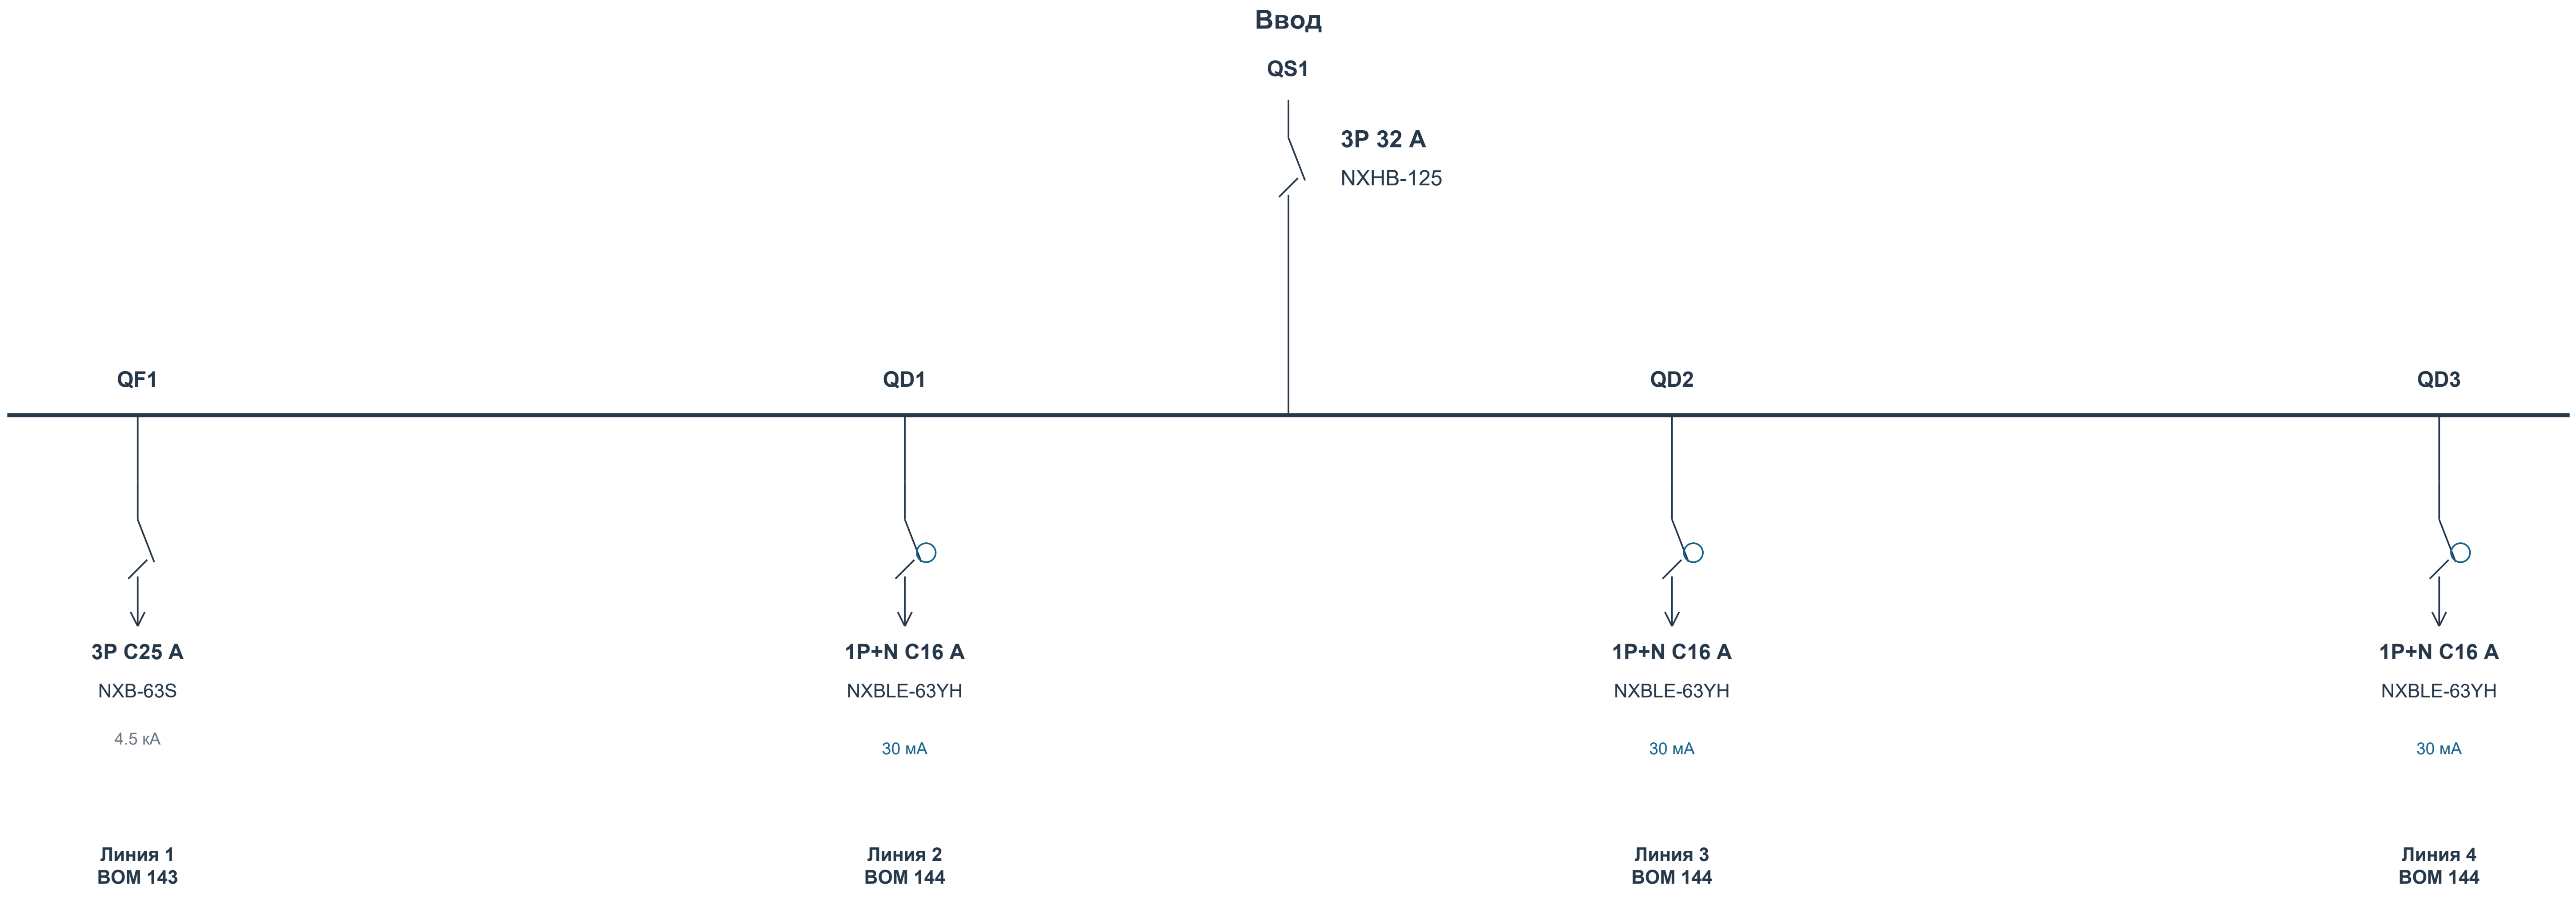
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QD1
QD2
QD3
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 143
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 144
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 144
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 144

Данные исходного проекта: Ру 11.7 кВт | Рр 10,3 кВт | Iр 16,4 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

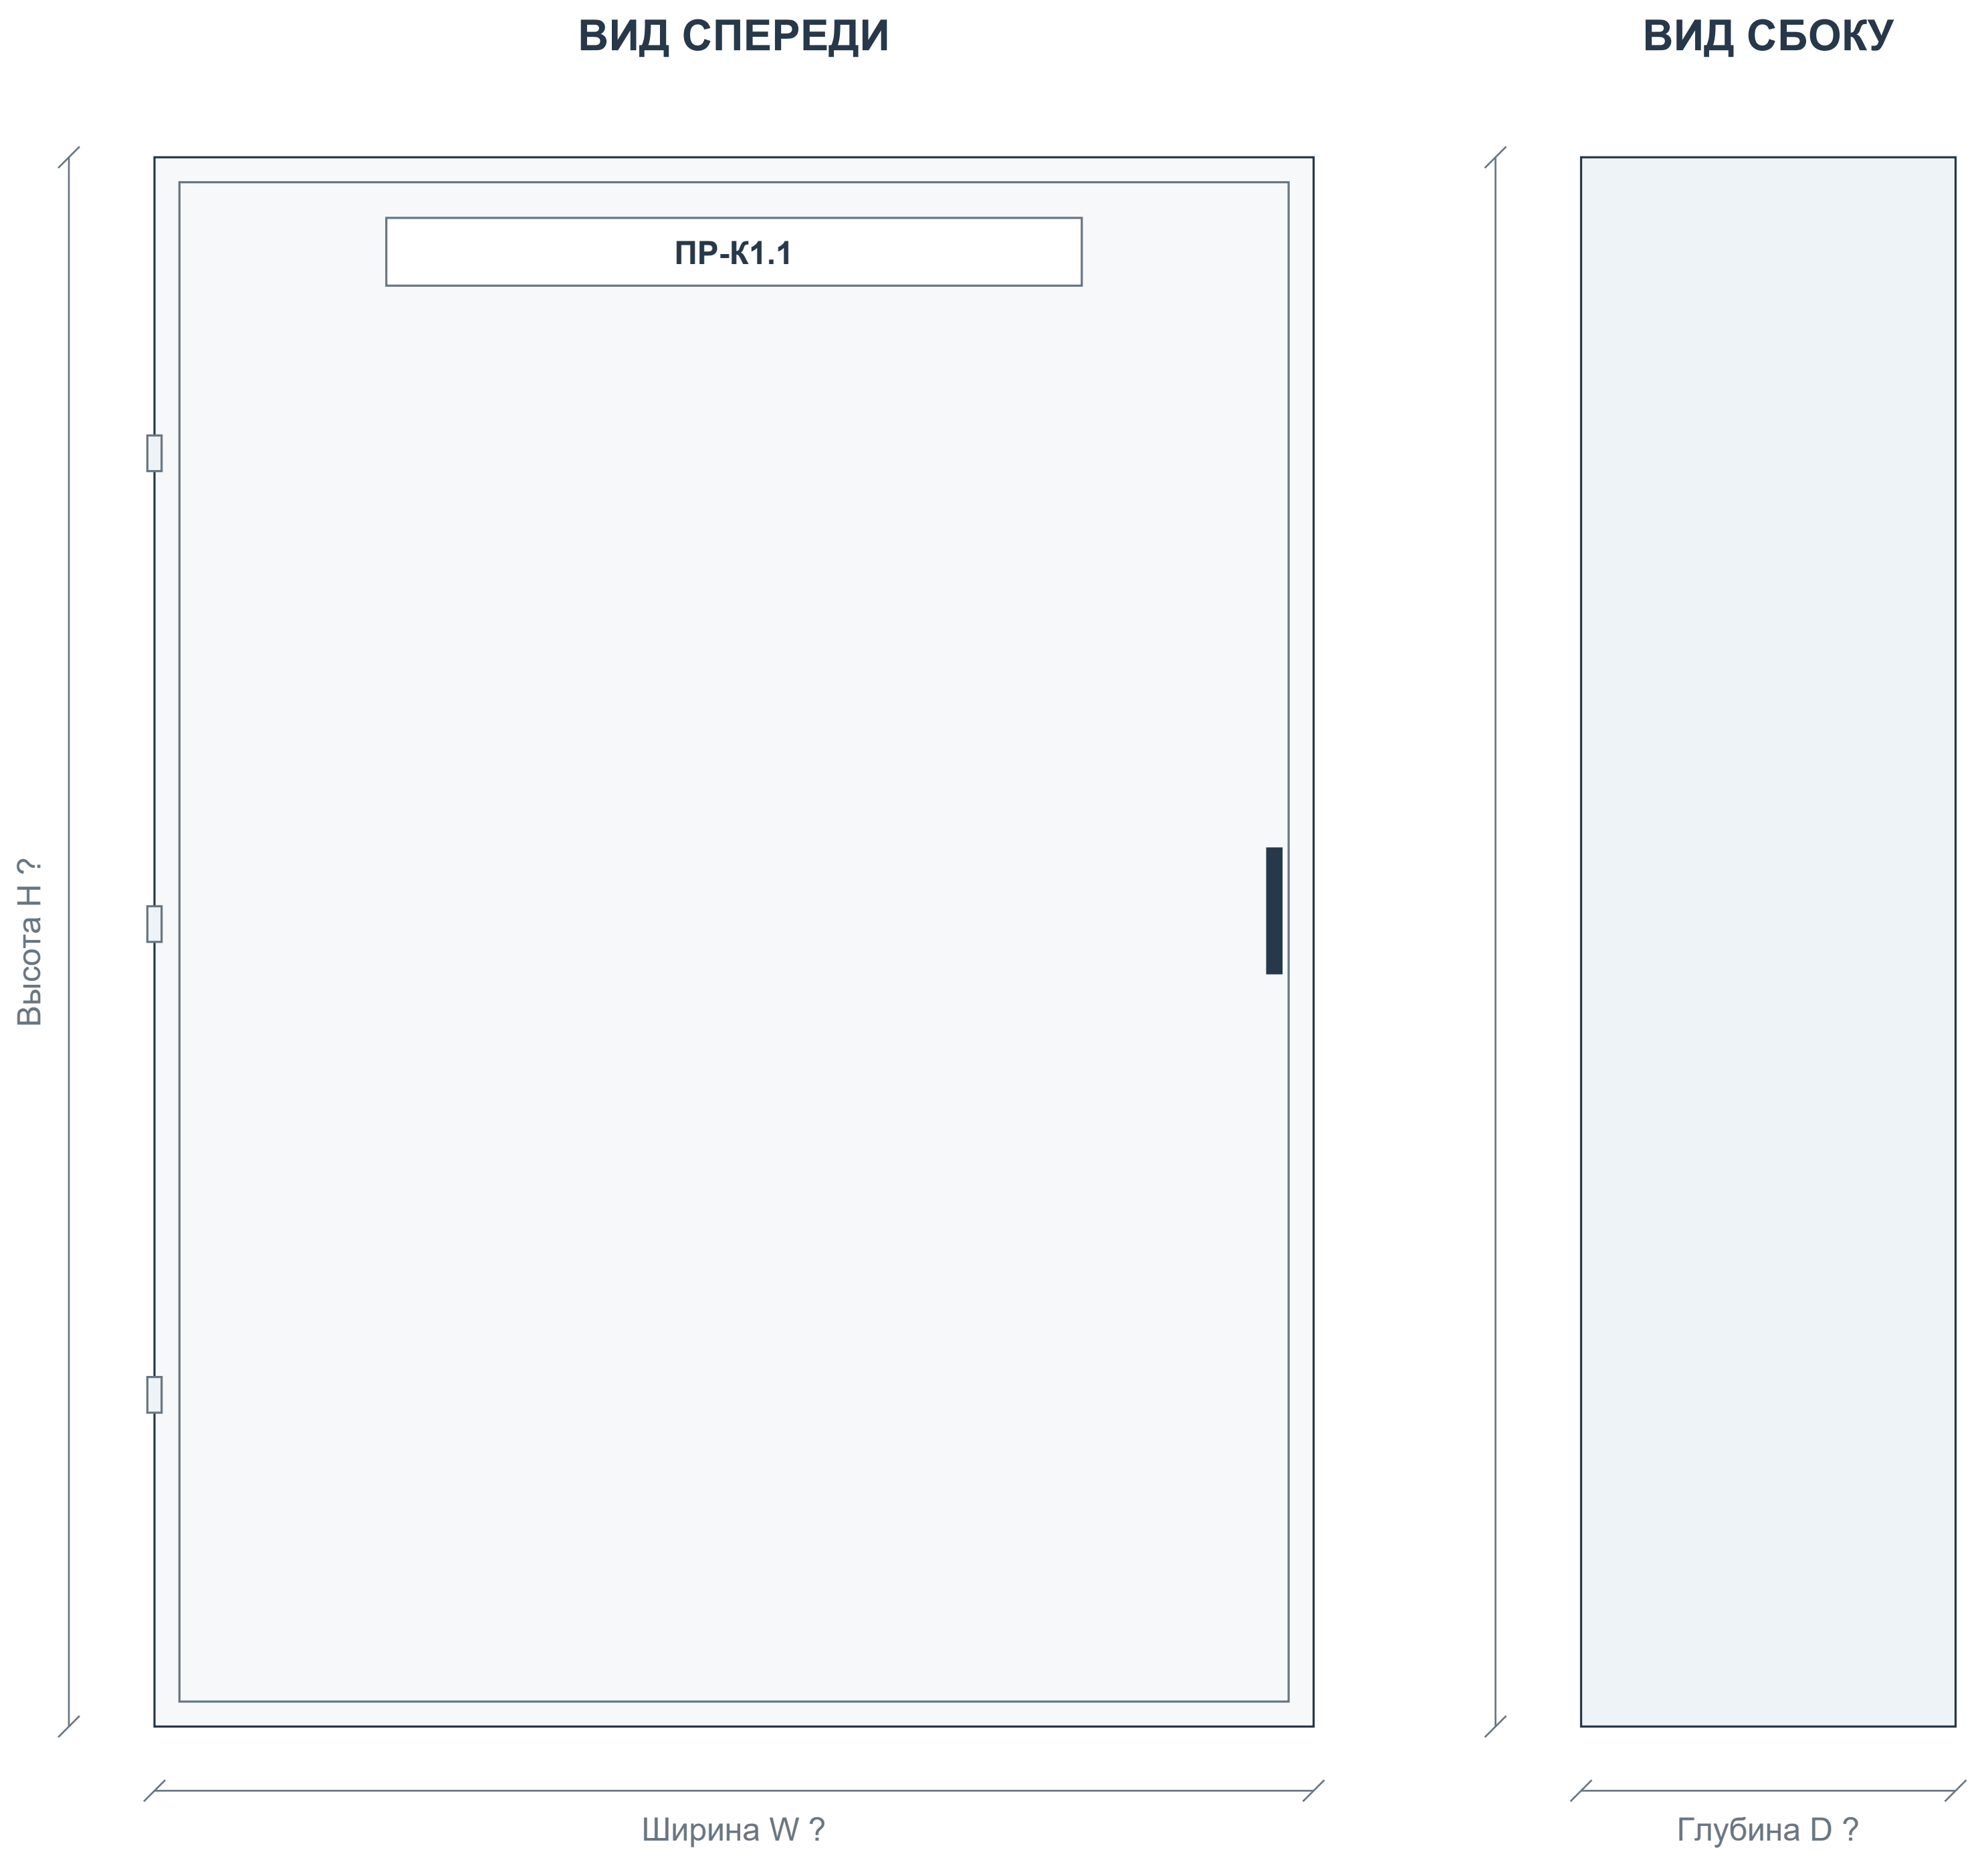

Корпус: Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные ВОМ. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

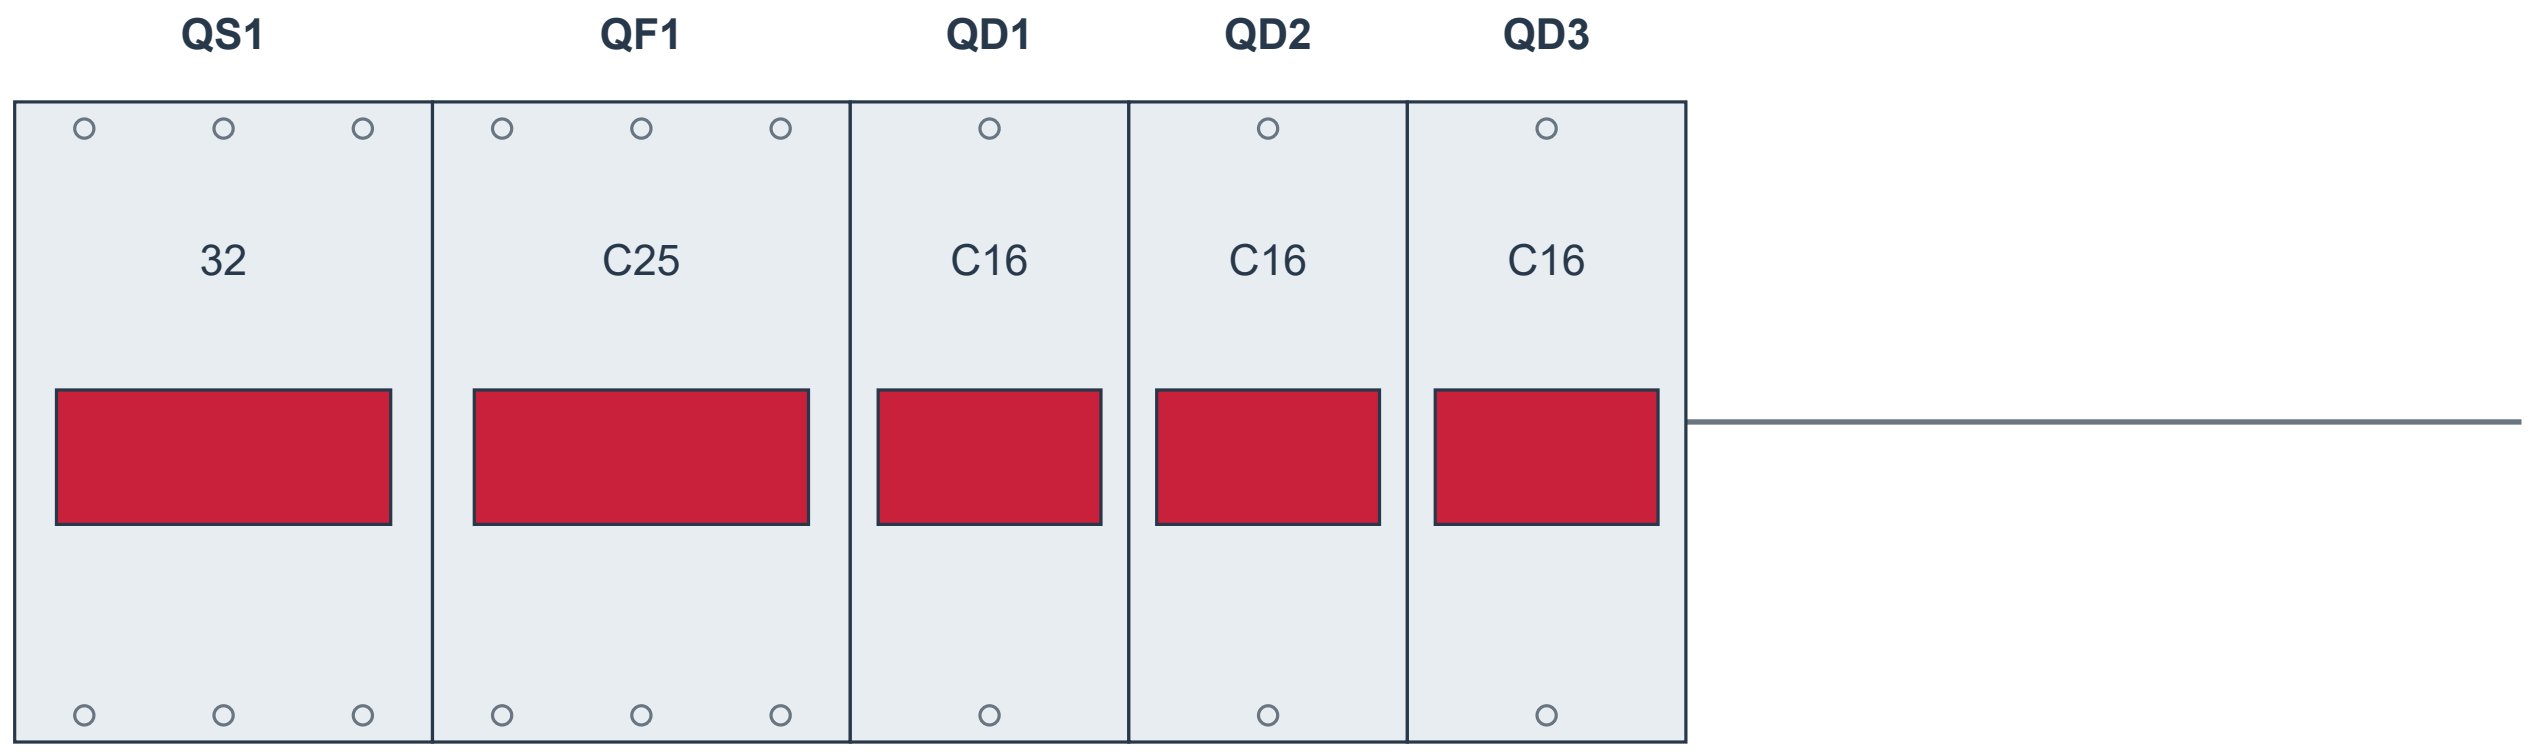

Сумма ширин: 216 мм В

Аппарат	Модель	ВОМ	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	142	1	0	?	54 В
QF1	NXB-63S	143	1	54	?	54 В
QD1 - QD3	NXBLE-63YH	144	1	108...180	?	36 В

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию ВОМ: 18 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.2 | Актуальная спецификация

ПР-Тх1.2 (NXW4-48 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 158 | ЭОМ, PDF стр. 13

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
159	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
160	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
161	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
162	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	9	9	chint	Отход.
163	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
164	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 13

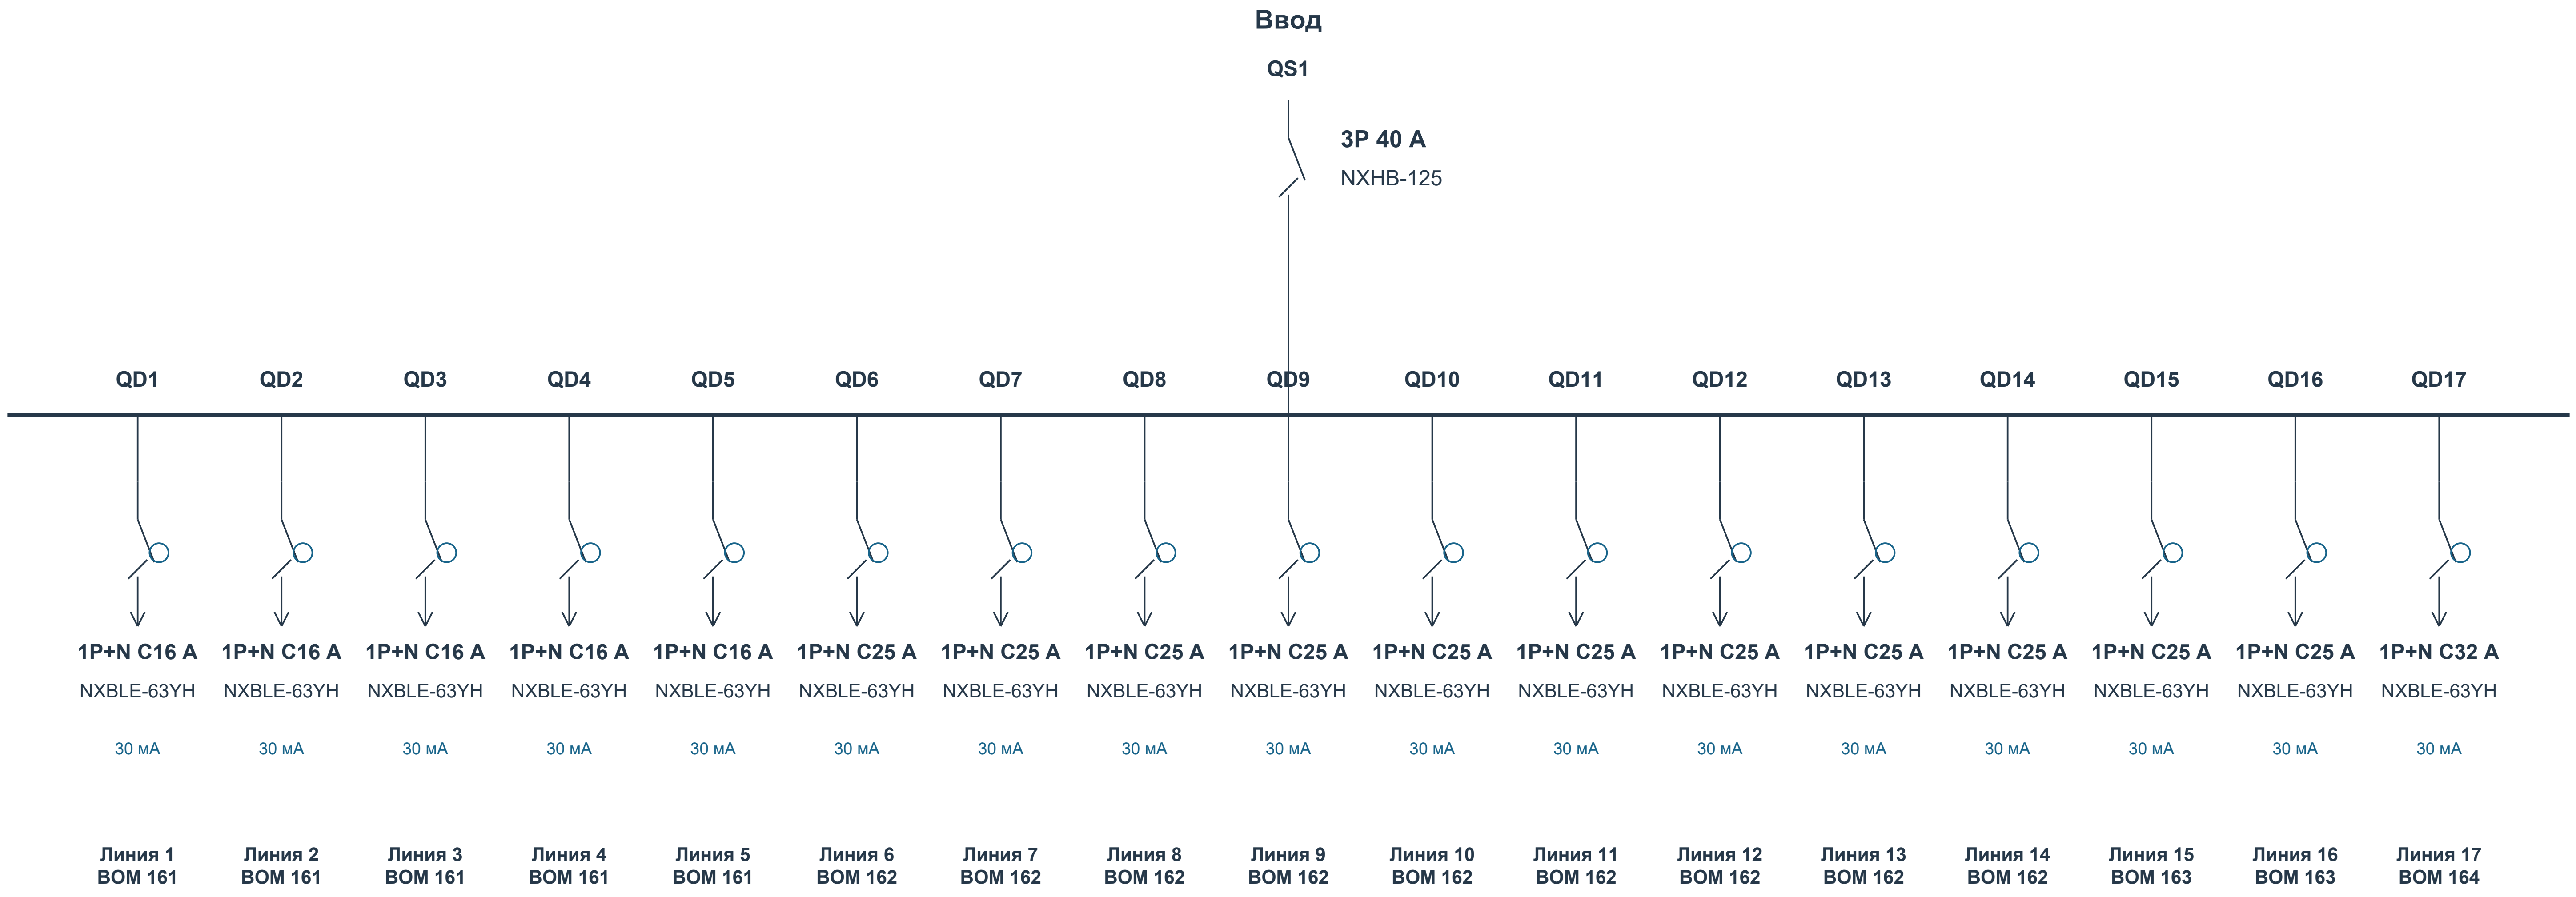
Ввод
QS1
3P 40 A
NXHB-125
QD1
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 161
QD2
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 161
QD3
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 161
QD4
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 161
QD5
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 161
QD6
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 162
QD7
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 162
QD8
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 162
QD9
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 9
BOM 162
QD10
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 10
BOM 162
QD11
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 11
BOM 162
QD12
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 12
BOM 162
QD13
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 13
BOM 162
QD14
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 14
BOM 162
QD15
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 15
BOM 163
QD16
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 16
BOM 163
QD17
1P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 17
BOM 164

Данные исходного проекта: Ру 63.3 кВт | Рр 10,1 кВт | Ір 16,2 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

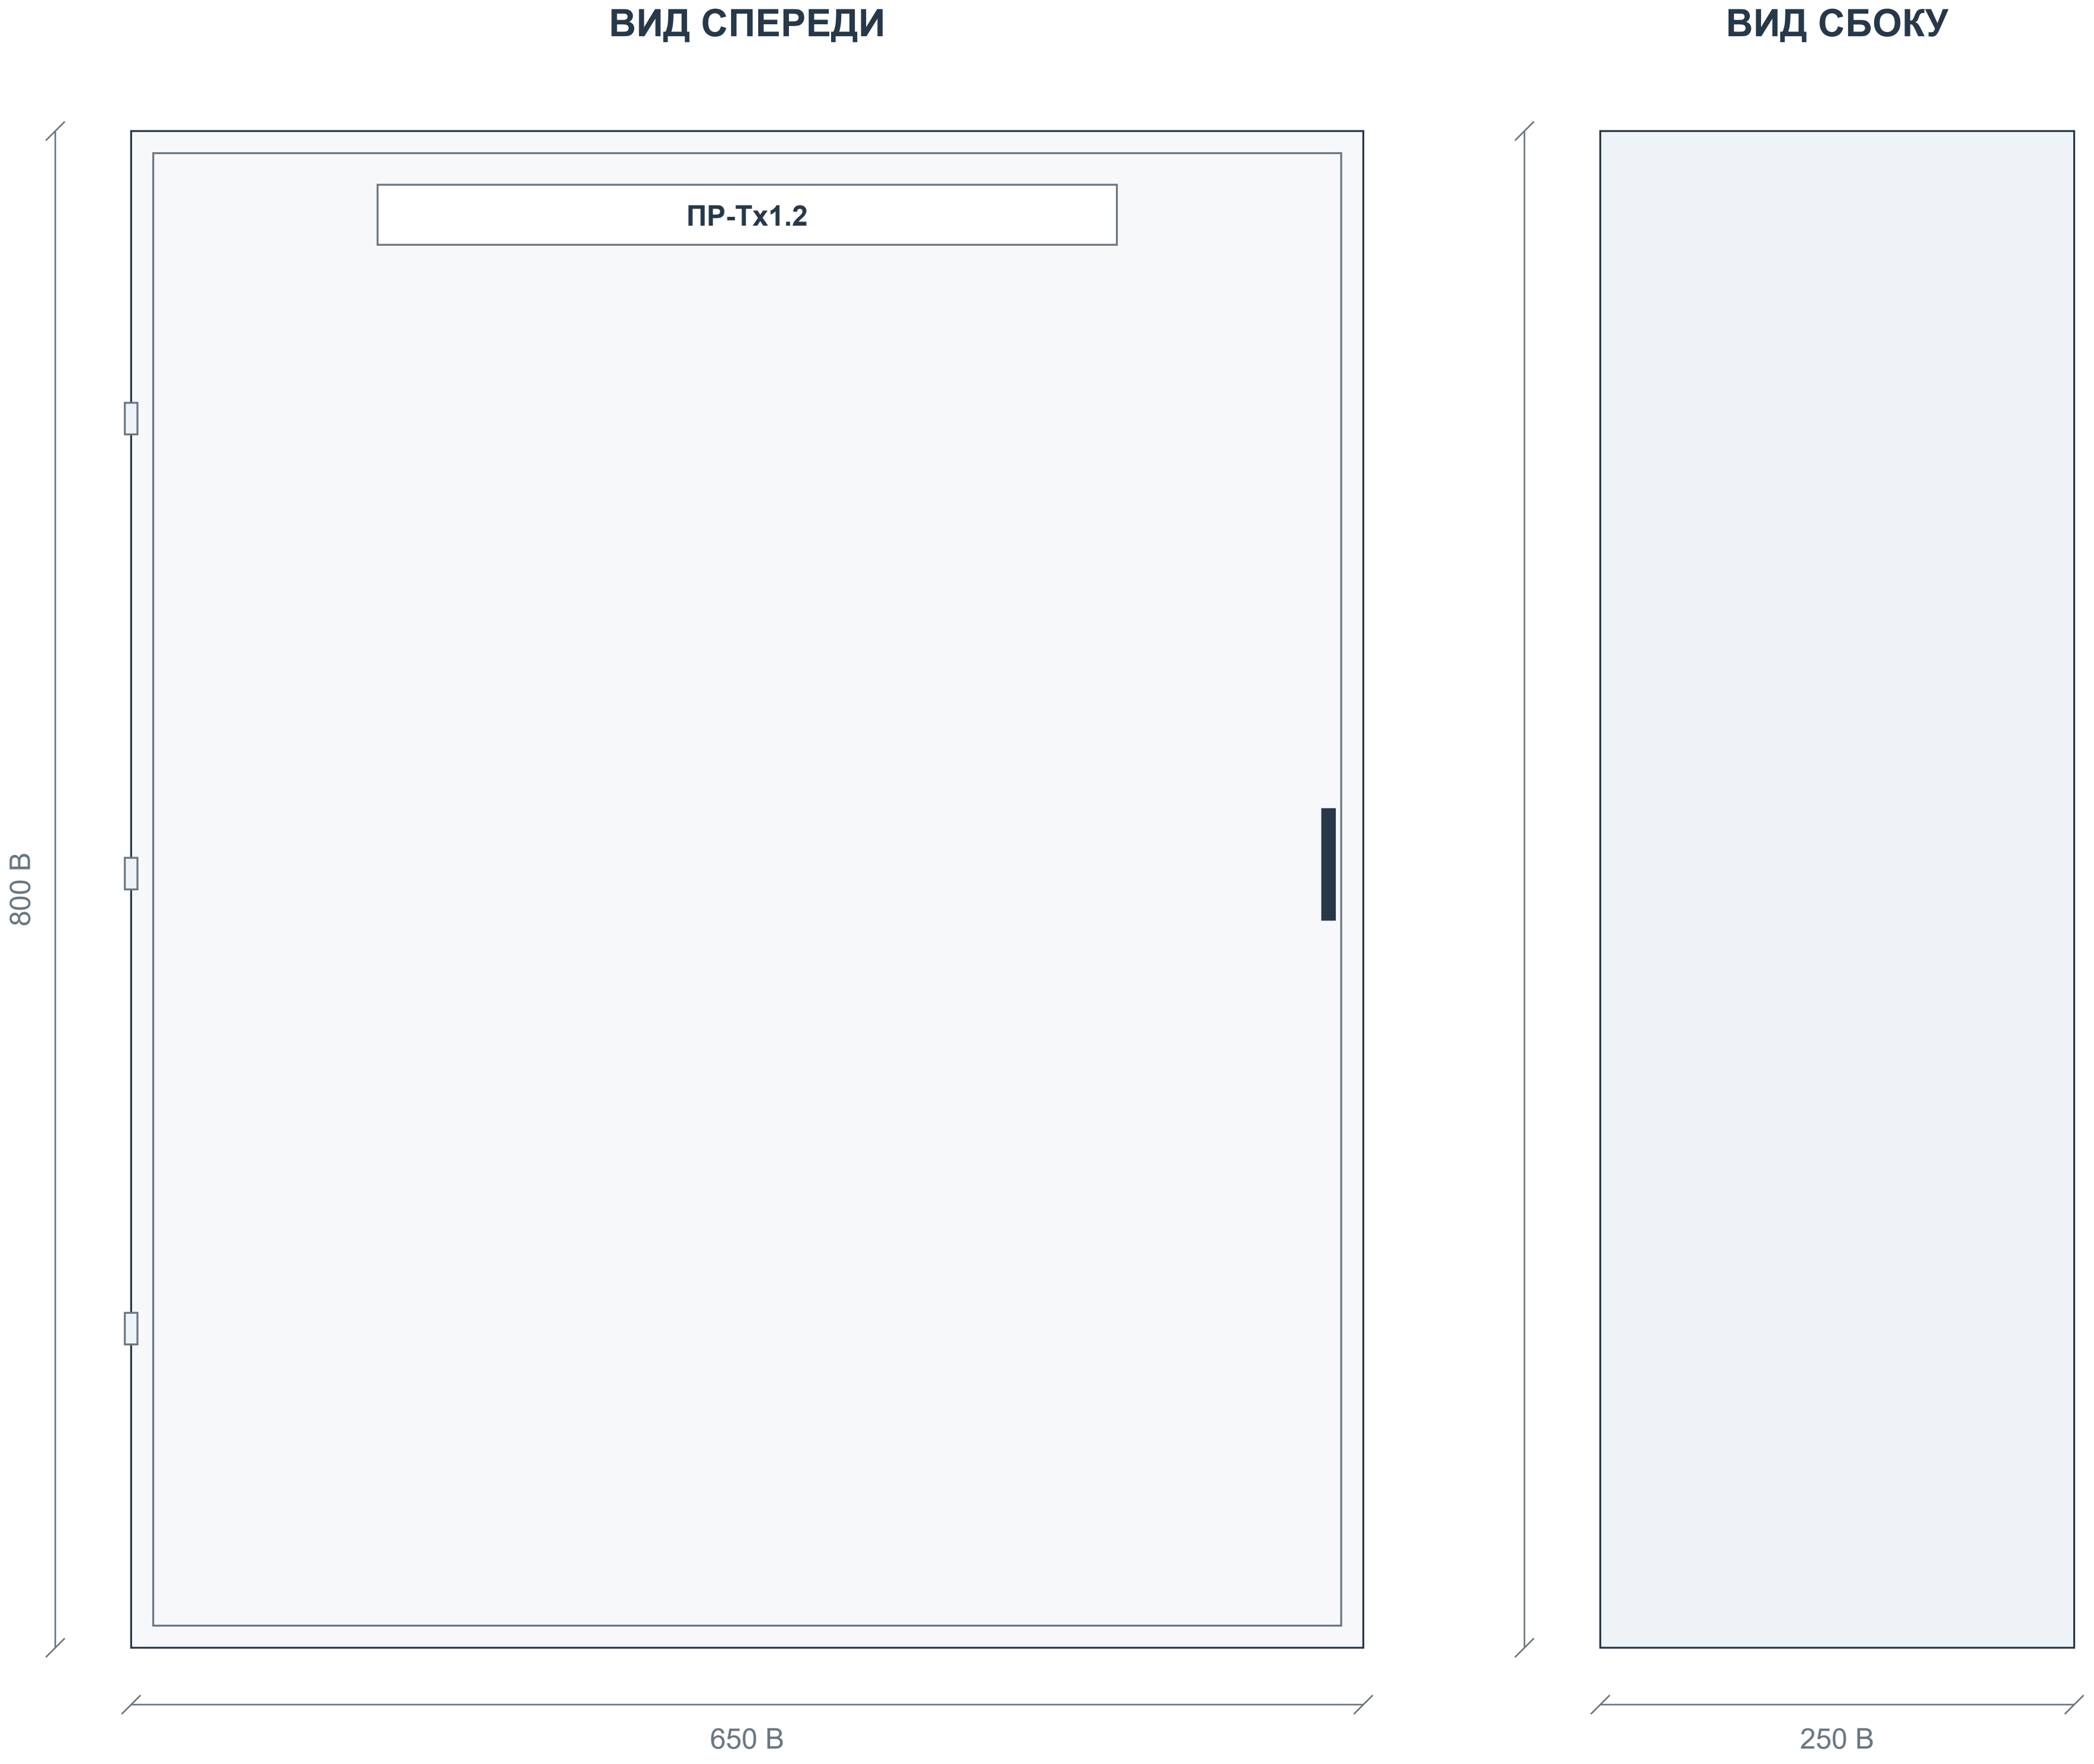

Корпус: Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.2 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

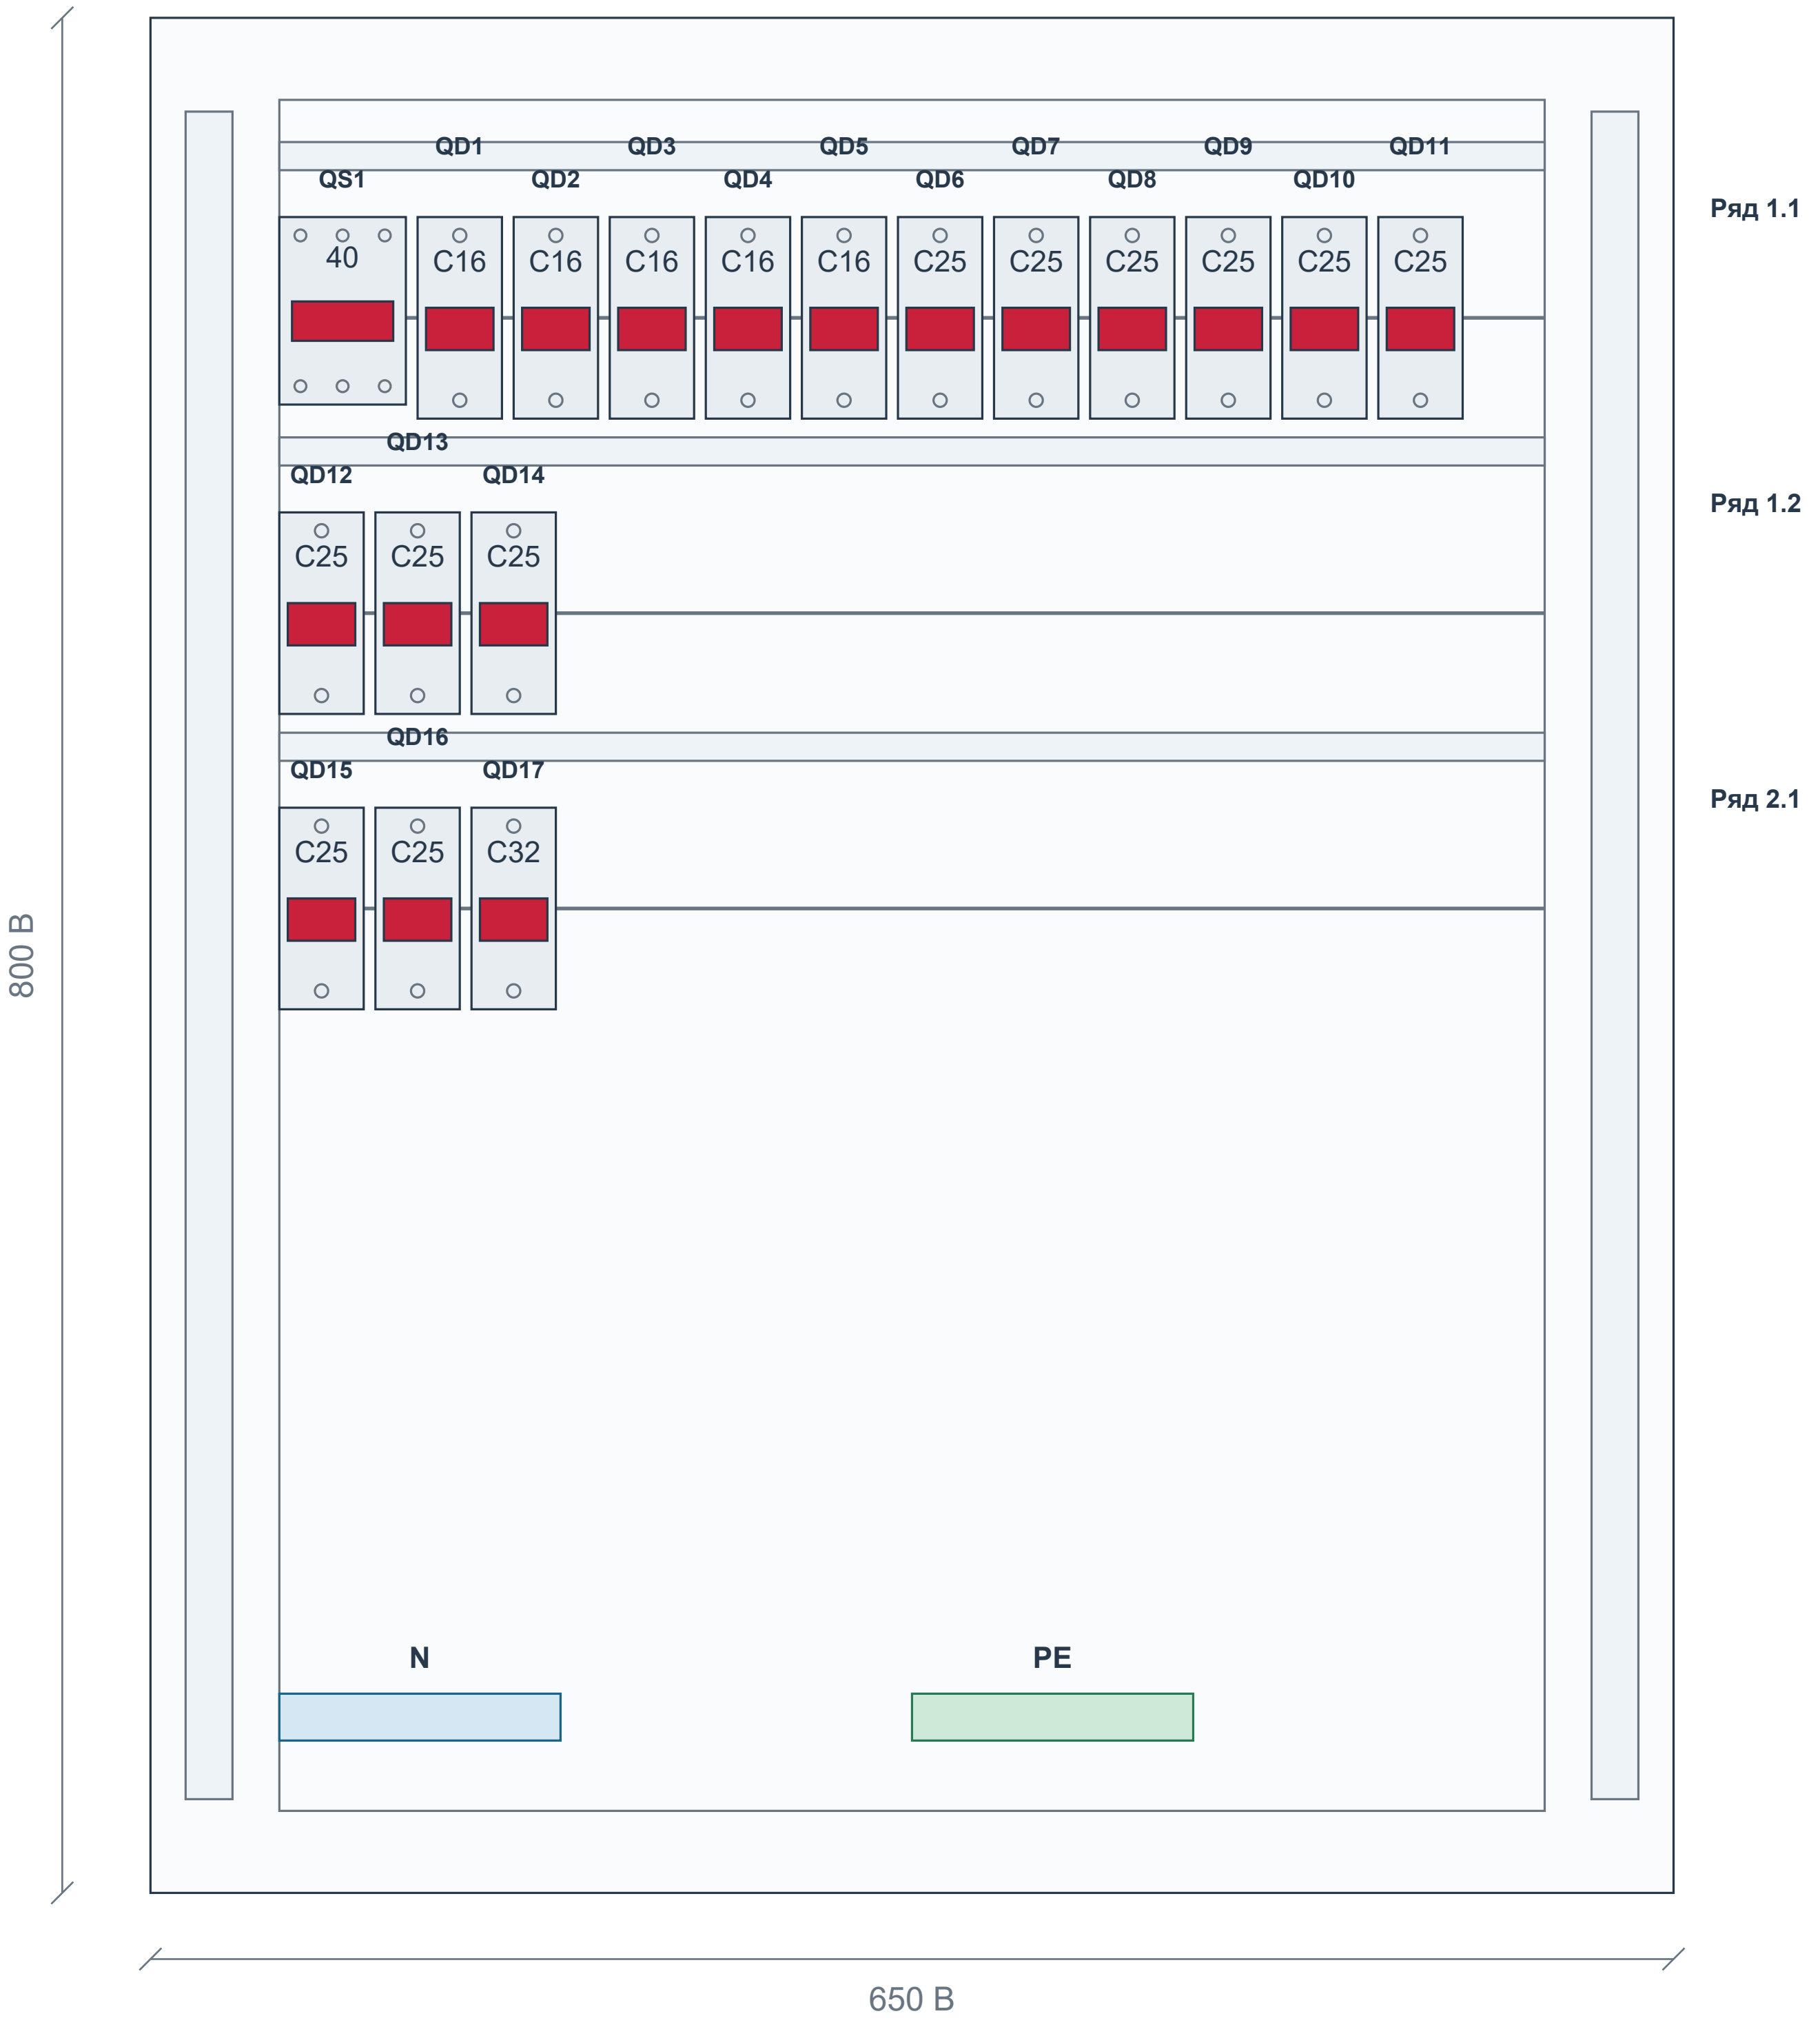
QD1
QD3
QD5
QD7
QD9
QD11
QS1
QD2
QD4
QD6
QD8
QD10
40
C16
C16
C16
C16
C16
C25
C25
C25
C25
C25
C25
Ряд 1.1
QD13
QD12
QD14
C25
C25
C25
Ряд 1.2
QD16
QD15
QD17
C25
C25
C32
Ряд 2.1
N
PE
800 B
650 B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	160	1.1	55	85	54 × 80
QD1 - QD5	NXBLE-63YH	161	1.1	114...278	85	36 × 86
QD6 - QD14	NXBLE-63YH	162	1.1/1.2	319...524 / 55...137	85/211	36 × 86
QD15 - QD16	NXBLE-63YH	163	2.1	55...96	337	36 × 86
QD17	NXBLE-63YH	164	2.1	137	337	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Ряды с недостаточной шириной разделены на подряды. Новые расстояния и способ крепления согласовать.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Актуальная спецификация

ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 181 | ЭОМ, PDF стр. 14

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
182	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
183	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
184	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 14

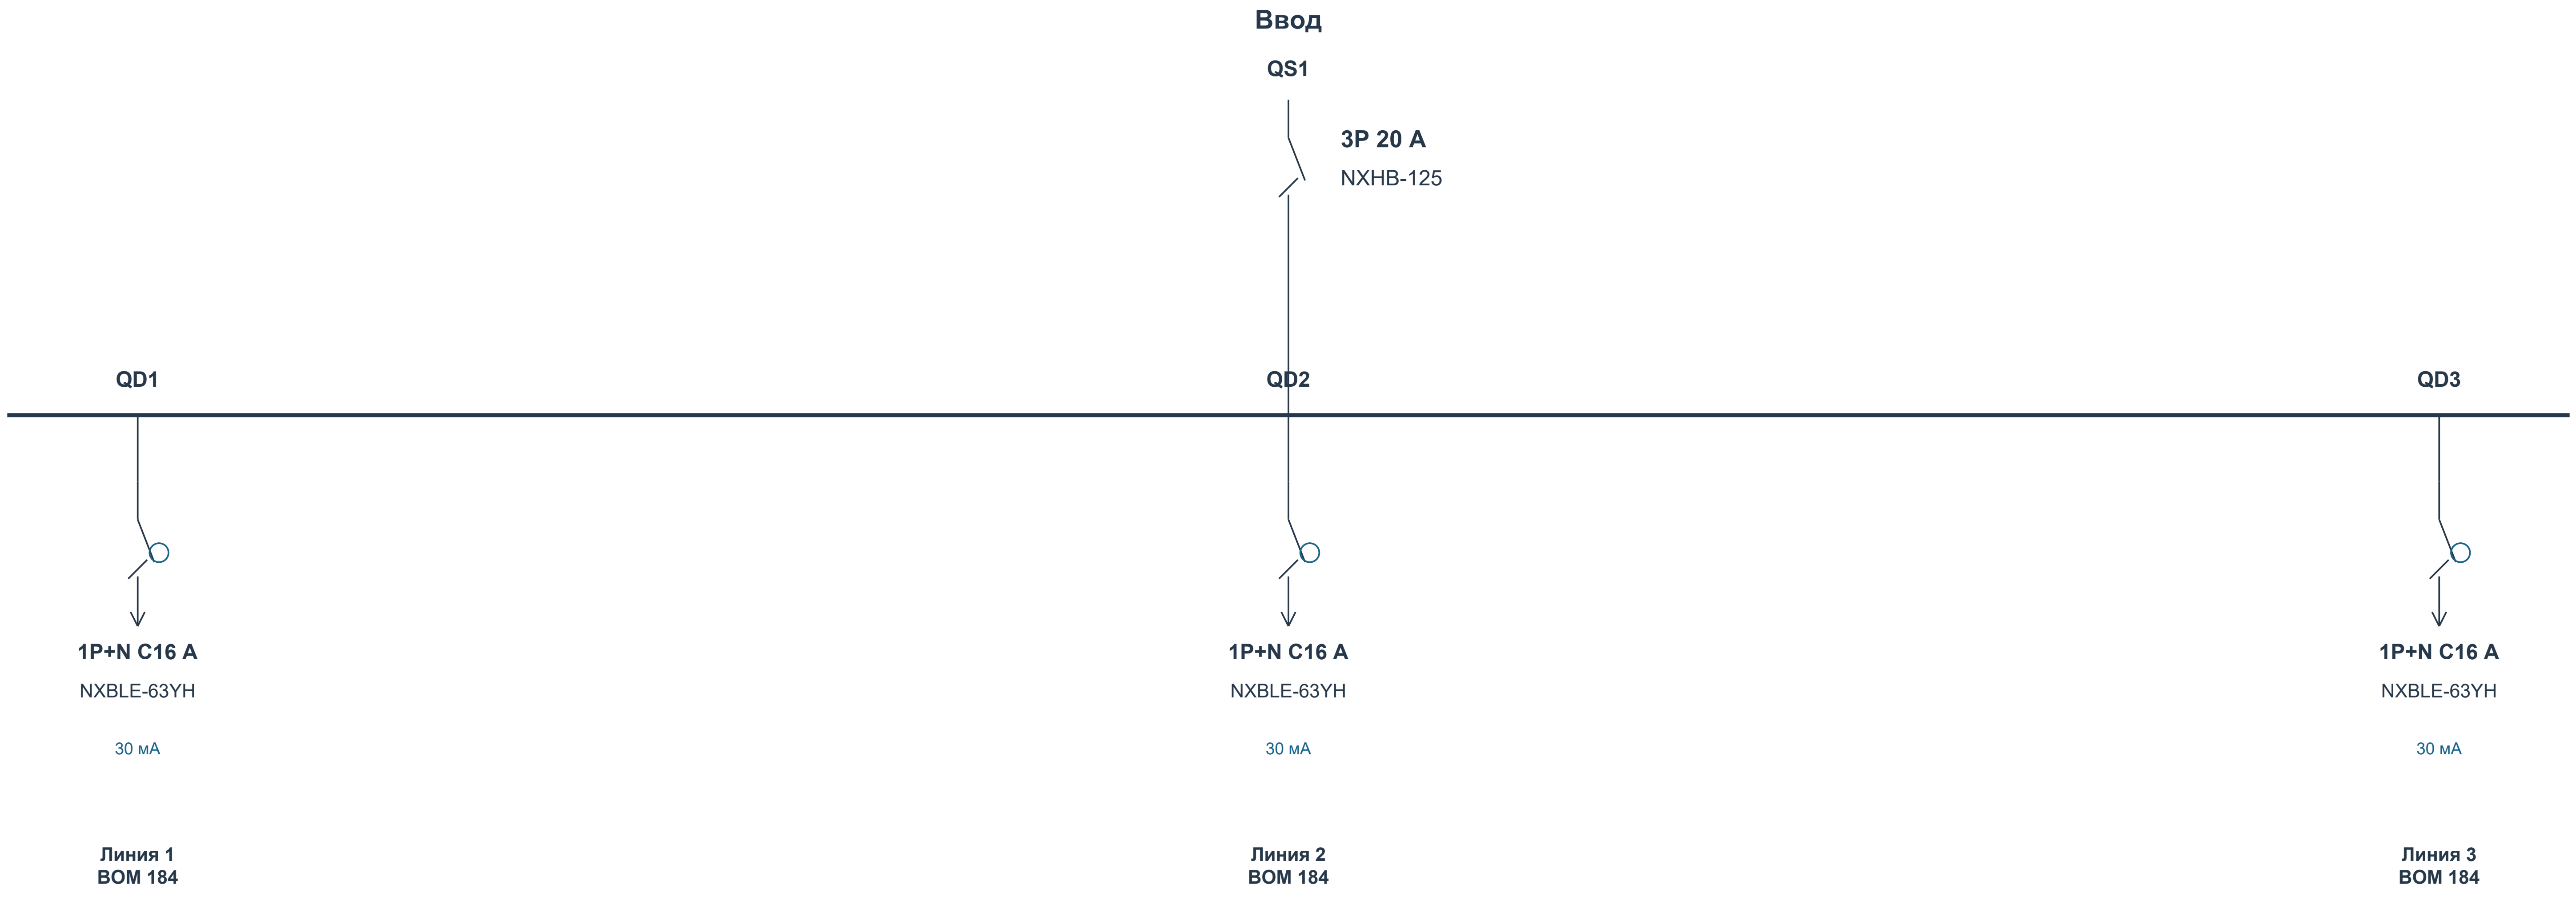
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QD1
QD2
QD3
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 184
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 184
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 184

Данные исходного проекта: Ру 3.4 кВт | Рр 1,4 кВт | Iр 2,2 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

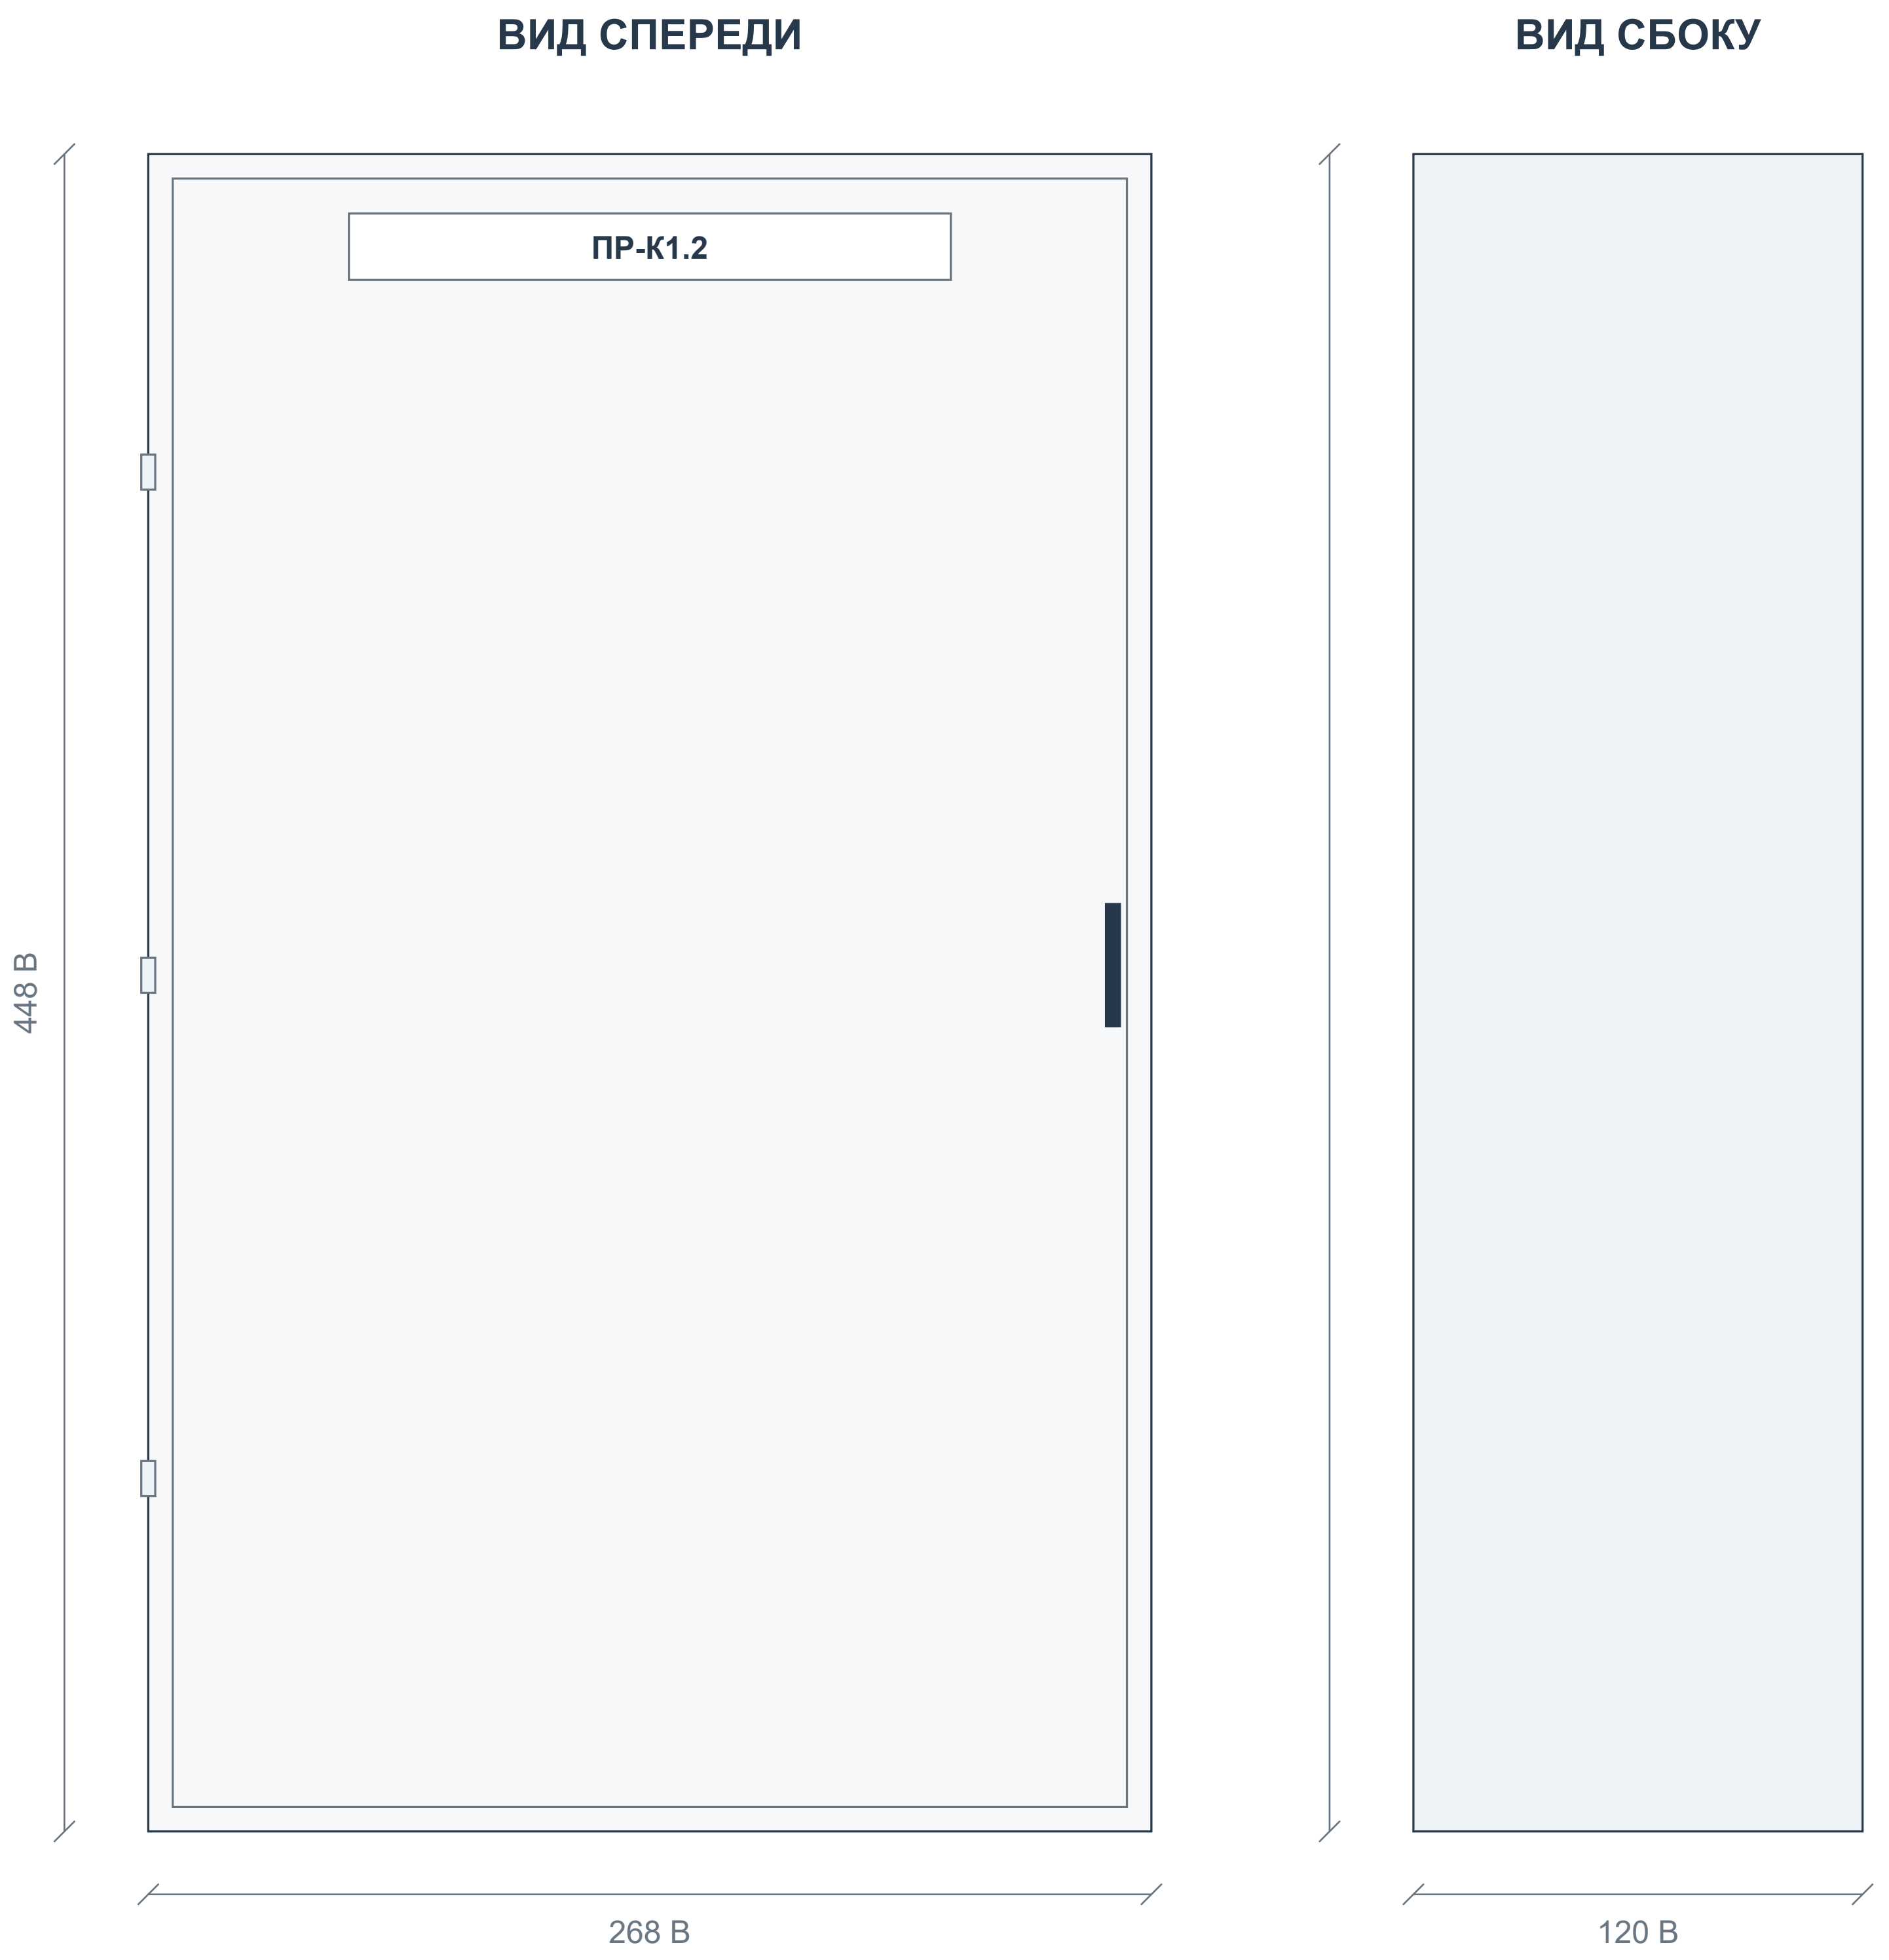

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

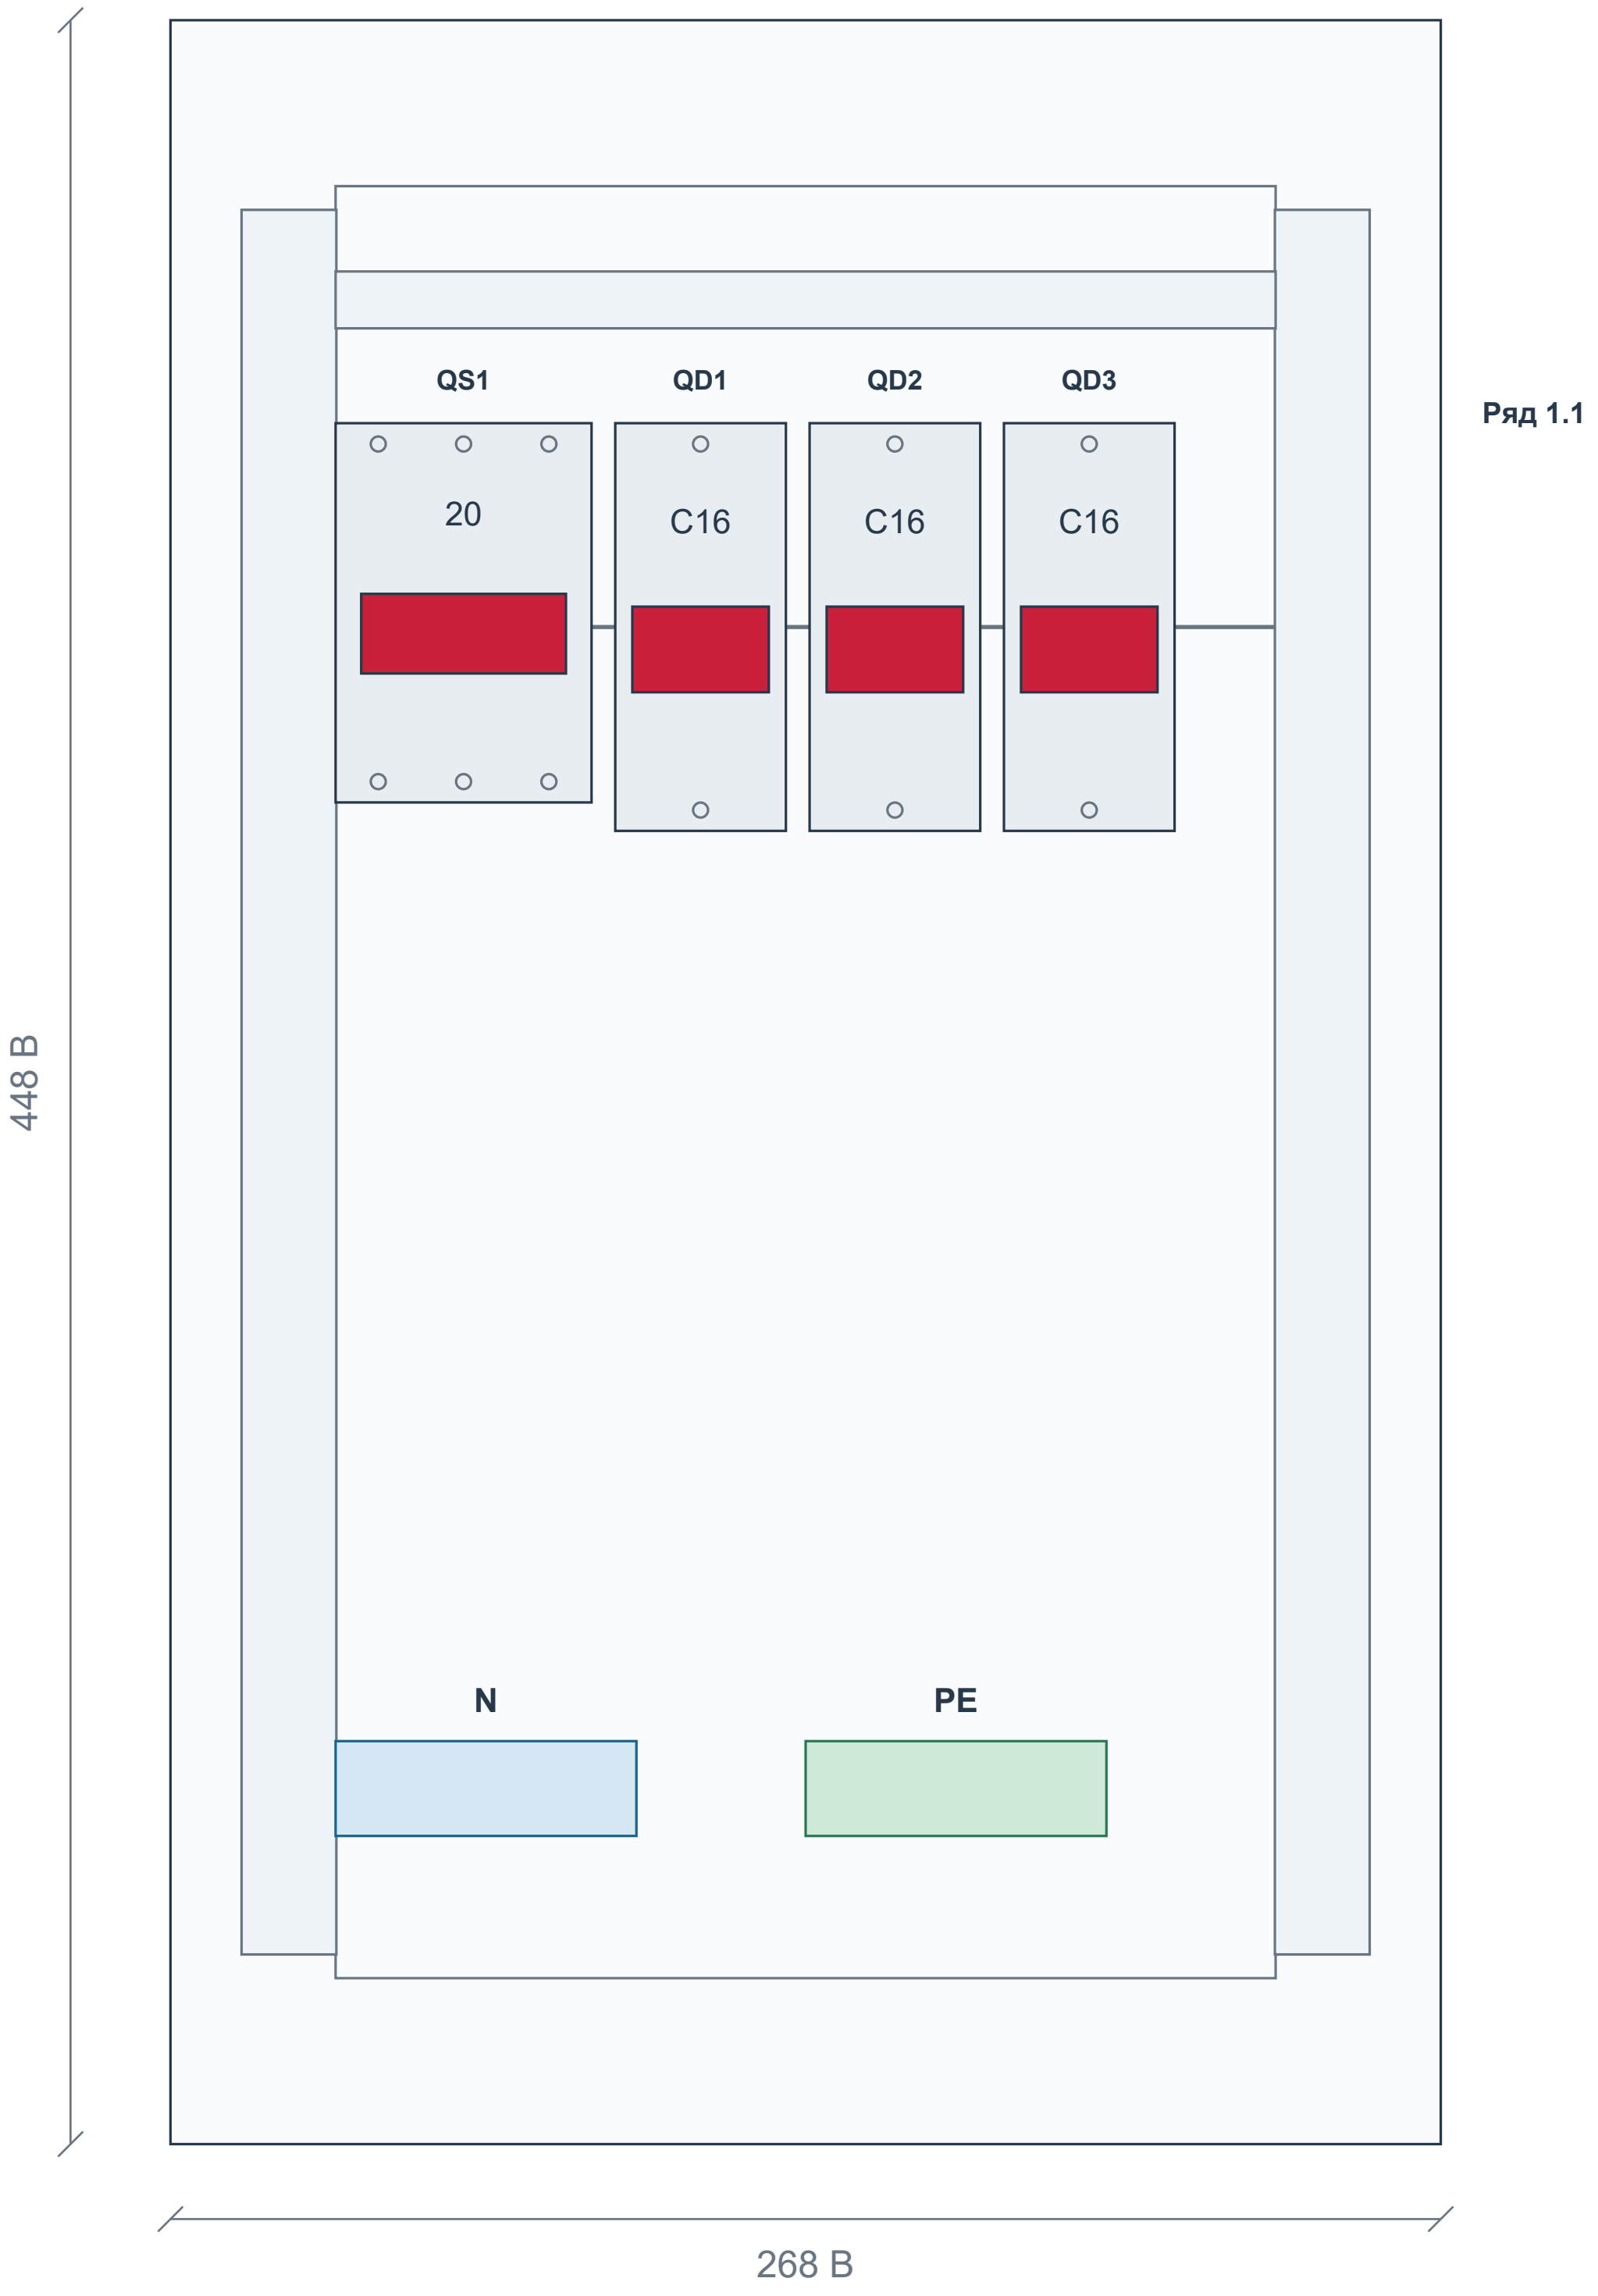

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	183	1.1	34.84	85	54 × 80
QD1 - QD3	NXBLE-63YH	184	1.1	93.84...175.84	85	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.3 | Актуальная спецификация

ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 198 | ЭОМ, PDF стр. 15

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
199	713-15060	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	шт	1	1	teksan f	Корпус
200	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
201	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
202	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
203	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	7	7	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 15

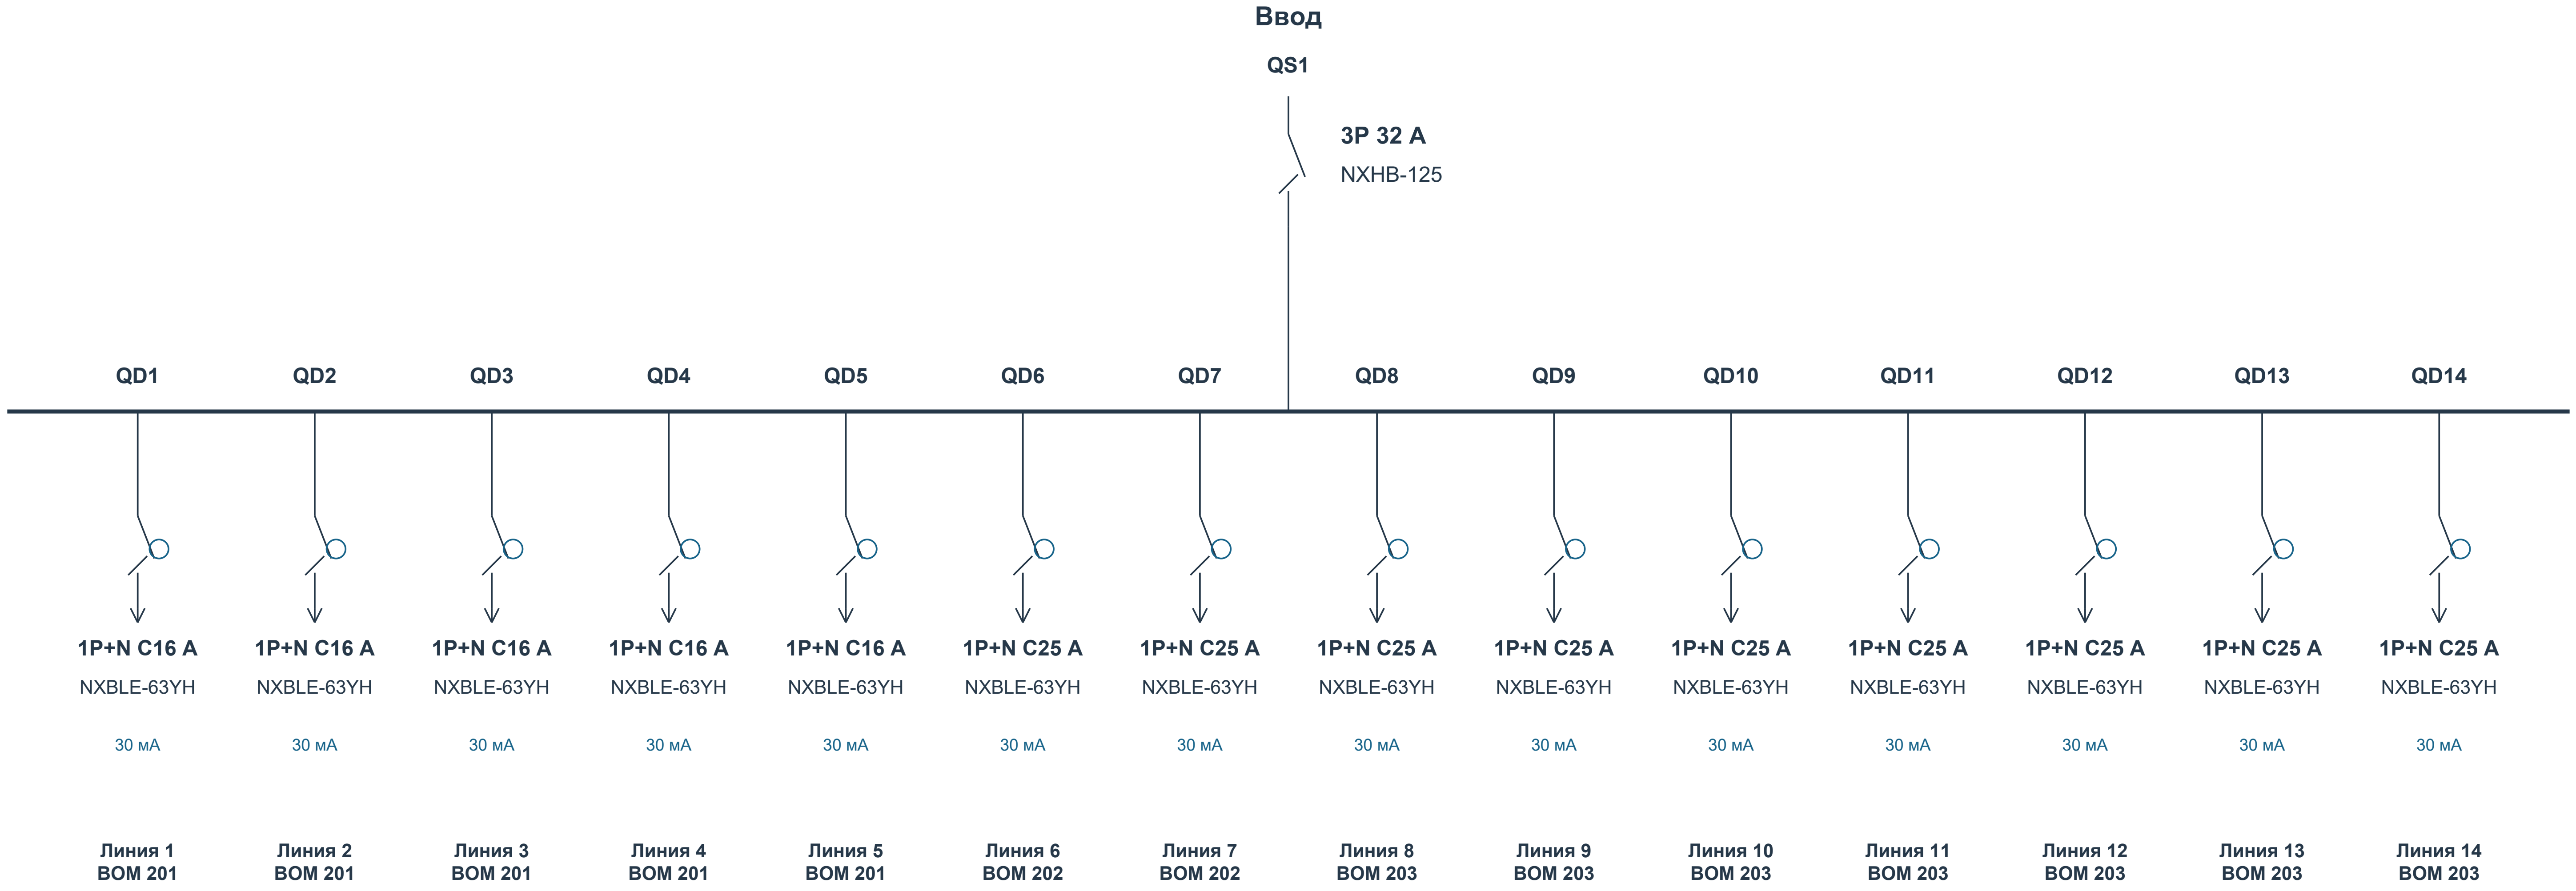
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QD1
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 201
QD2
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 201
QD3
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 201
QD4
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 201
QD5
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 201
QD6
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 202
QD7
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 202
QD8
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 203
QD9
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 9
BOM 203
QD10
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 10
BOM 203
QD11
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 11
BOM 203
QD12
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 12
BOM 203
QD13
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 13
BOM 203
QD14
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 14
BOM 203

Данные исходного проекта: Ру 39.7 кВт | Рр 5,2 кВт | Ip 8,3 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

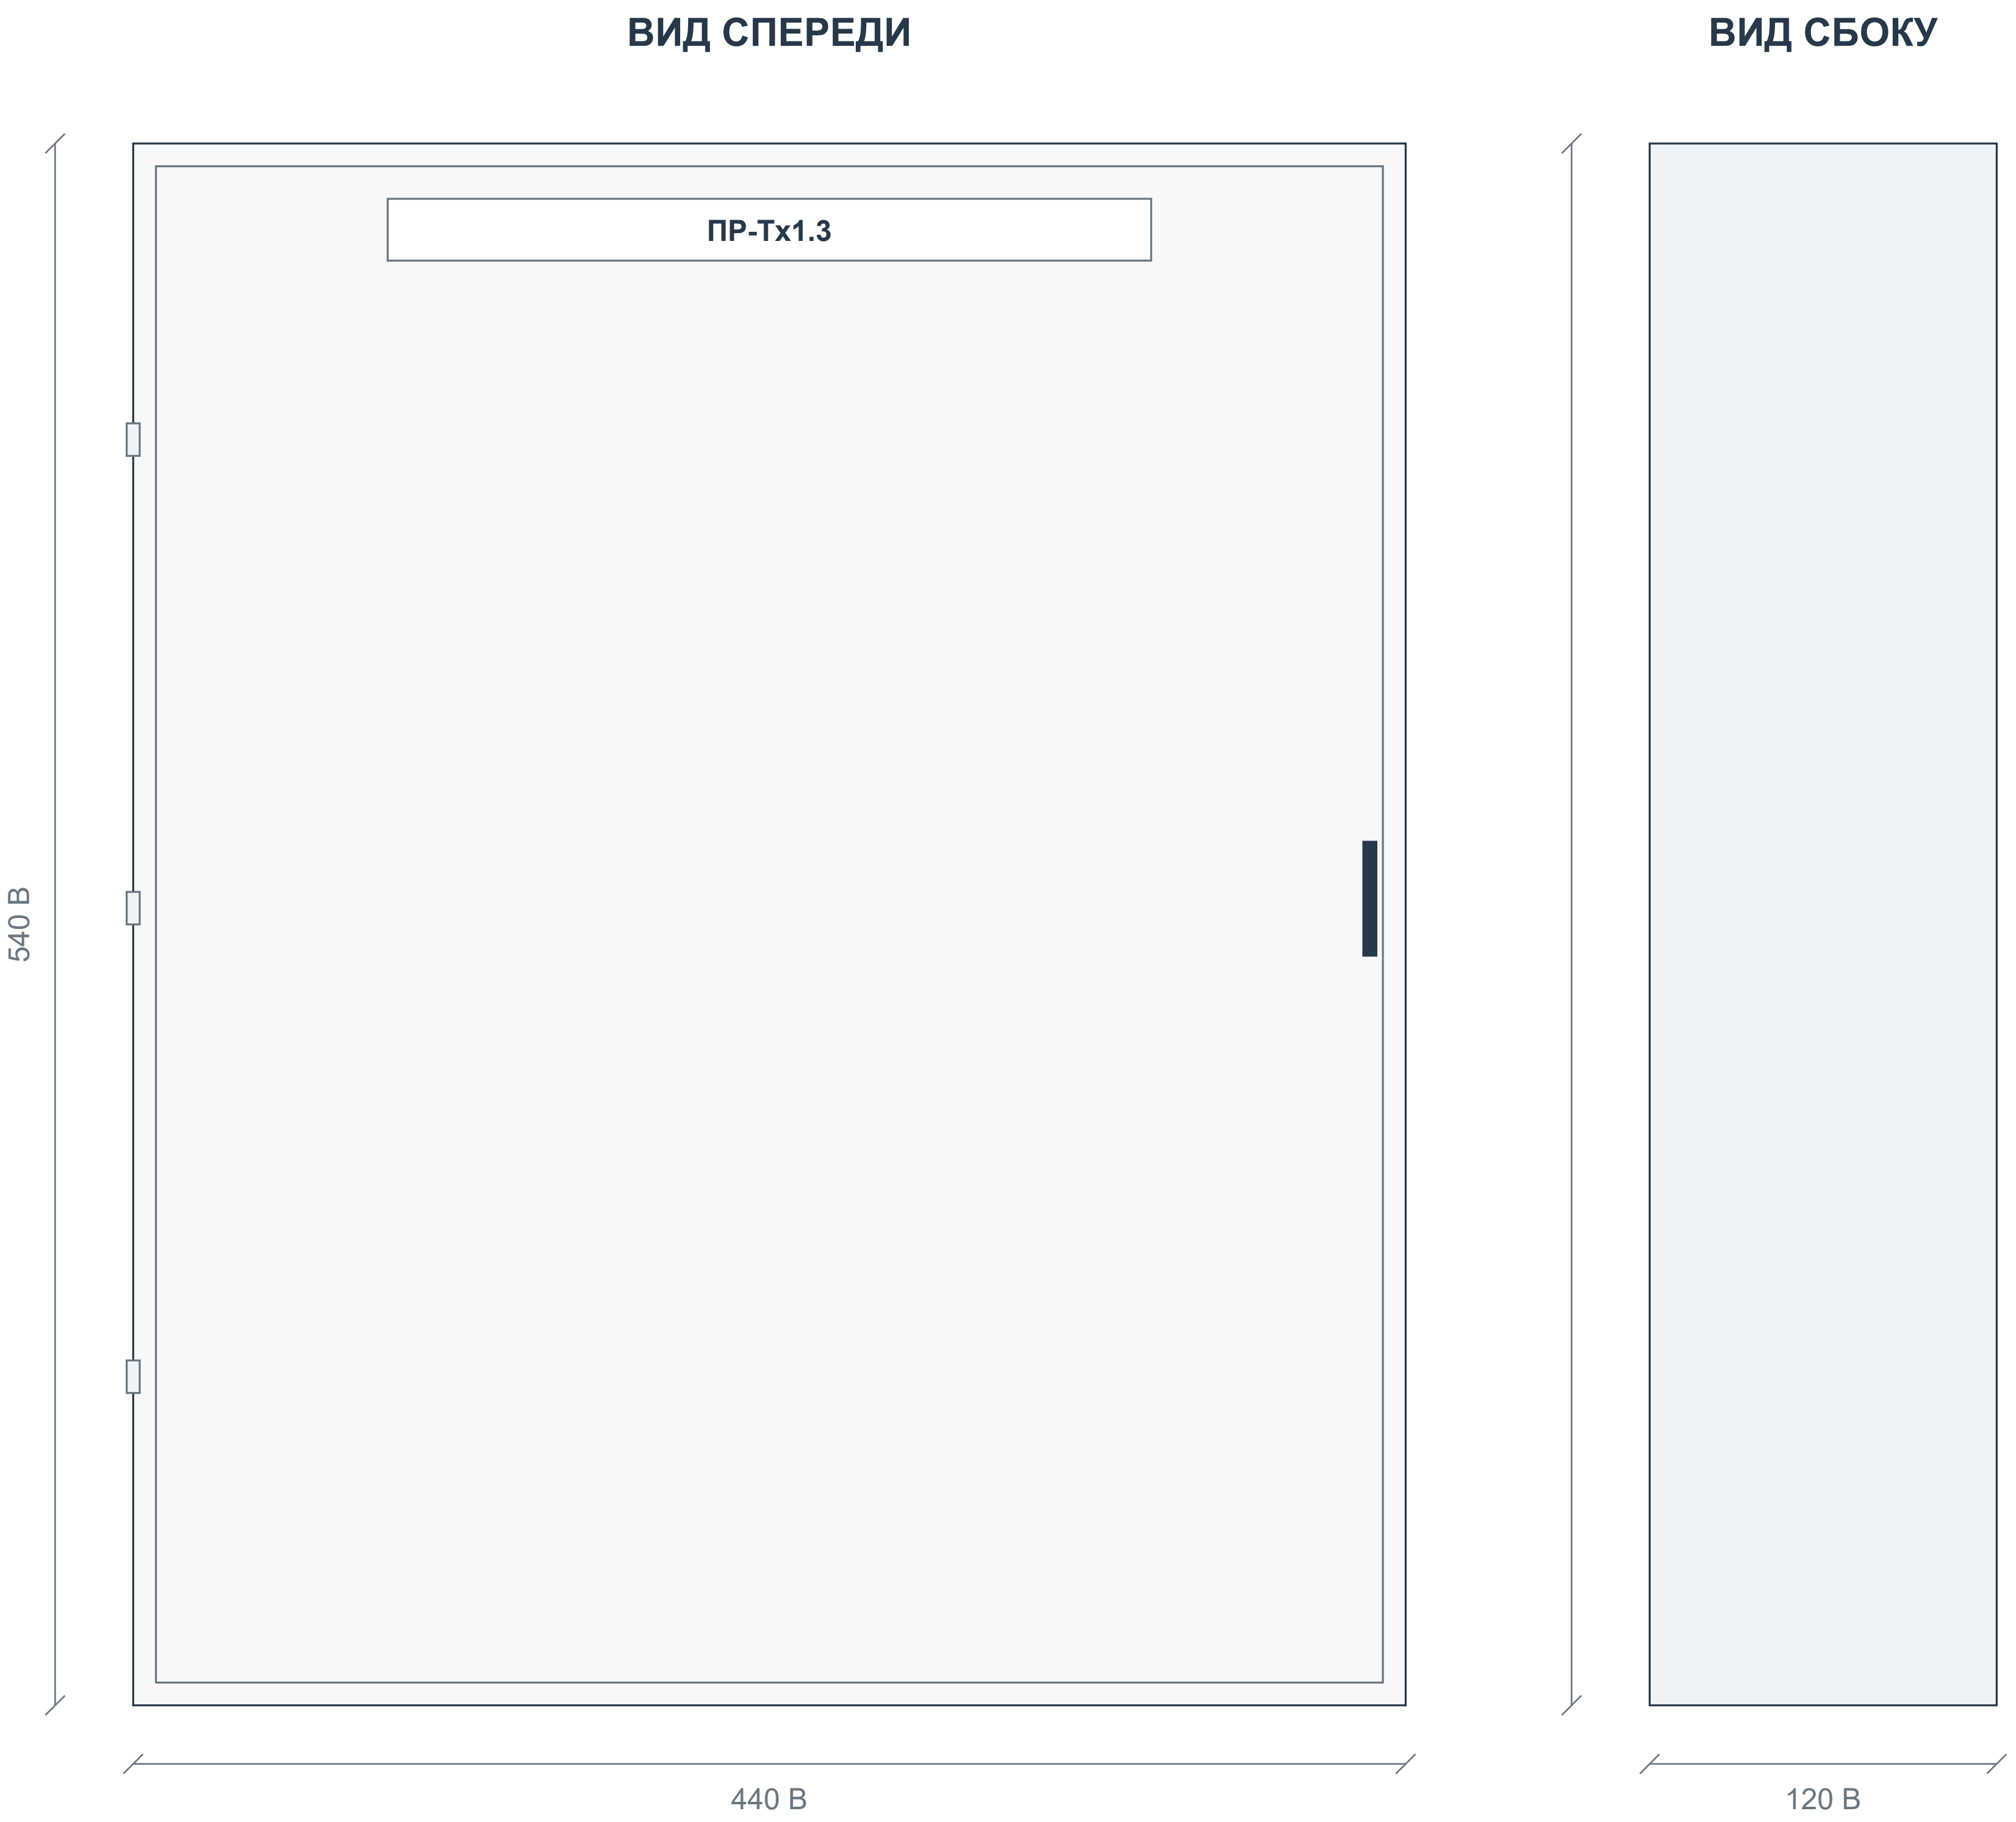

Корпус: Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

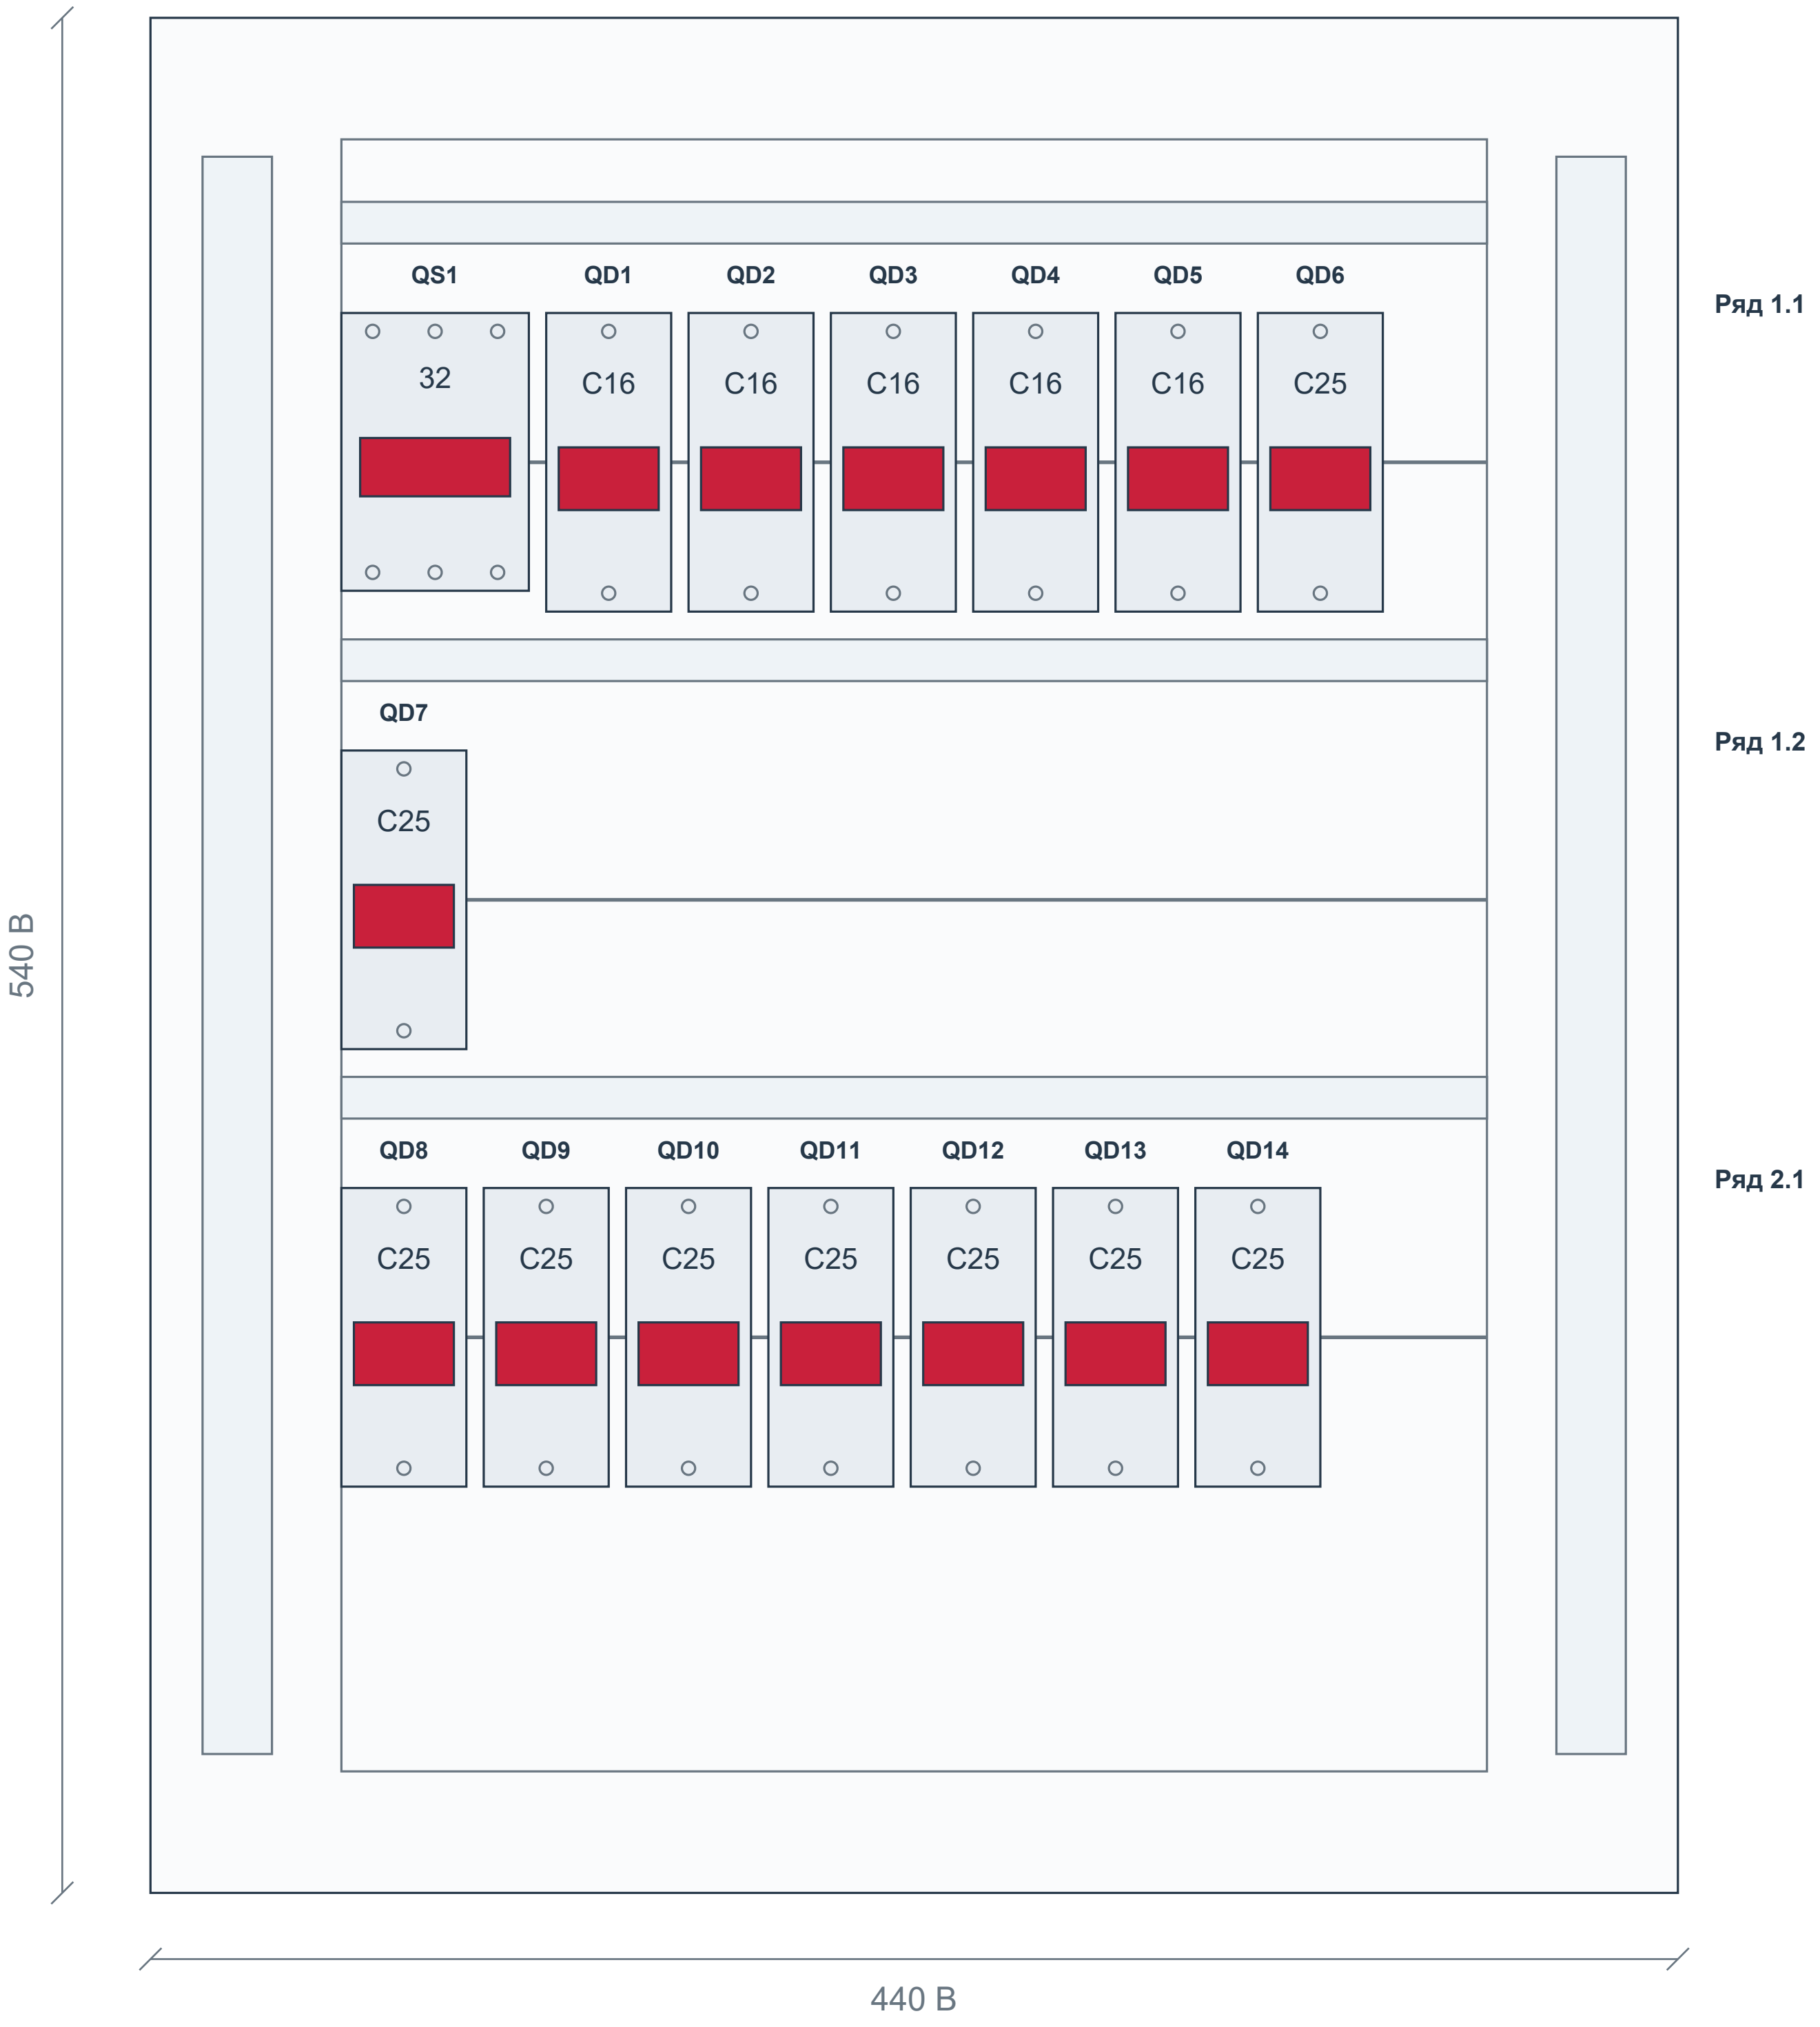
QS1
32
QD1
C16
QD2
C16
QD3
C16
QD4
C16
QD5
C16
QD6
C25
QD7
C25
QD8
C25
QD9
C25
QD10
C25
QD11
C25
QD12
C25
QD13
C25
QD14
C25
Ряд 1.1
Ряд 1.2
Ряд 2.1
540 B
440 B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	200	1.1	55	85	54 × 80
QD1 - QD5	NXBLE-63YH	201	1.1	114...278	85	36 × 86
QD6 - QD7	NXBLE-63YH	202	1.1/1.2	319 / 55	85/211	36 × 86
QD8 - QD14	NXBLE-63YH	203	2.1	55...301	337	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Ряды с недостаточной шириной разделены на подряды. Новые расстояния и способ крепления согласовать.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Актуальная спецификация

ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 220 | ЭОМ, PDF стр. 16

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
221	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
222	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
223	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
224	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 16

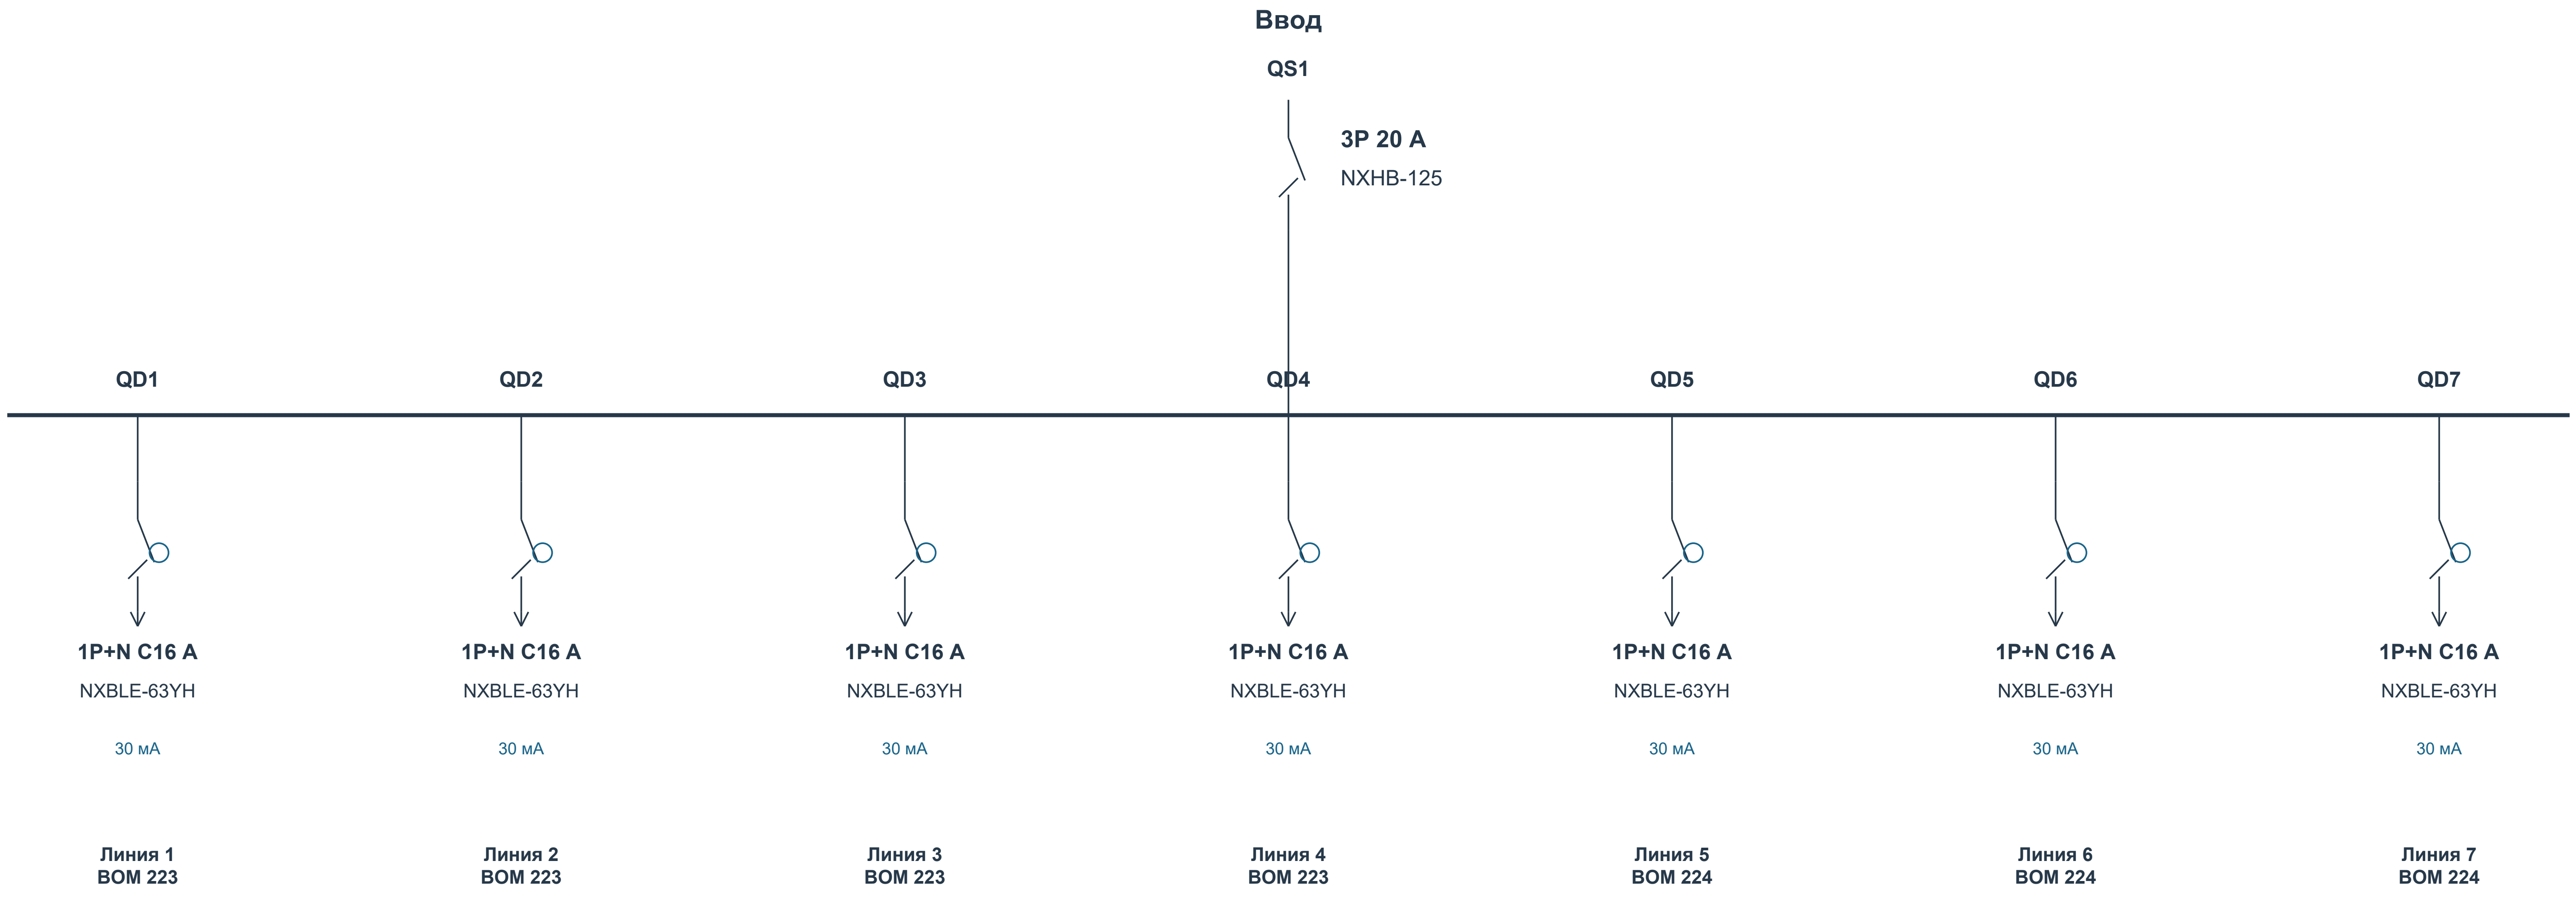
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 223
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 223
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 223
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 223
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 224
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 224
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 224

Данные исходного проекта: Ру 7.9 кВт | Рр 3,2 кВт | Iр 5,1 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

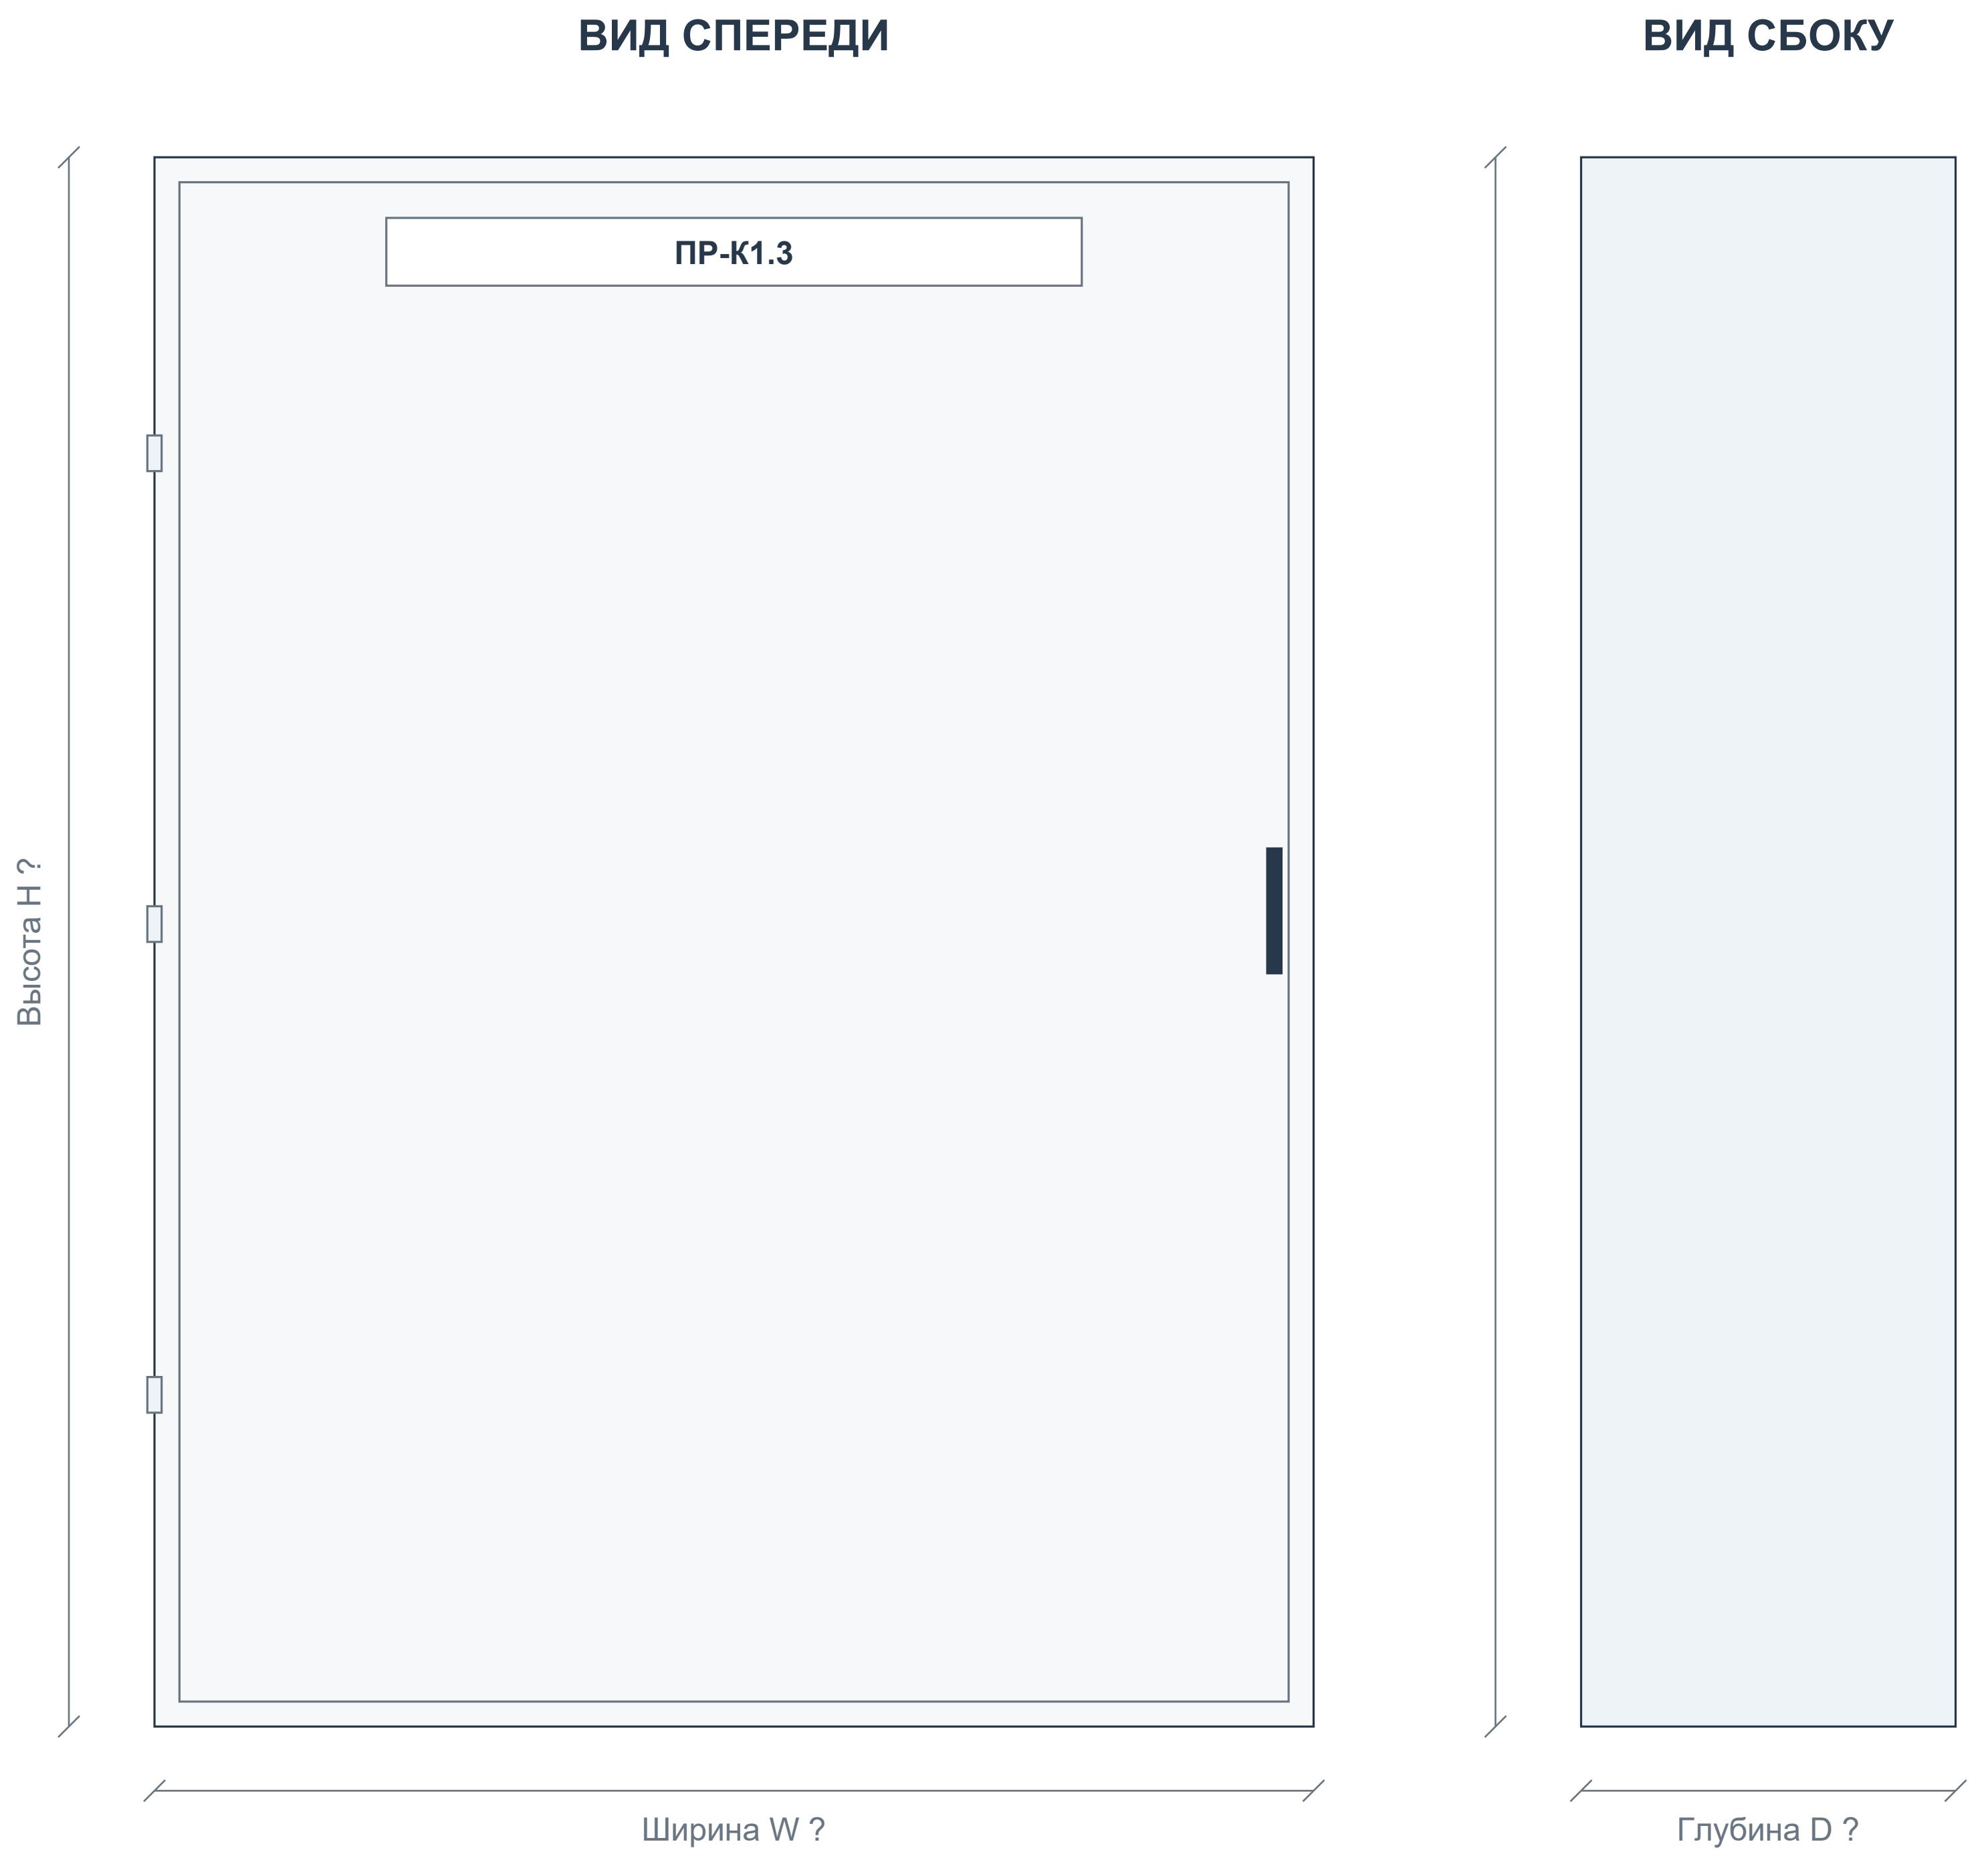

Корпус: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

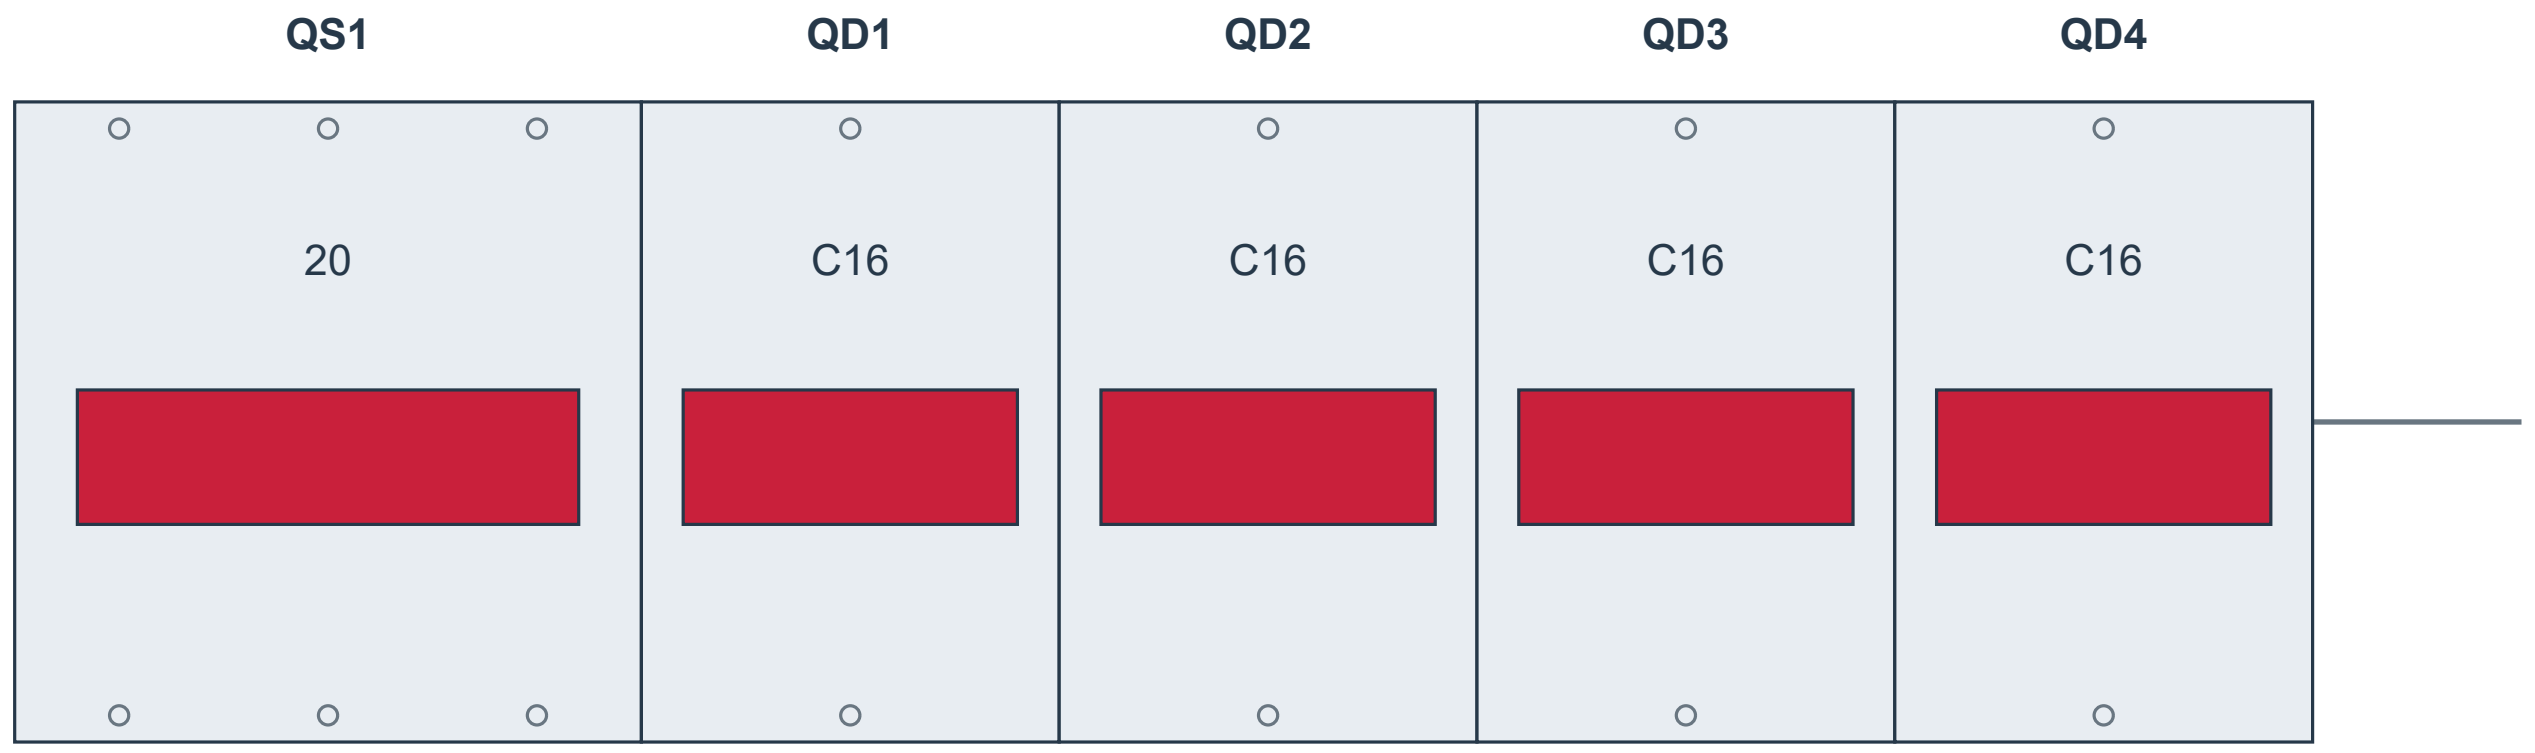

Сумма ширин: 198 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

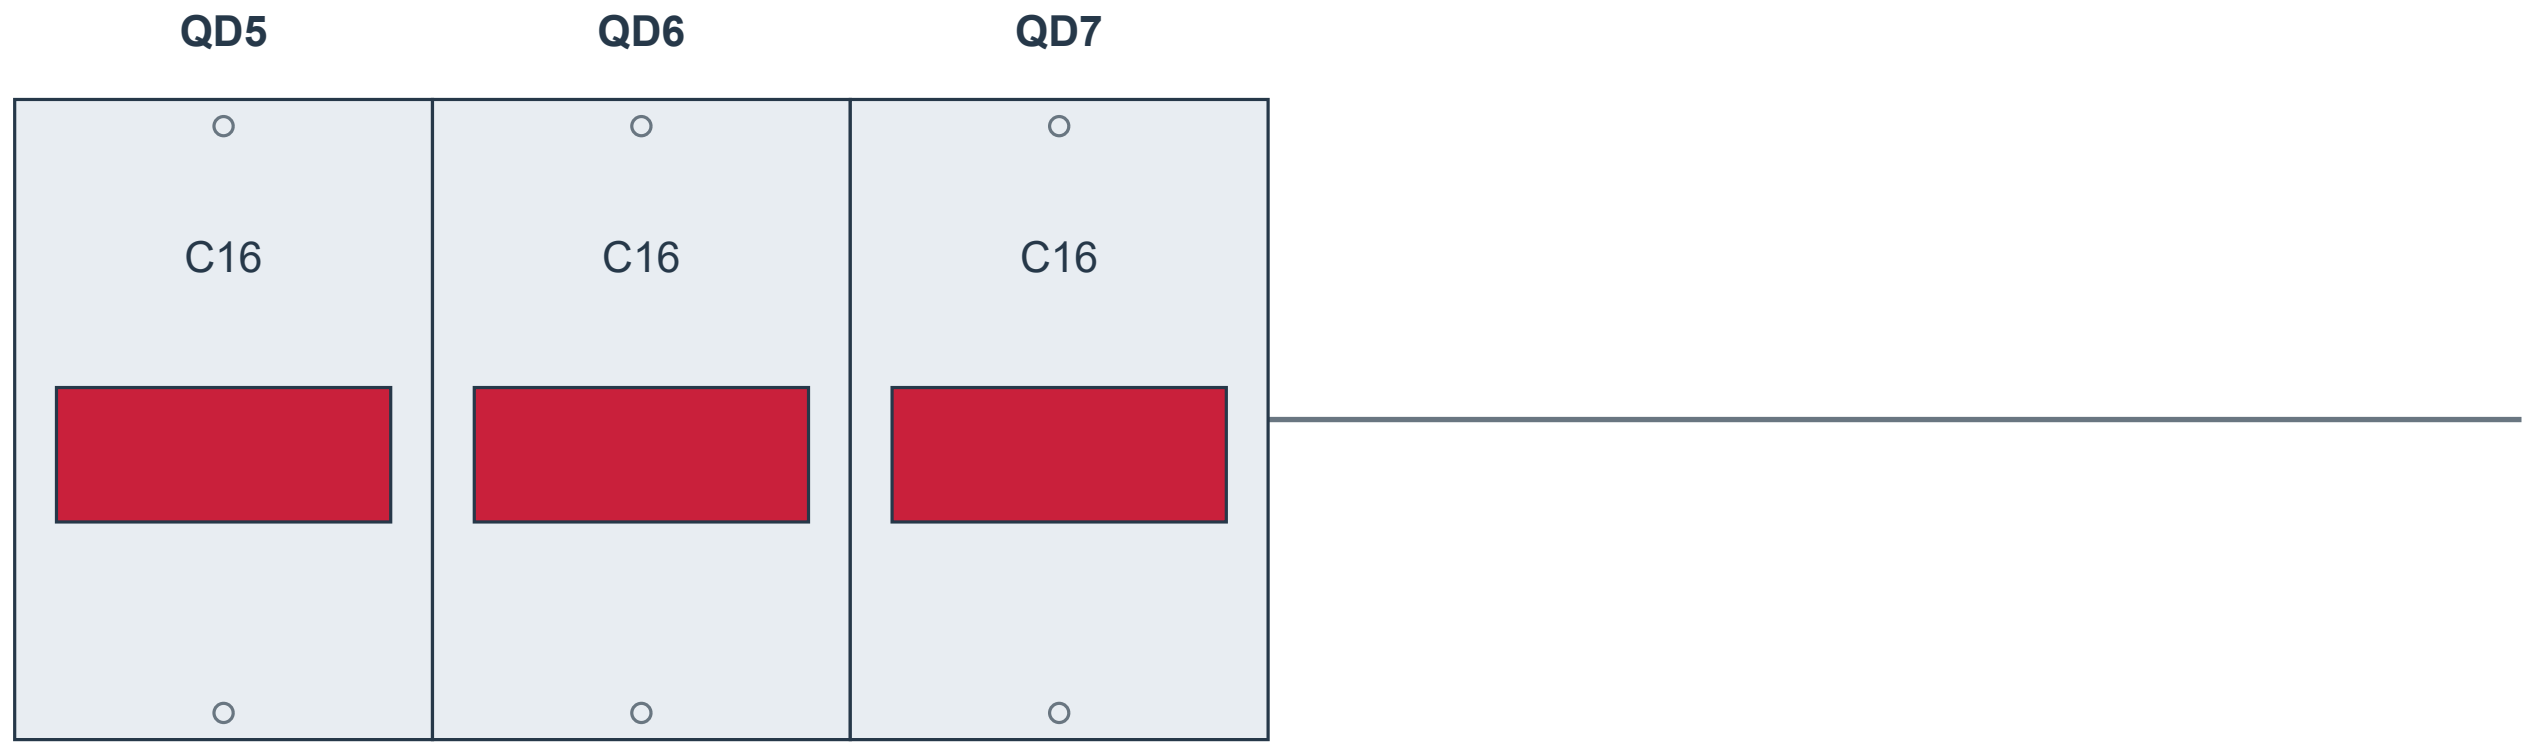

Сумма ширин: 108 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	222	1	0	?	54 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	223	1	54...162	?	36 B
QD5 - QD7	NXBLE-63YH	224	2	0...72	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Актуальная спецификация

ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 239 | ЭОМ, PDF стр. 17

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
240	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
241	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
242	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
243	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
244	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
245	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 17

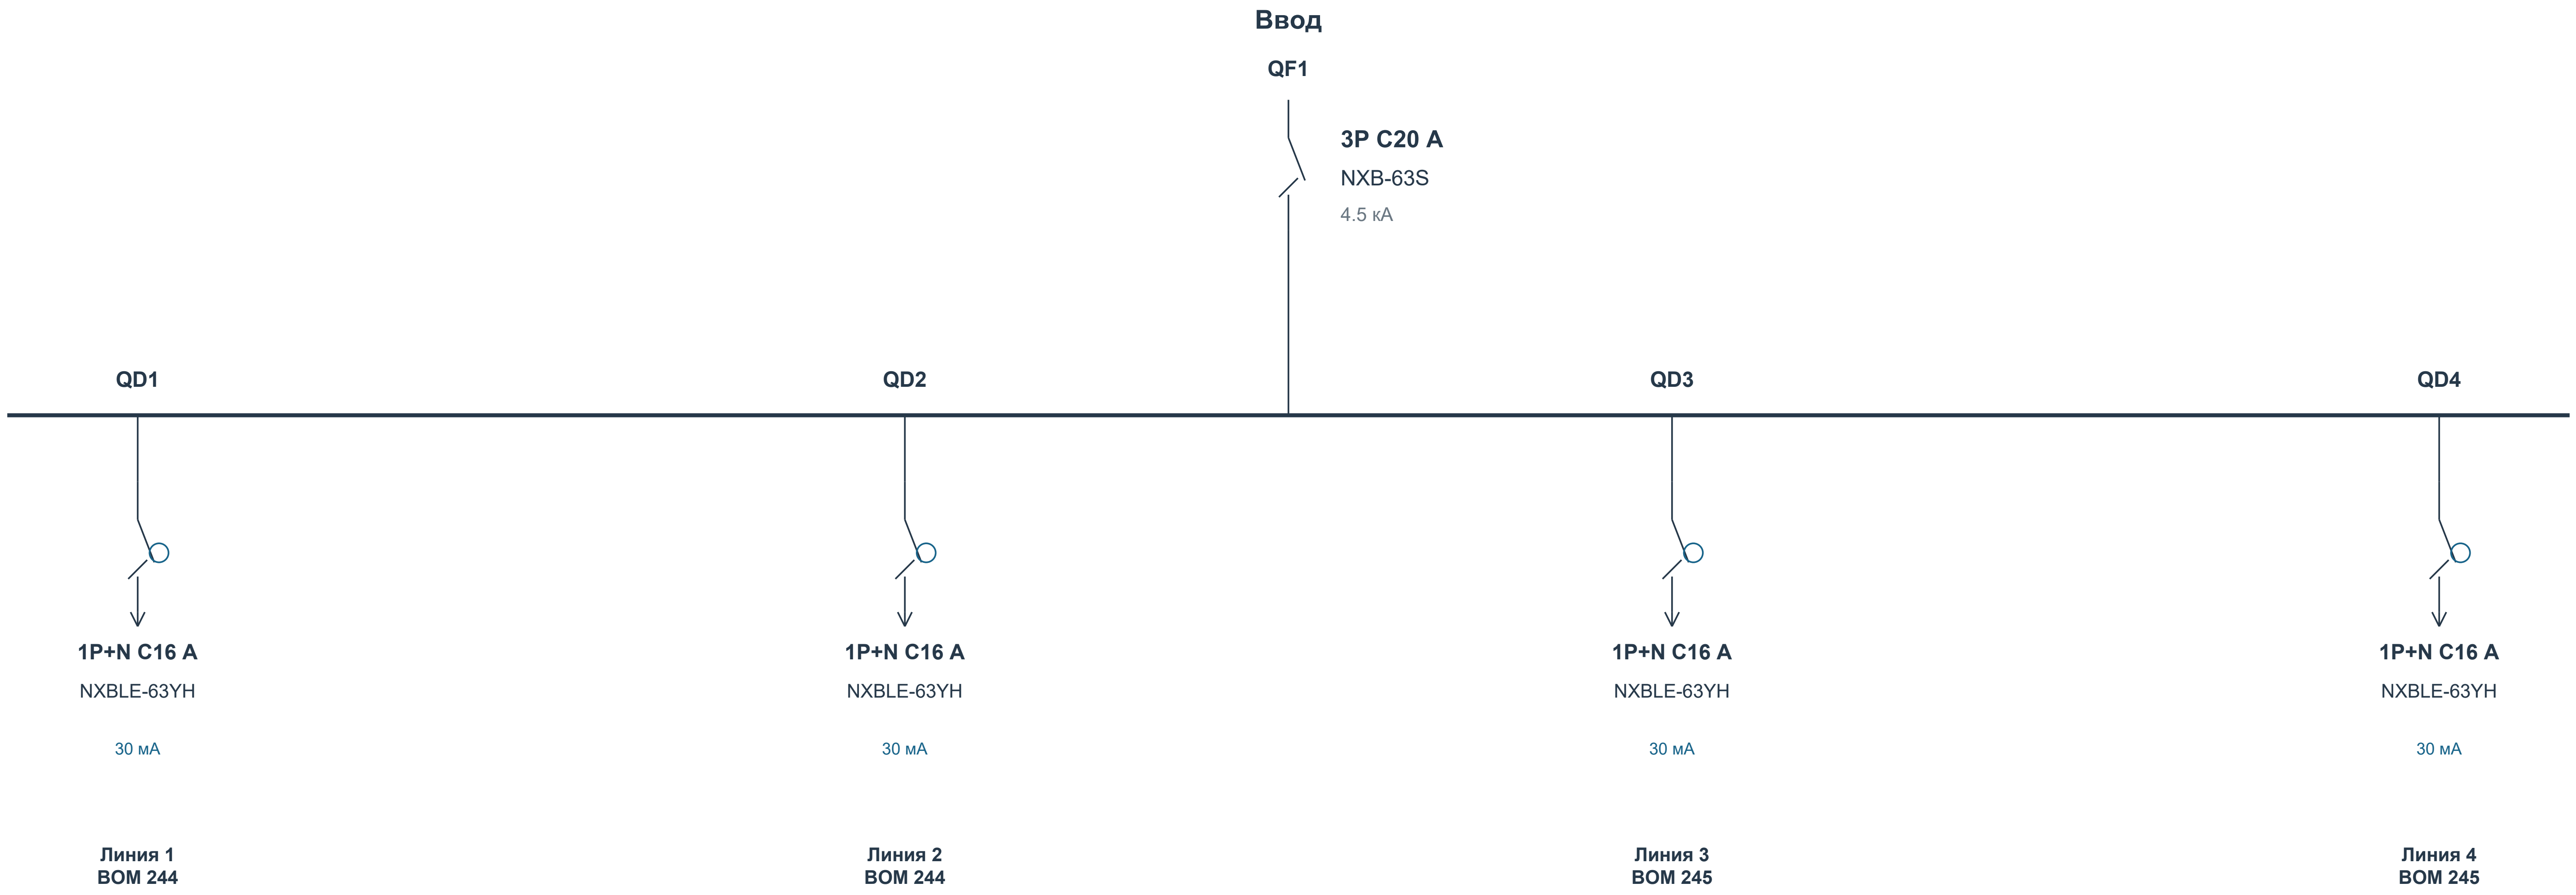
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 244
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 244
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 245
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 245

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 5.3 кВт | Рр 0,8 кВт | Ip 1,3 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

ВИД СПЕРЕДИ **ВИД СБОКУ**

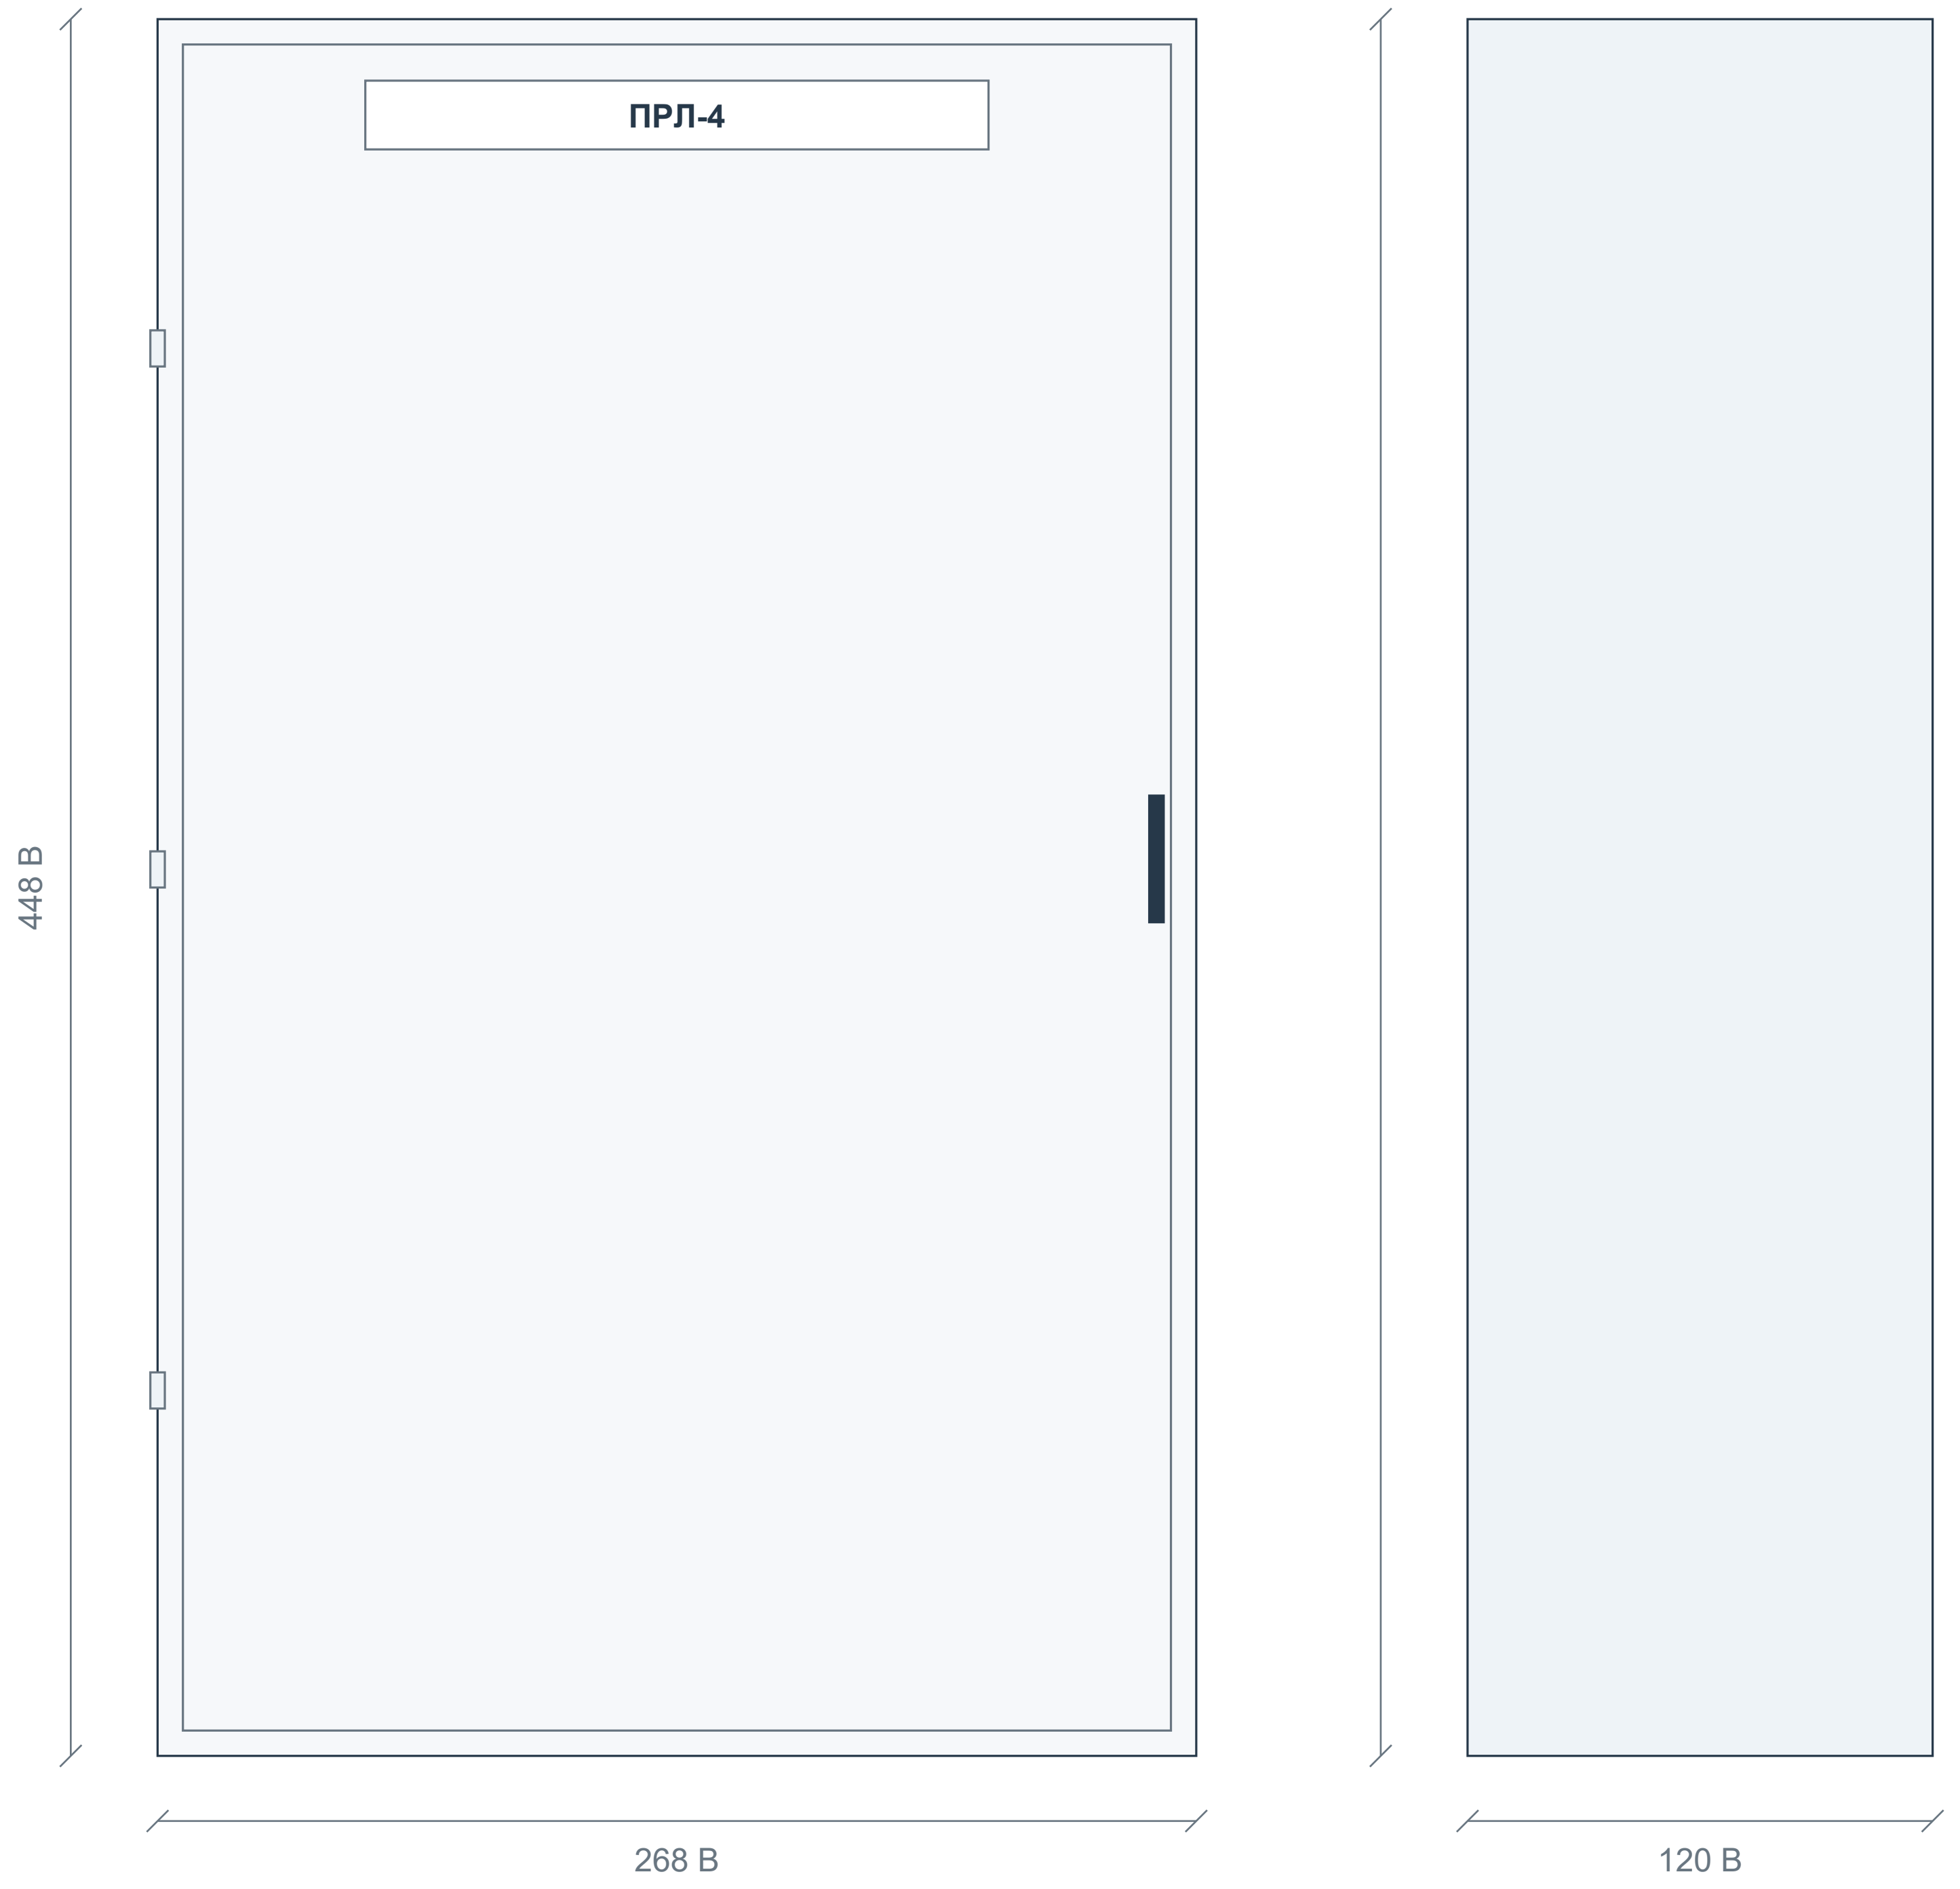

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

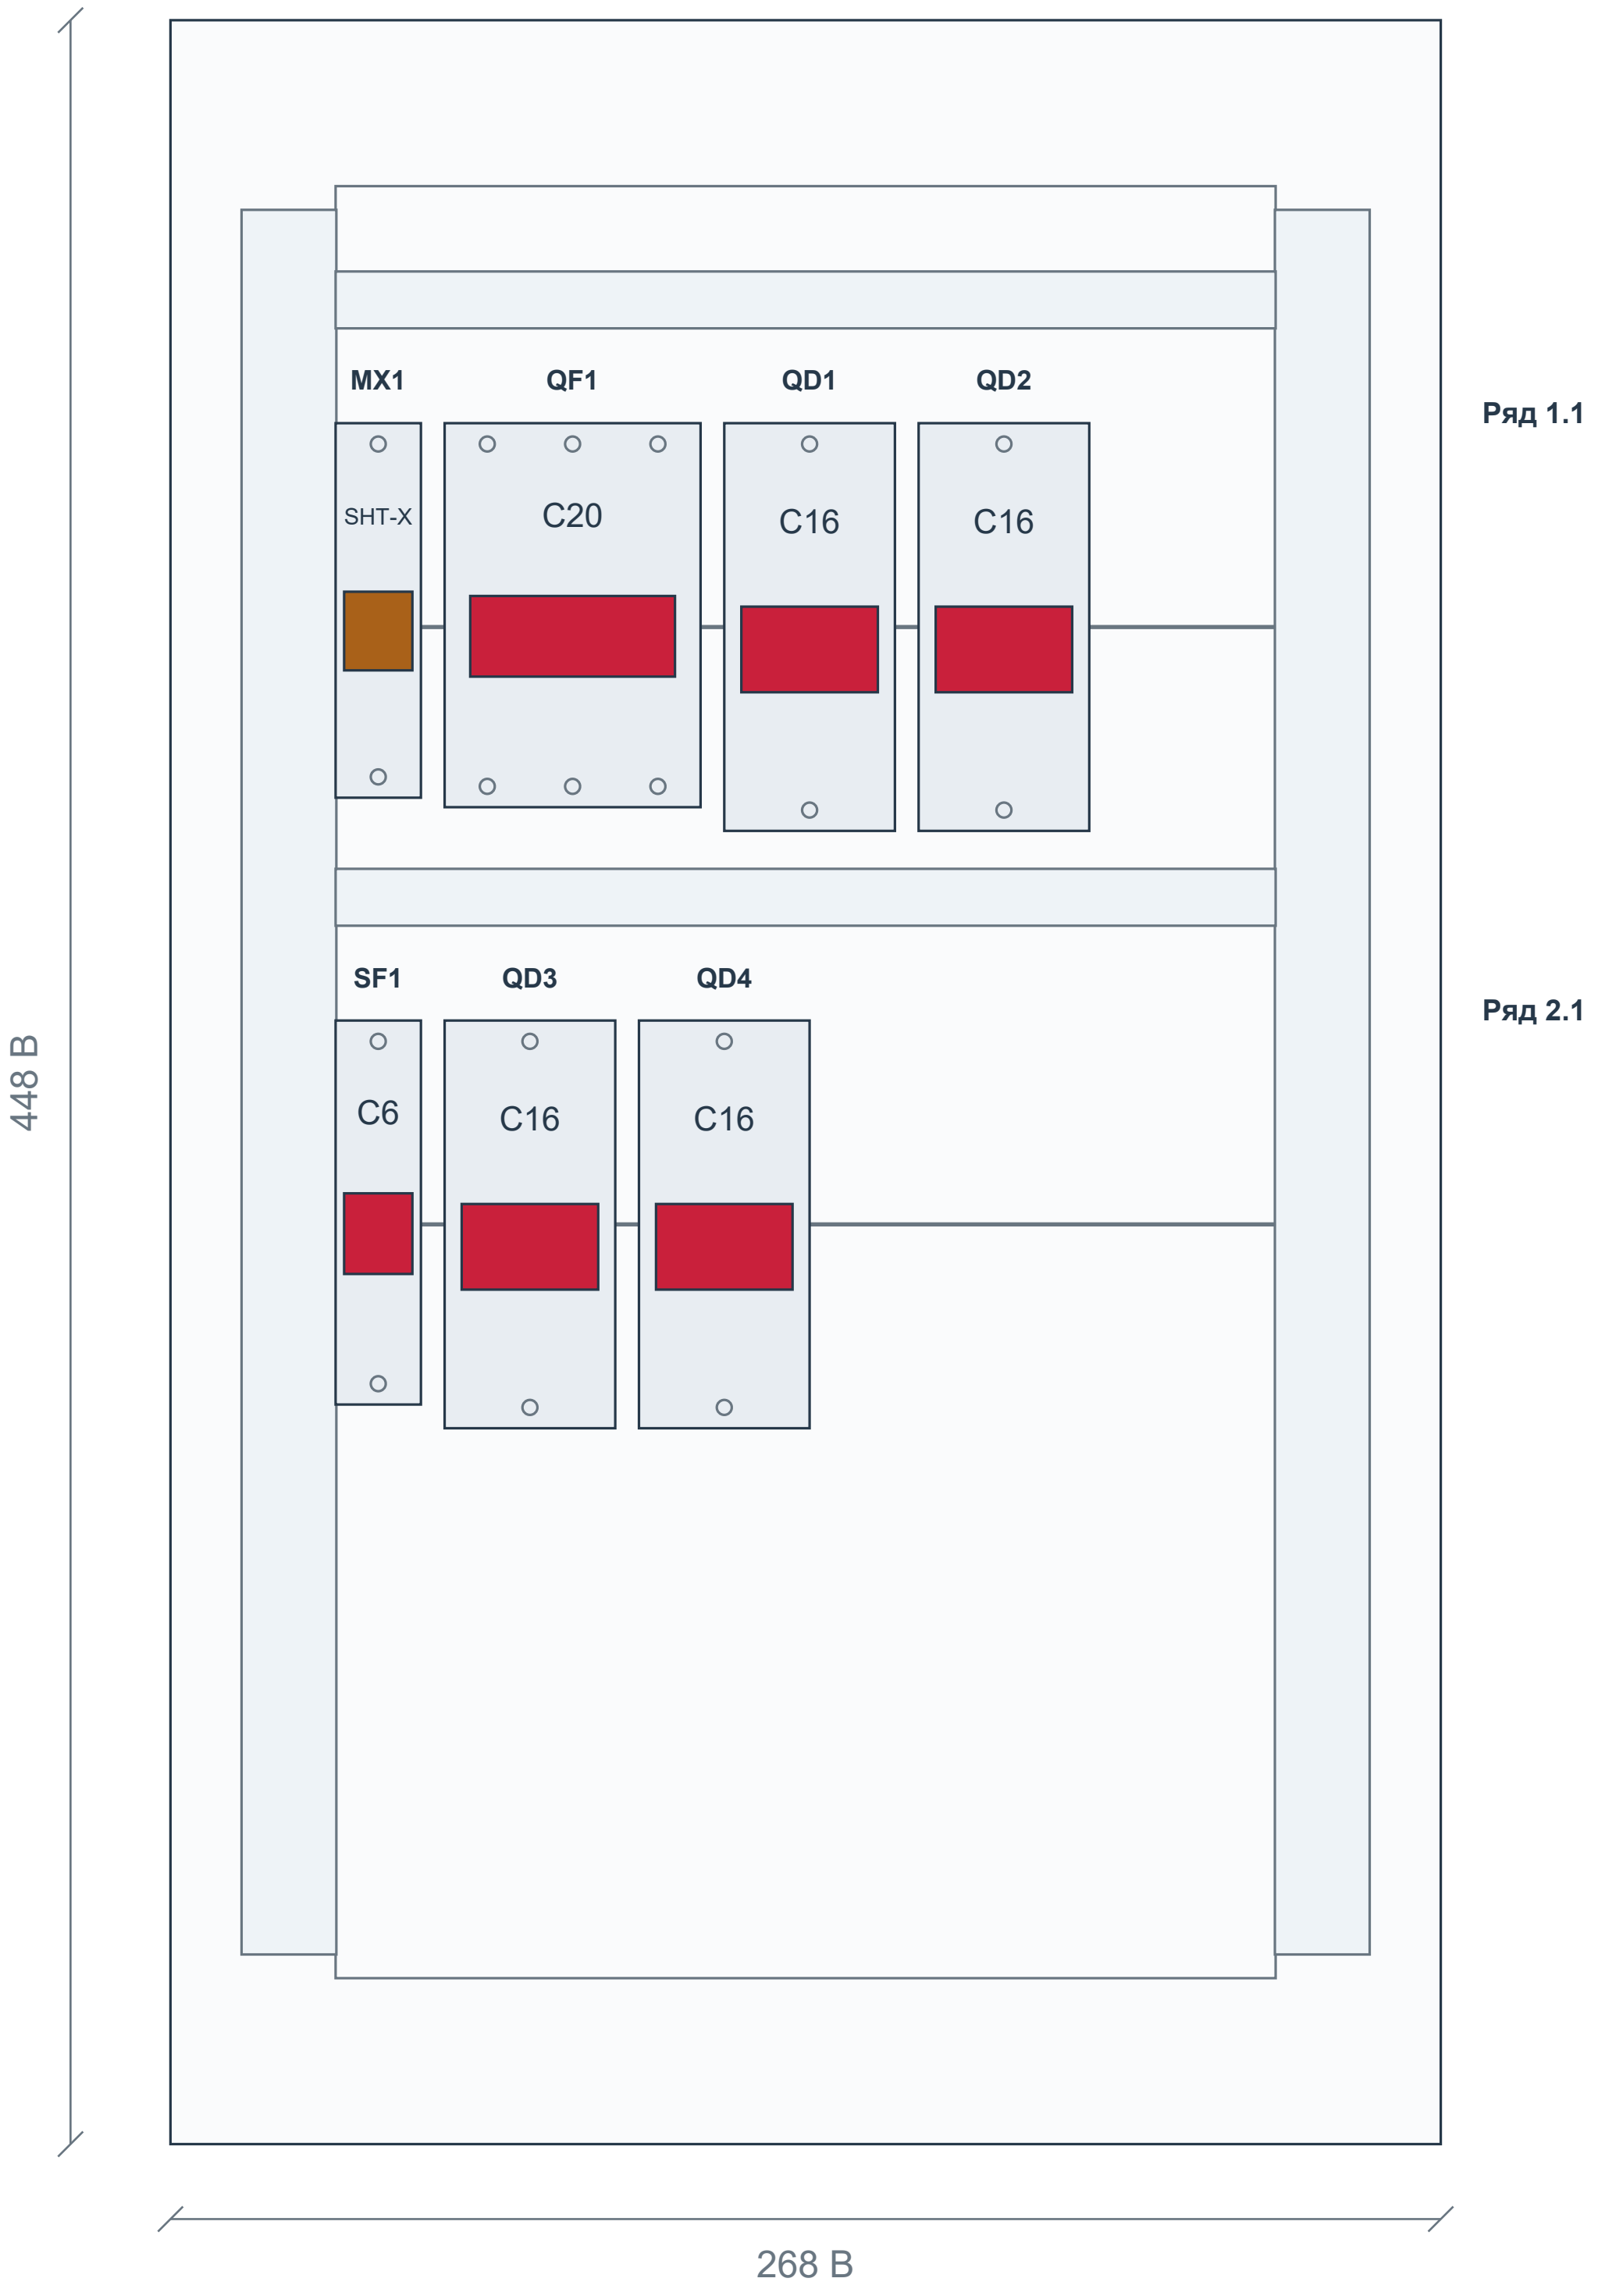

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	241	1.1	34.84	85	18 × 79
QF1	NXB-63S	242	1.1	57.84	85	54 × 81
SF1	NXB-63S	243	2.1	34.84	211	18 × 81
QD1 - QD2	NXBLE-63YH	244	1.1	116.84...157.84	85	36 × 86
QD3 - QD4	NXBLE-63YH	245	2.1	57.84...98.84	211	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Актуальная спецификация

ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 262 | ЭОМ, PDF стр. 18

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
263	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
264	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
265	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
266	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
267	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
268	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 18

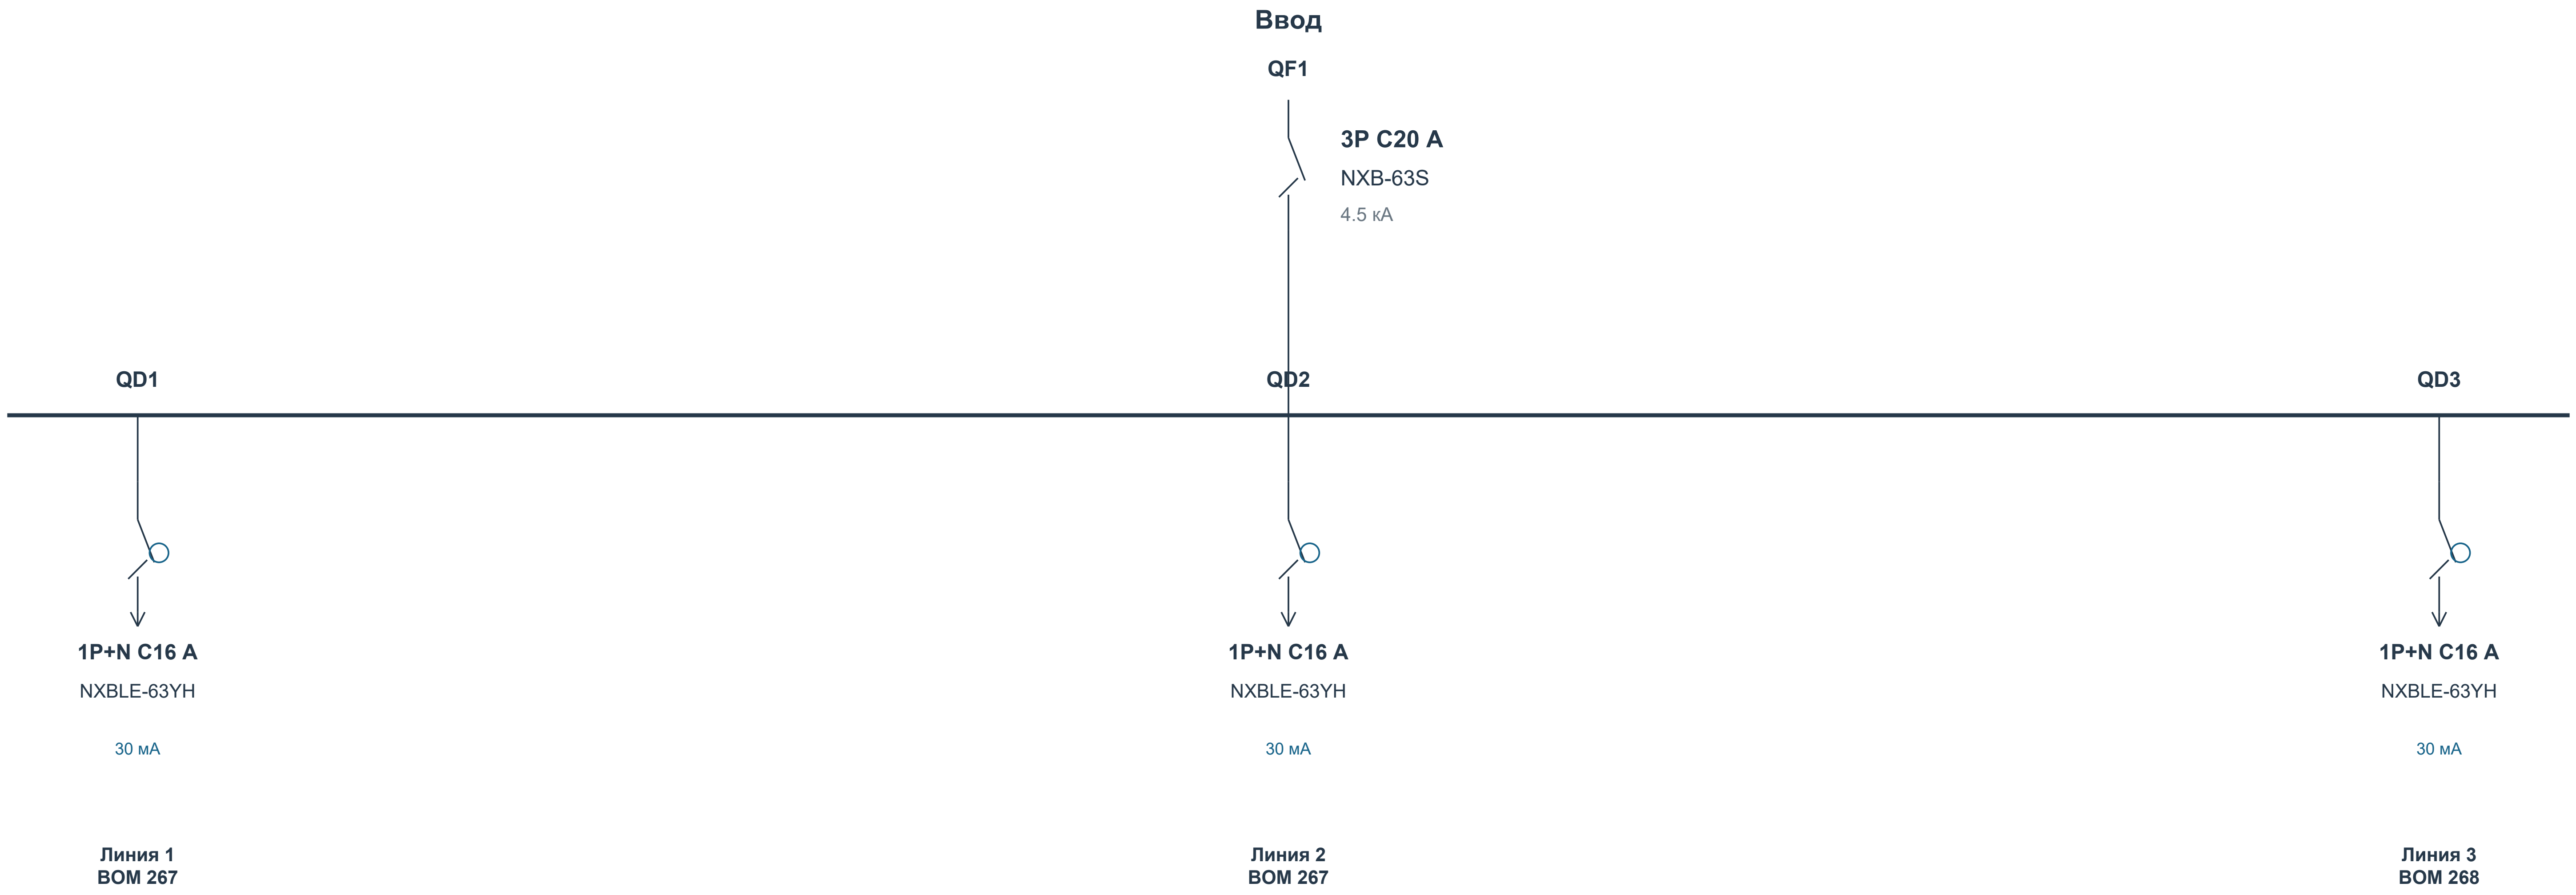
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 267
Линия 2
BOM 267
Линия 3
BOM 268

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 2.2 кВт | Рр 0,3 кВт | Iр 0,5 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

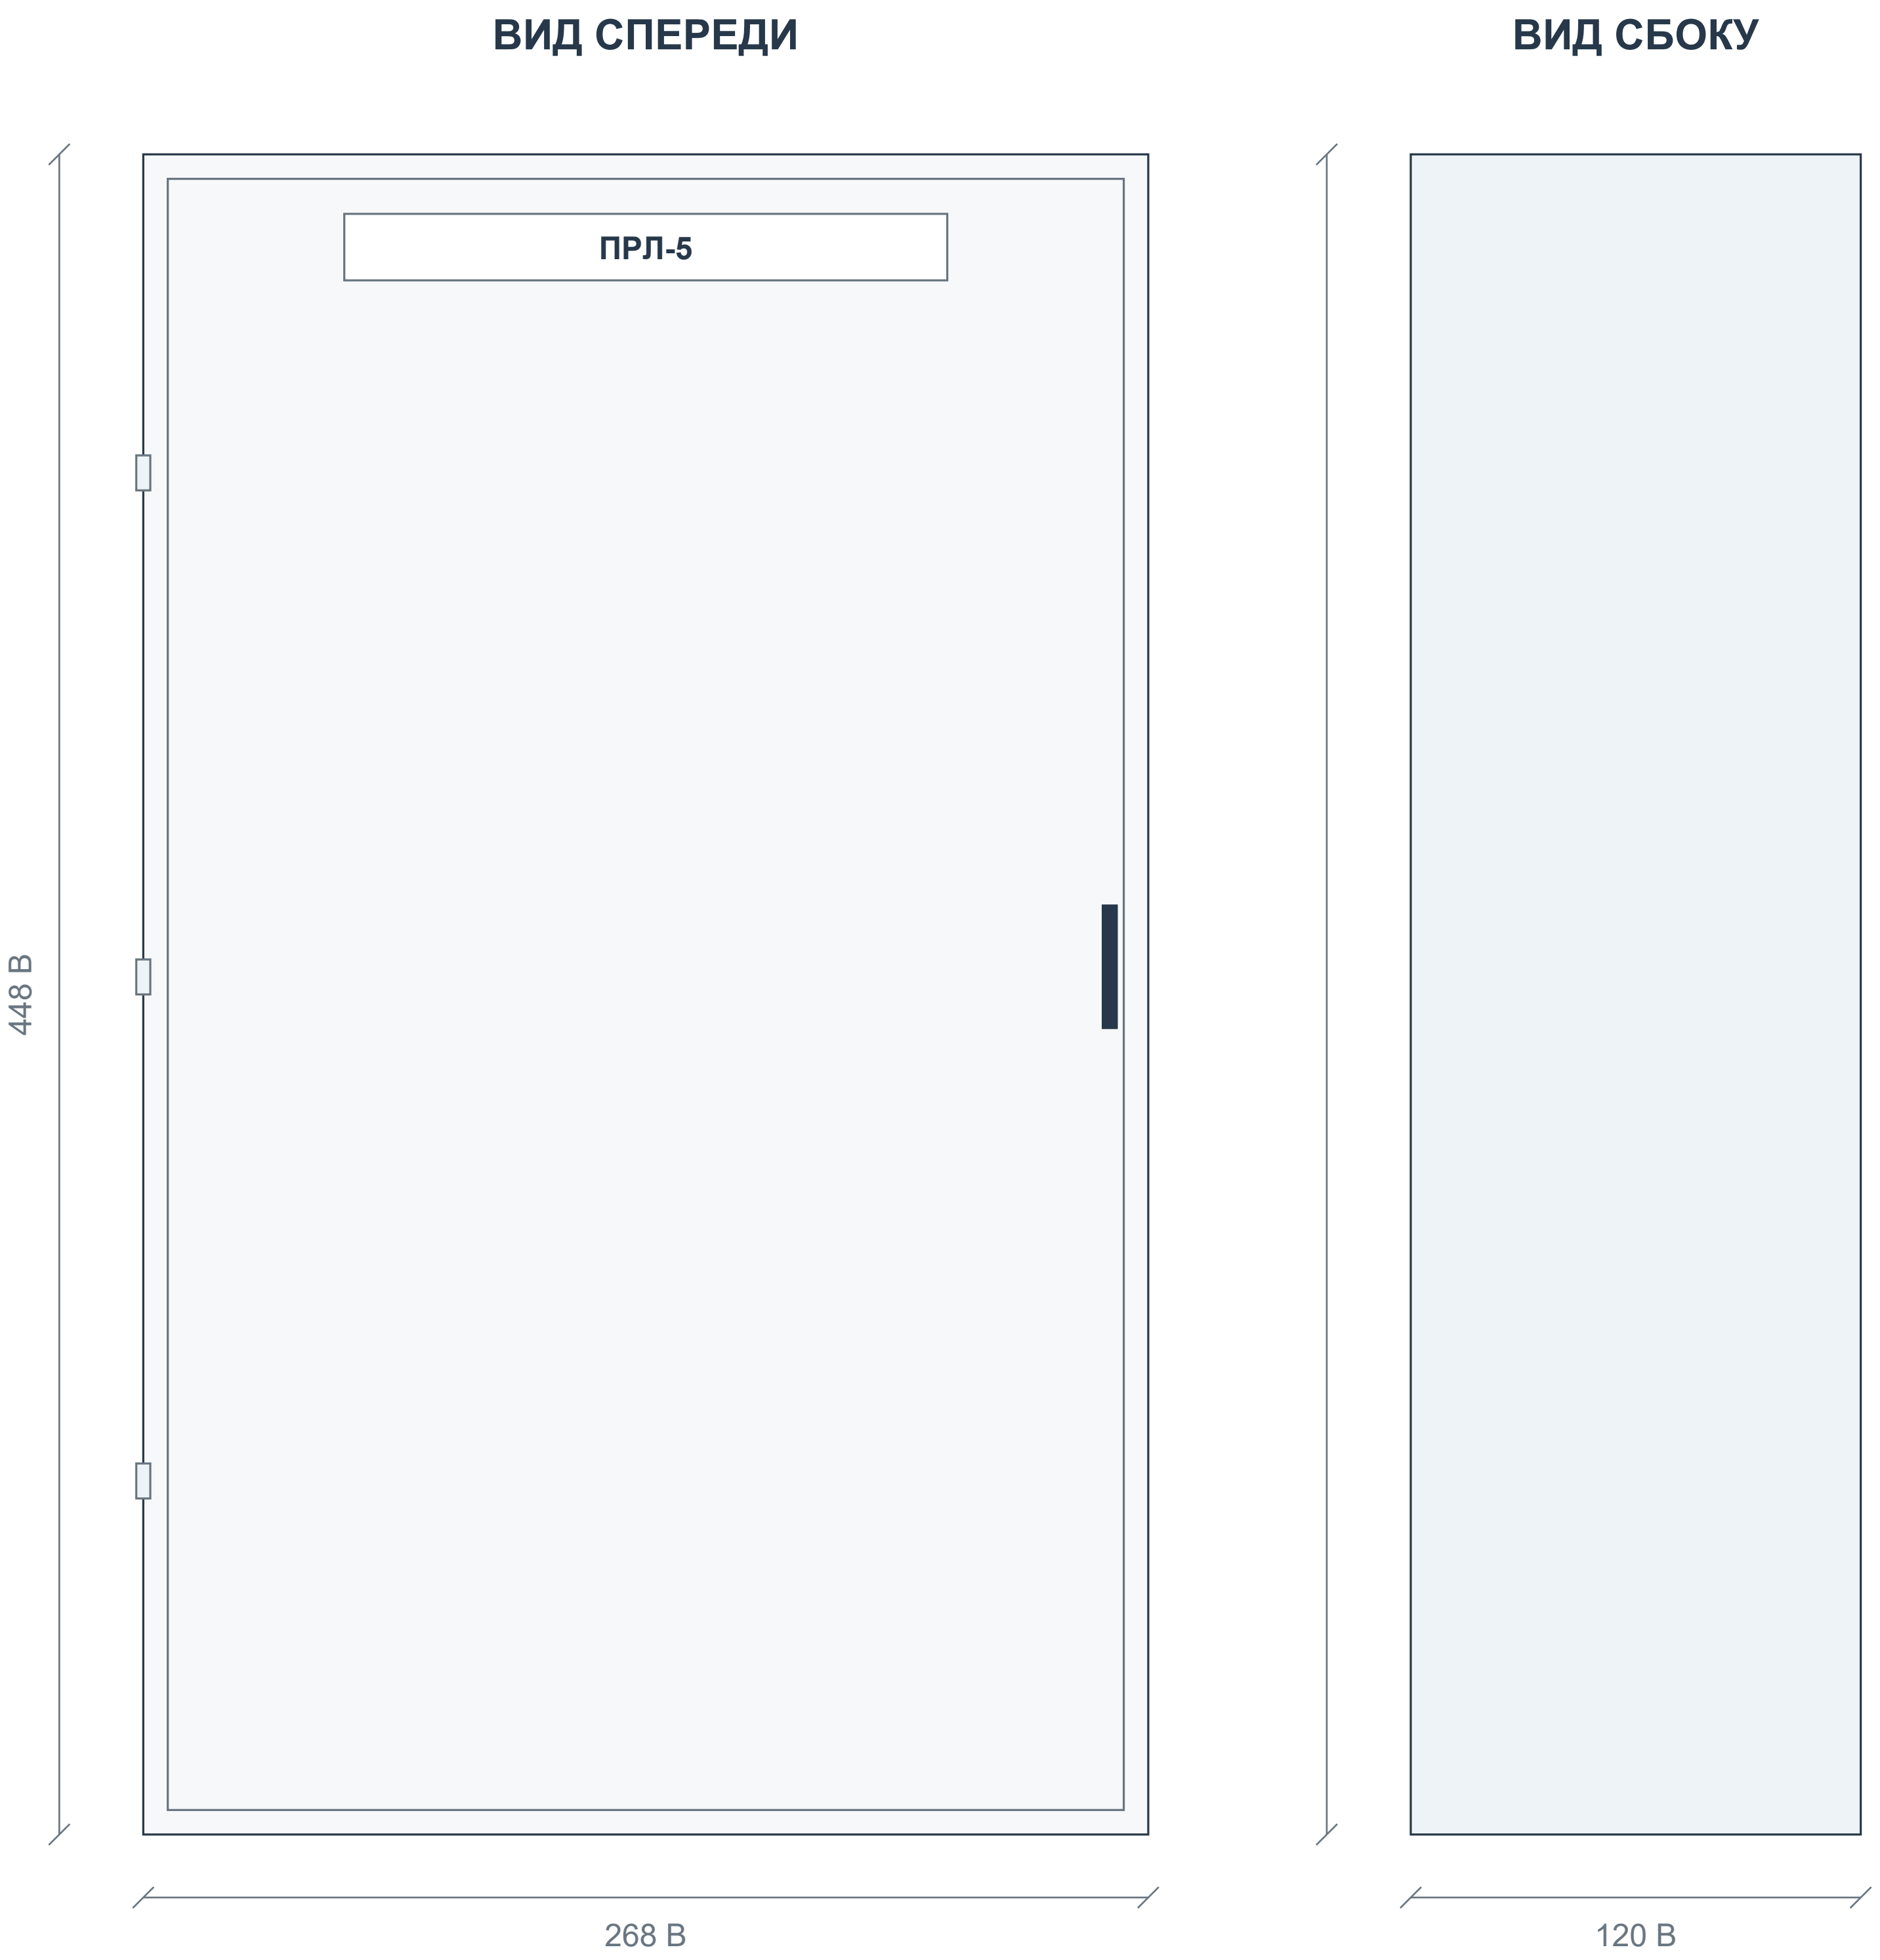

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

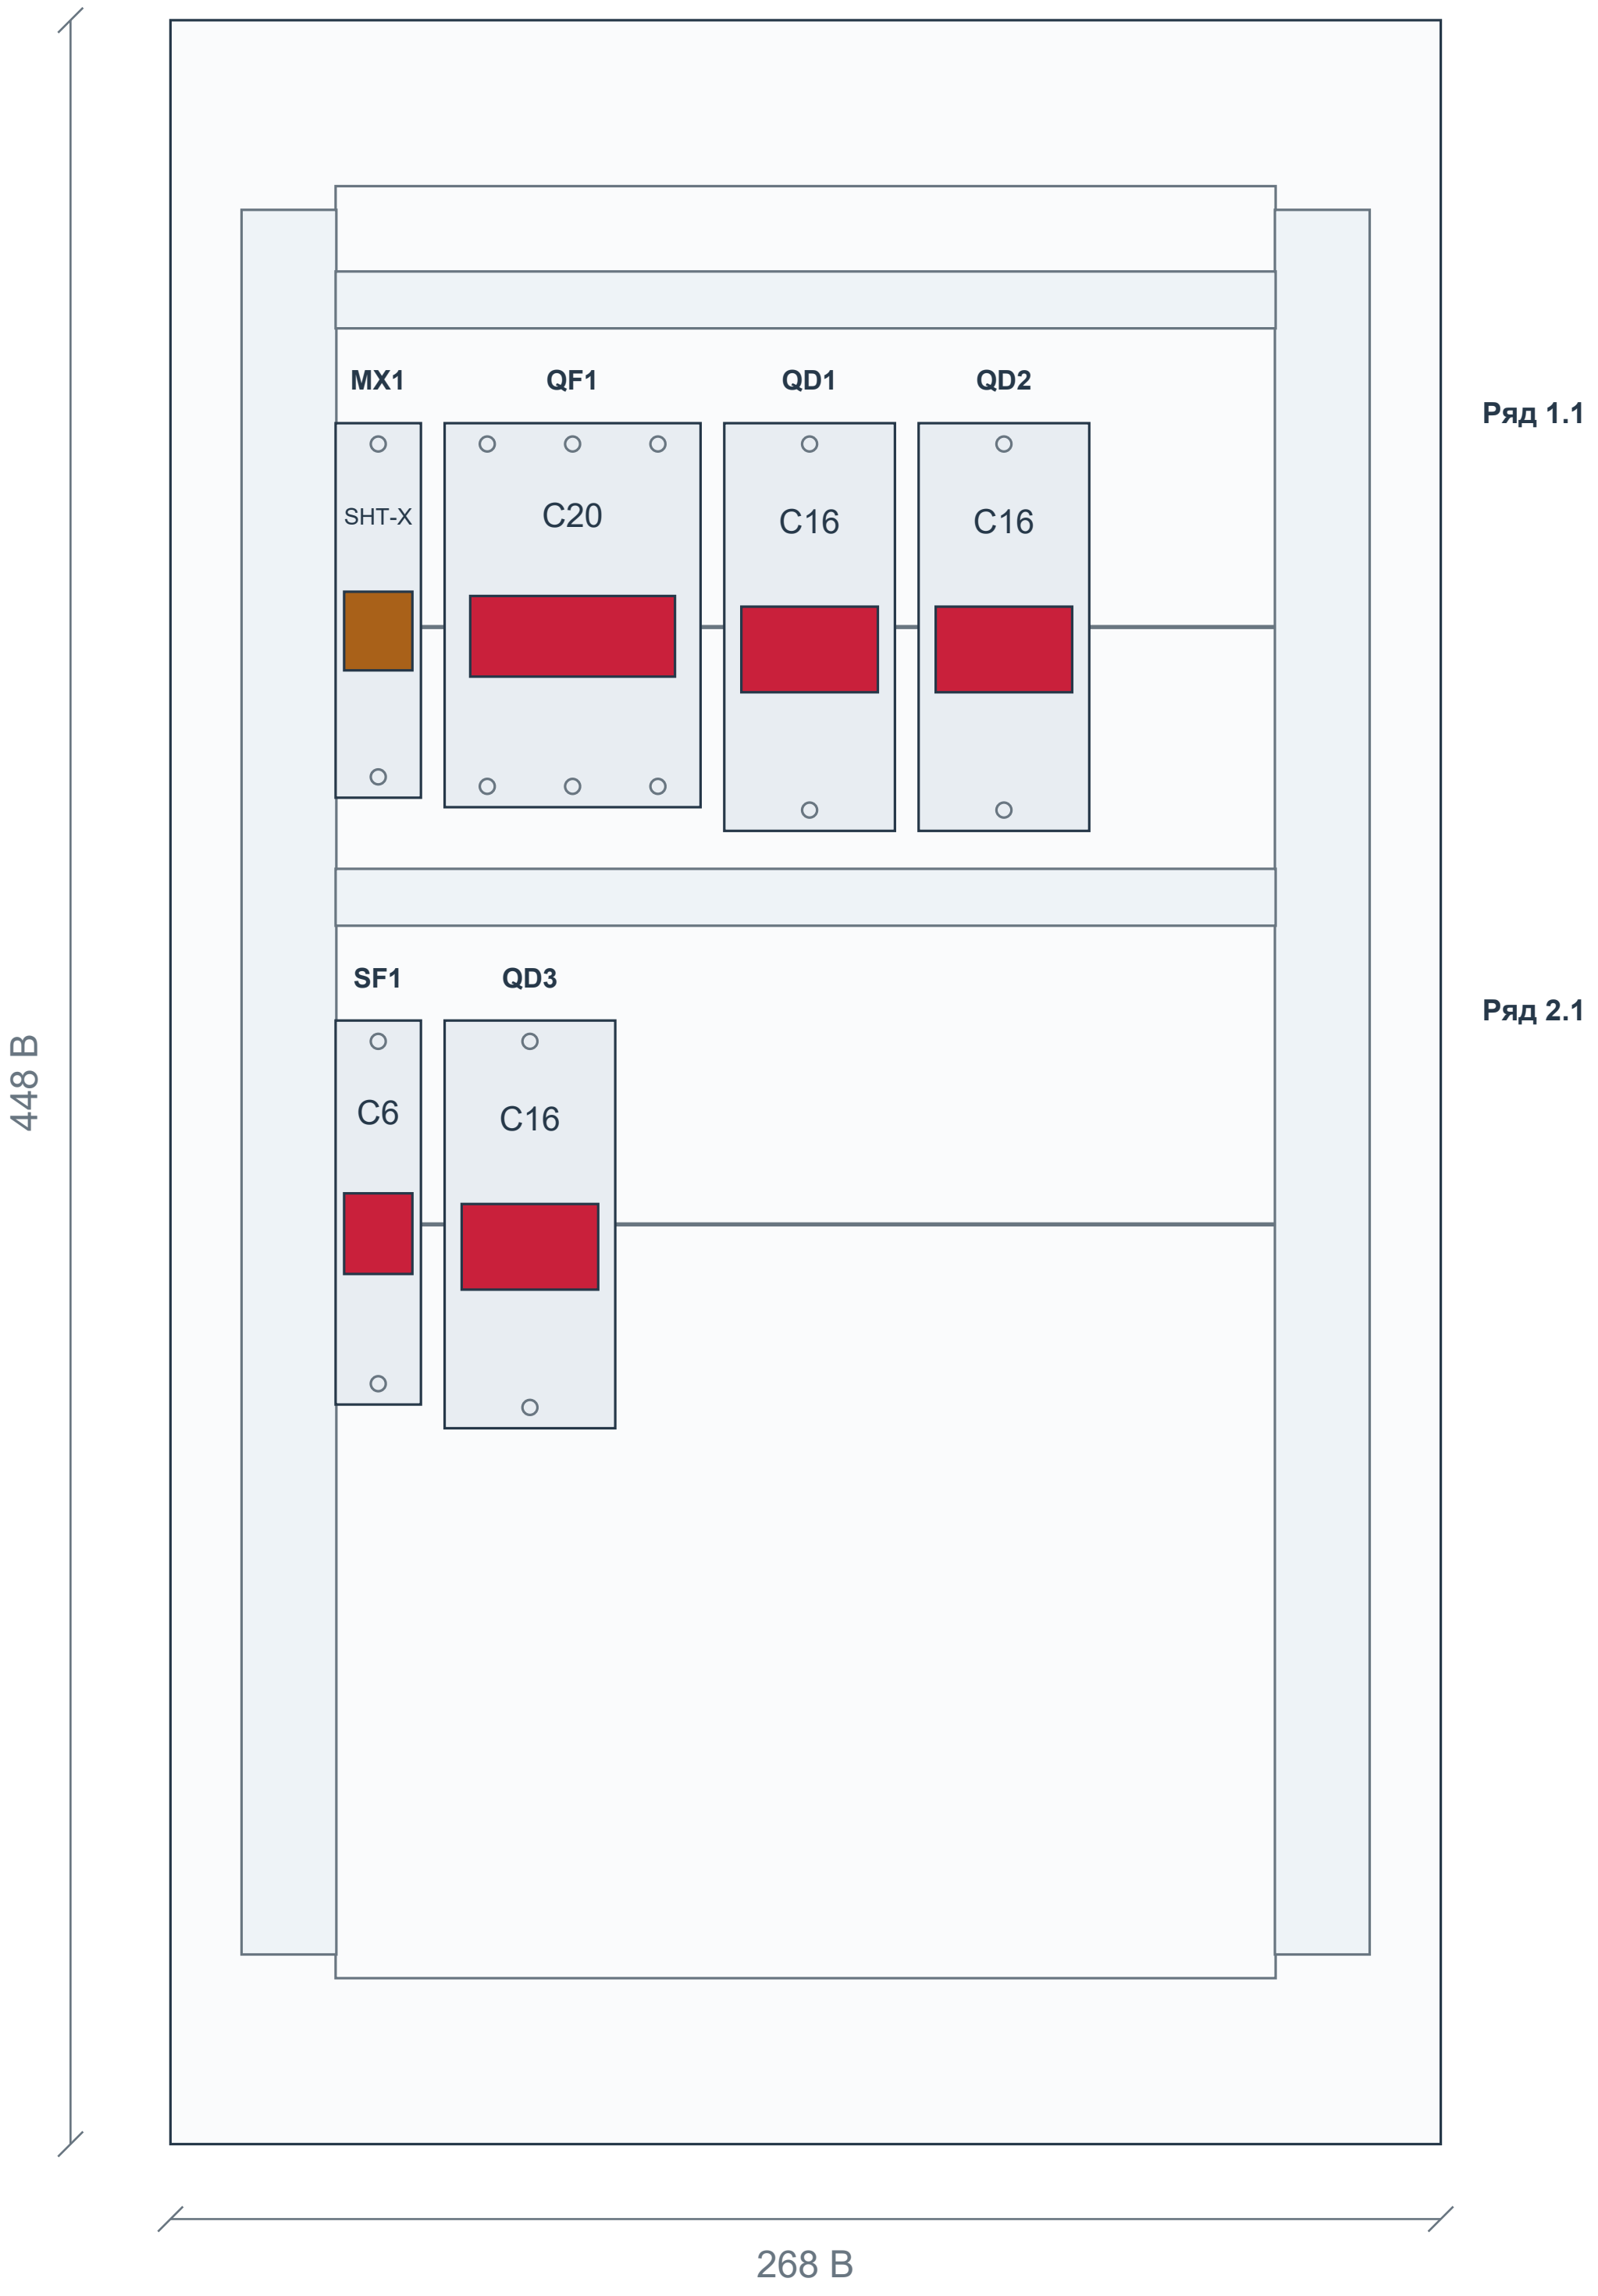

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	264	1.1	34.84	85	18 × 79
QF1	NXB-63S	265	1.1	57.84	85	54 × 81
SF1	NXB-63S	266	2.1	34.84	211	18 × 81
QD1 - QD2	NXBLE-63YH	267	1.1	116.84...157.84	85	36 × 86
QD3	NXBLE-63YH	268	2.1	57.84	211	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.1 | Актуальная спецификация

ПР-Тх2.1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 285 | ЭОМ, PDF стр. 19

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
286	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
287	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
288	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
289	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
290	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
291	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 19

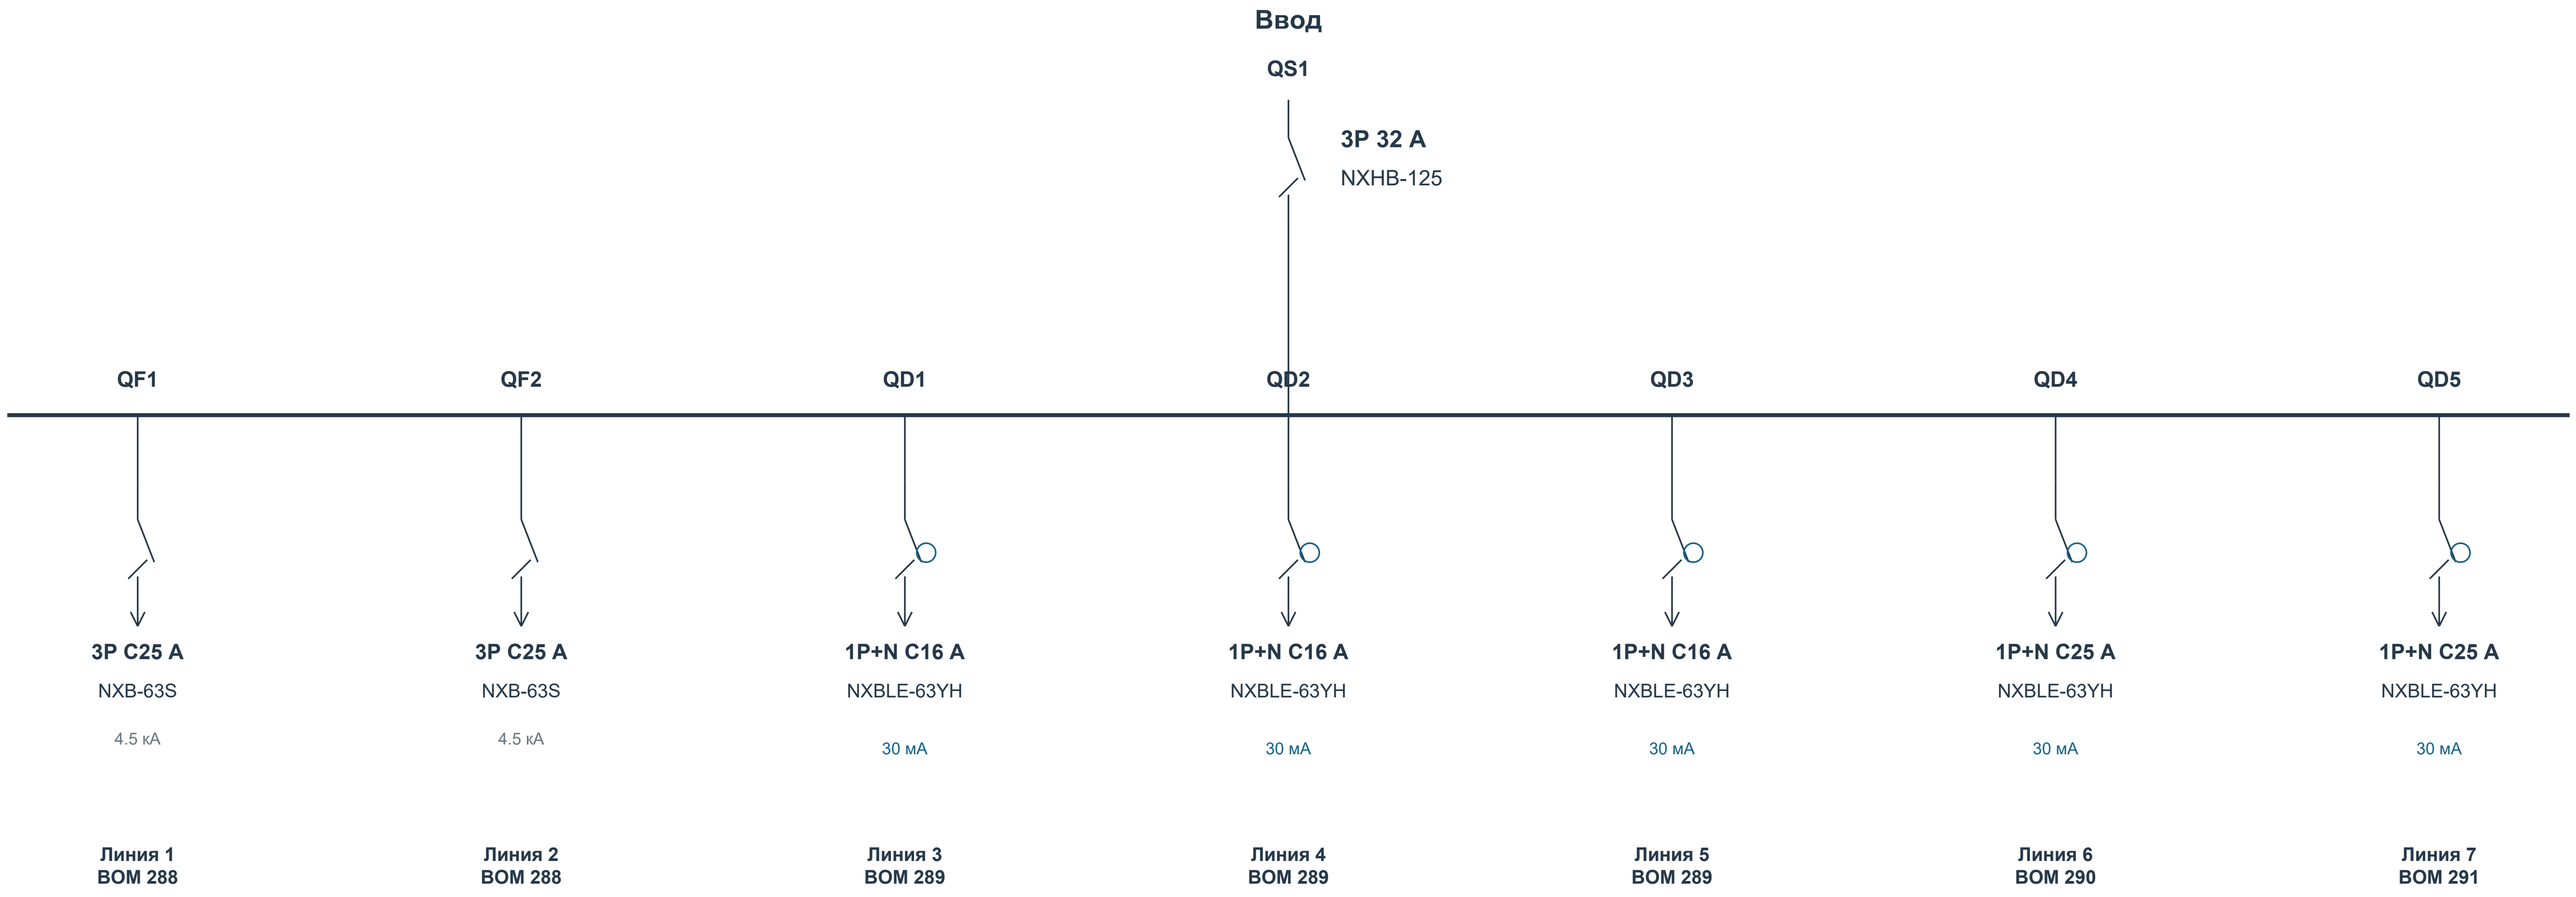
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QF2
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 288
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 288
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 289
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 289
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 289
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 290
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 291

Данные исходного проекта: Ру 12.1 кВт | Рр 4,0 кВт | Iр 19,1 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

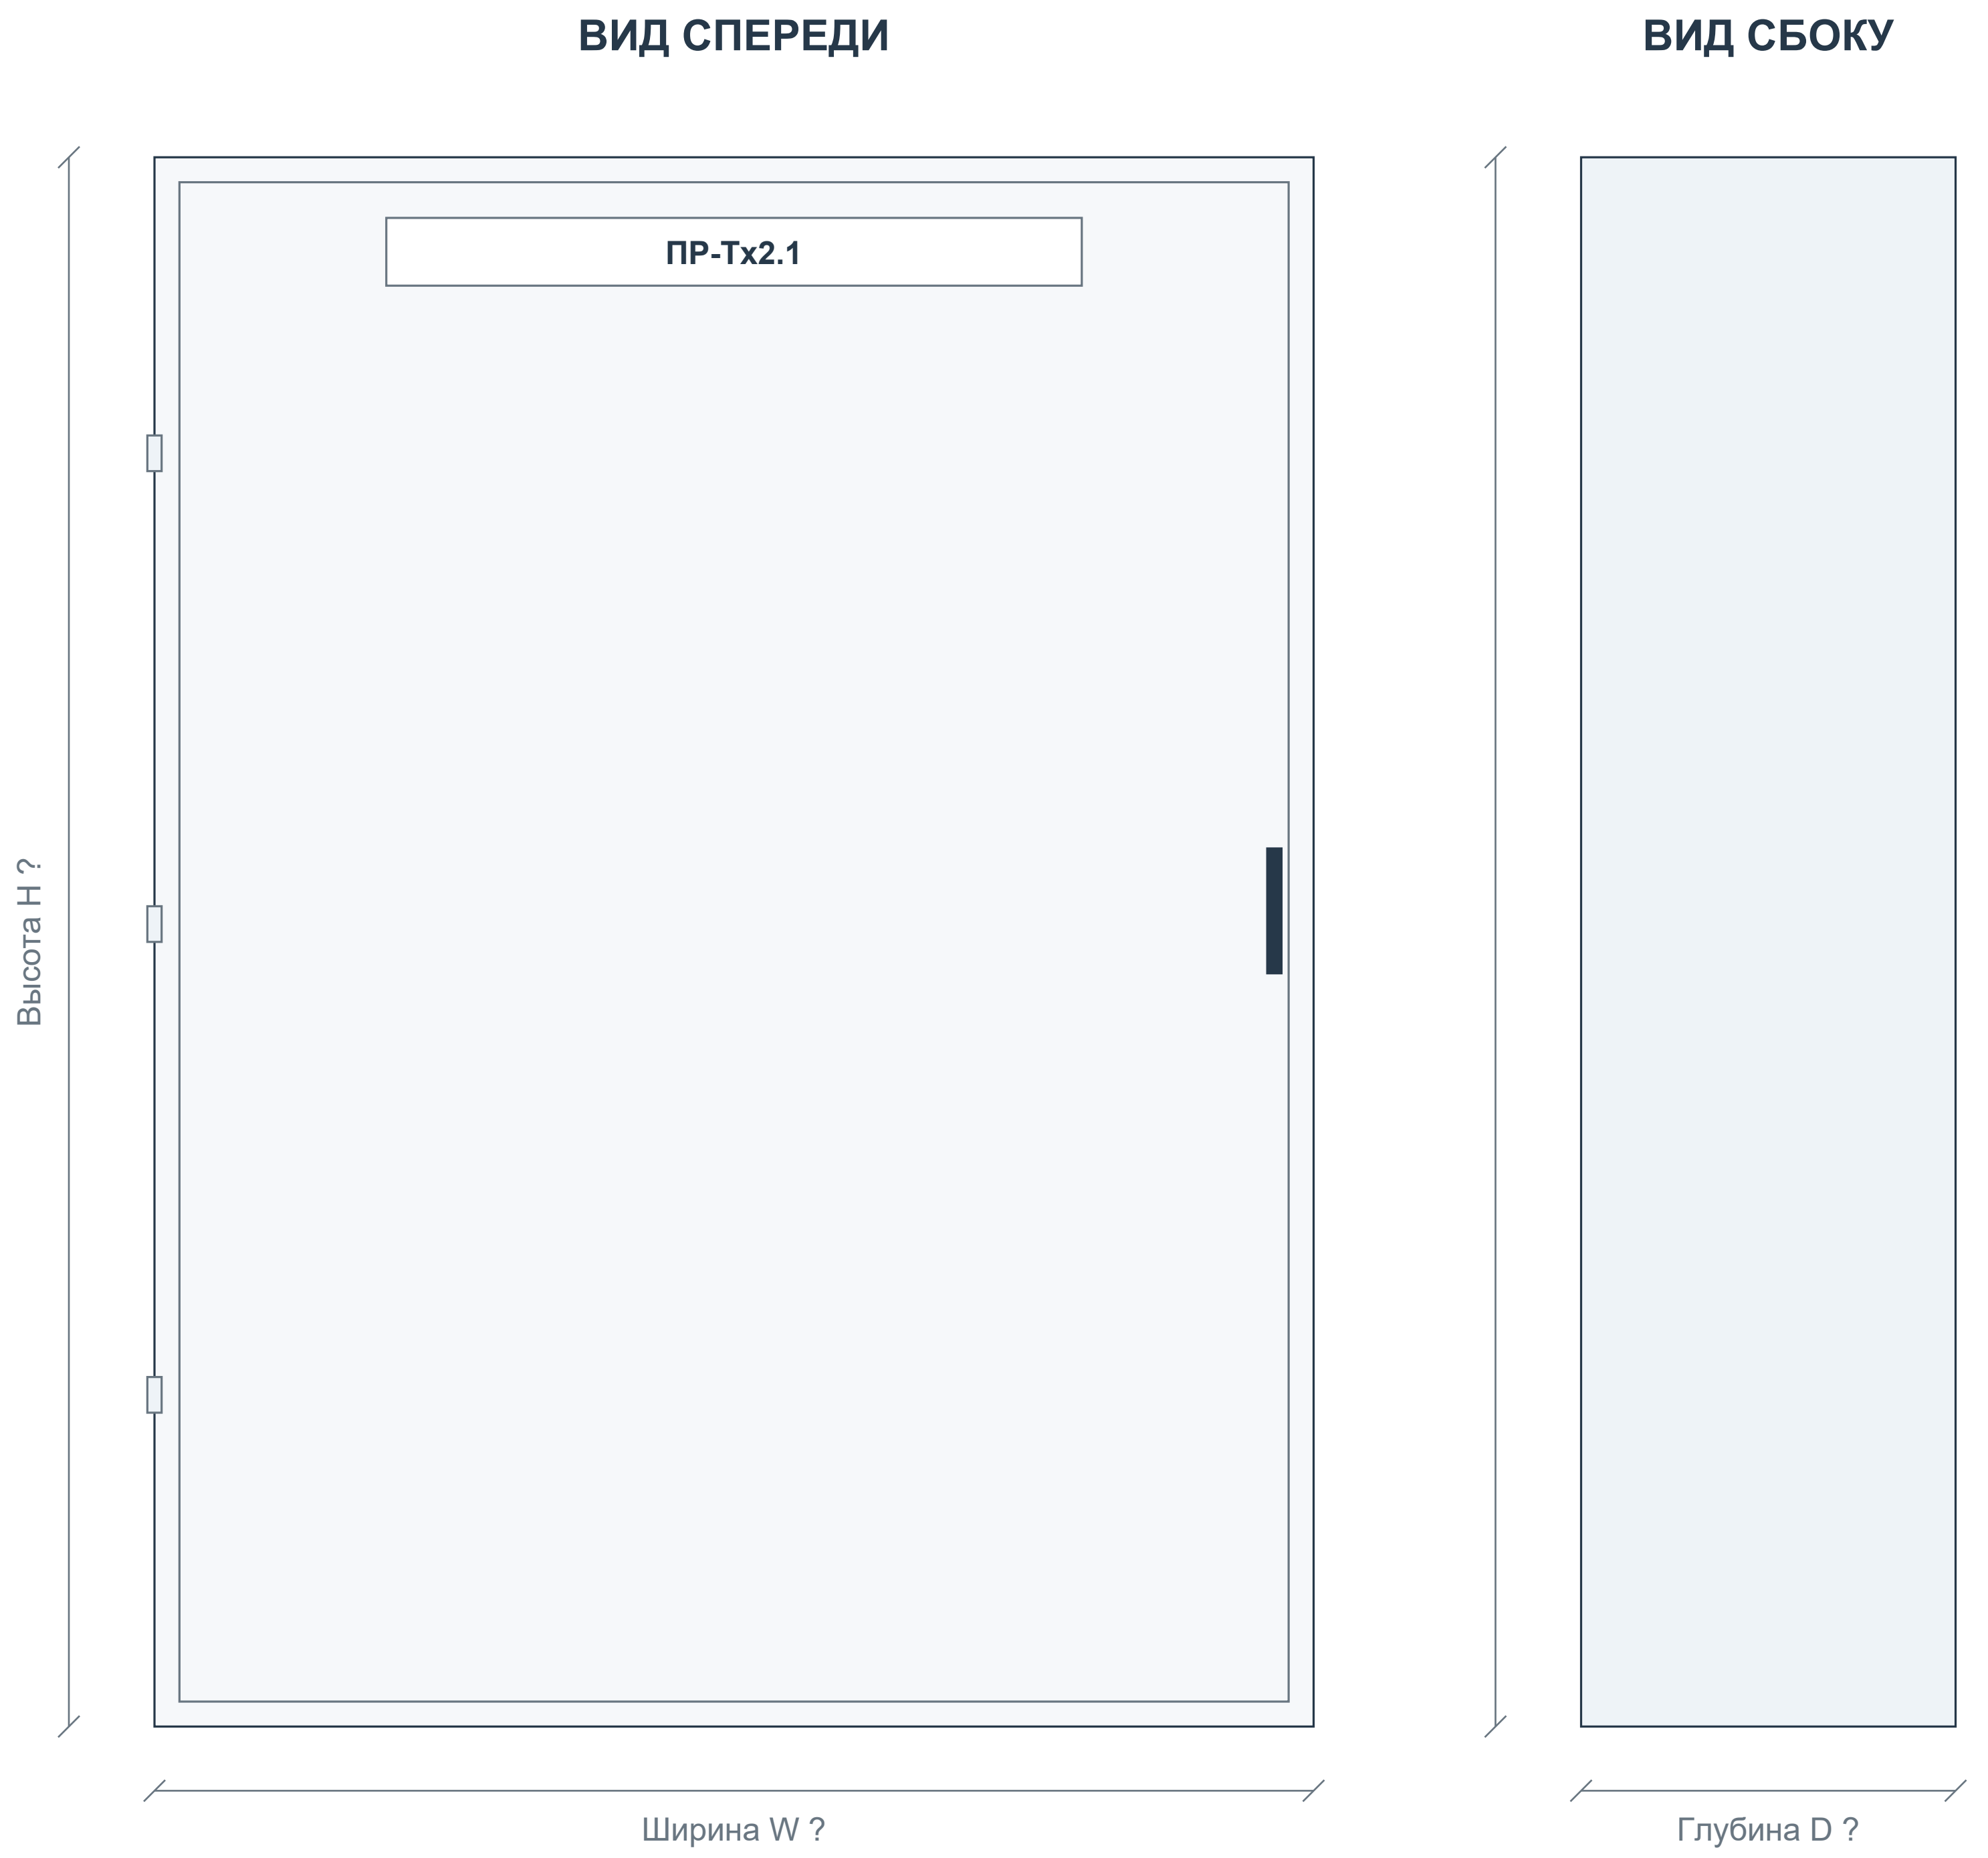

Корпус: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тx2.1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

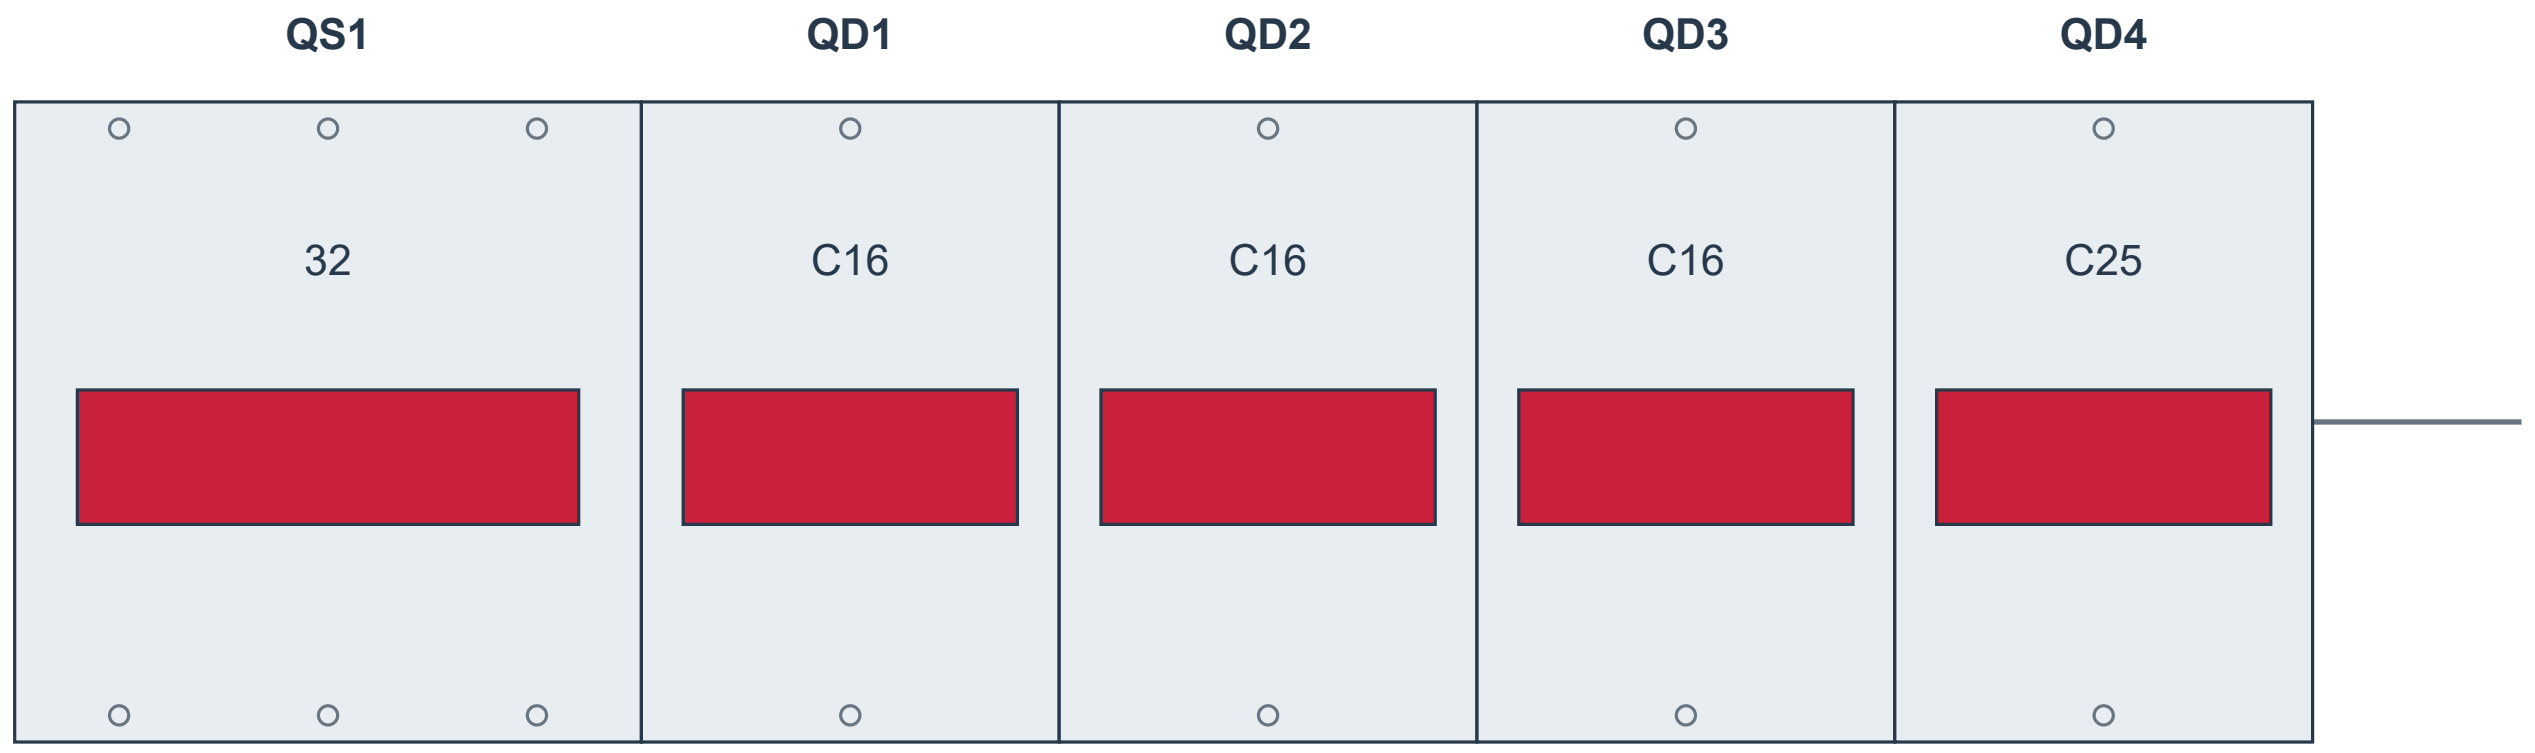

Сумма ширин: 198 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

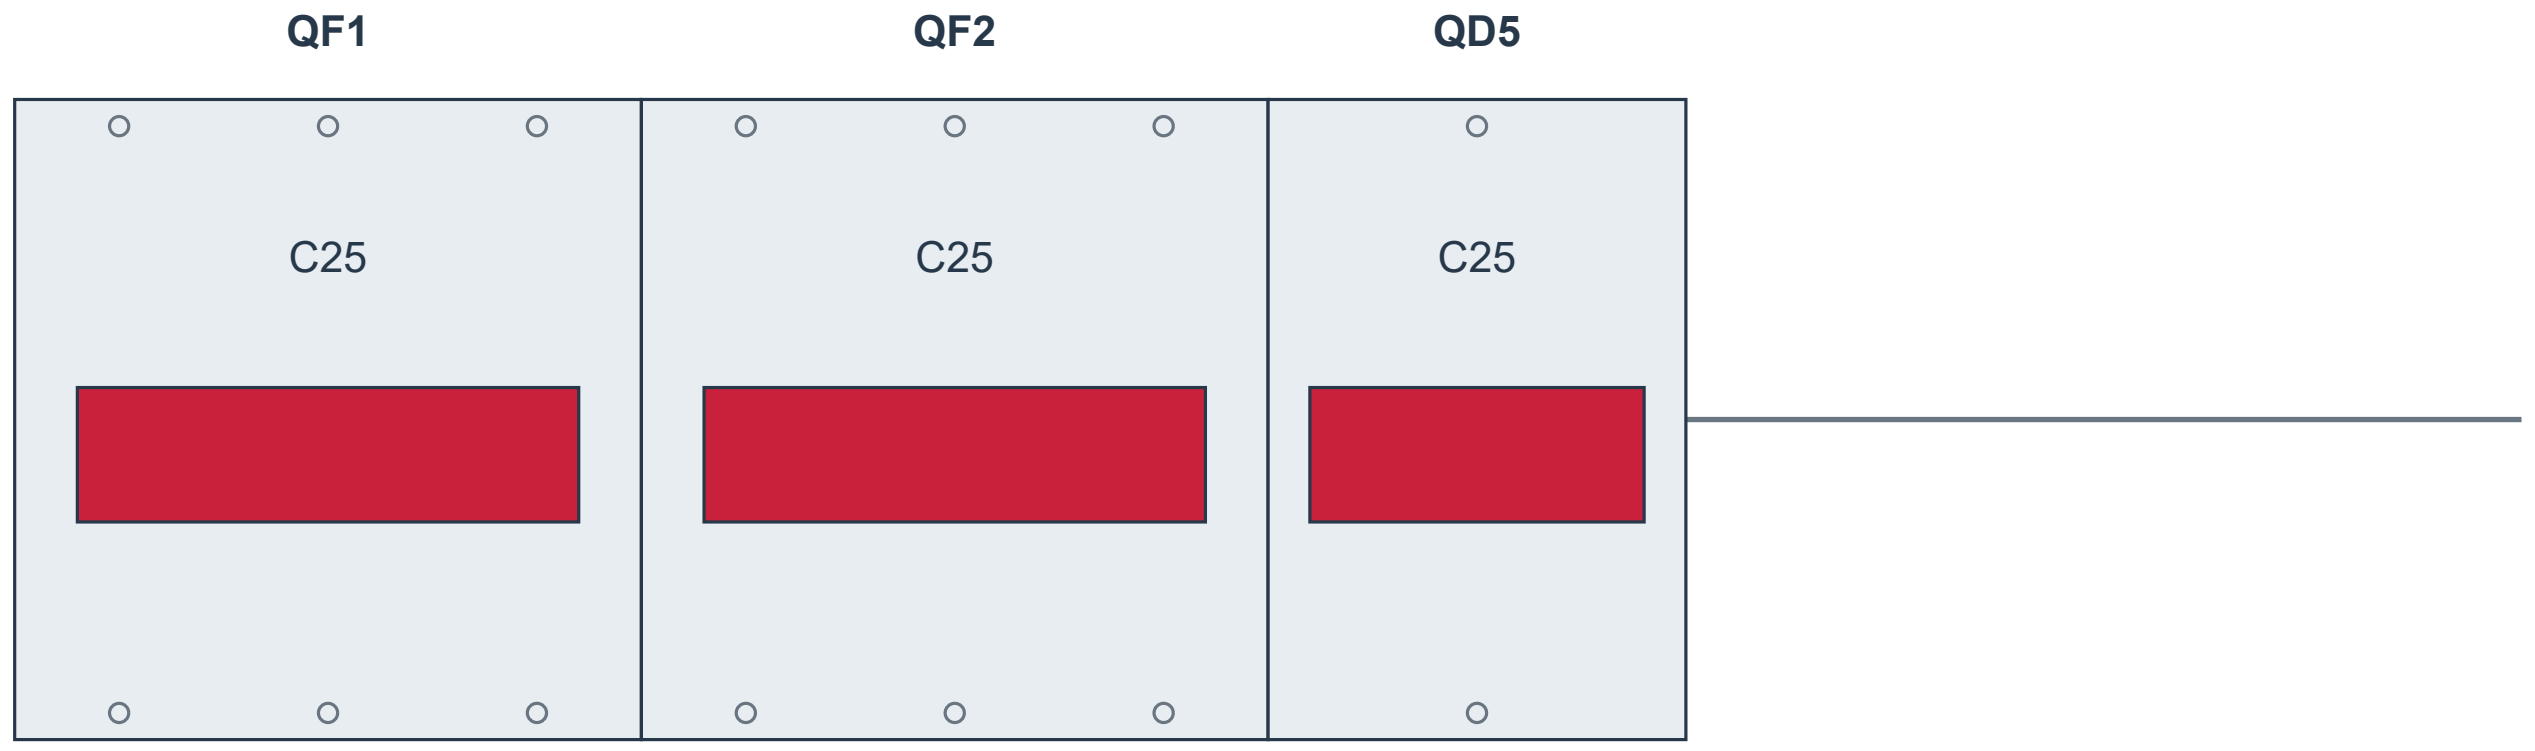

Сумма ширин: 144 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	287	1	0	?	54 B
QF1 - QF2	NXB-63S	288	2	0...54	?	54 B
QD1 - QD3	NXBLE-63YH	289	1	54...126	?	36 B
QD4	NXBLE-63YH	290	1	162	?	36 B
QD5	NXBLE-63YH	291	2	108	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Актуальная спецификация

ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 308 | ЭОМ, PDF стр. 20

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
309	713-09054	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
310	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
311	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 20

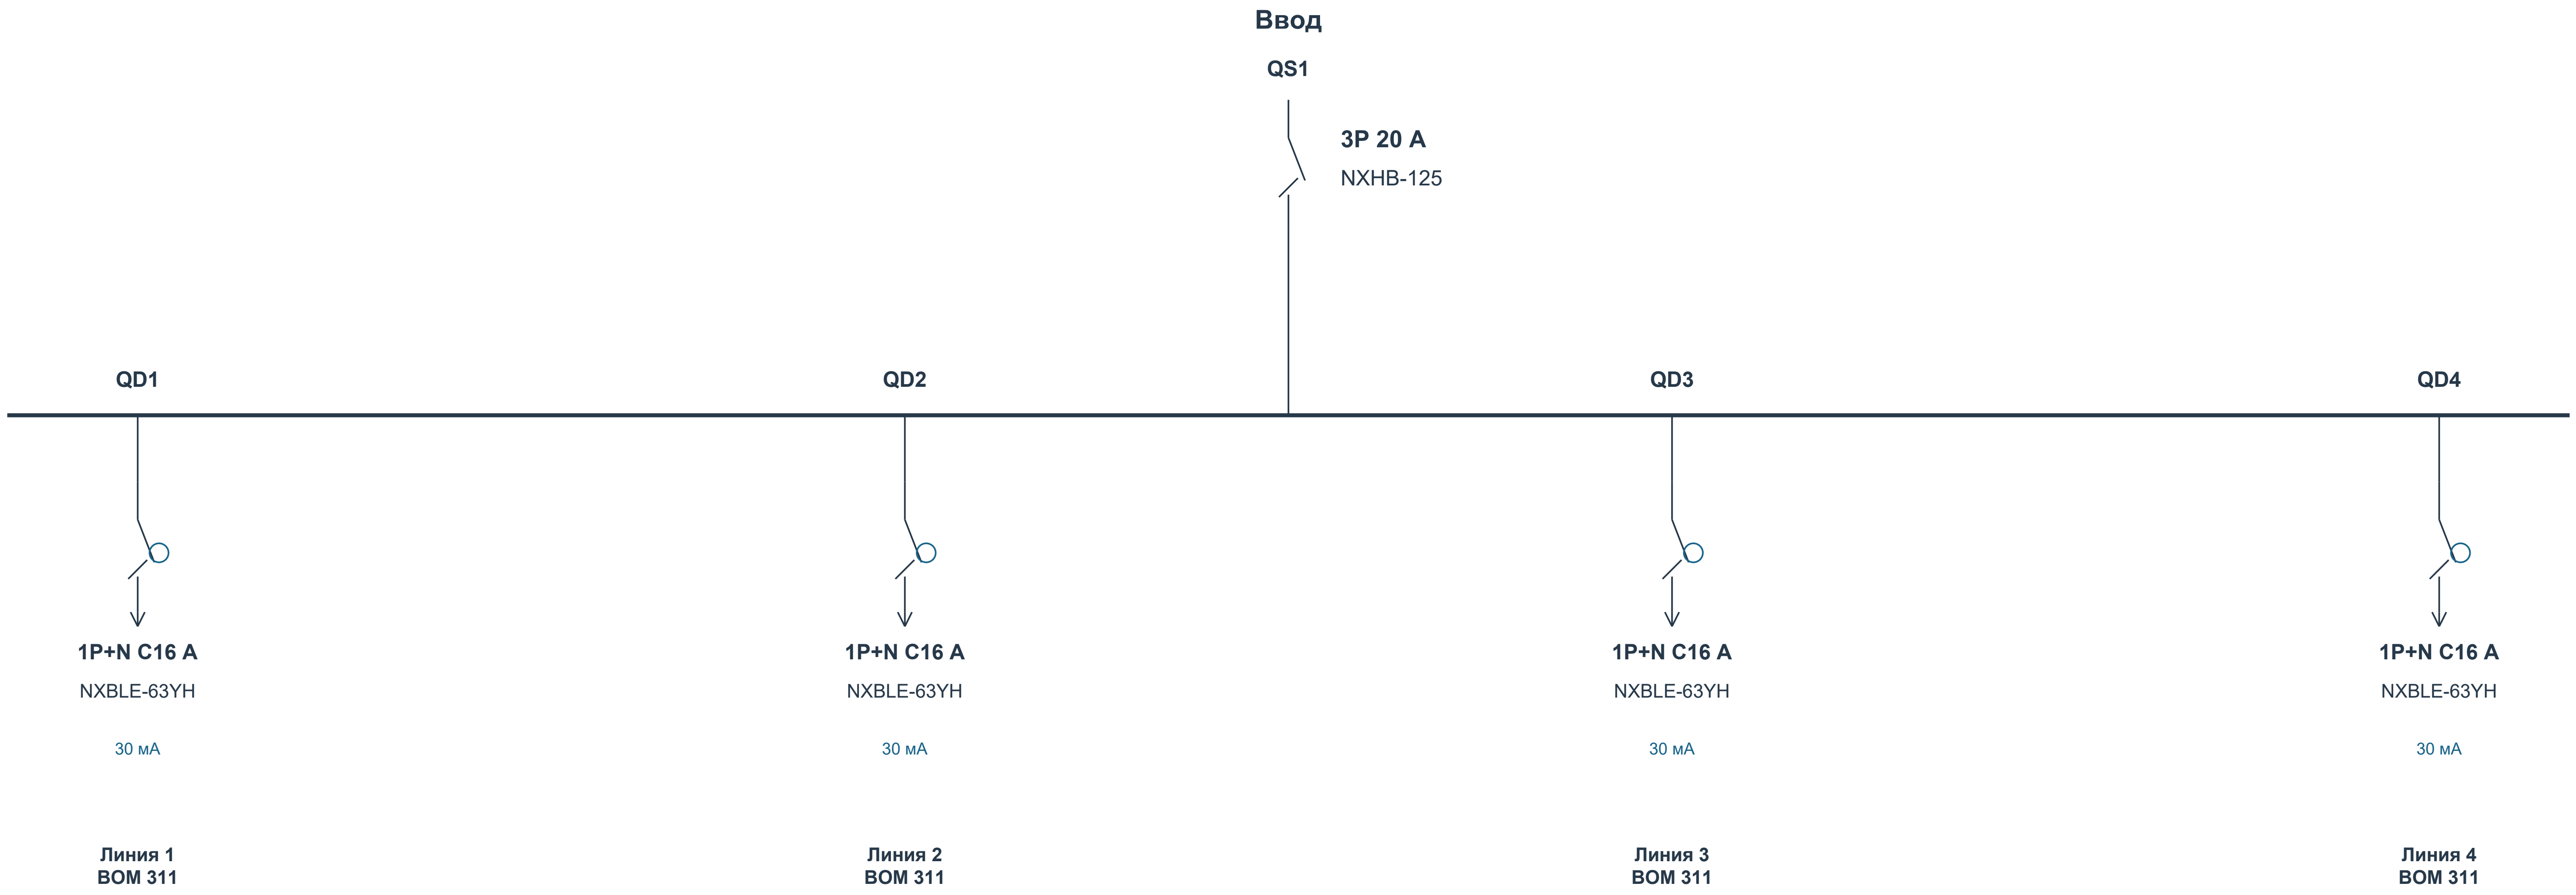
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QD1
QD2
QD3
QD4
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 311
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 311
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 311
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 311

Данные исходного проекта: Ру 3.18 кВт | Рр 1,3 кВт | Iр 2,0 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

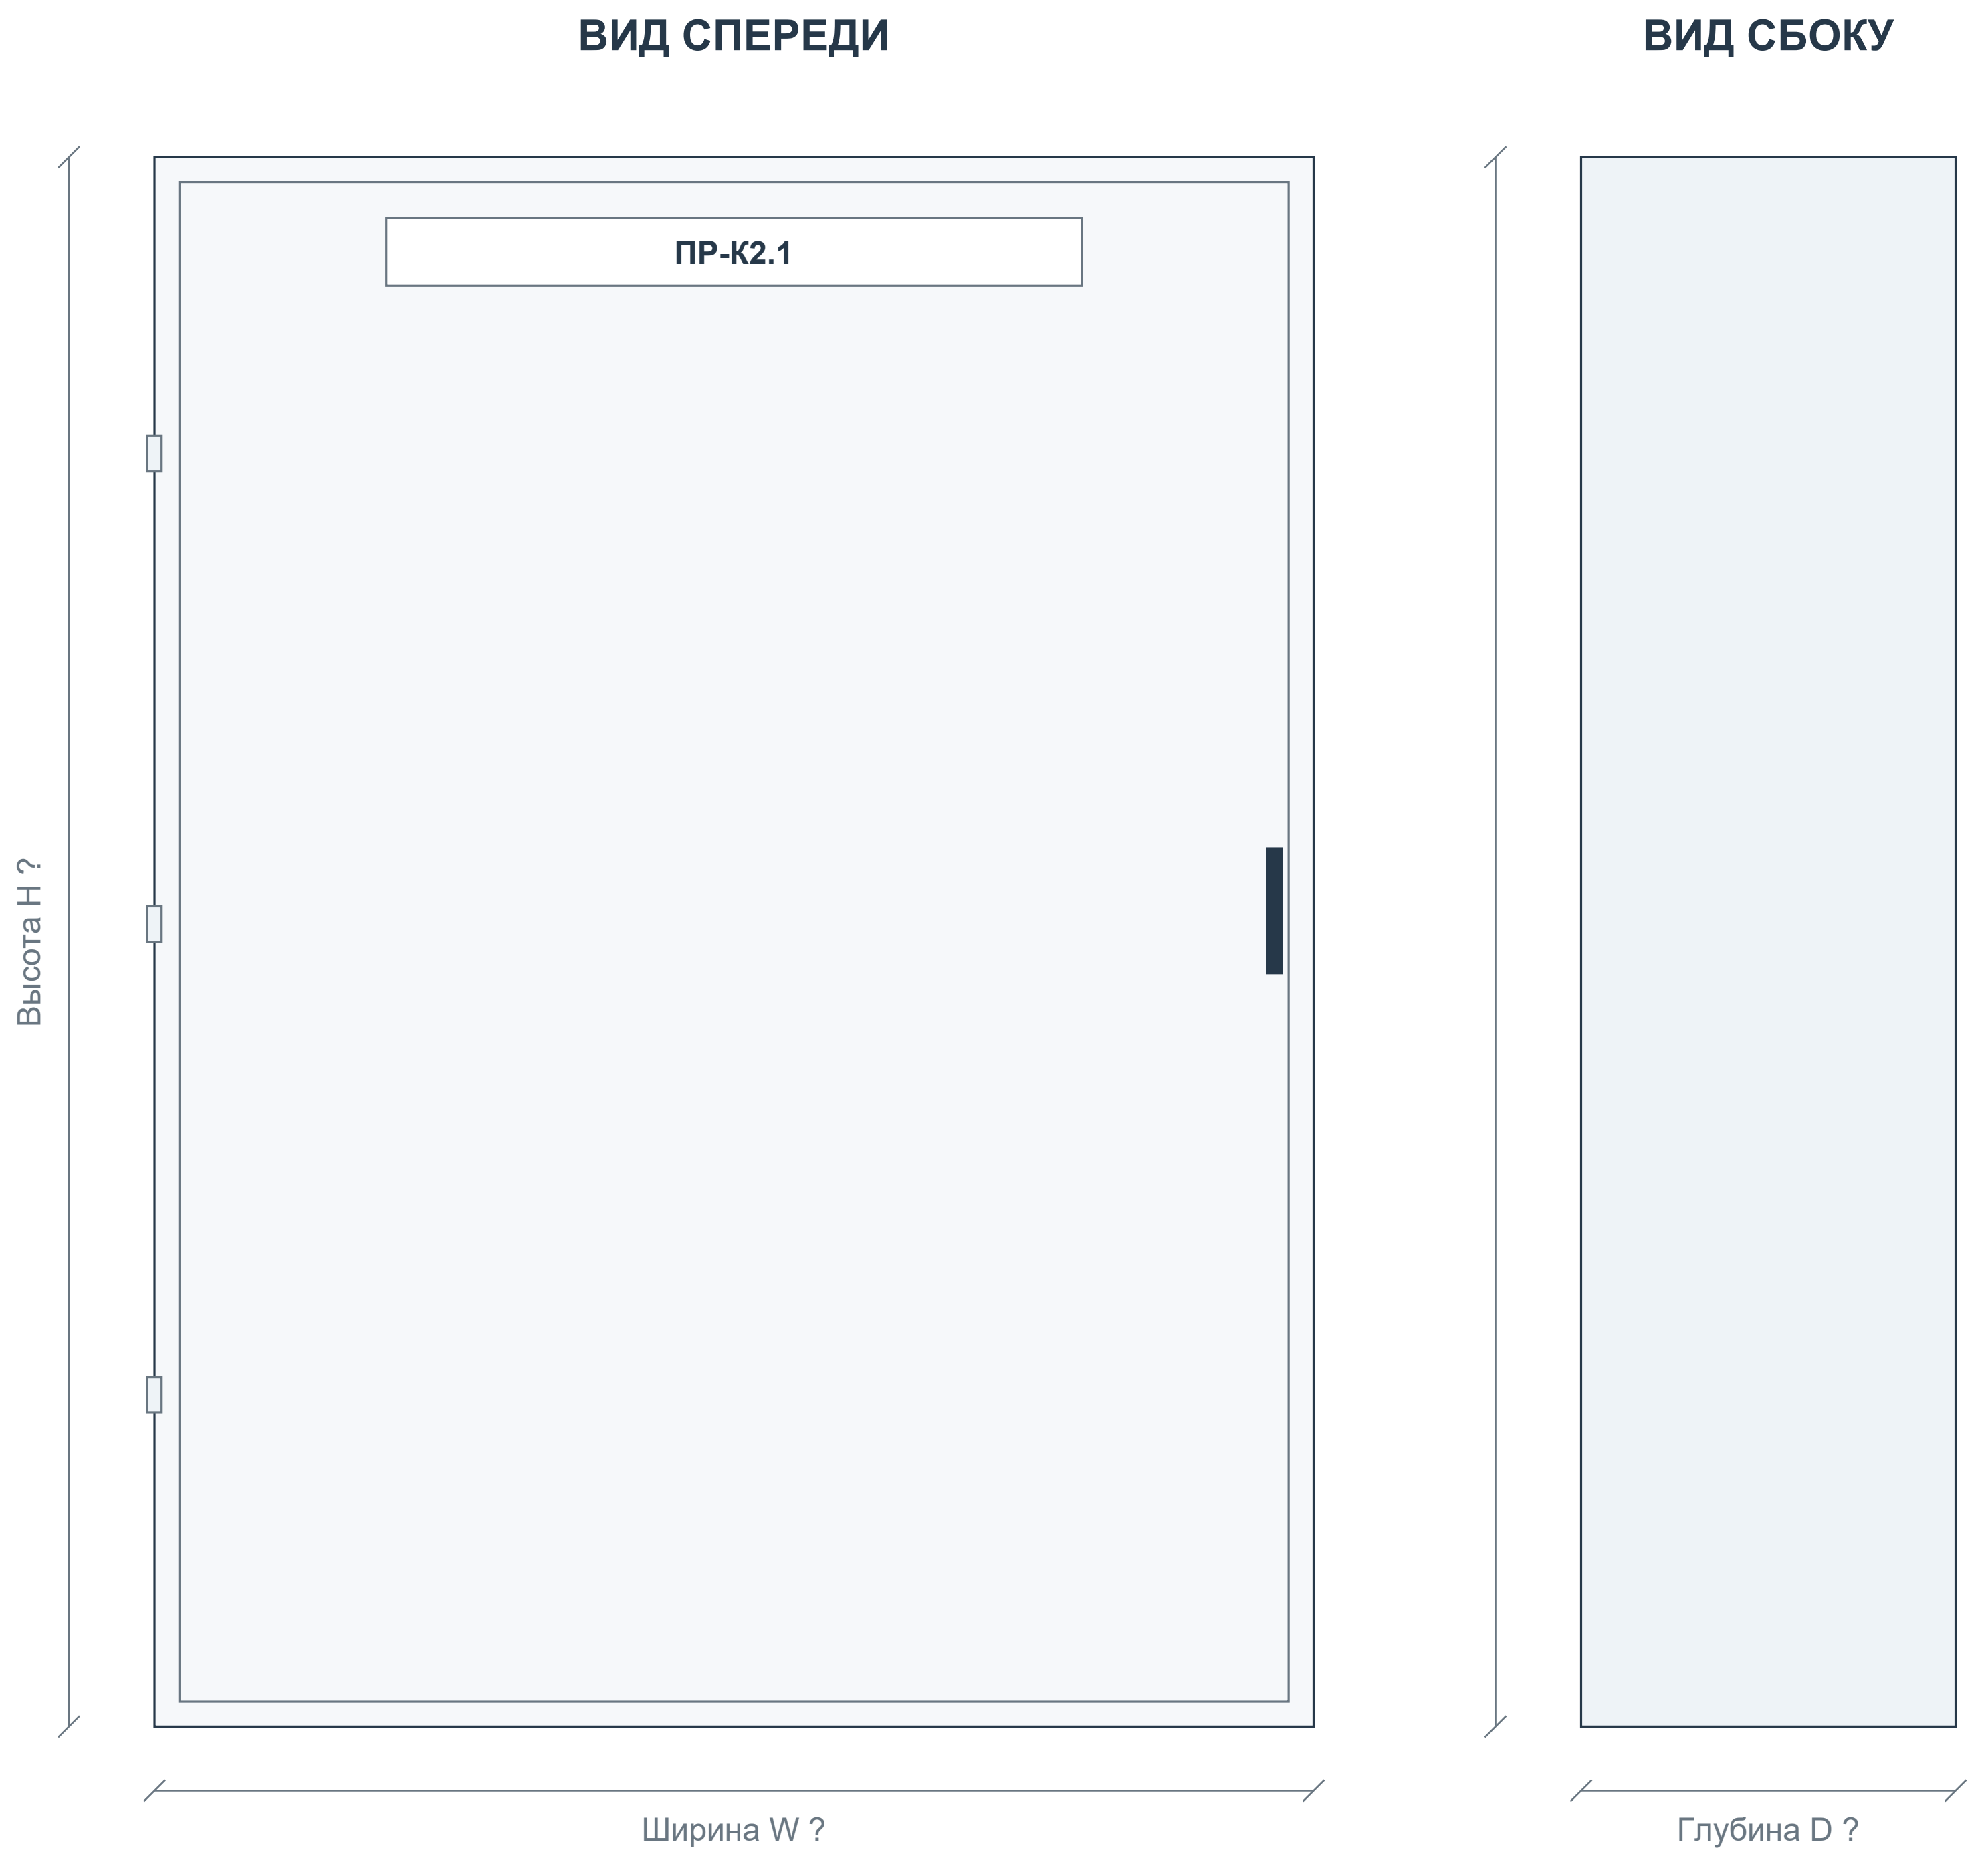

Корпус: Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные ВОМ. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

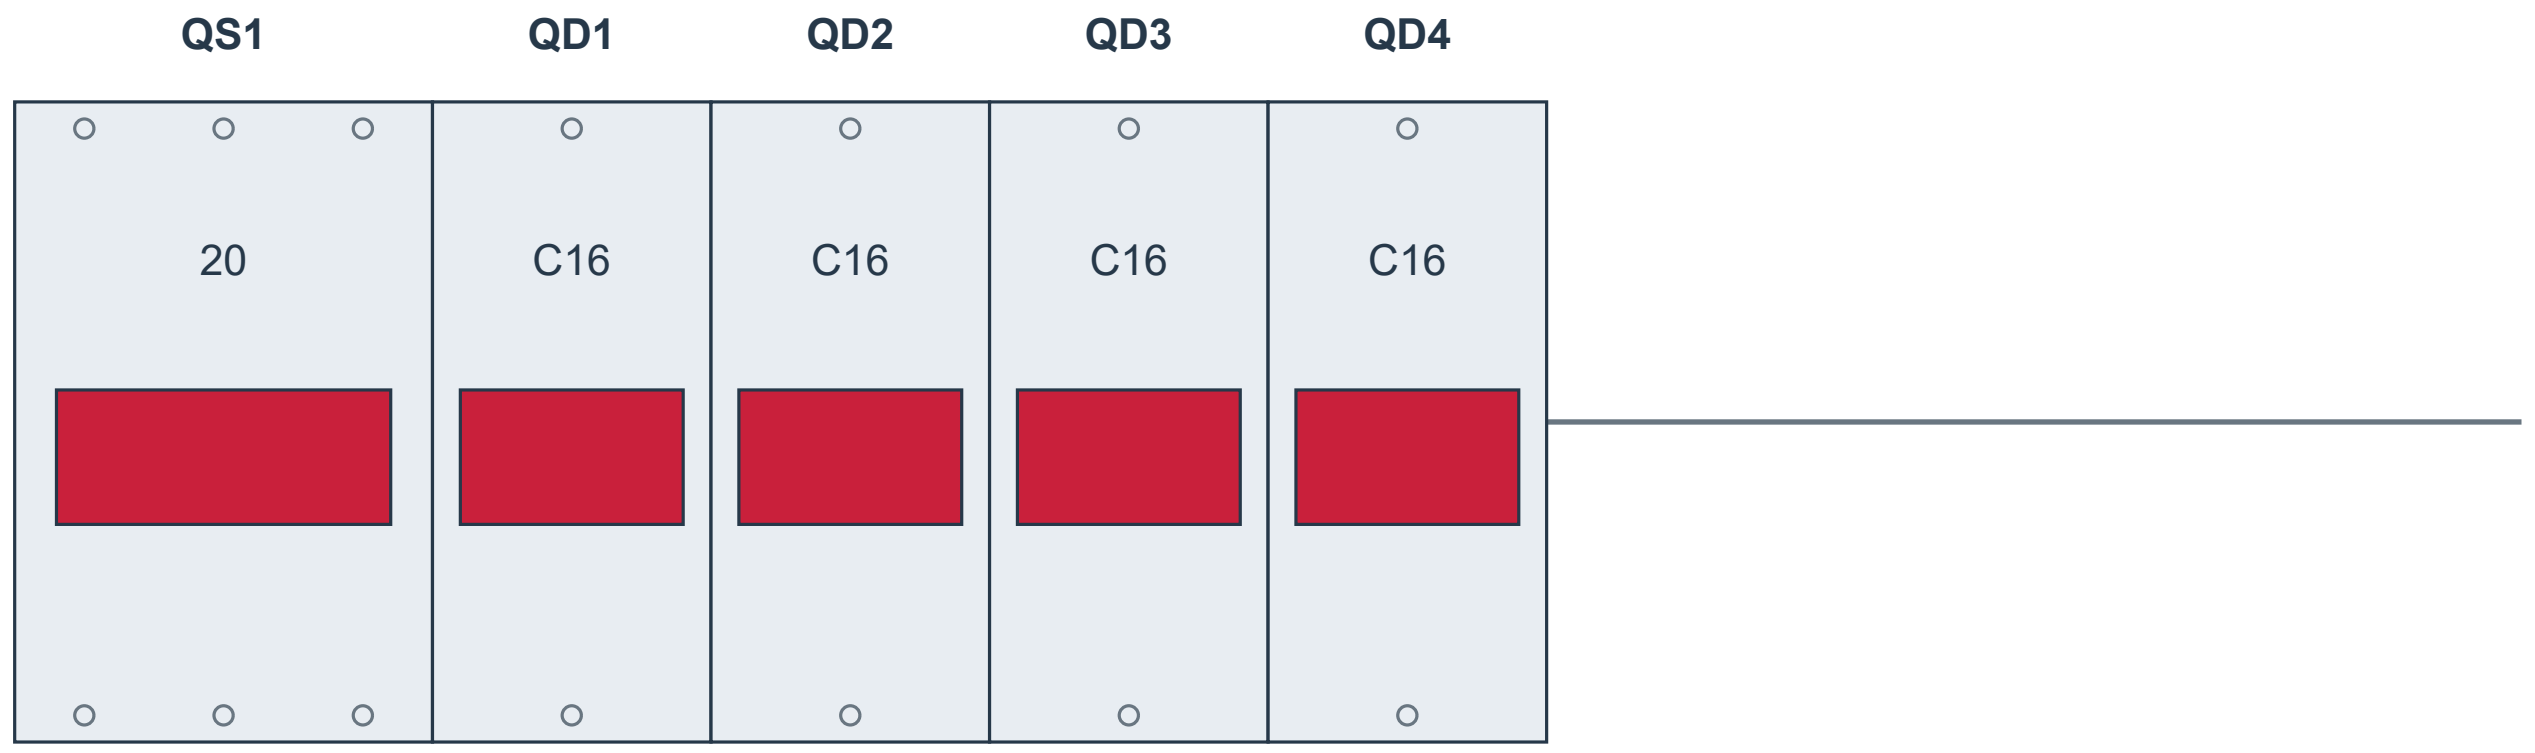

Сумма ширин: 198 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	310	1	0	?	54 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	311	1	54...162	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 18 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Актуальная спецификация

ПРК-2 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 325 | ЭОМ, PDF стр. 21

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
326	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
327	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
328	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
329	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
330	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
331	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 21

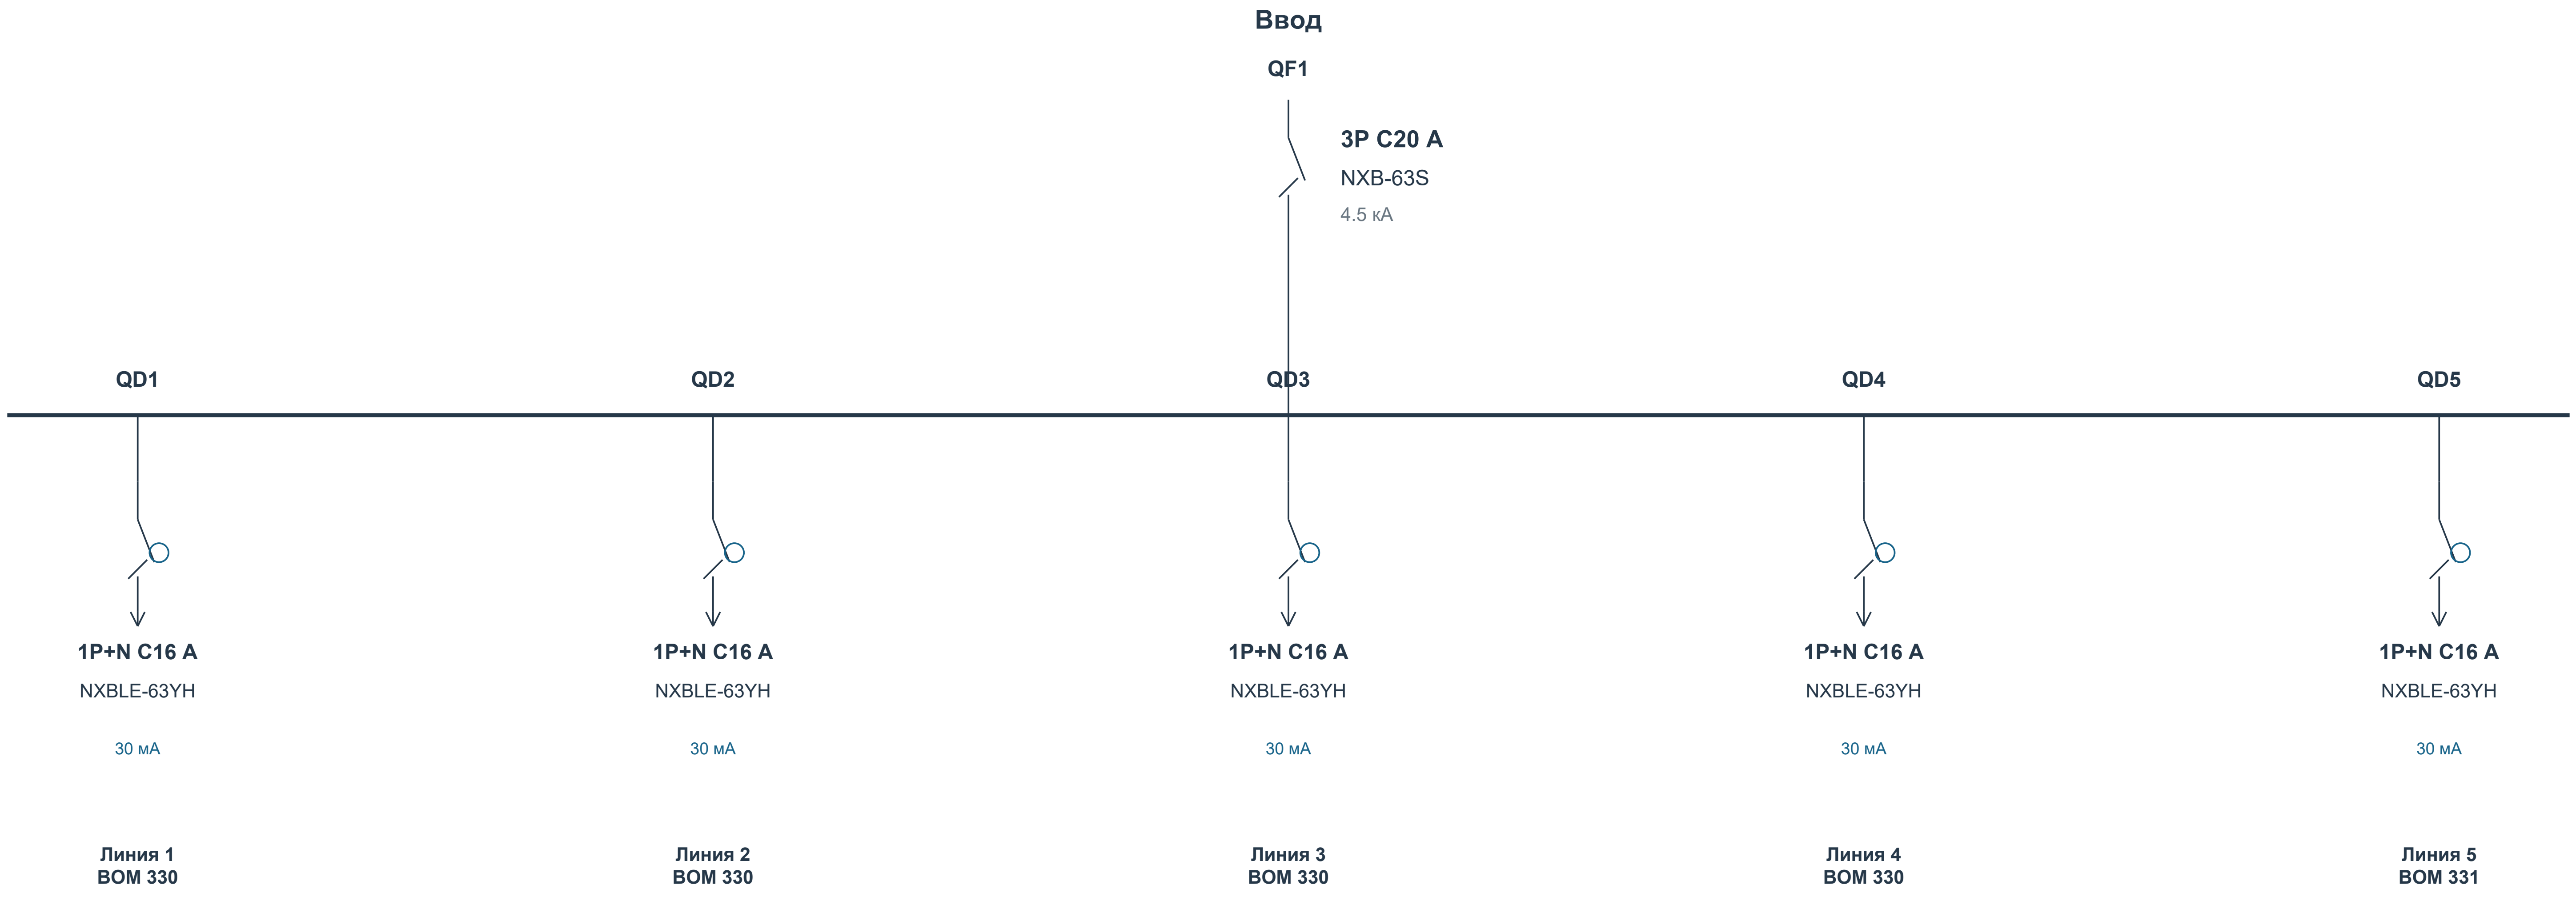
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 330
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 330
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 330
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 330
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 331

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 5.9 кВт | Рр 5,0 кВт | Ір 8,0 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

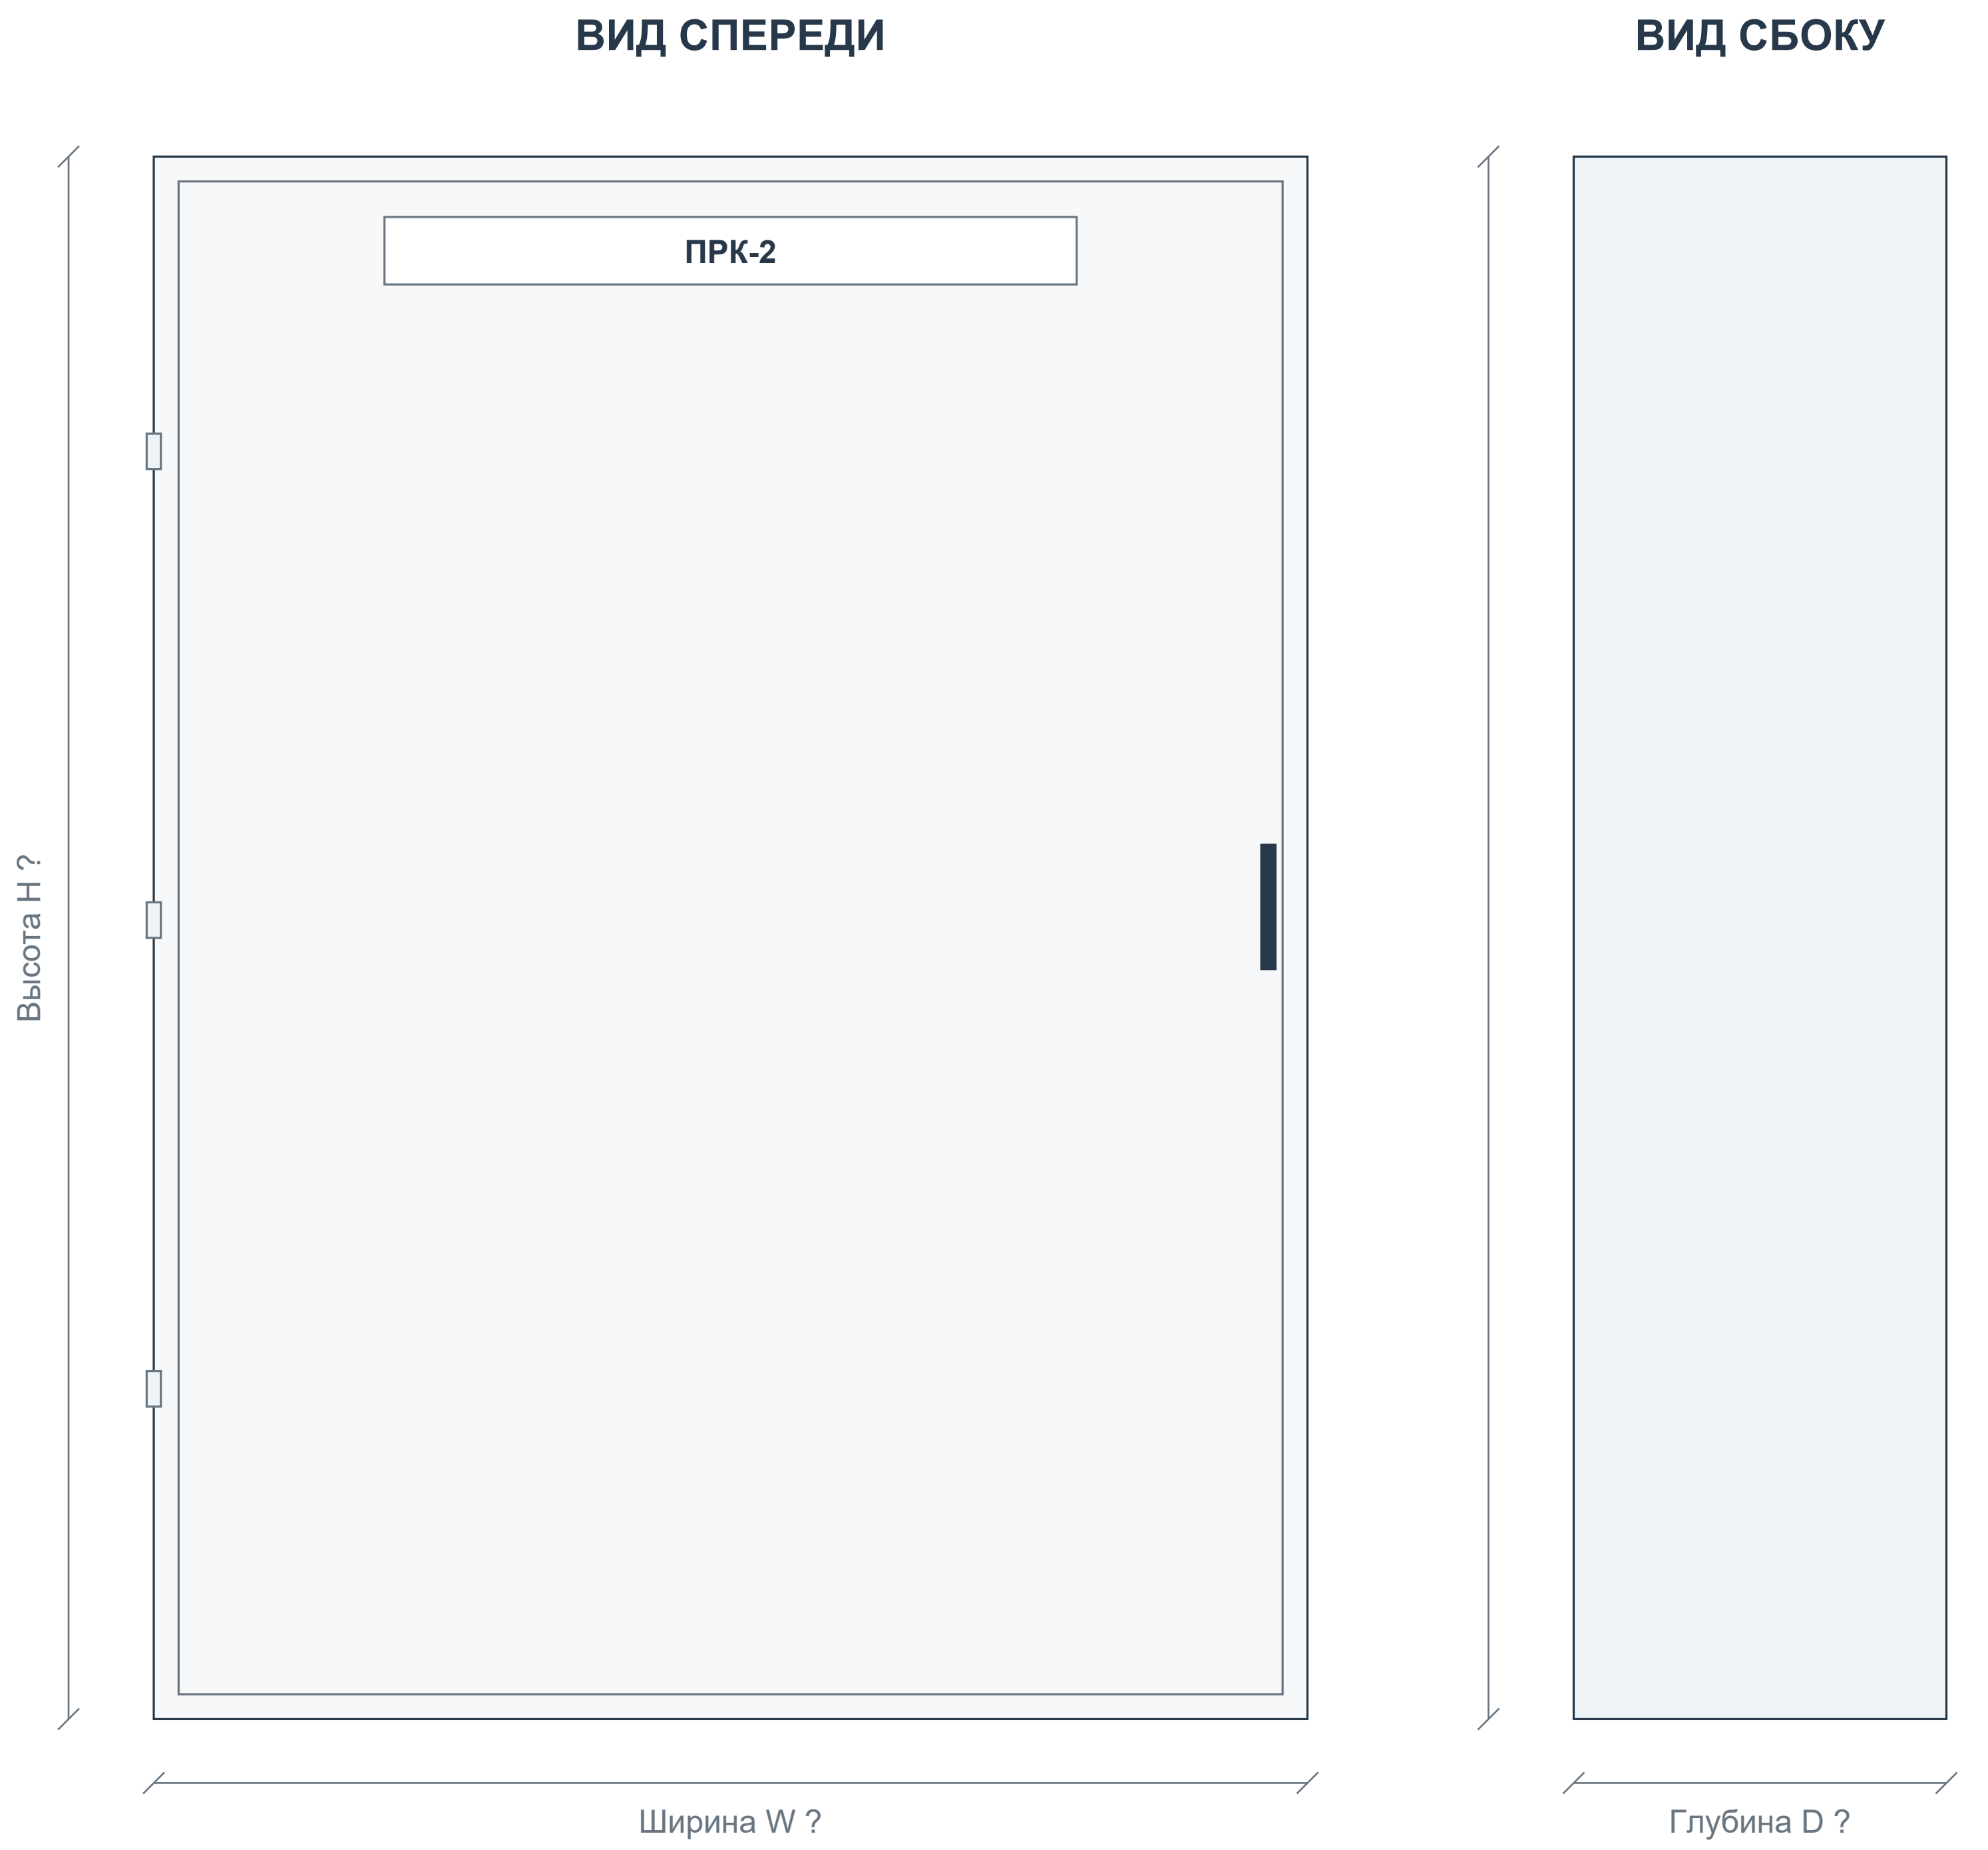

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

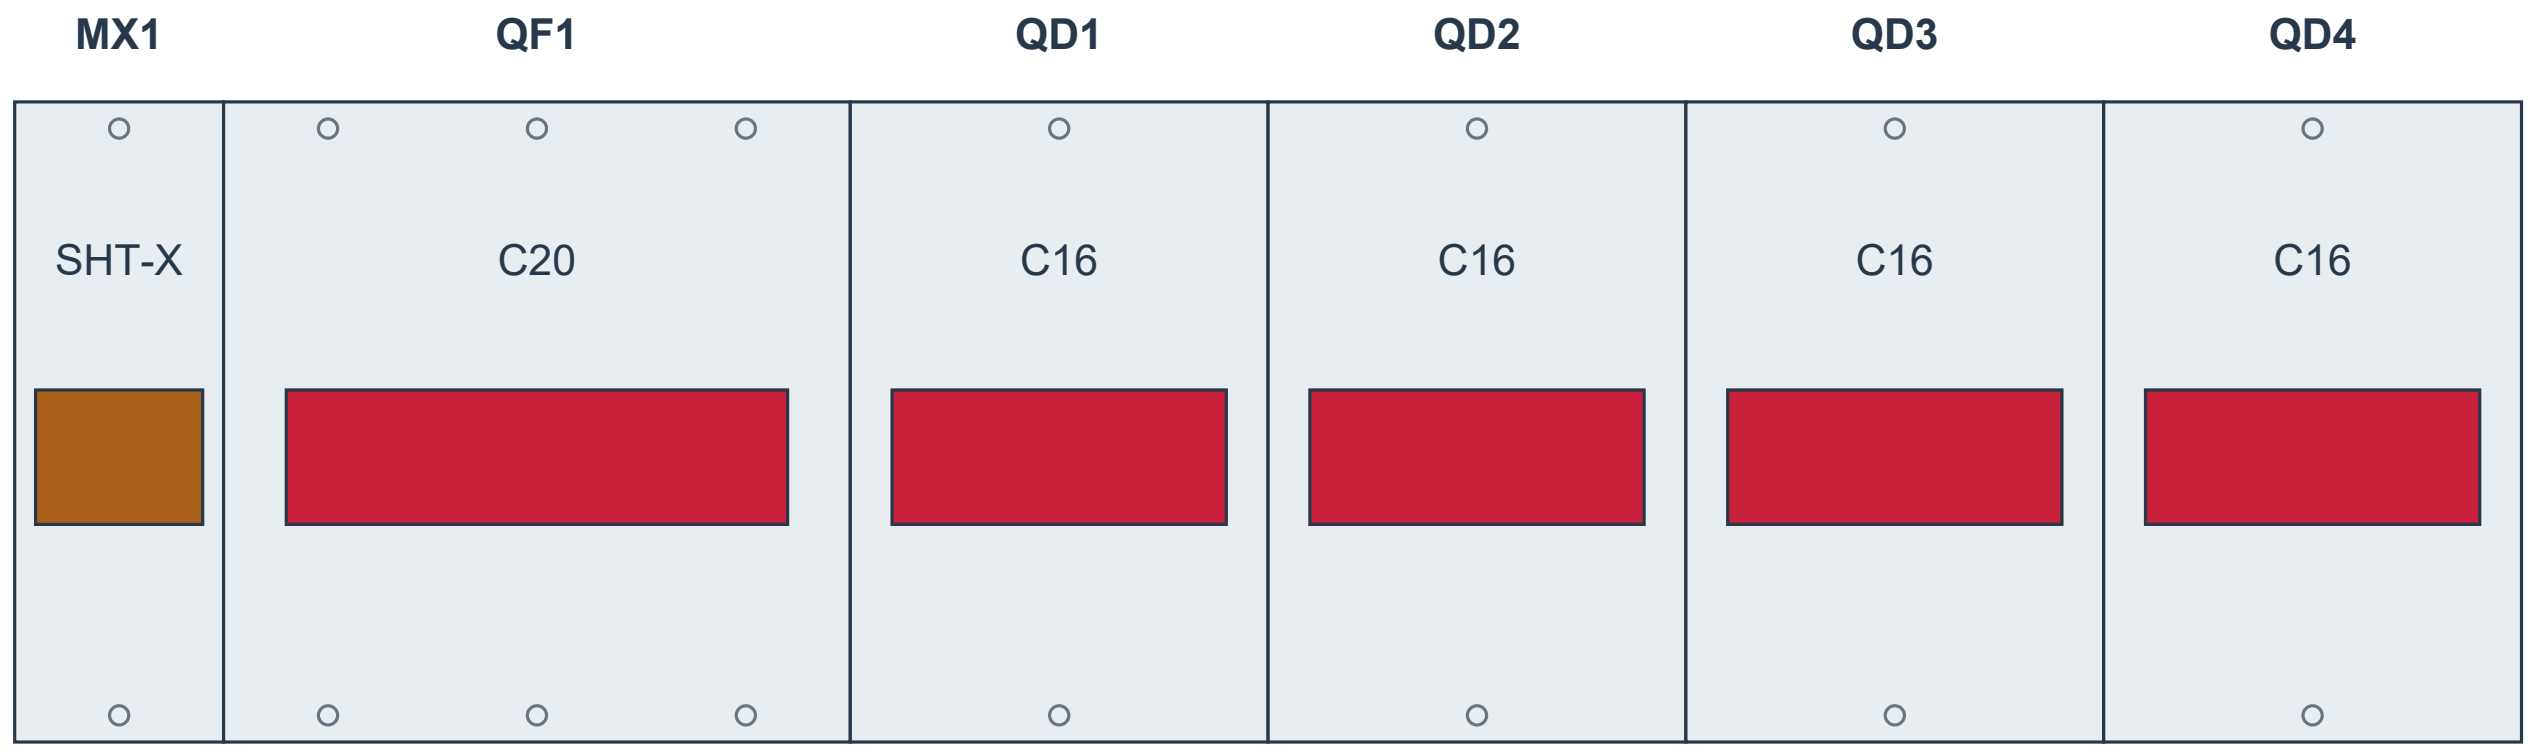

Сумма ширин: 216 мм В

Ряд 2 | модульная раскладка D

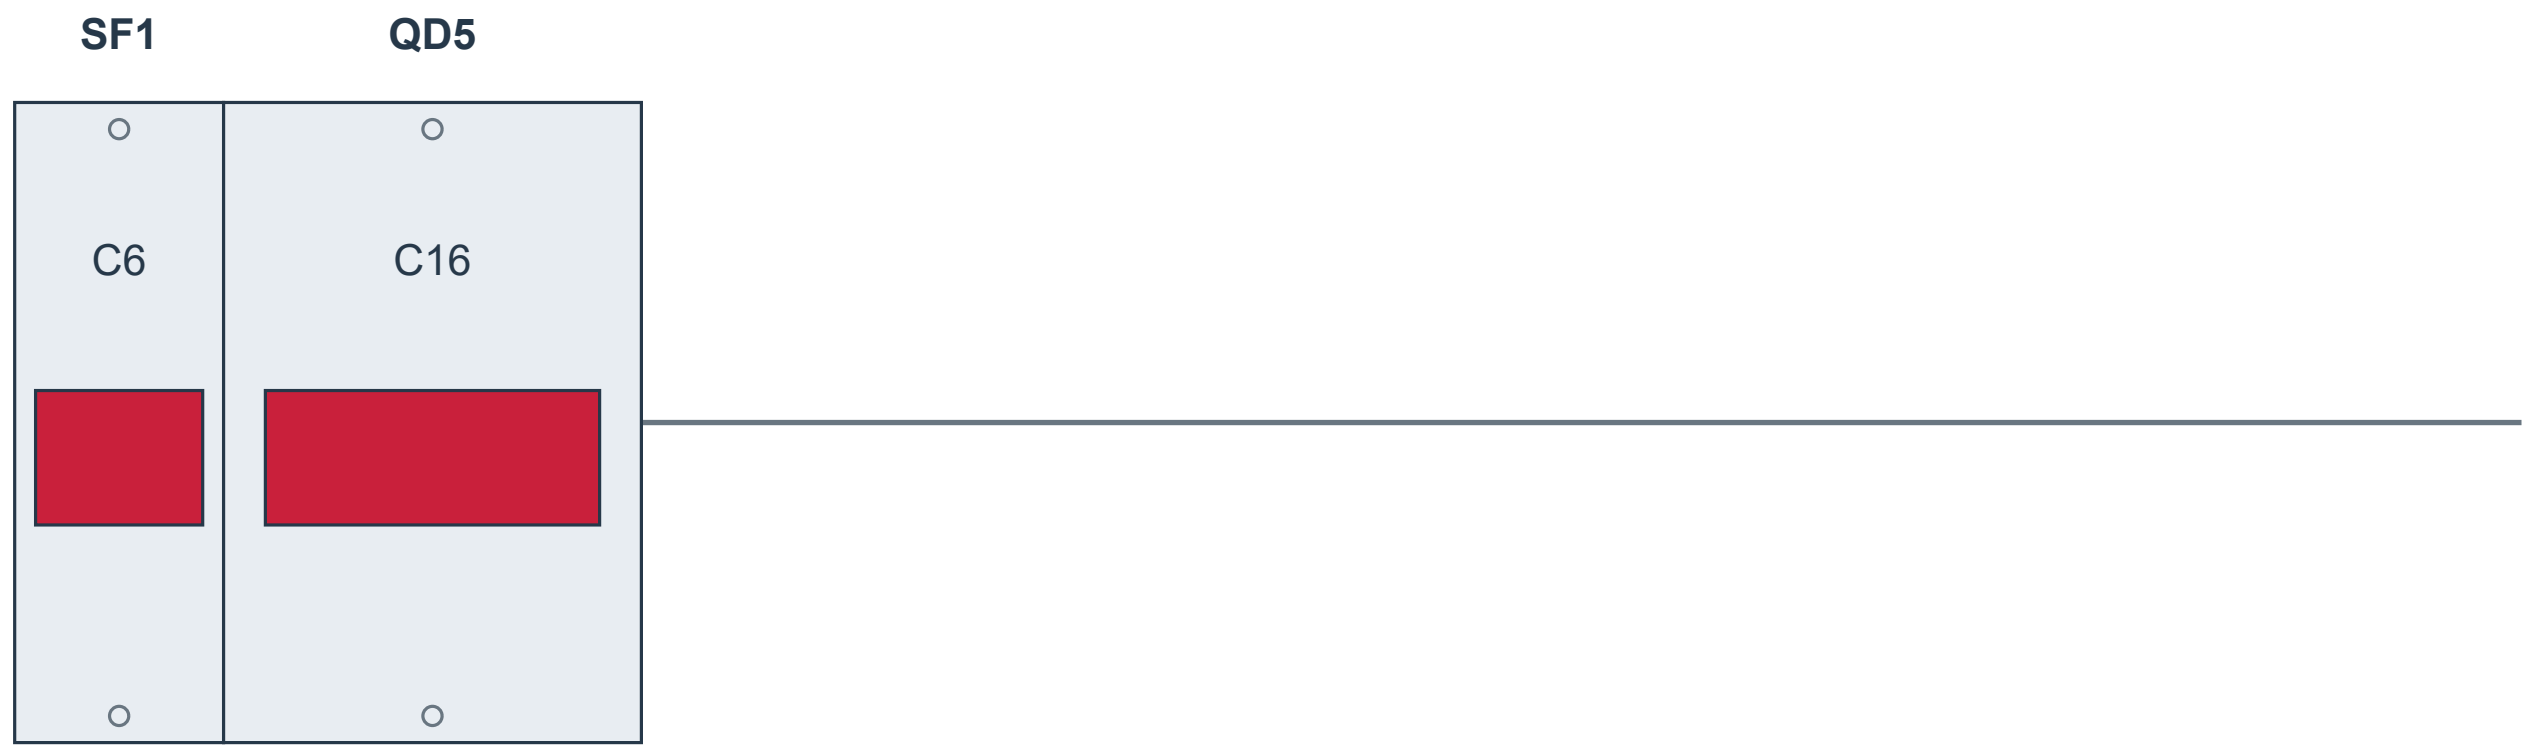

Сумма ширин: 54 мм В

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	327	1	0	?	18 B
QF1	NXB-63S	328	1	18	?	54 B
SF1	NXB-63S	329	2	0	?	18 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	330	1	72...180	?	36 B
QD5	NXBLE-63YH	331	2	18	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Актуальная спецификация

ПРК-3 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 348 | ЭОМ, PDF стр. 22

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
349	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
350	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
351	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
352	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
353	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
354	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 22

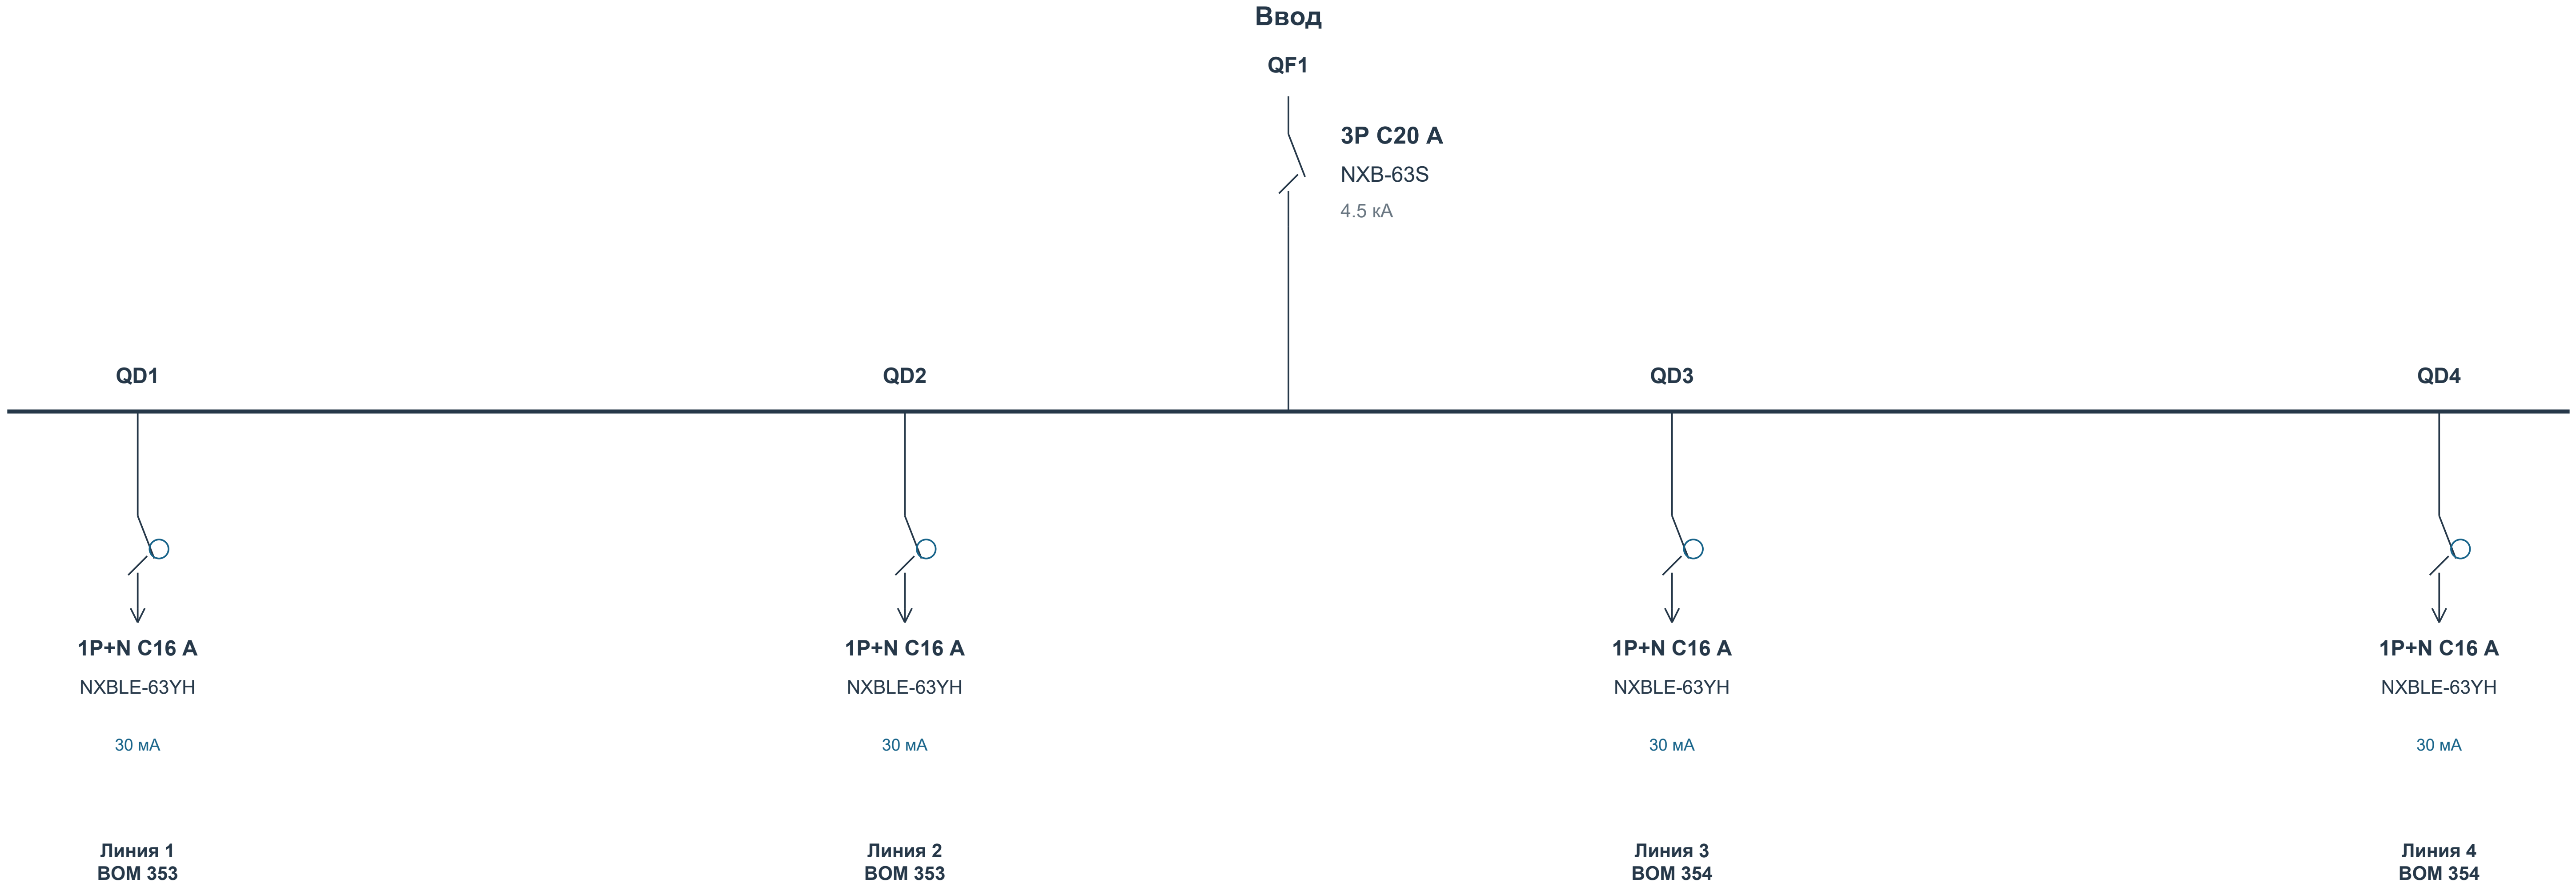
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 353
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 353
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 354
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 354

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 2.3 кВт | Рр 2,0 кВт | Ір 3,3 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

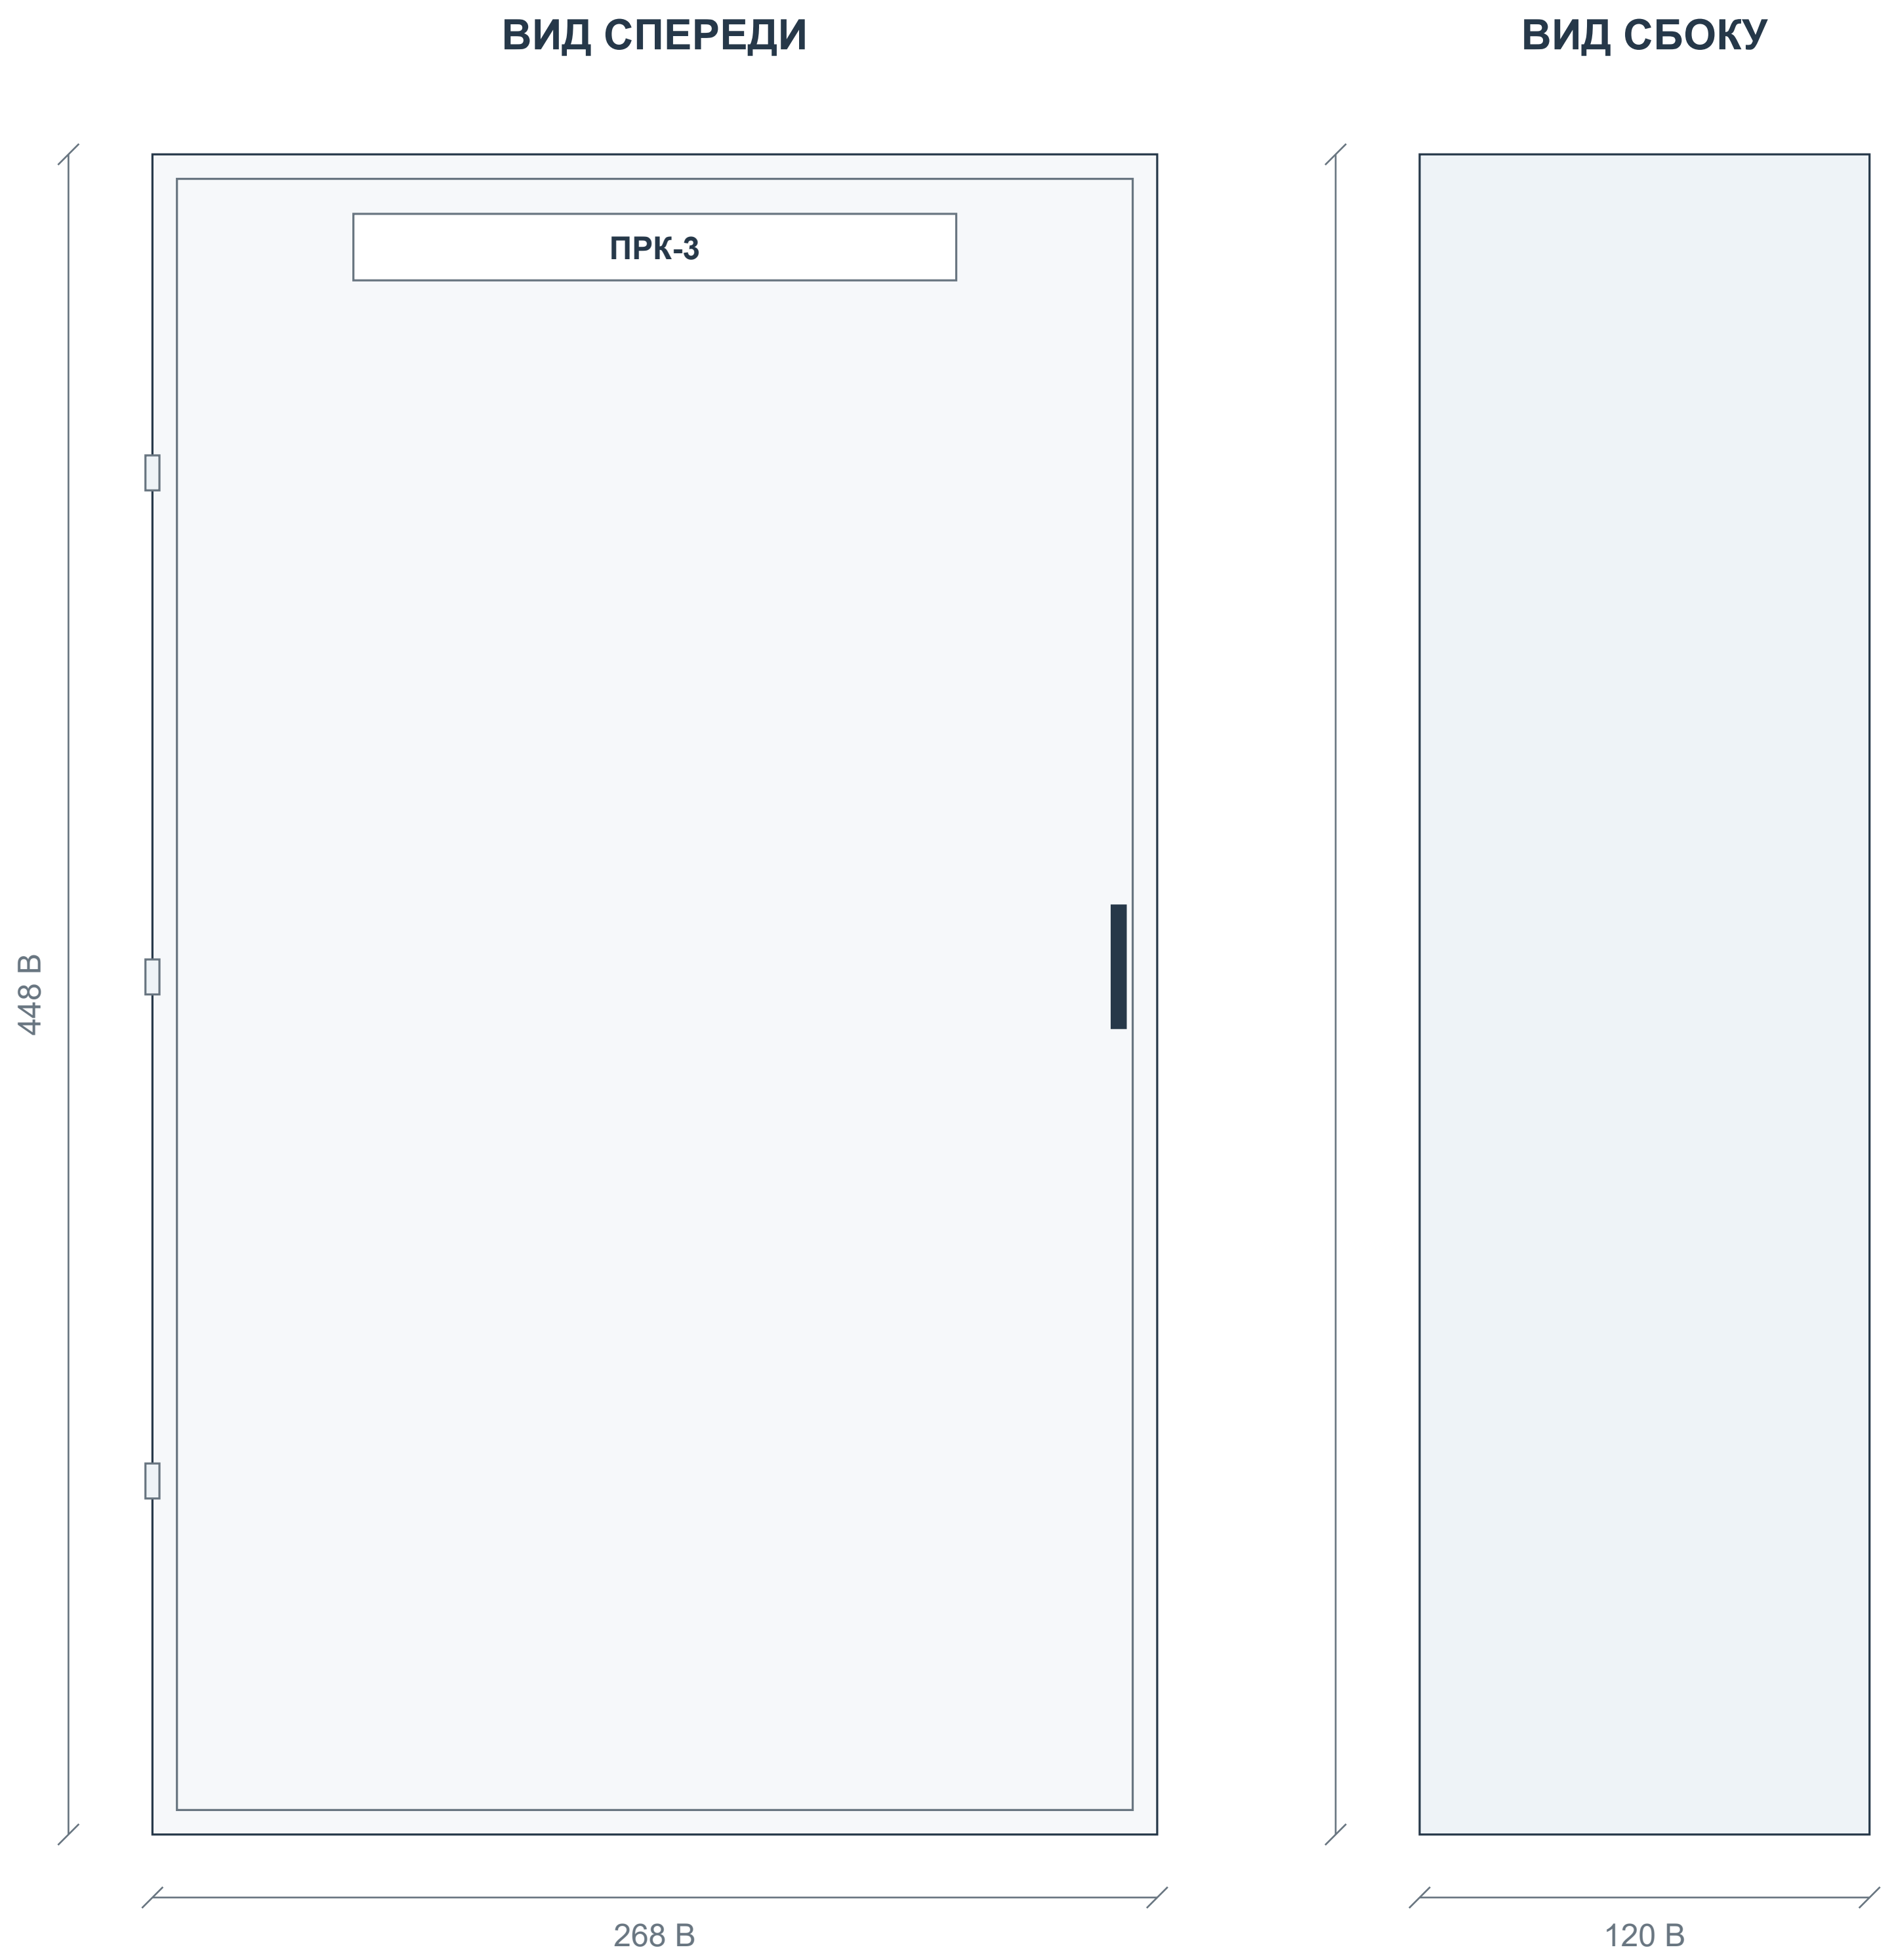

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

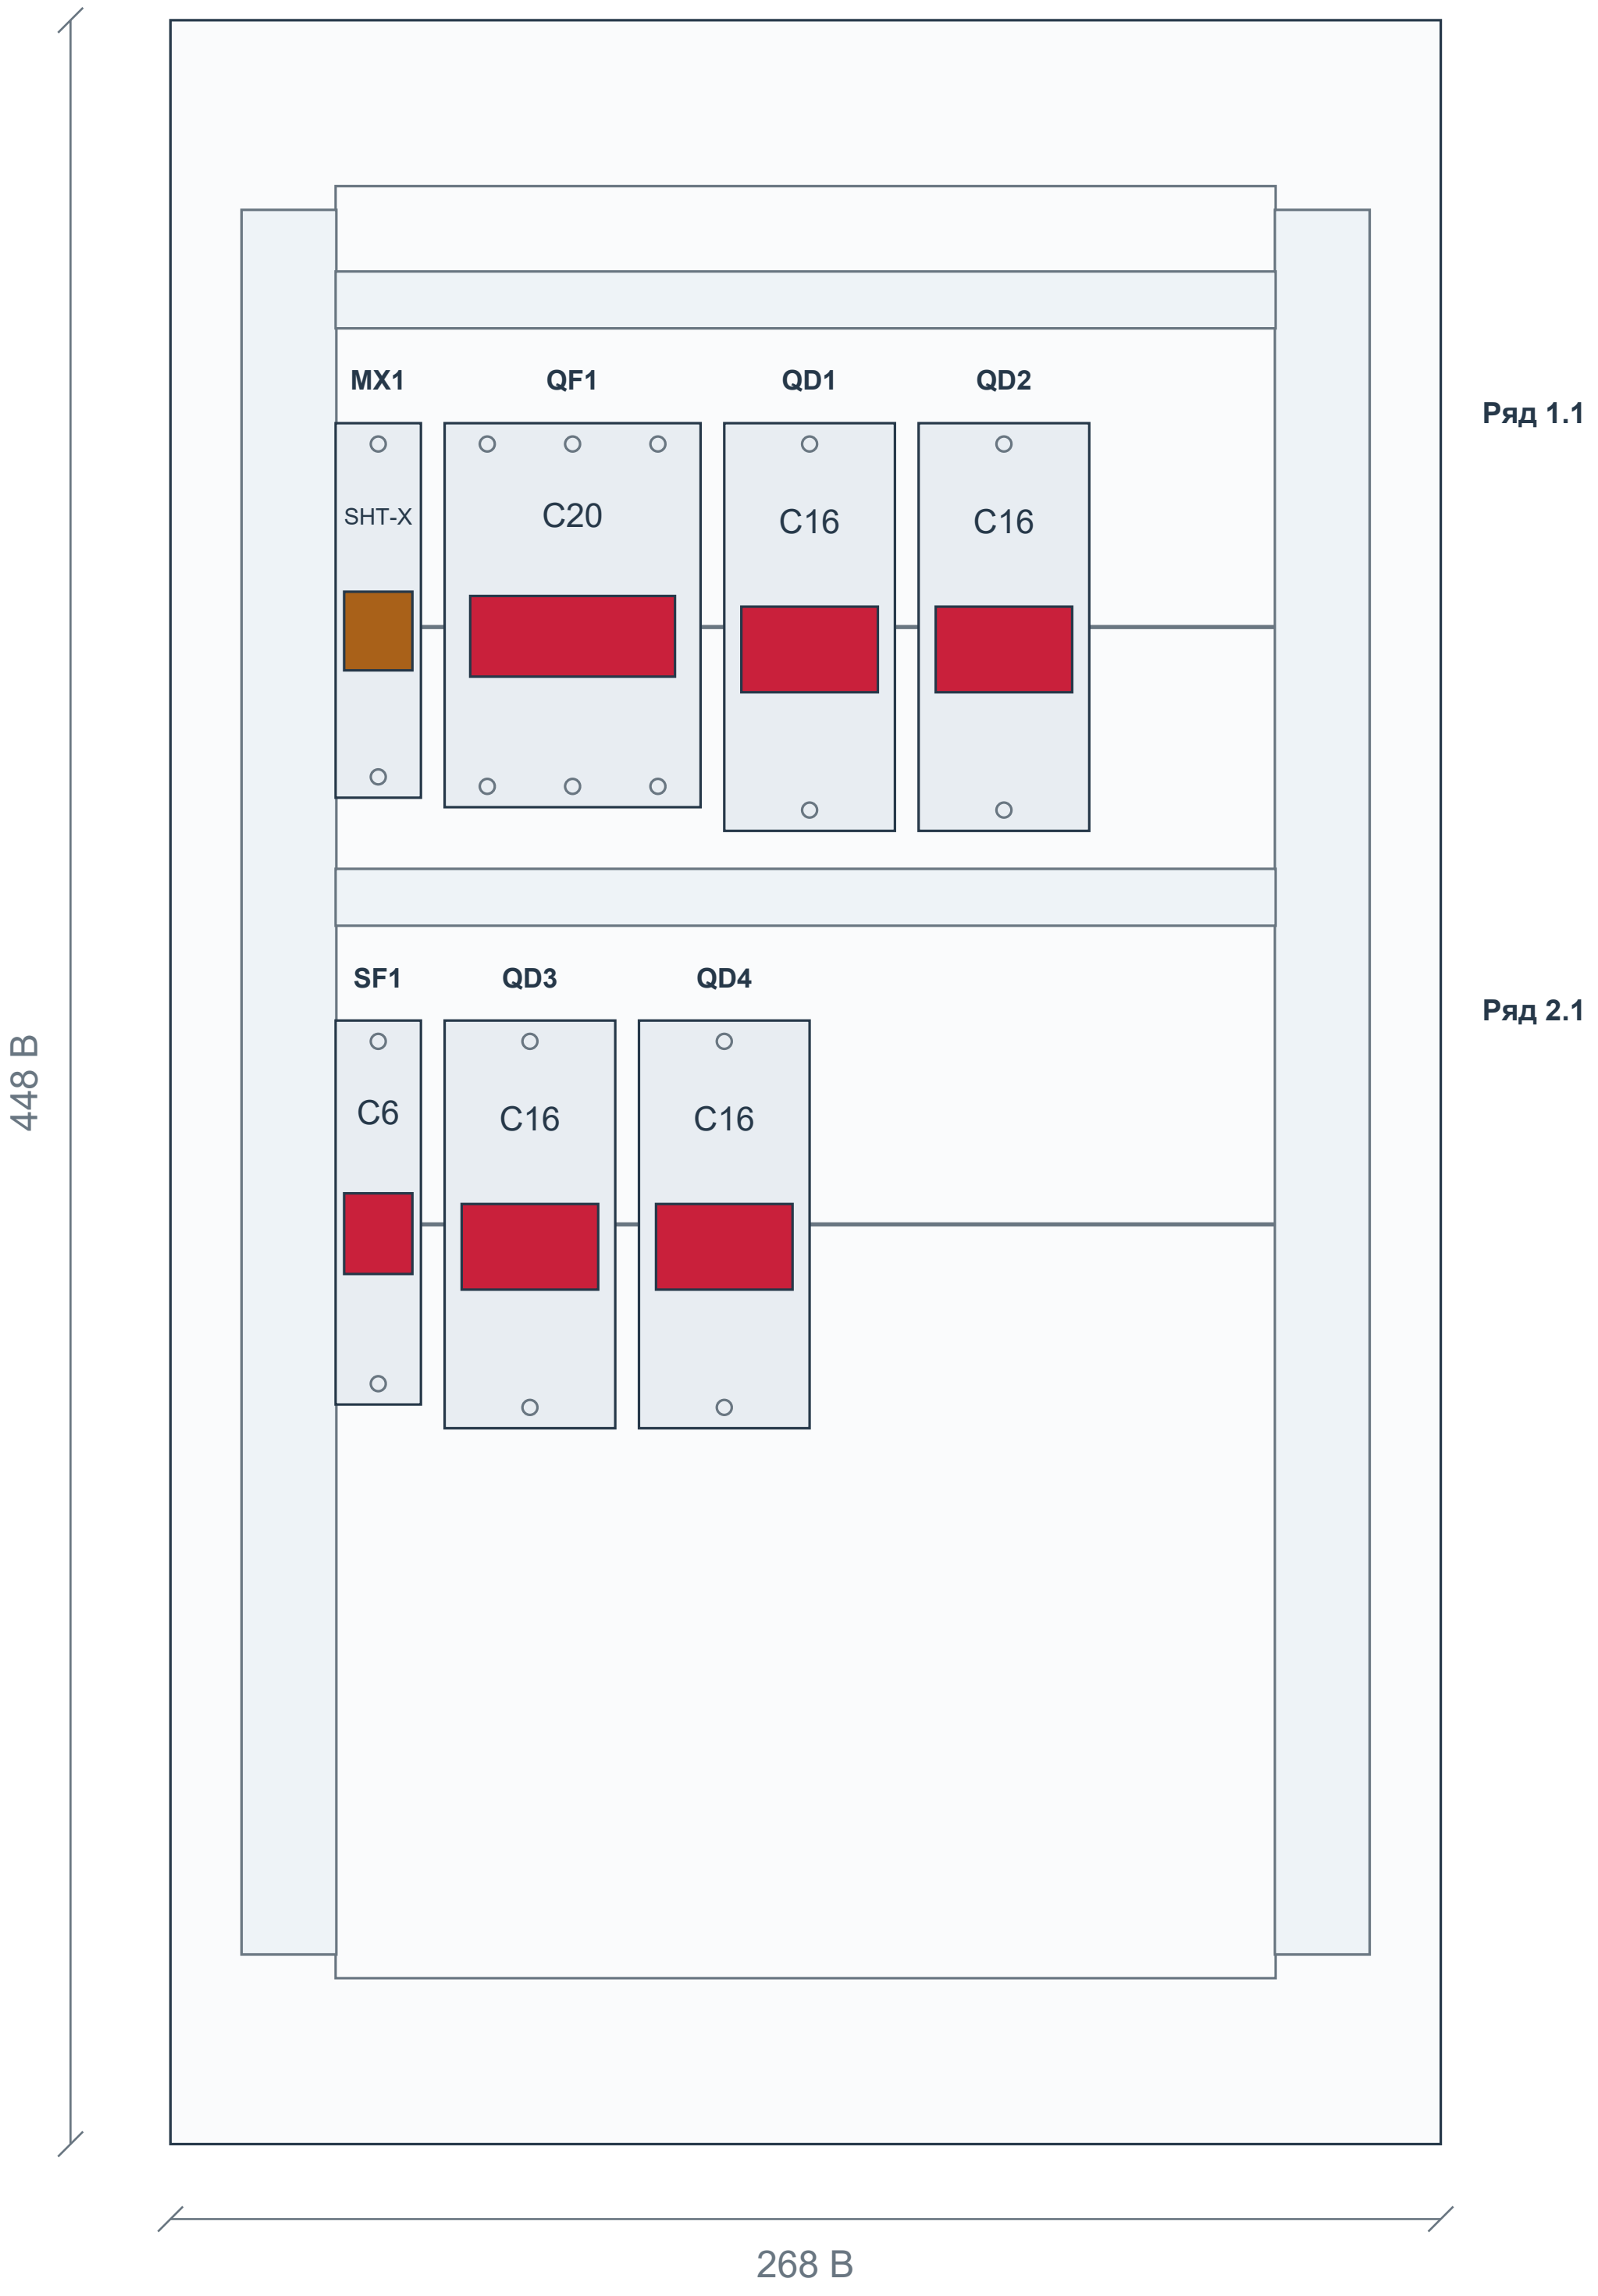

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	350	1.1	34.84	85	18 × 79
QF1	NXB-63S	351	1.1	57.84	85	54 × 81
SF1	NXB-63S	352	2.1	34.84	211	18 × 81
QD1 - QD2	NXBLE-63YH	353	1.1	116.84...157.84	85	36 × 86
QD3 - QD4	NXBLE-63YH	354	2.1	57.84...98.84	211	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Актуальная спецификация

ПР-А3 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 371 | ЭОМ, PDF стр. 23

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
372	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
373	193166	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
374	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
375	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 23

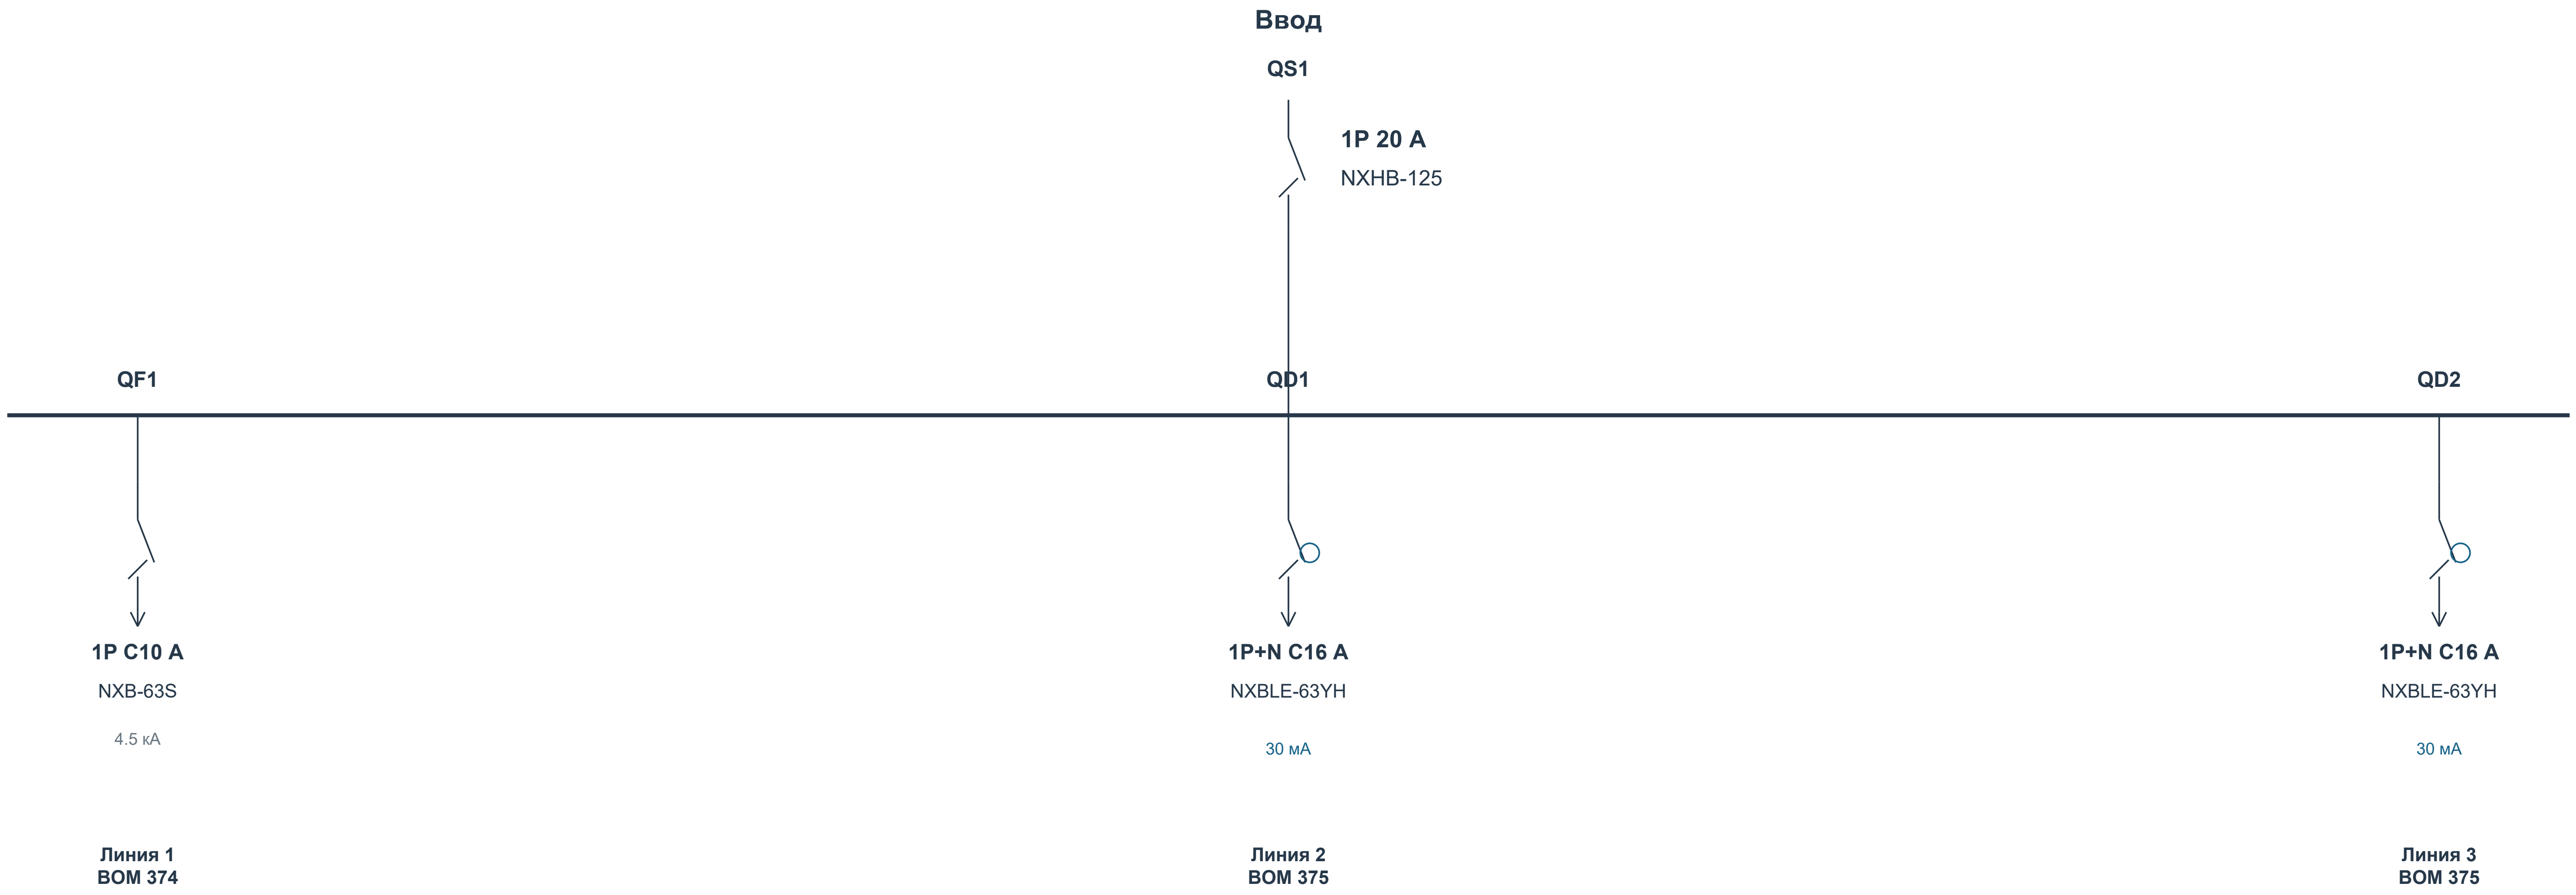
Ввод
QS1
1P 20 A
NXHB-125
QF1
QD1
QD2
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 374
Линия 2
BOM 375
Линия 3
BOM 375

Данные исходного проекта: Ру 1.7 кВт | Рр 0,8 кВт | Ip 4,0 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

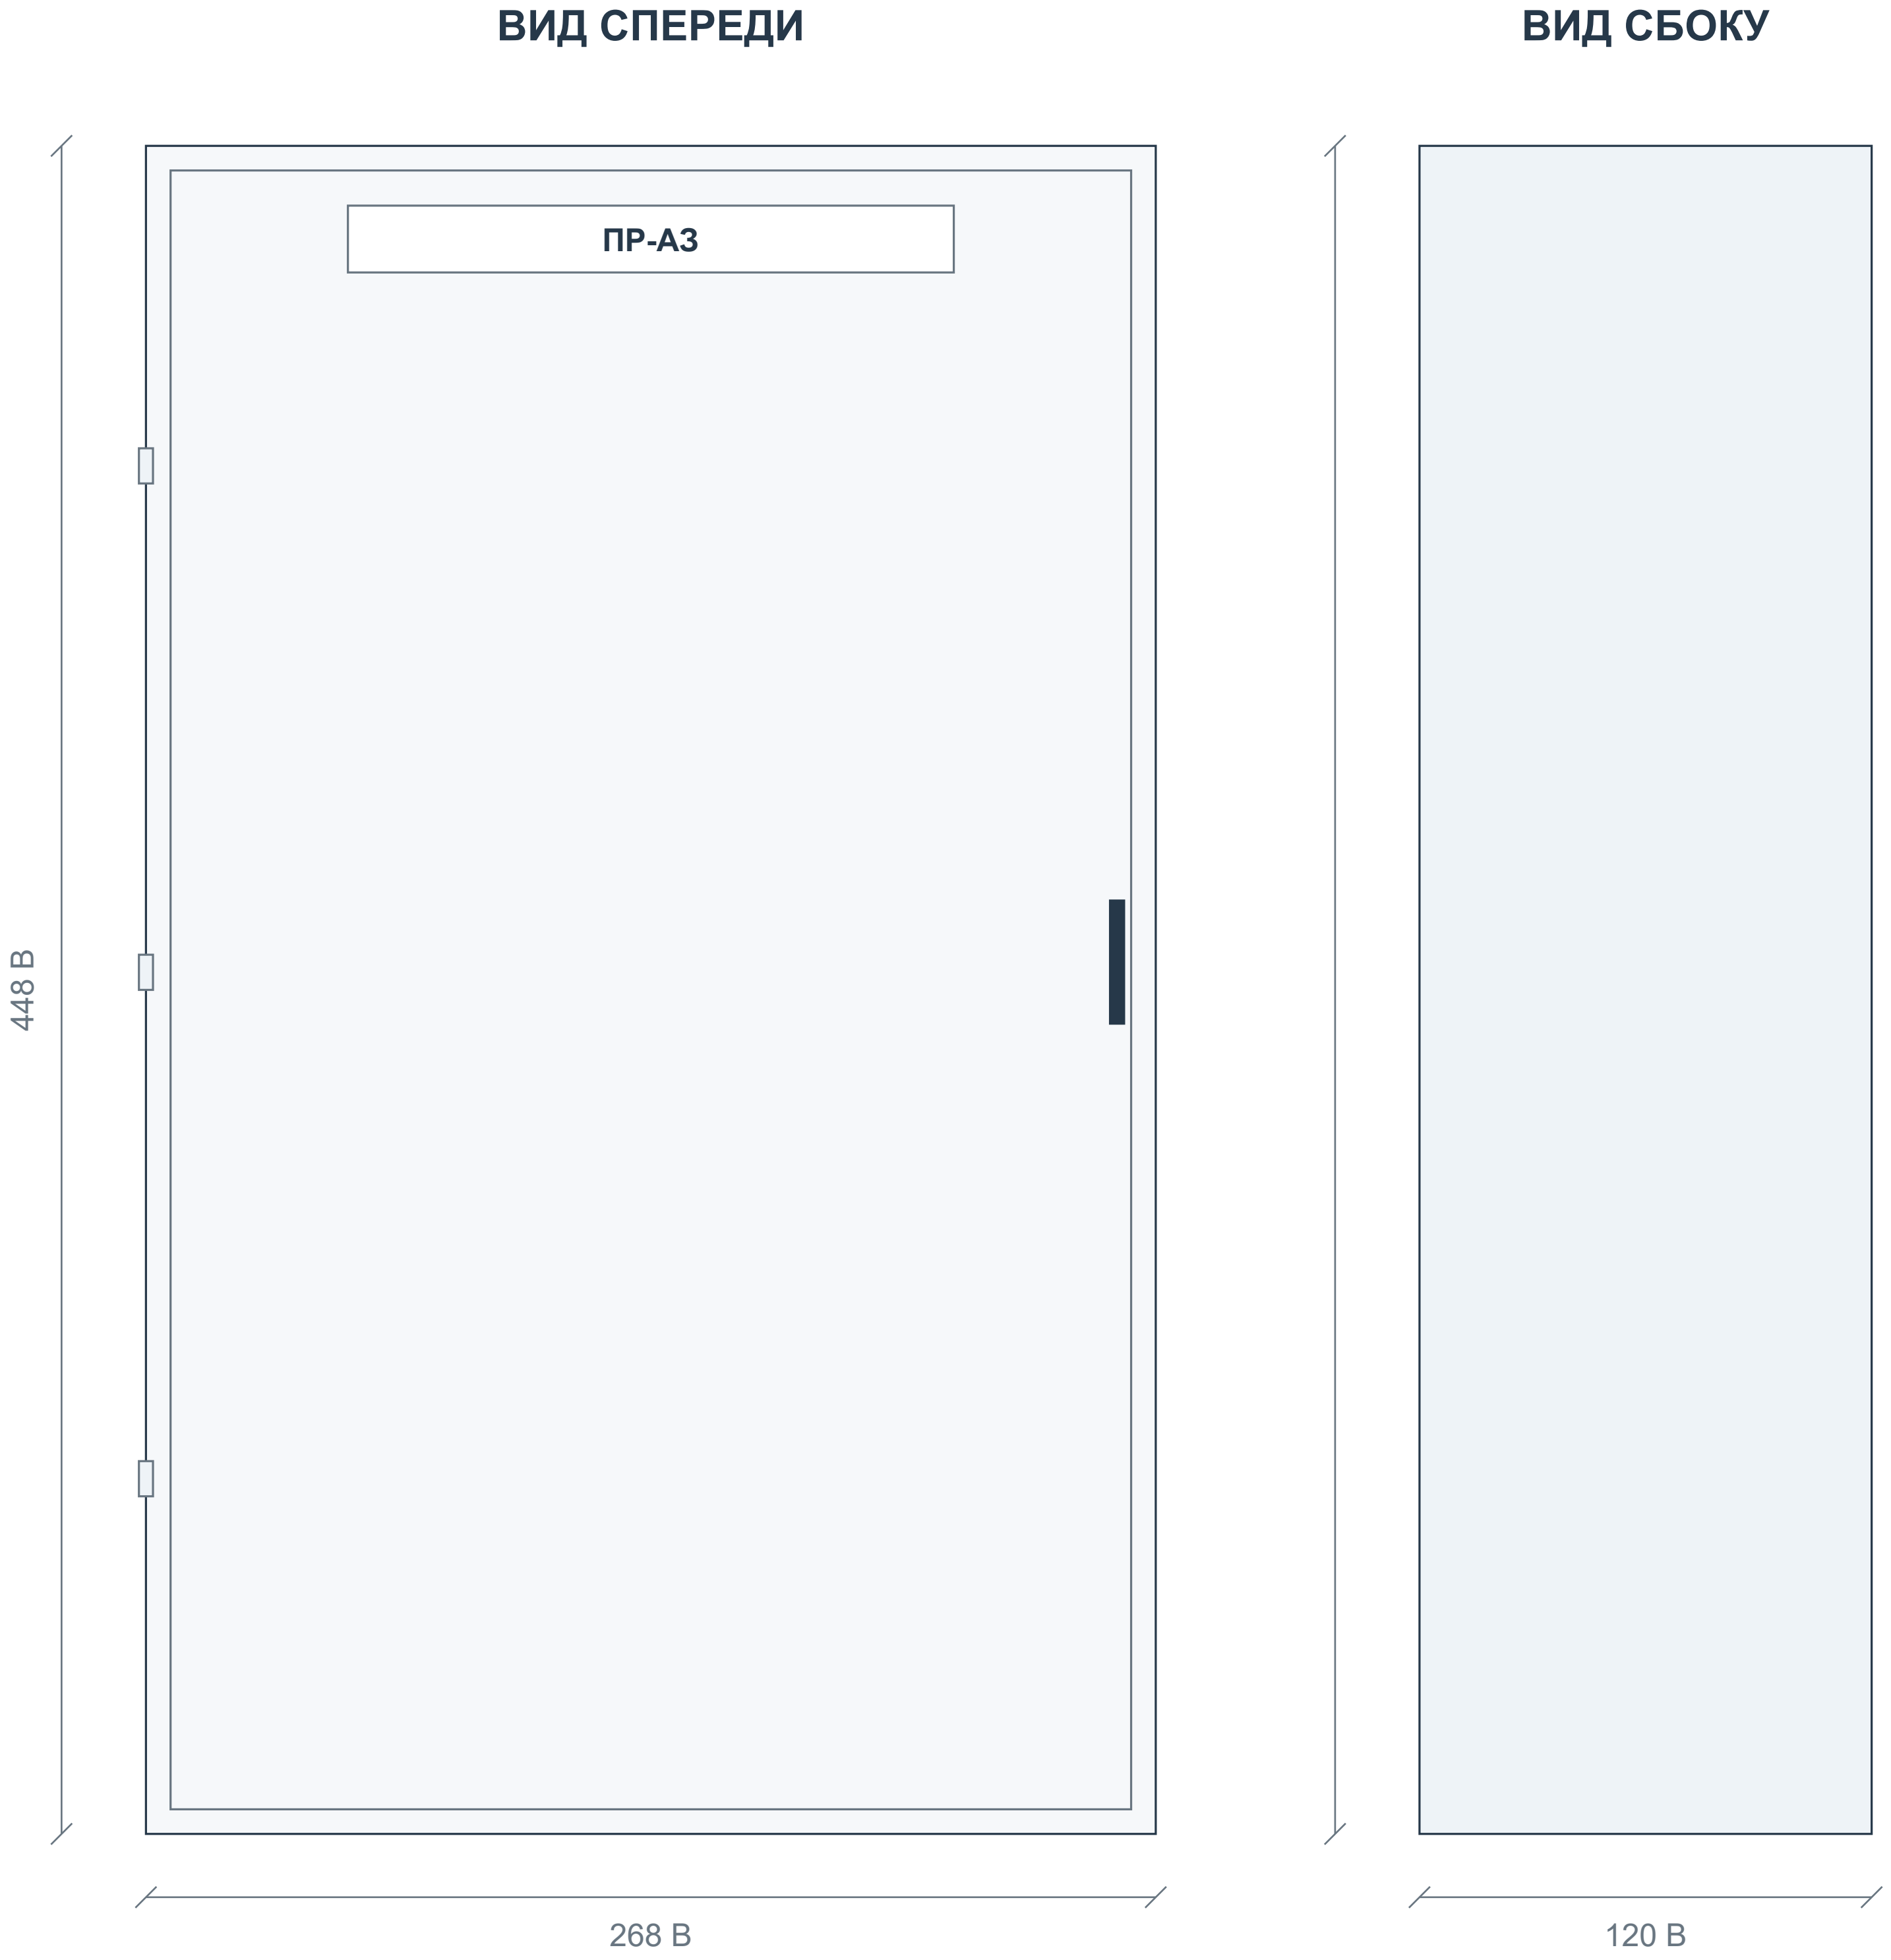

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

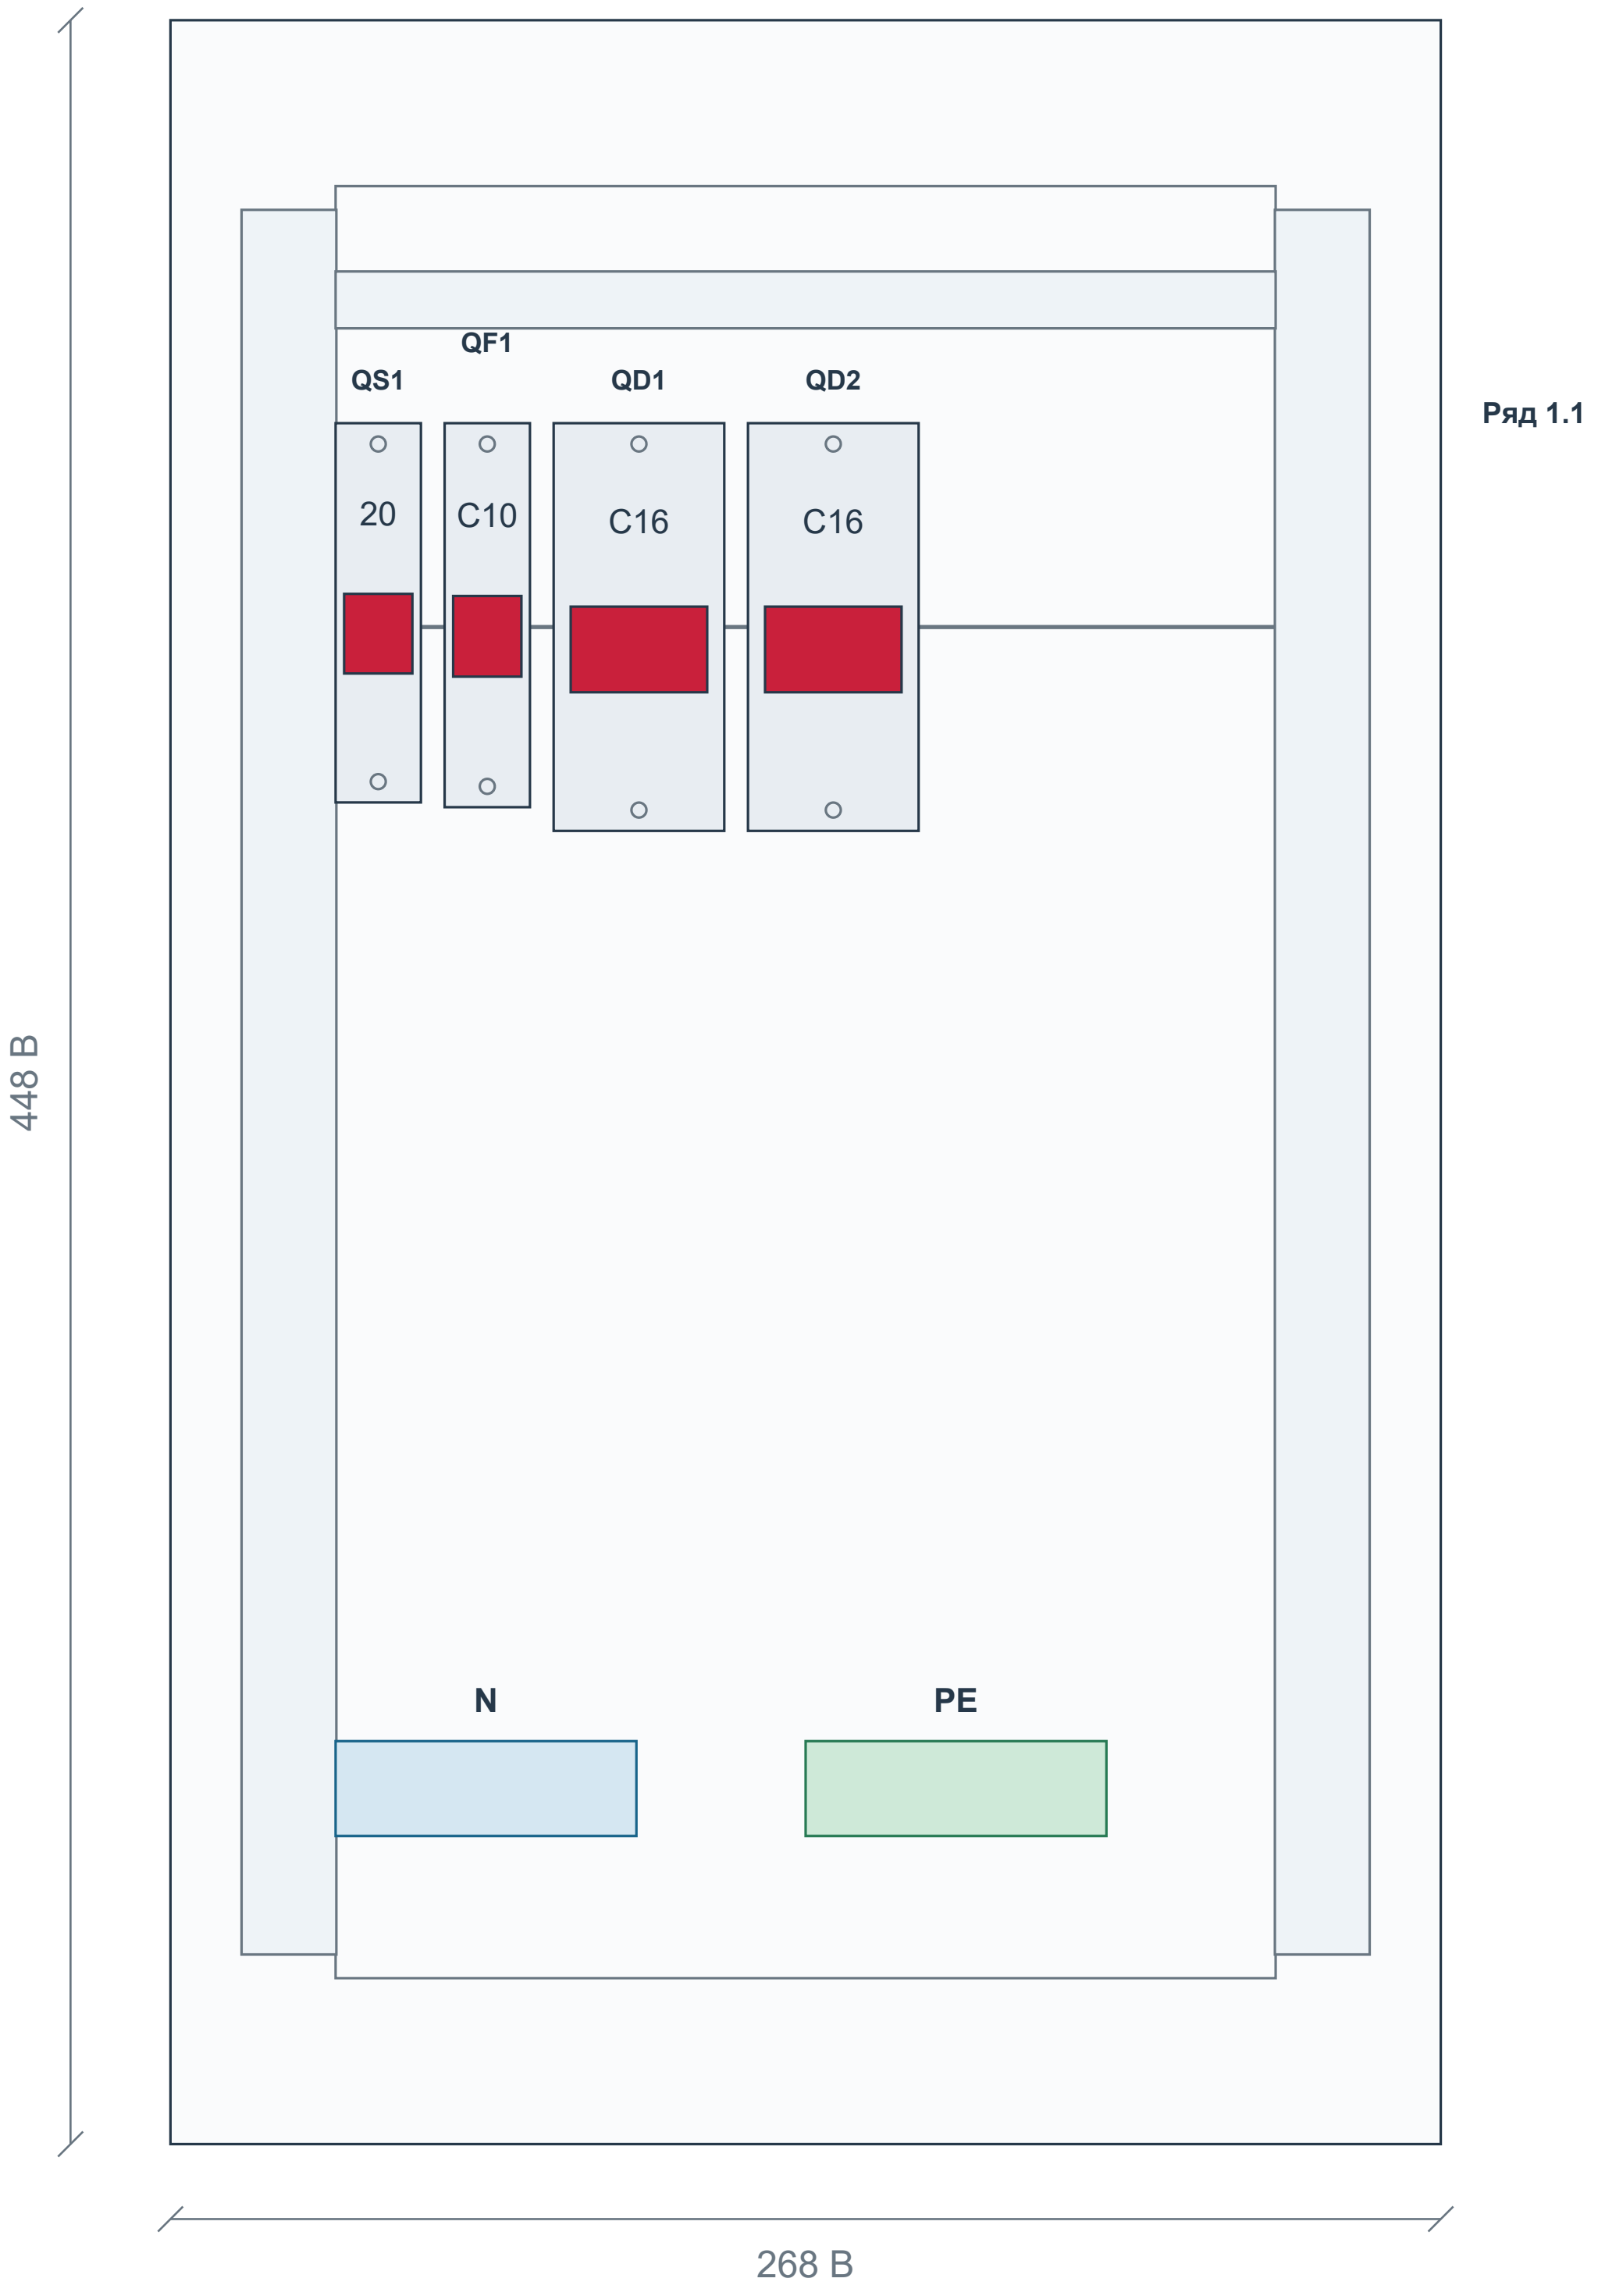

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	373	1.1	34.84	85	18 × 80
QF1	NXB-63S	374	1.1	57.84	85	18 × 81
QD1 - QD2	NXBLE-63YH	375	1.1	80.84...121.84	85	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.2 | Актуальная спецификация

ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 389 | ЭОМ, PDF стр. 24

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
390	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
391	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
392	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
393	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
394	515388	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
395	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
396	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
397	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 24

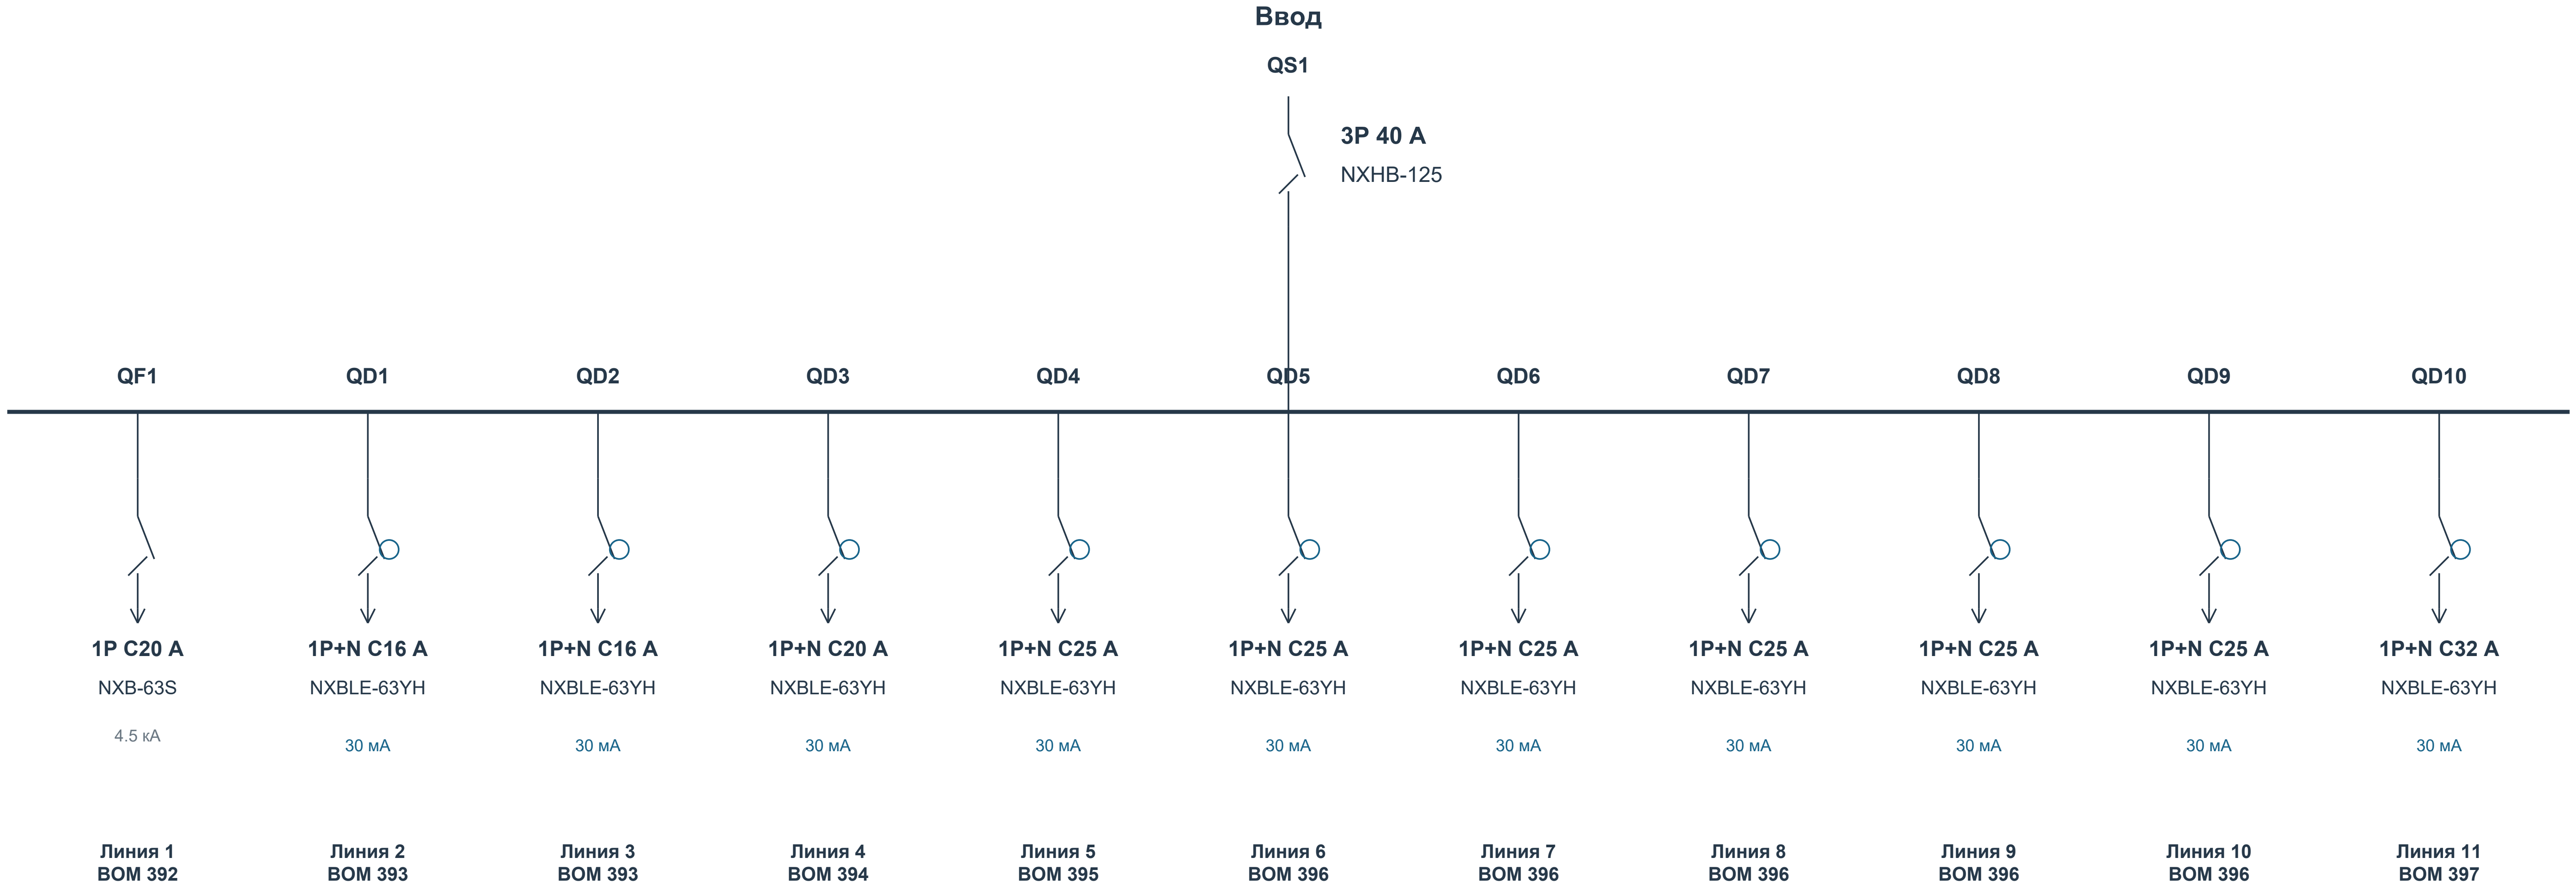
Ввод
QS1
3P 40 A
NXHB-125
QF1
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
QD9
QD10
1P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 392
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 393
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 393
1P+N C20 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 394
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 395
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 396
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 396
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 396
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 9
BOM 396
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 10
BOM 396
1P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 11
BOM 397

Данные исходного проекта: Ру 38.0 кВт | Рр 9,9 кВт | Iр 15,8 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

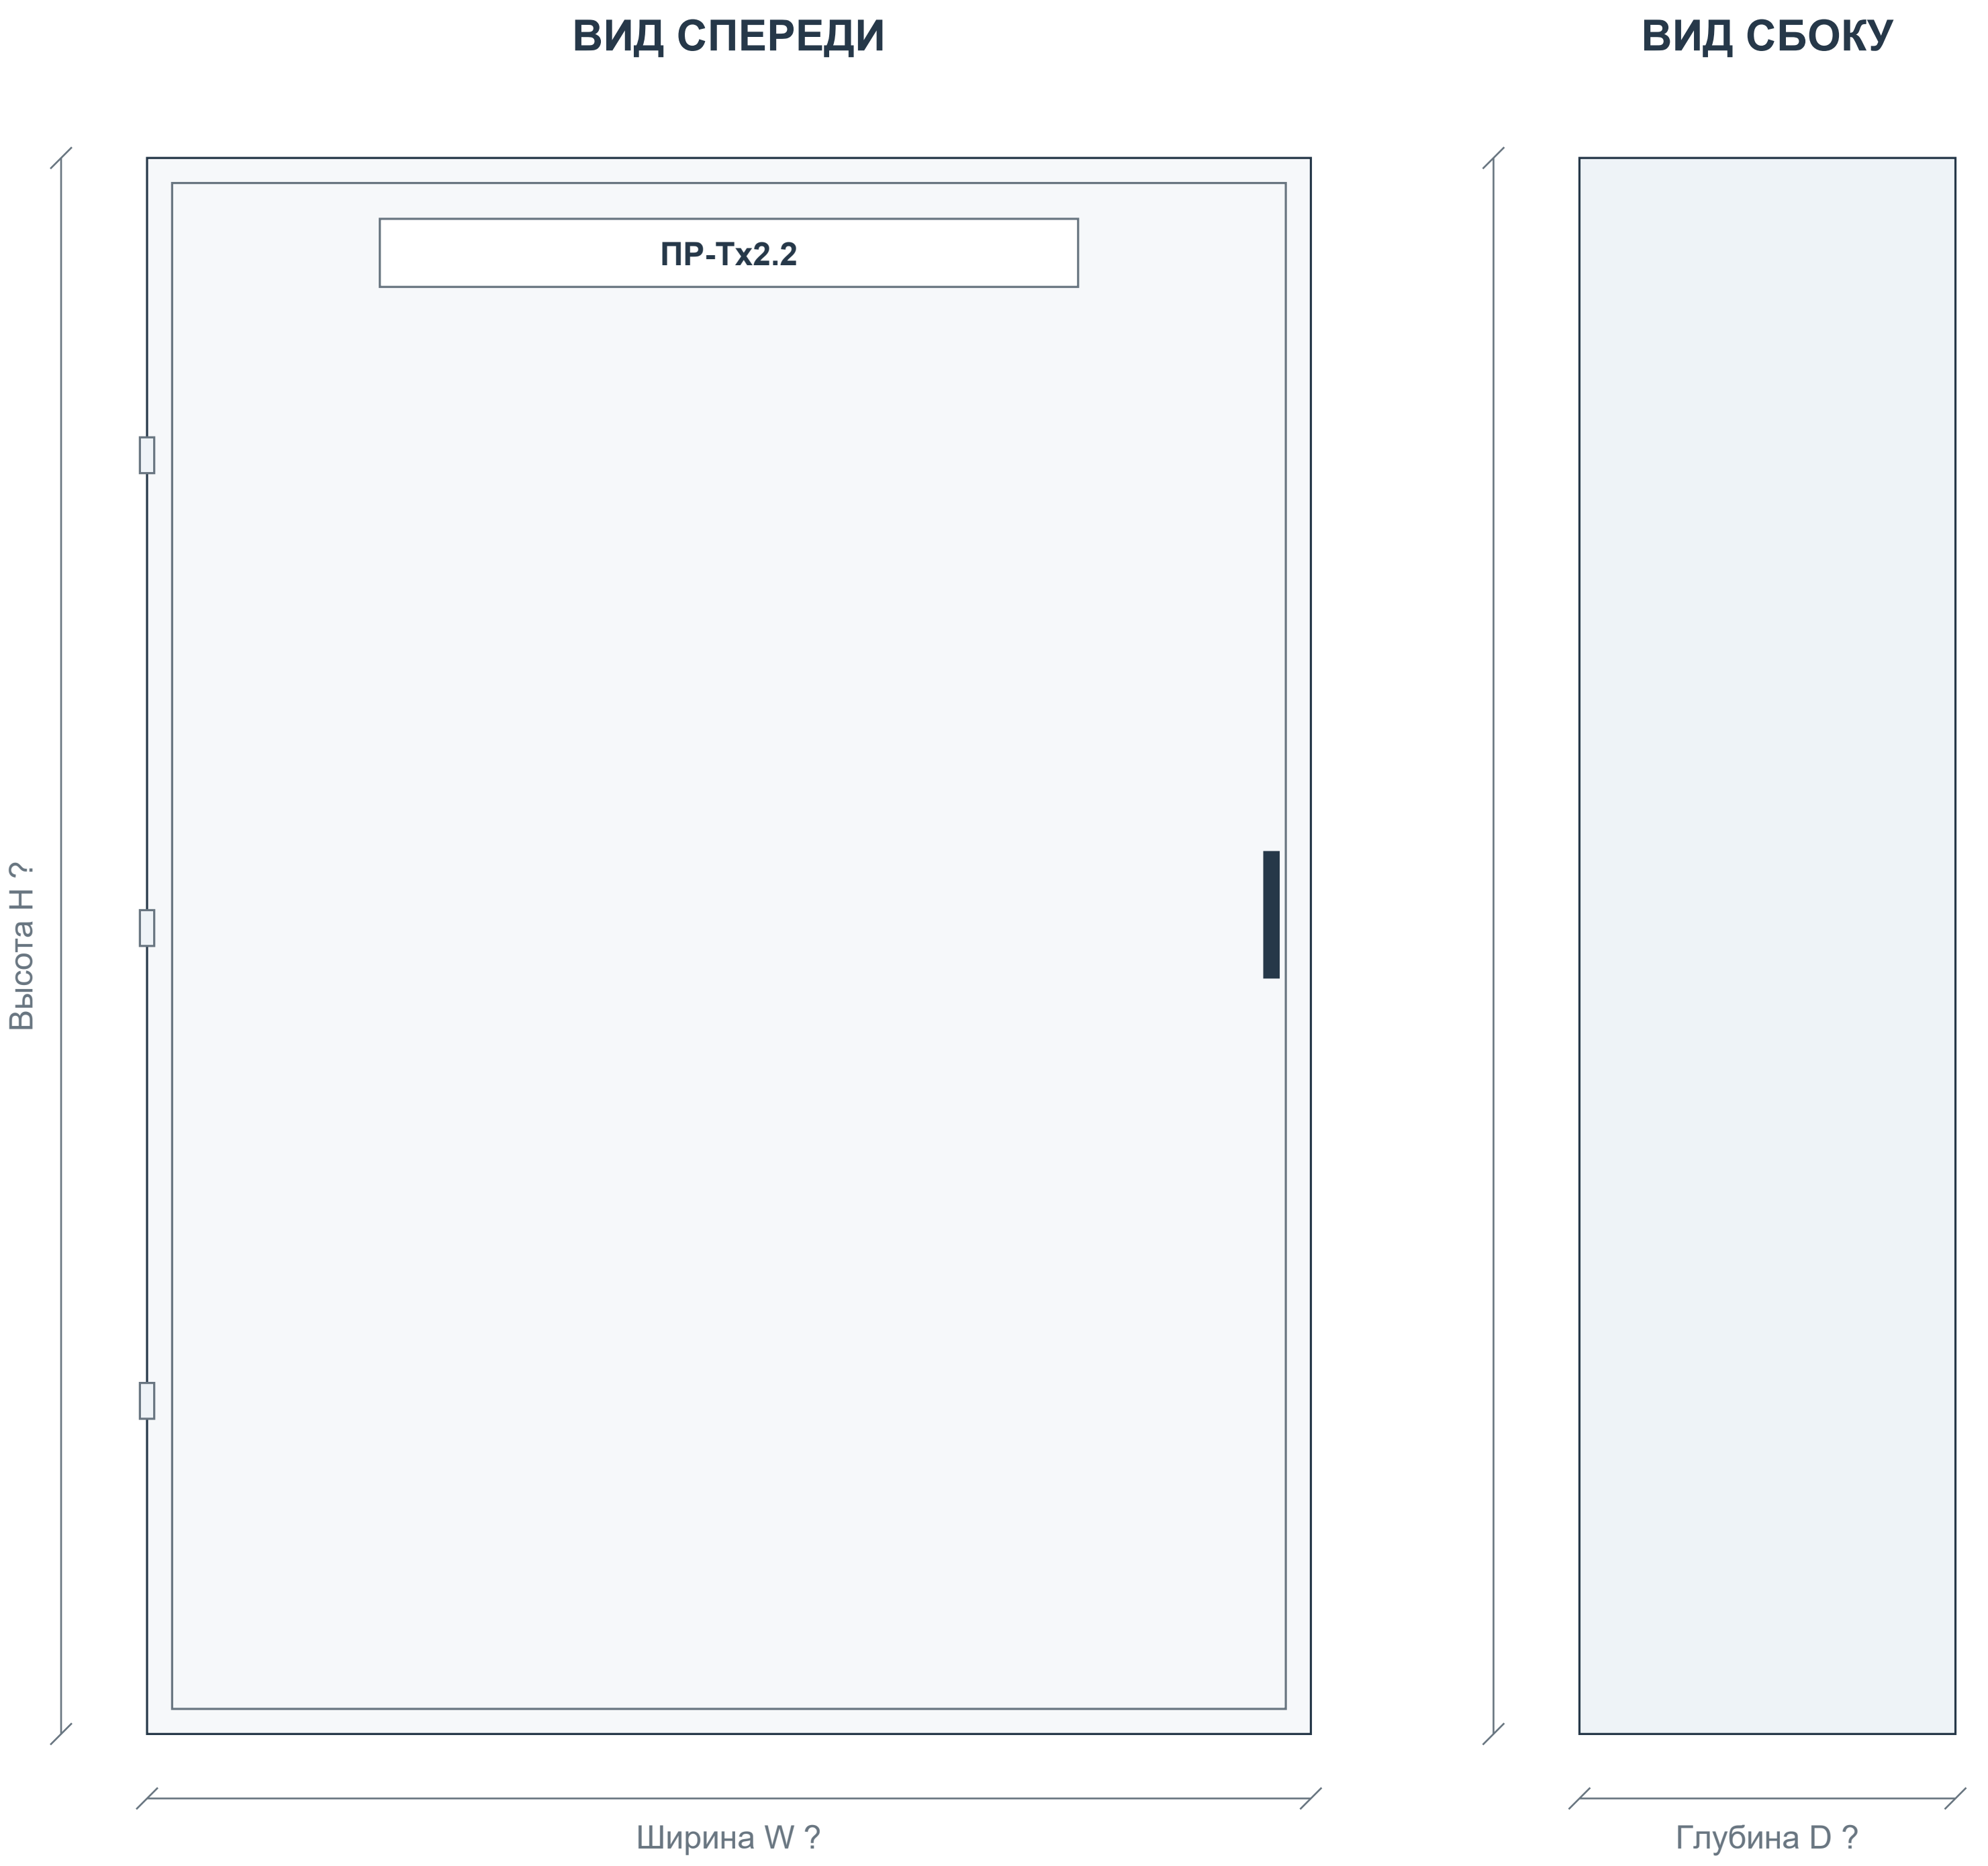

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.2 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

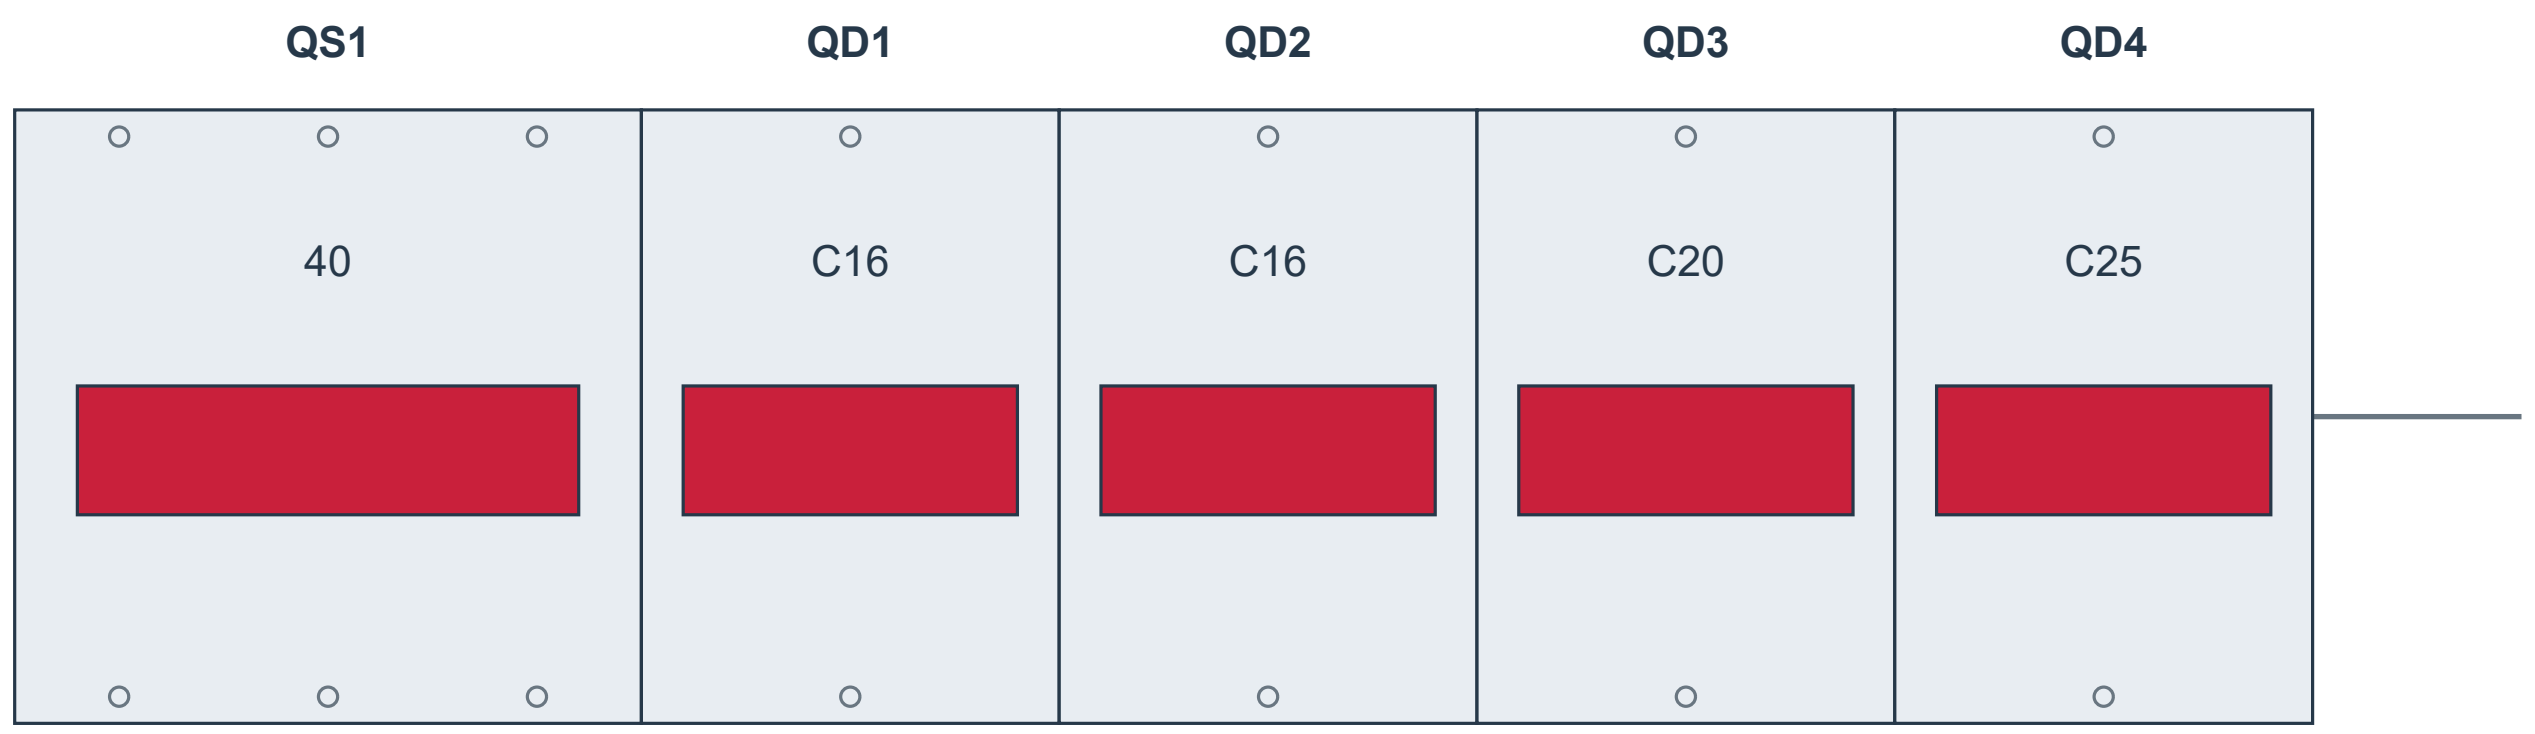

Сумма ширин: 198 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

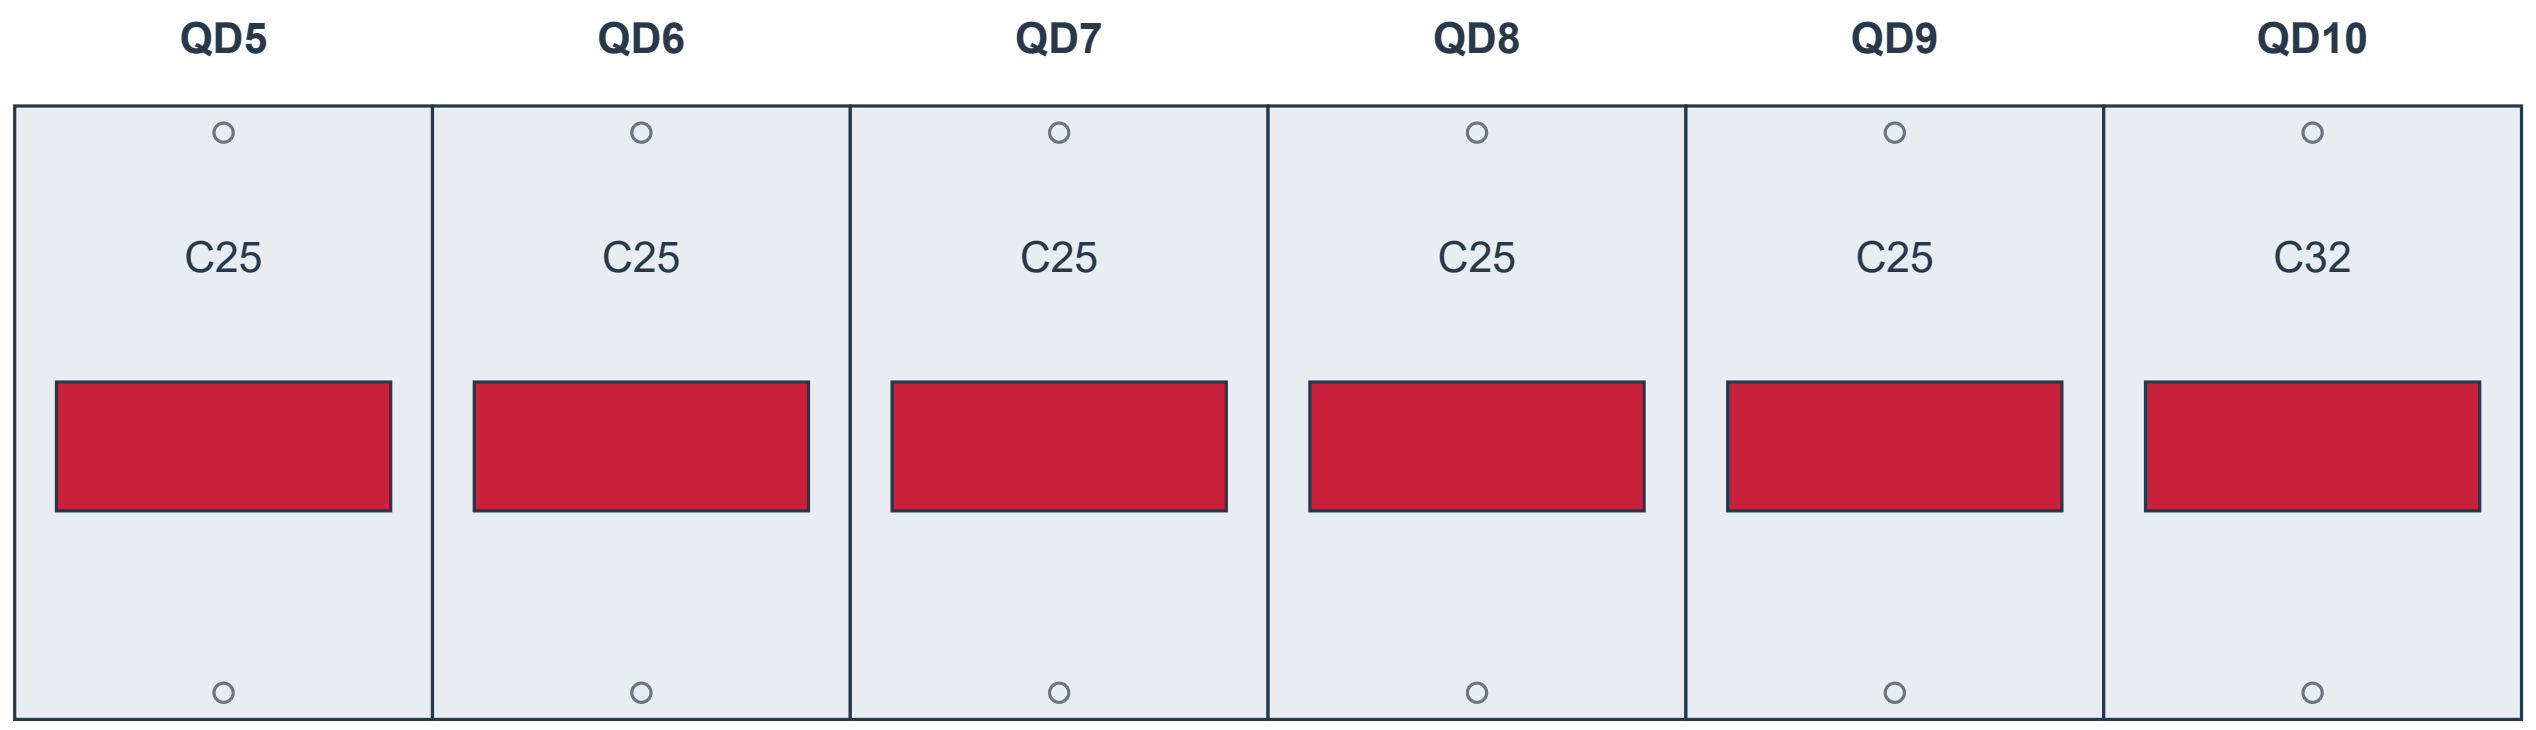

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 3 | модульная раскладка D

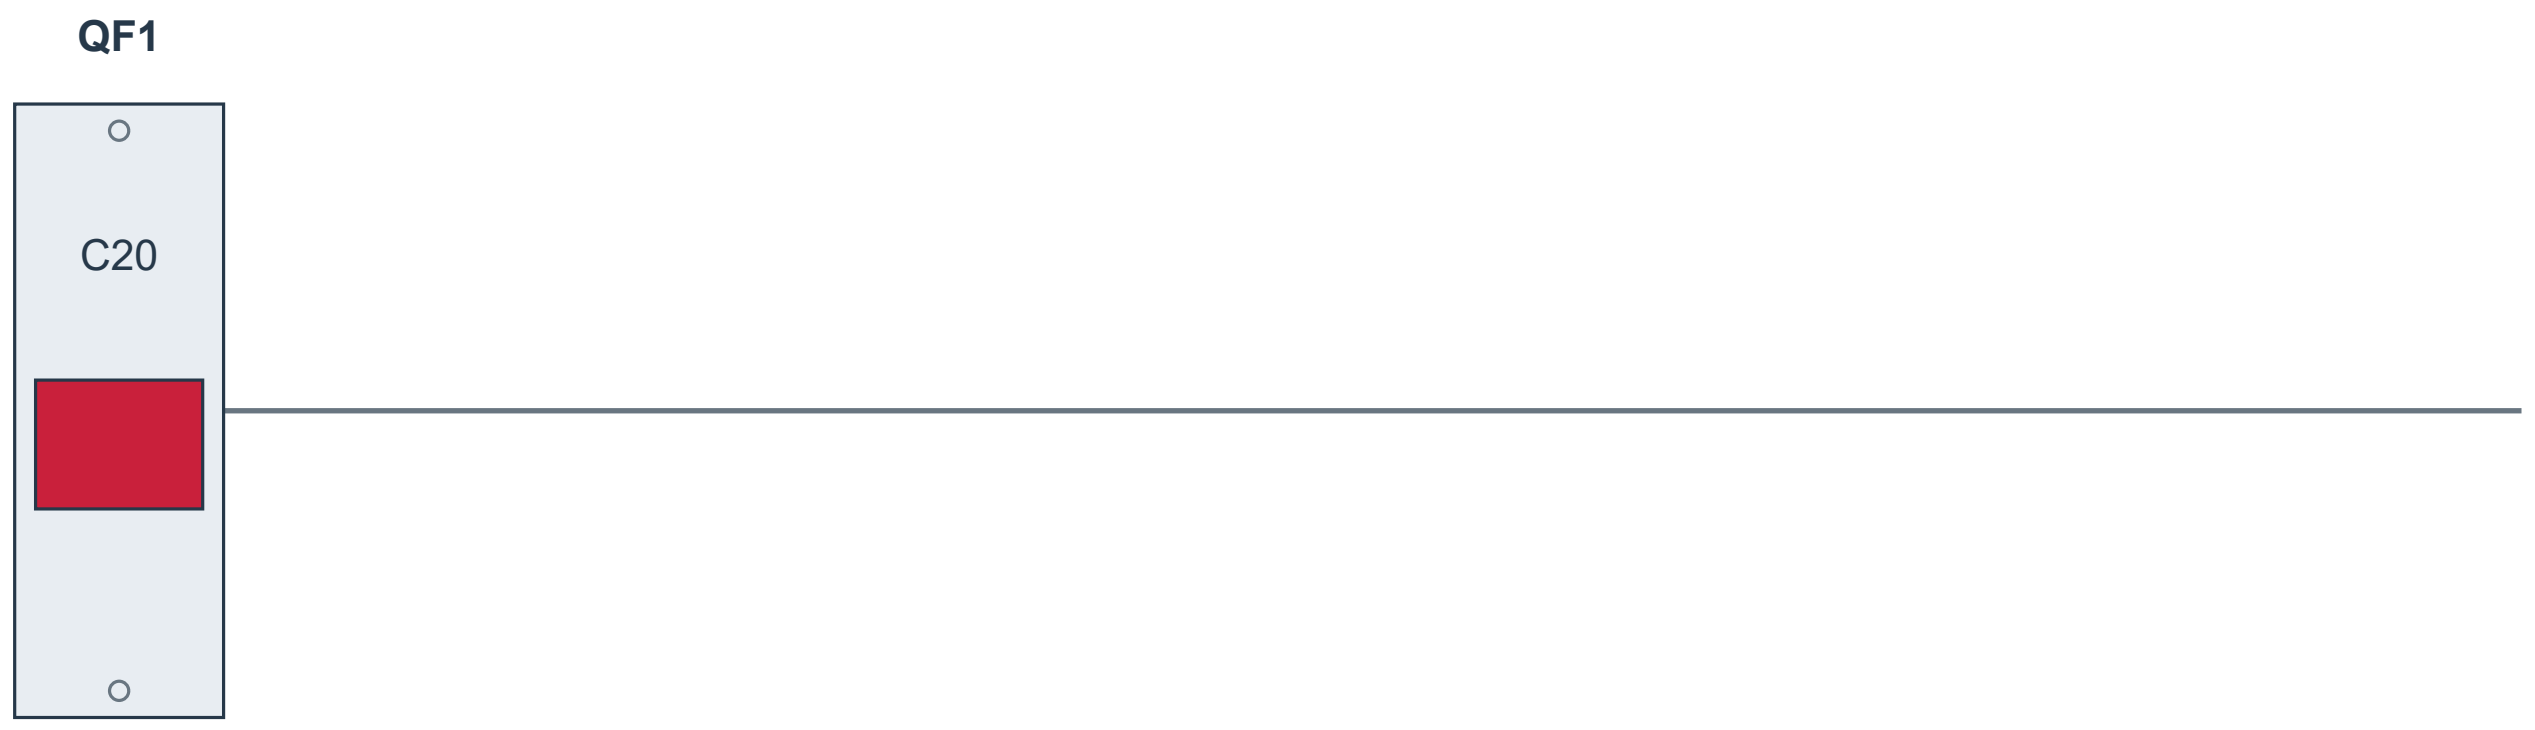

Сумма ширин: 18 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	391	1	0	?	54 B
QF1	NXB-63S	392	3	0	?	18 B
QD1 - QD2	NXBLE-63YH	393	1	54...90	?	36 B
QD3	NXBLE-63YH	394	1	126	?	36 B
QD4	NXBLE-63YH	395	1	162	?	36 B
QD5 - QD9	NXBLE-63YH	396	2	0...144	?	36 B
QD10	NXBLE-63YH	397	2	180	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Актуальная спецификация

ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 414 | ЭОМ, PDF стр. 25

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
415	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
416	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
417	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
418	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
419	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 25

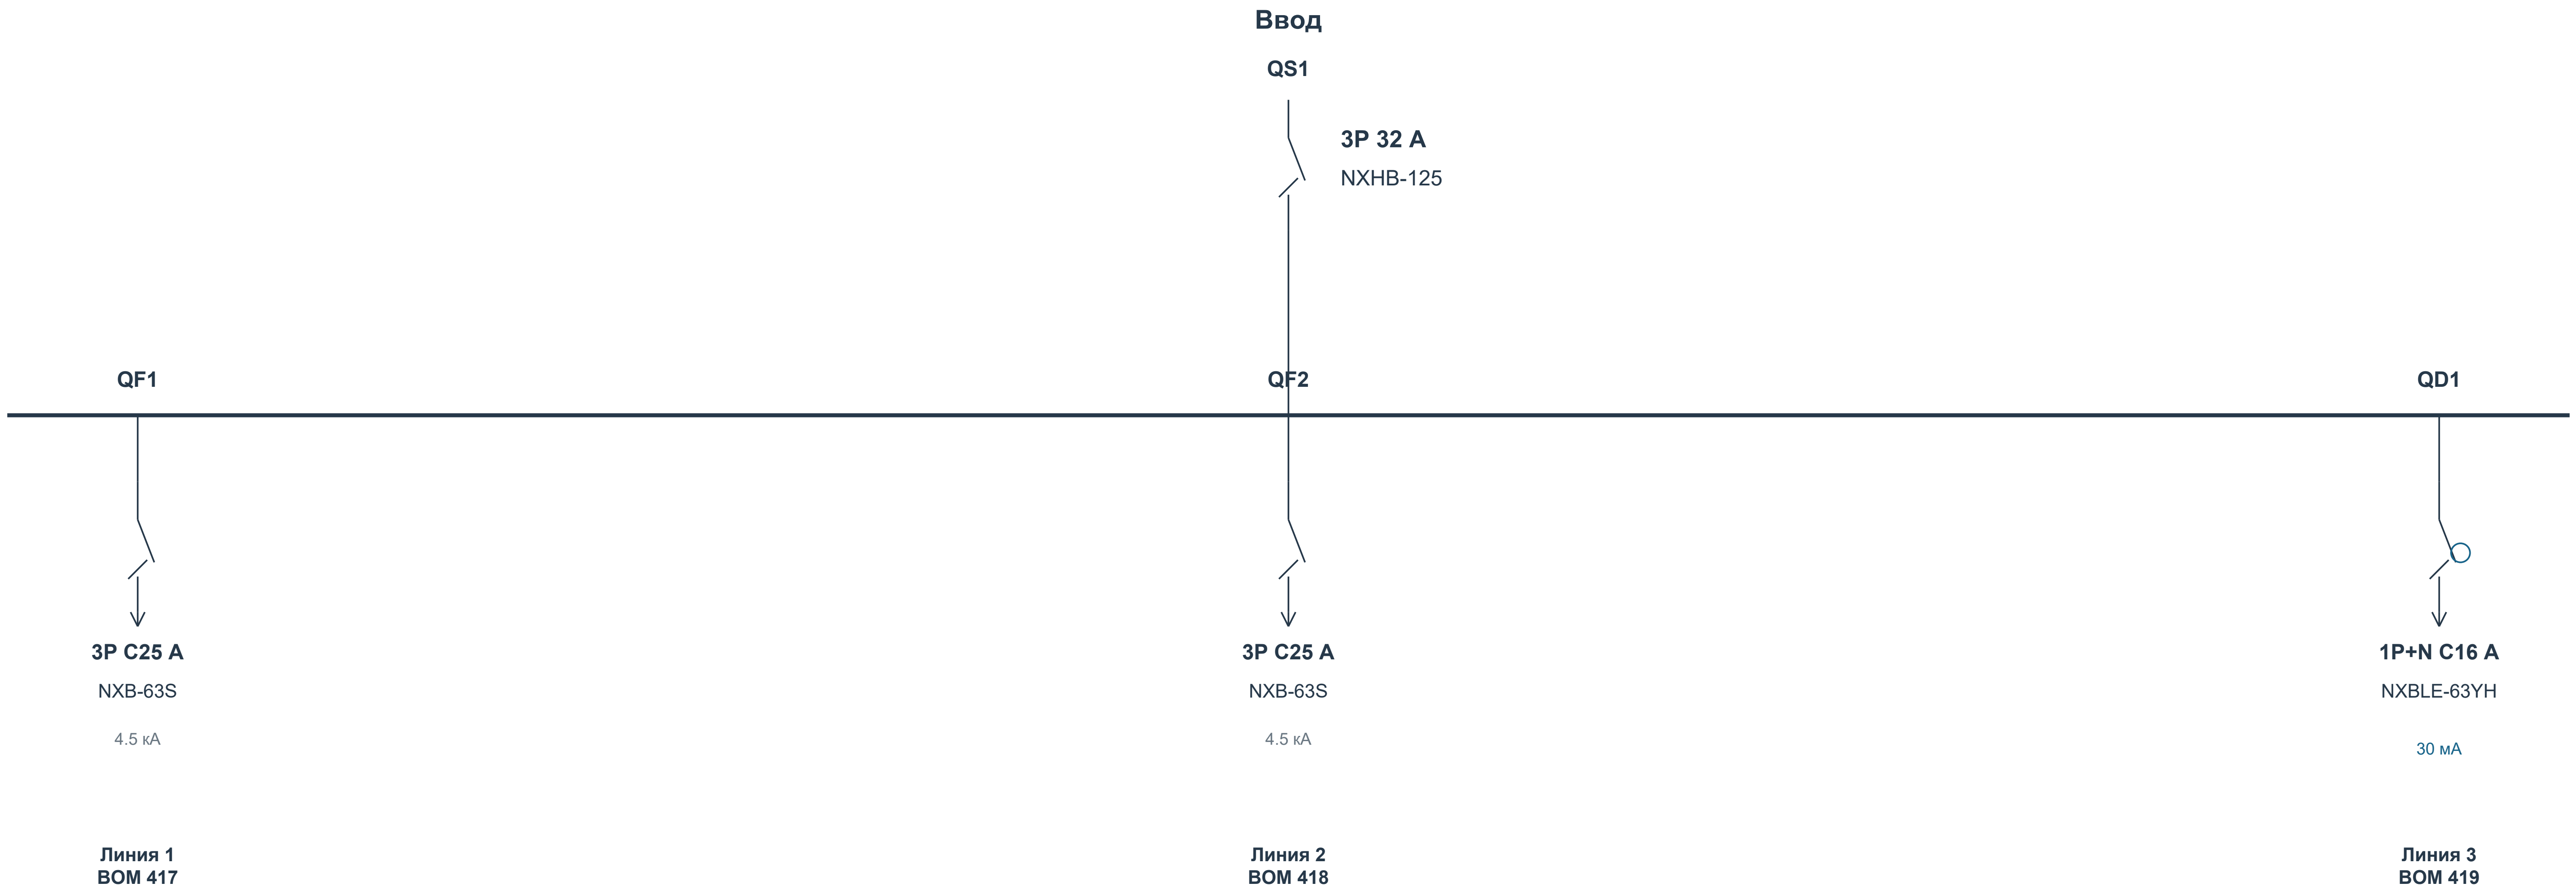
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QF2
QD1
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 417
Линия 2
BOM 418
Линия 3
BOM 419

Данные исходного проекта: Ру 7.9 кВт | Рр 7,4 кВт | Iр 11,8 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

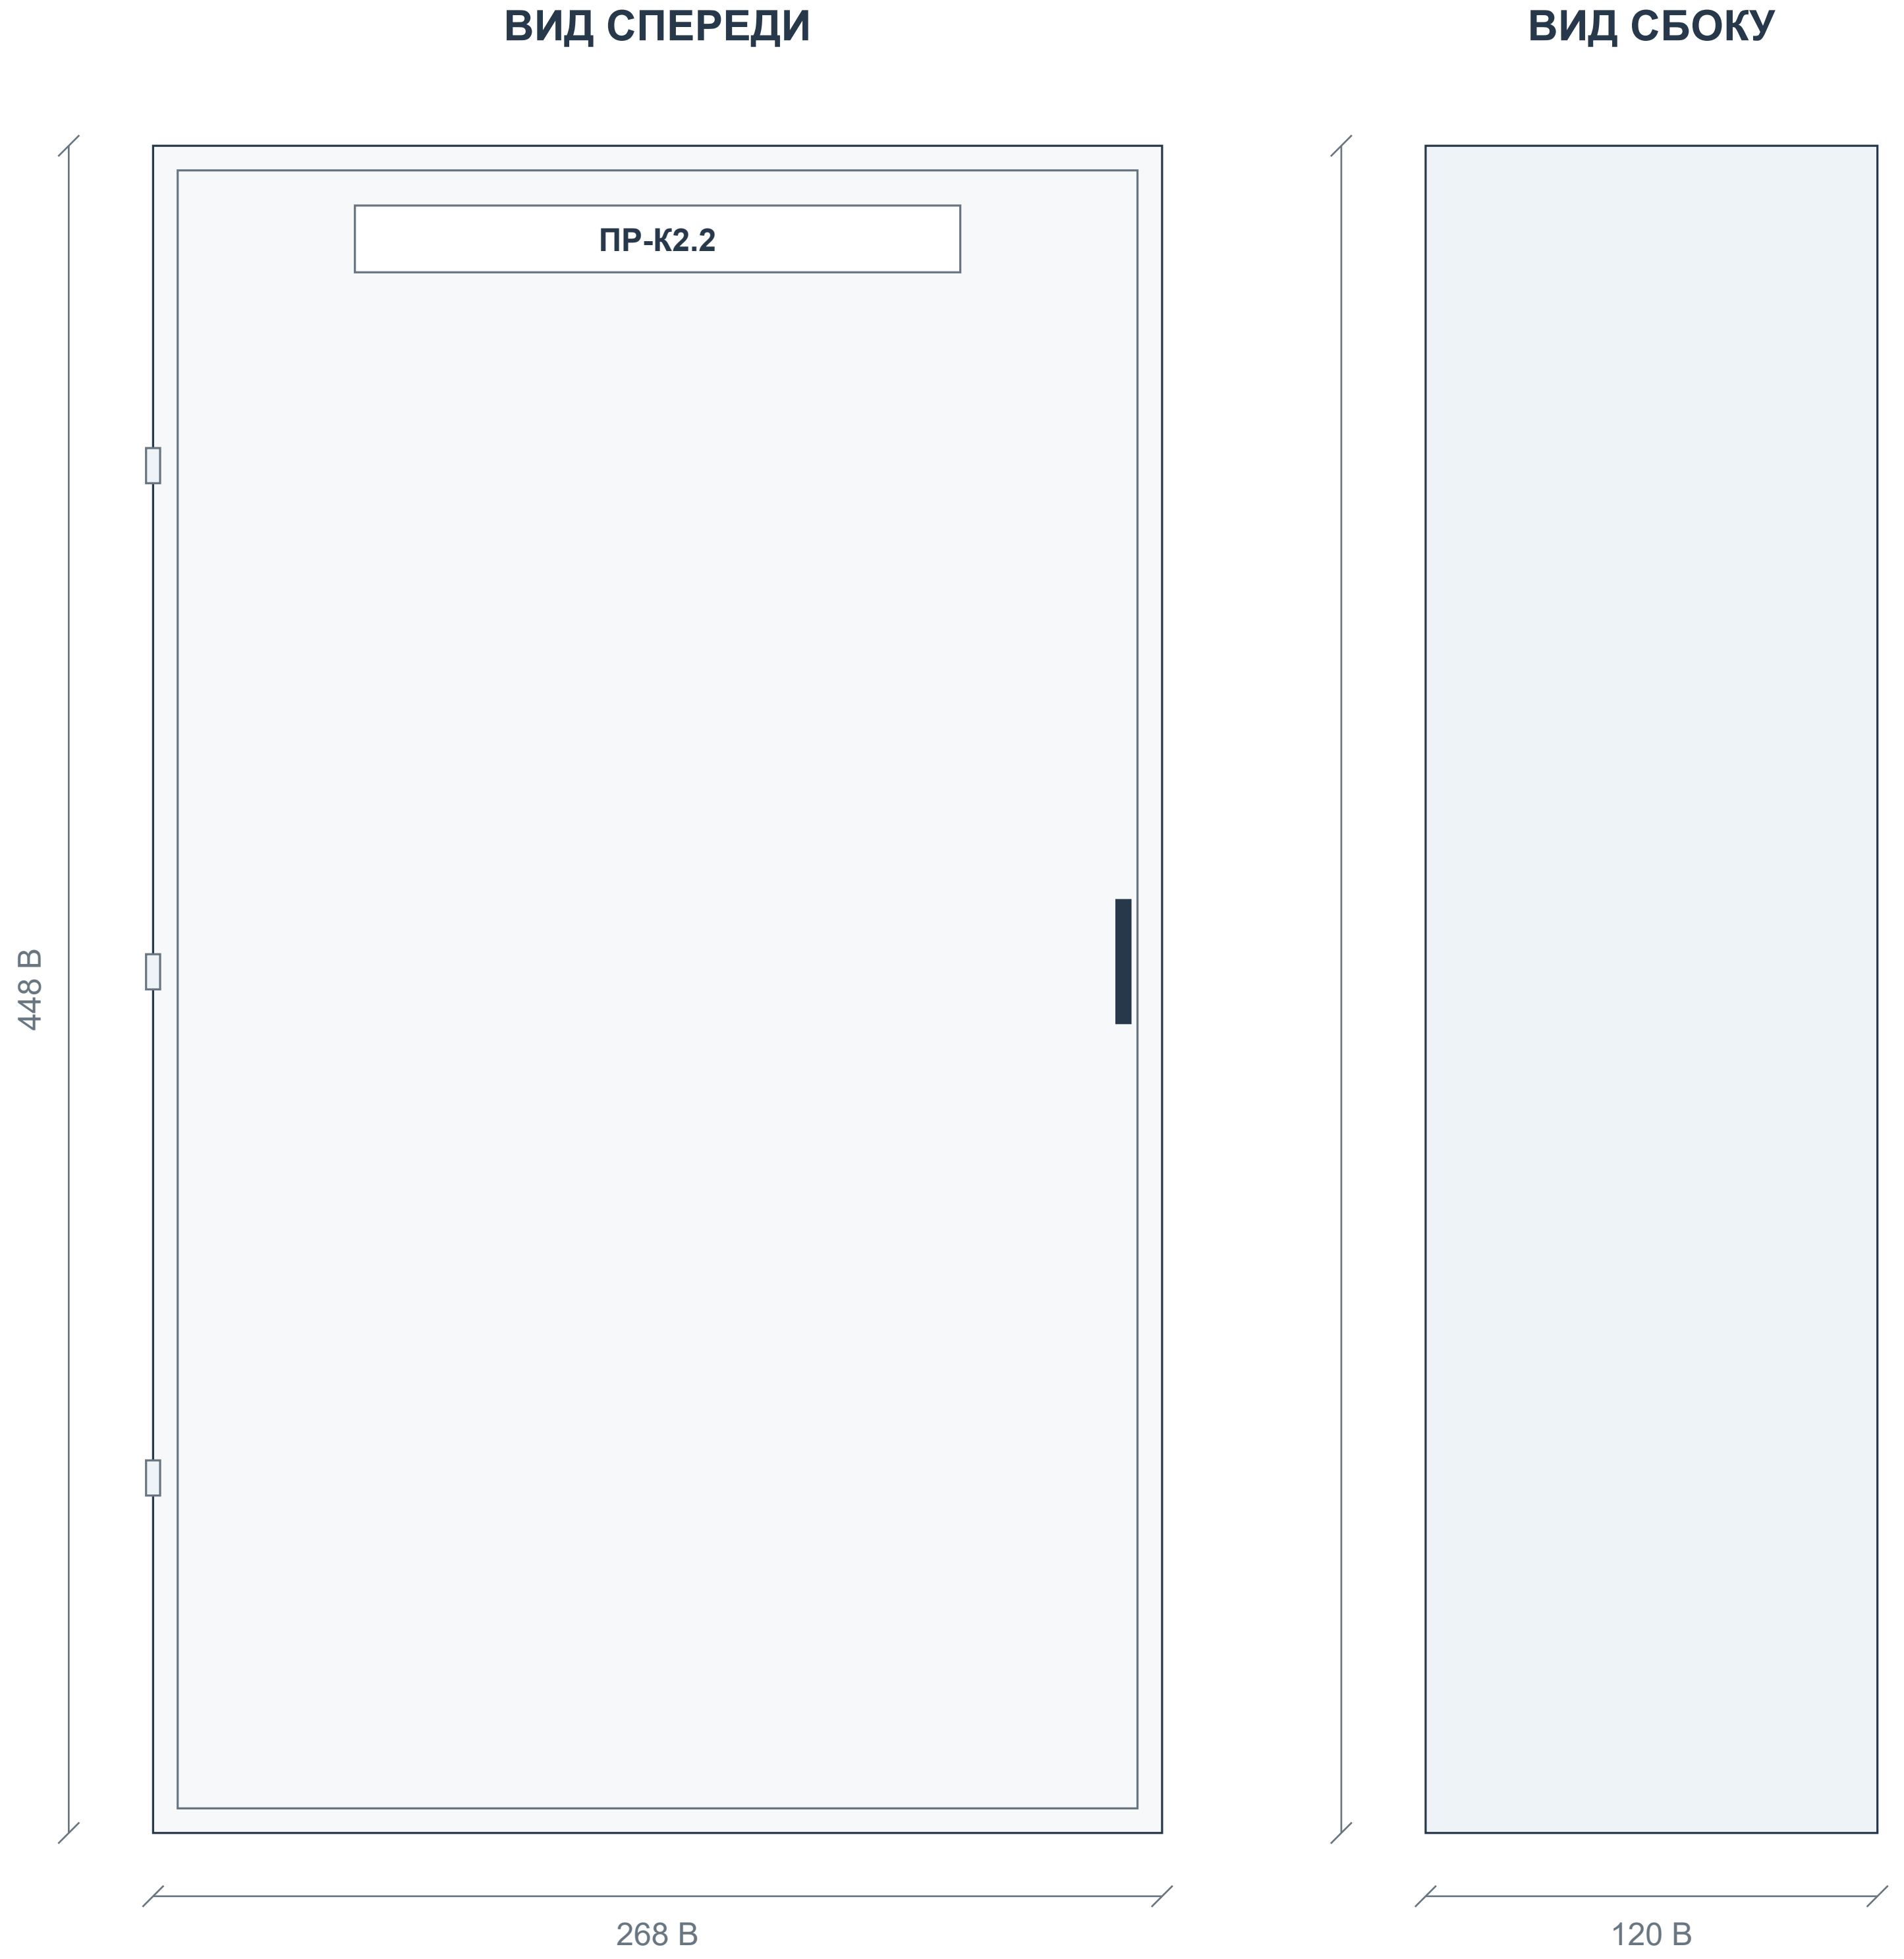

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

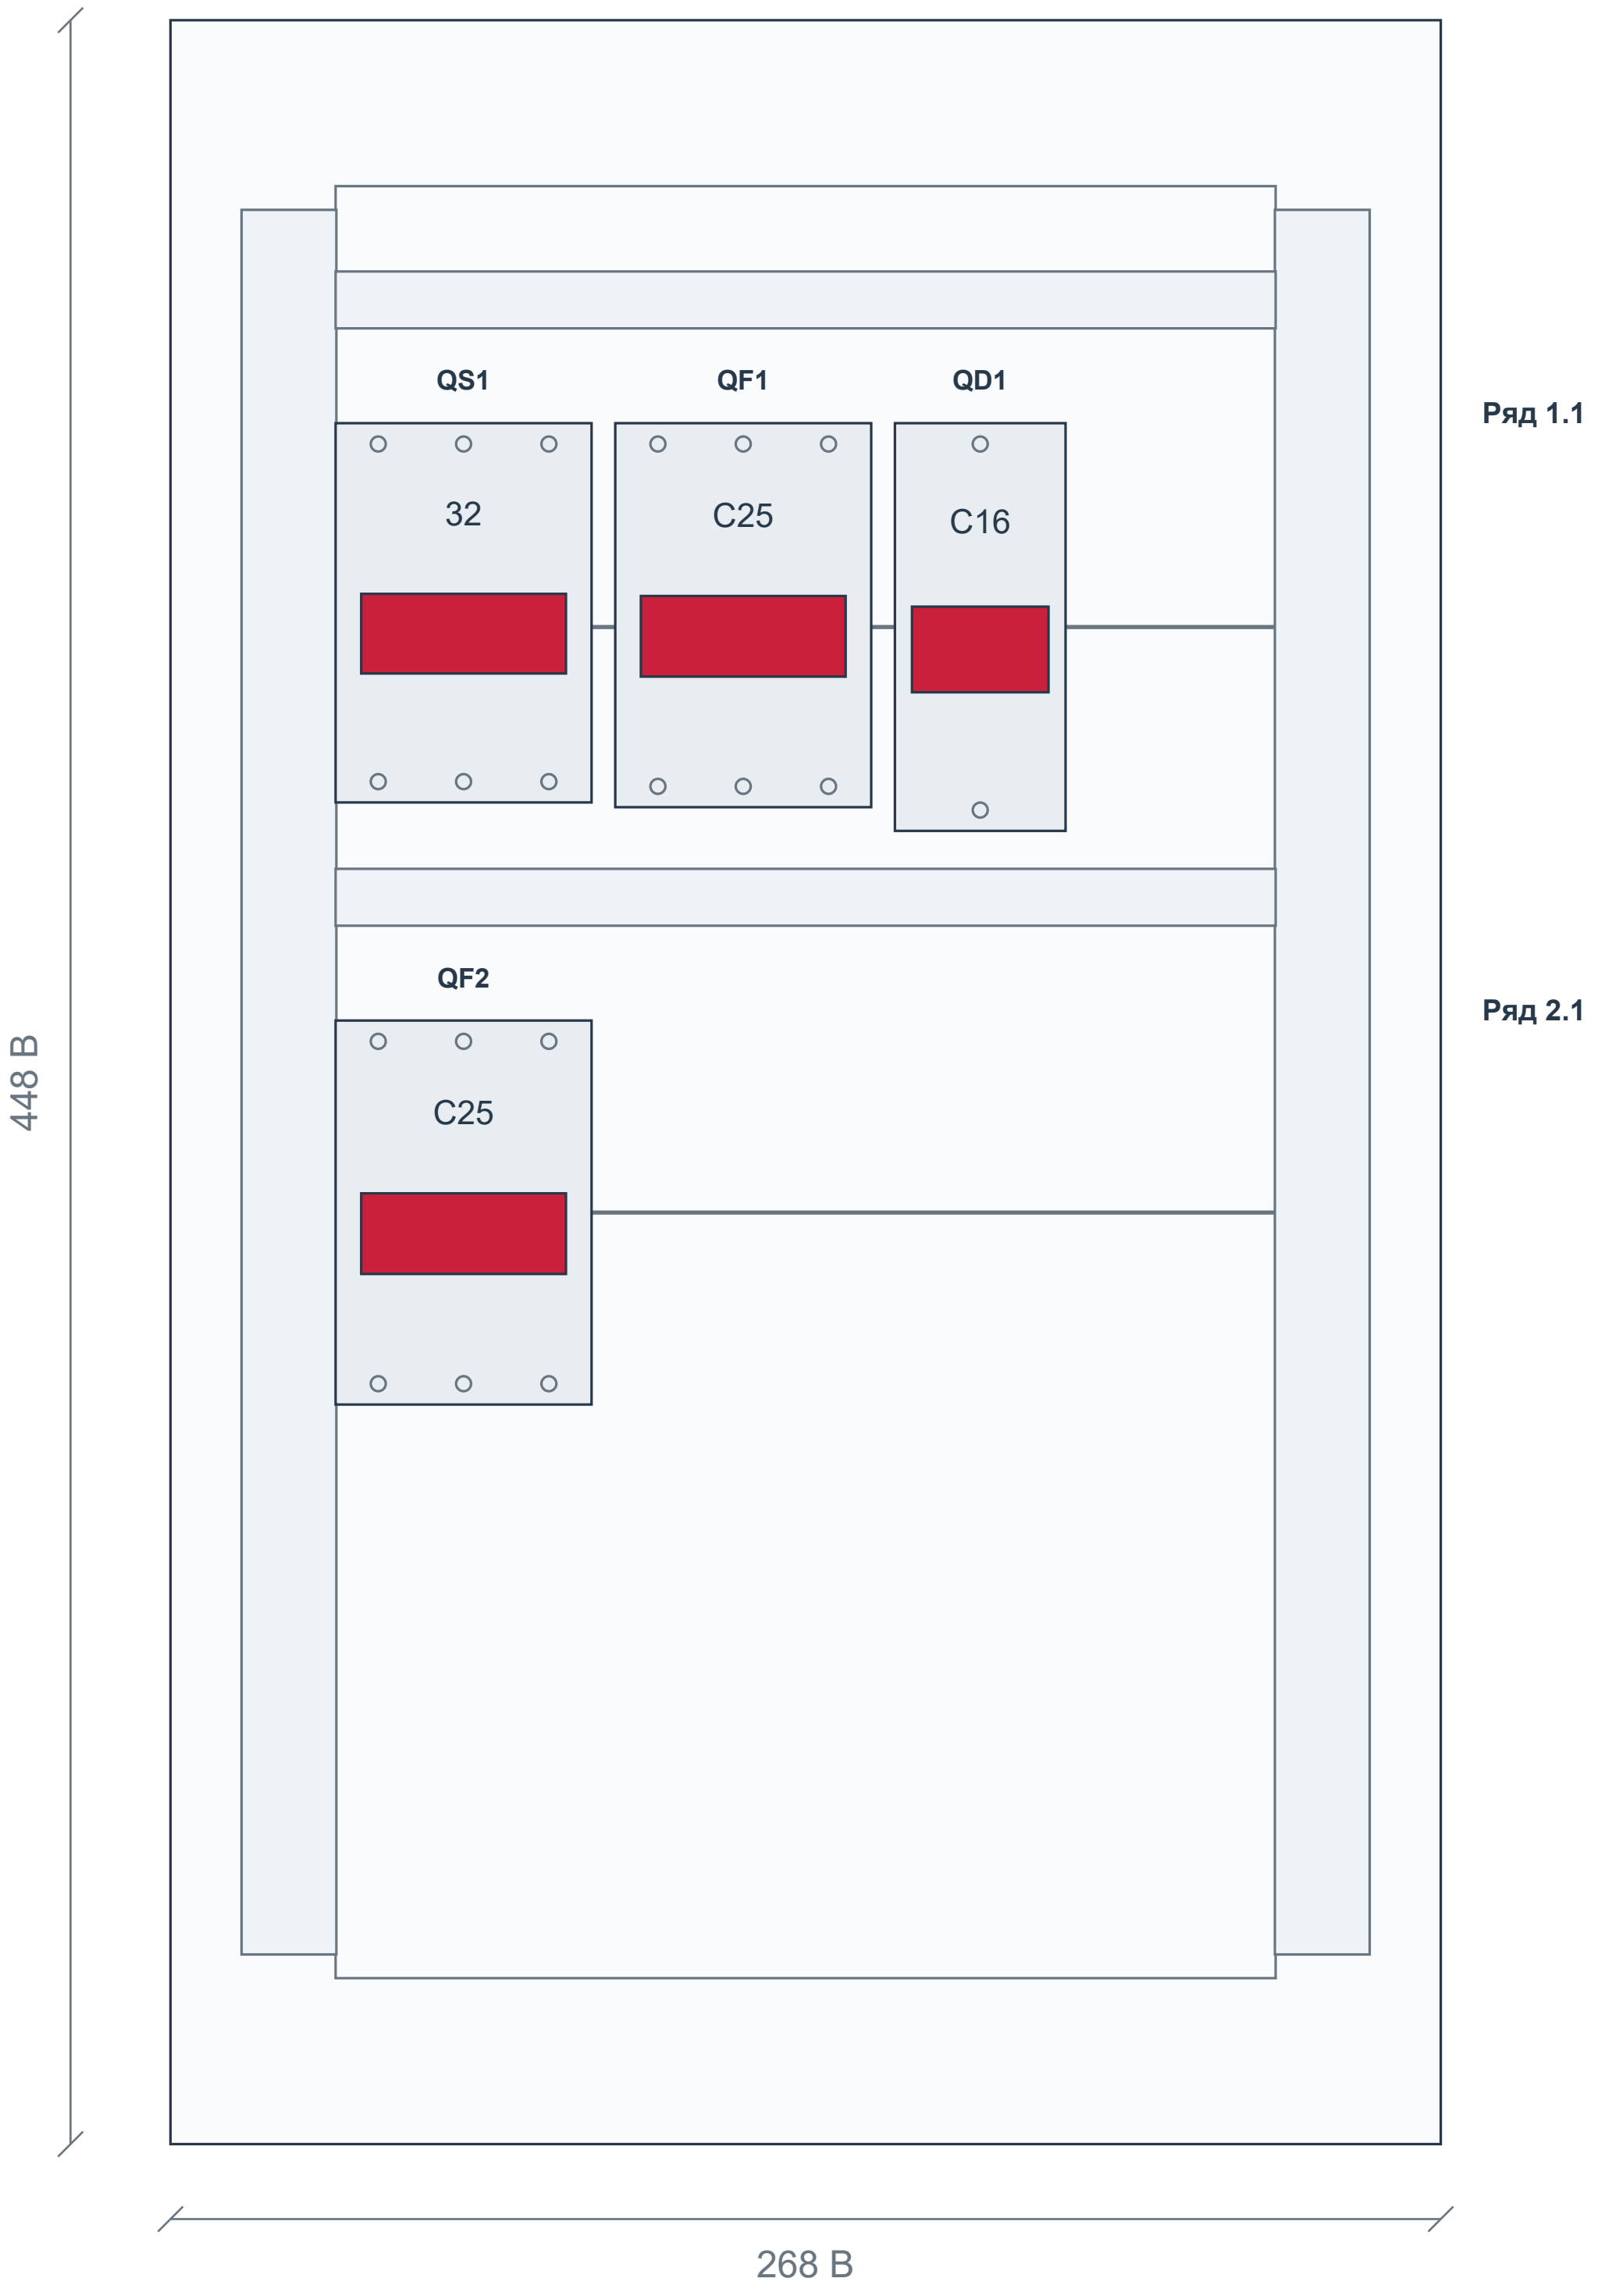

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	416	1.1	34.84	85	54 × 80
QF1	NXB-63S	417	1.1	93.84	85	54 × 81
QF2	NXB-63S	418	2.1	34.84	211	54 × 81
QD1	NXBLE-63YH	419	1.1	152.84	85	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Актуальная спецификация

ПРК-4 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 435 | ЭОМ, PDF стр. 26

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
436	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
437	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
438	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
439	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
440	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
441	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 26

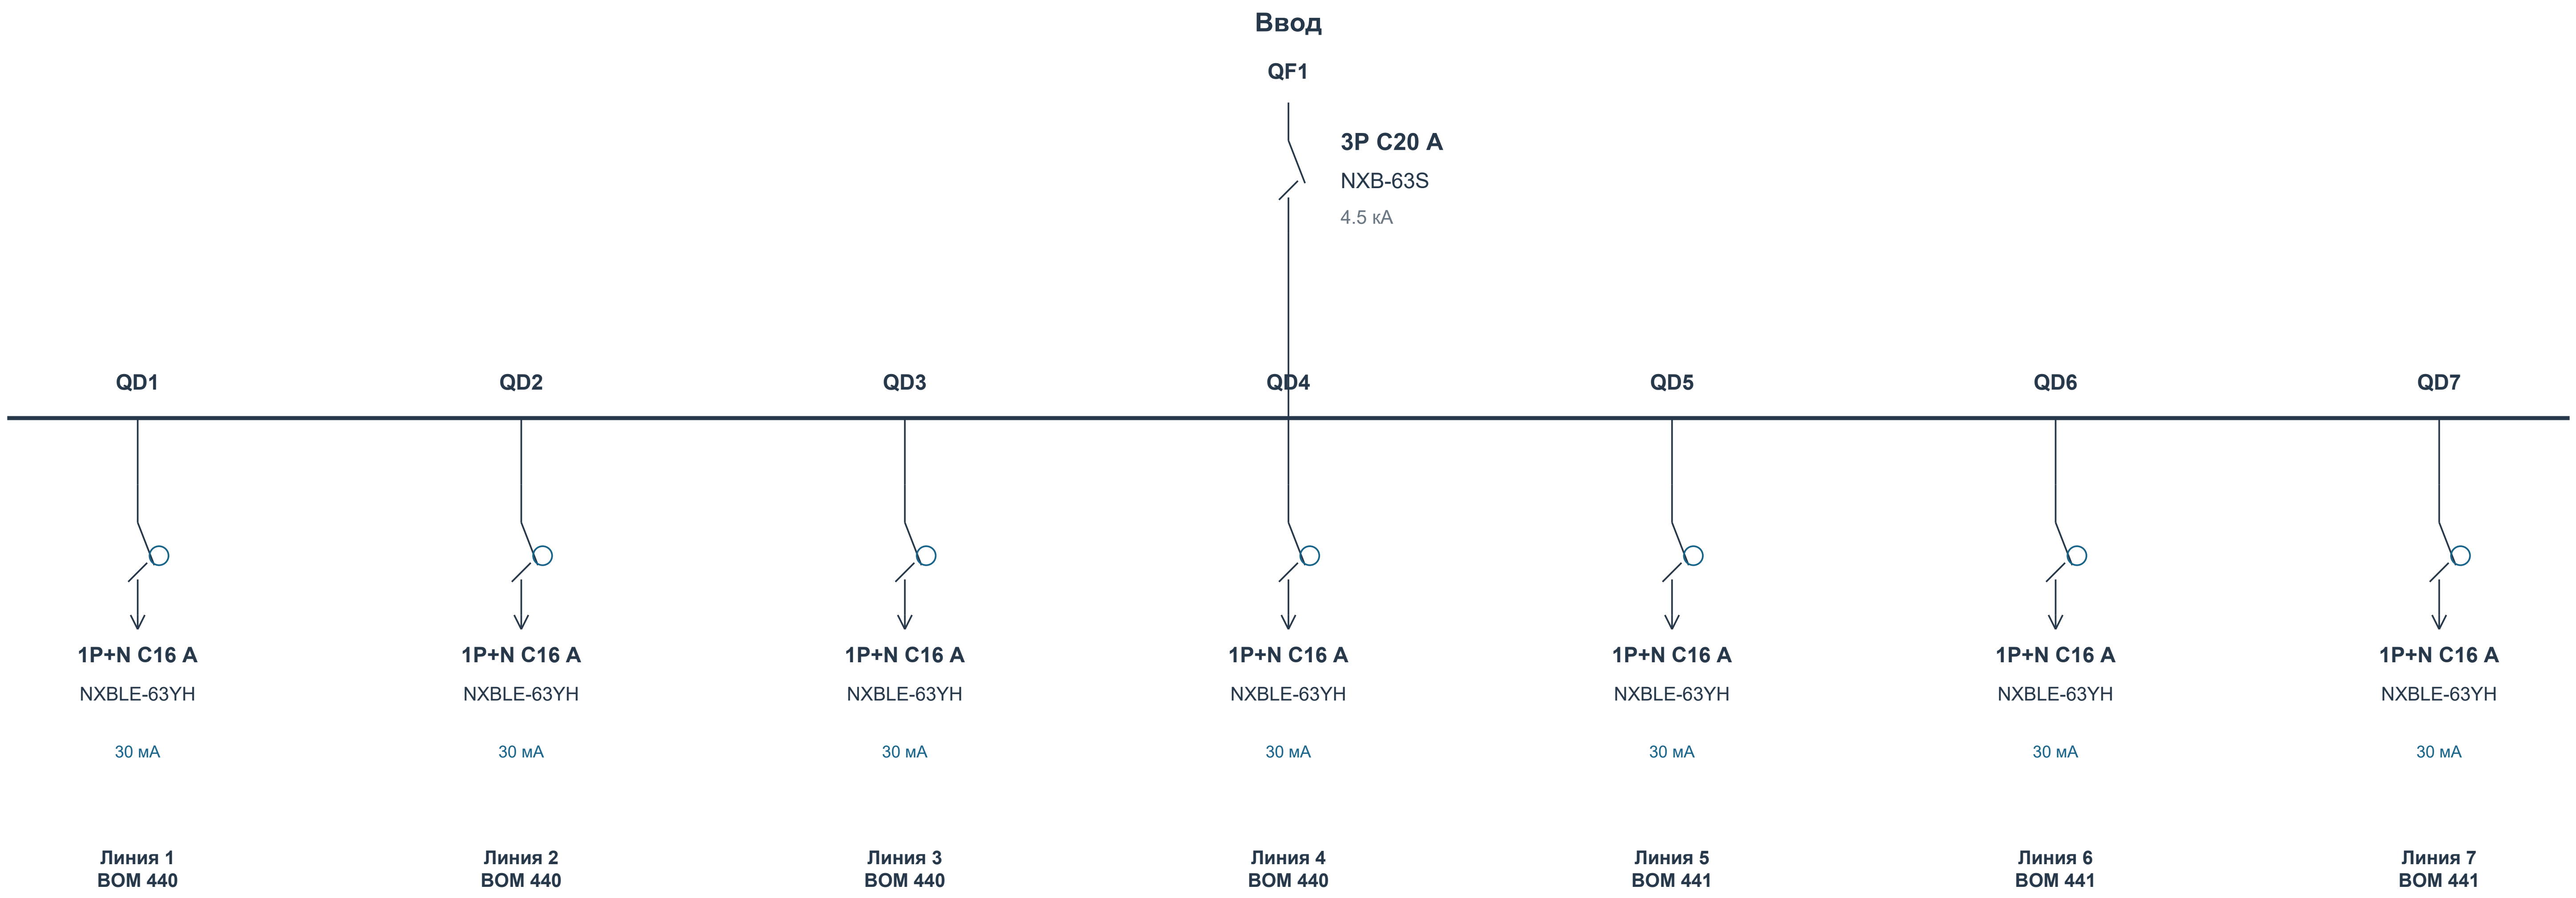
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 440
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 440
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 440
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 440
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 441
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 441
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 441

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 1.7 кВт | Рр 1,4 кВт | Iр 2,3 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

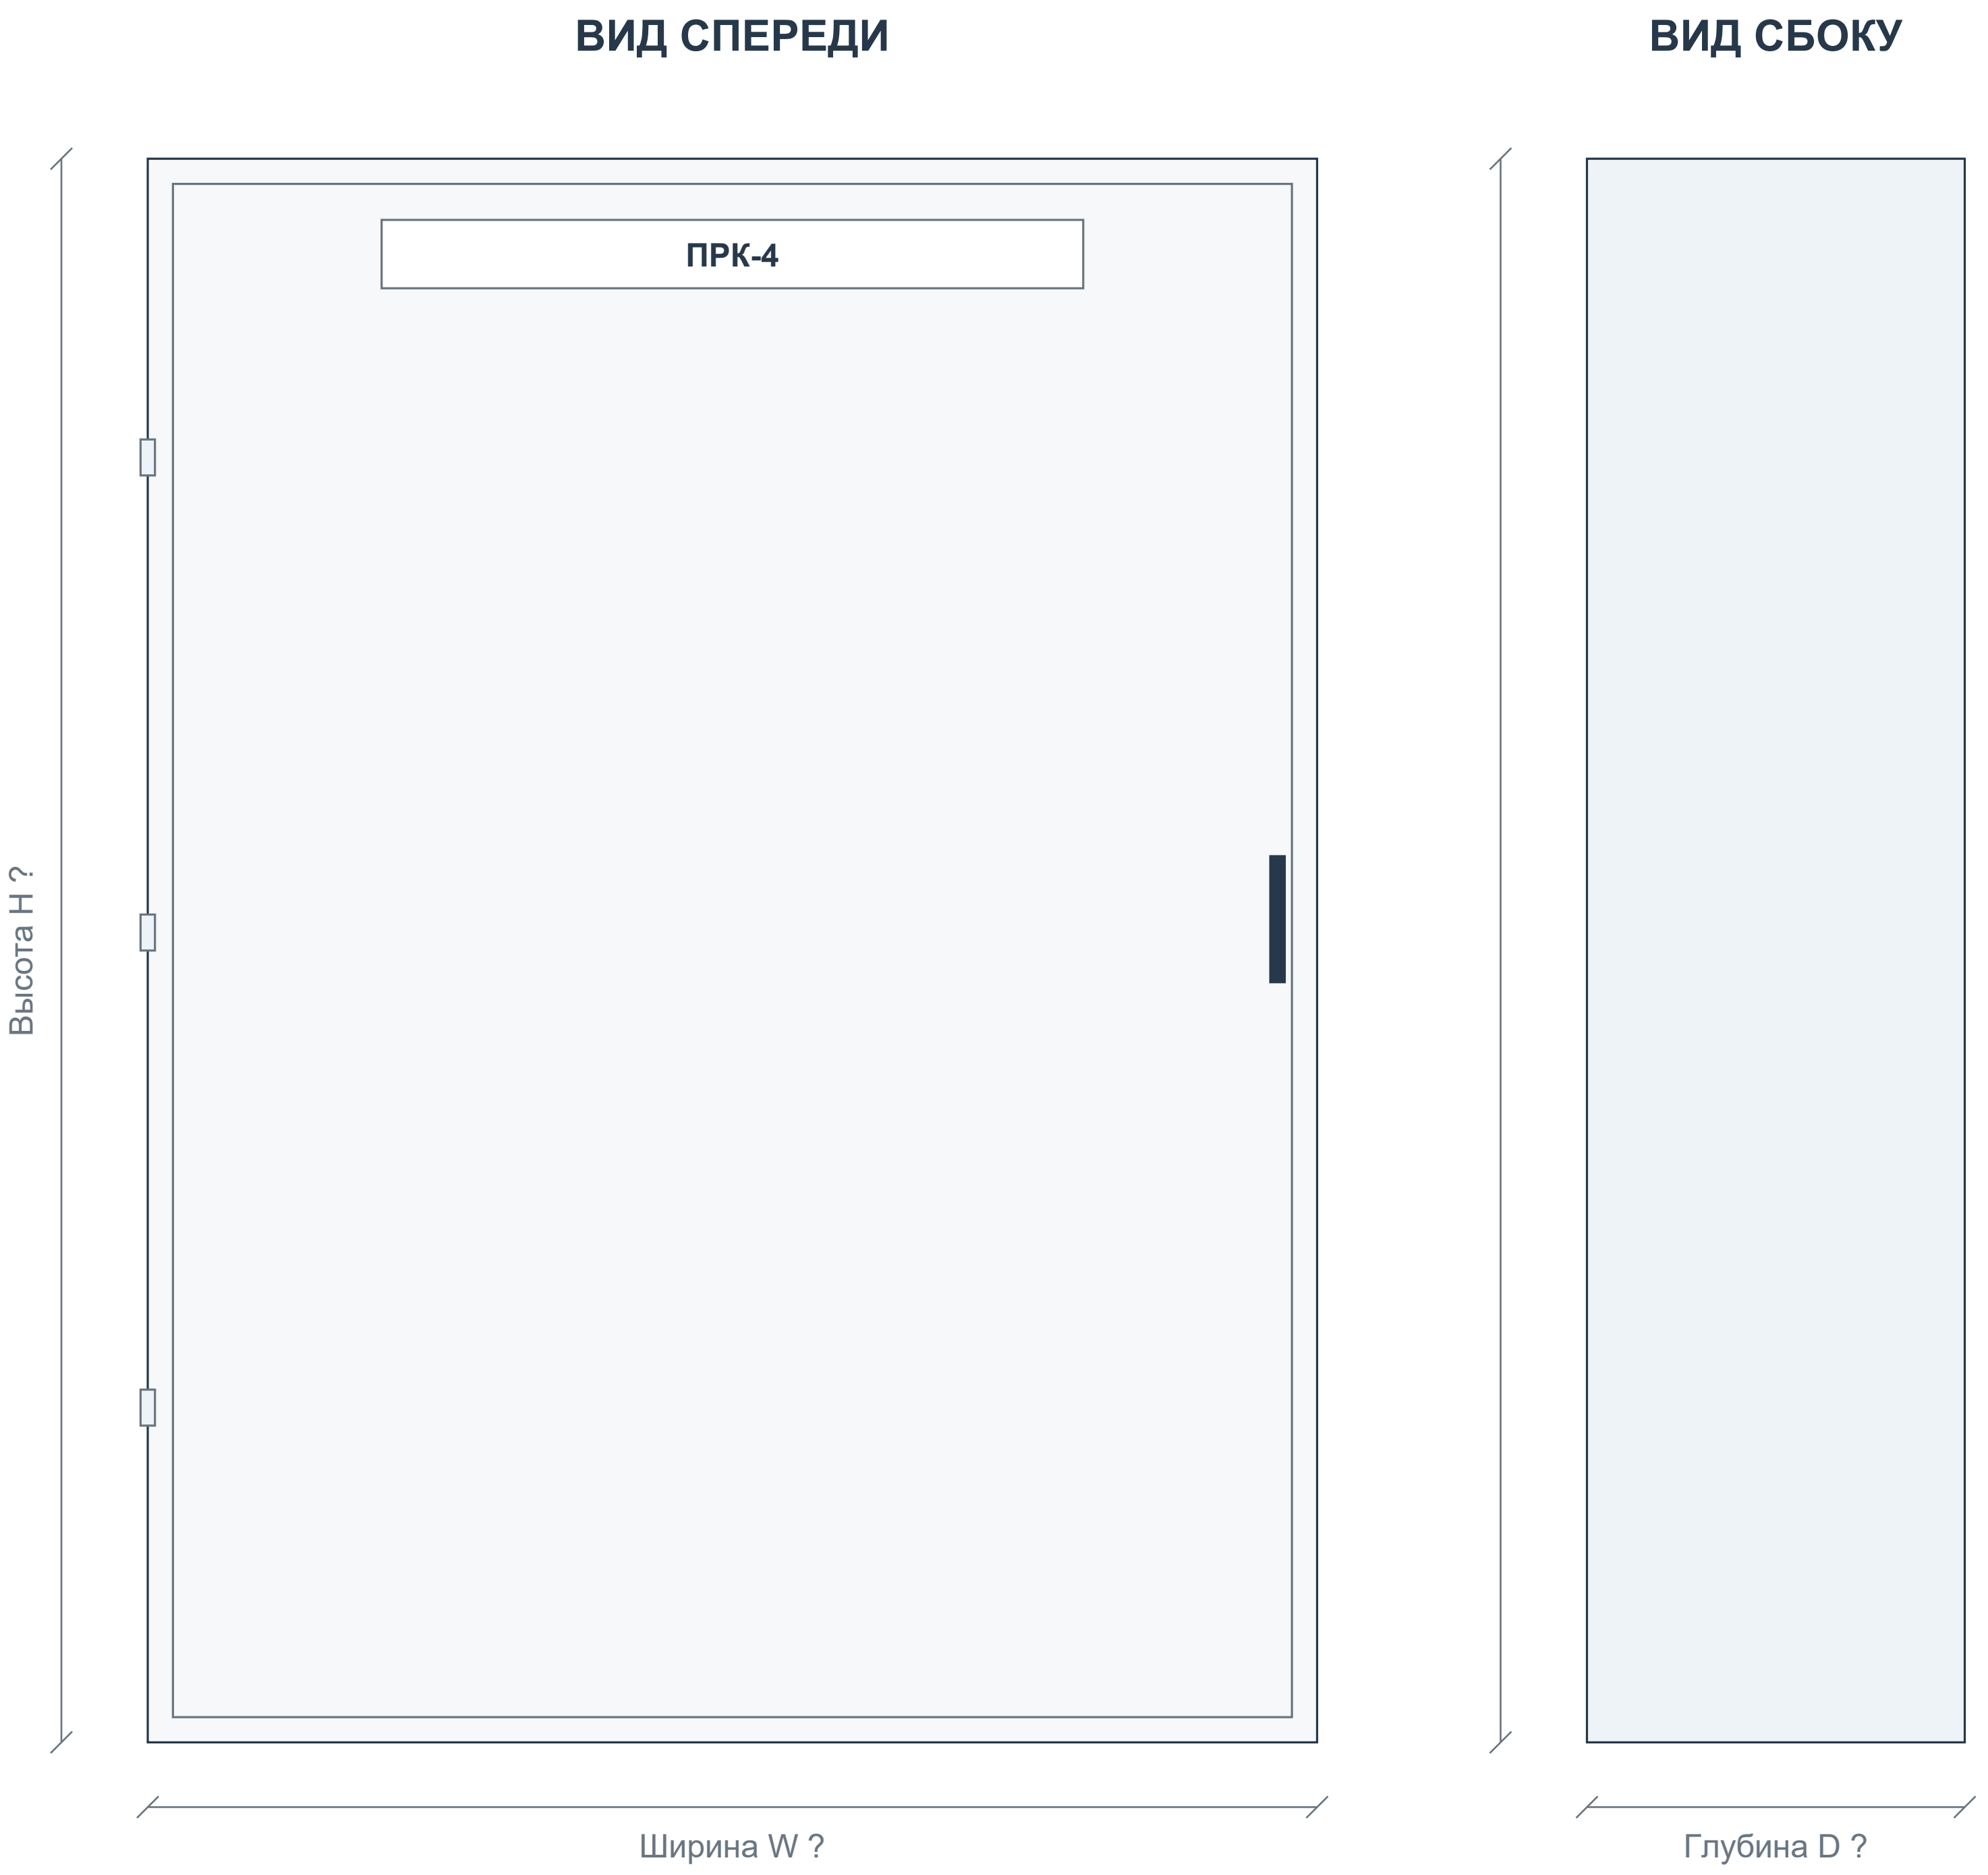

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

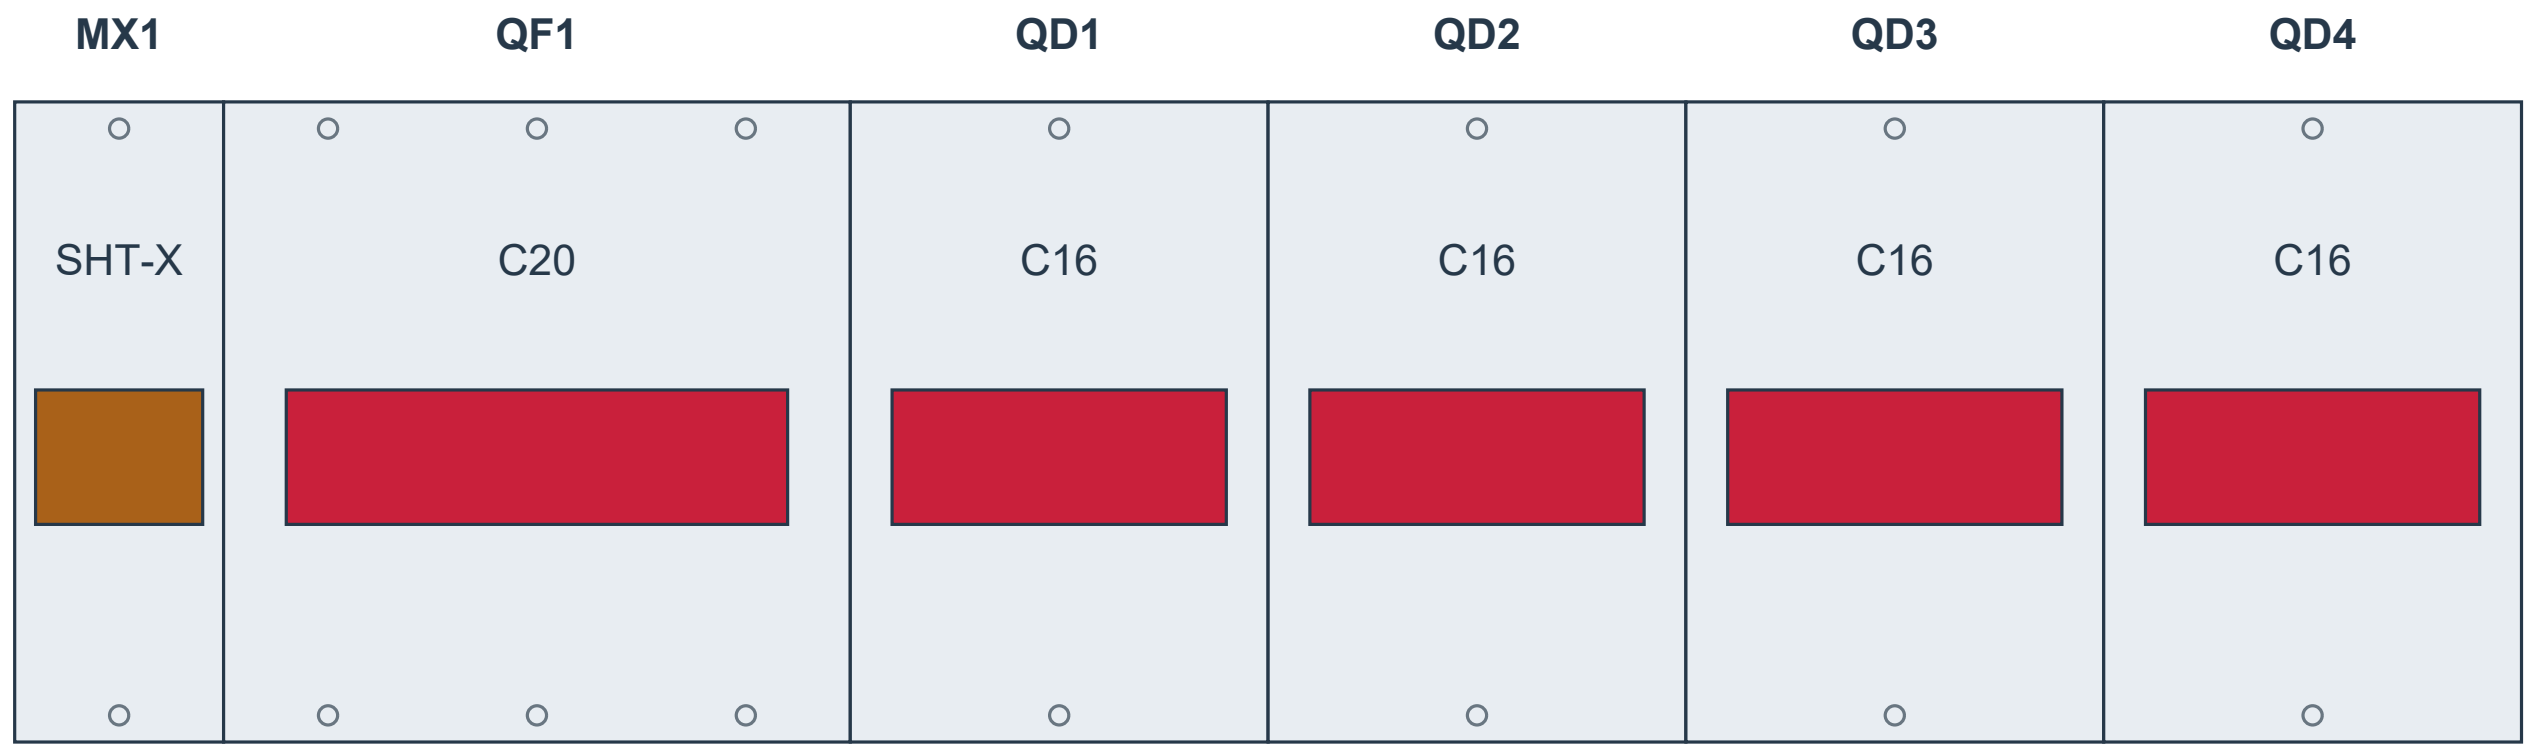

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

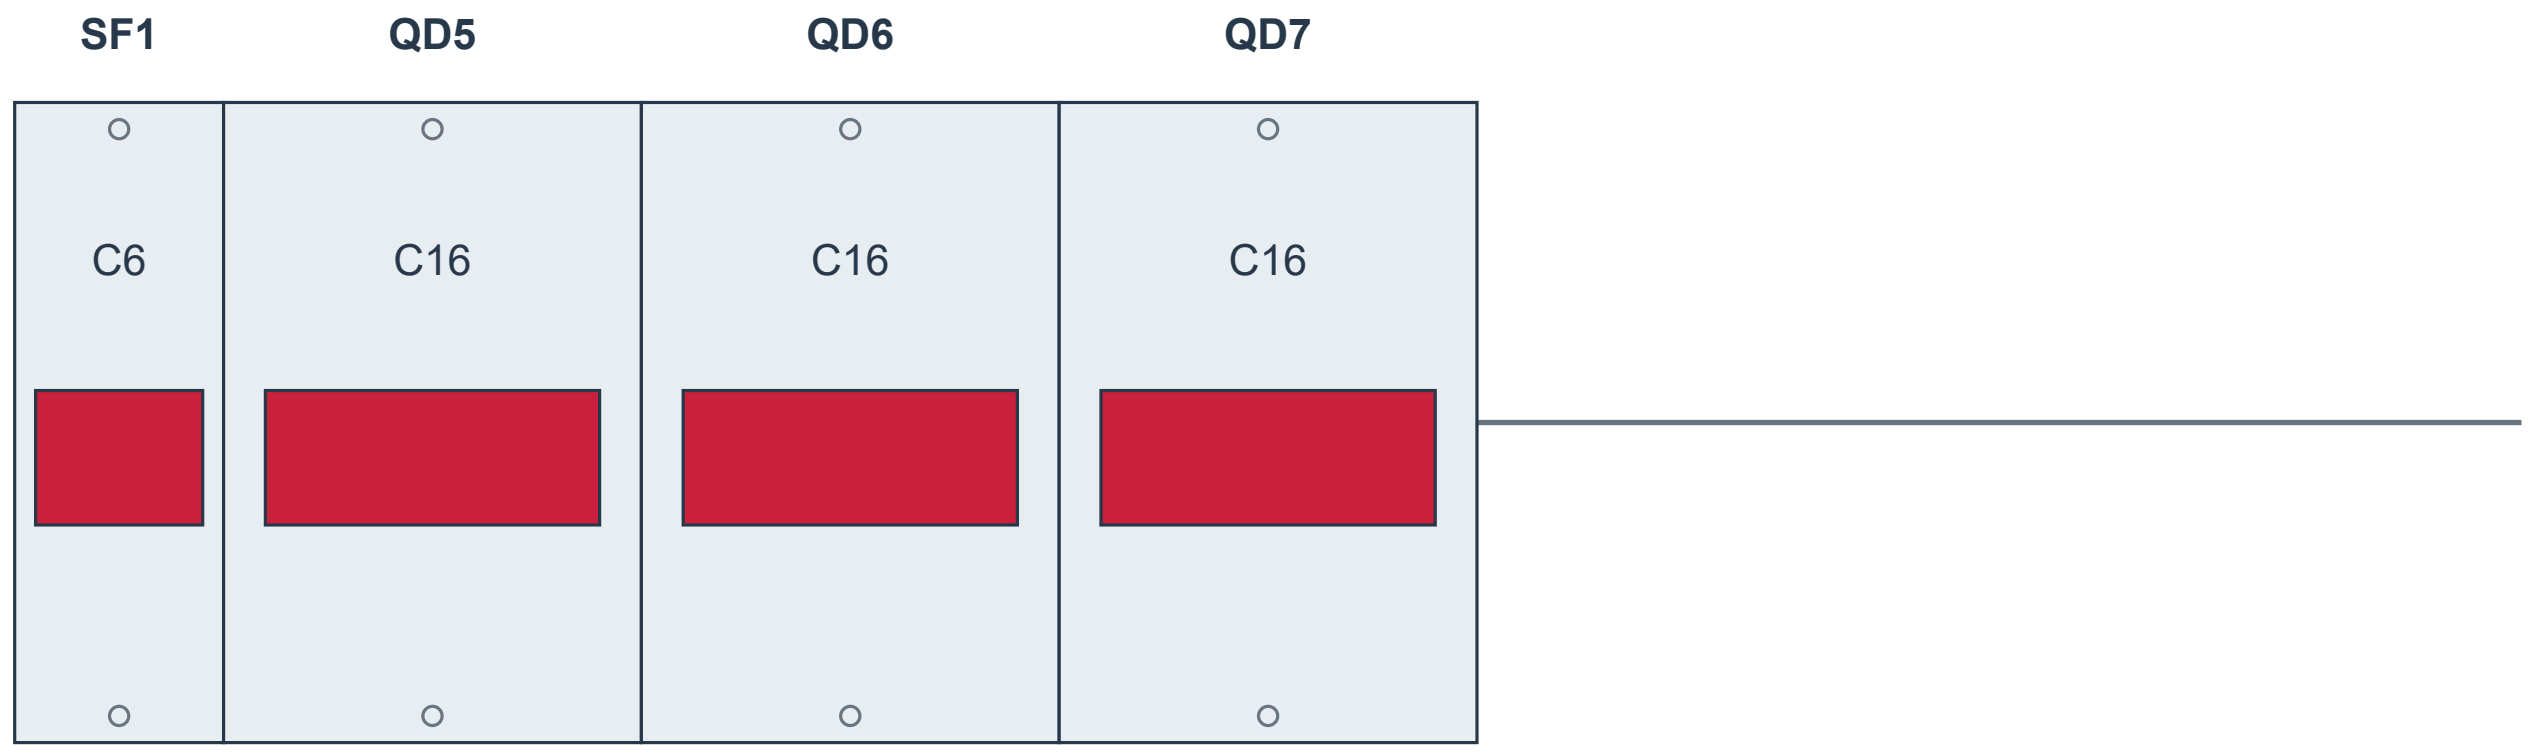

Сумма ширин: 126 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	437	1	0	?	18 B
QF1	NXB-63S	438	1	18	?	54 B
SF1	NXB-63S	439	2	0	?	18 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	440	1	72...180	?	36 B
QD5 - QD7	NXBLE-63YH	441	2	18...90	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Актуальная спецификация

ПРК-5 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 458 | ЭОМ, PDF стр. 27

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
459	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
460	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
461	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
462	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
463	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
464	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 27

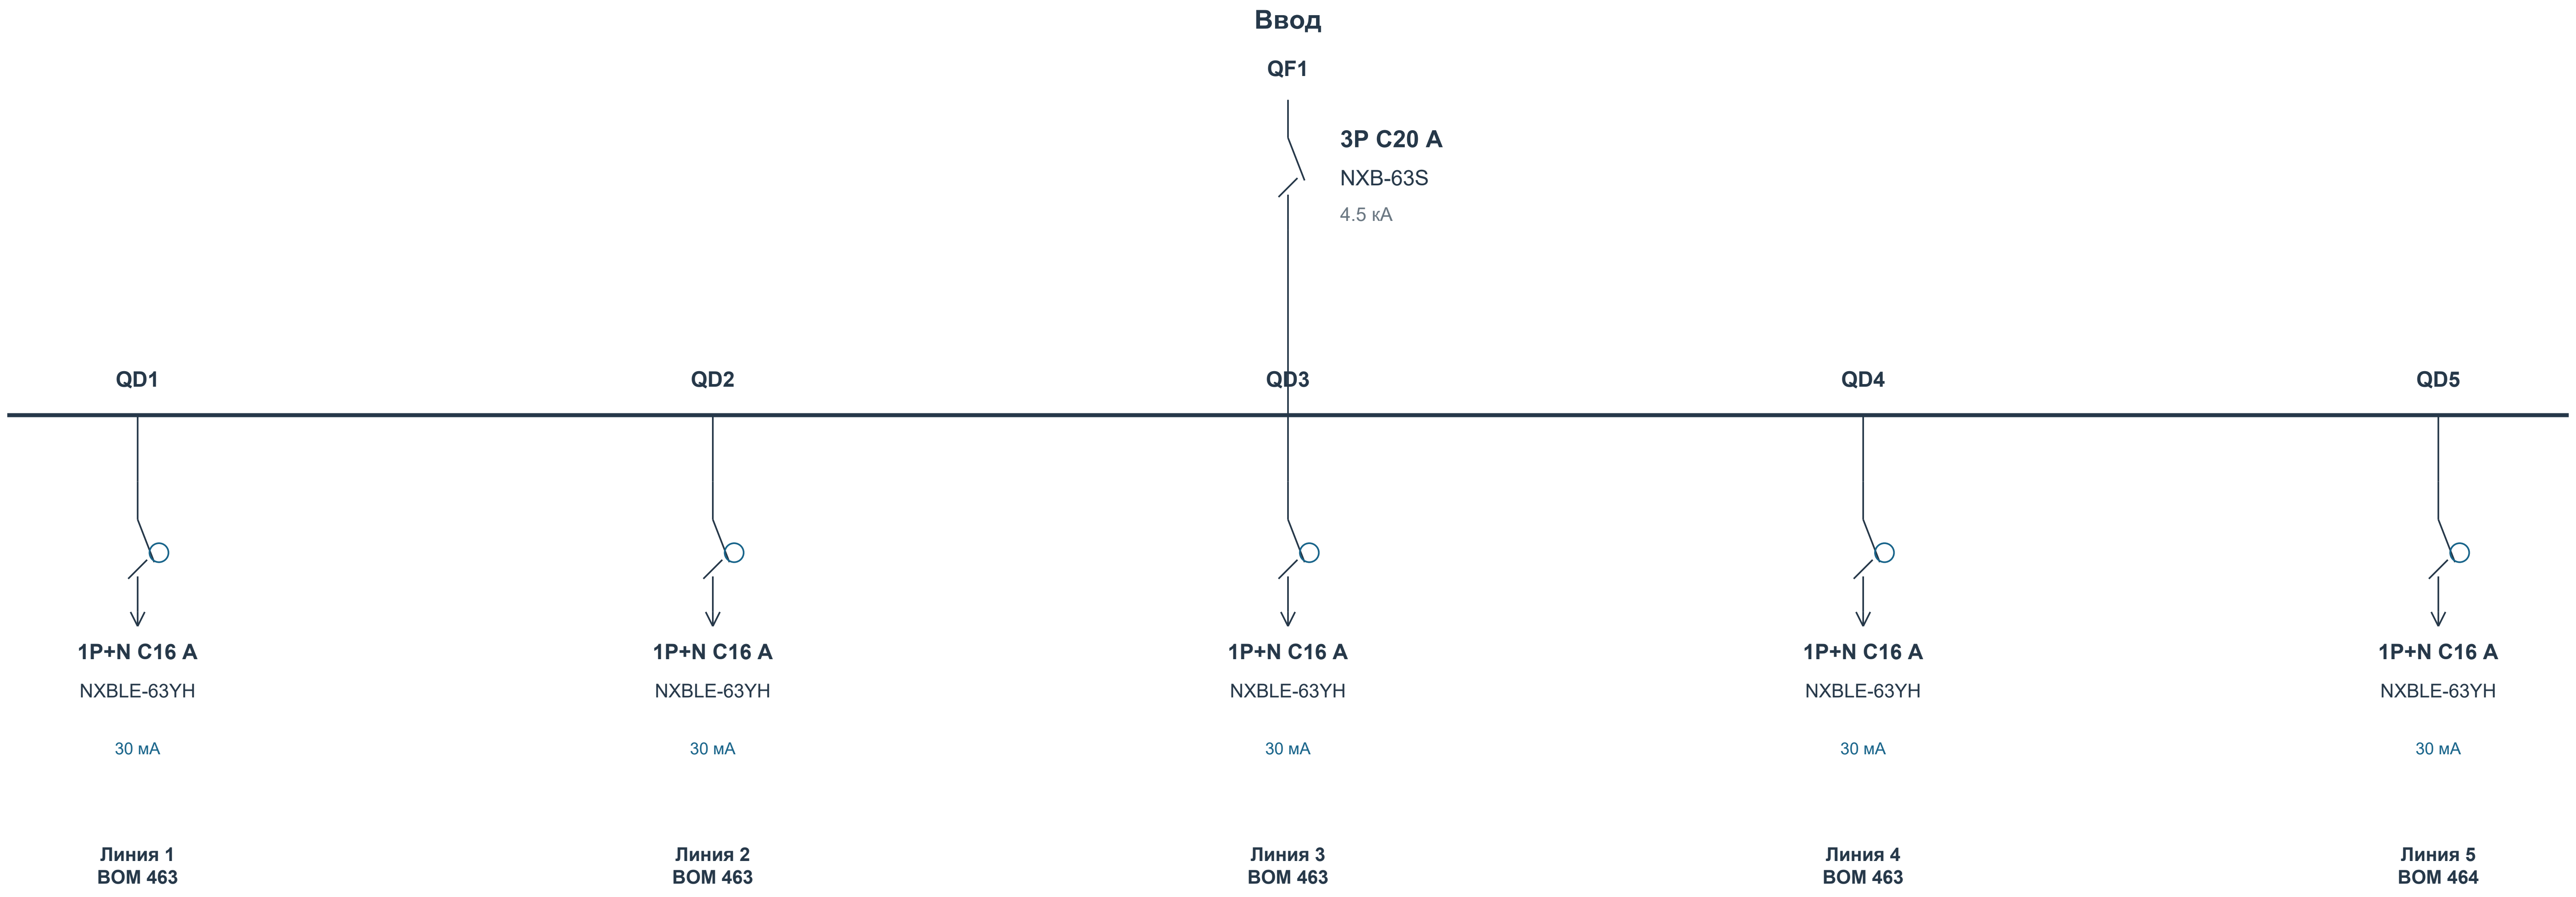
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 463
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 463
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 463
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 463
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 464

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 5.9 кВт | Рр 5,0 кВт | Iр 8,0 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

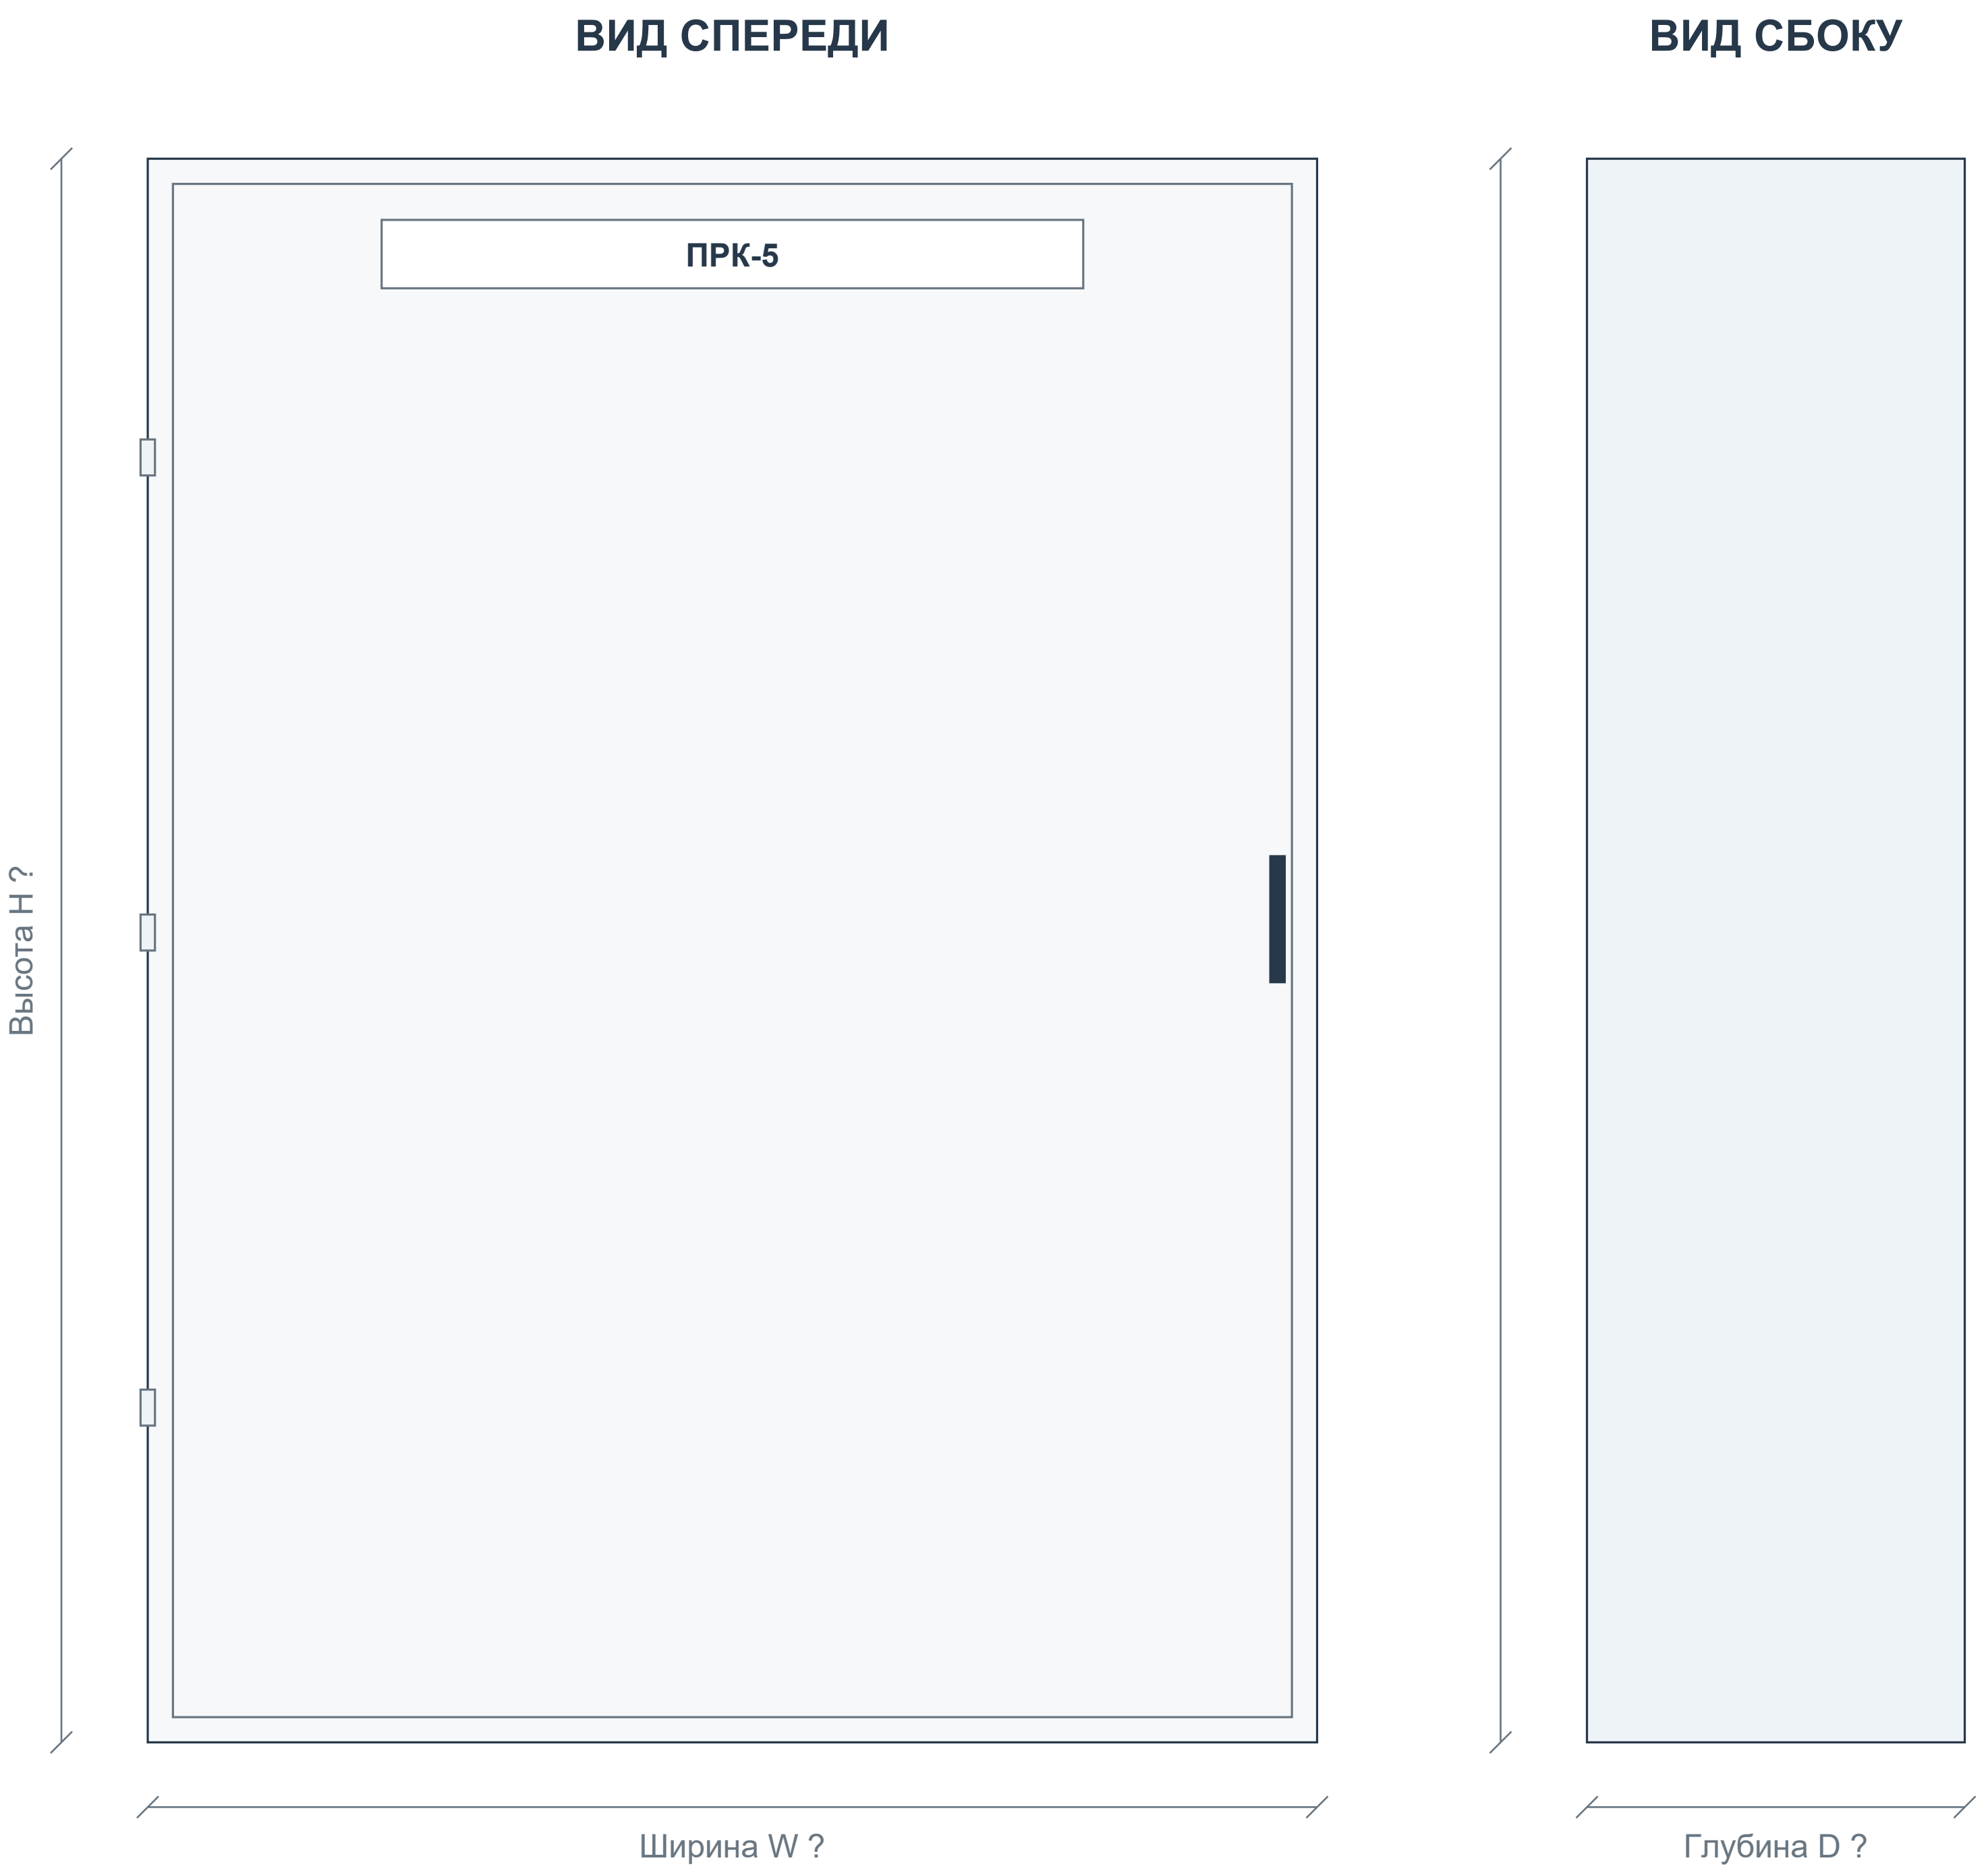

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

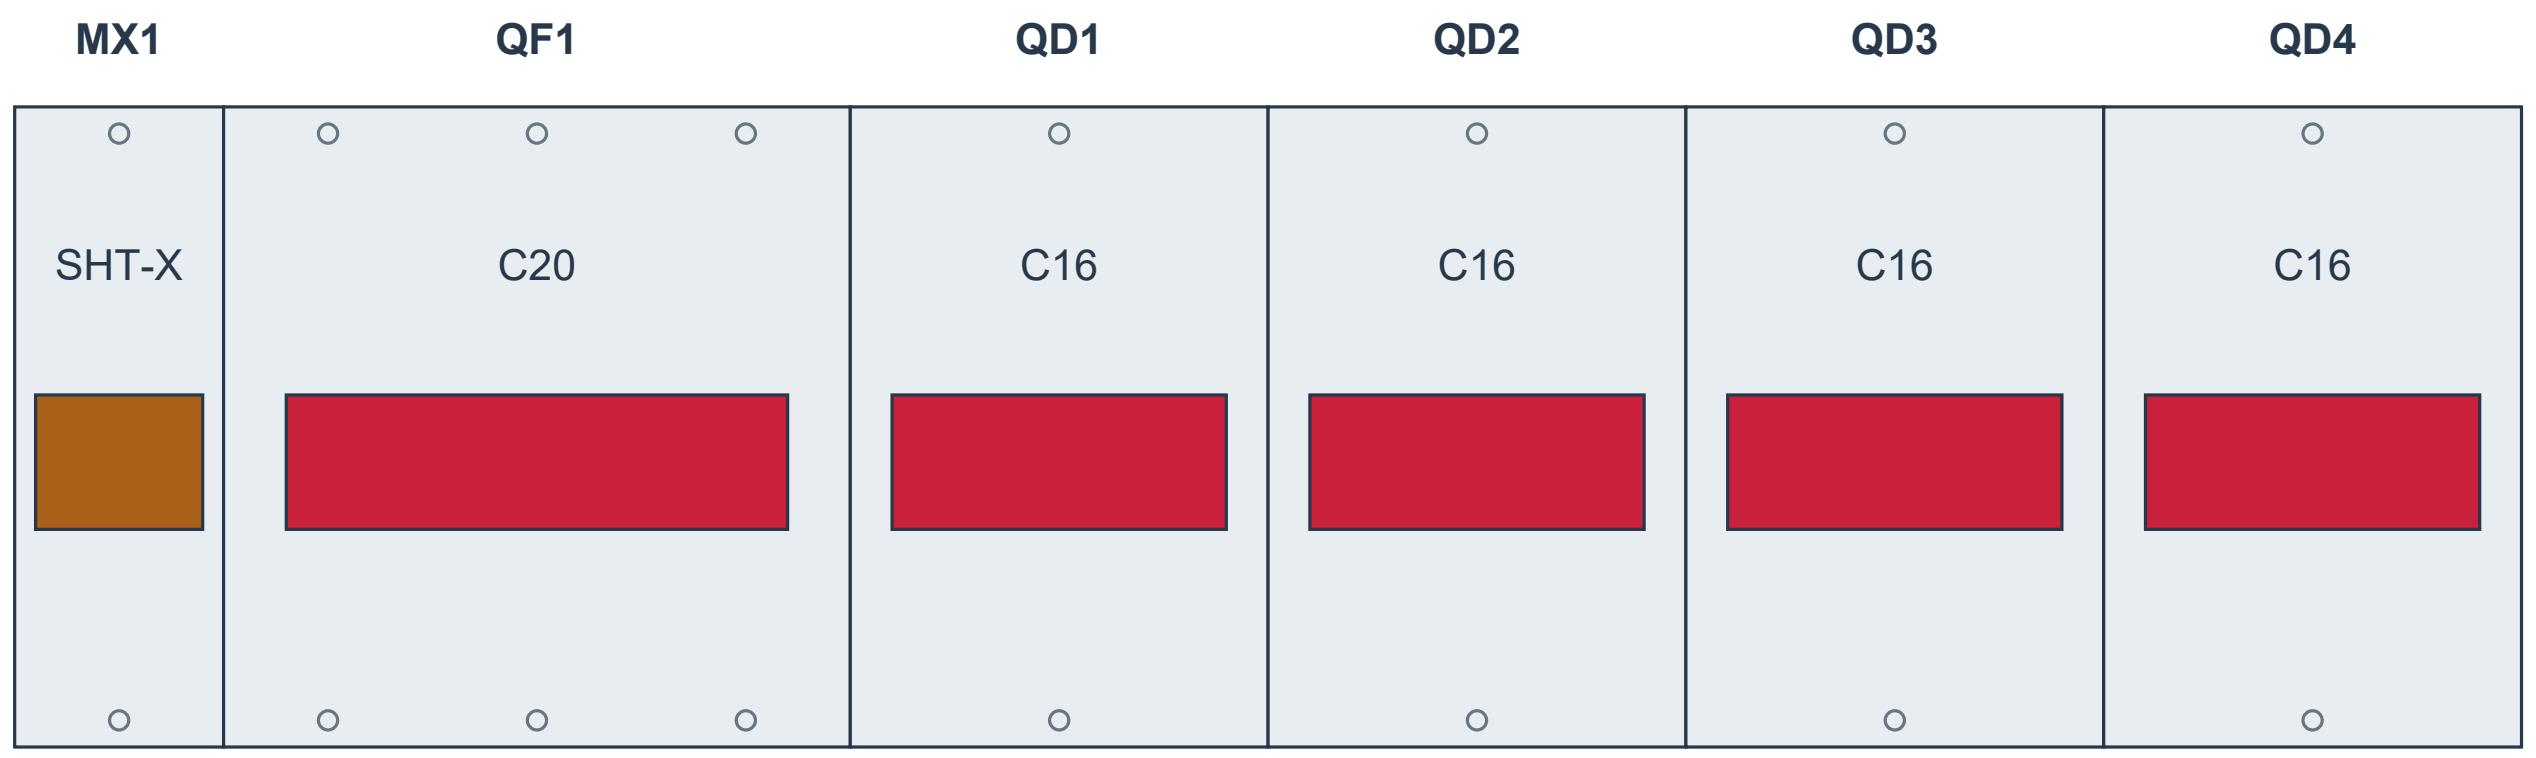

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

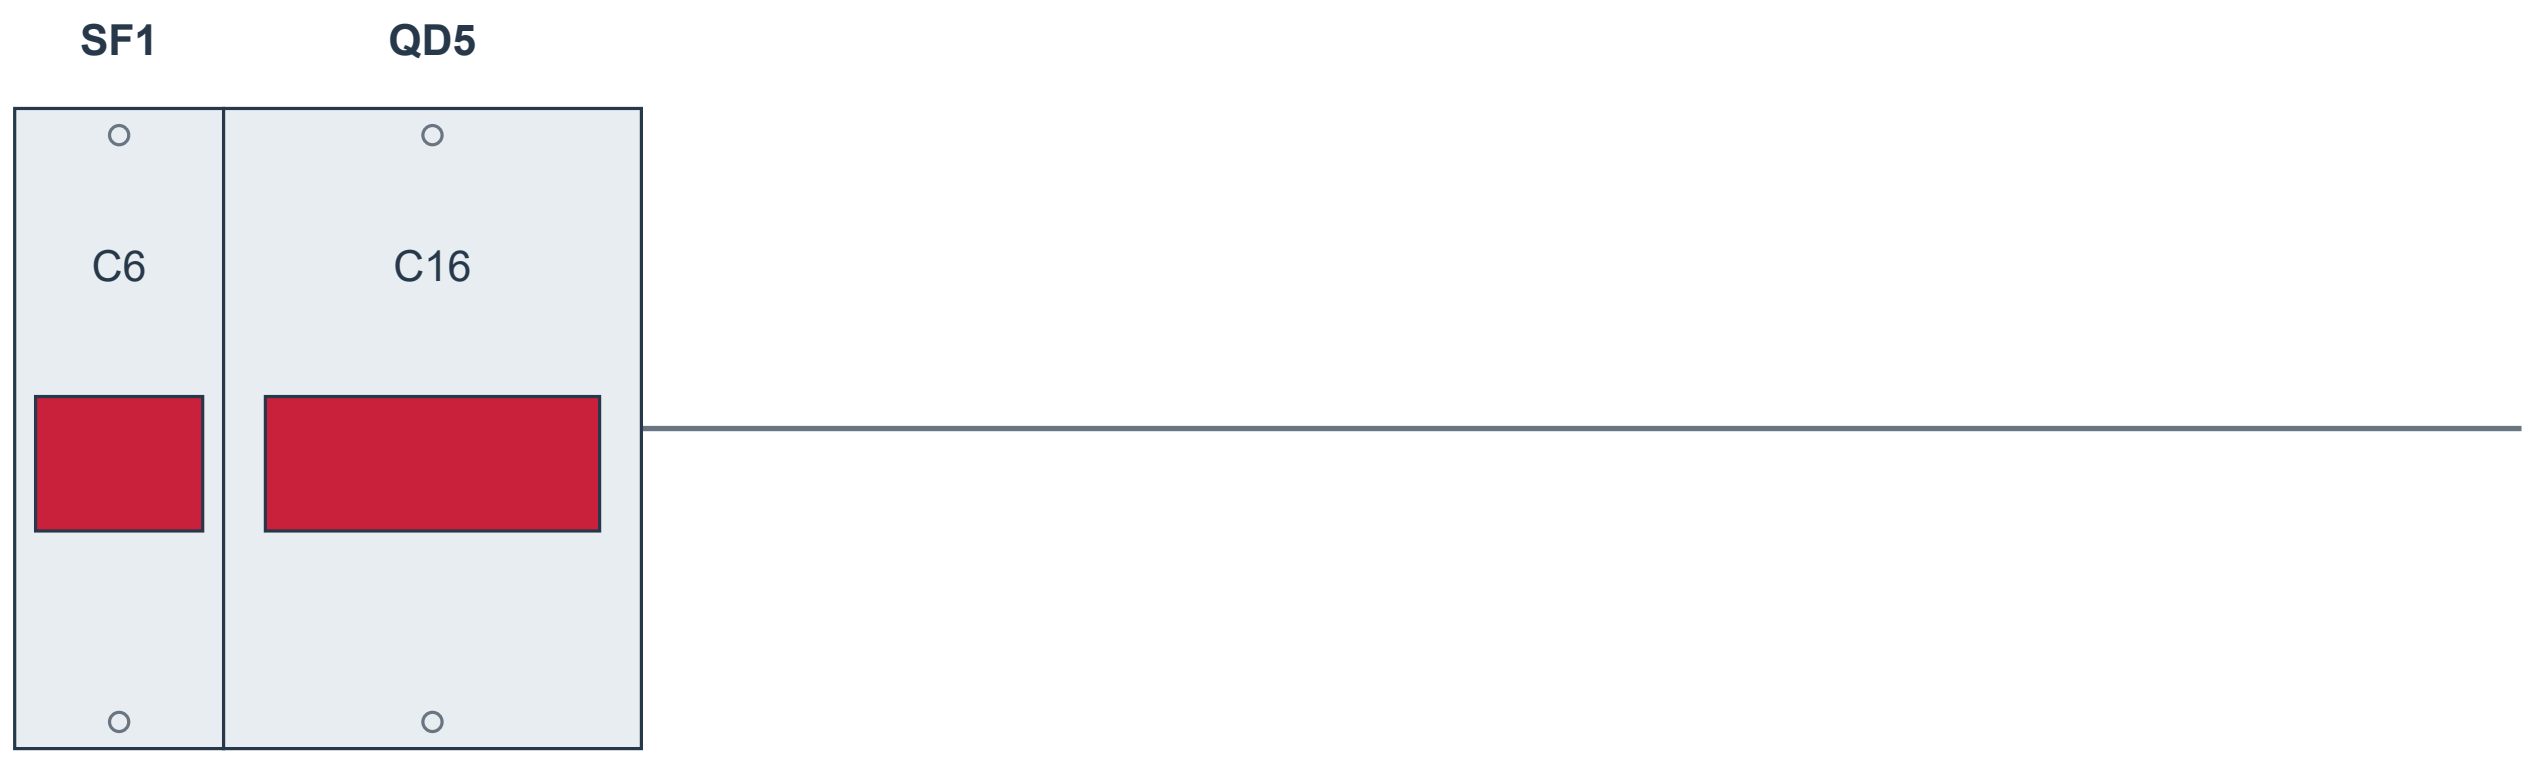

Сумма ширин: 54 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	460	1	0	?	18 B
QF1	NXB-63S	461	1	18	?	54 B
SF1	NXB-63S	462	2	0	?	18 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	463	1	72...180	?	36 B
QD5	NXBLE-63YH	464	2	18	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.3 | Актуальная спецификация

ПР-Тх2.3 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 481 | ЭОМ, PDF стр. 28

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
482	713-15060	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	шт	1	1	teksan f	Корпус
483	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
484	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
485	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	7	7	chint	Отход.
486	515388	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
487	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
488	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 28

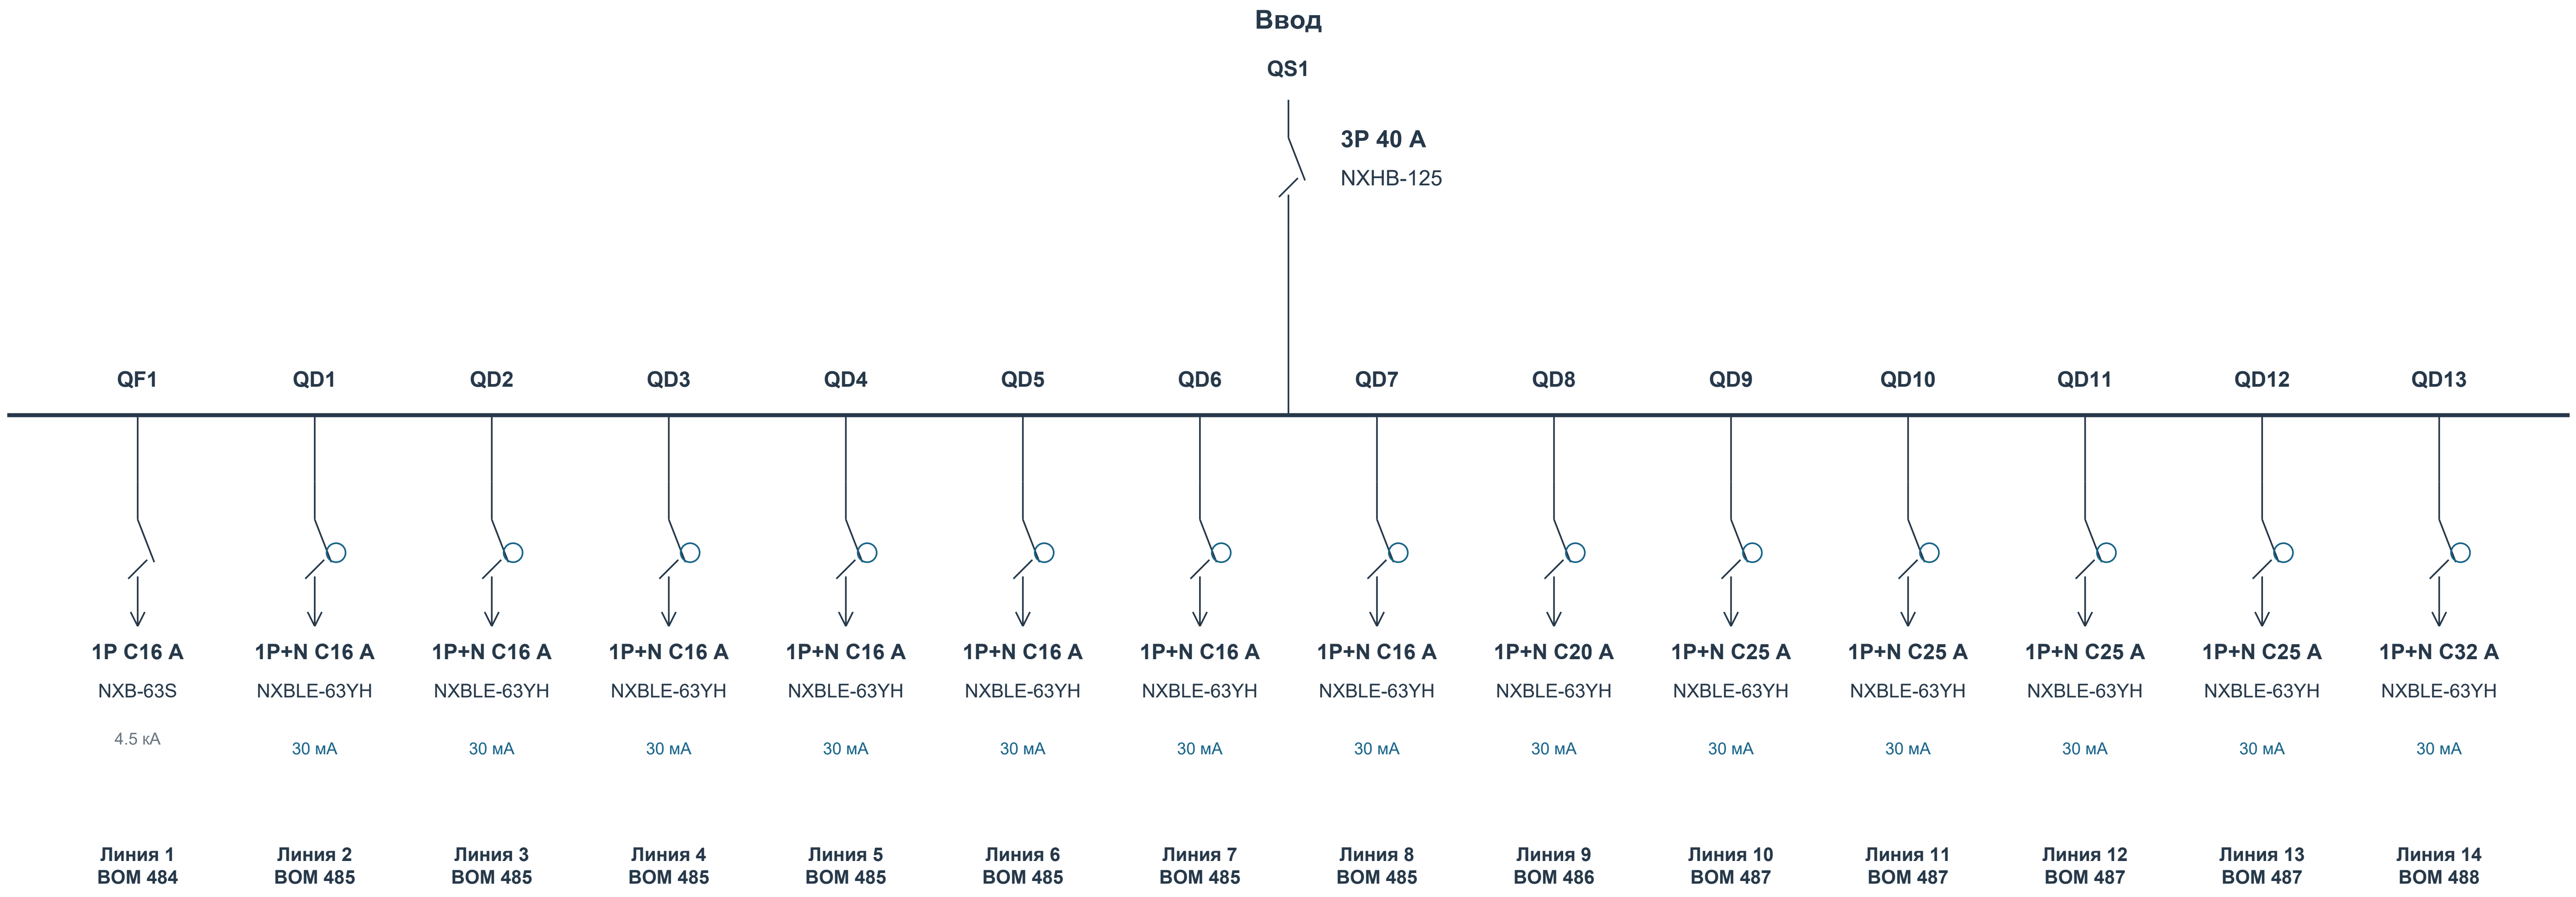
Ввод
QS1
3P 40 A
NXHB-125
QF1
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
QD9
QD10
QD11
QD12
QD13
1P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 484
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 485
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 485
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 485
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 485
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 485
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 485
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 485
1P+N C20 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 9
BOM 486
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 10
BOM 487
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 11
BOM 487
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 12
BOM 487
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 13
BOM 487
1P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 14
BOM 488

Данные исходного проекта: Ру 32.6 кВт | Рр 5,5 кВт | Ір 8,9 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

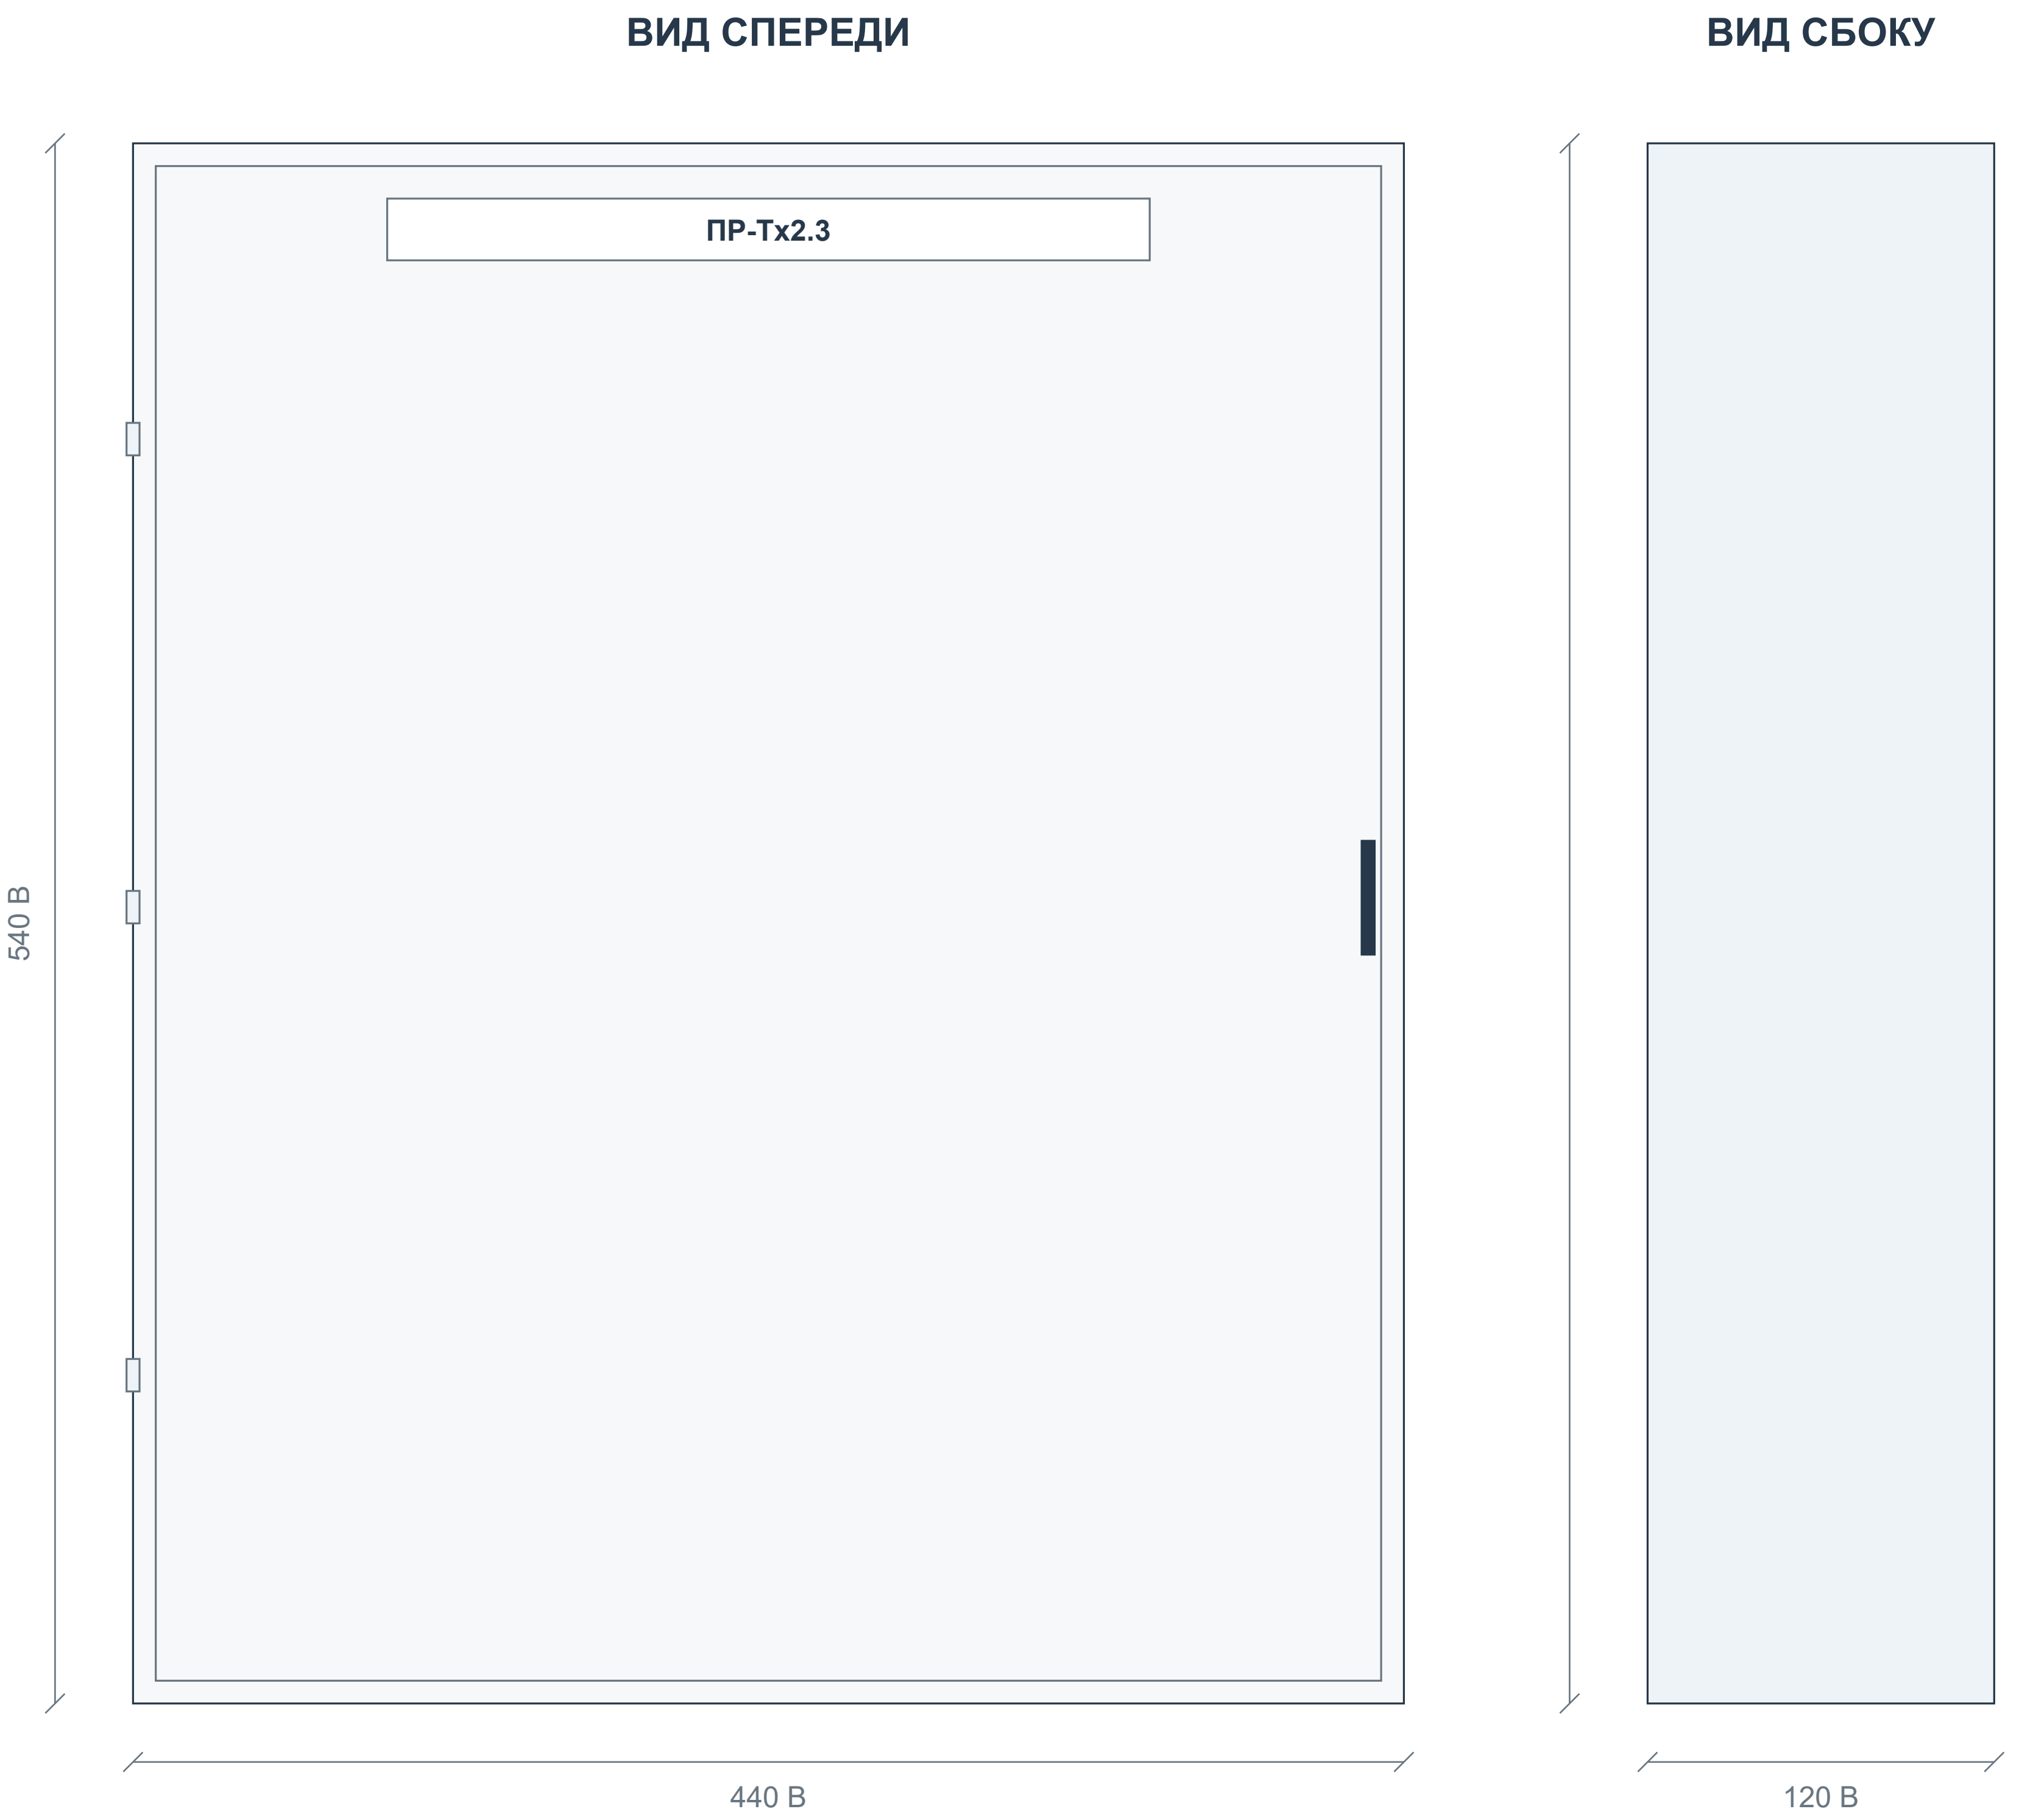

Корпус: Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

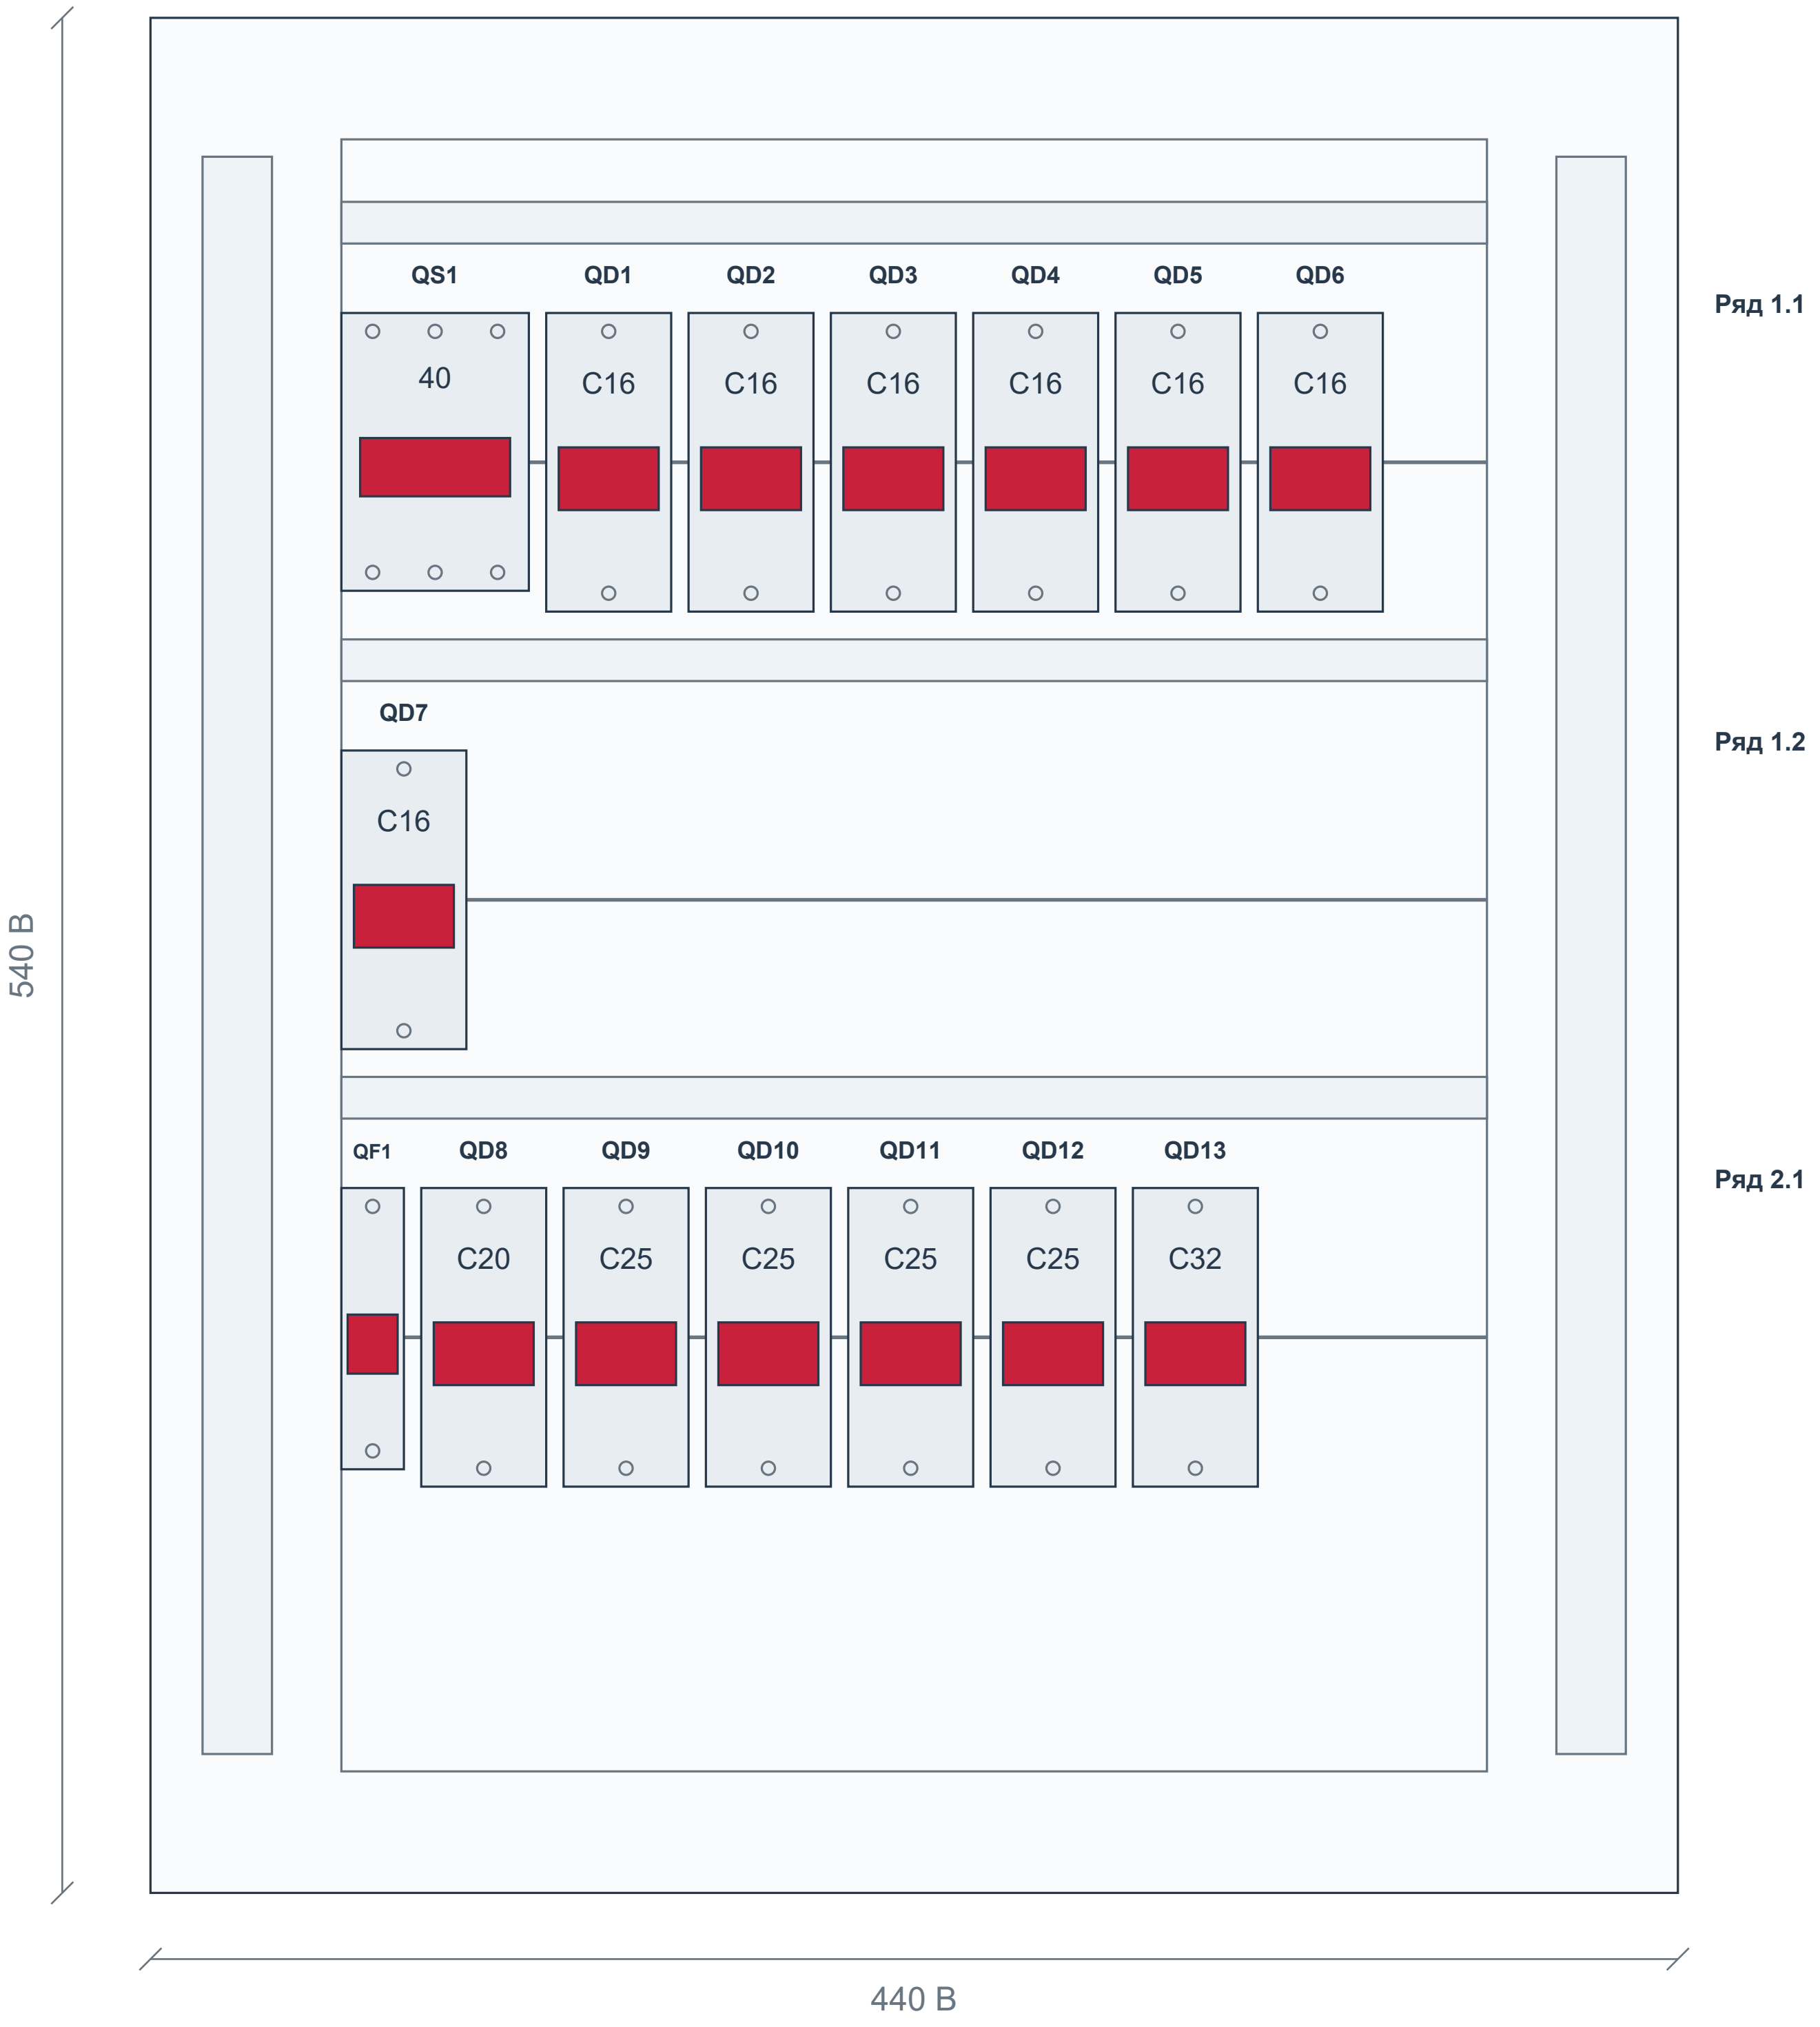
QS1
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
40
C16
C16
C16
C16
C16
C16
Ряд 1.1
QD7
C16
Ряд 1.2
QF1
QD8
QD9
QD10
QD11
QD12
QD13
C20
C25
C25
C25
C25
C32
Ряд 2.1
540 B
440 B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	483	1.1	55	85	54 × 80
QF1	NXB-63S	484	2.1	55	337	18 × 81
QD1 - QD7	NXBLE-63YH	485	1.1/1.2	114...319 / 55	85/211	36 × 86
QD8	NXBLE-63YH	486	2.1	78	337	36 × 86
QD9 - QD12	NXBLE-63YH	487	2.1	119...242	337	36 × 86
QD13	NXBLE-63YH	488	2.1	283	337	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Ряды с недостаточной шириной разделены на подряды. Новые расстояния и способ крепления согласовать.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Актуальная спецификация

ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 505 | ЭОМ, PDF стр. 29

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
506	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
507	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
508	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
509	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
510	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
511	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 29

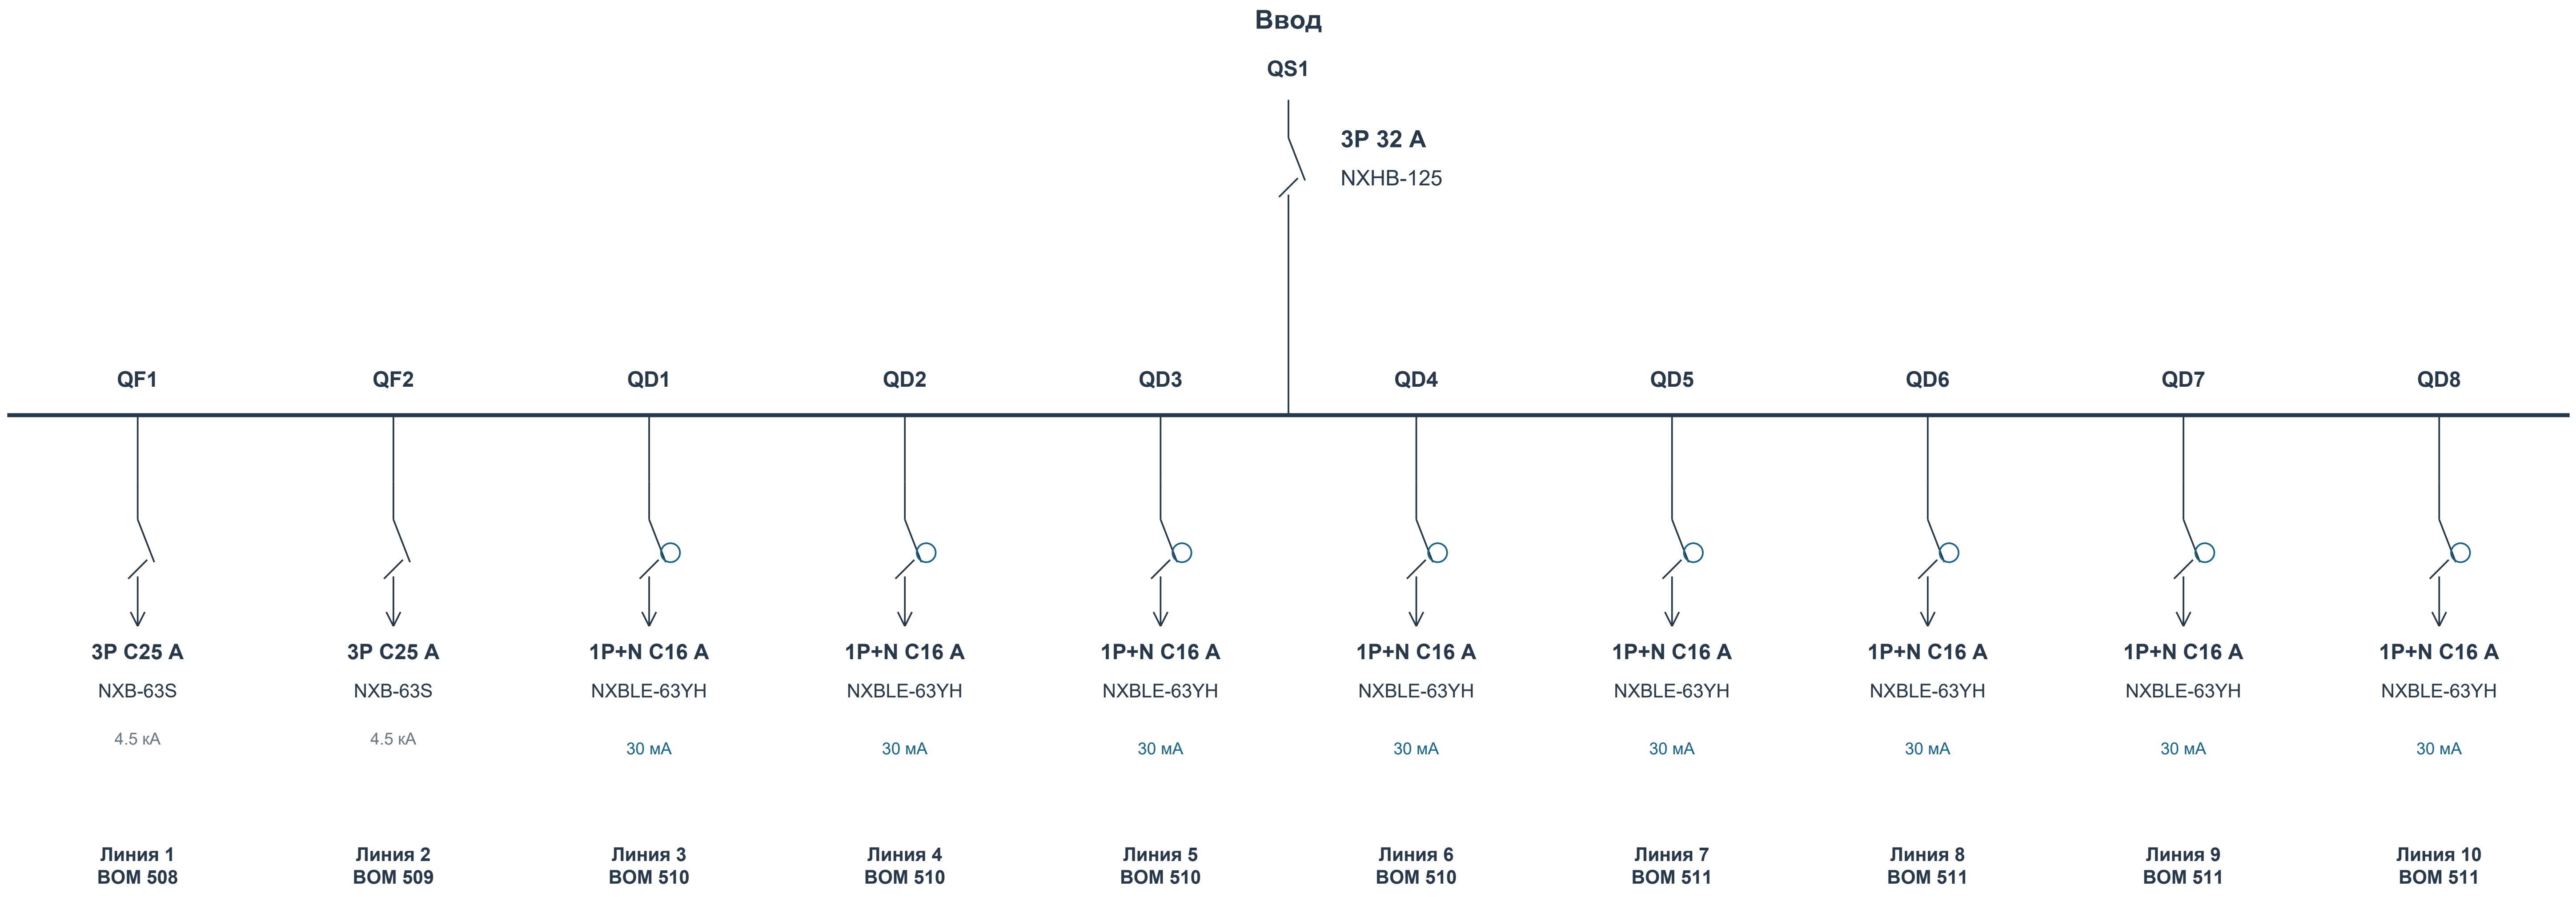
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QF2
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 508
Линия 2
BOM 509
Линия 3
BOM 510
Линия 4
BOM 510
Линия 5
BOM 510
Линия 6
BOM 510
Линия 7
BOM 511
Линия 8
BOM 511
Линия 9
BOM 511
Линия 10
BOM 511

Данные исходного проекта: Py 14.3 кВт | Pp 9,6 кВт | Ip 15,4 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

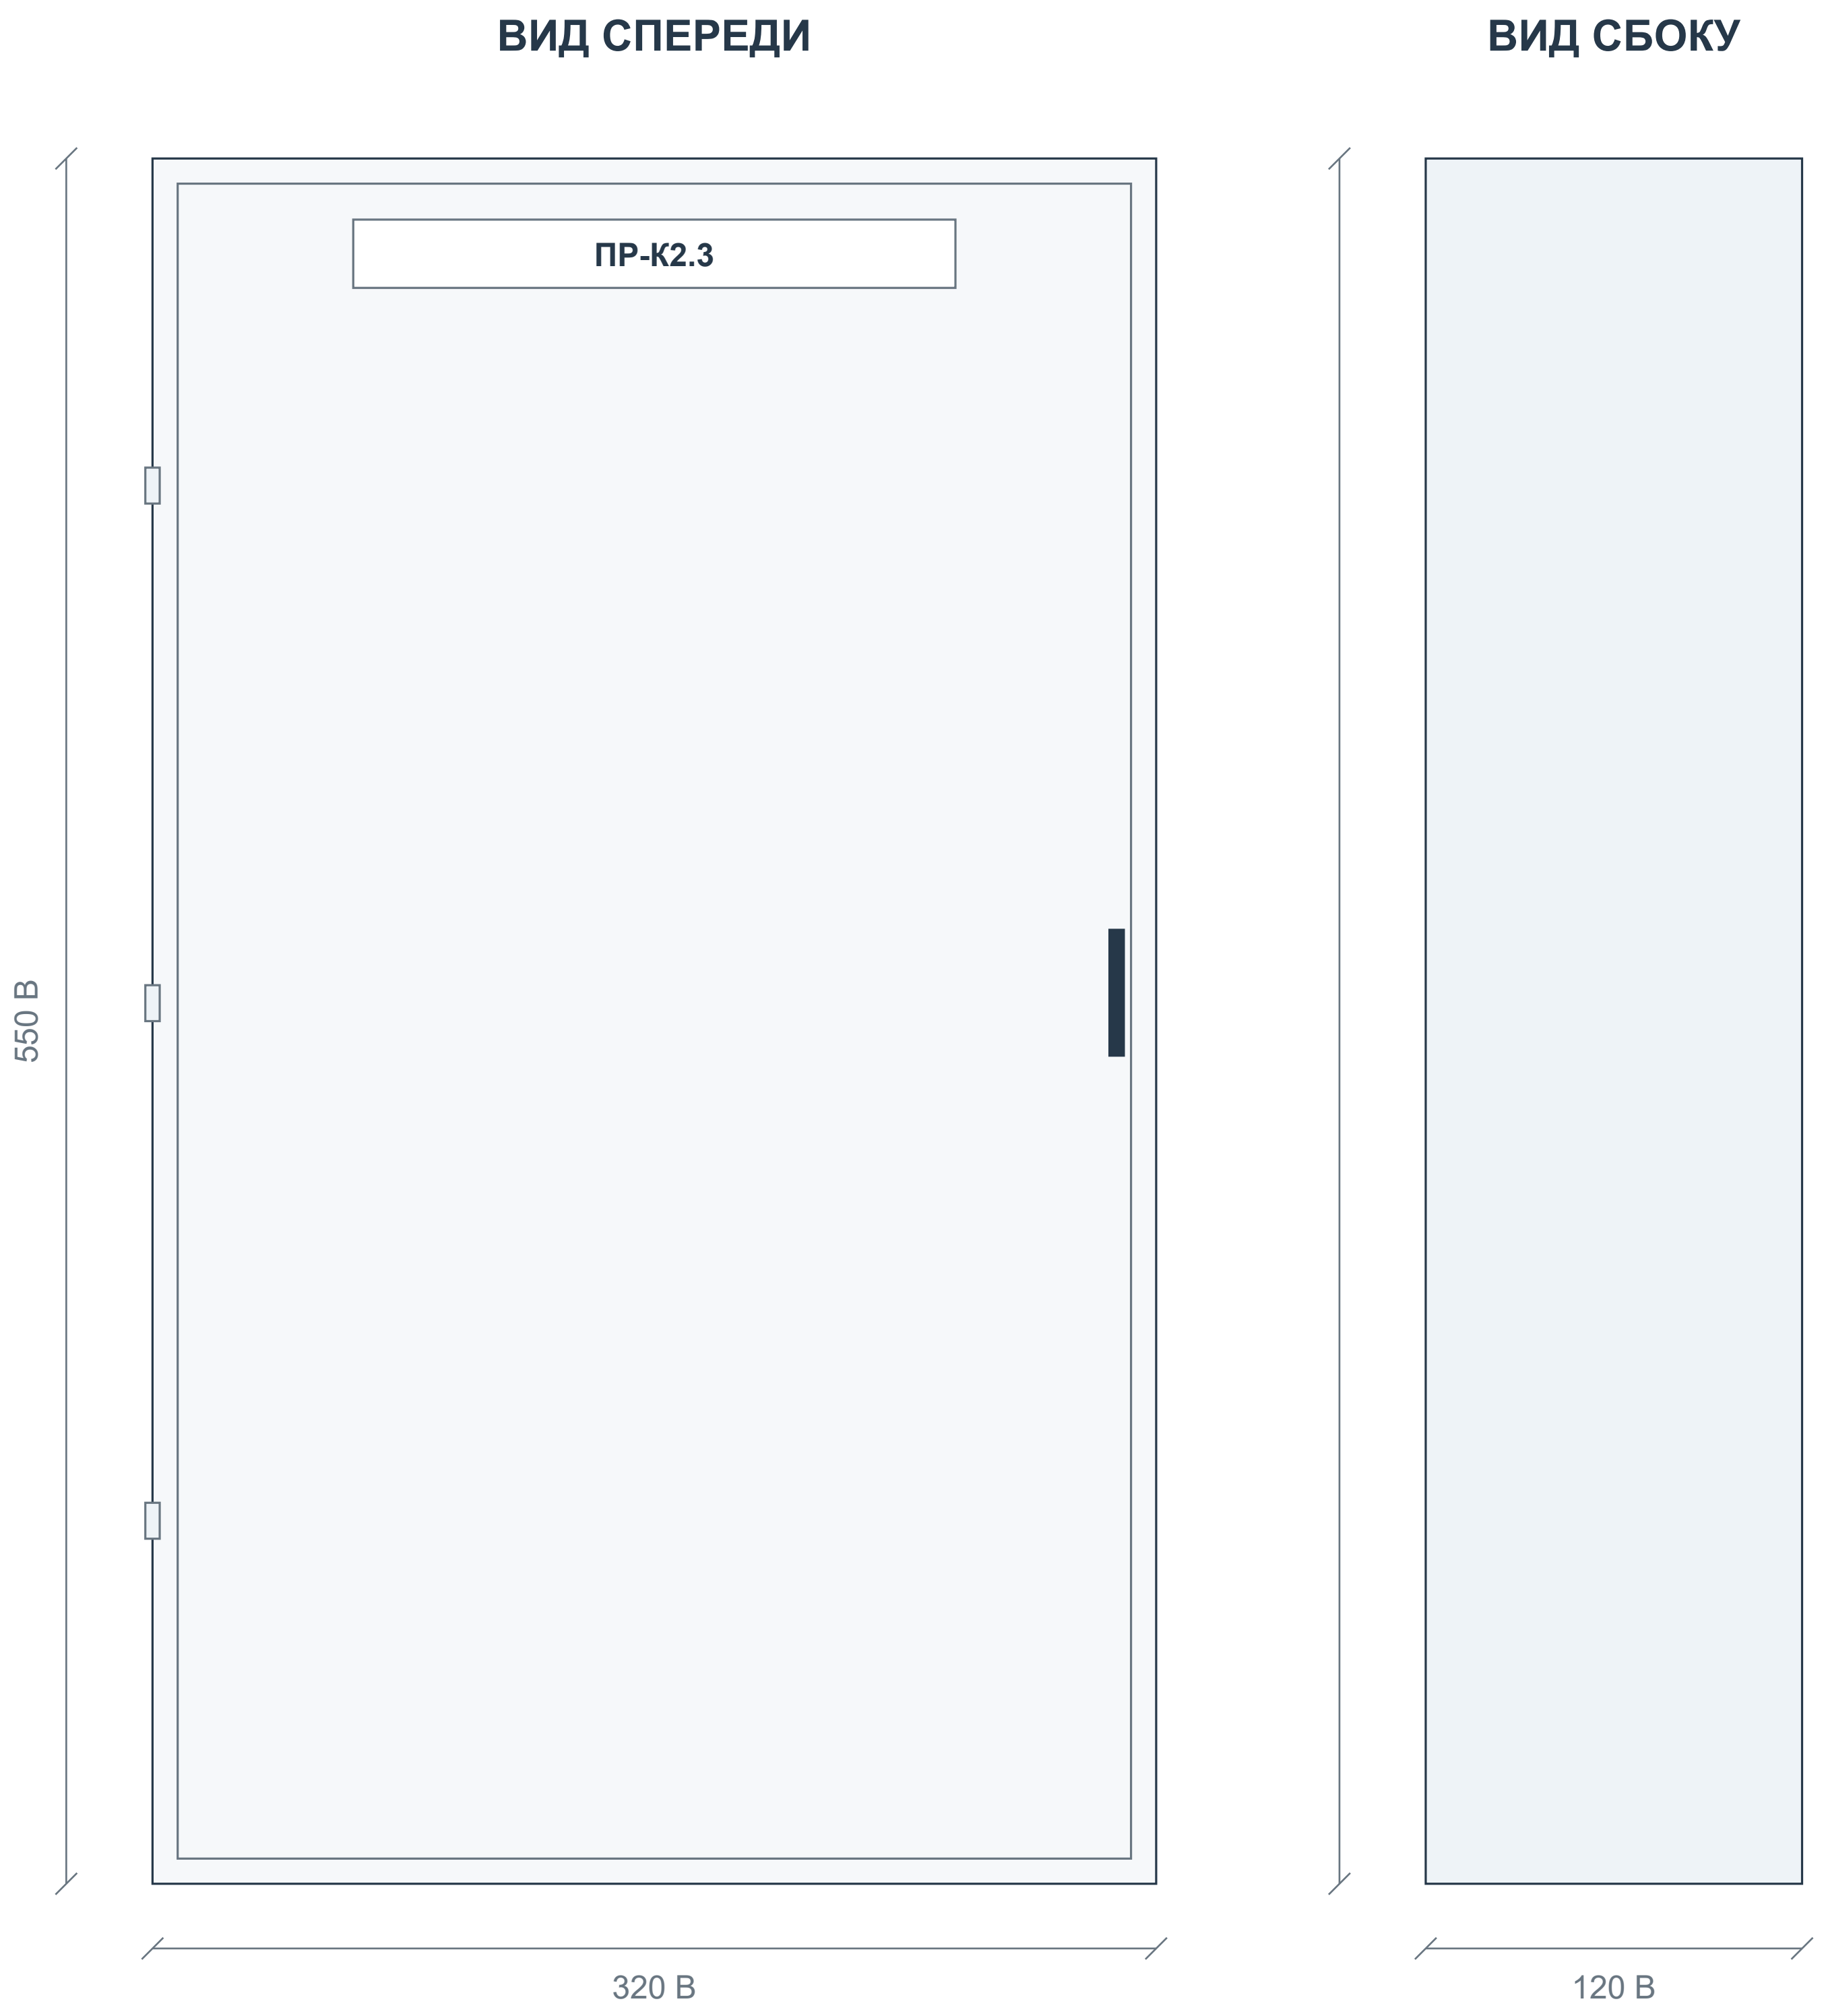

Корпус: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

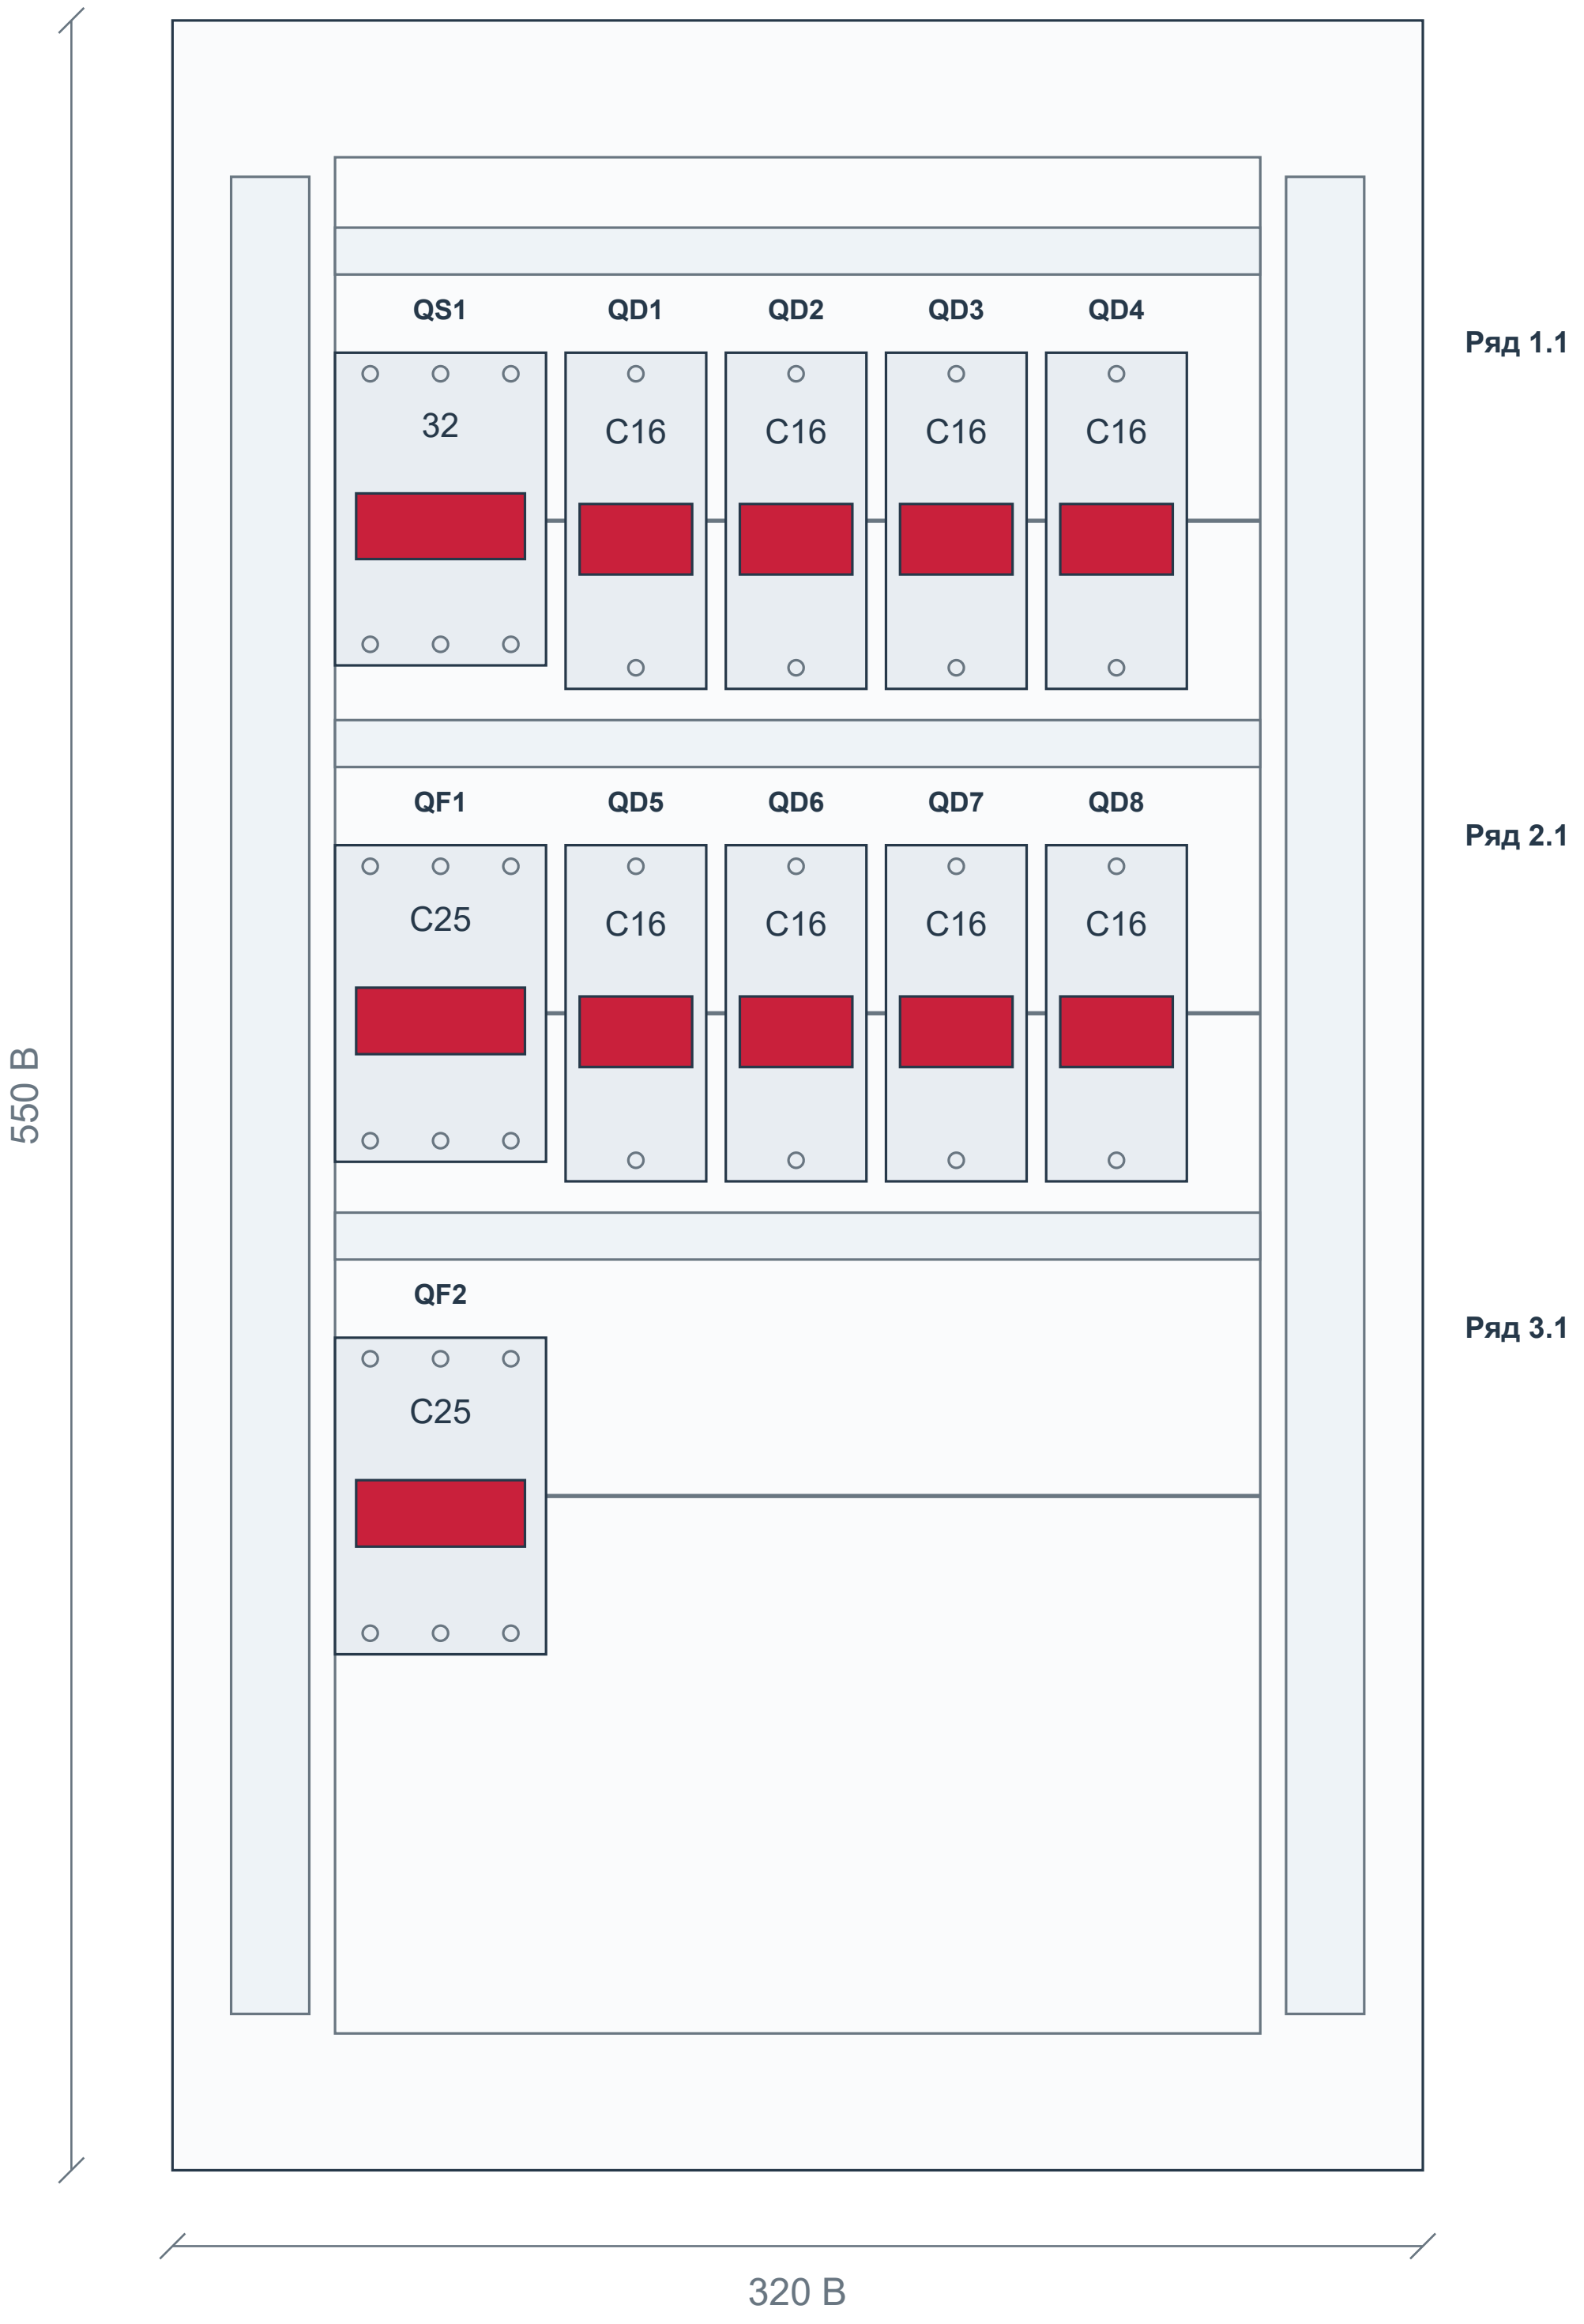

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	507	1.1	41.6	85	54 × 80
QF1	NXB-63S	508	2.1	41.6	211	54 × 81
QF2	NXB-63S	509	3.1	41.6	337	54 × 81
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	510	1.1	100.6...223.6	85	36 × 86
QD5 - QD8	NXBLE-63YH	511	2.1	100.6...223.6	211	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Актуальная спецификация

ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 528 | ЭОМ, PDF стр. 30

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
529	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
530	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
531	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
532	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
533	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип А, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
534	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип А, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 30

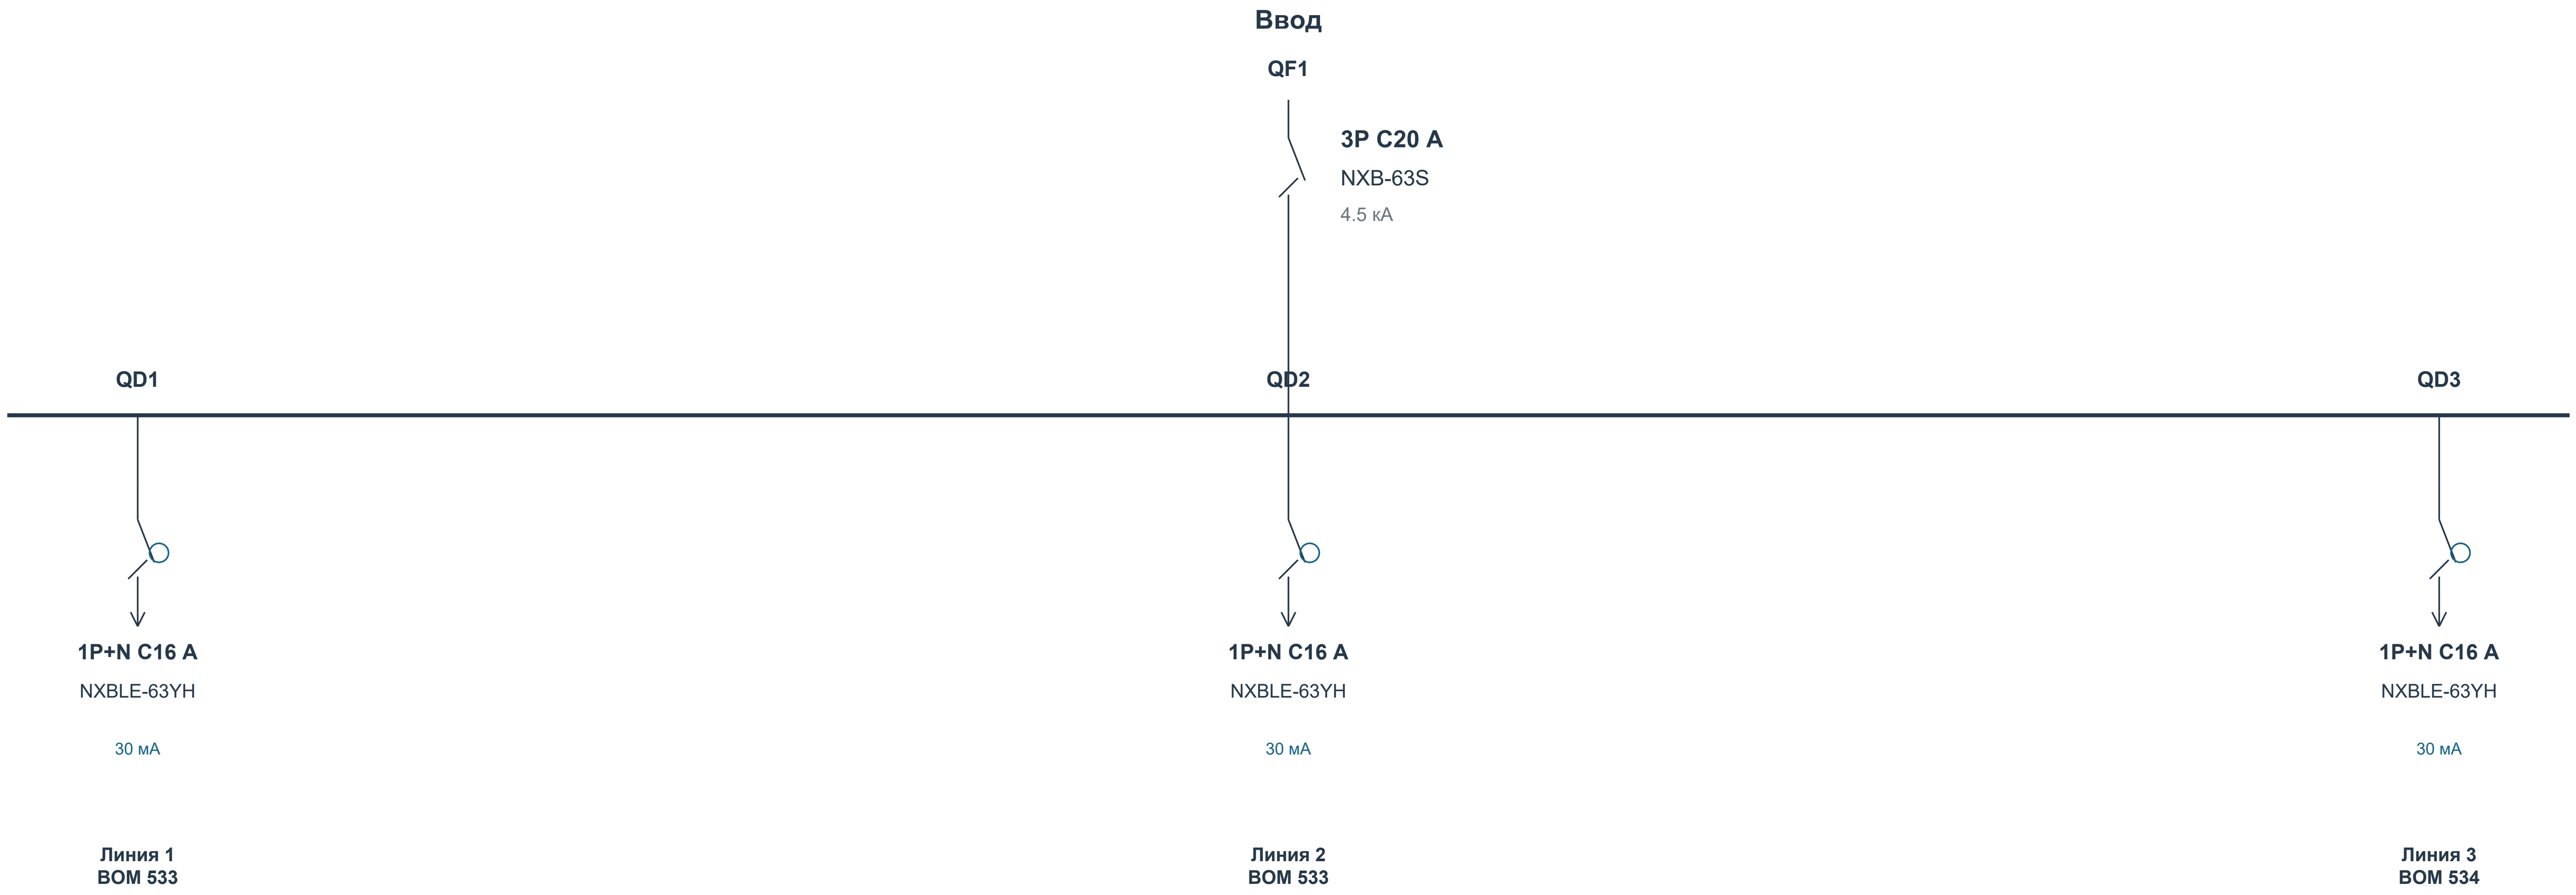
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 533
Линия 2
BOM 533
Линия 3
BOM 534

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 2.2 кВт | Рр 0,3 кВт | Iр 0,5 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

ВИД СПЕРЕДИ

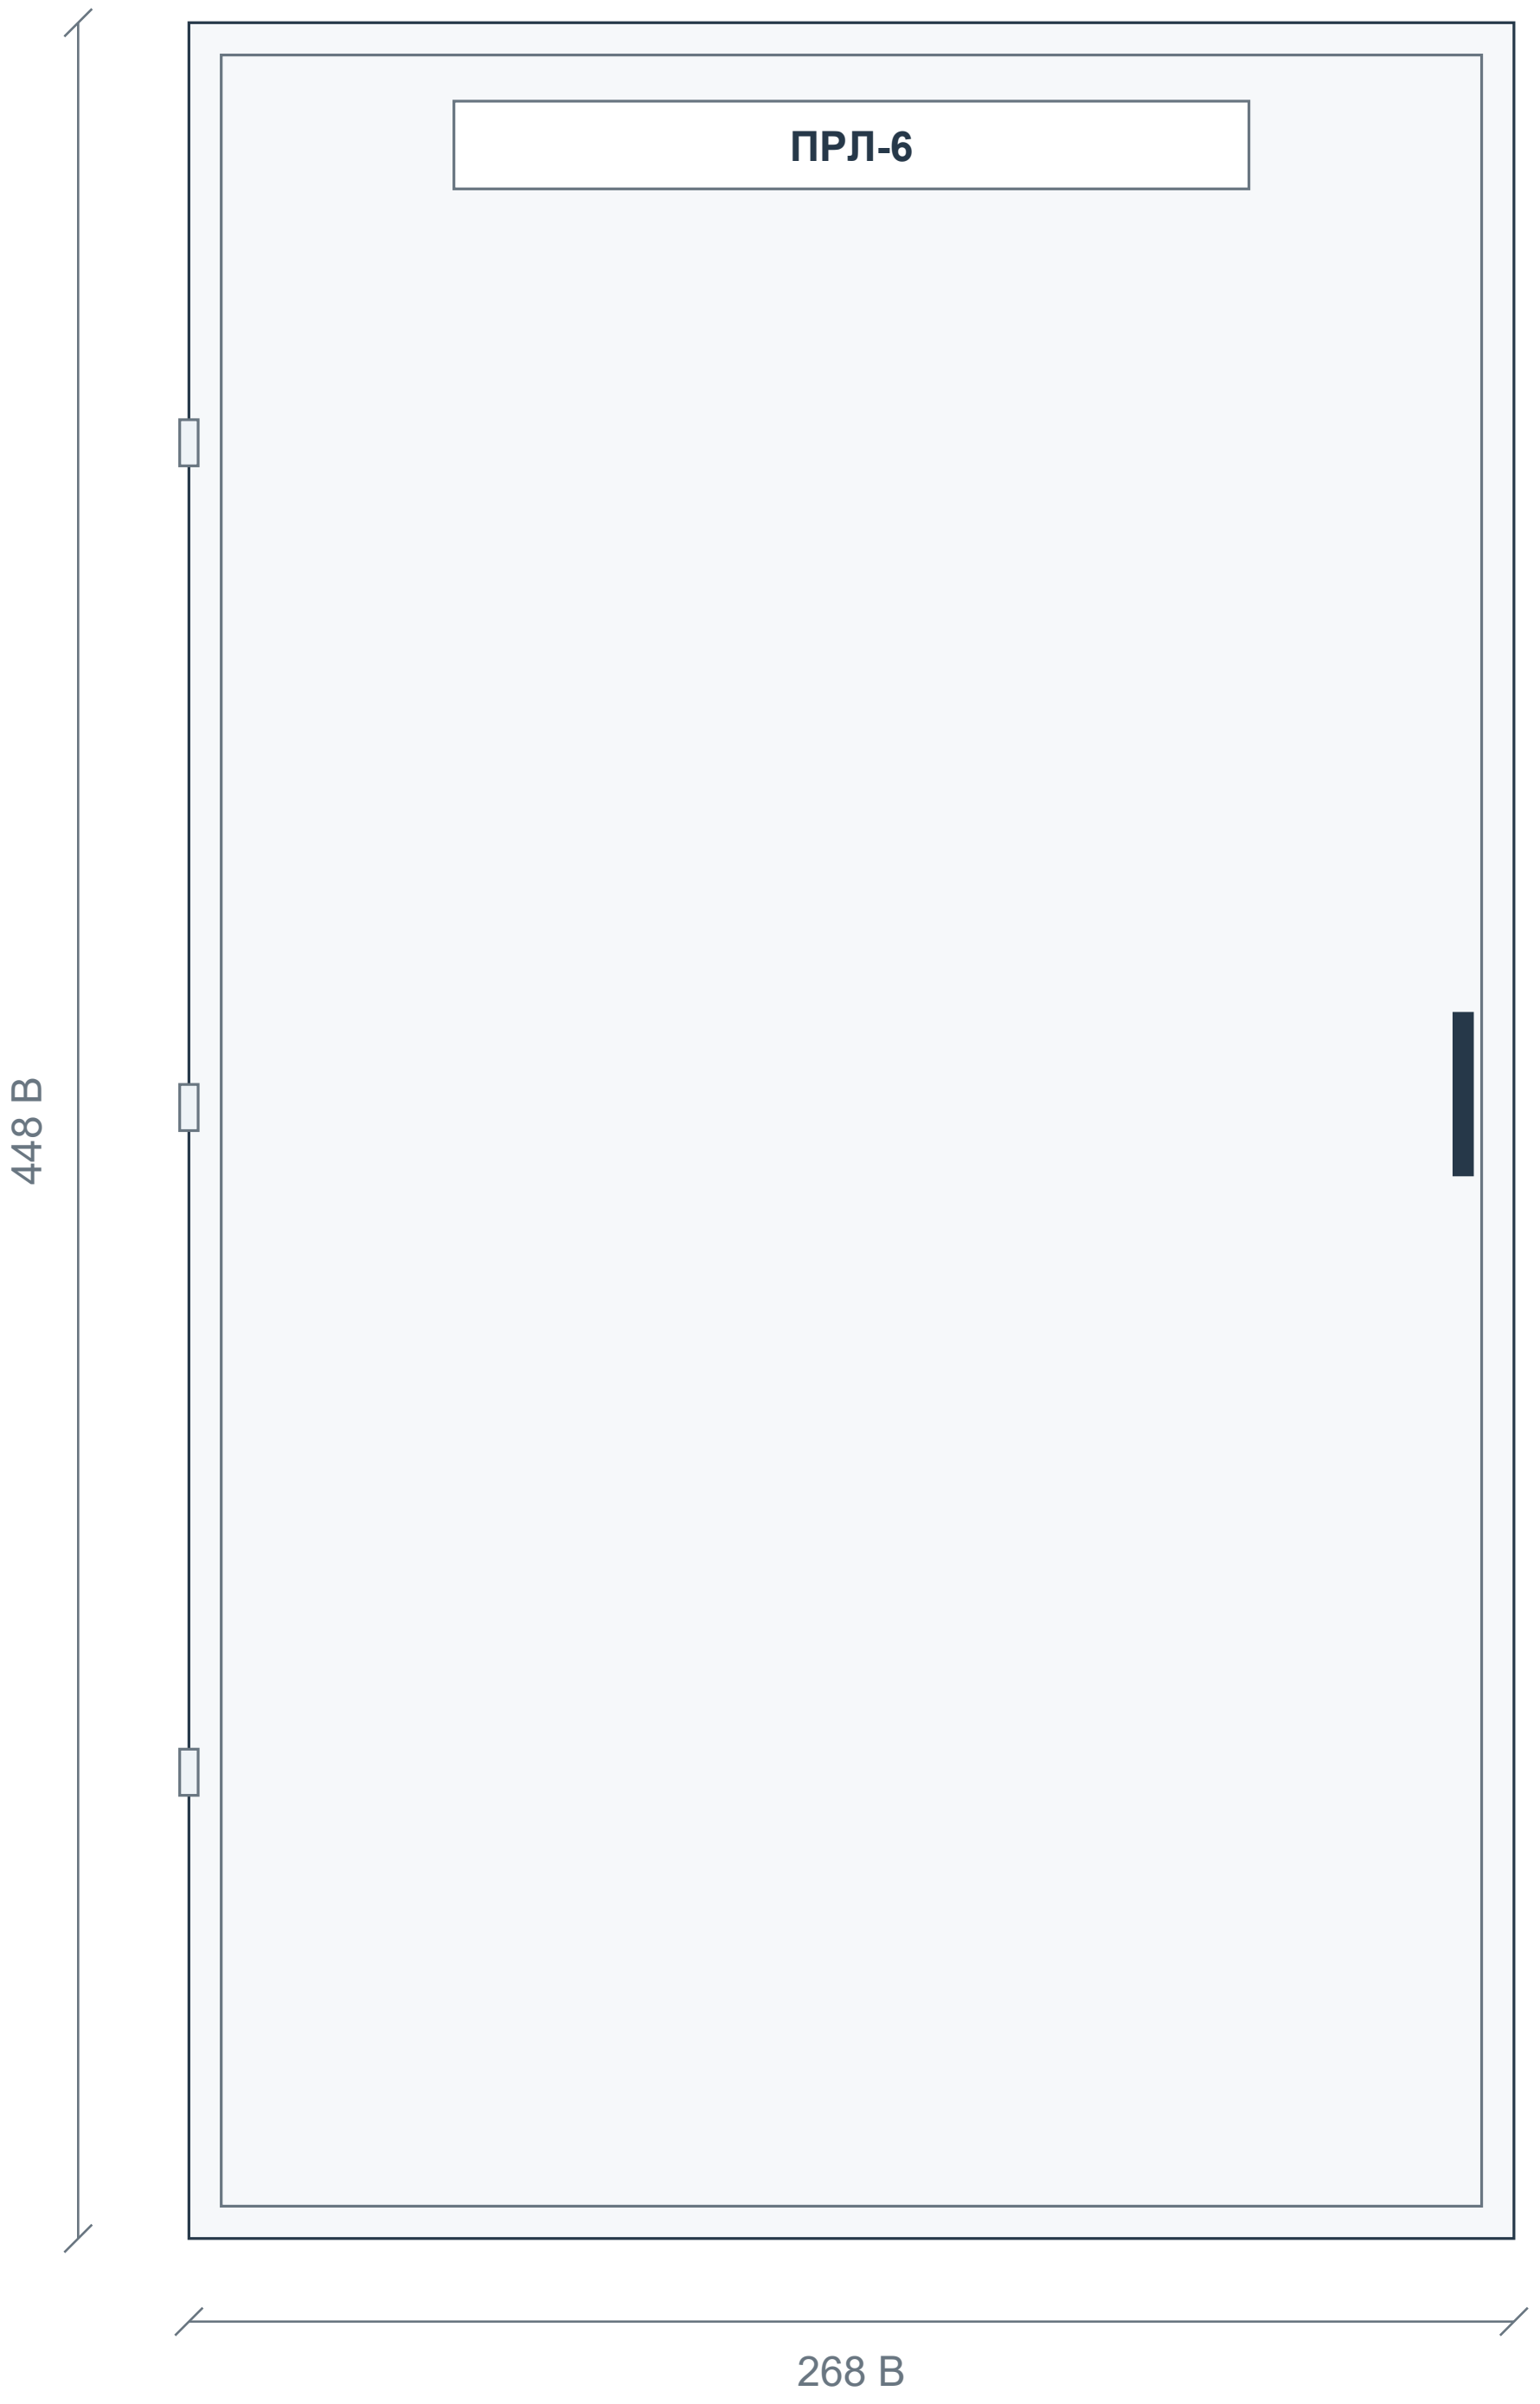

ВИД СБОКУ



Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

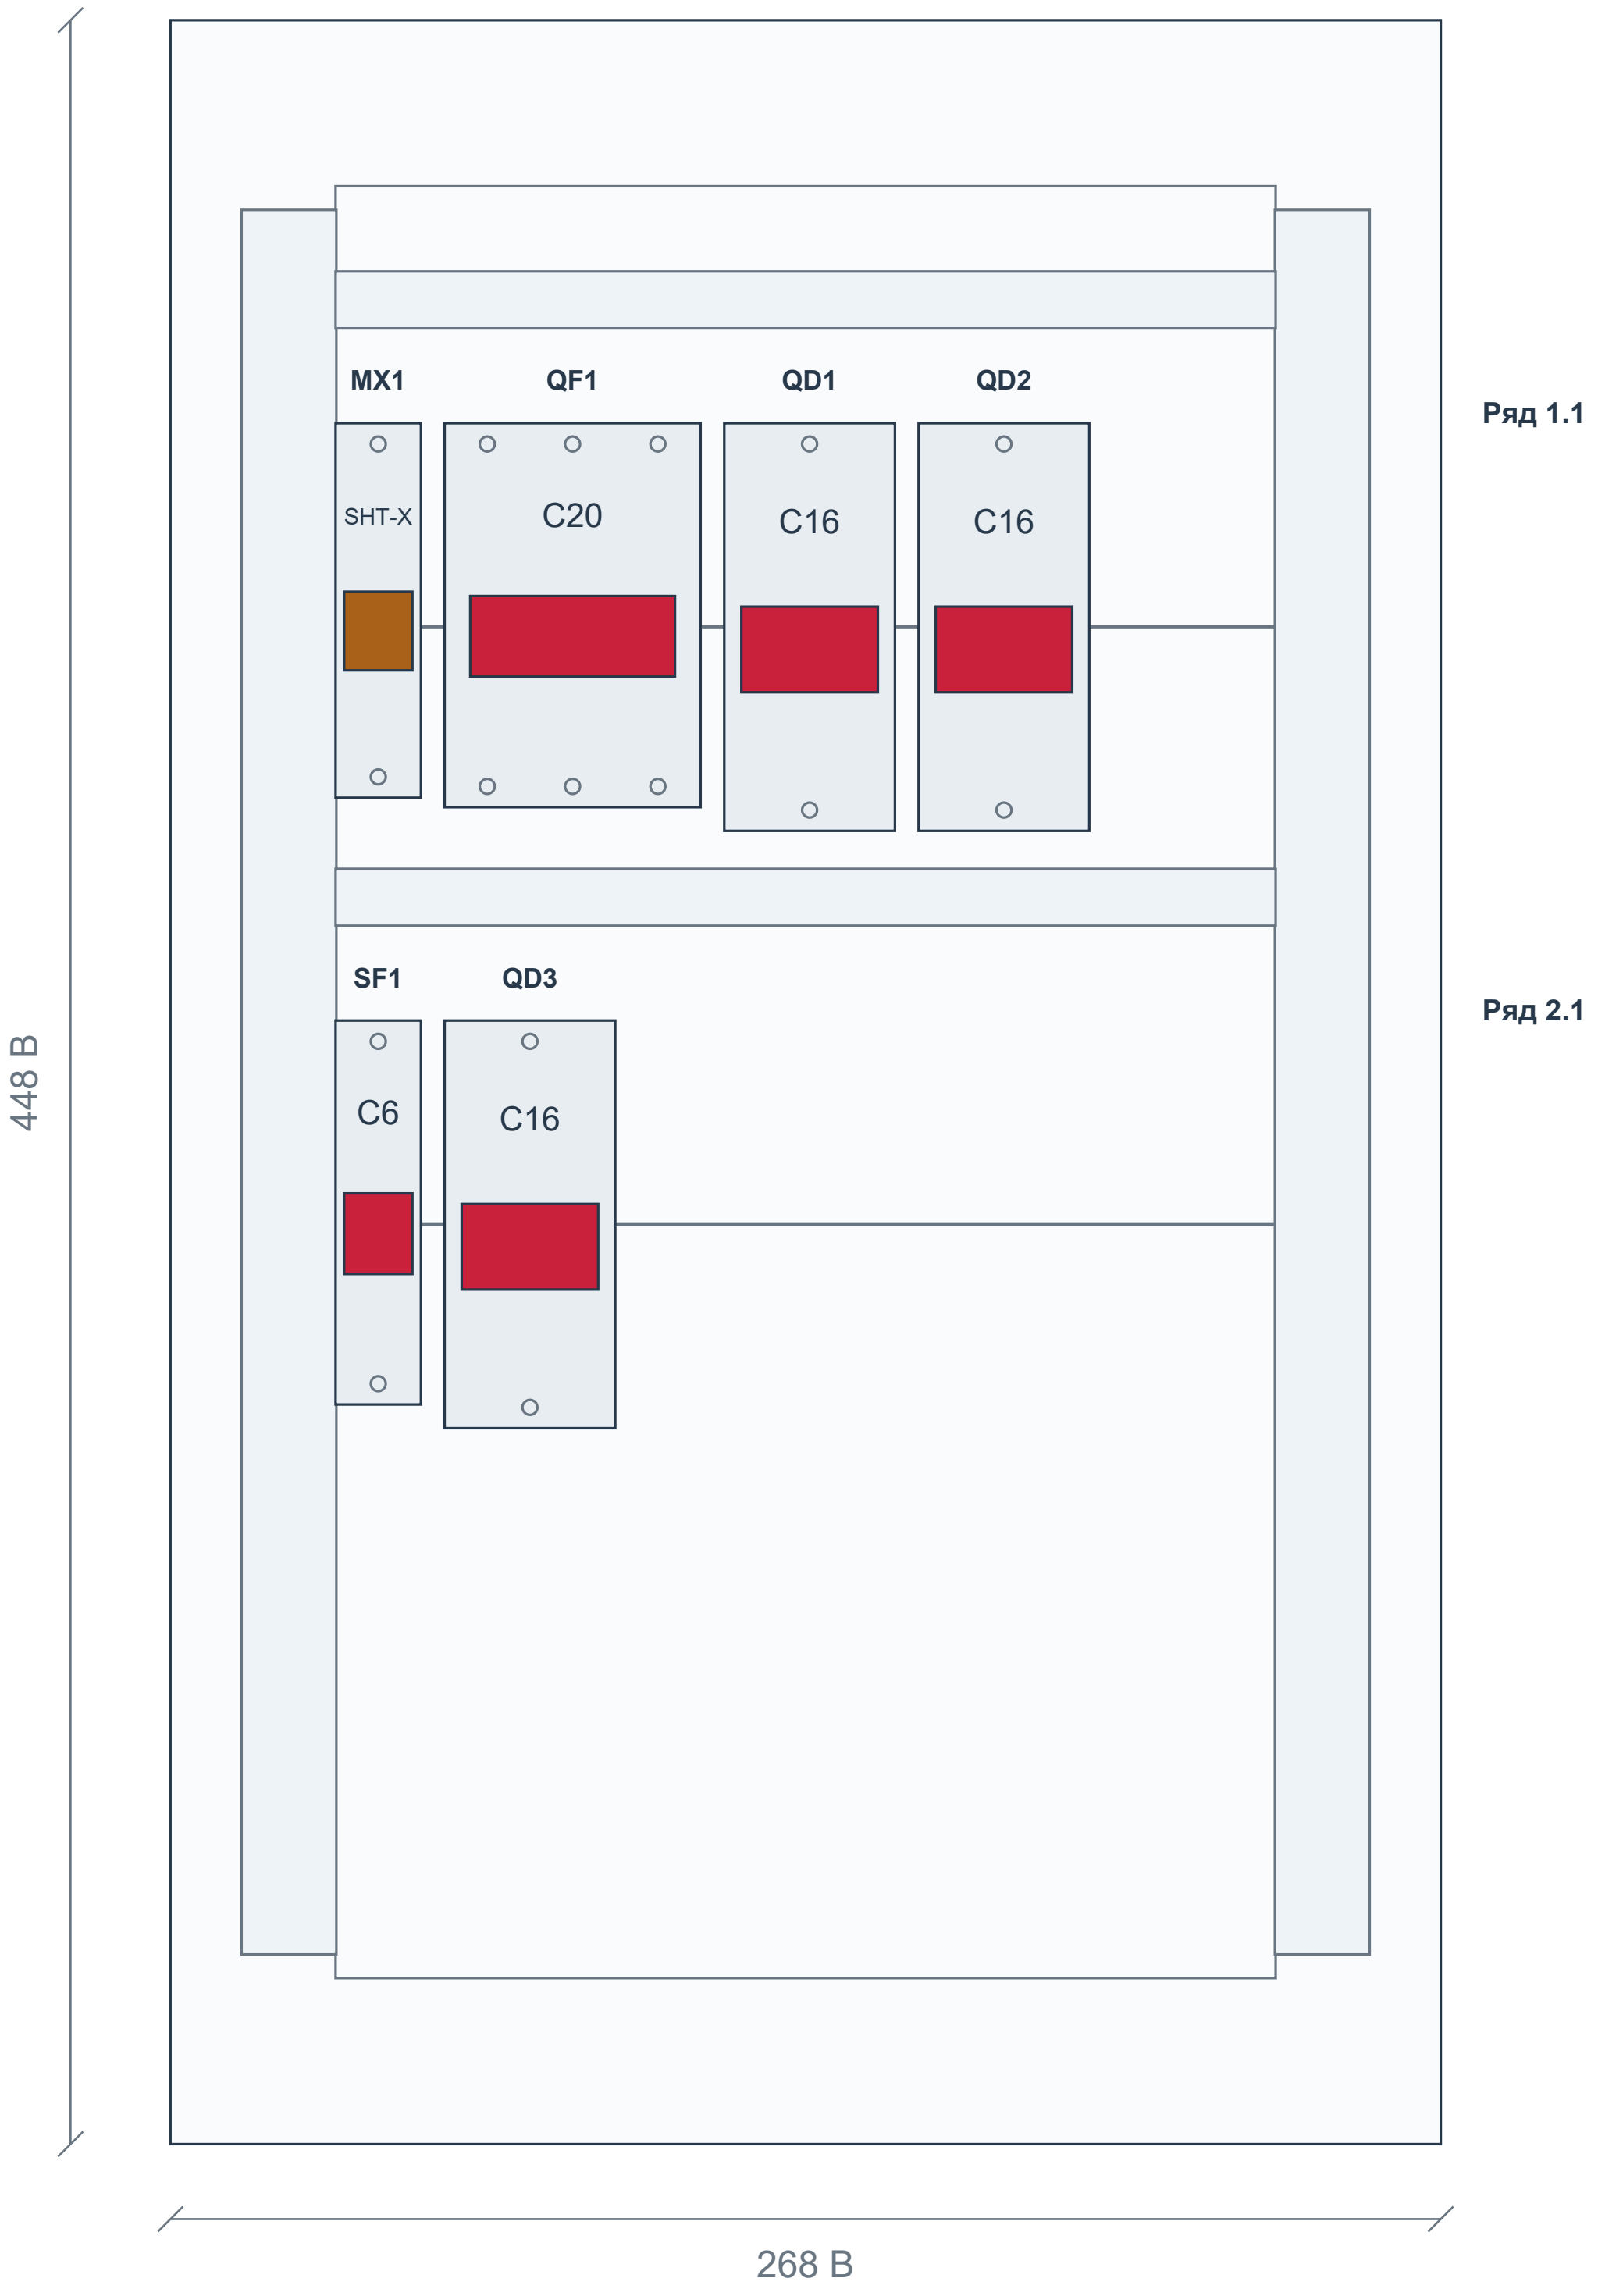

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	530	1.1	34.84	85	18 × 79
QF1	NXB-63S	531	1.1	57.84	85	54 × 81
SF1	NXB-63S	532	2.1	34.84	211	18 × 81
QD1 - QD2	NXBLE-63YH	533	1.1	116.84...157.84	85	36 × 86
QD3	NXBLE-63YH	534	2.1	57.84	211	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Актуальная спецификация

ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 551 | ЭОМ, PDF стр. 31

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
552	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
553	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
554	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
555	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
556	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
557	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 31

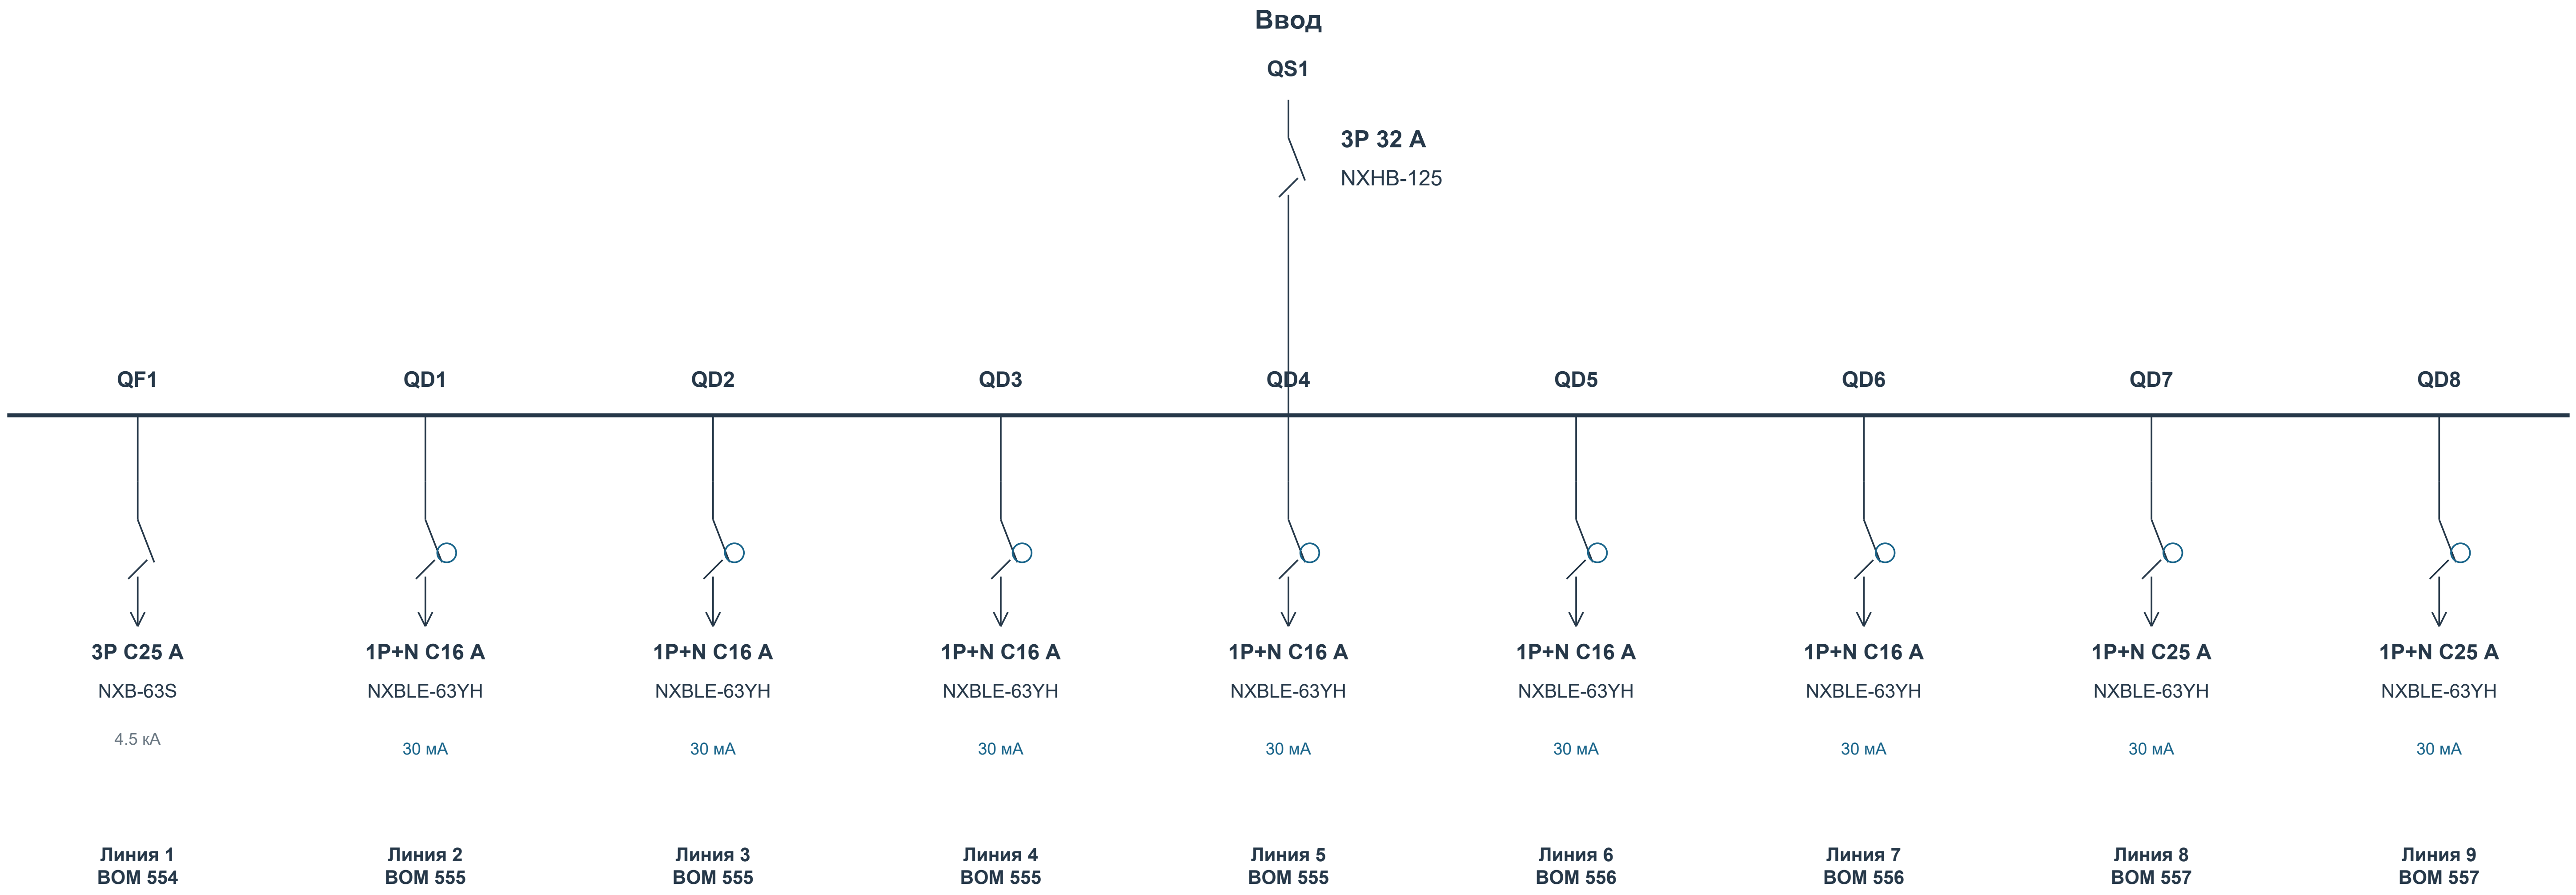
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 554
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 555
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 555
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 555
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 555
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 556
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 556
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 557
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 9
BOM 557

Данные исходного проекта: Ру 20.3 кВт | Рр 4,1 кВт | Iр 6,5 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: ВОМ. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

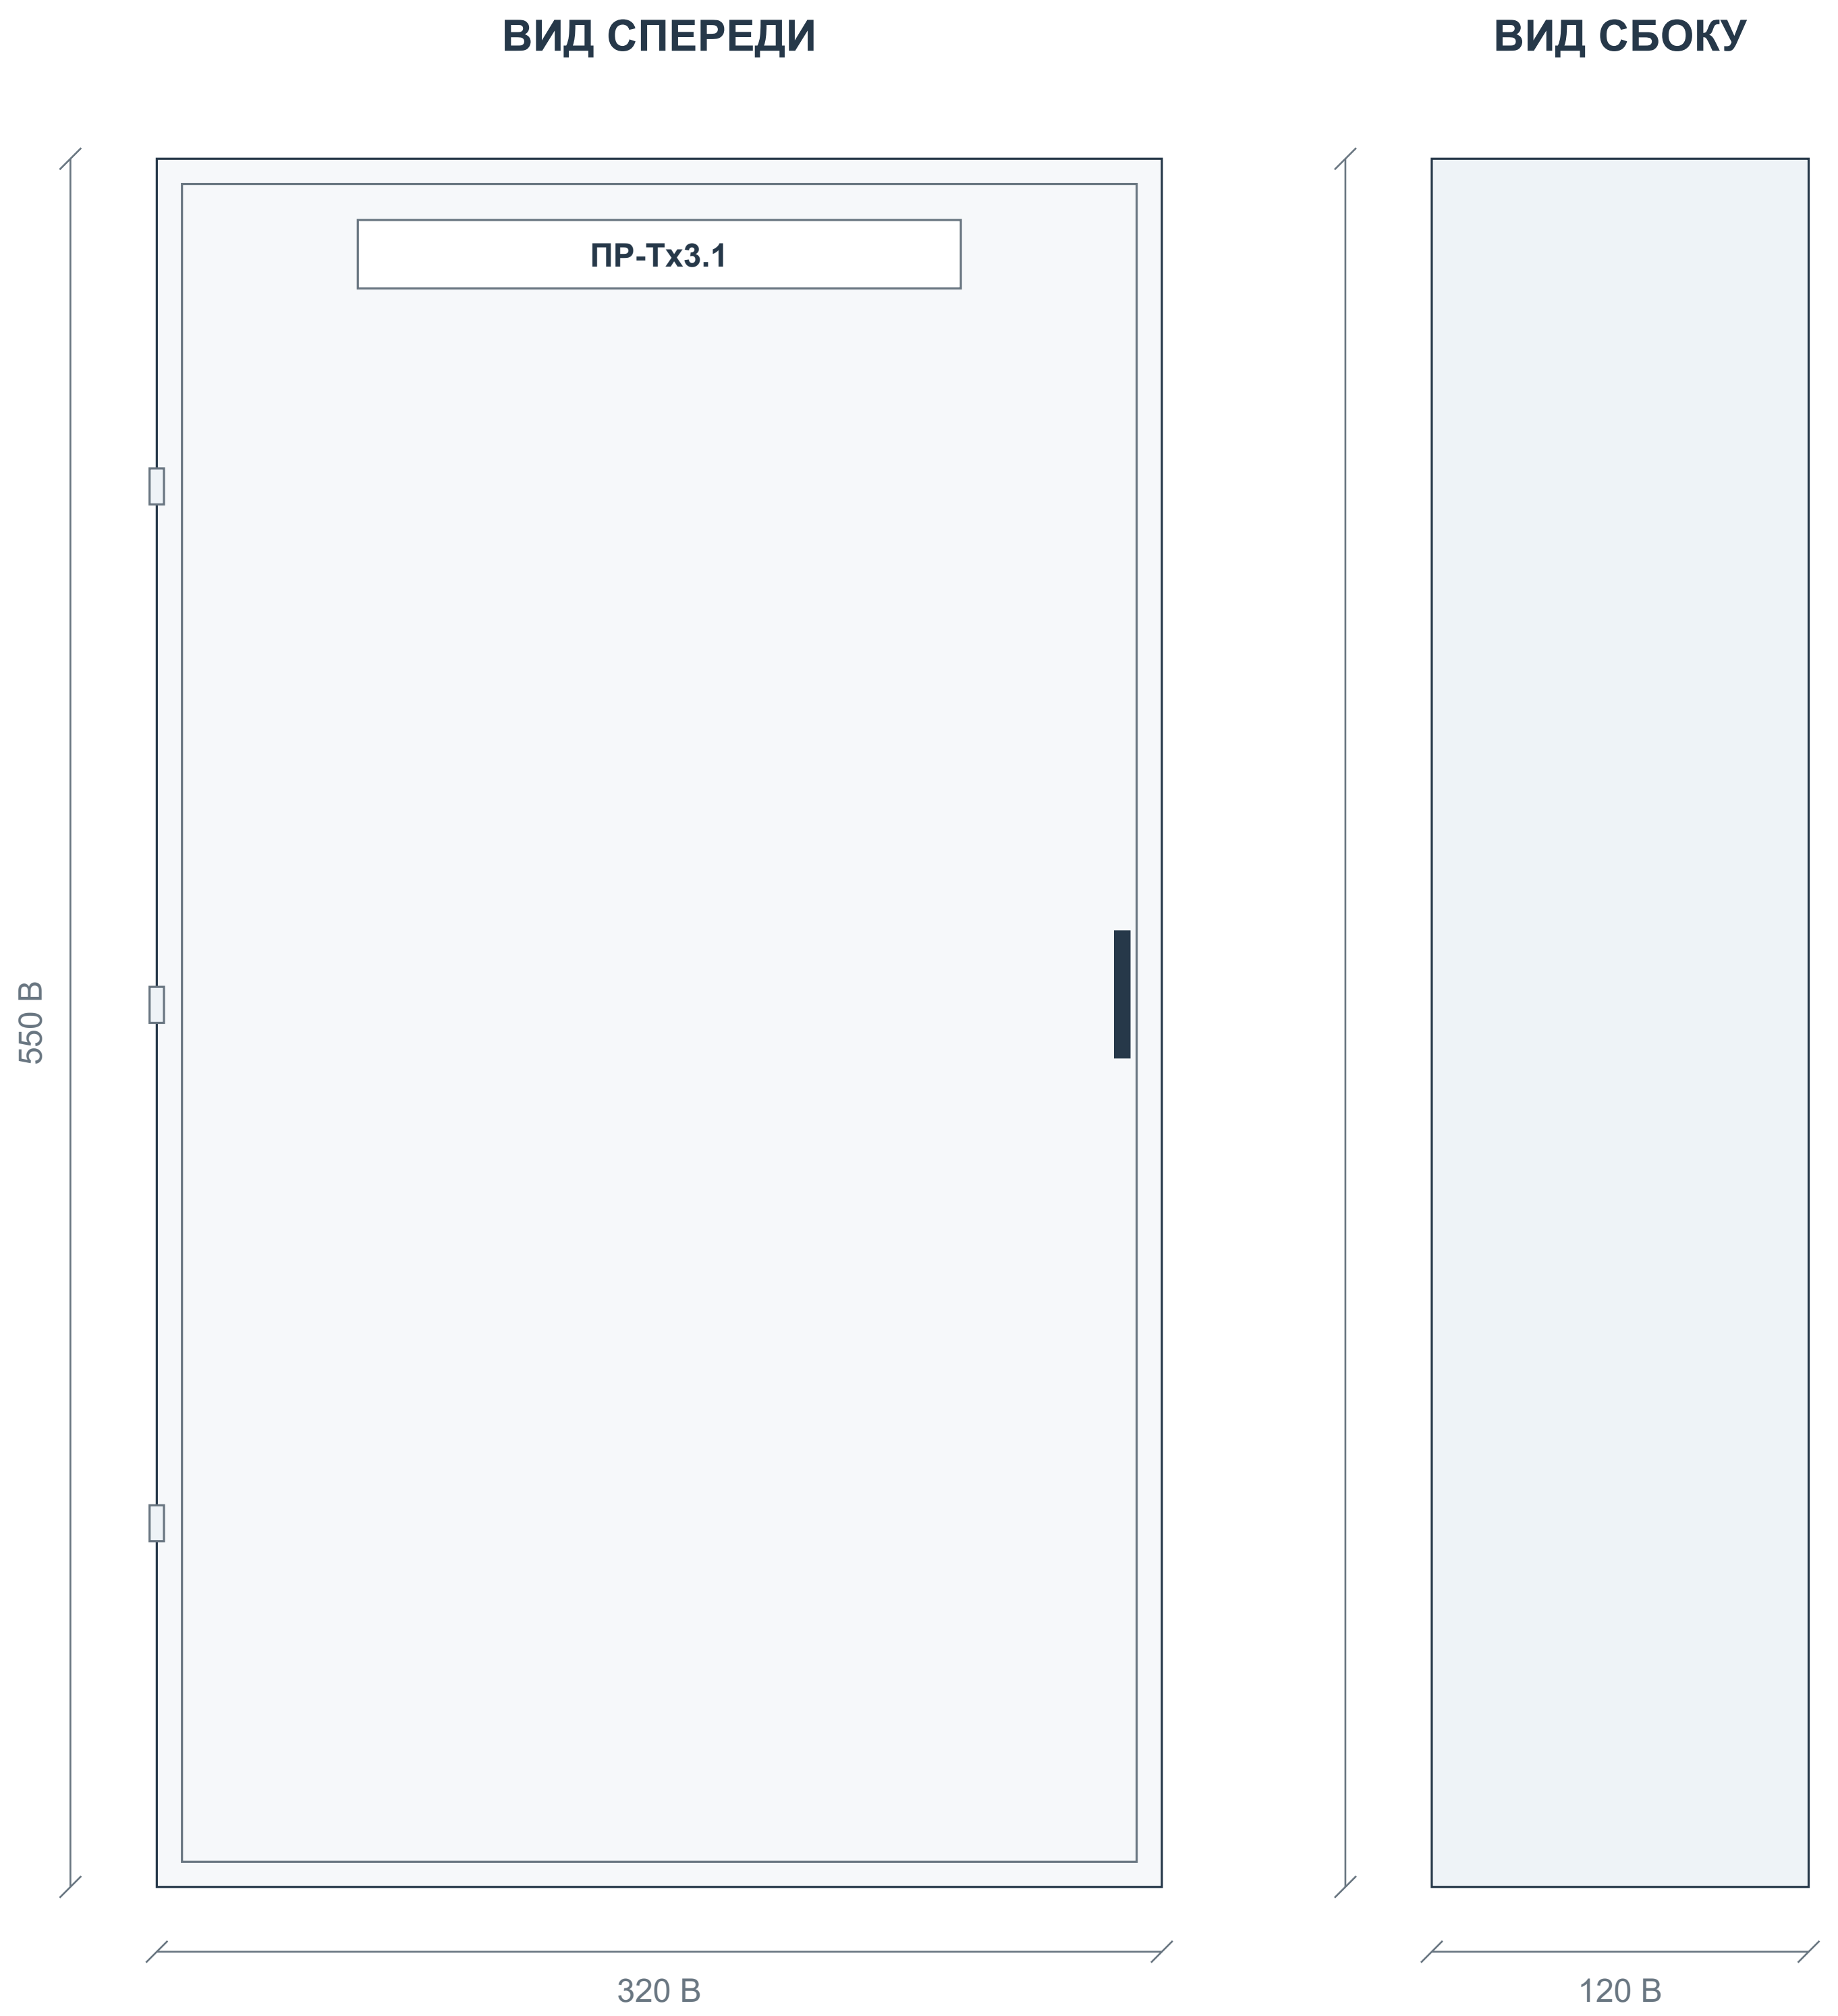

Корпус: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK)

Габаритное описание и количество секций - ВОМ. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по ВОМ. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем ВОМ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

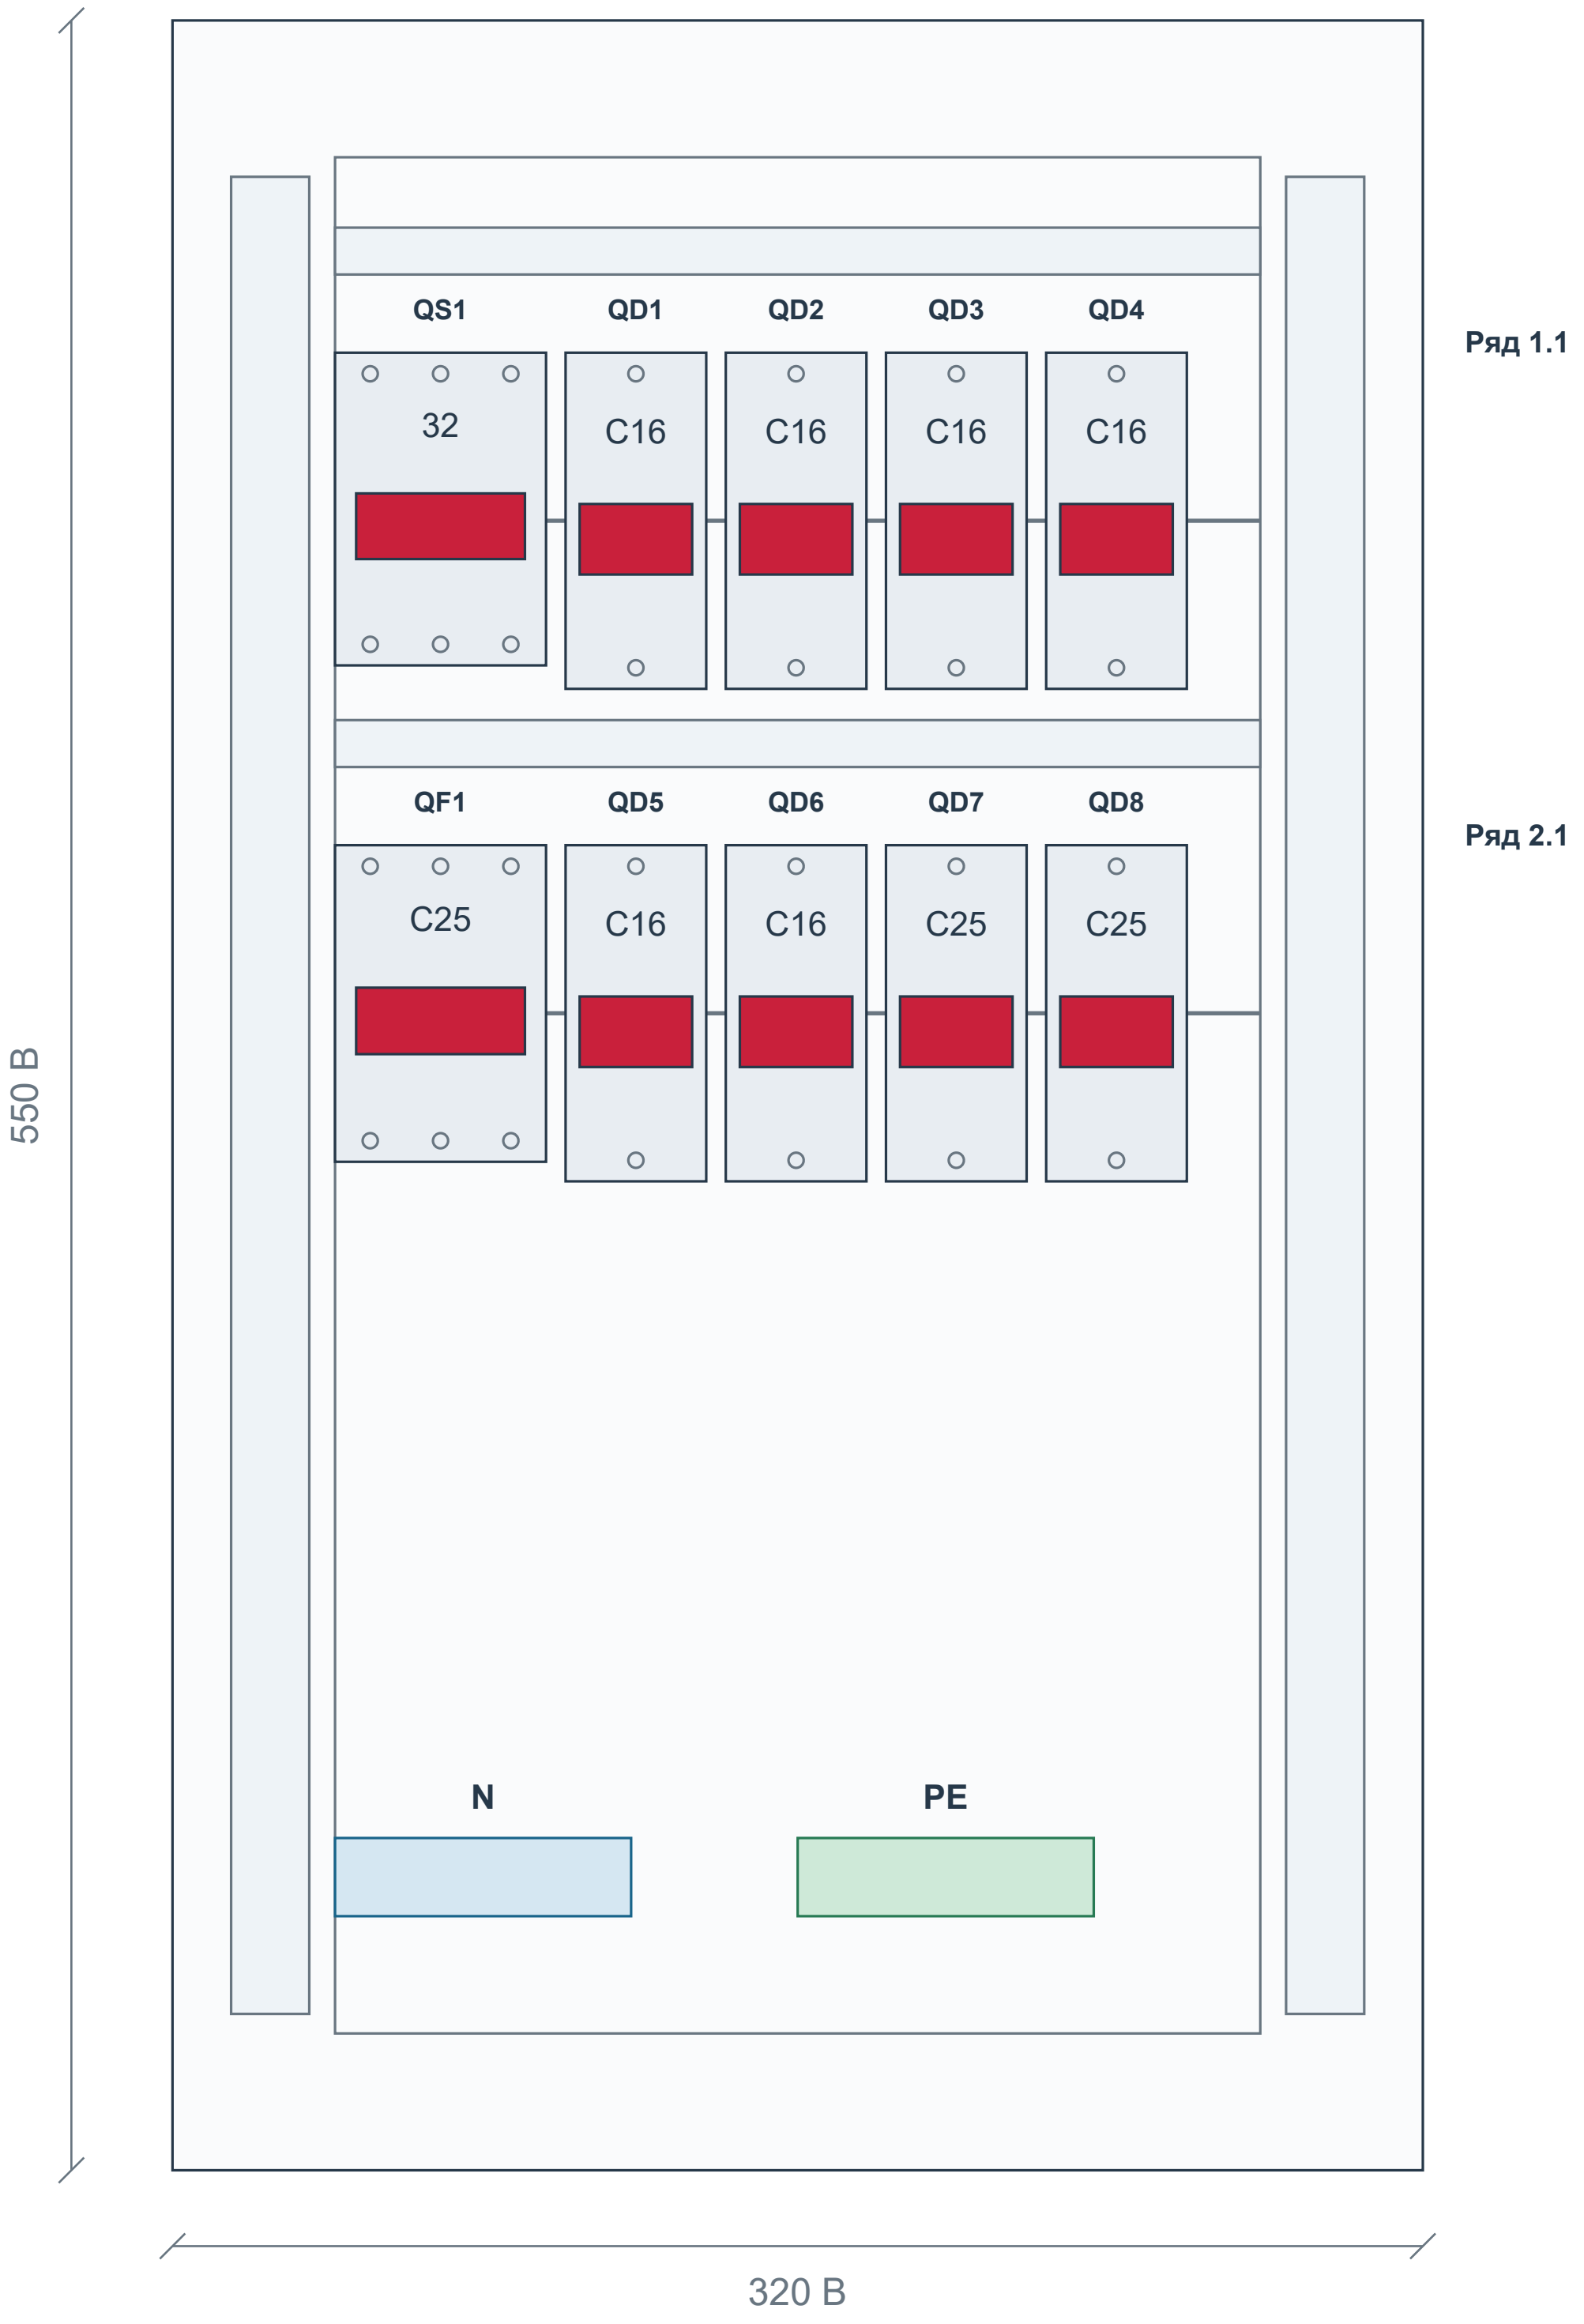

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	553	1.1	41.6	85	54 × 80
QF1	NXB-63S	554	2.1	41.6	211	54 × 81
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	555	1.1	100.6...223.6	85	36 × 86
QD5 - QD6	NXBLE-63YH	556	2.1	100.6...141.6	211	36 × 86
QD7 - QD8	NXBLE-63YH	557	2.1	182.6...223.6	211	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Актуальная спецификация

ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 574 | ЭОМ, PDF стр. 32

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
575	713-09050	5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
576	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
577	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 32

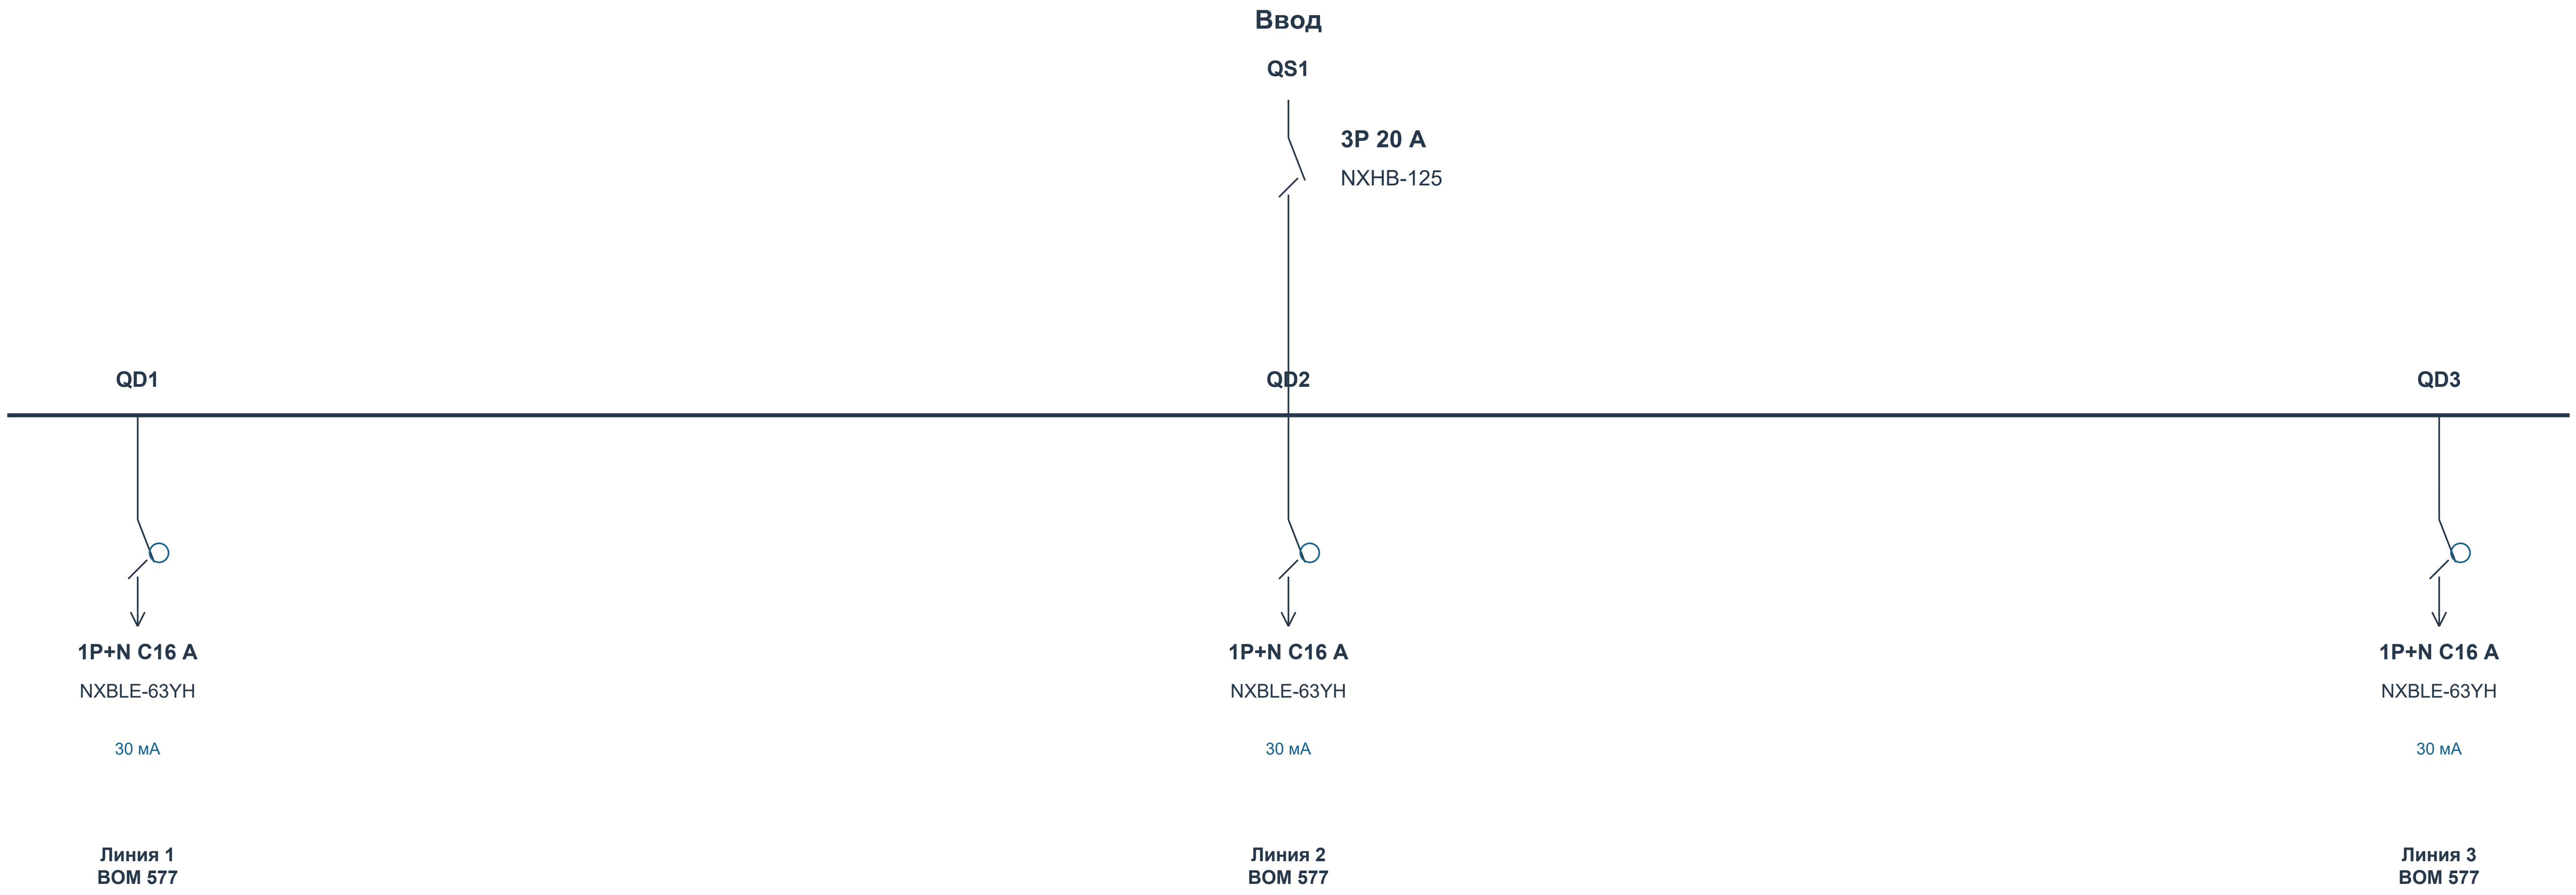
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QD1
QD2
QD3
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 577
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 577
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 577

Данные исходного проекта: Ру 2.9 кВт | Рр 2,6 кВт | Iр 4,2 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

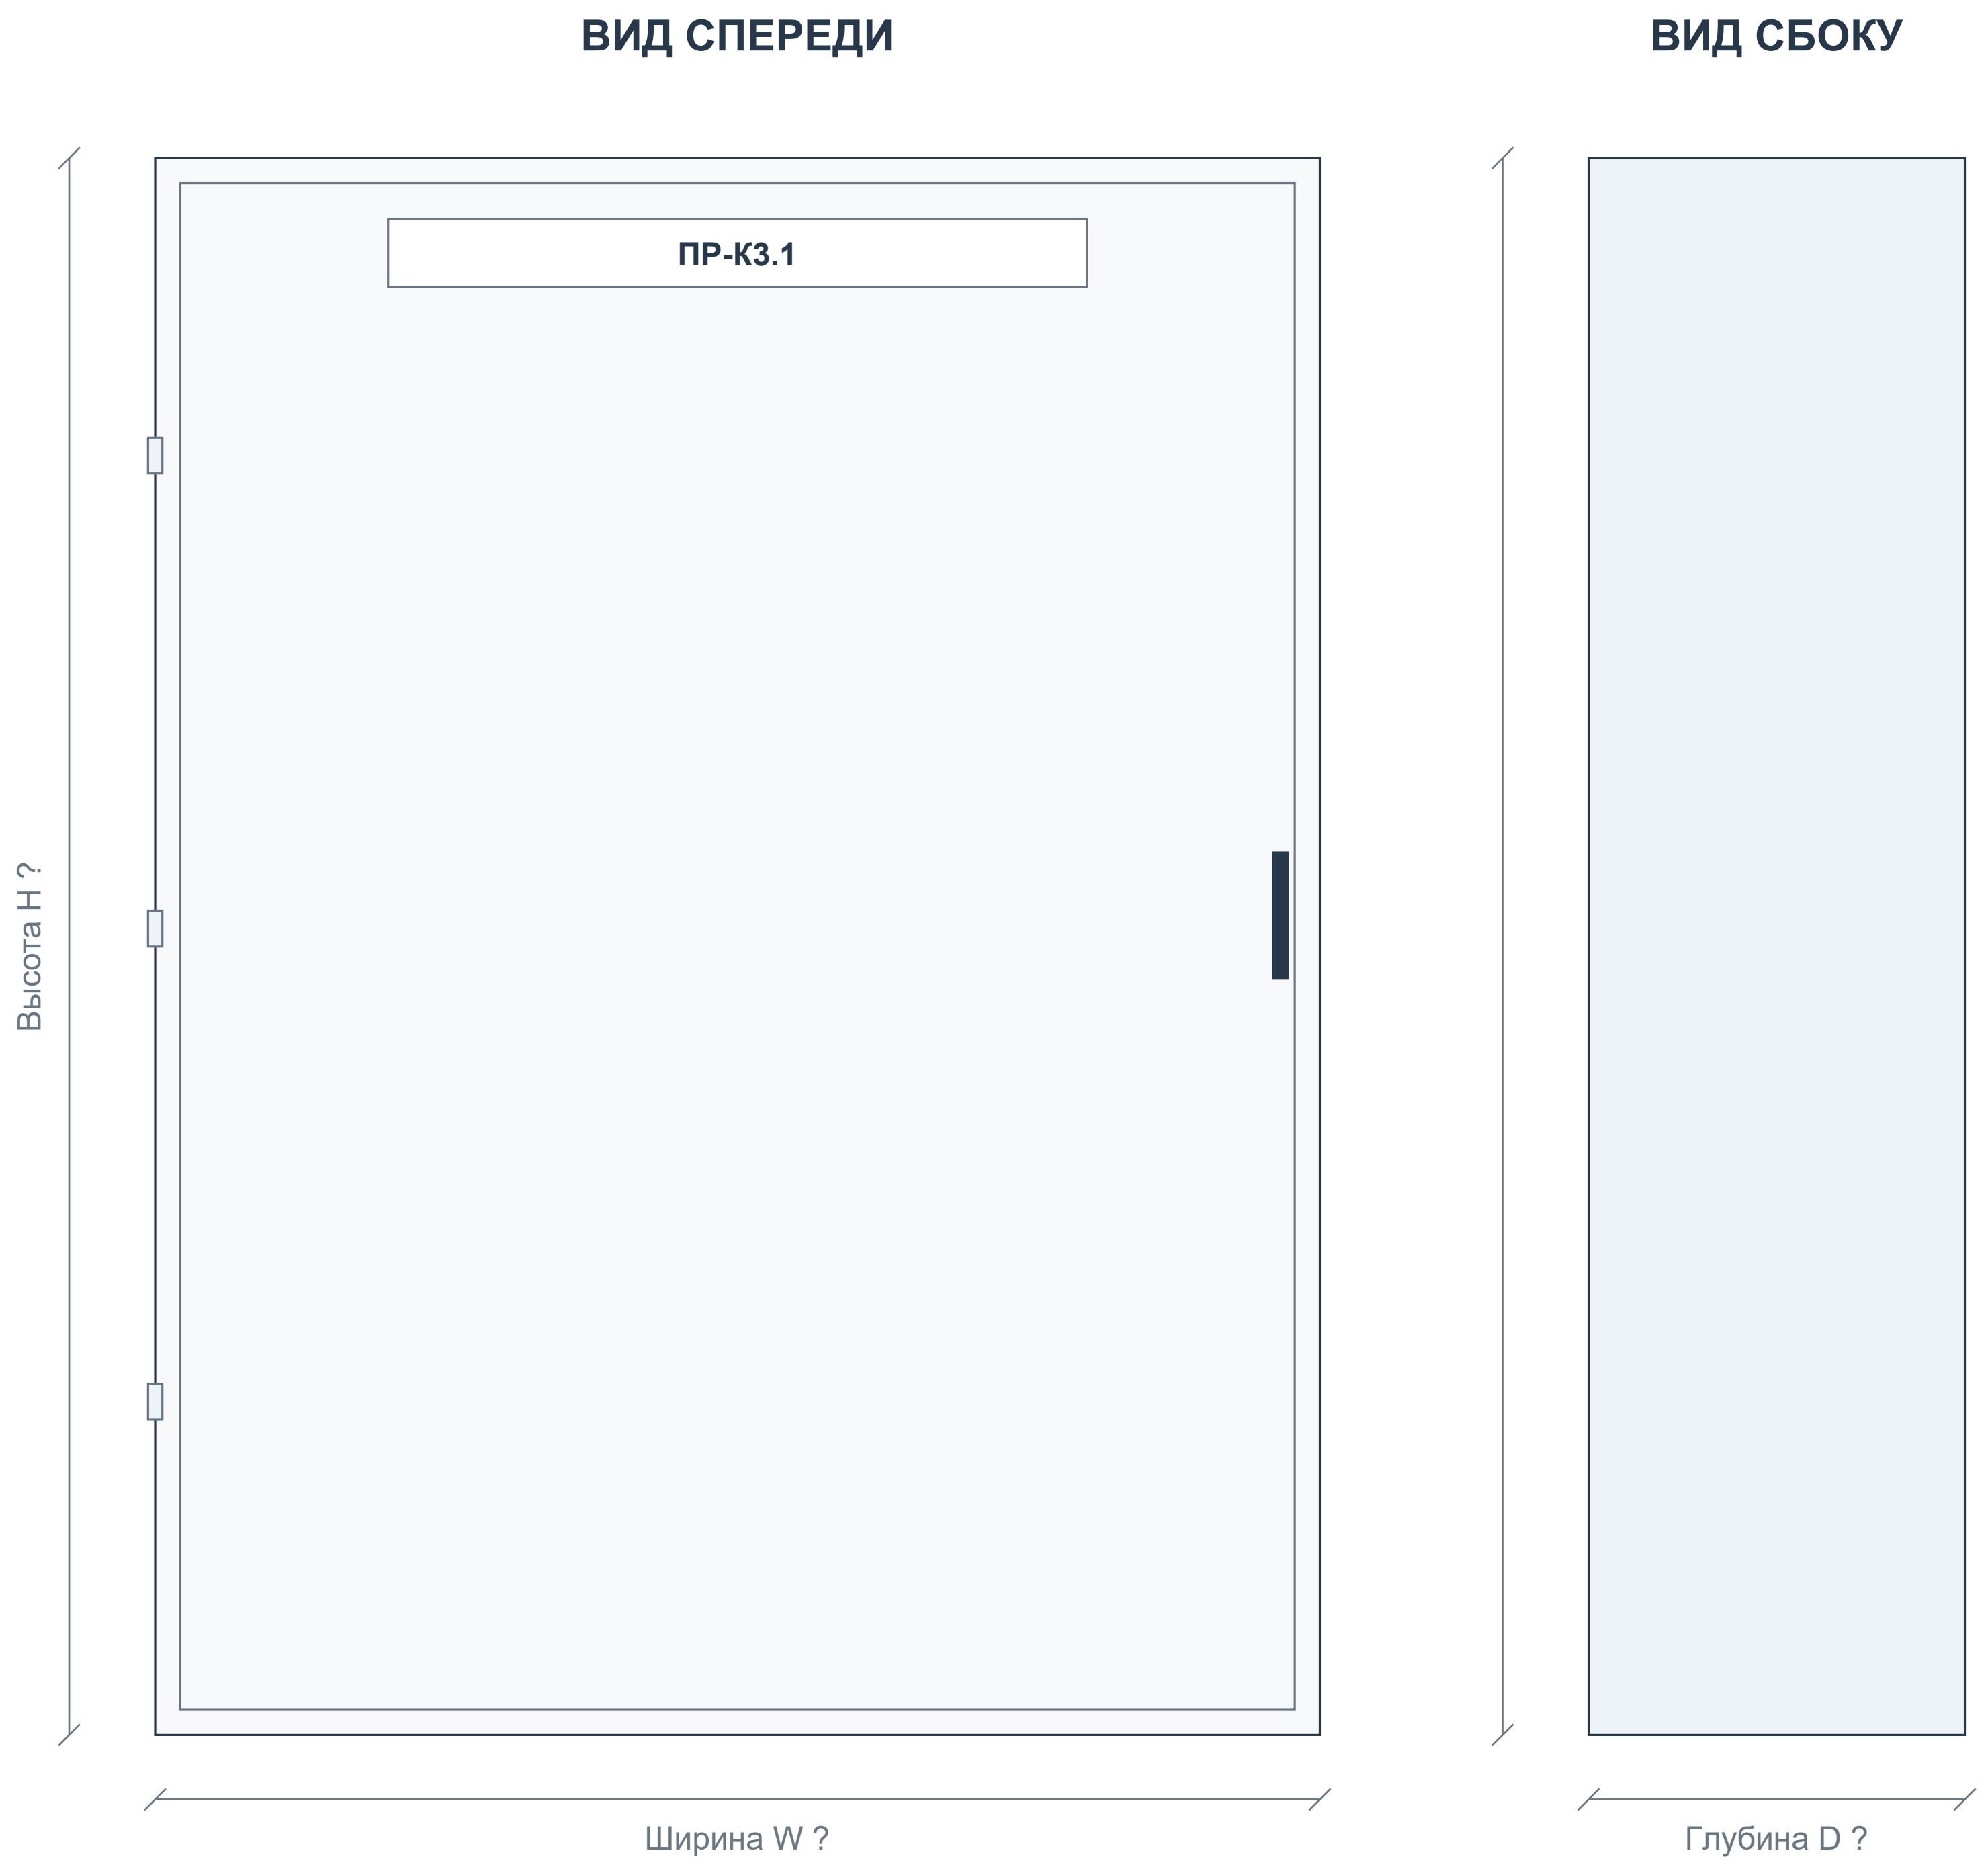

Корпус: 5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

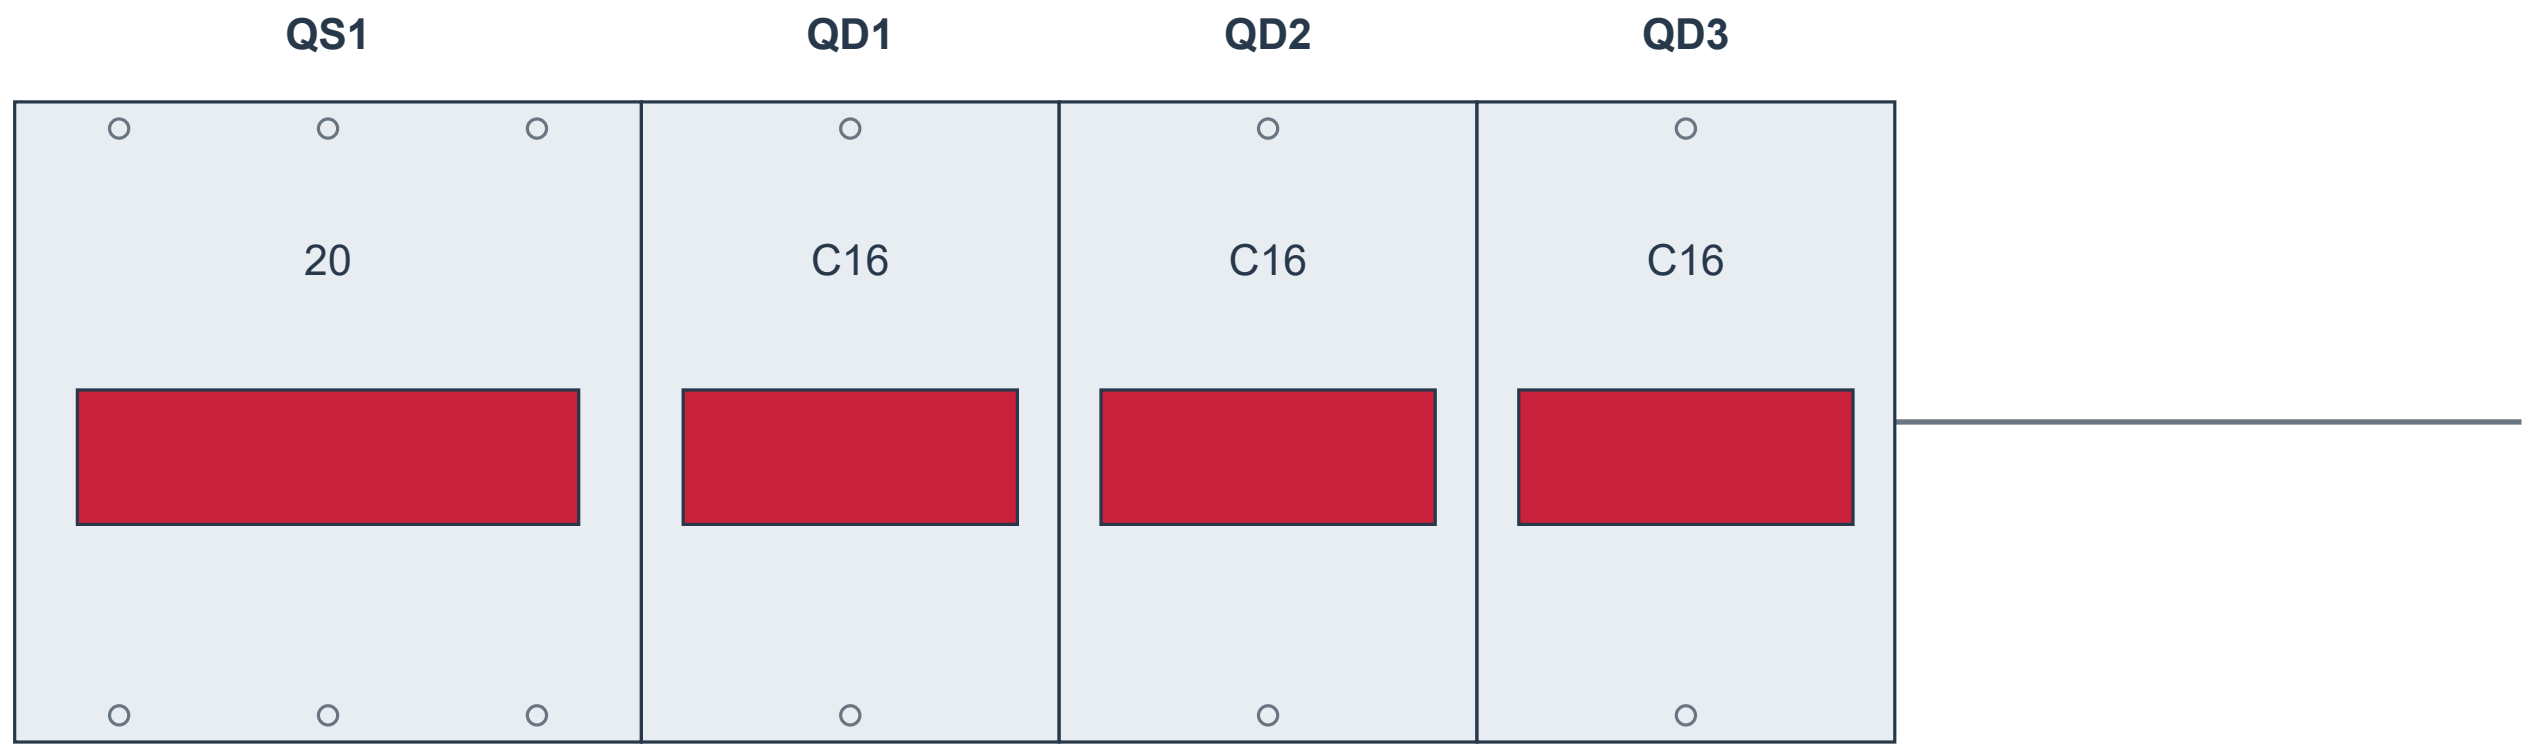

Сумма ширин: 162 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	576	1	0	?	54 B
QD1 - QD3	NXBLE-63YH	577	1	54...126	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 12 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Актуальная спецификация

ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 591 | ЭОМ, PDF стр. 33

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
592	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
593	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
594	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
595	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
596	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
597	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 33

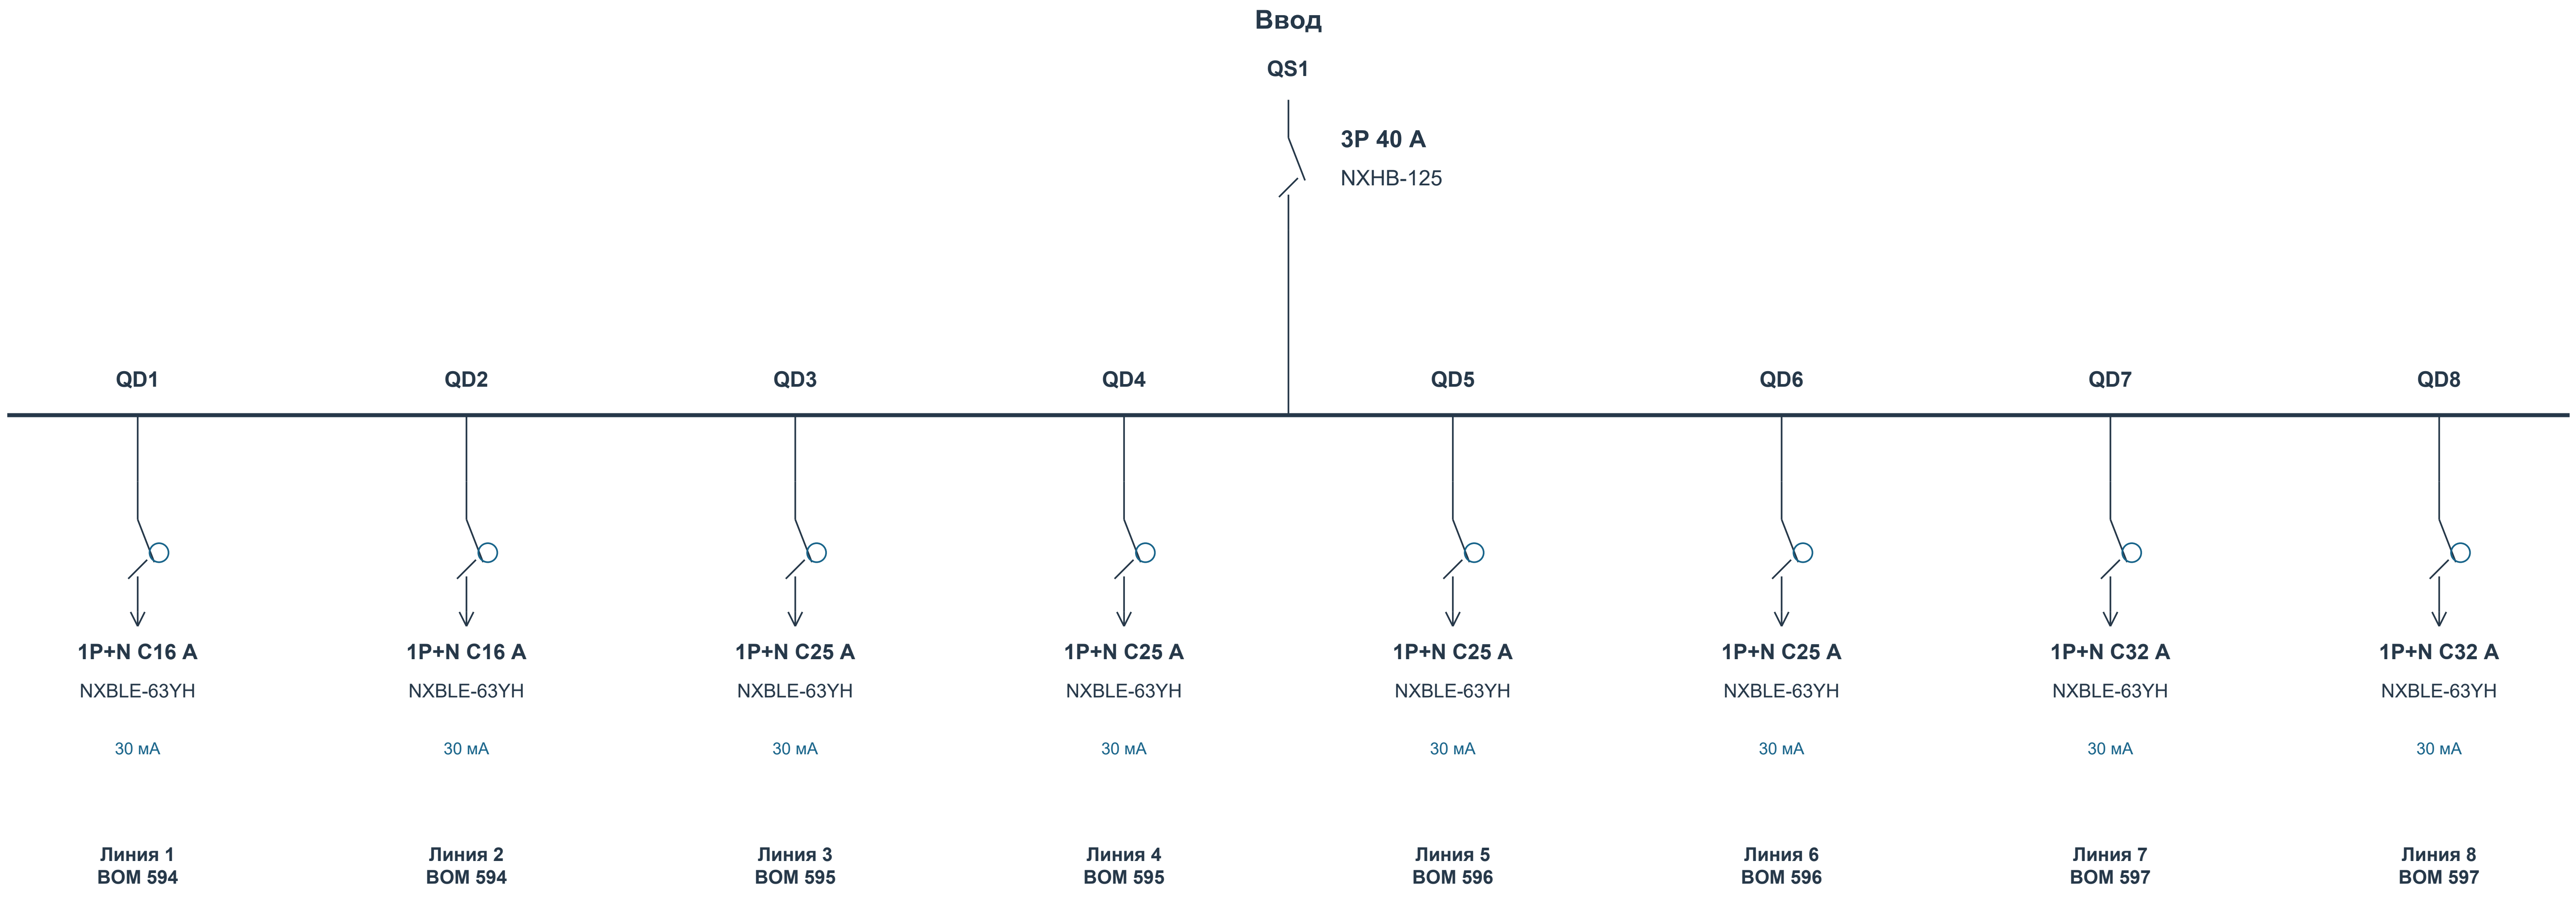
Ввод
QS1
3P 40 A
NXHB-125
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 594
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 594
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 595
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 595
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 596
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 596
1P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 597
1P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 597

Данные исходного проекта: Ру 30.9 кВт | Рр 5,2 кВт | Ip 8,4 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

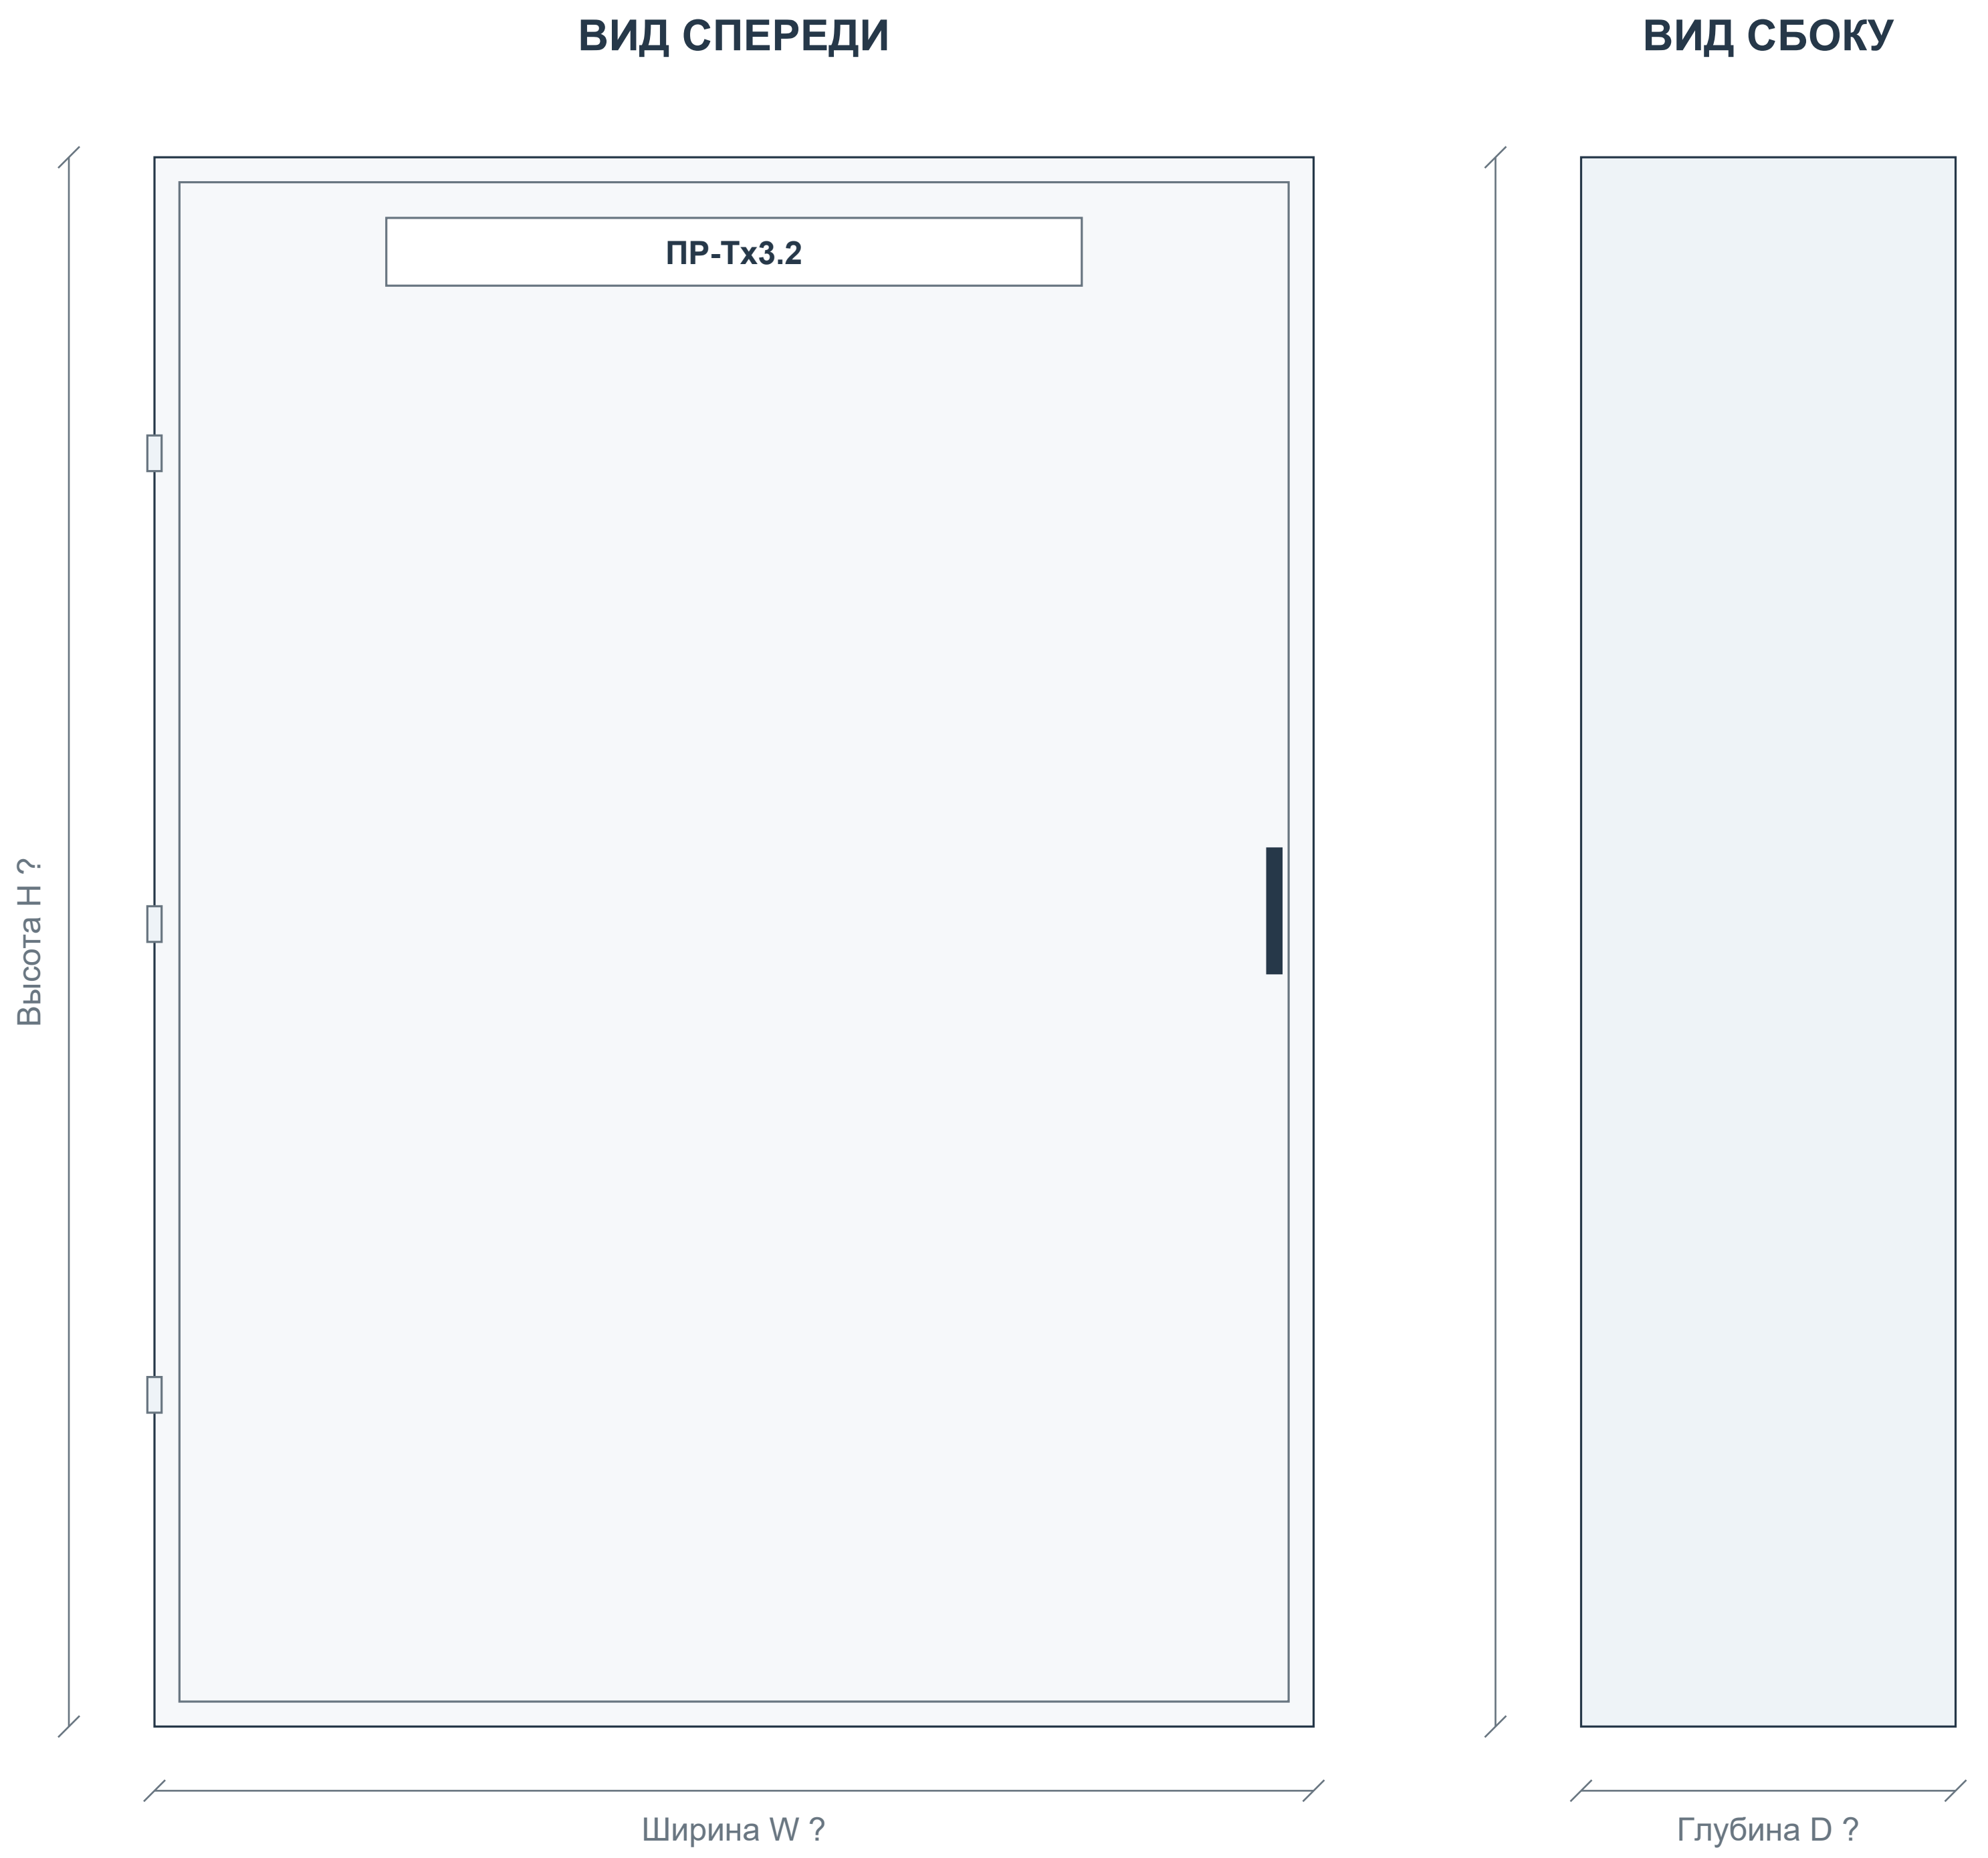

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

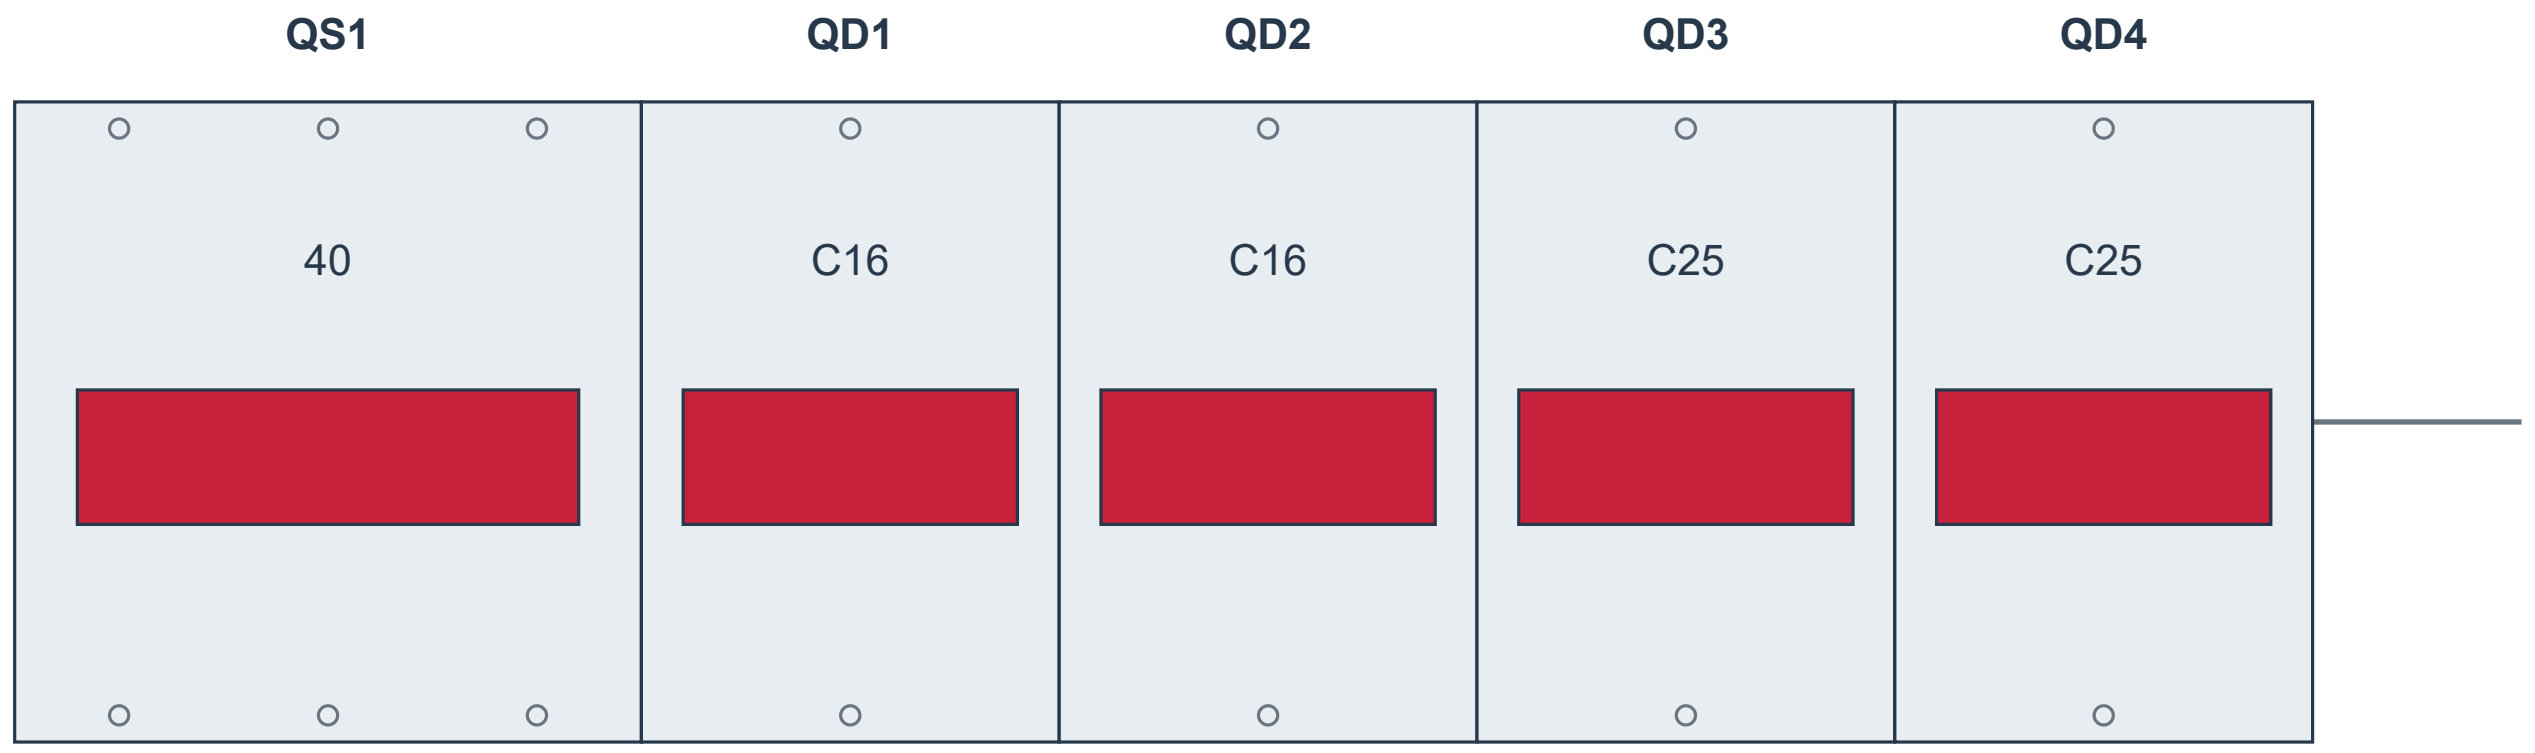

Сумма ширин: 198 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

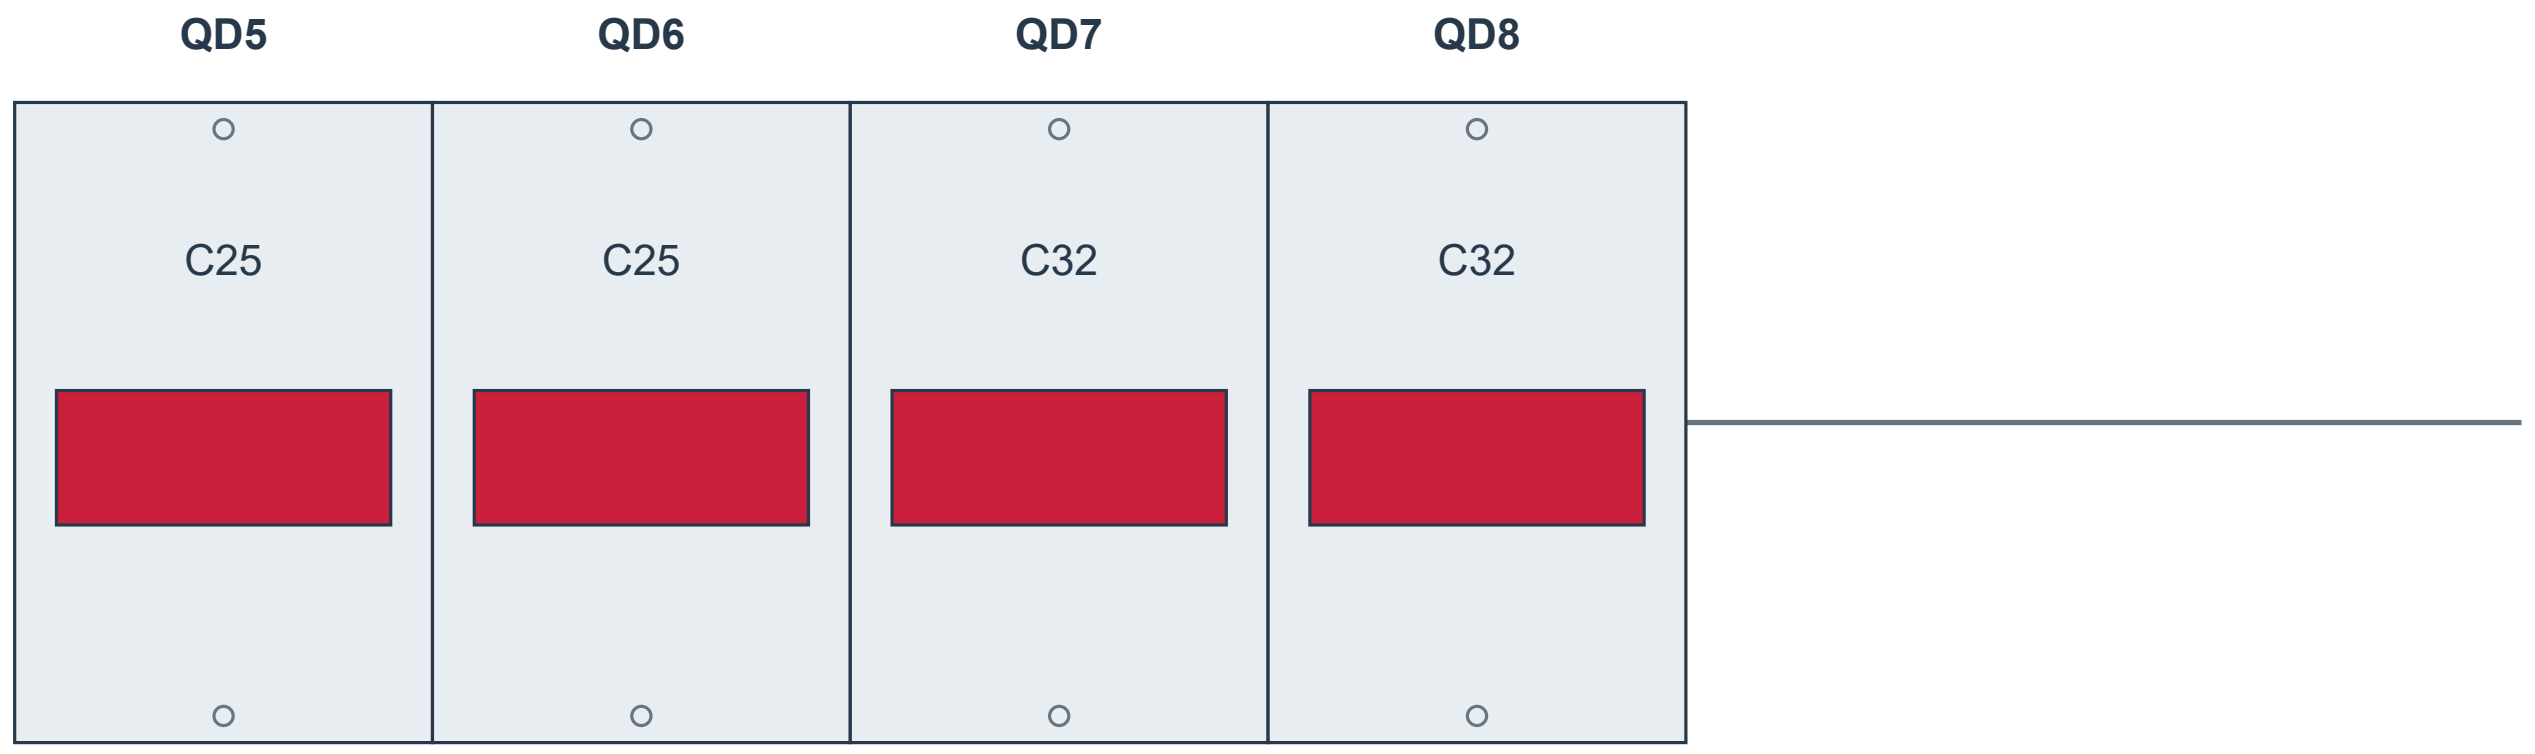

Сумма ширин: 144 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	593	1	0	?	54 B
QD1 - QD2	NXBLE-63YH	594	1	54...90	?	36 B
QD3 - QD4	NXBLE-63YH	595	1	126...162	?	36 B
QD5 - QD6	NXBLE-63YH	596	2	0...36	?	36 B
QD7 - QD8	NXBLE-63YH	597	2	72...108	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Актуальная спецификация

ПРК-6 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 614 | ЭОМ, PDF стр. 34

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
615	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
616	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
617	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
618	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
619	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
620	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 34

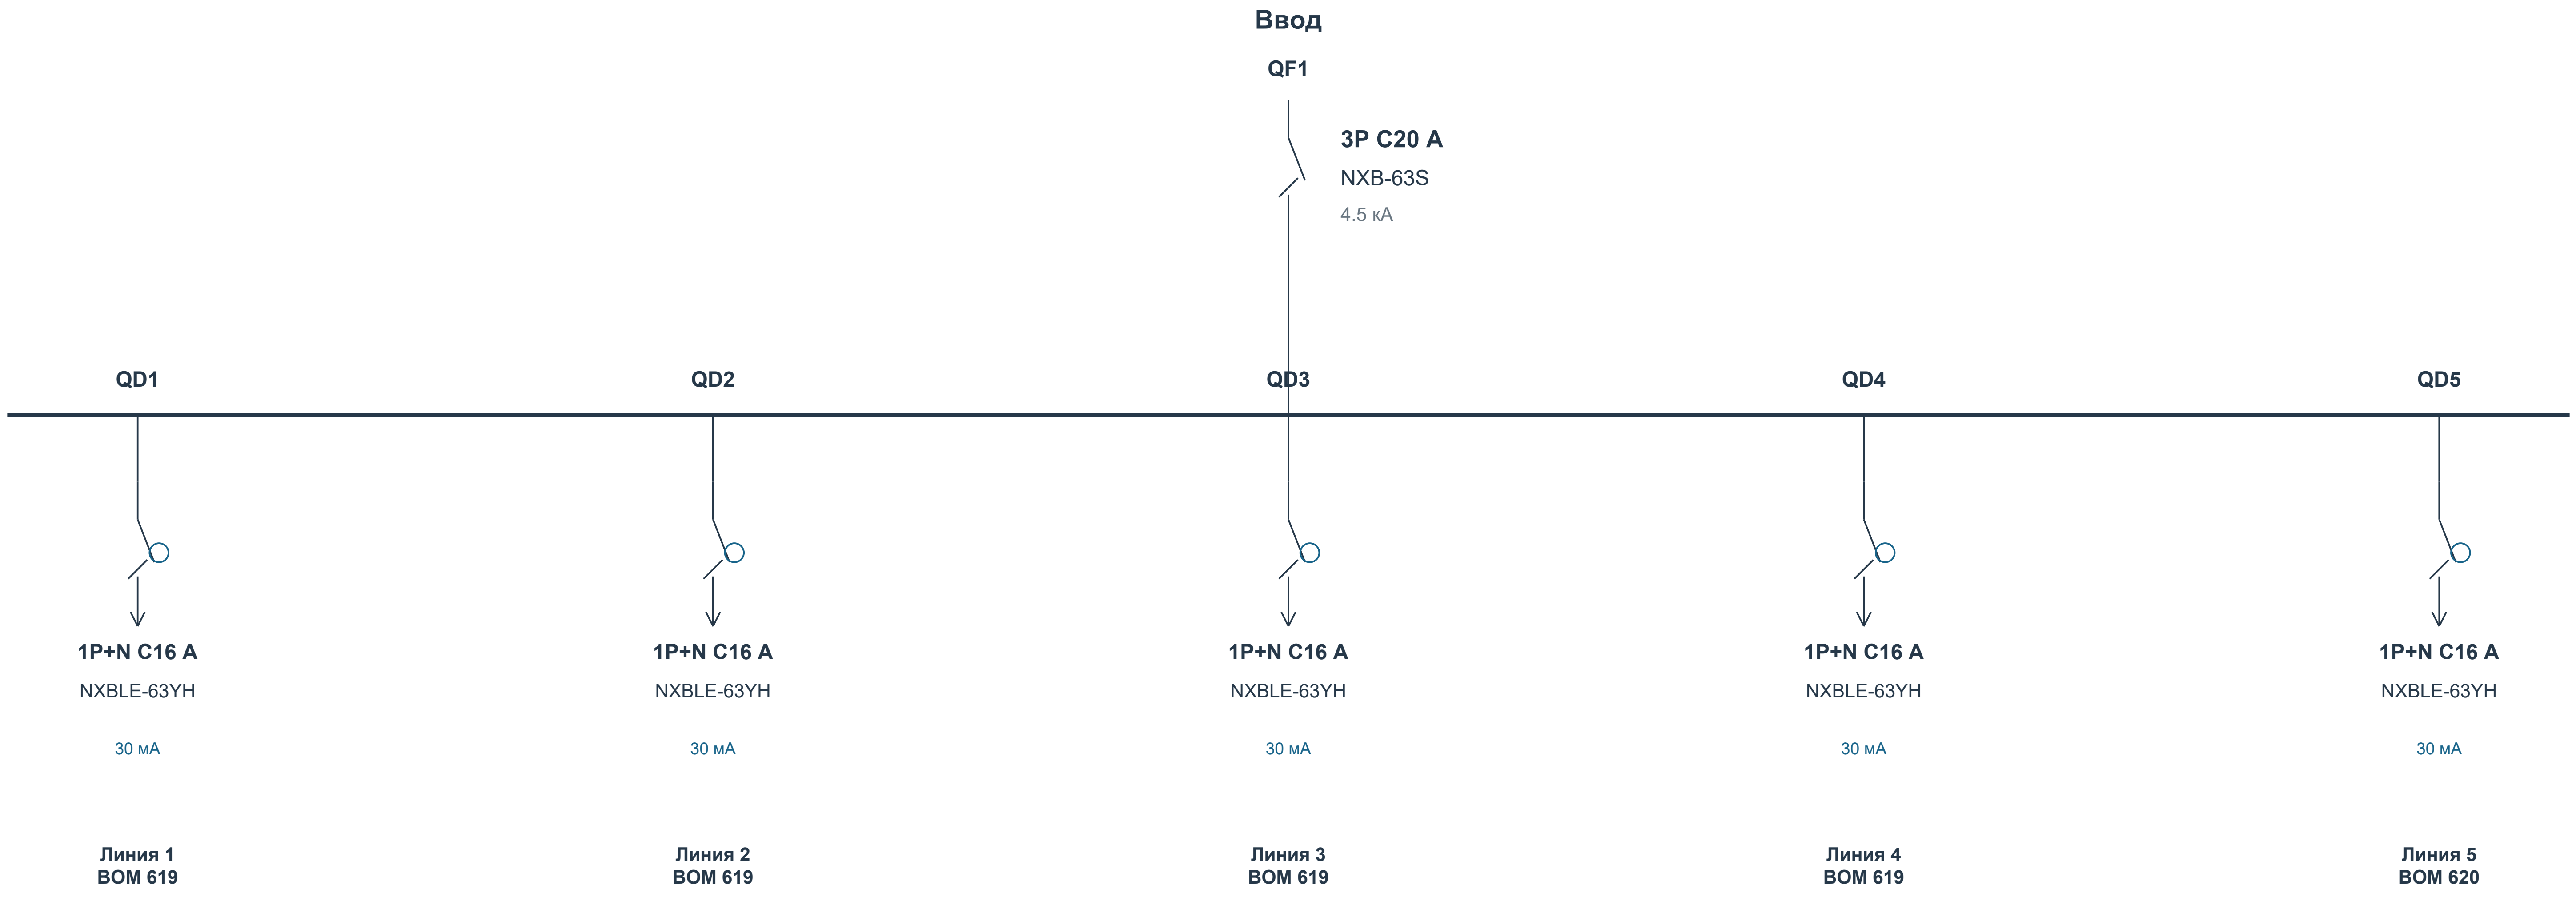
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 619
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 619
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 619
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 619
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 620

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 5.9 кВт | Рр 5,0 кВт | Ip 8,0 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

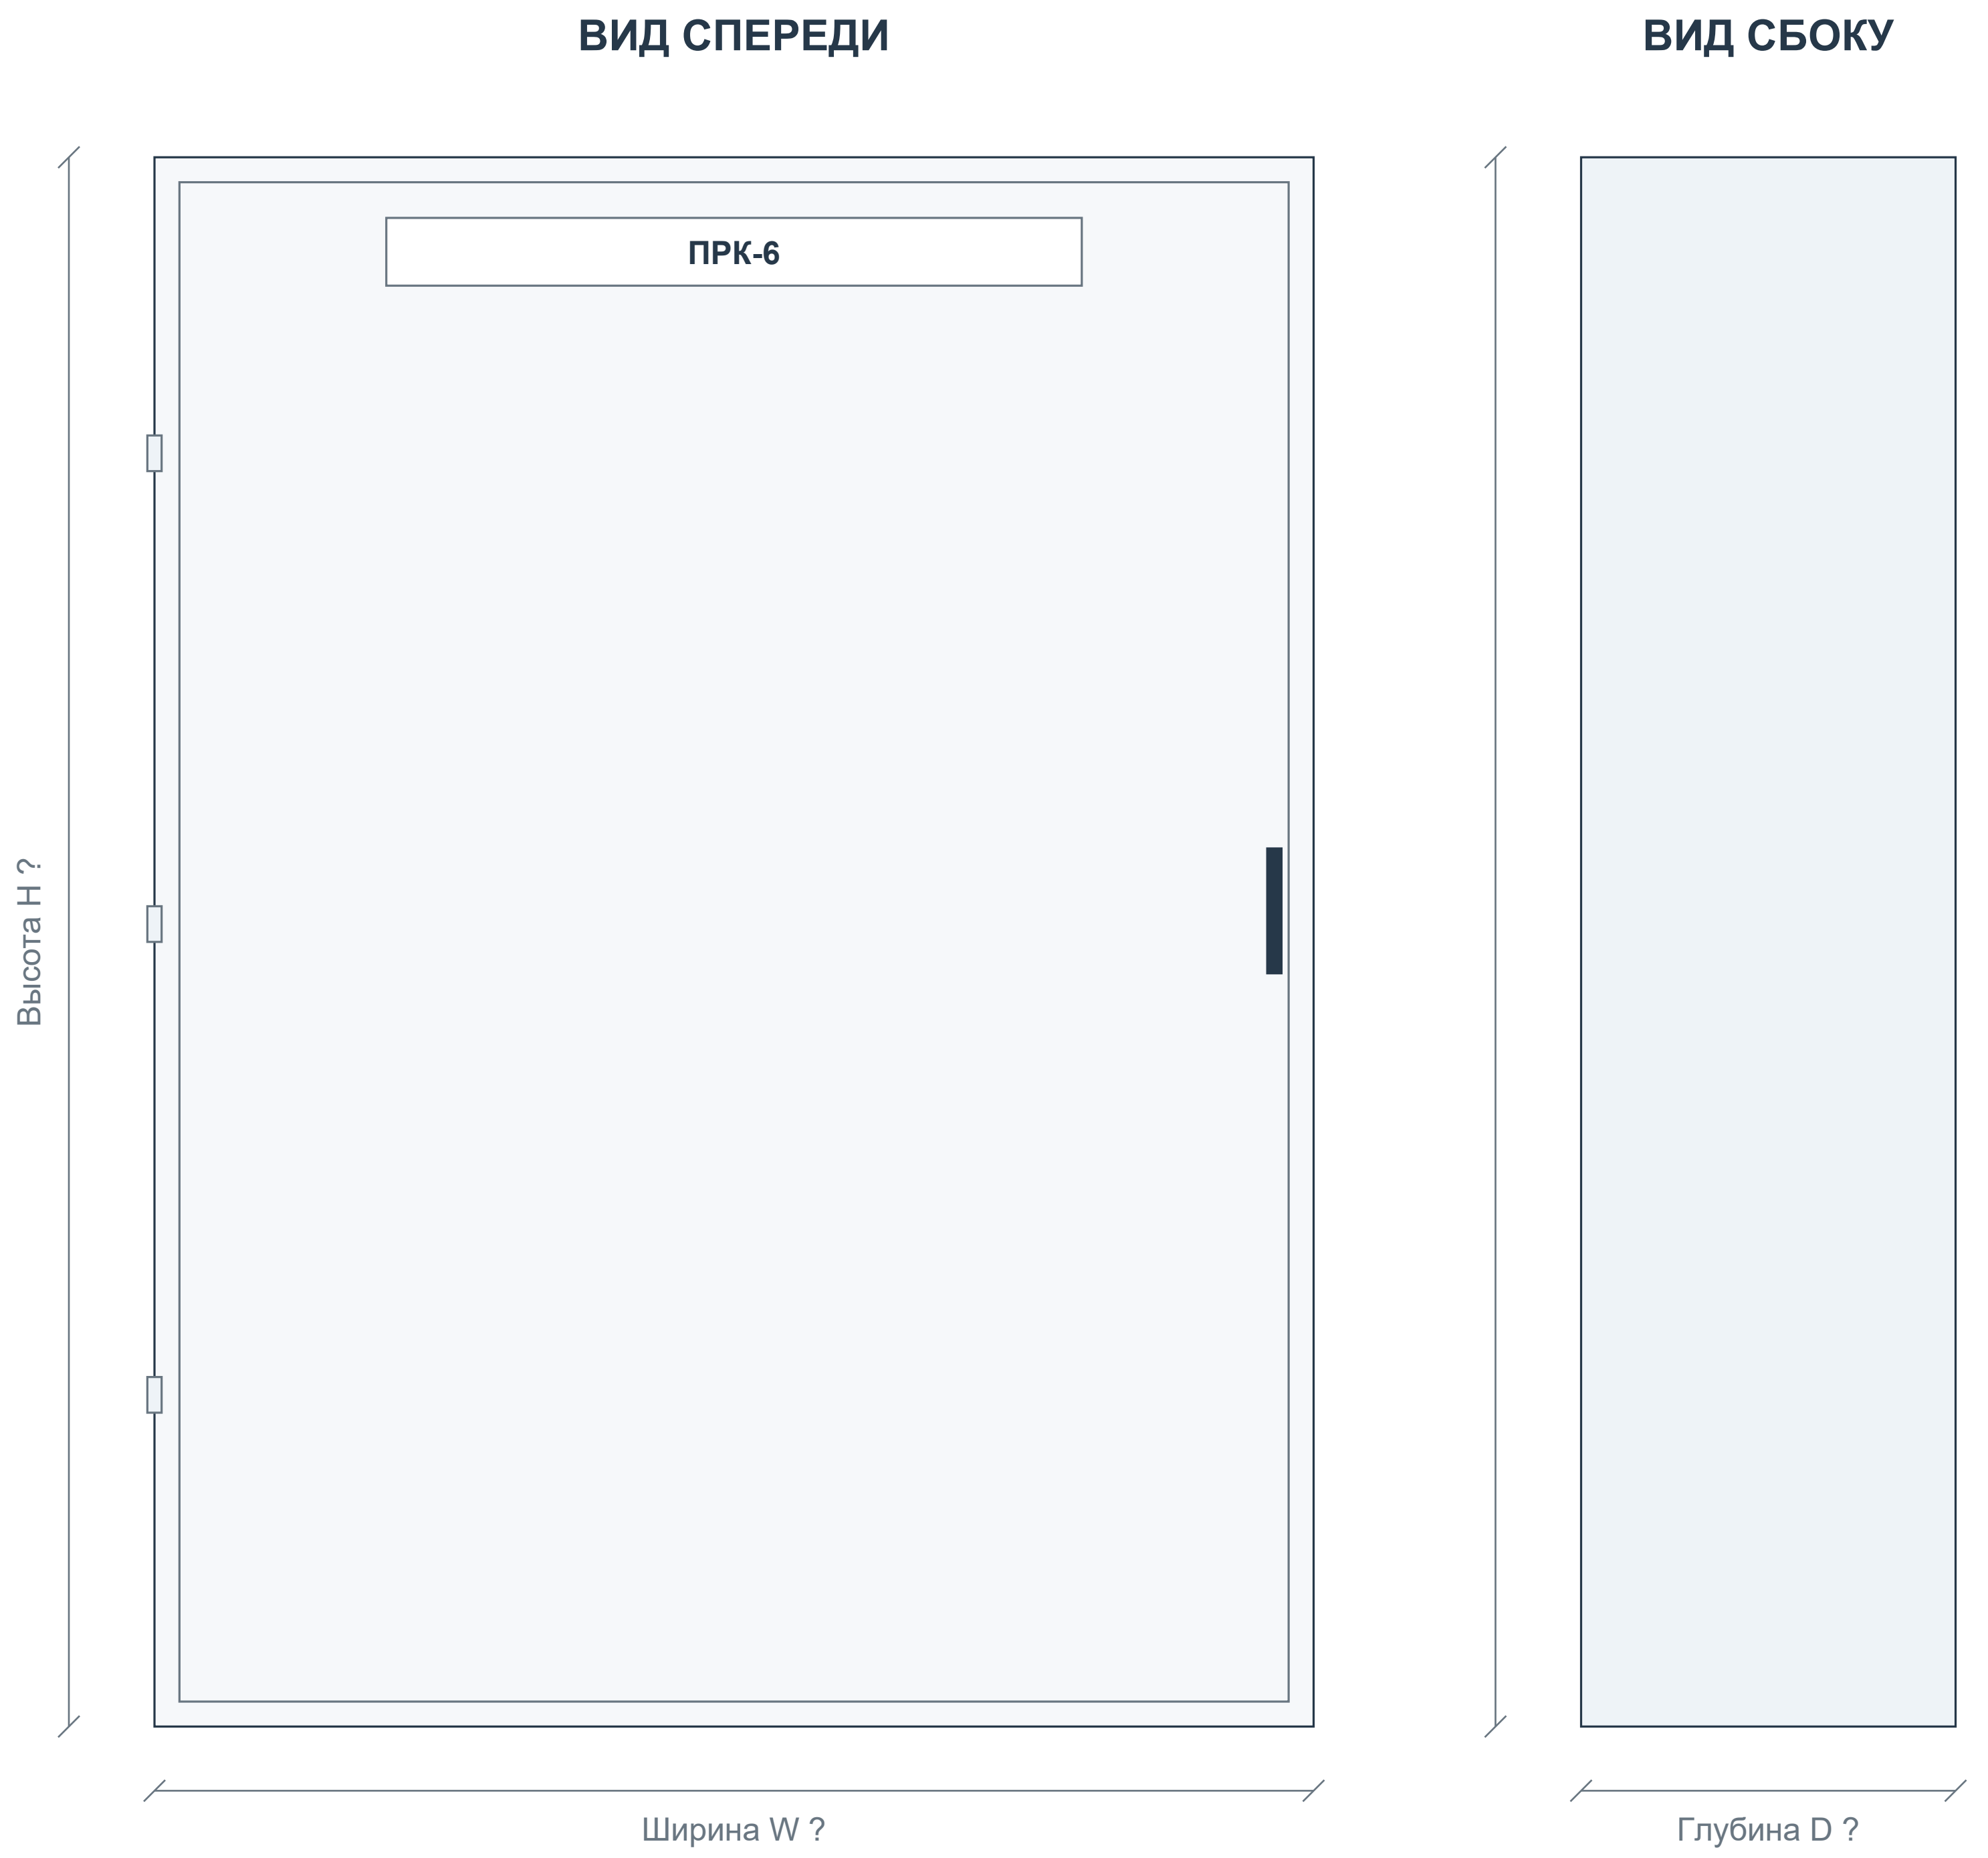

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

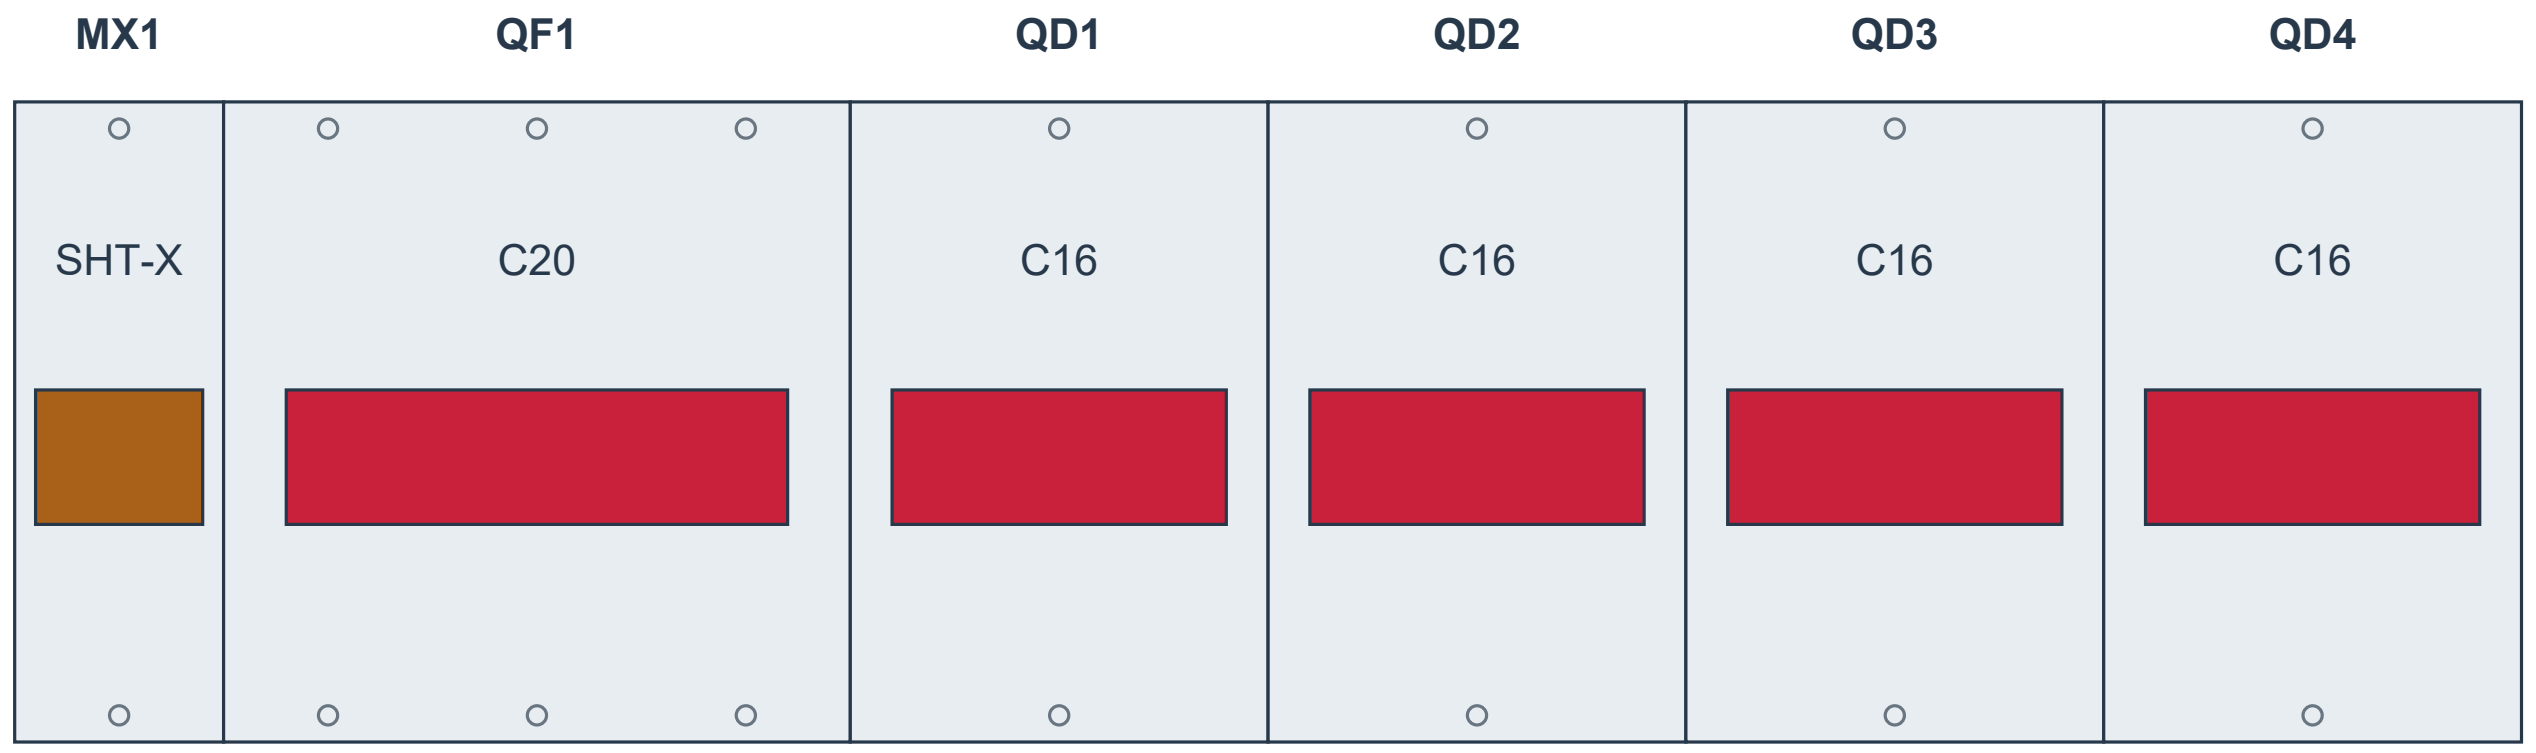

Сумма ширин: 216 мм В

Ряд 2 | модульная раскладка D

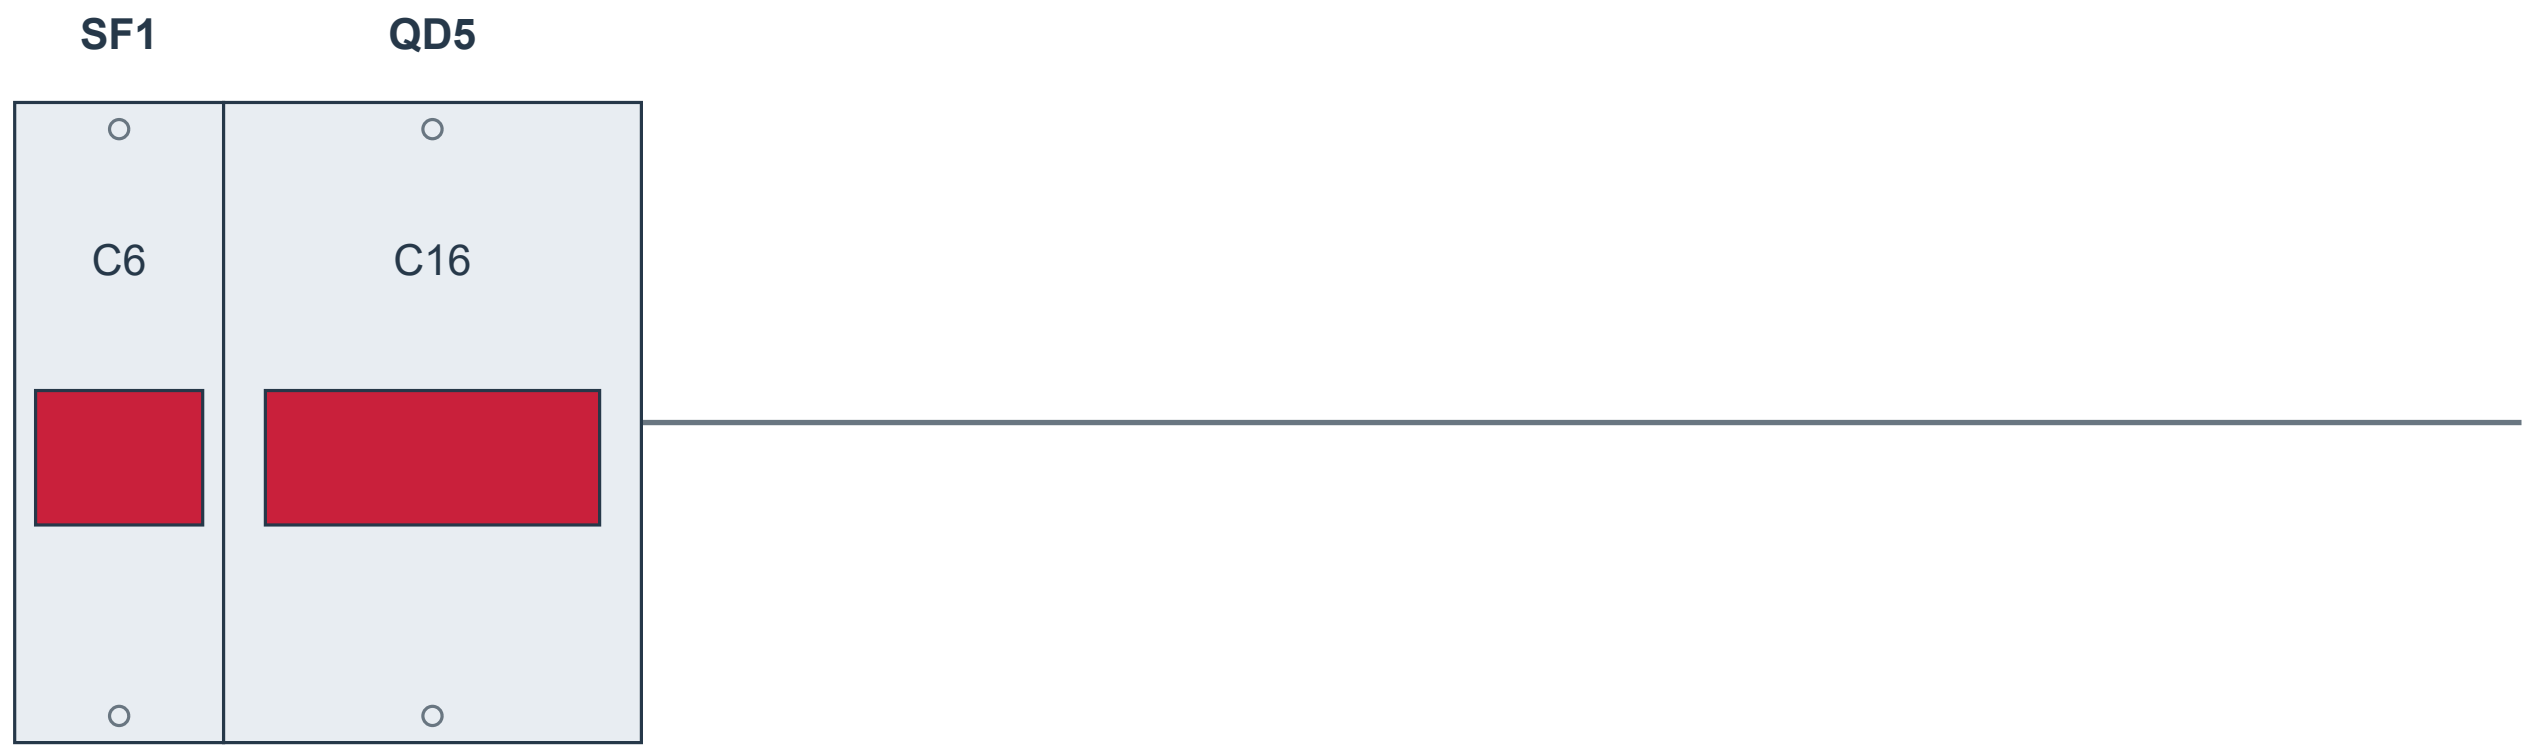

Сумма ширин: 54 мм В

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	616	1	0	?	18 B
QF1	NXB-63S	617	1	18	?	54 B
SF1	NXB-63S	618	2	0	?	18 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	619	1	72...180	?	36 B
QD5	NXBLE-63YH	620	2	18	?	36 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Актуальная спецификация

ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 637 | ЭОМ, PDF стр. 35

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
638	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
639	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
640	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
641	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 35

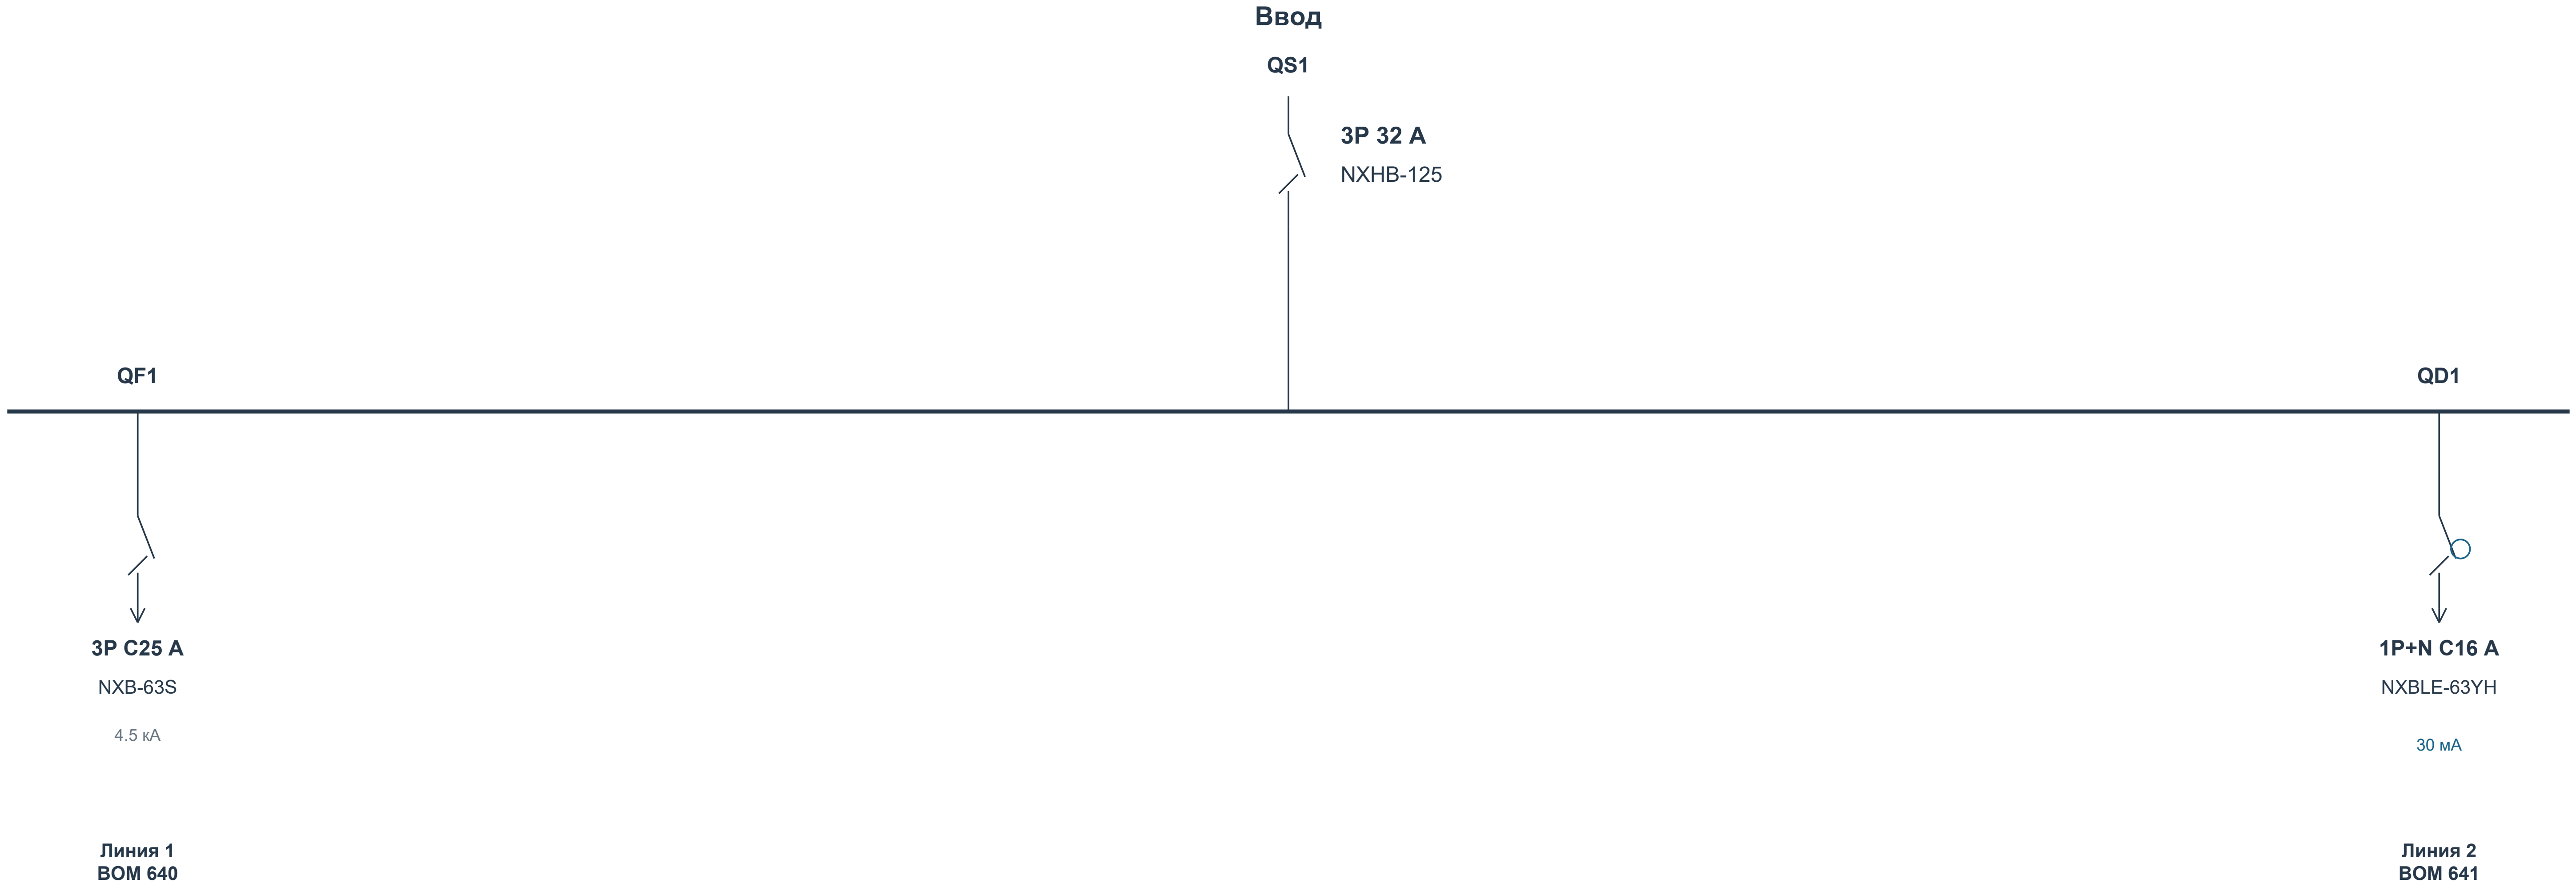
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QD1
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 640
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 641

Данные исходного проекта: Ру 6.3 кВт | Рр 5,5 кВт | Ір 8,8 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

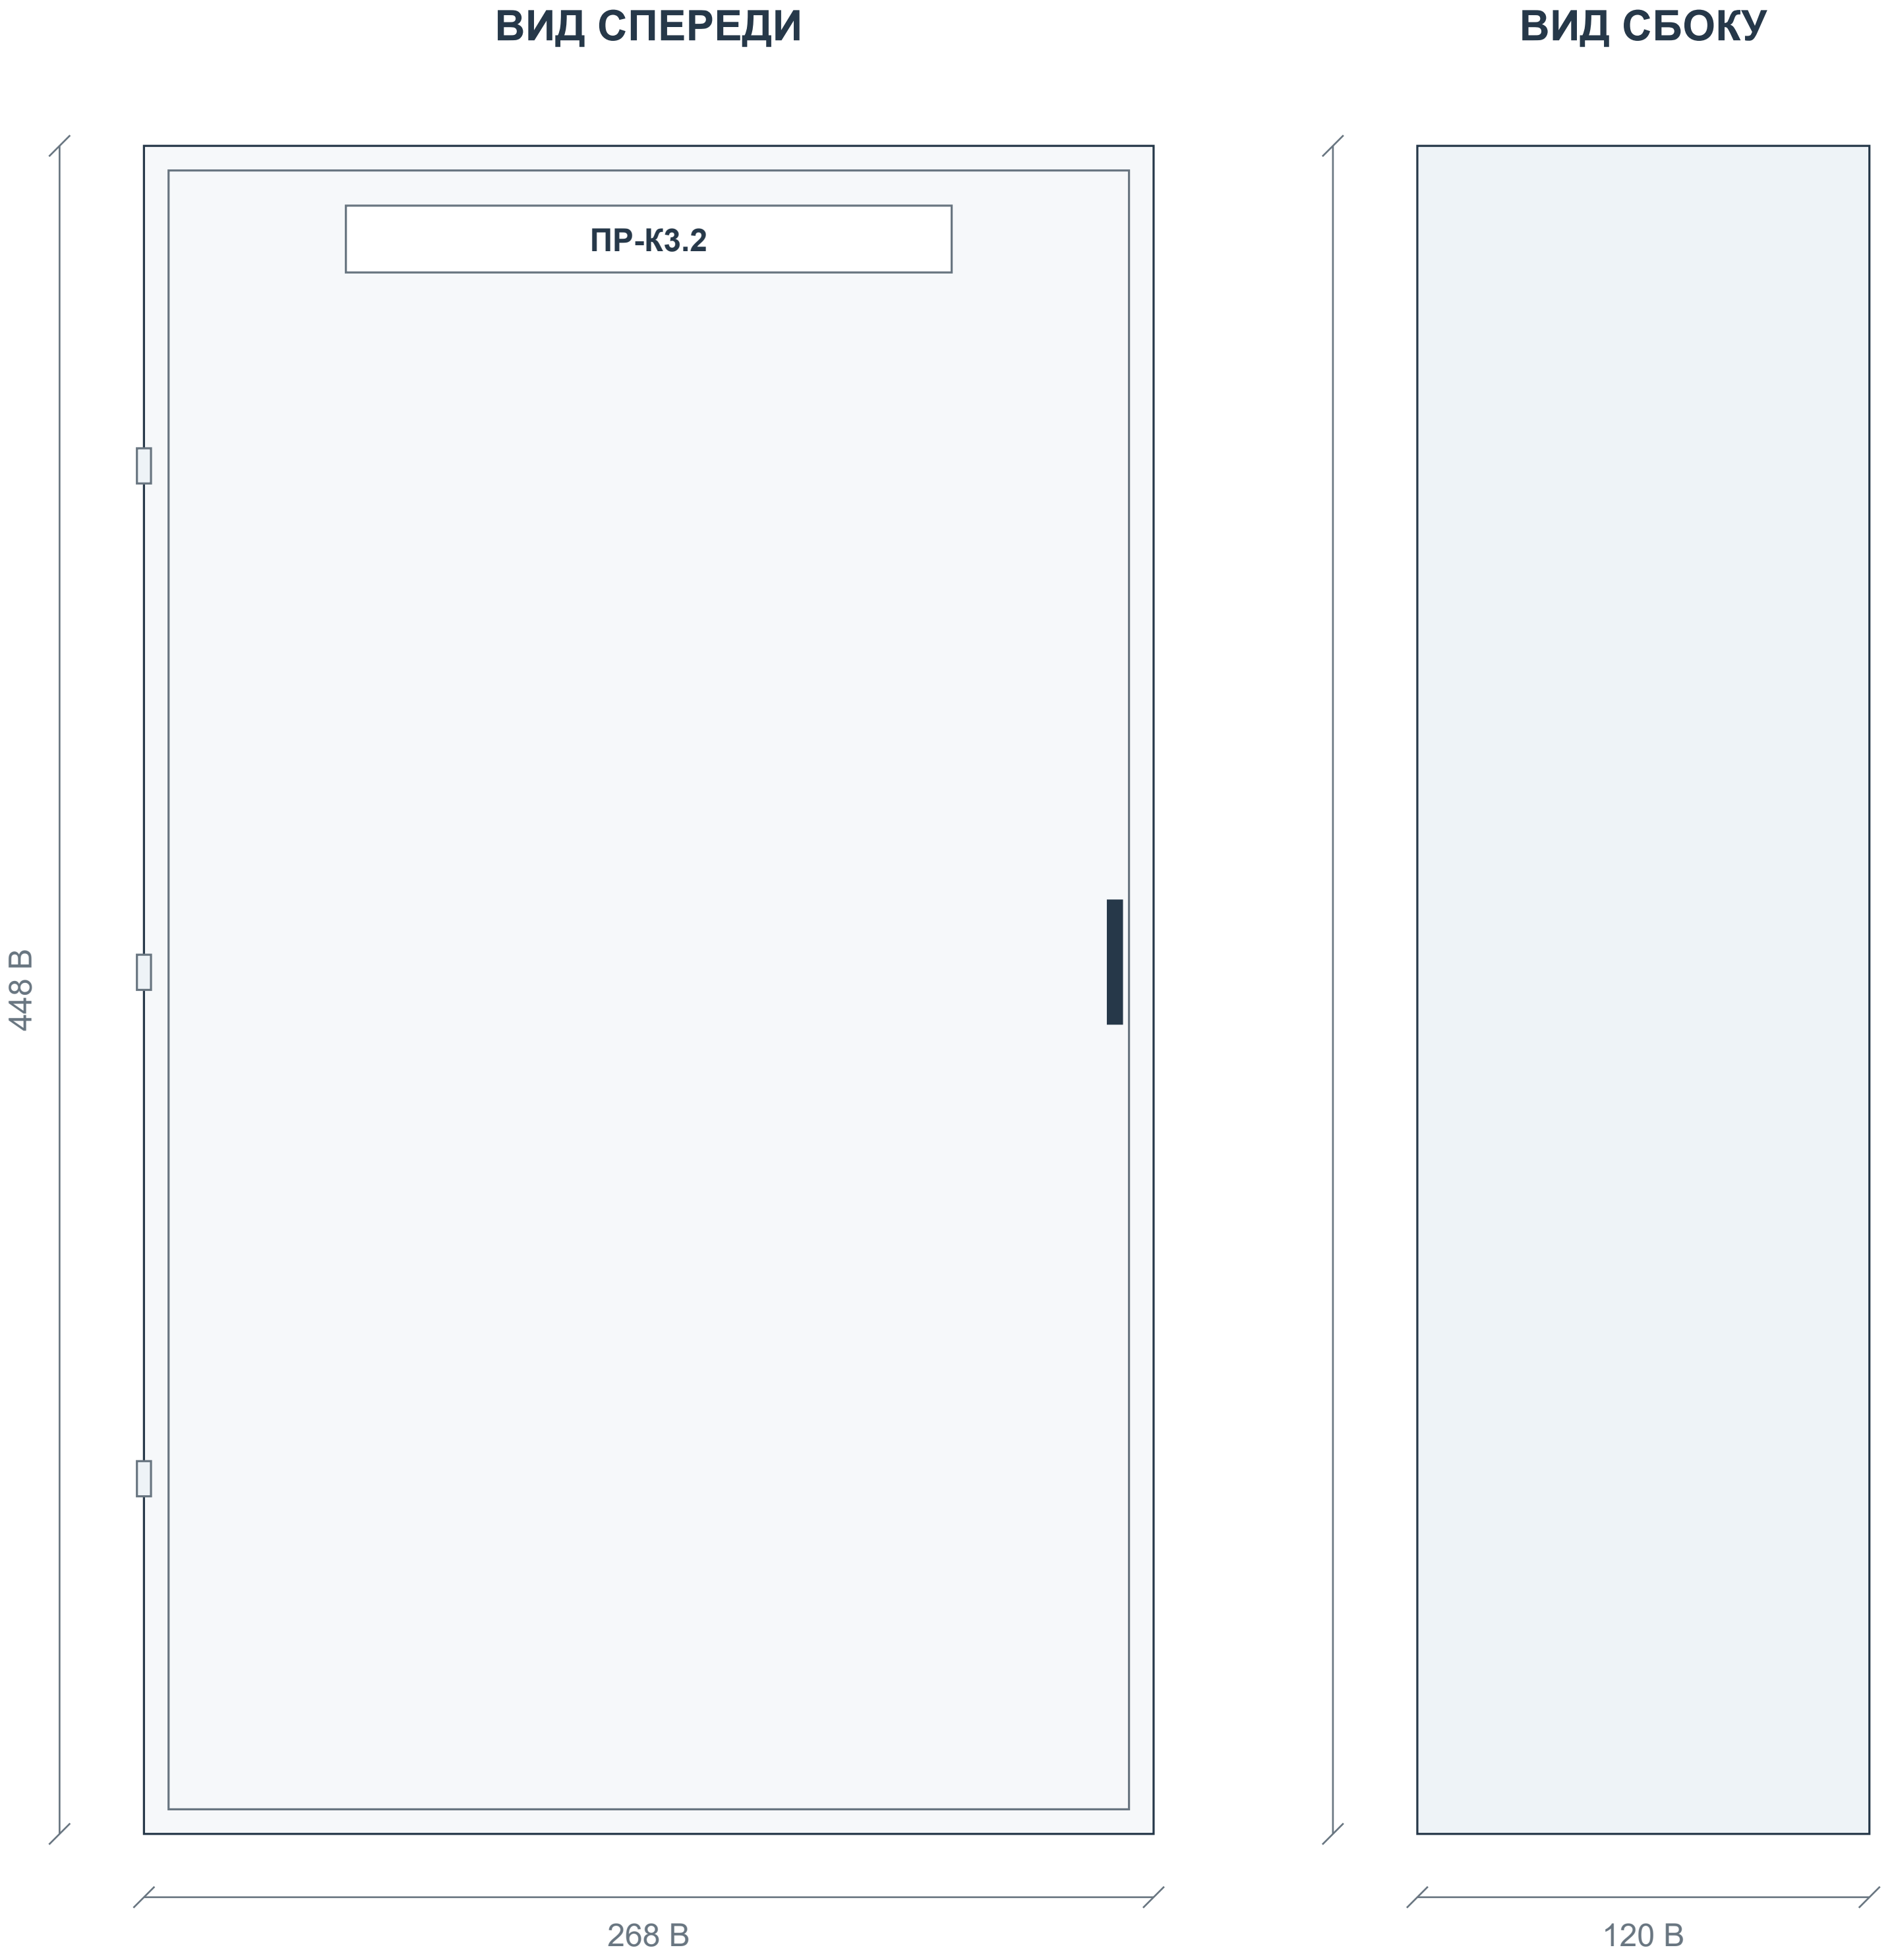

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

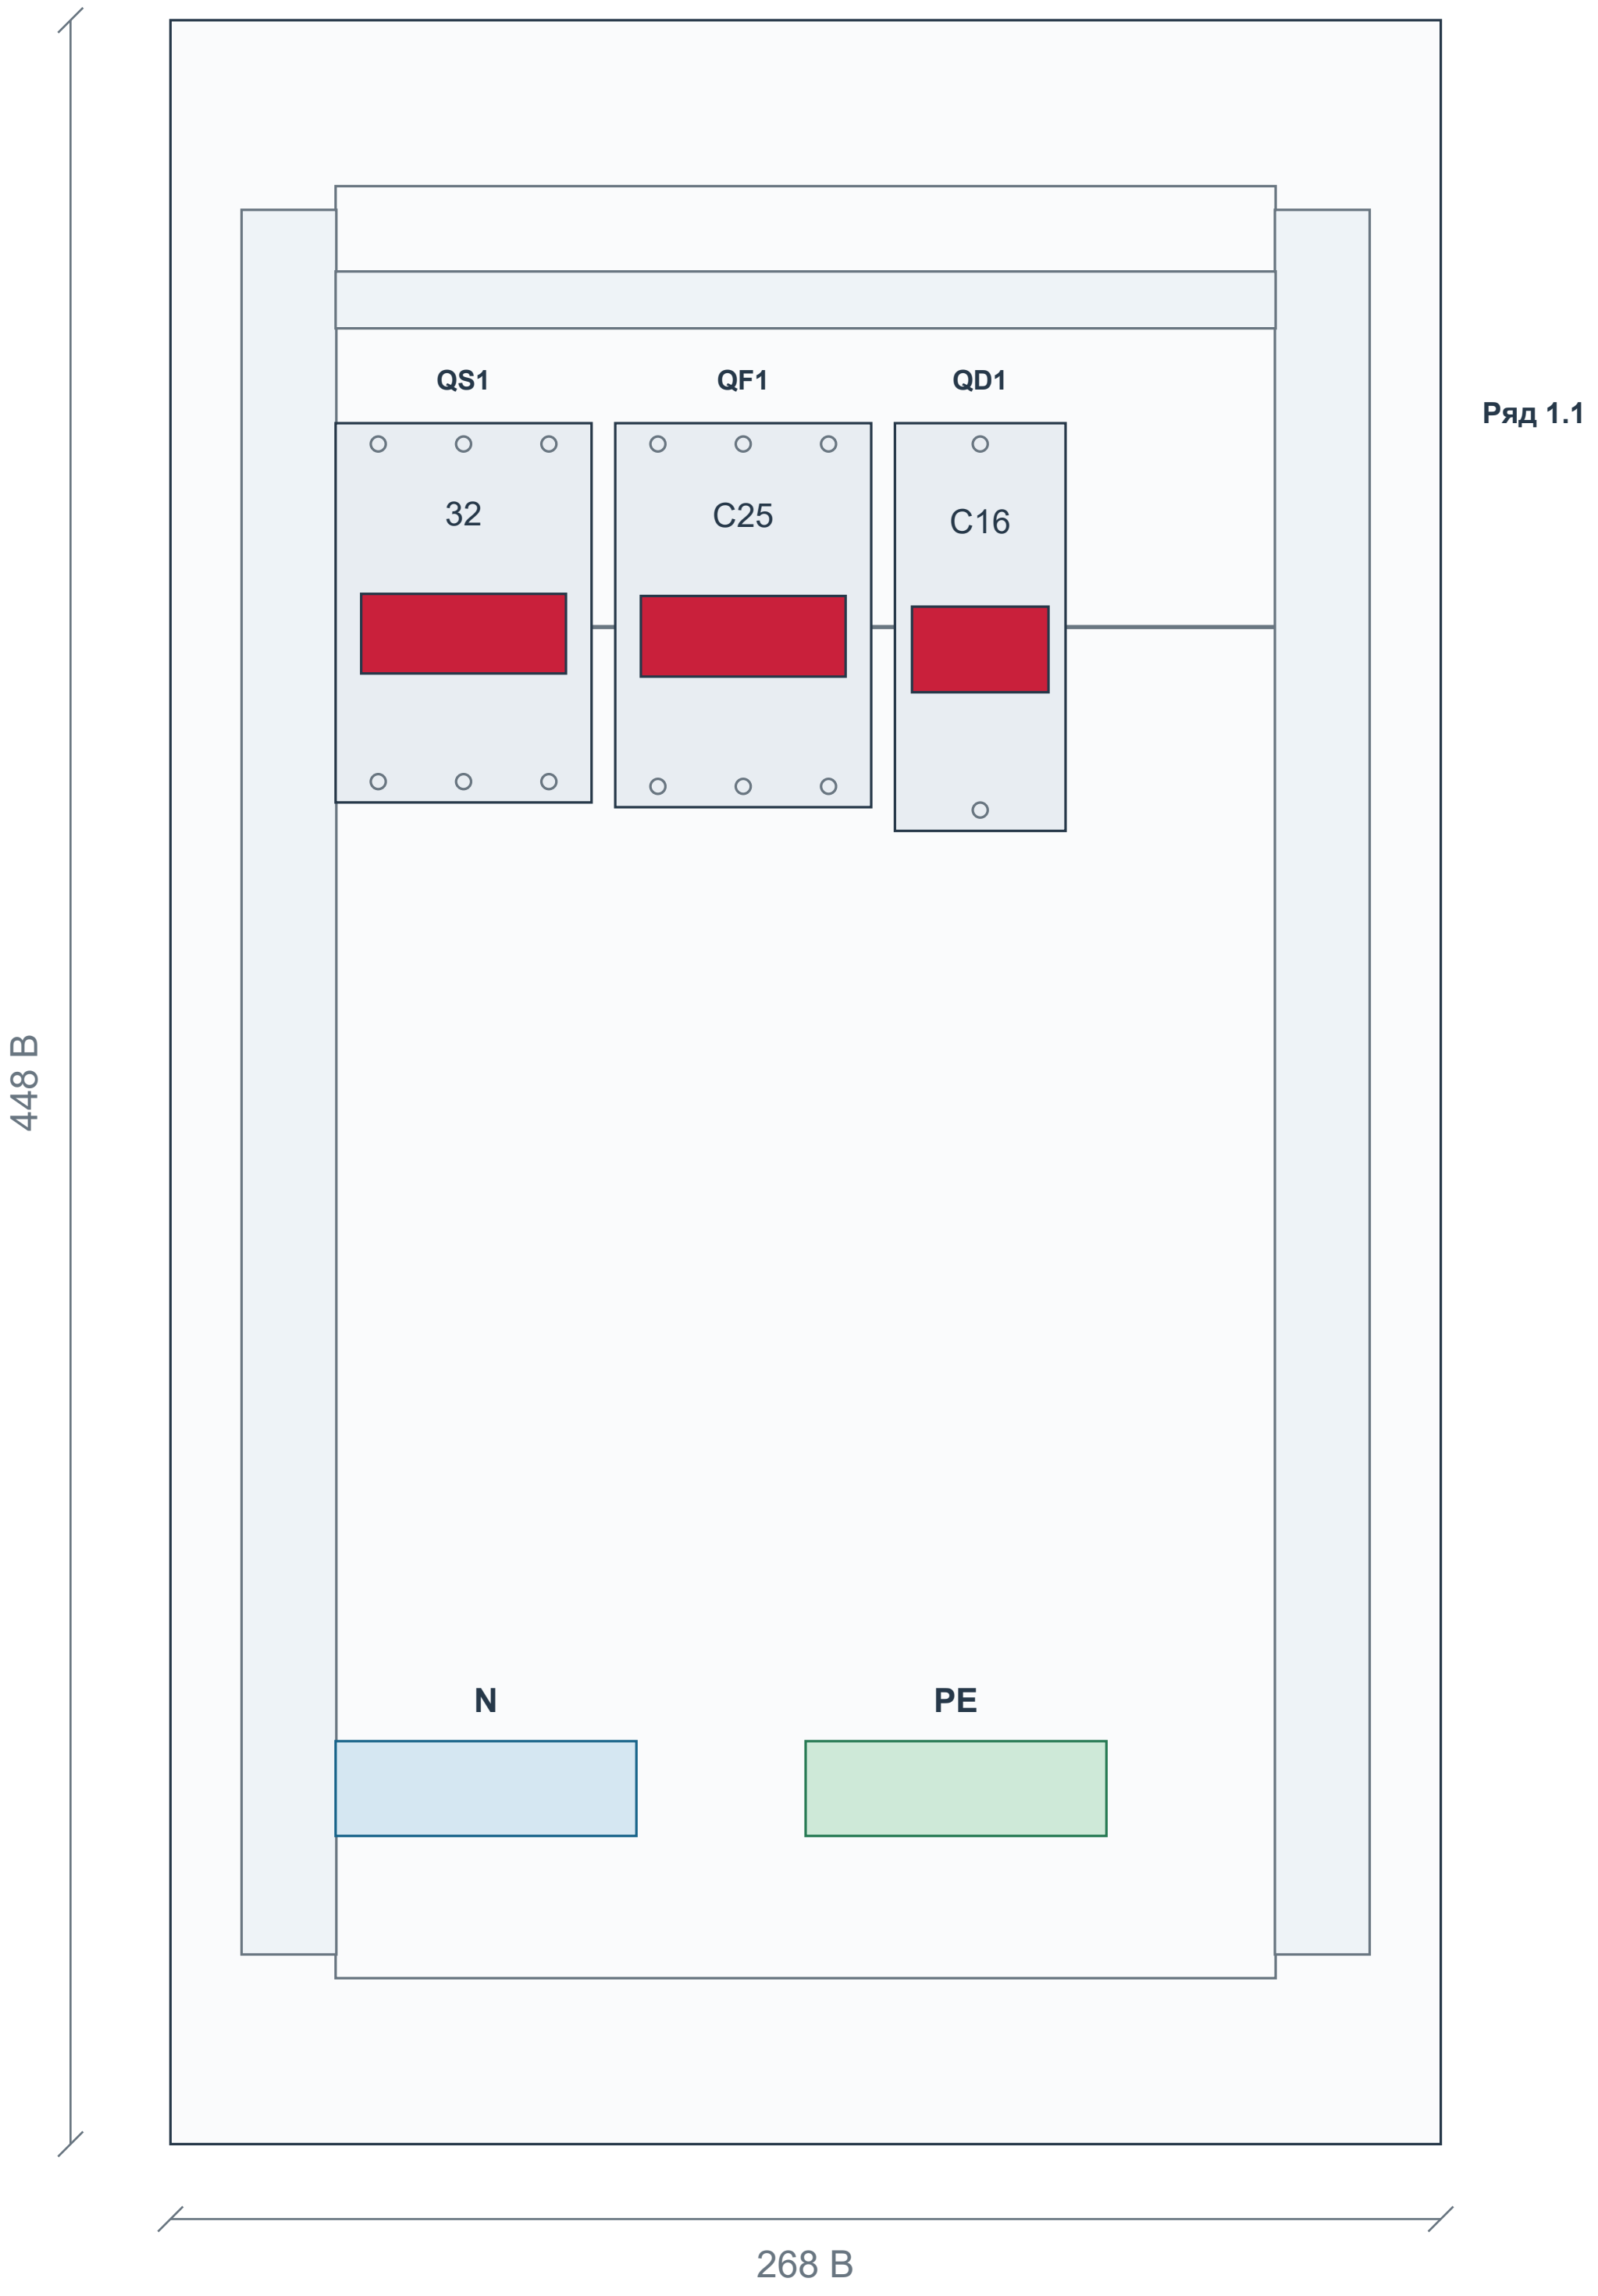

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	639	1.1	34.84	85	54 × 80
QF1	NXB-63S	640	1.1	93.84	85	54 × 81
QD1	NXBLE-63YH	641	1.1	152.84	85	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Актуальная спецификация

ПРК-7 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 655 | ЭОМ, PDF стр. 36

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
656	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
657	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
658	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
659	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
660	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
661	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 36

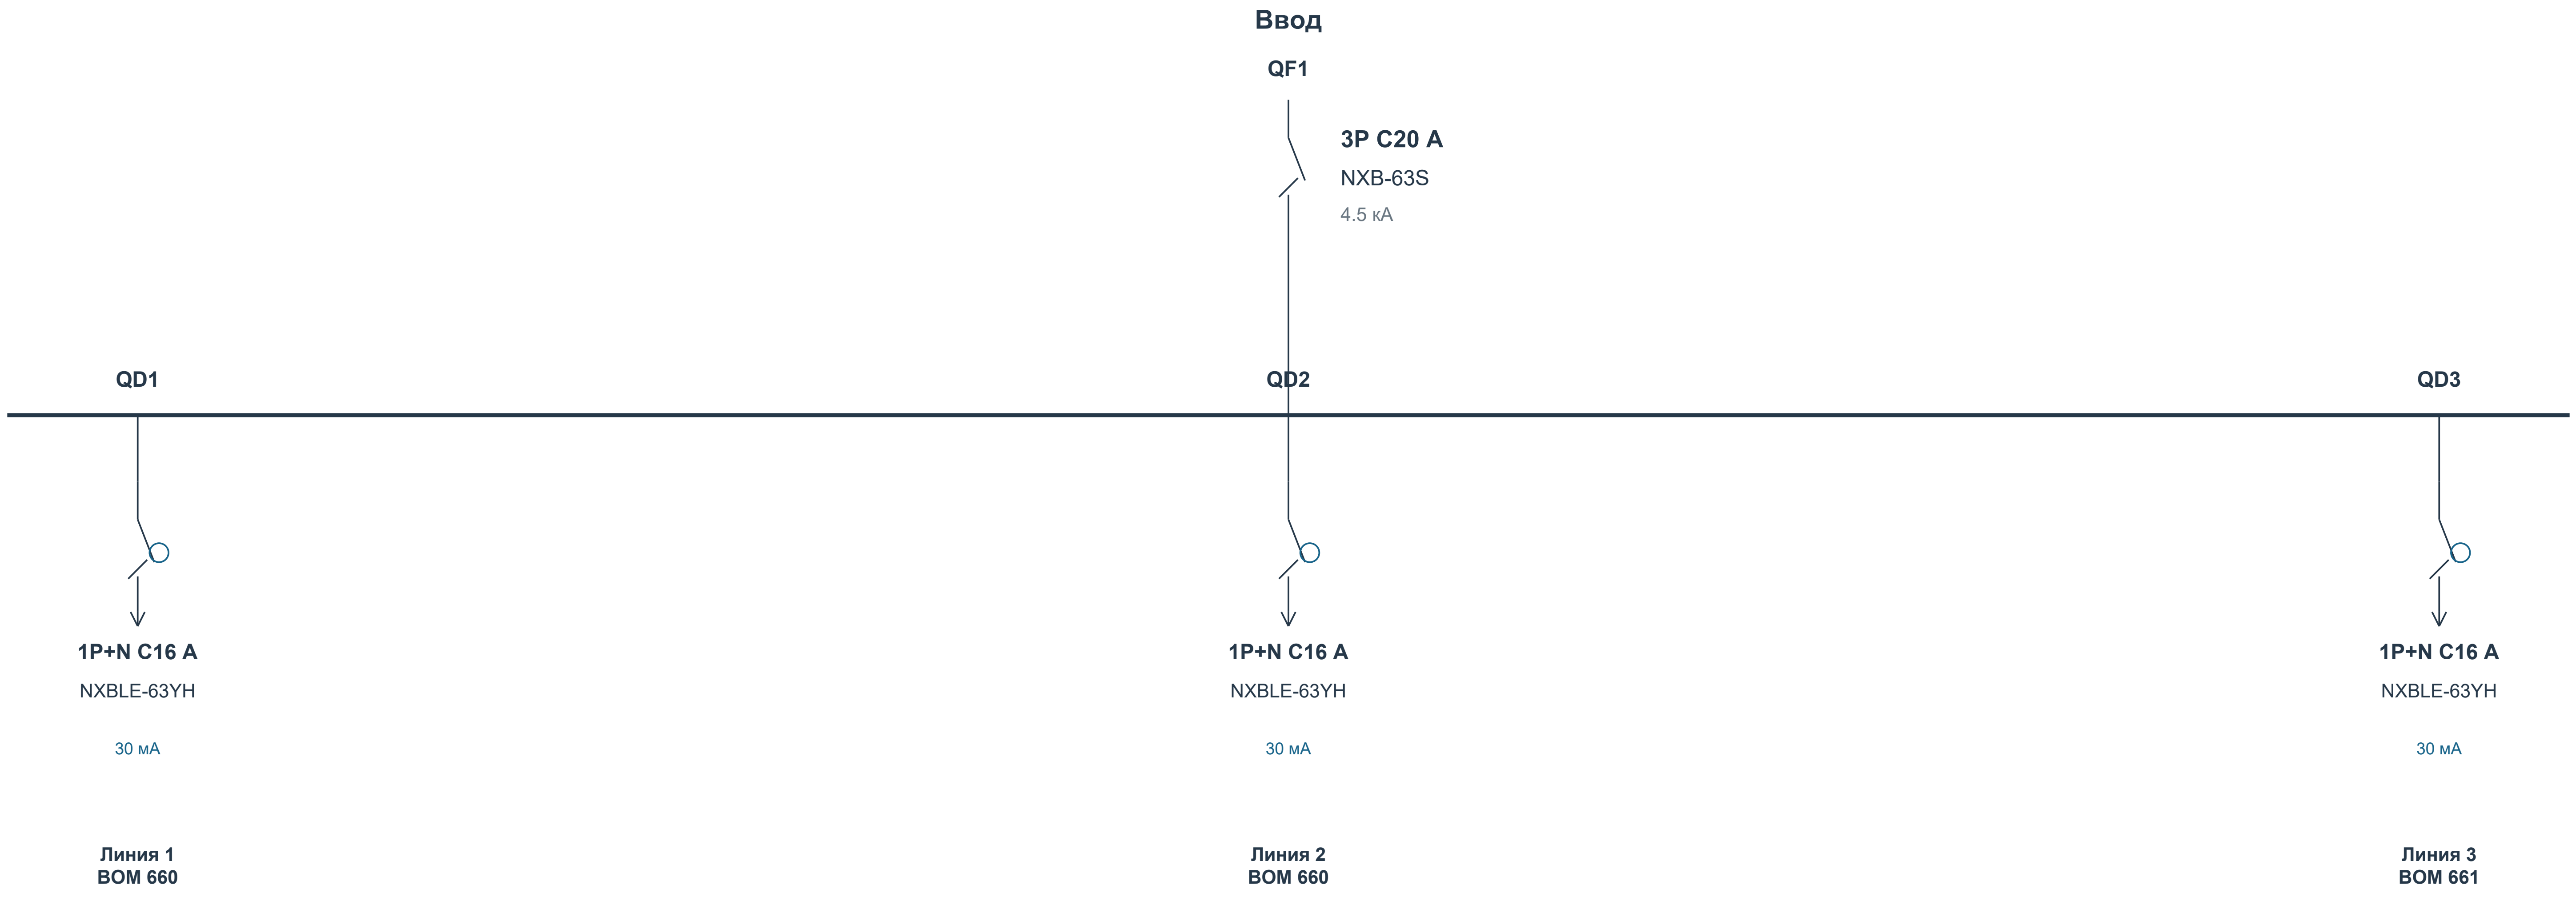
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 660
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 660
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 661

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 2.9 кВт | Рр 2,3 кВт | Iр 3,7 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

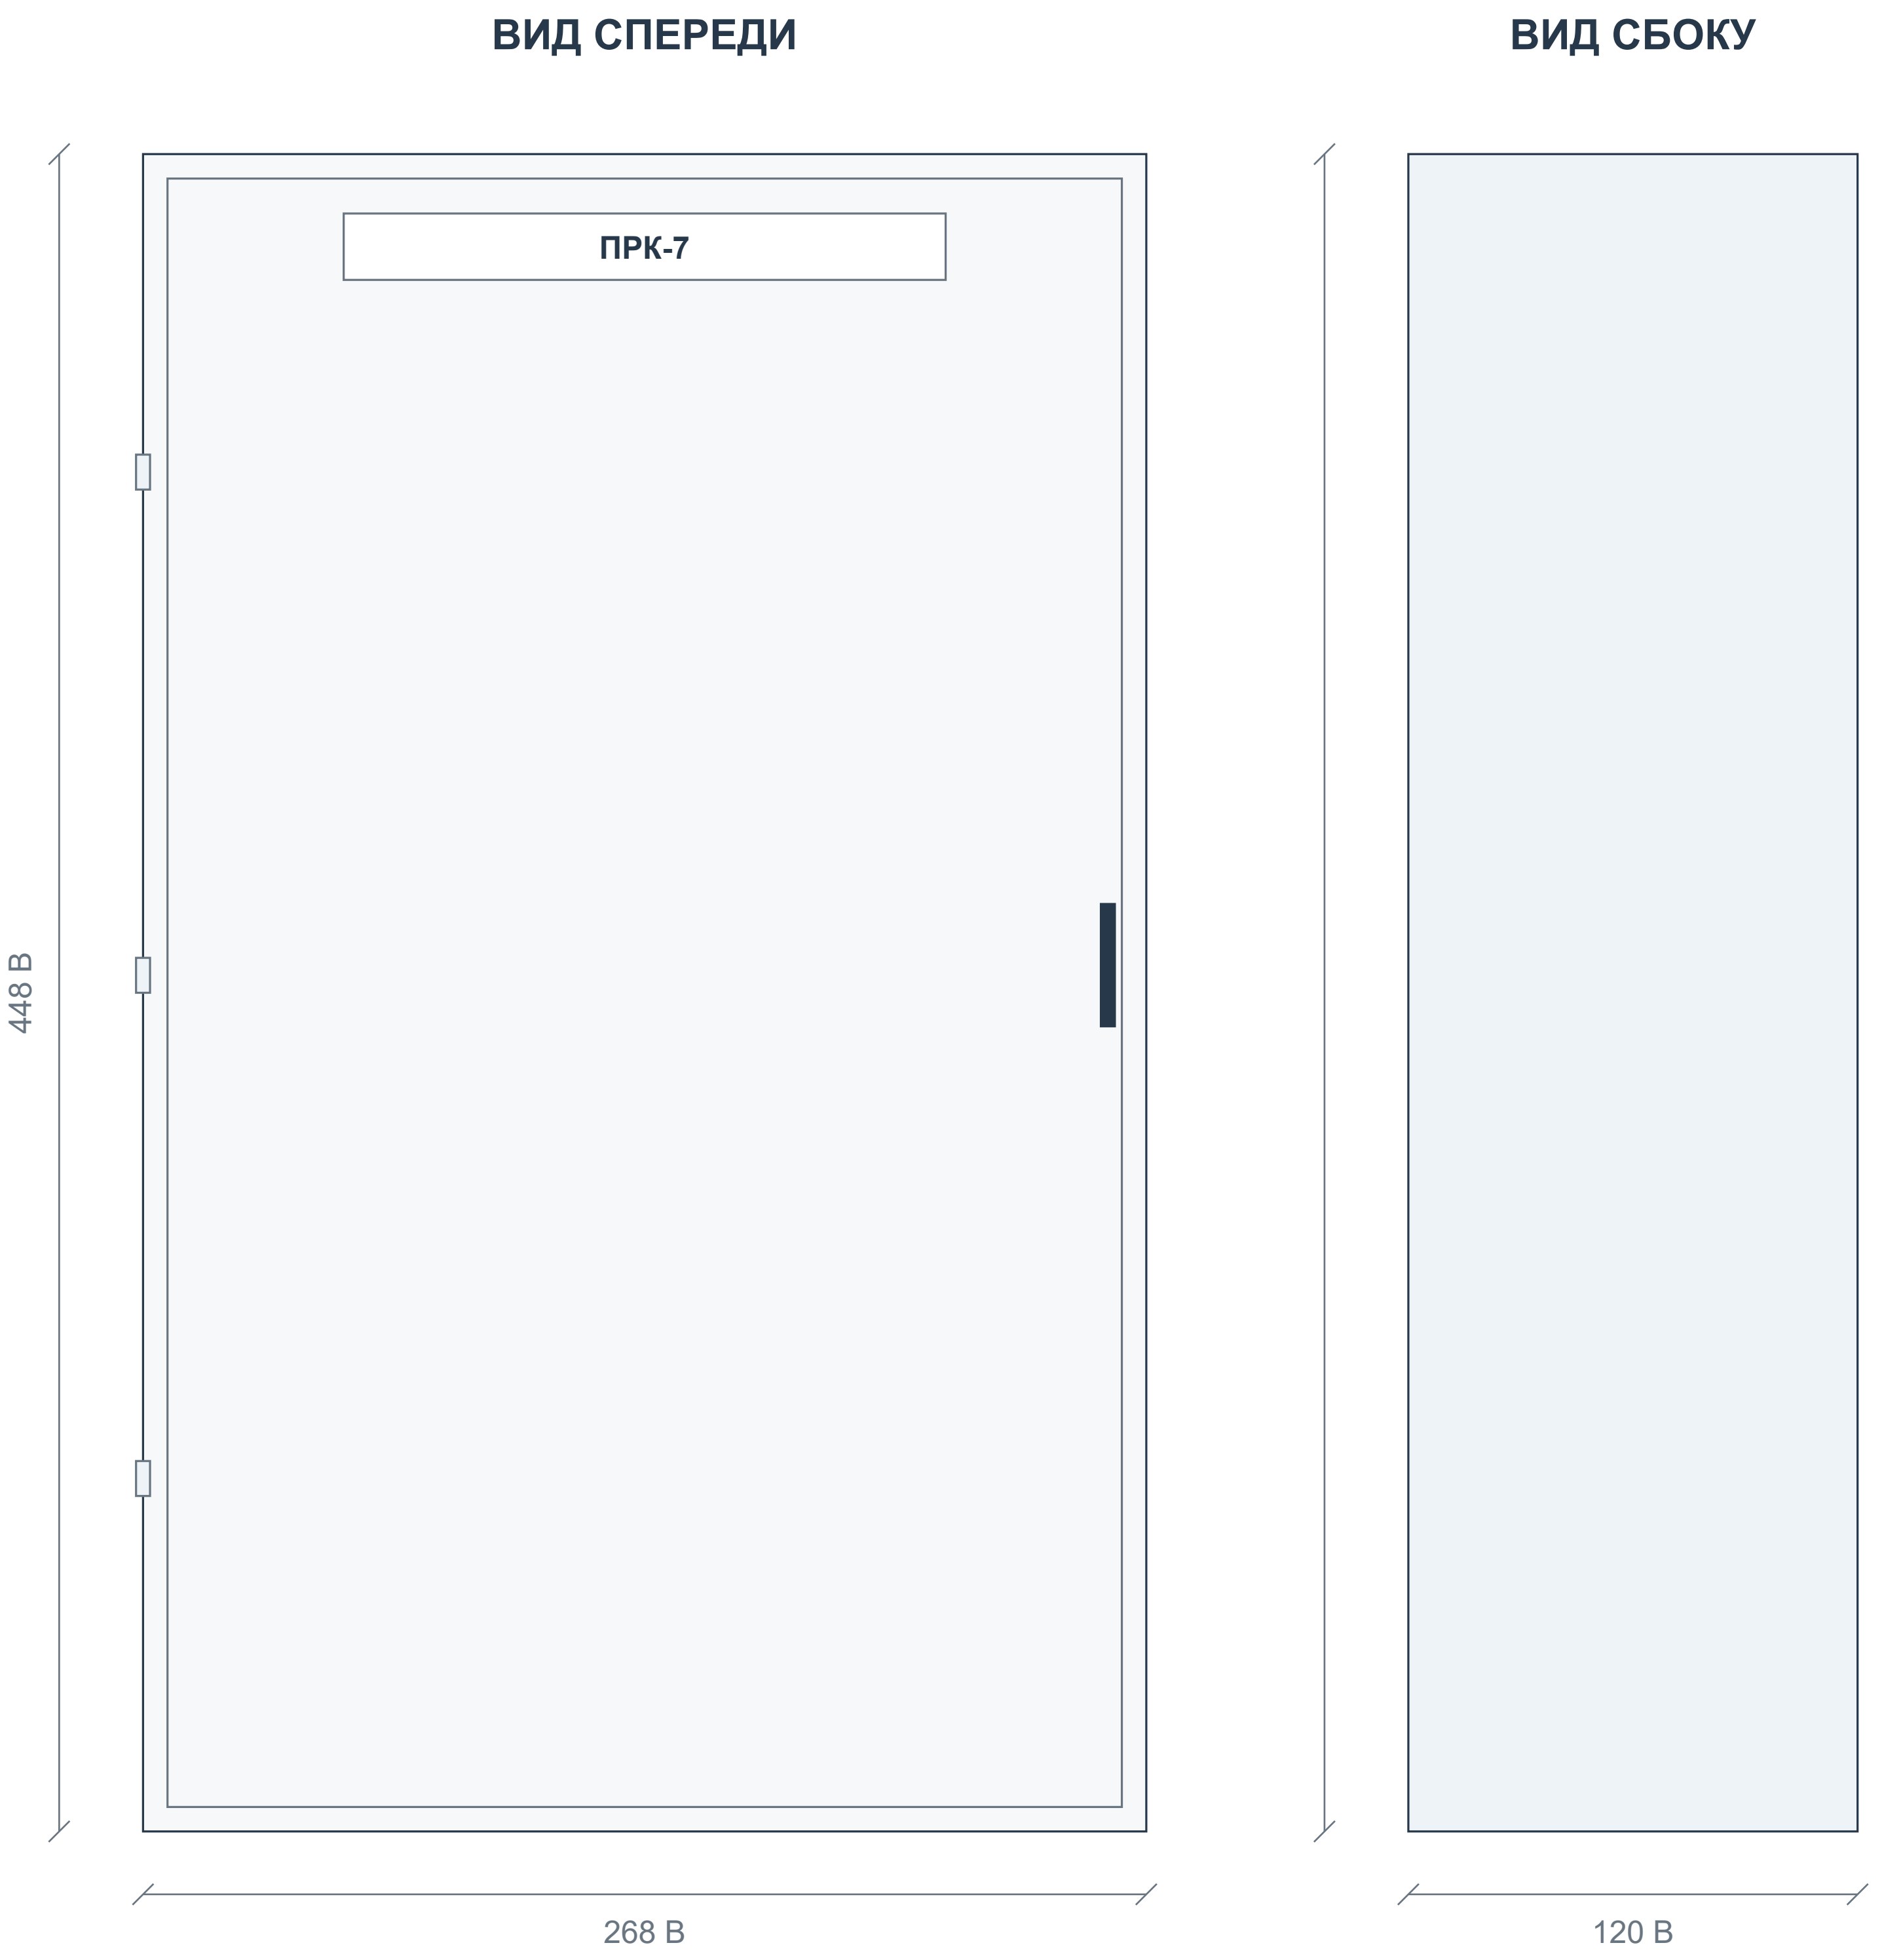

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

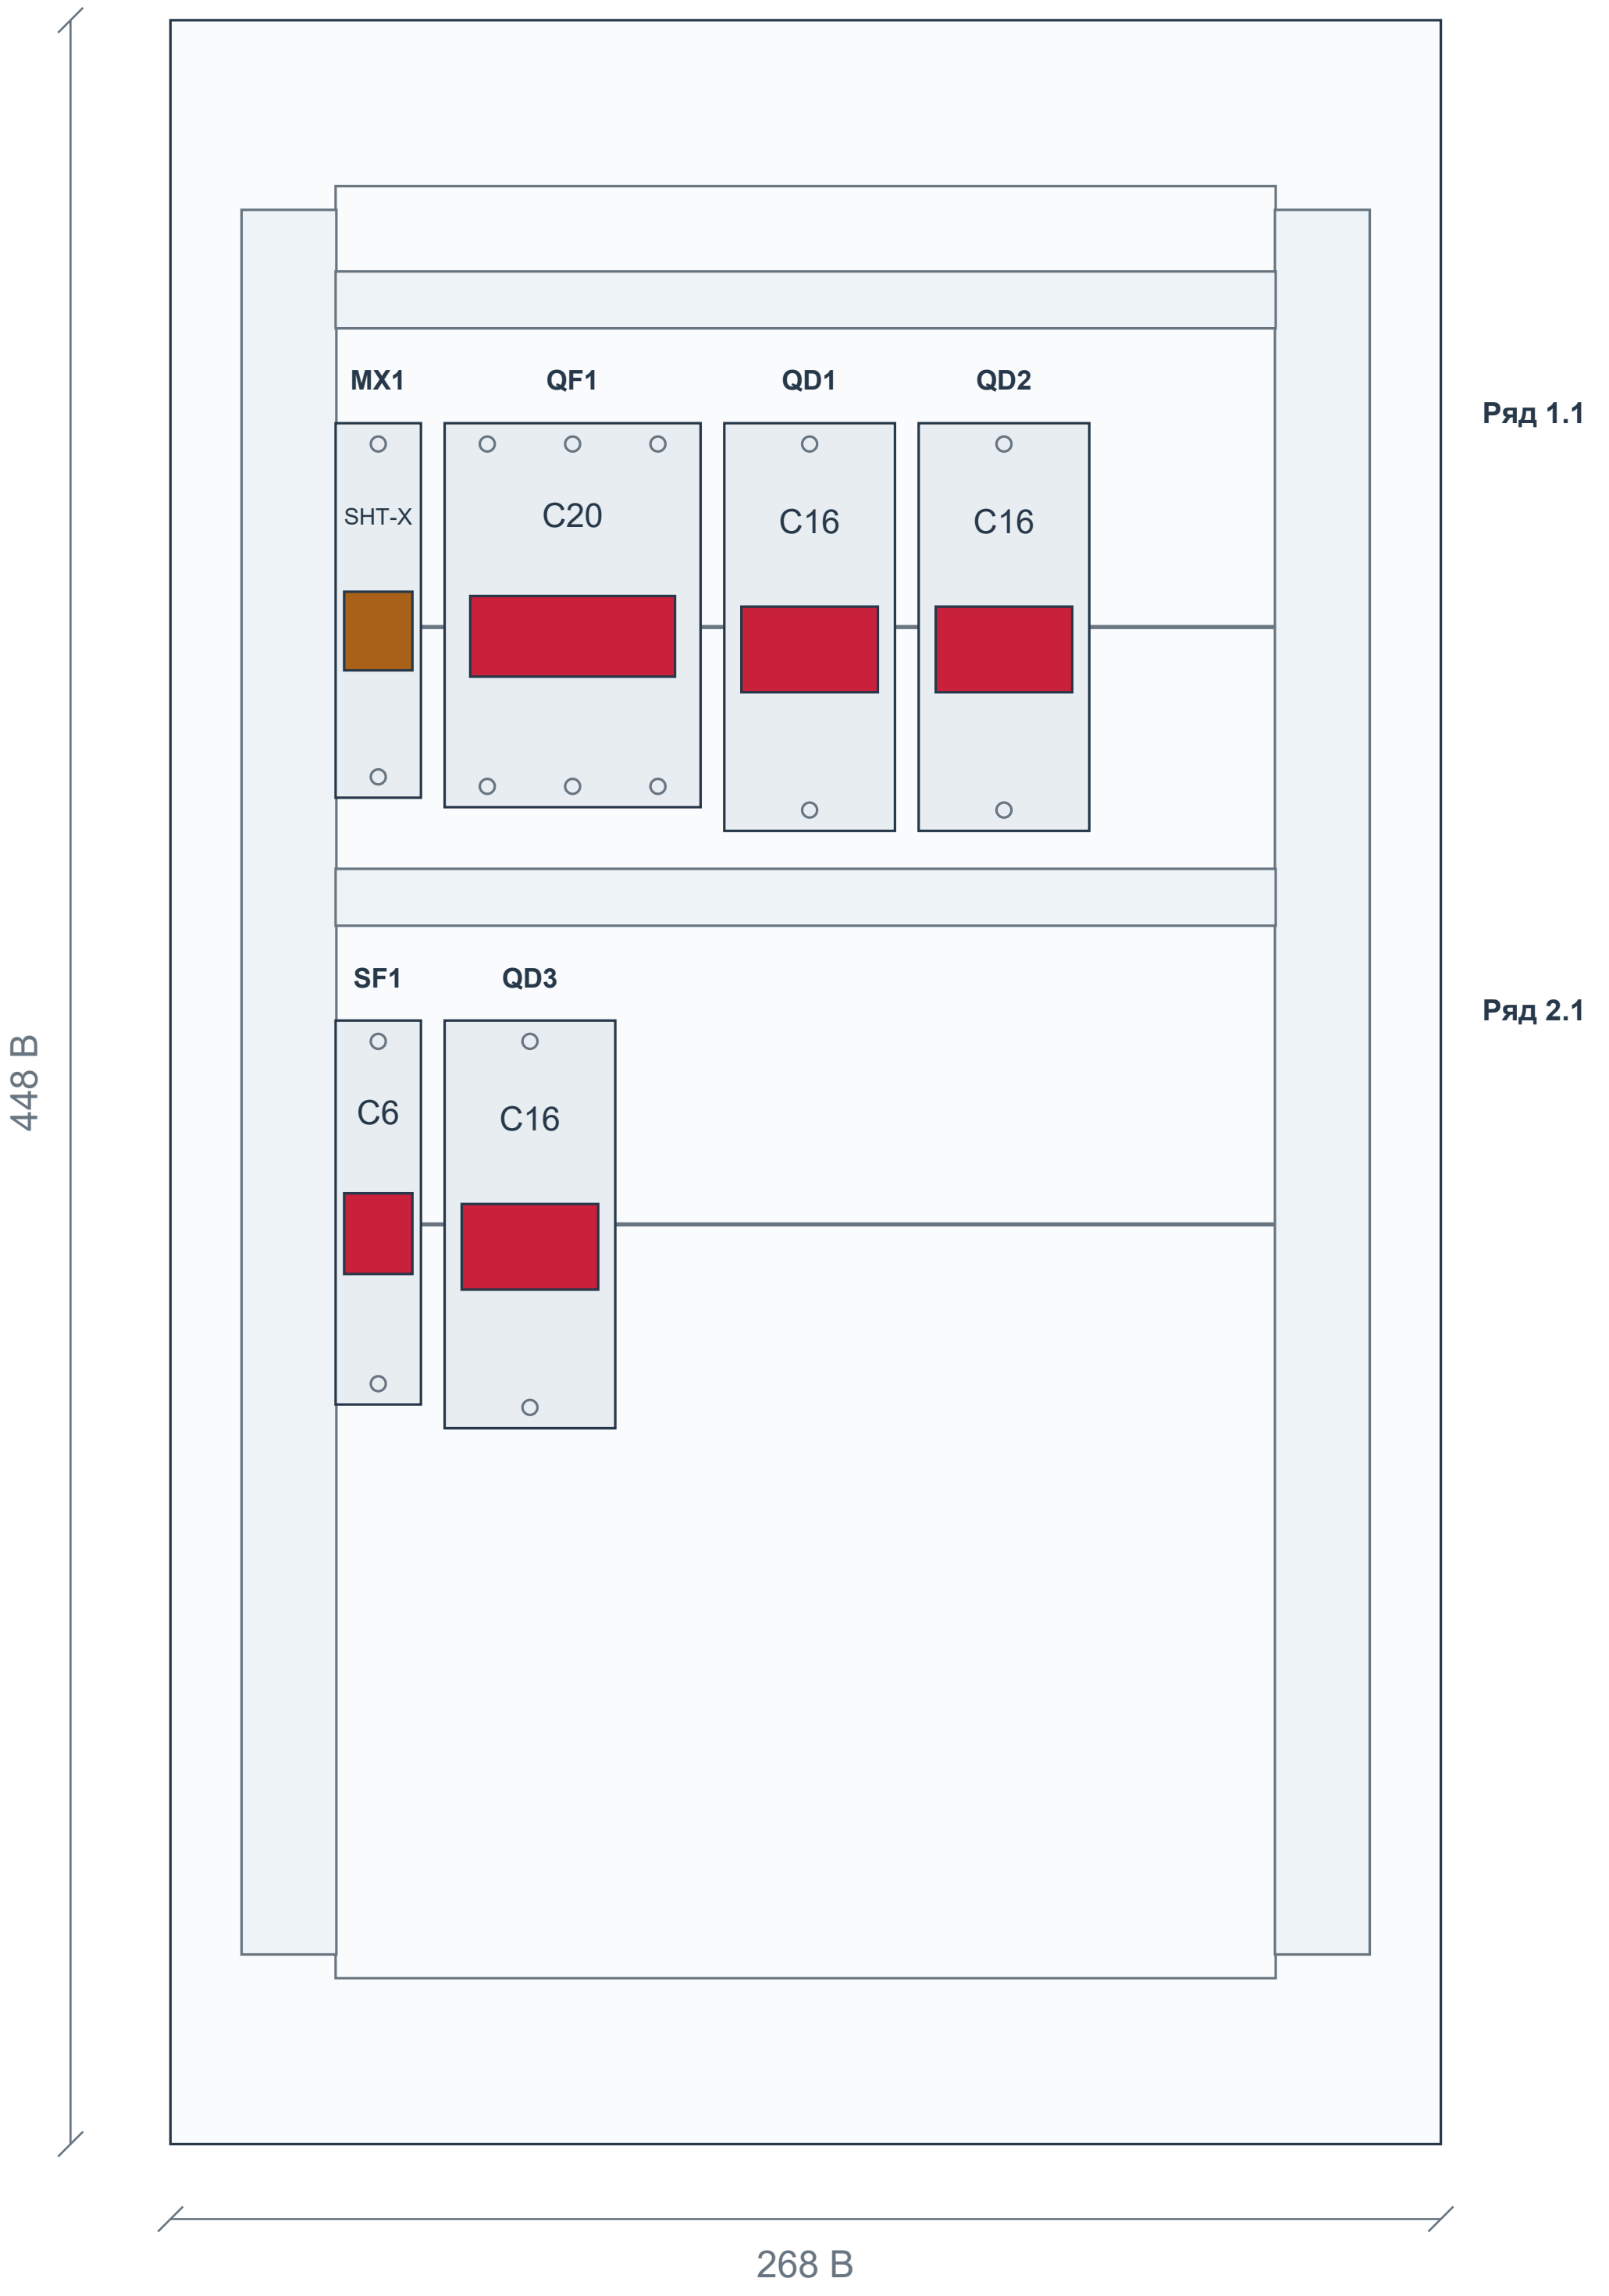

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	657	1.1	34.84	85	18 × 79
QF1	NXB-63S	658	1.1	57.84	85	54 × 81
SF1	NXB-63S	659	2.1	34.84	211	18 × 81
QD1 - QD2	NXBLE-63YH	660	1.1	116.84...157.84	85	36 × 86
QD3	NXBLE-63YH	661	2.1	57.84	211	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Актуальная спецификация

ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 678 | ЭОМ, PDF стр. 37

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
679	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
680	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
681	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
682	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
683	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
684	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 37

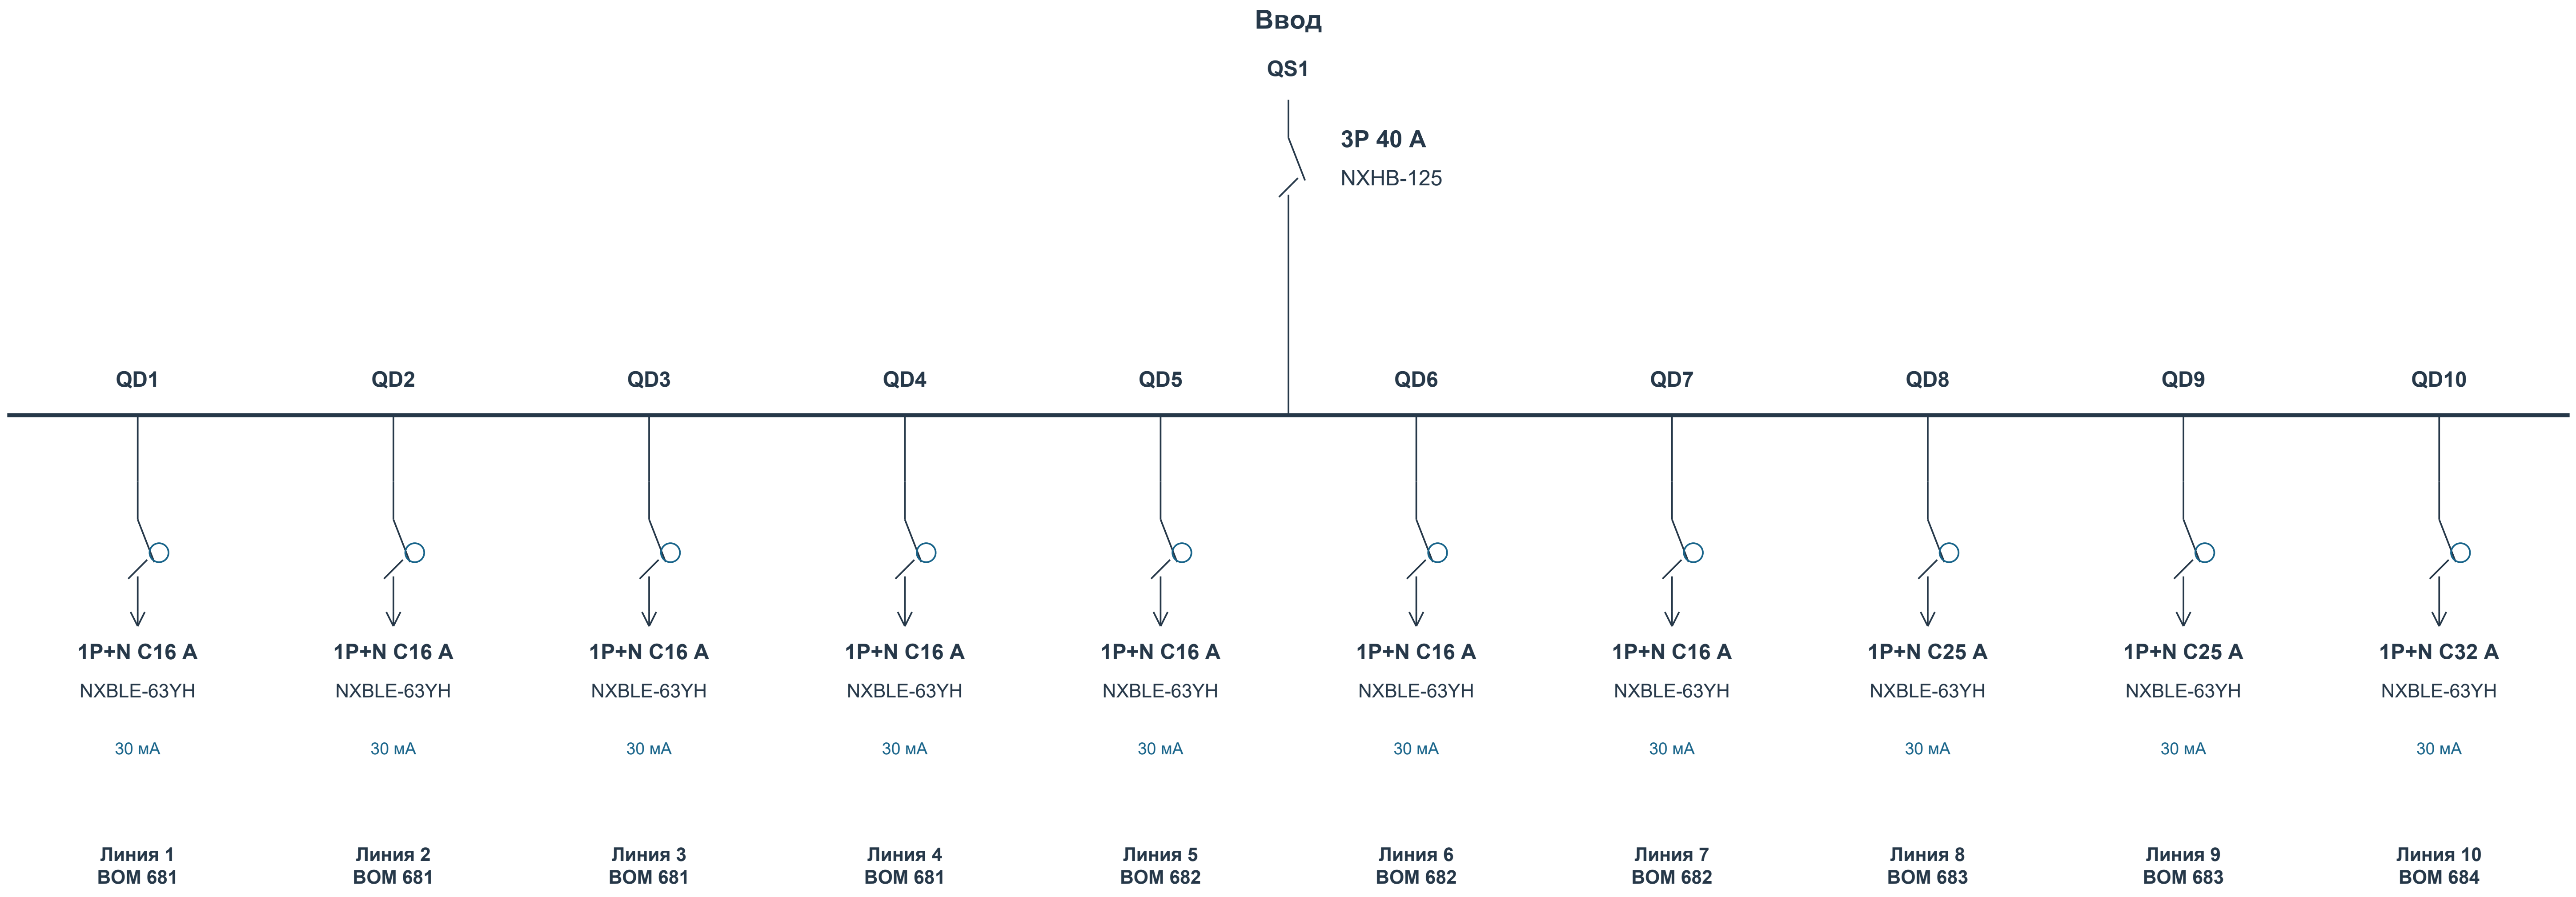
Ввод
QS1
3P 40 A
NXHB-125
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
QD9
QD10
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 681
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 681
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 681
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 681
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 682
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 682
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 682
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 683
1P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 9
BOM 683
1P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 10
BOM 684

Данные исходного проекта: Ру 20.5 кВт | Рр 4,0 кВт | Ip 19,1 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

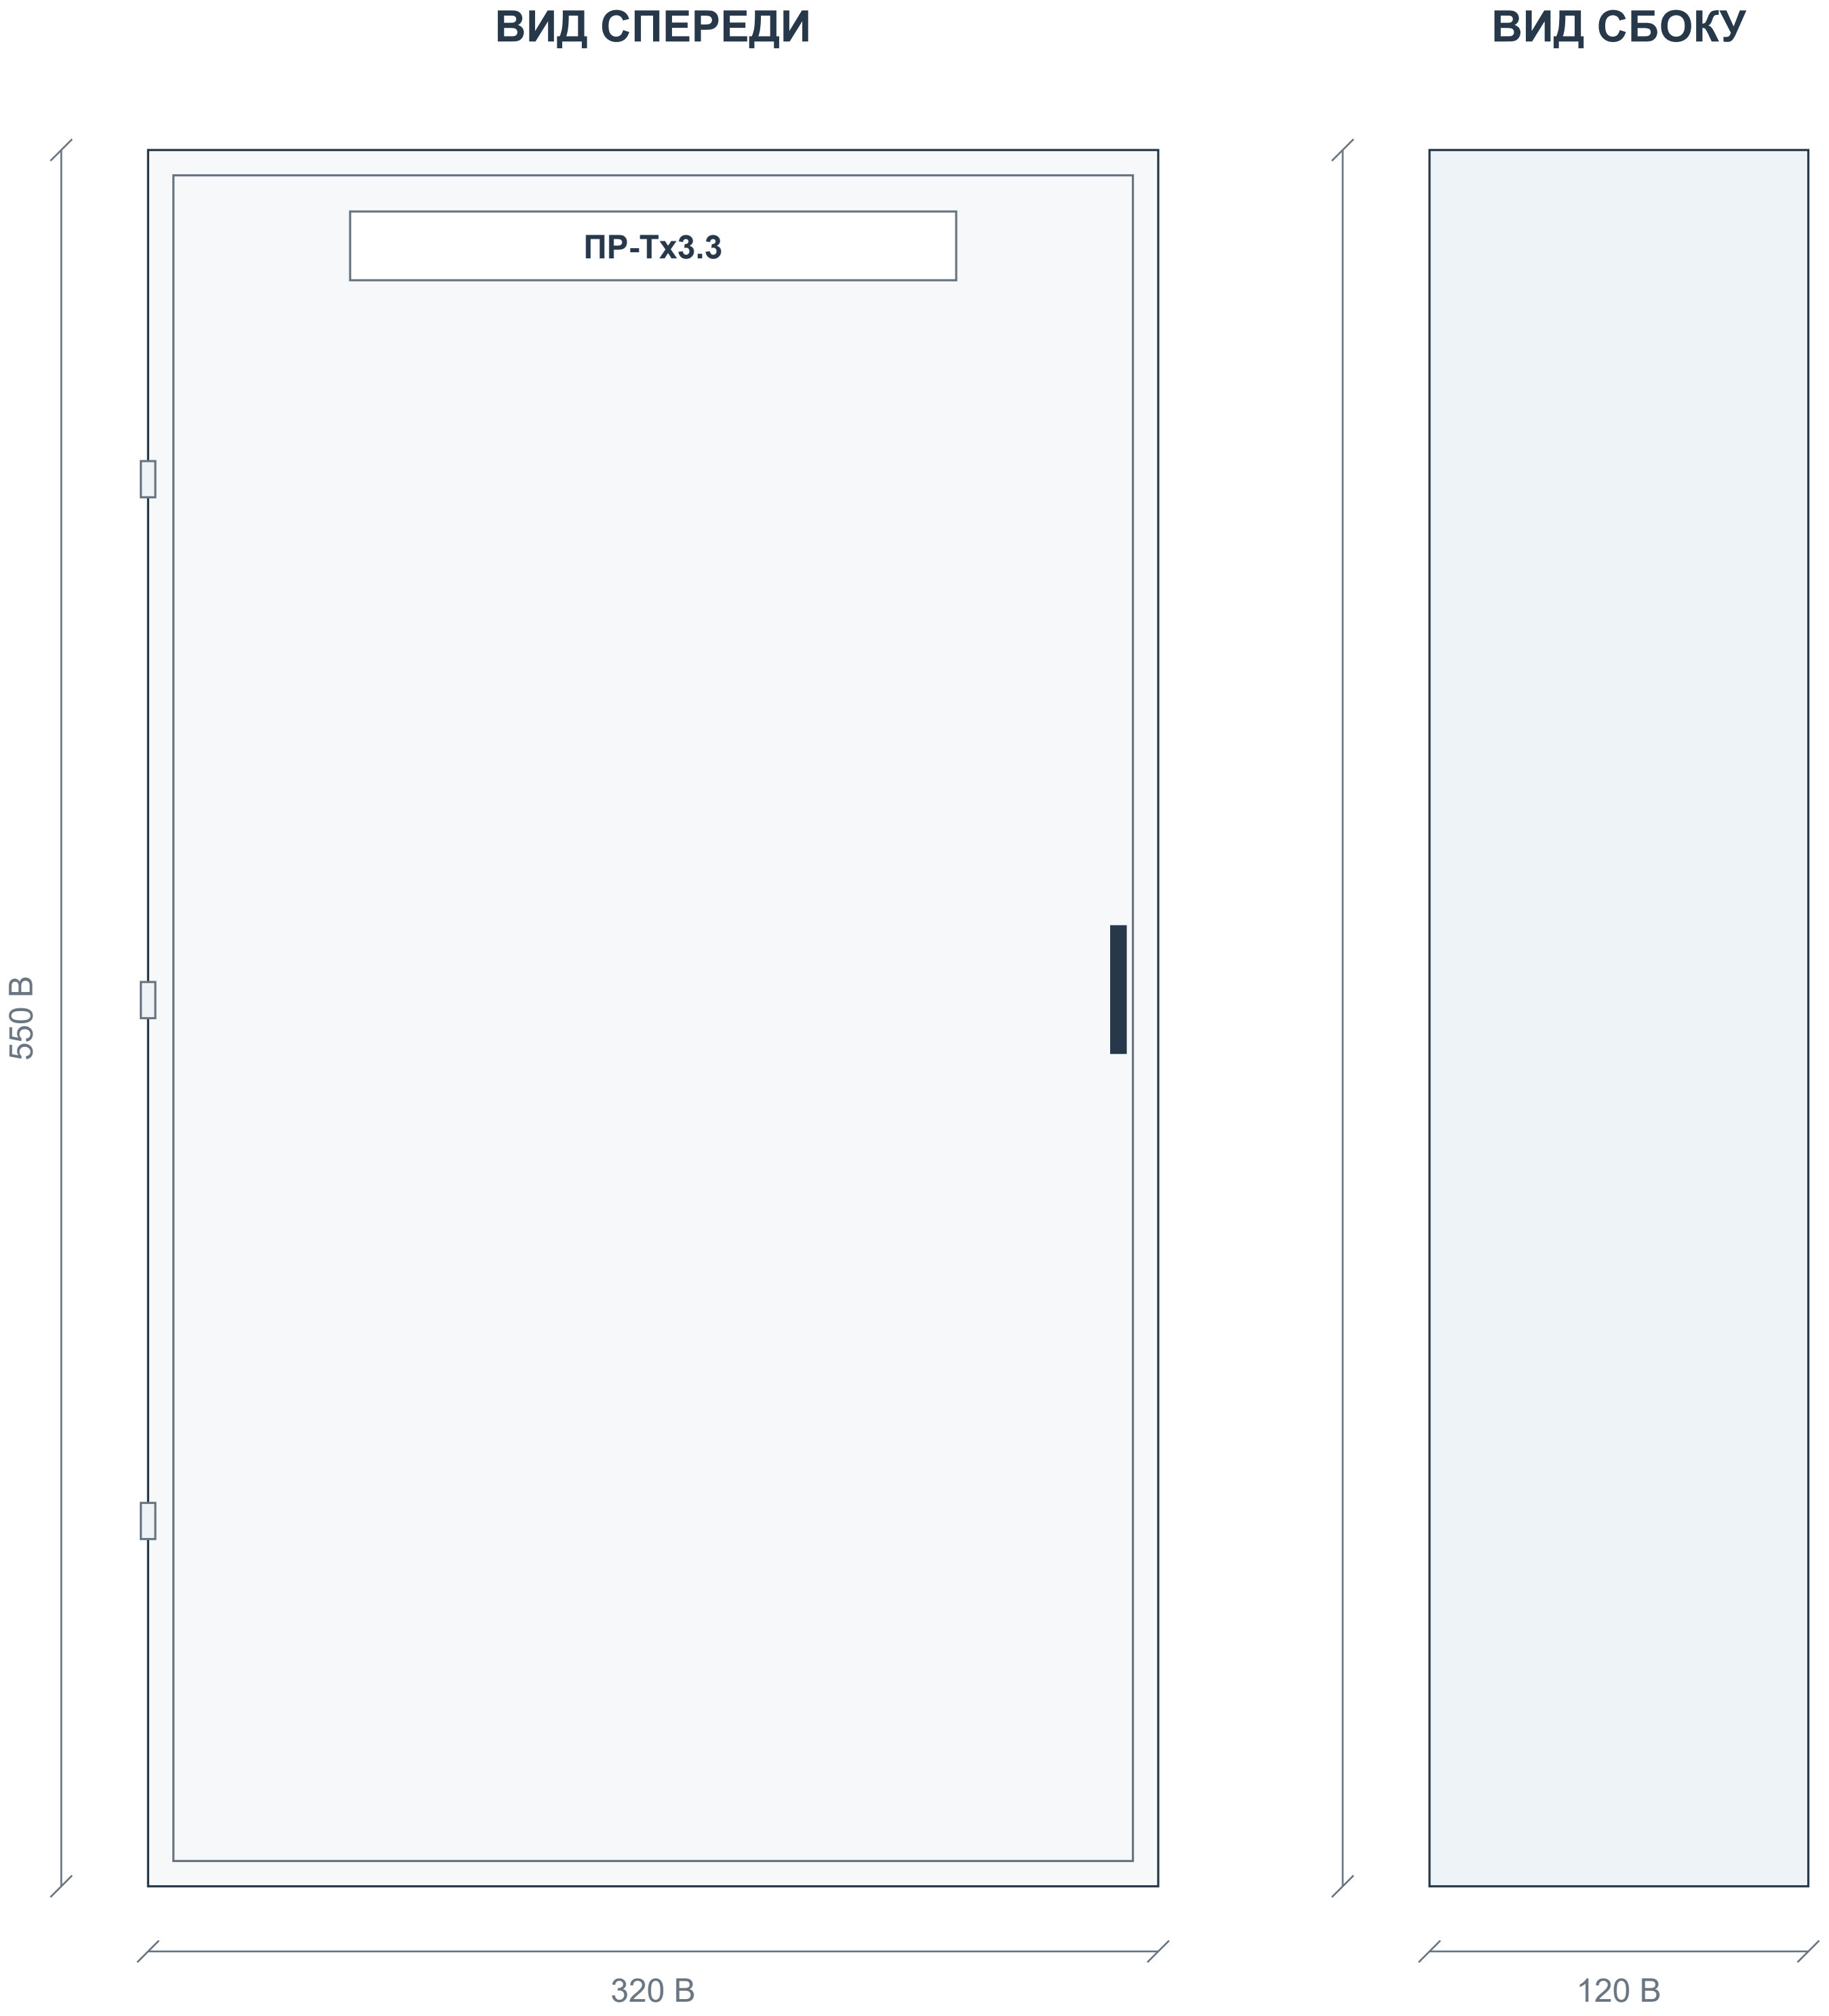

Корпус: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

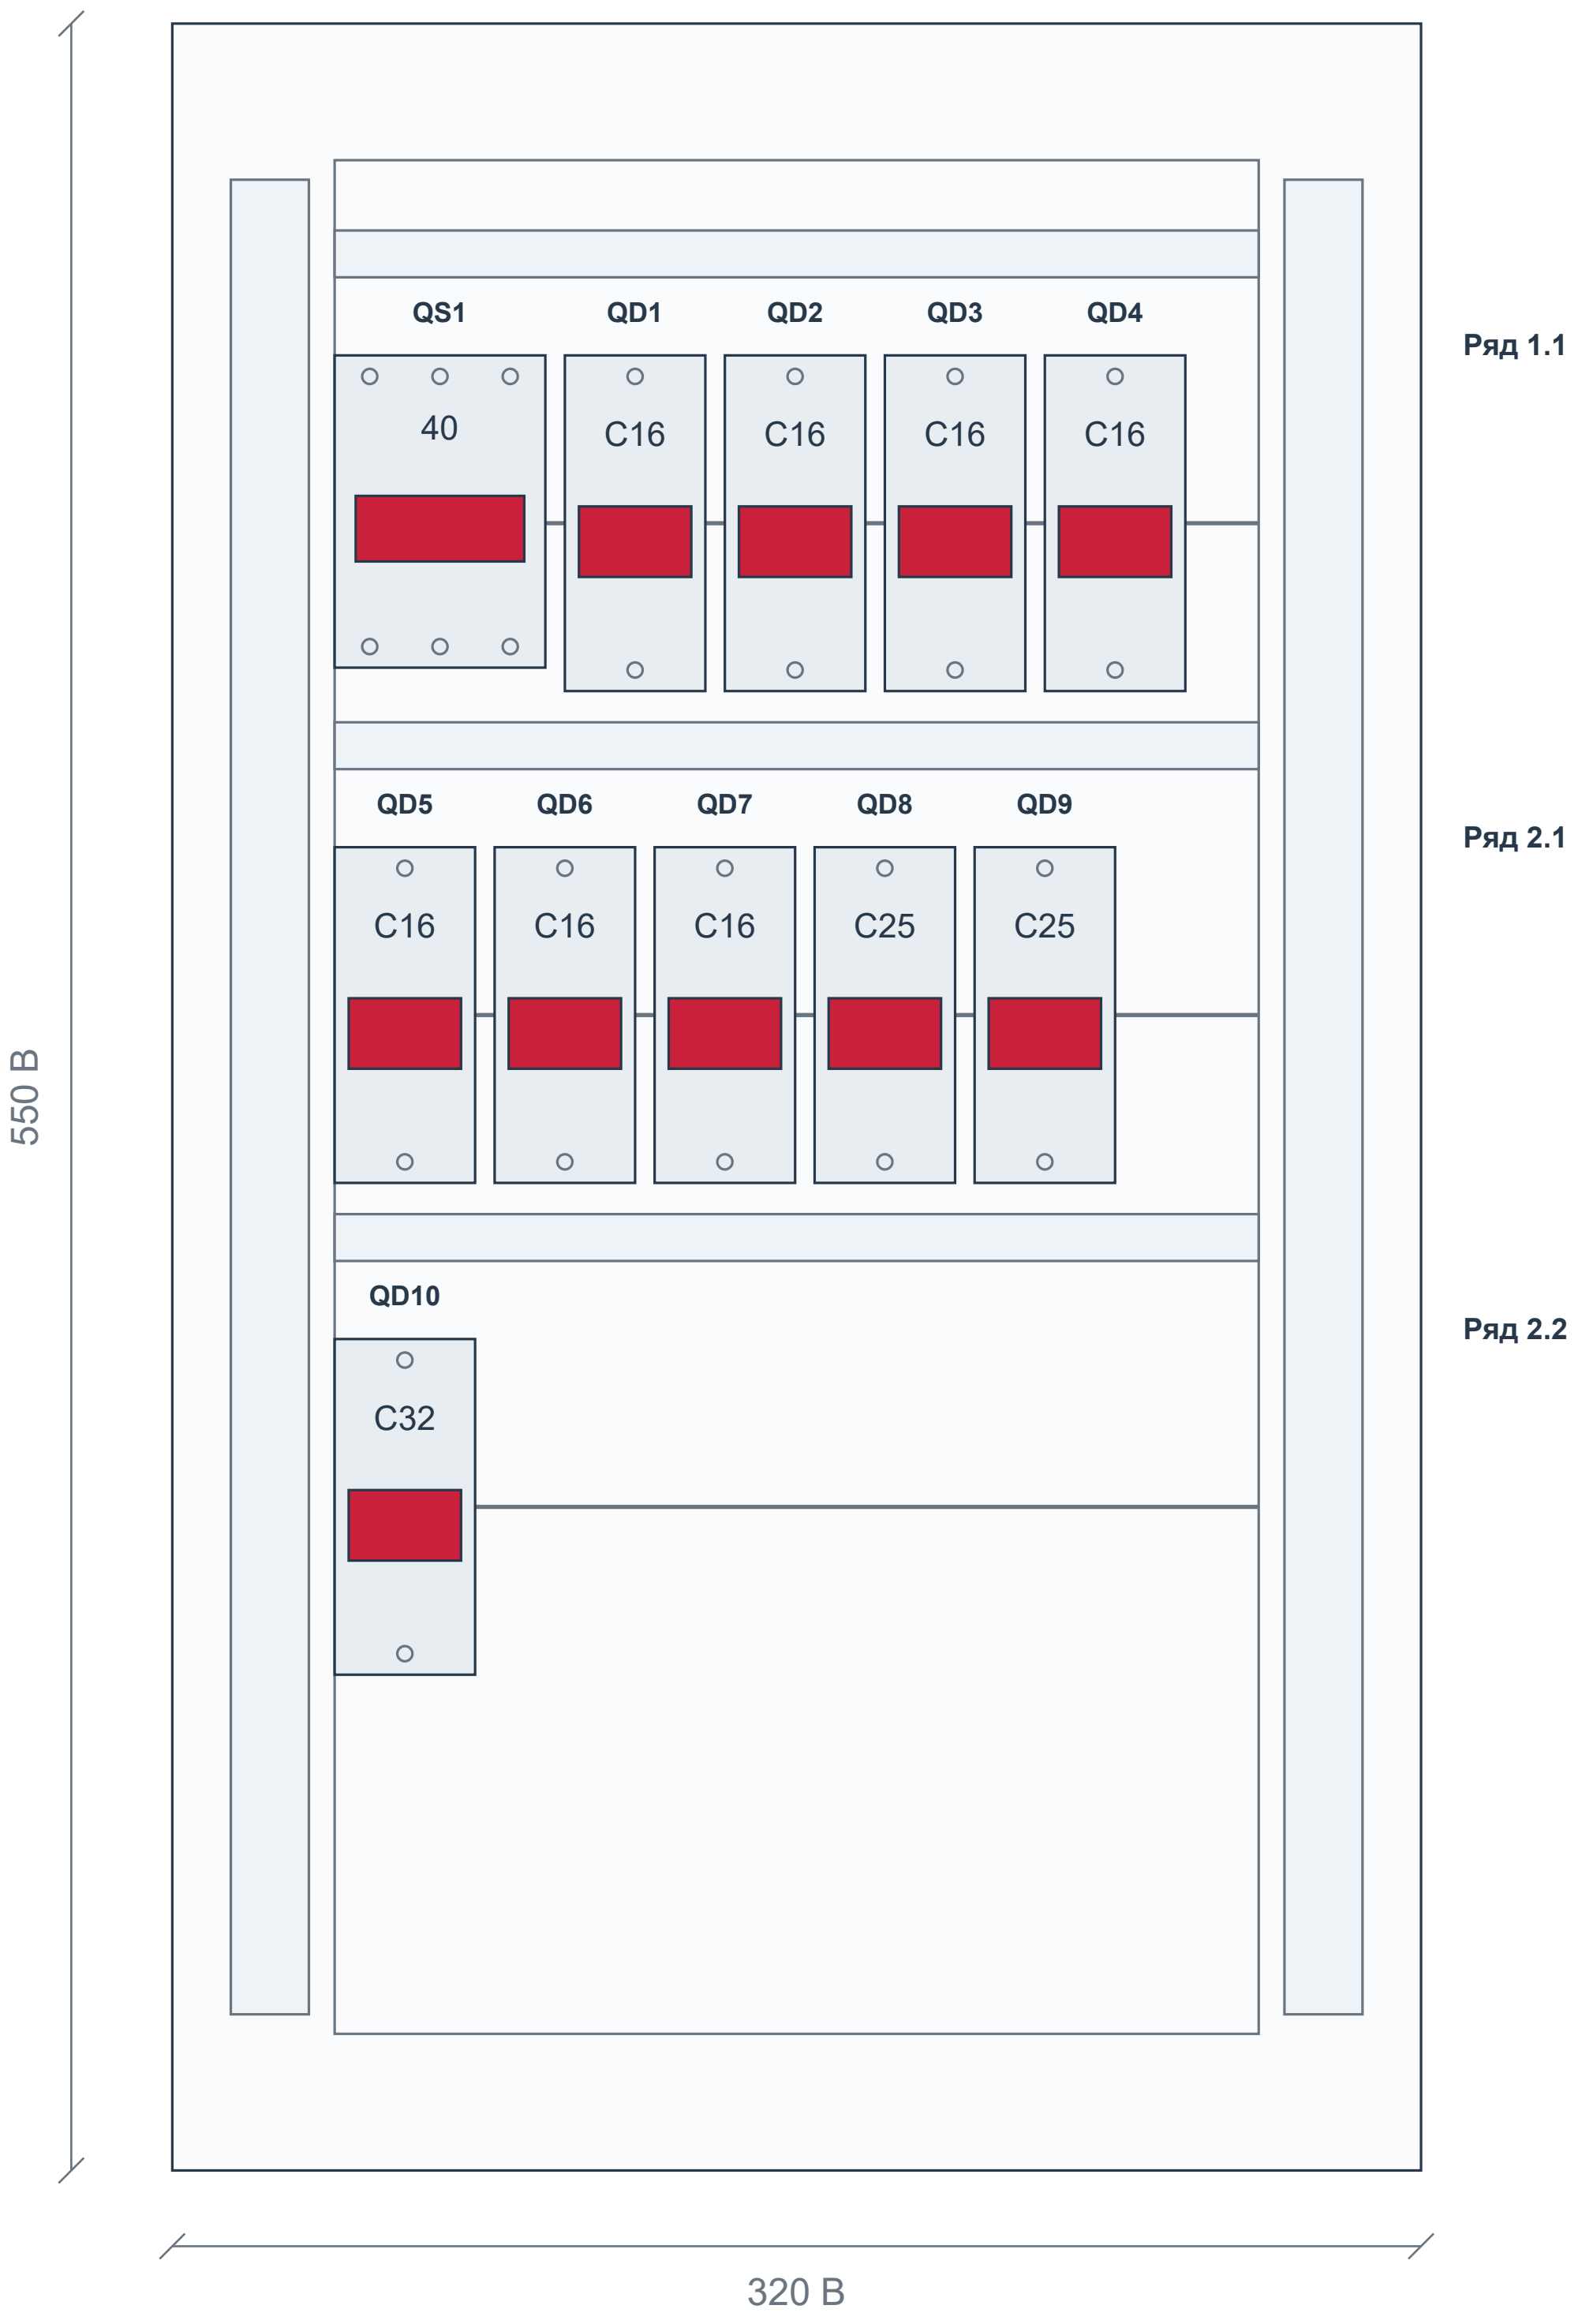

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	680	1.1	41.6	85	54 × 80
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	681	1.1	100.6...223.6	85	36 × 86
QD5 - QD7	NXBLE-63YH	682	2.1	41.6...123.6	211	36 × 86
QD8 - QD9	NXBLE-63YH	683	2.1	164.6...205.6	211	36 × 86
QD10	NXBLE-63YH	684	2.2	41.6	337	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Ряды с недостаточной шириной разделены на подряды. Новые расстояния и способ крепления согласовать.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Актуальная спецификация

ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 701 | ЭОМ, PDF стр. 38

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
702	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
703	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
704	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
705	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
706	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 38

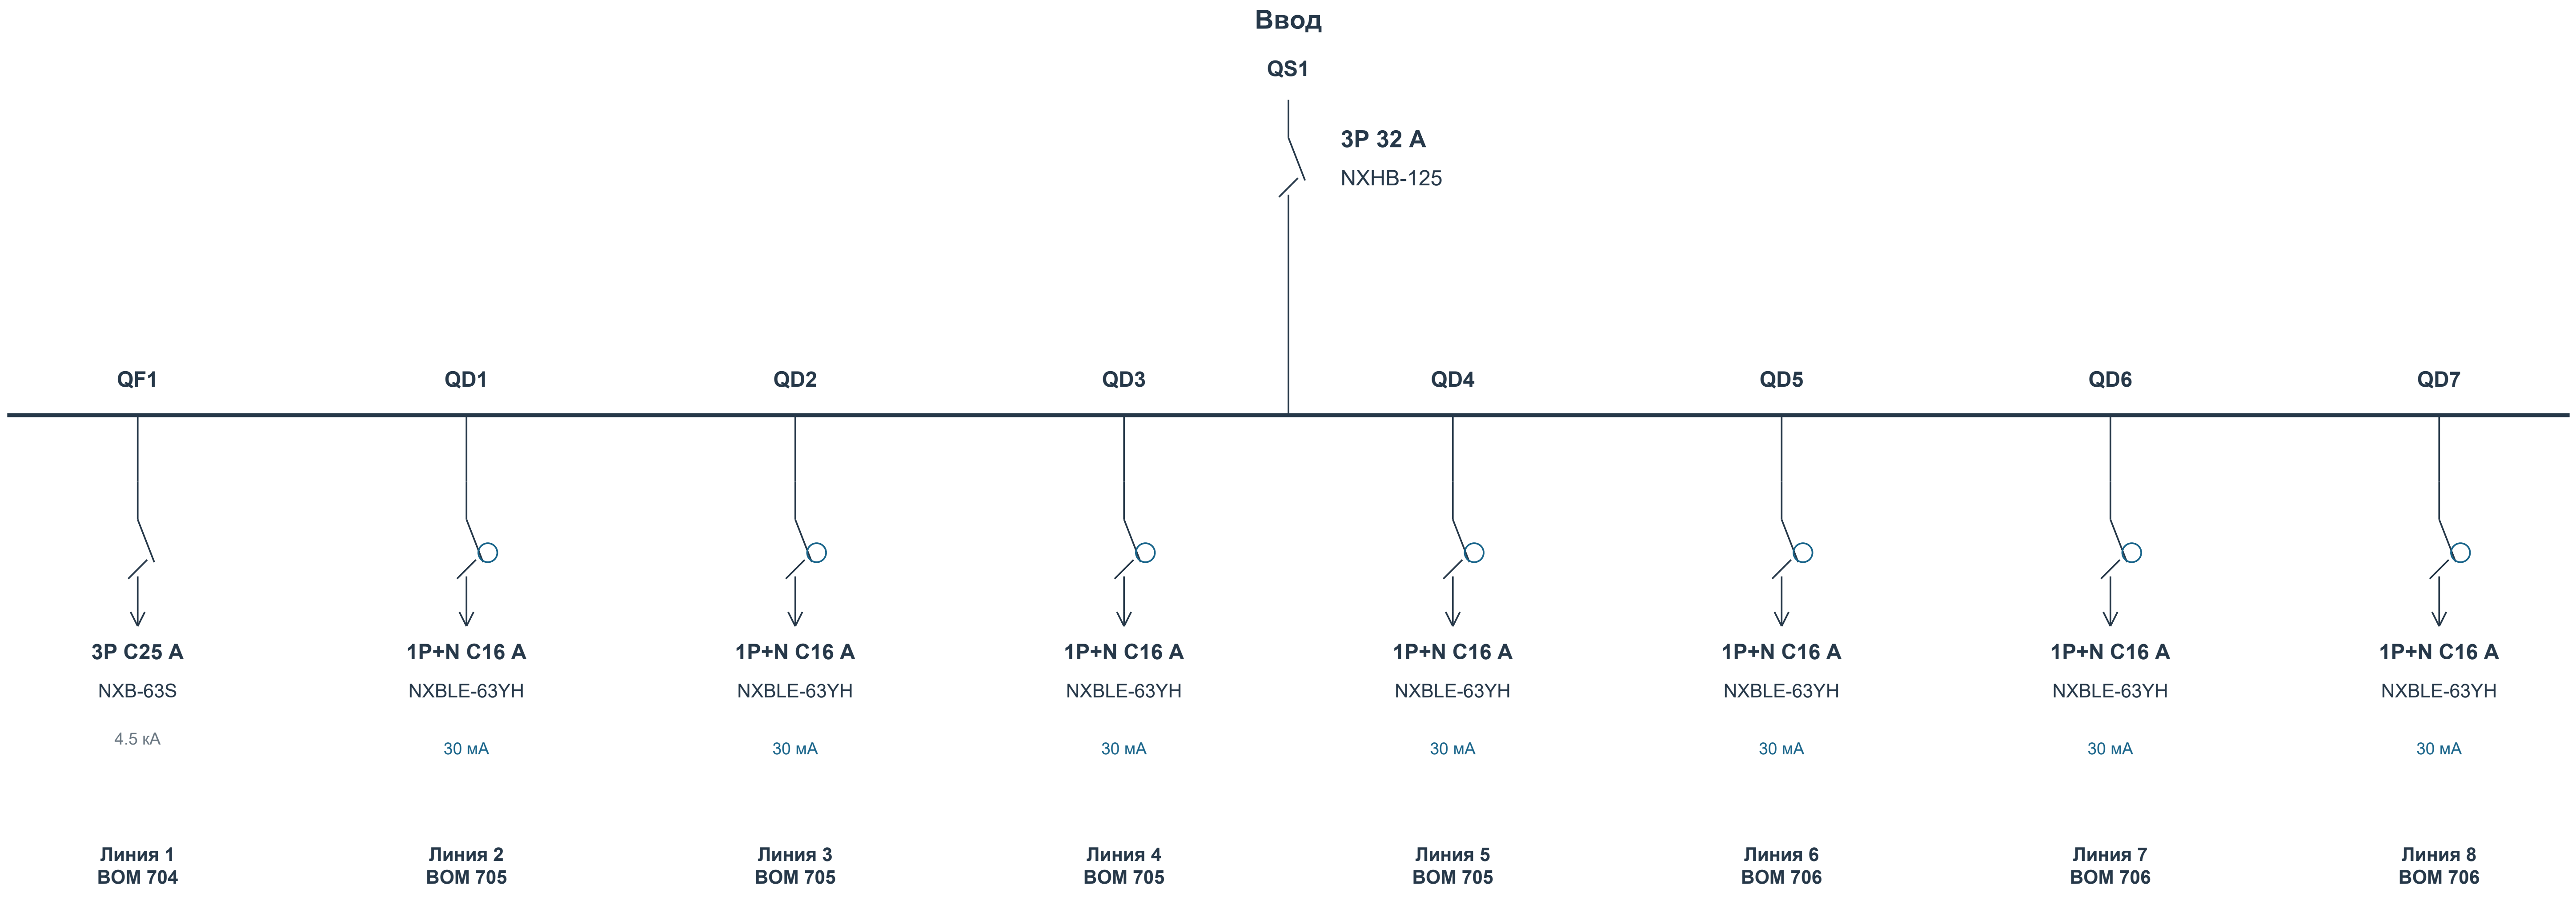
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 704
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 705
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 705
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 705
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 705
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 706
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 706
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 706

Данные исходного проекта: Ру 9.0 кВт | Рр 5,5 кВт | Ip 8,8 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

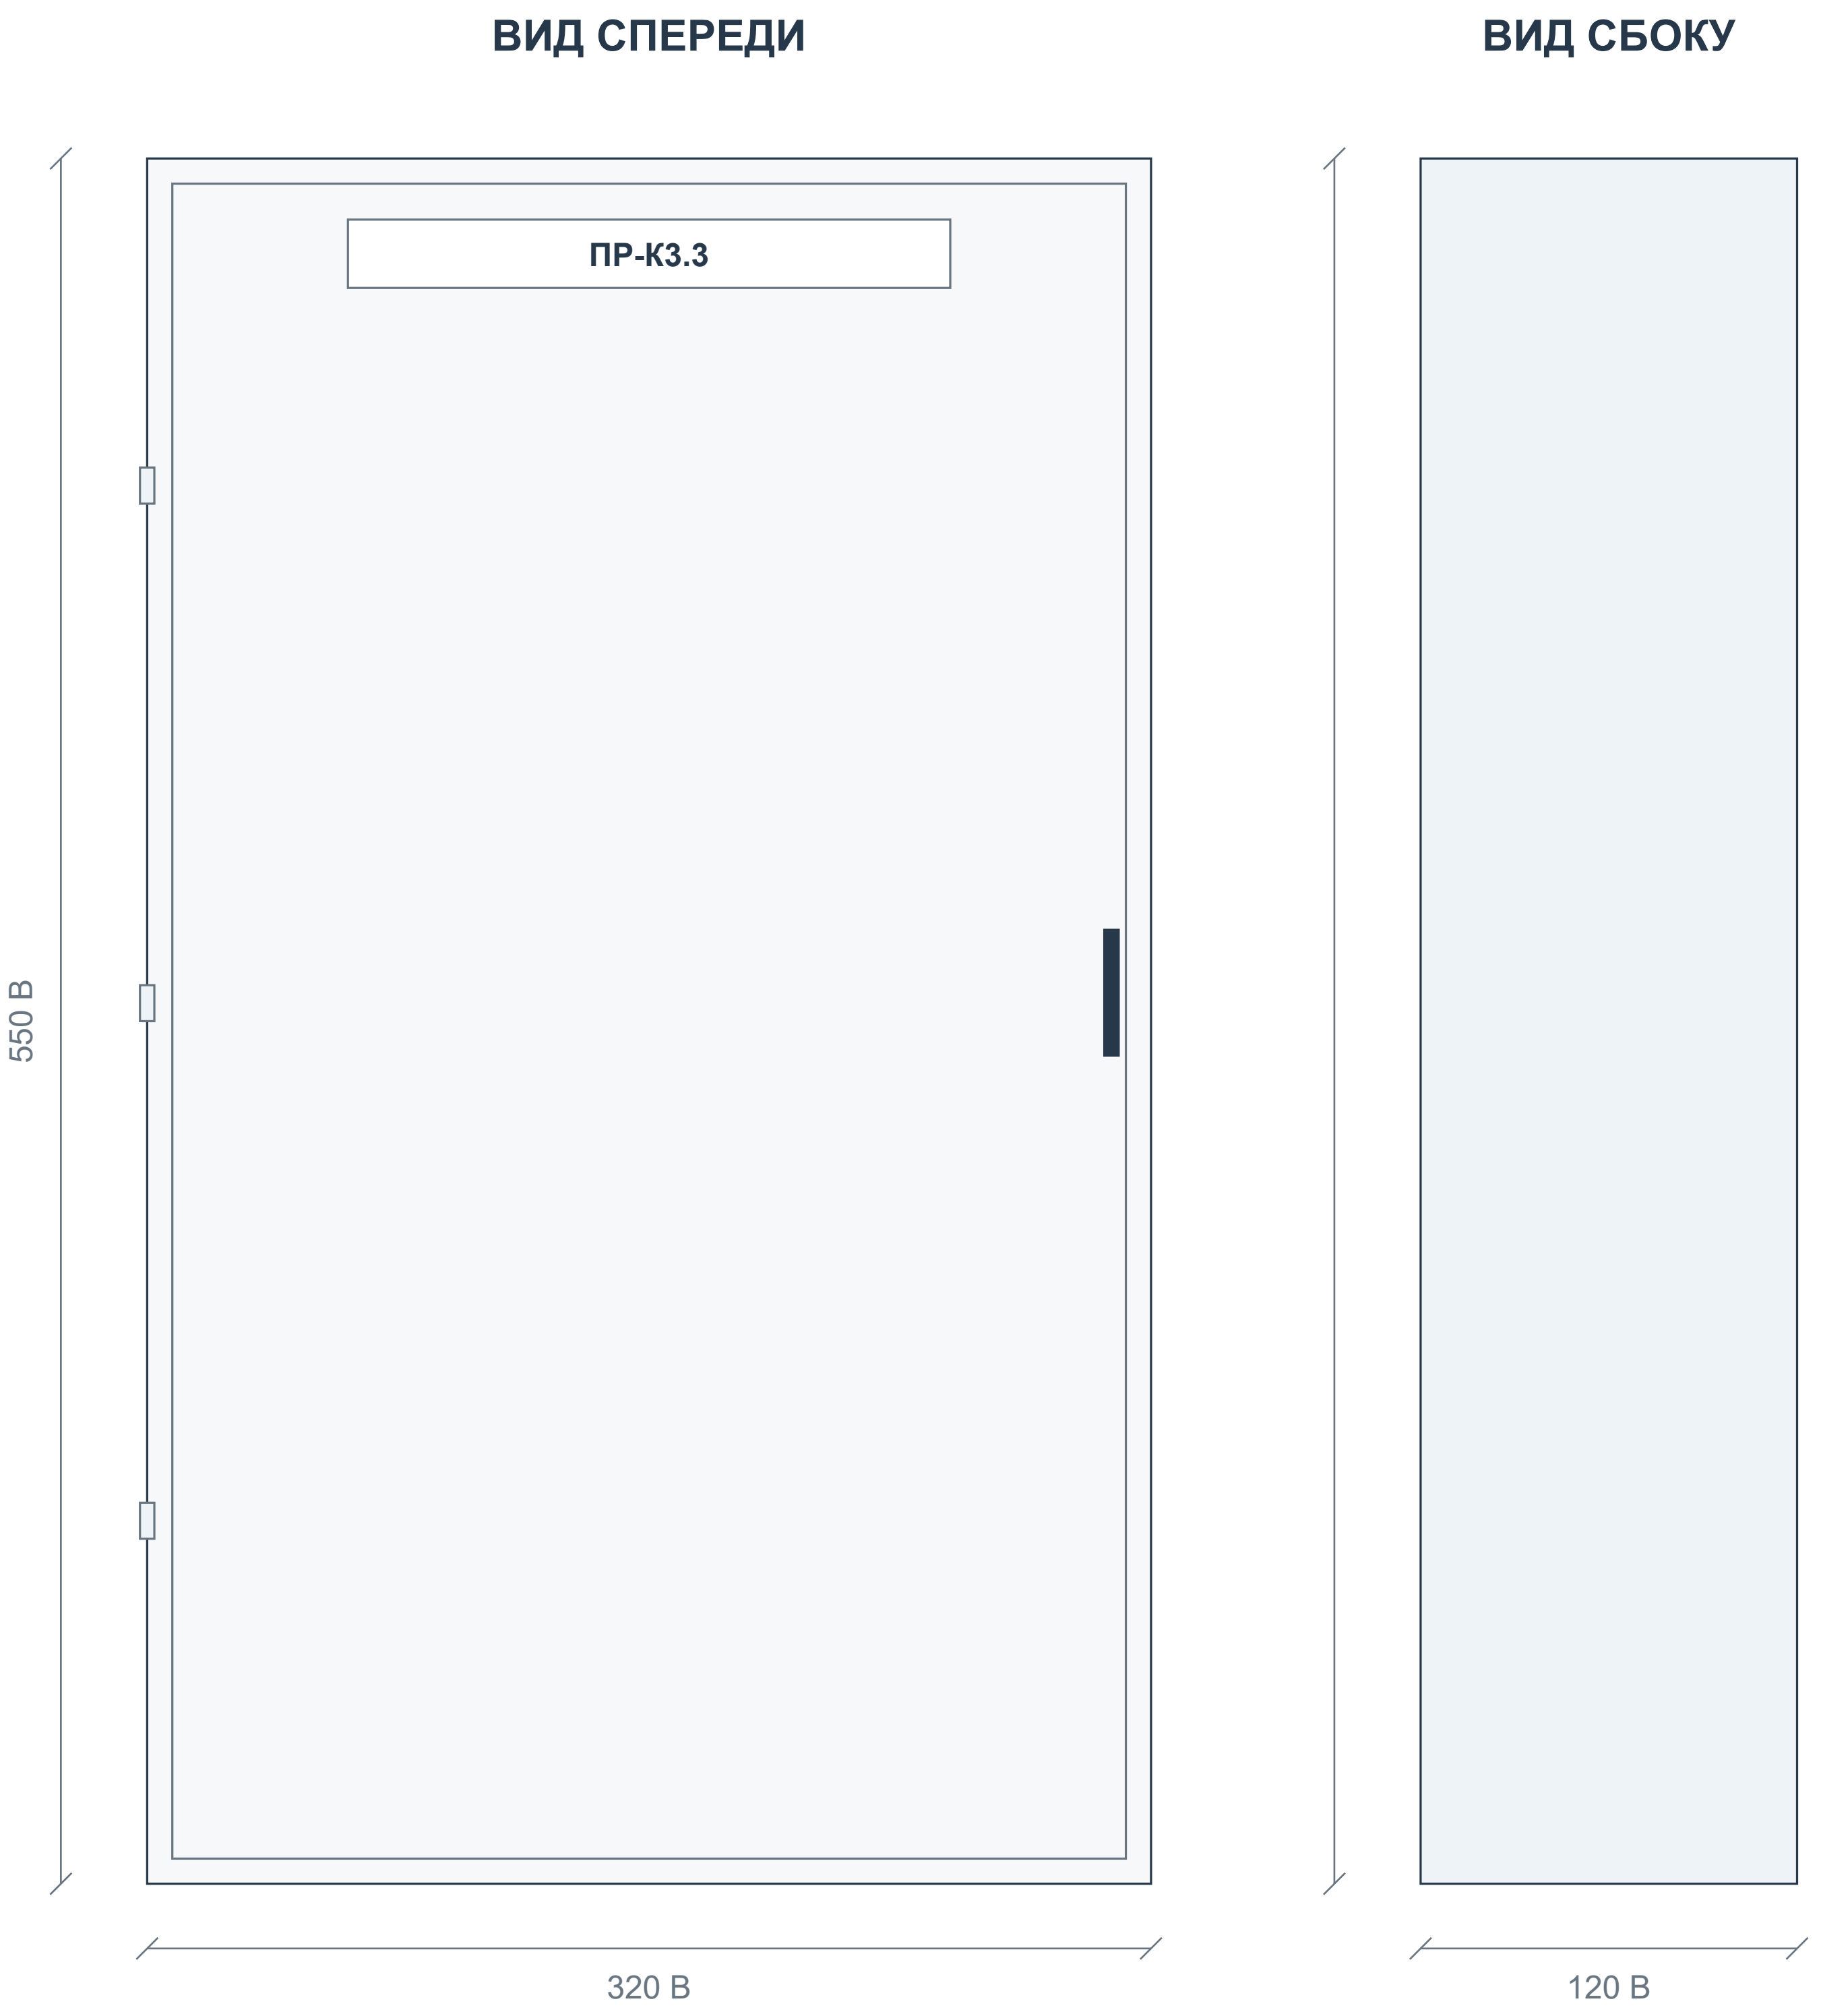

Корпус: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

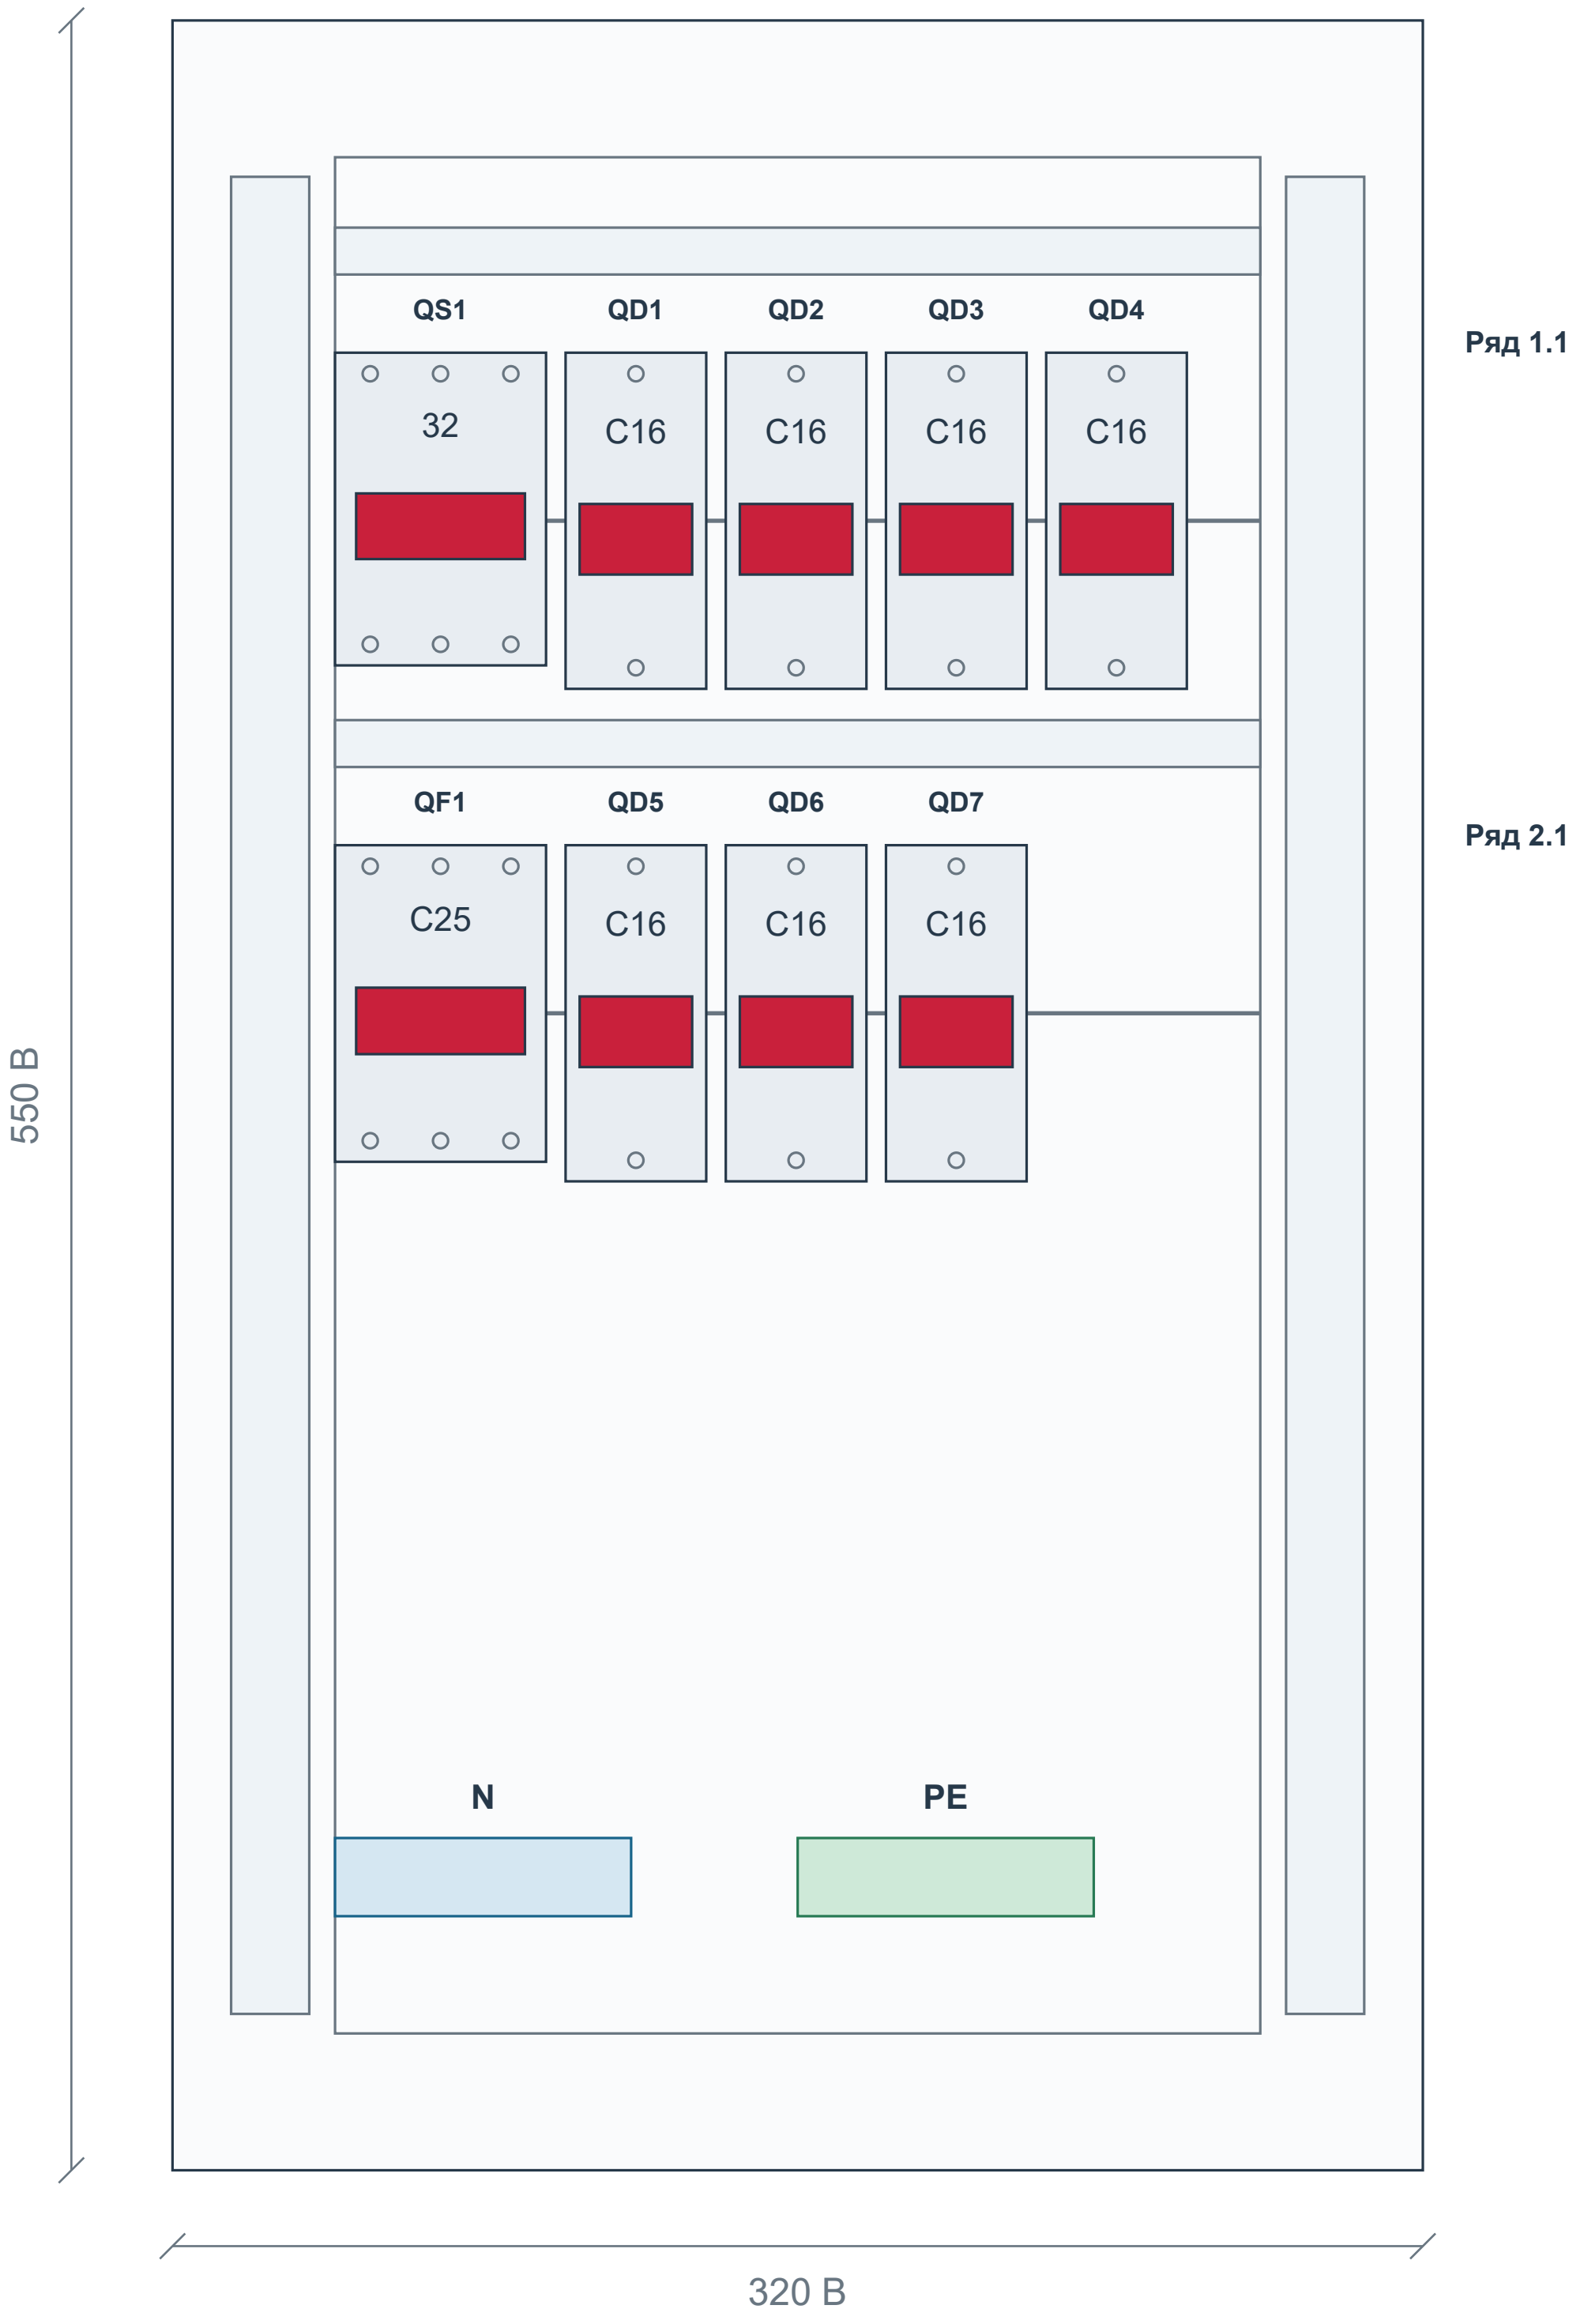

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	703	1.1	41.6	85	54 × 80
QF1	NXB-63S	704	2.1	41.6	211	54 × 81
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	705	1.1	100.6...223.6	85	36 × 86
QD5 - QD7	NXBLE-63YH	706	2.1	100.6...182.6	211	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Актуальная спецификация

ЩО-0 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 721 | ЭОМ, PDF стр. 39

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
722	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
723	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
724	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
725	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 39

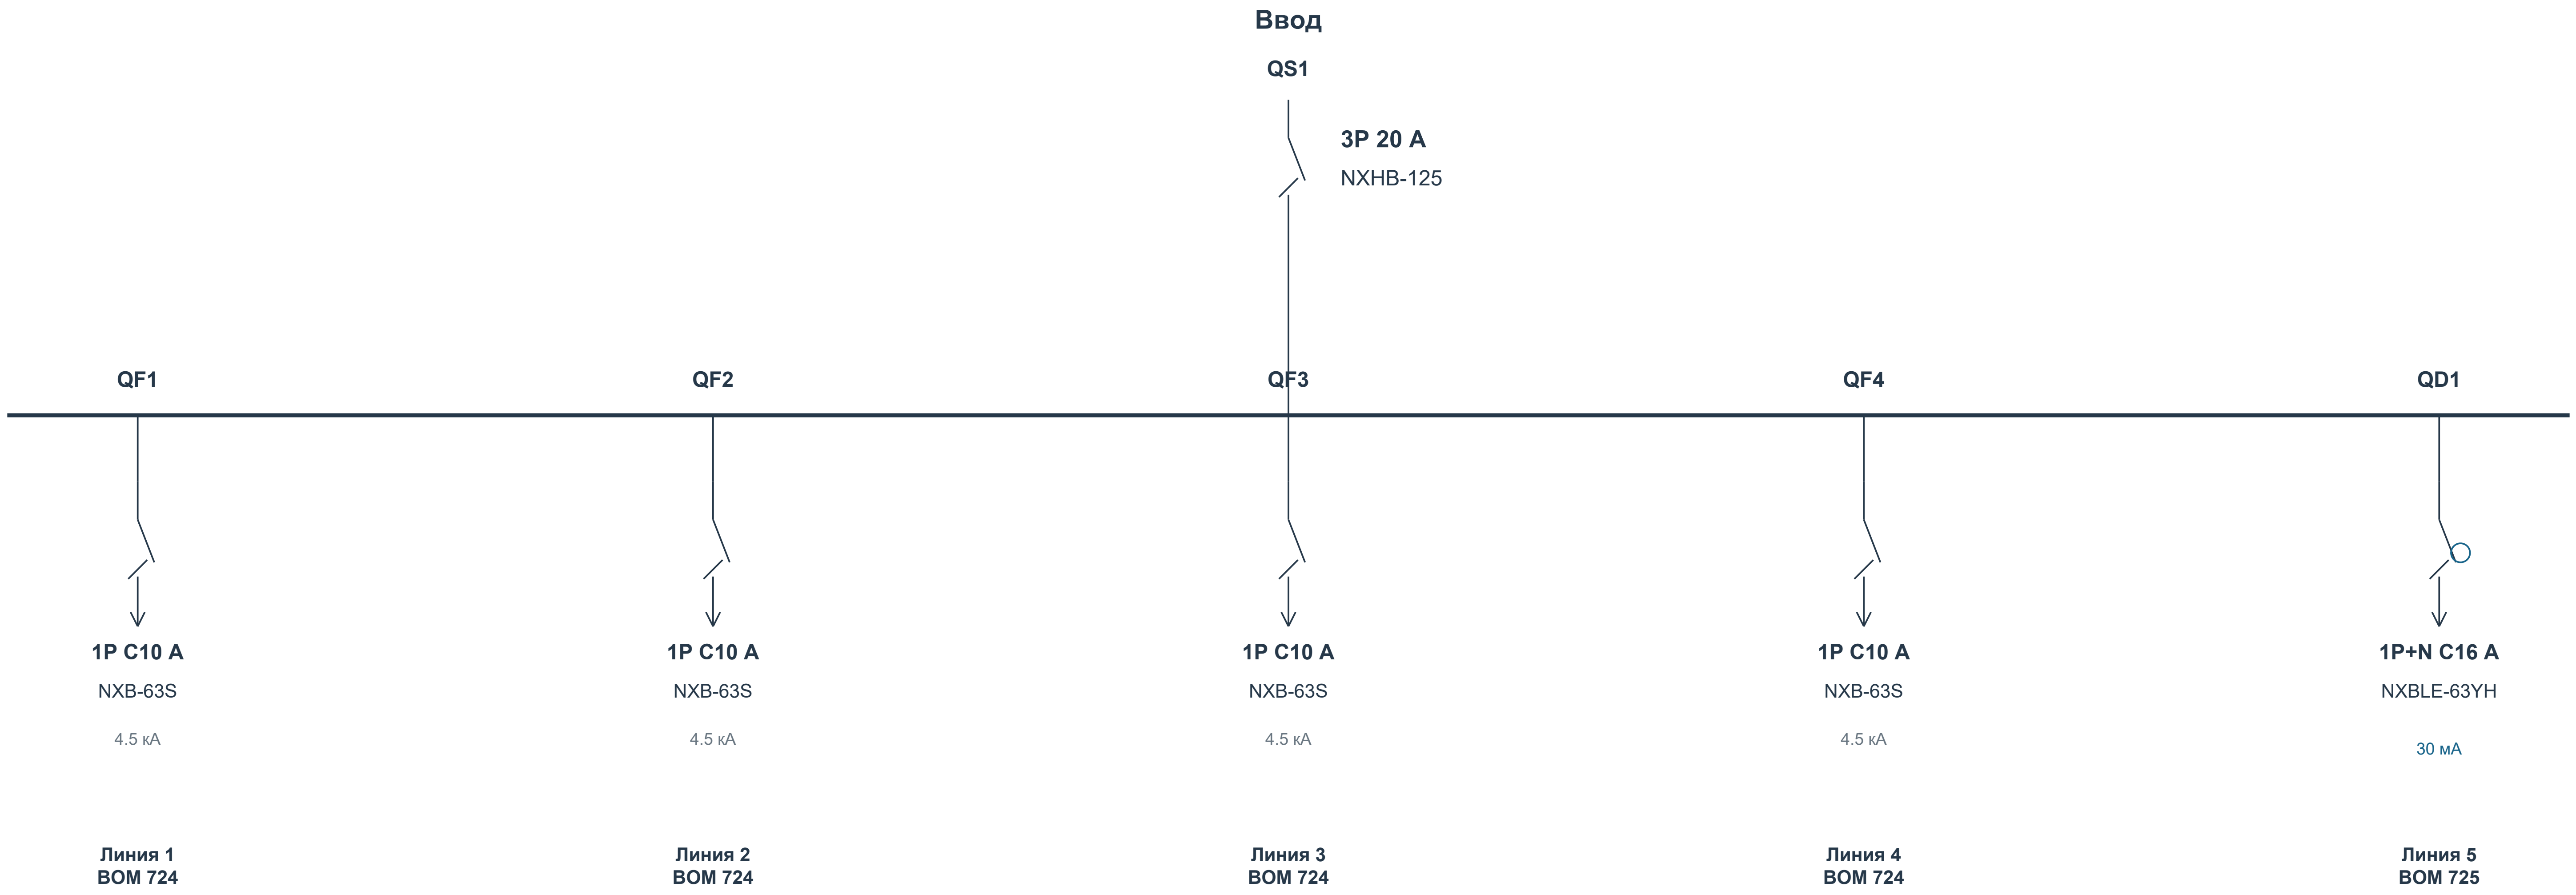
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QD1
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 724
Линия 2
BOM 724
Линия 3
BOM 724
Линия 4
BOM 724
Линия 5
BOM 725

Данные исходного проекта: Ру 2.40 кВт | Рр 2,40 кВт | Iр 3,84 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

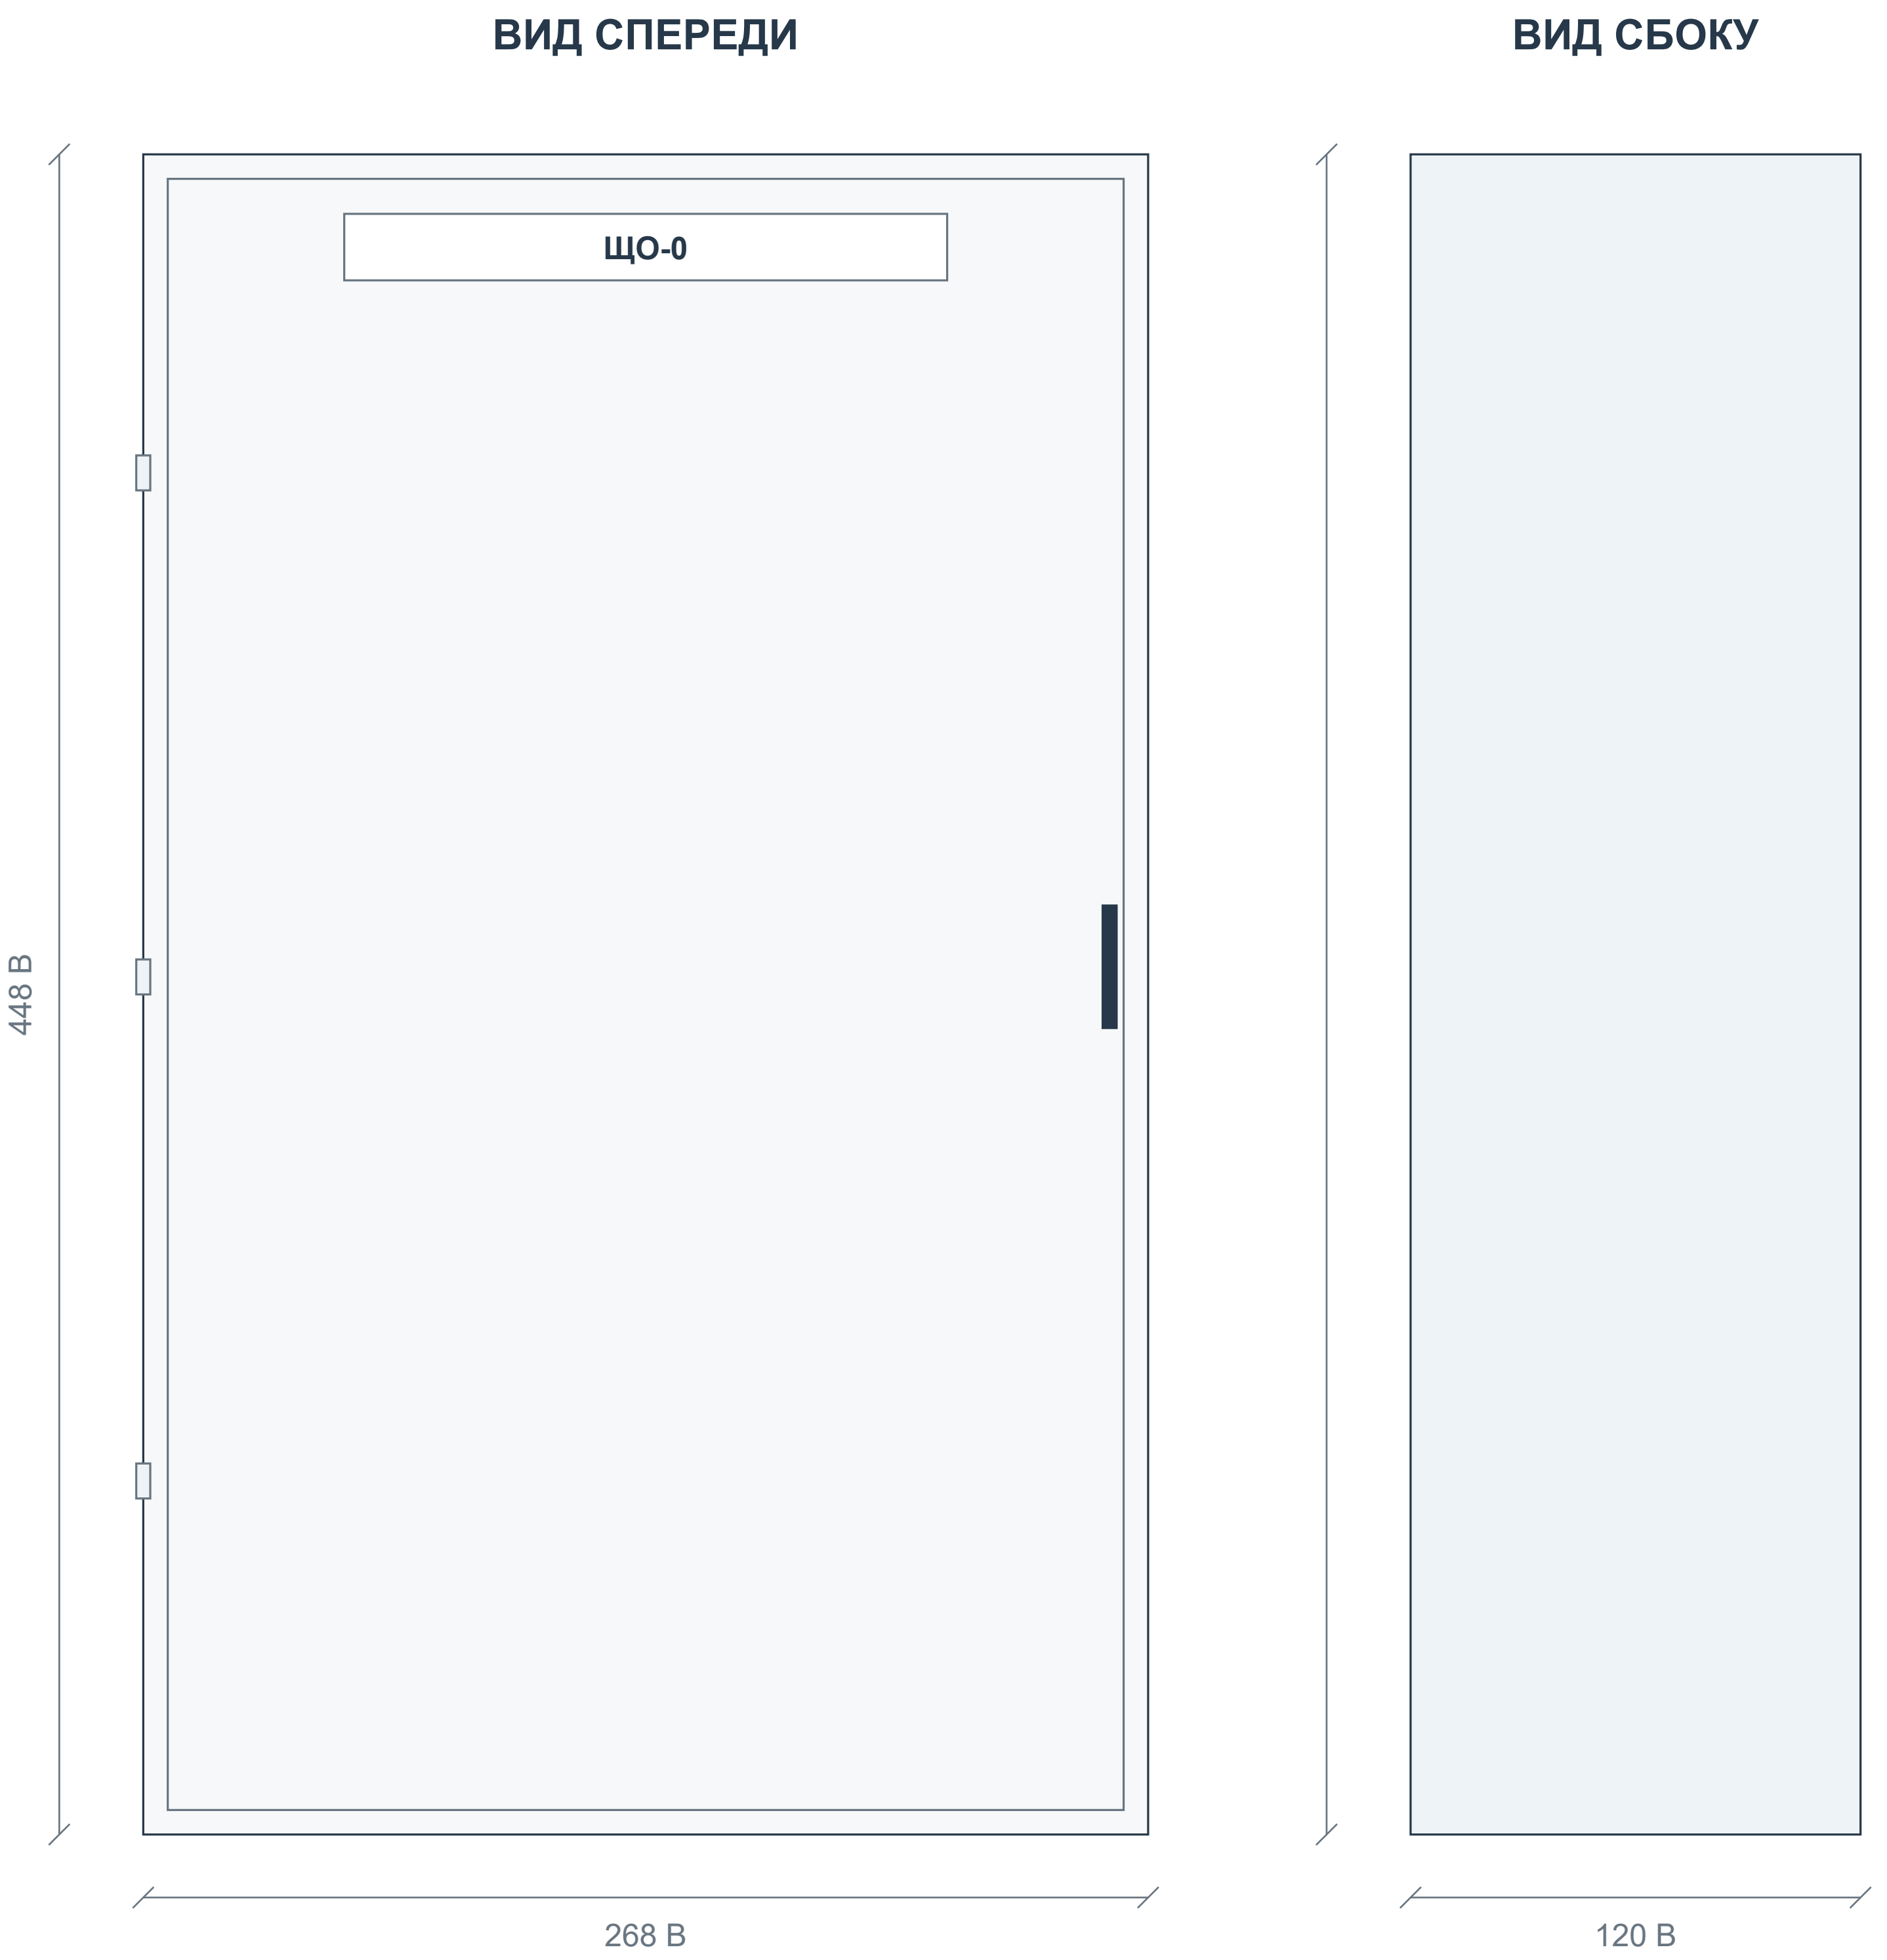

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

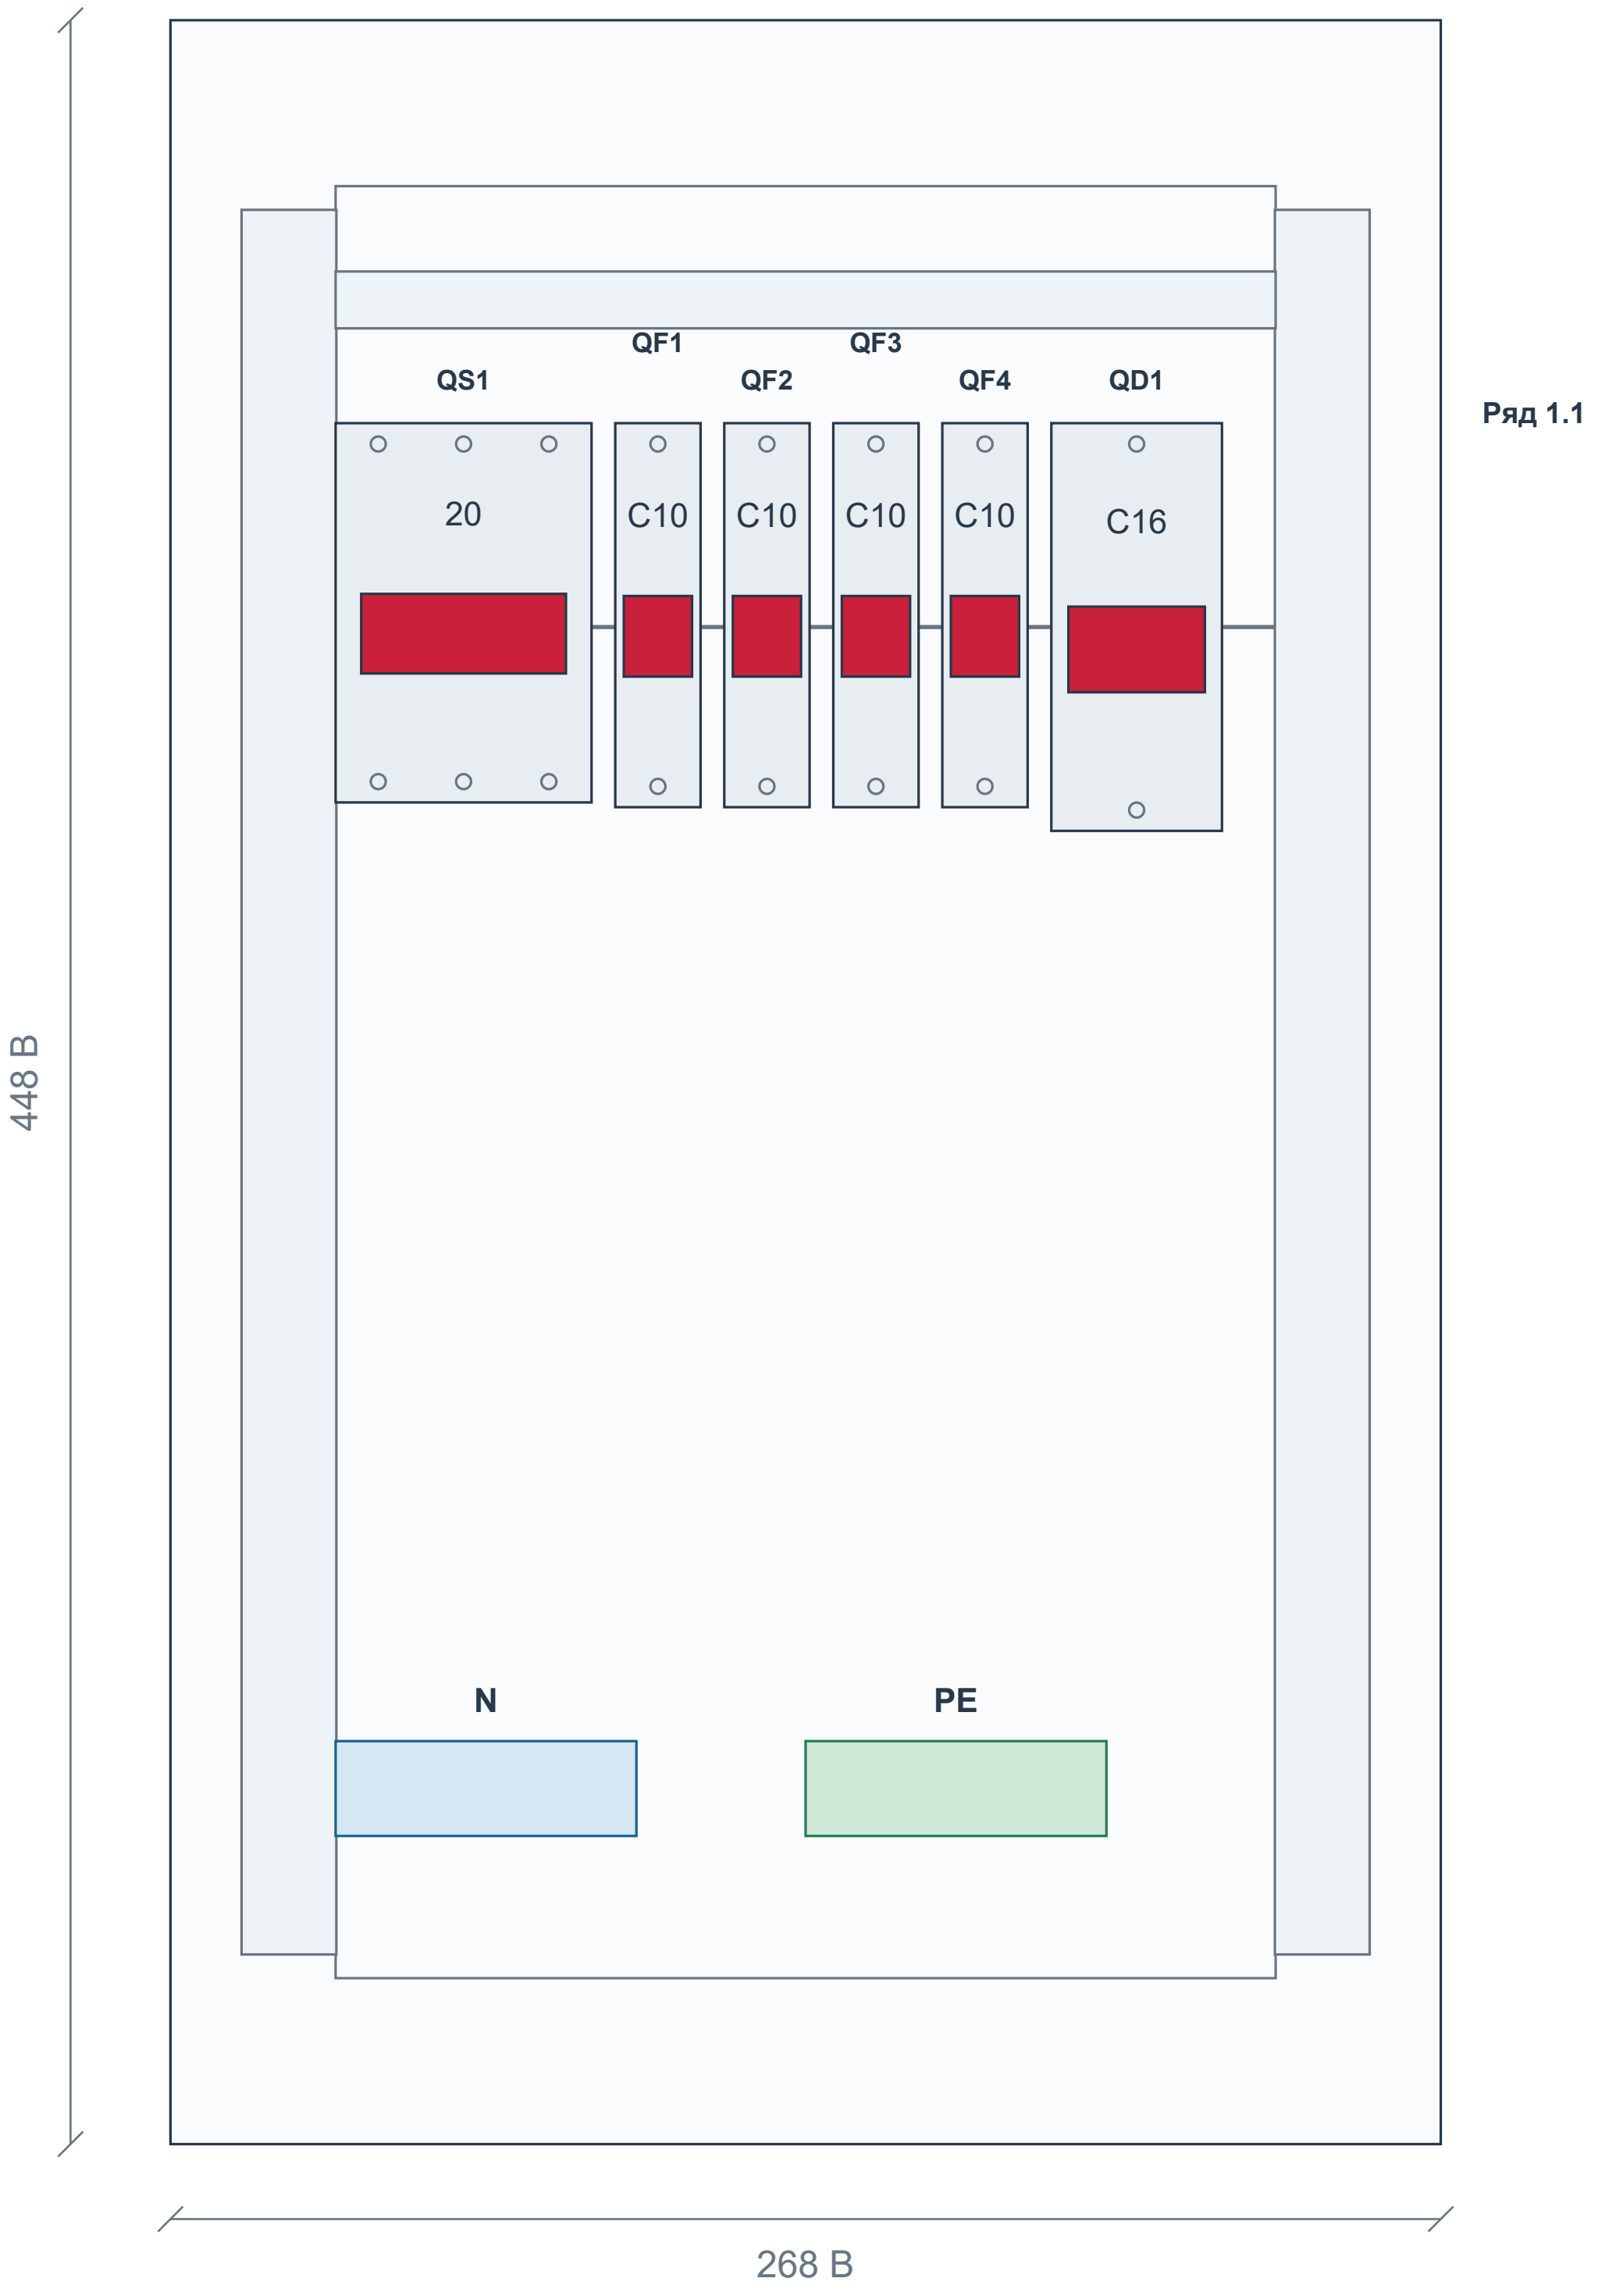

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	723	1.1	34.84	85	54 × 80
QF1 - QF4	NXB-63S	724	1.1	93.84...162.84	85	18 × 81
QD1	NXBLE-63YH	725	1.1	185.84	85	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Актуальная спецификация

ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 739 | ЭОМ, PDF стр. 40

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
740	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
741	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
742	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 40

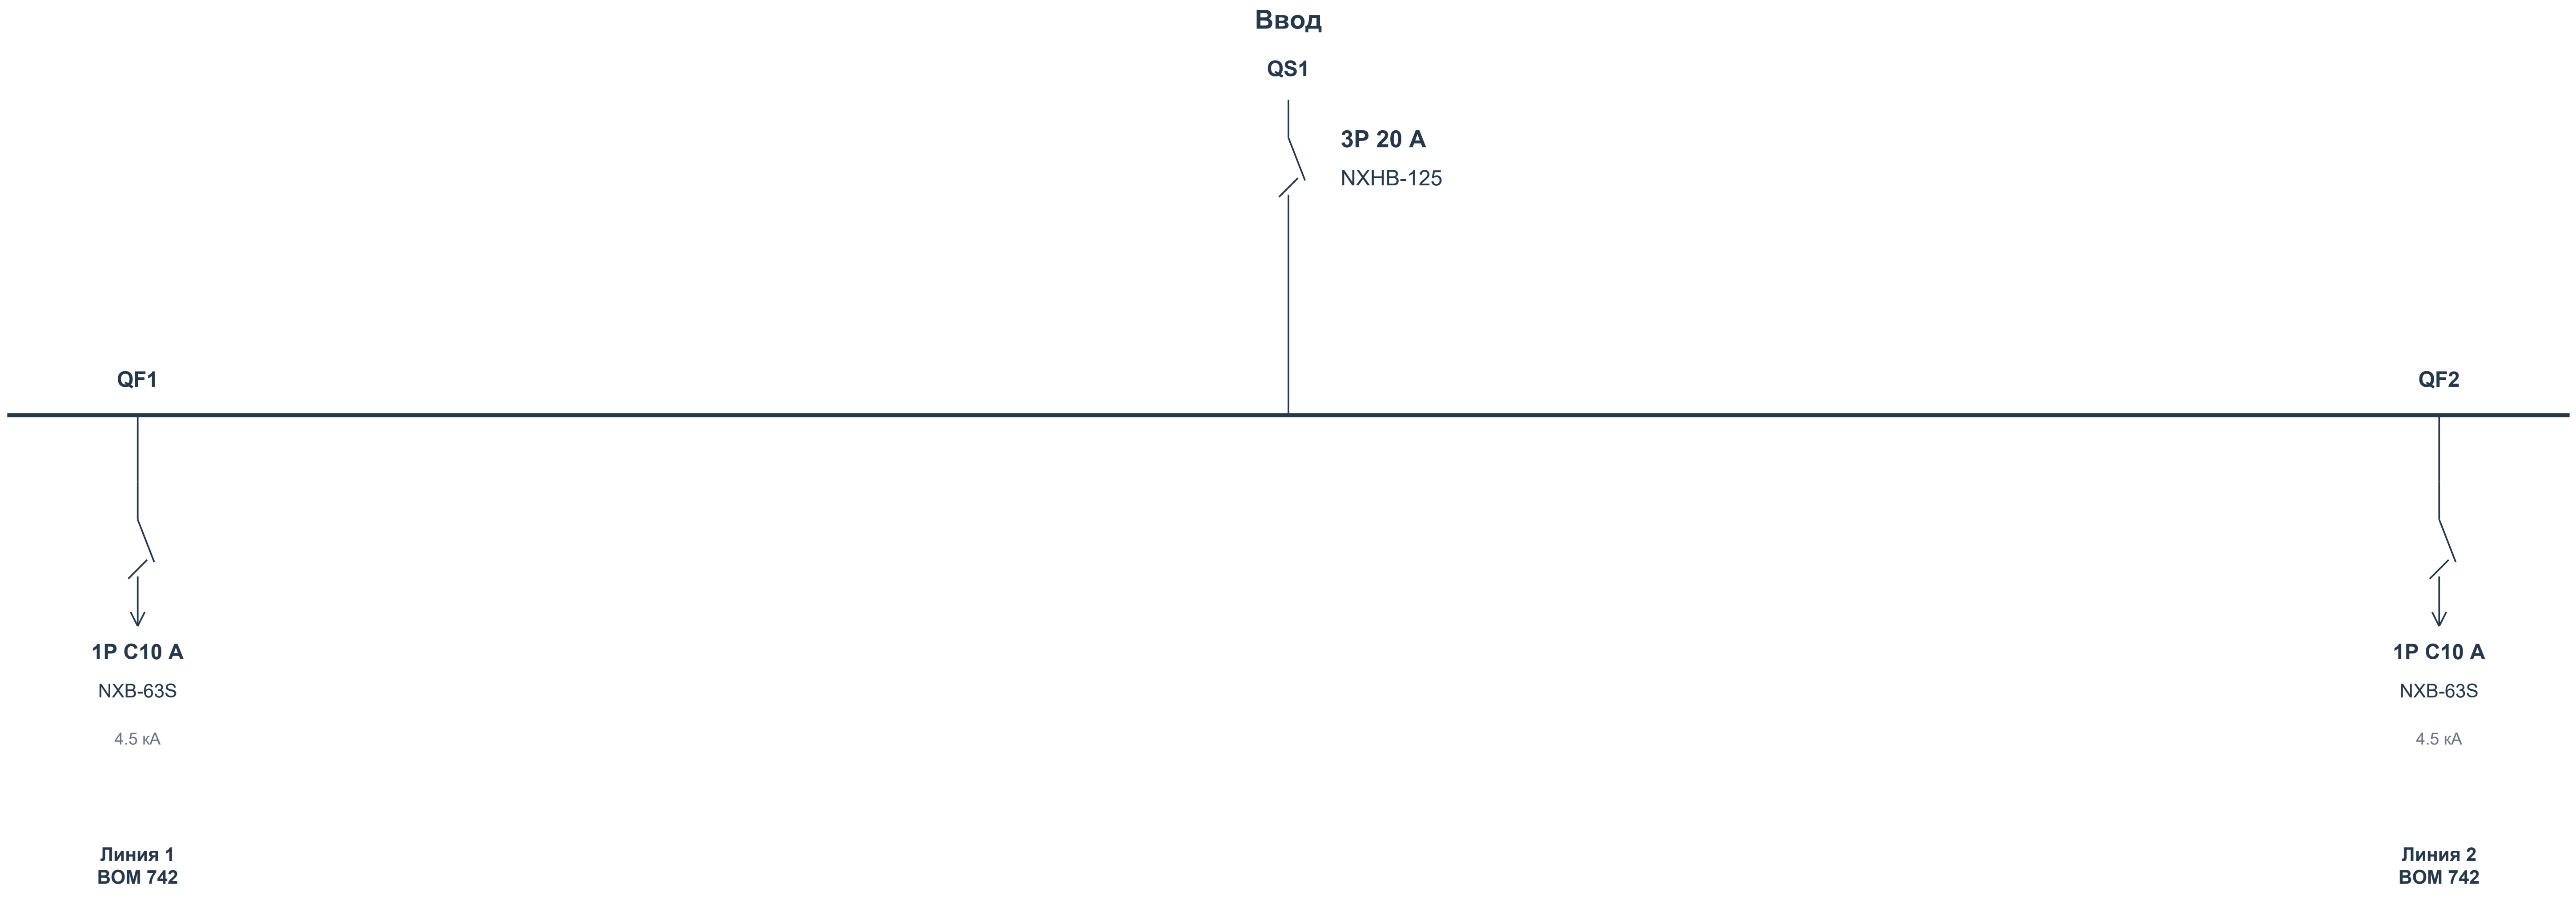
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 742
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 742

Данные исходного проекта: Ру 0.20 кВт | Рр 0,20 кВт | Iр 0,32 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

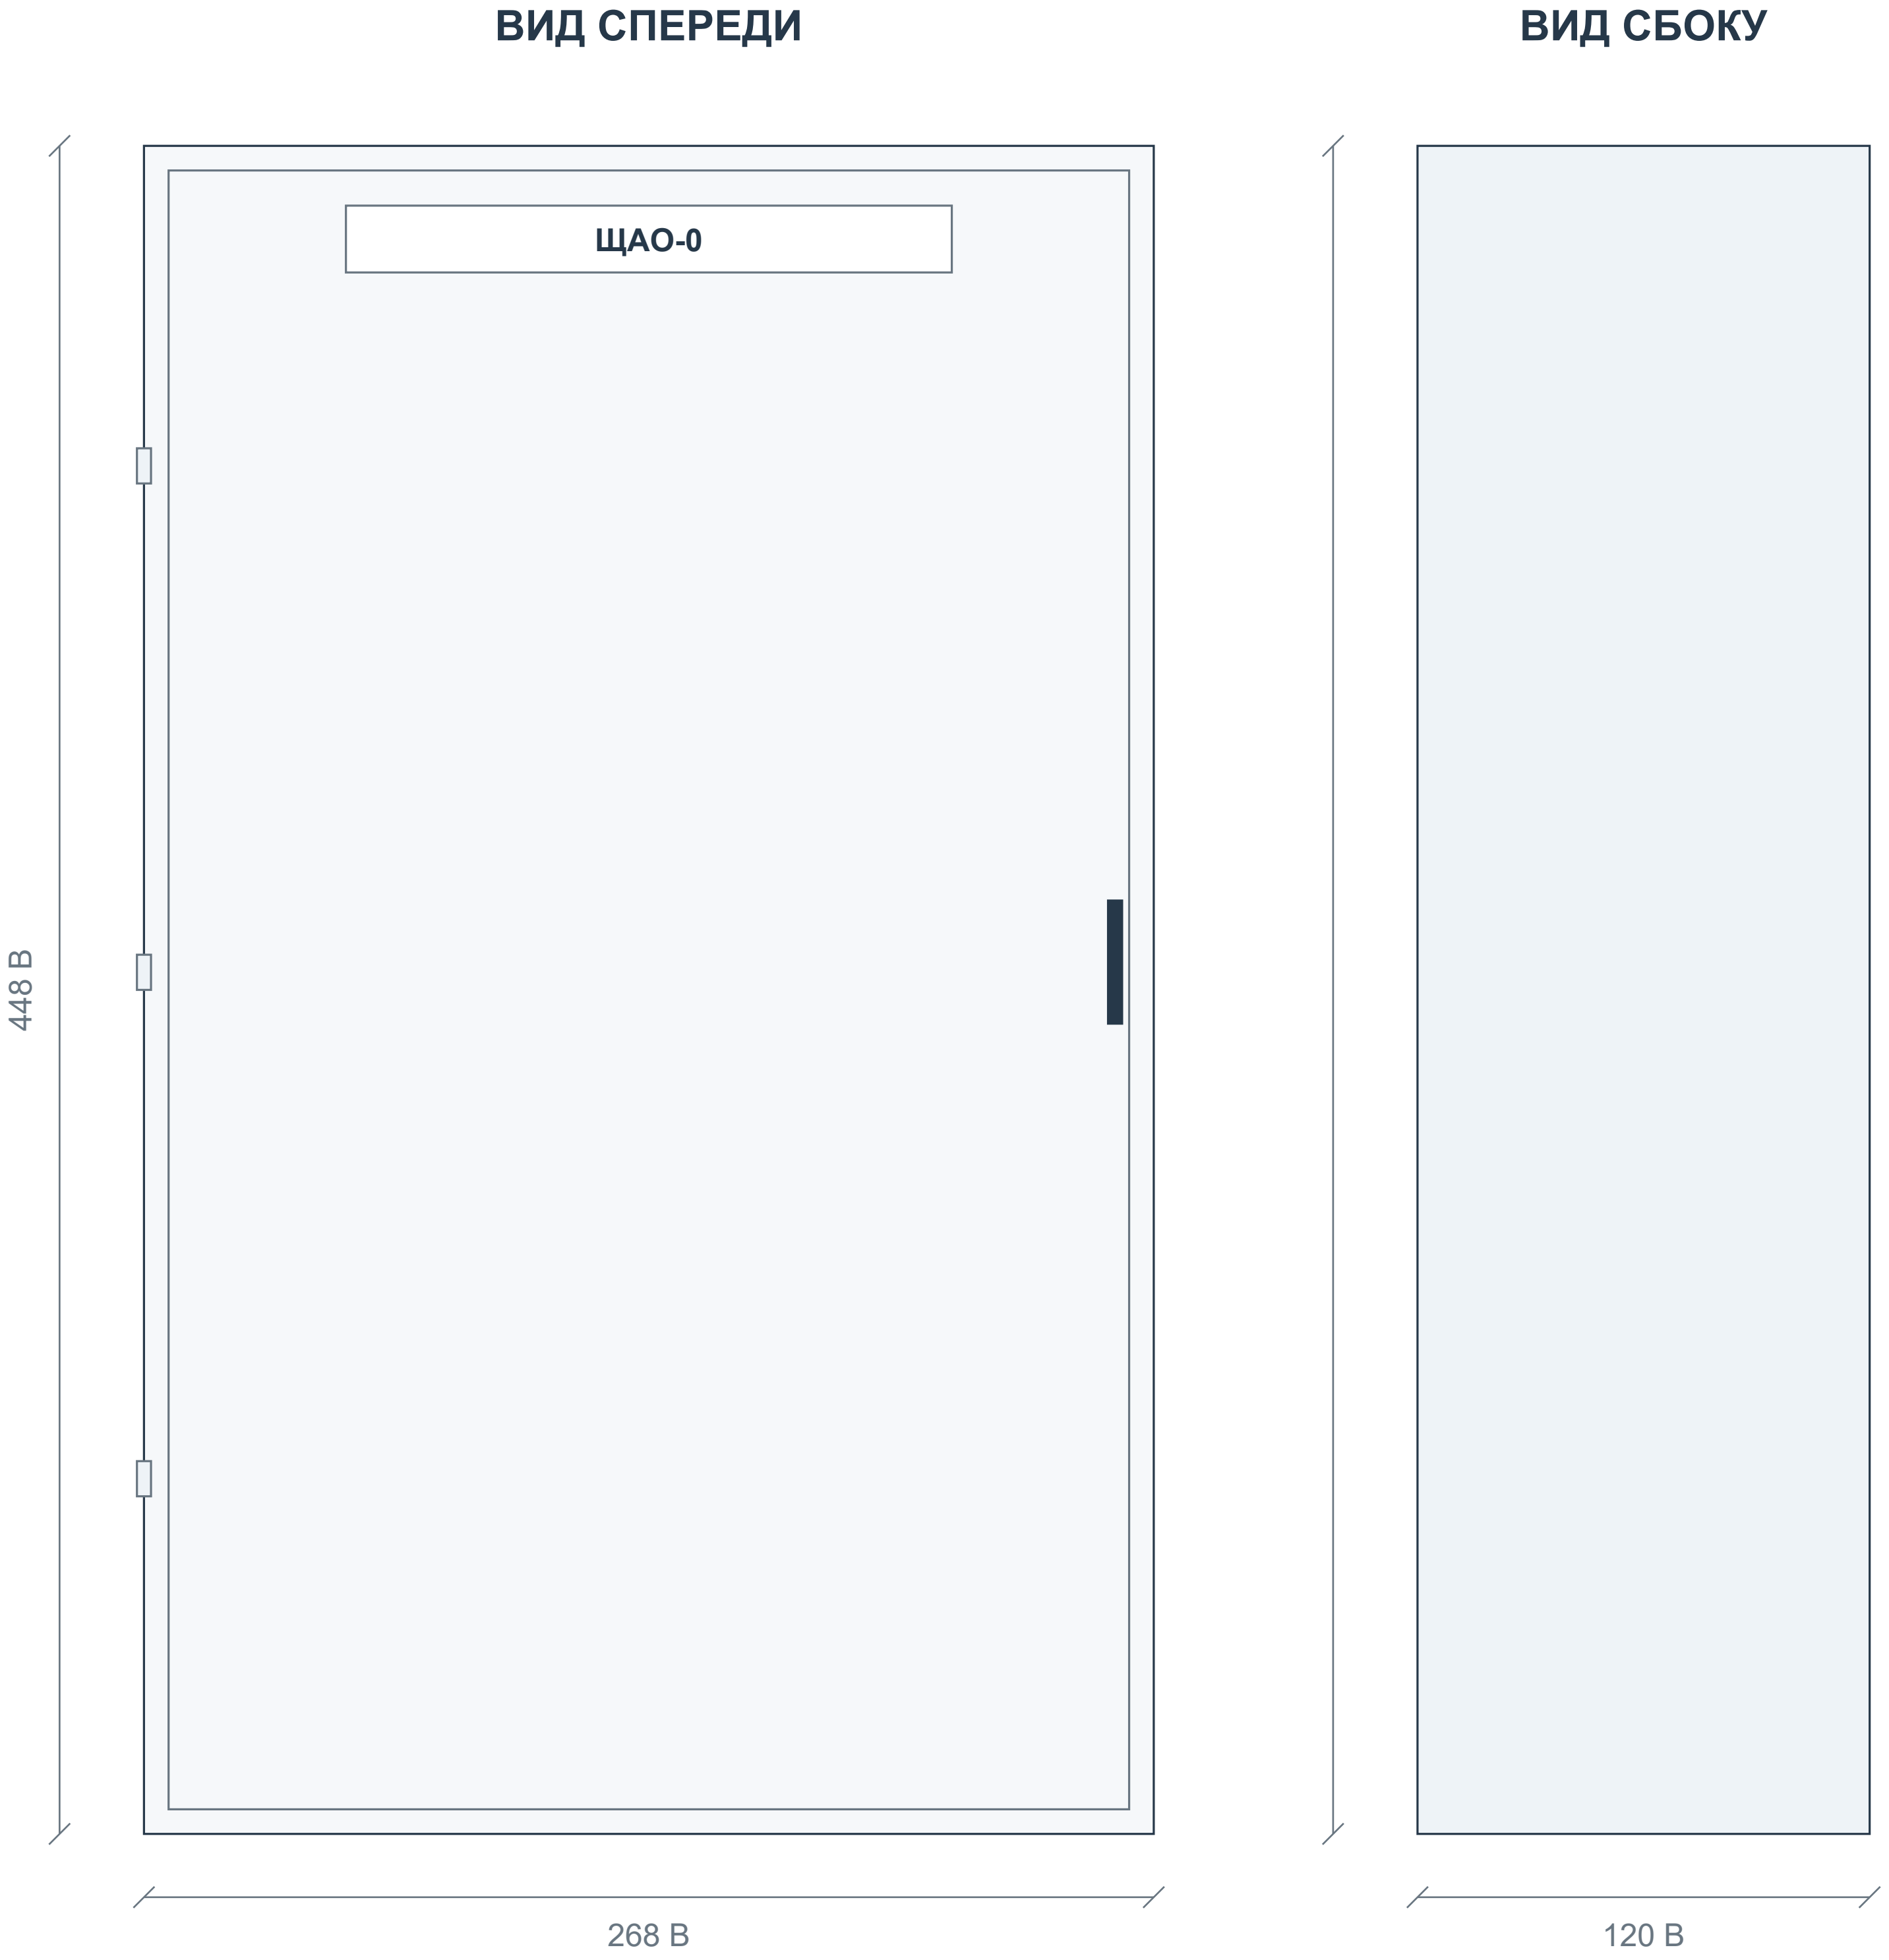

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

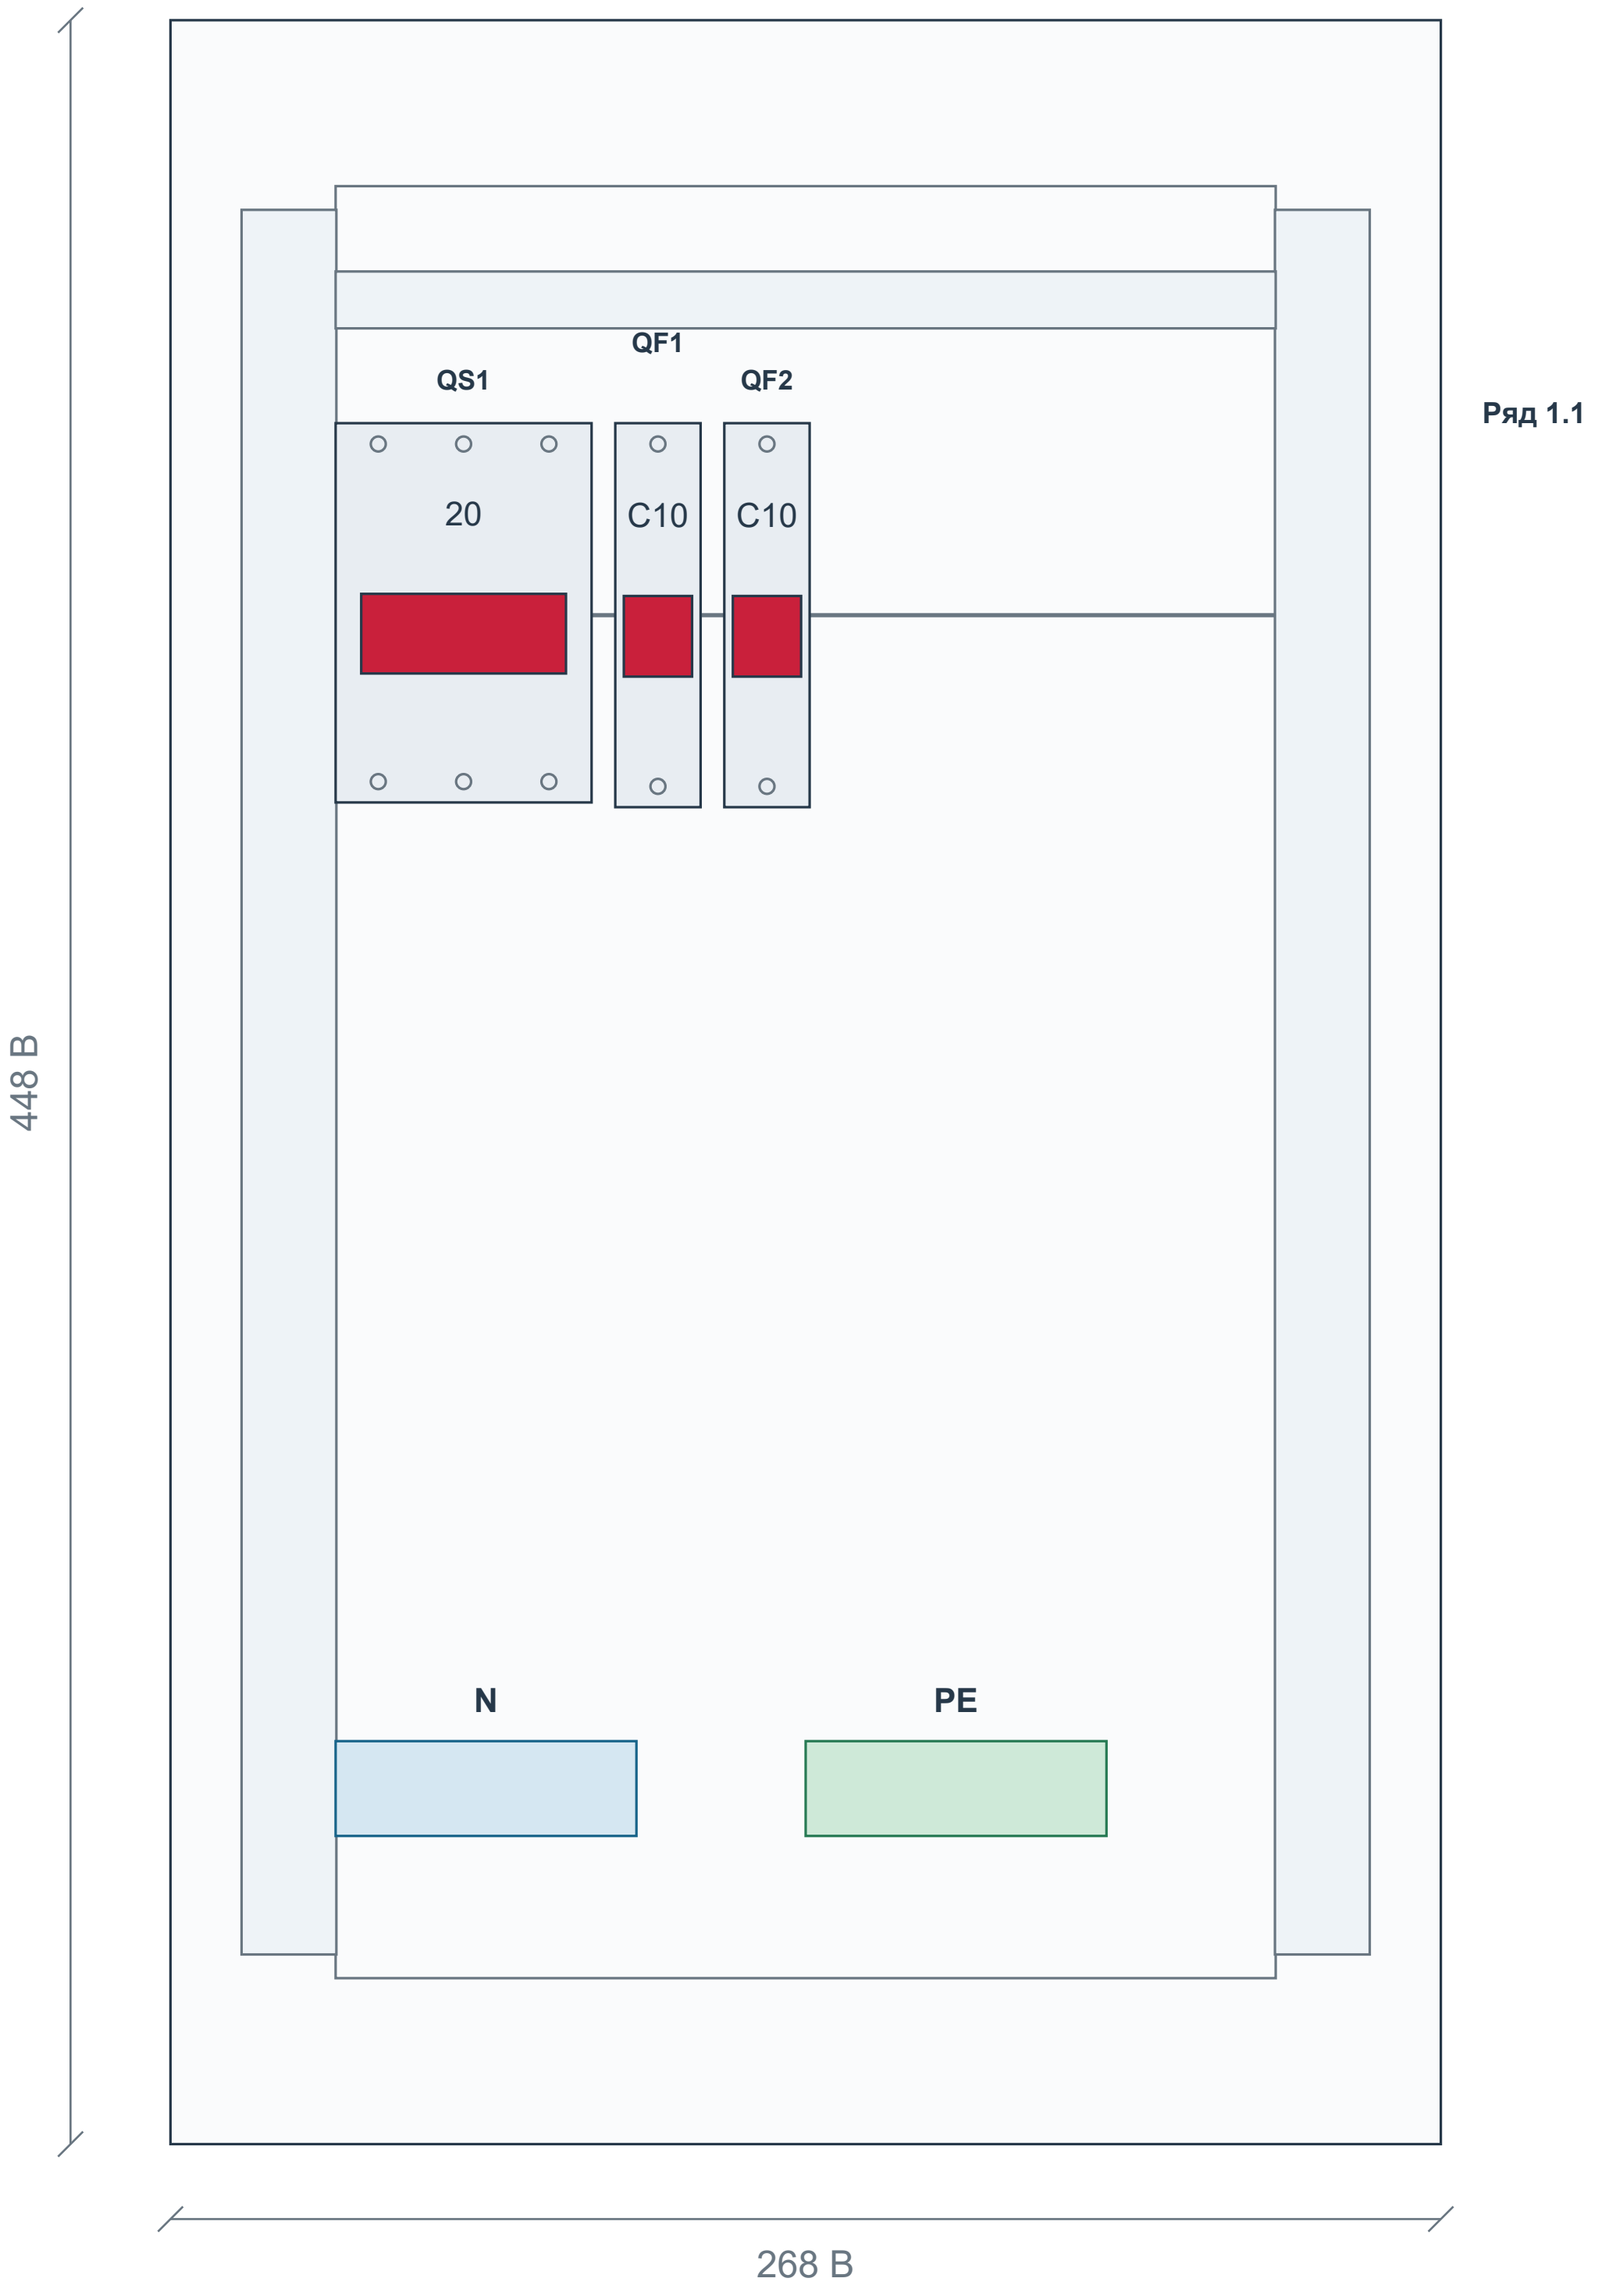

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	741	1.1	34.84	85	54 × 80
QF1 - QF2	NXB-63S	742	1.1	93.84...116.84	85	18 × 81

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Актуальная спецификация

ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 754 | ЭОМ, PDF стр. 41

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
755	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
756	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
757	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
758	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
759	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
760	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	5	5	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 41

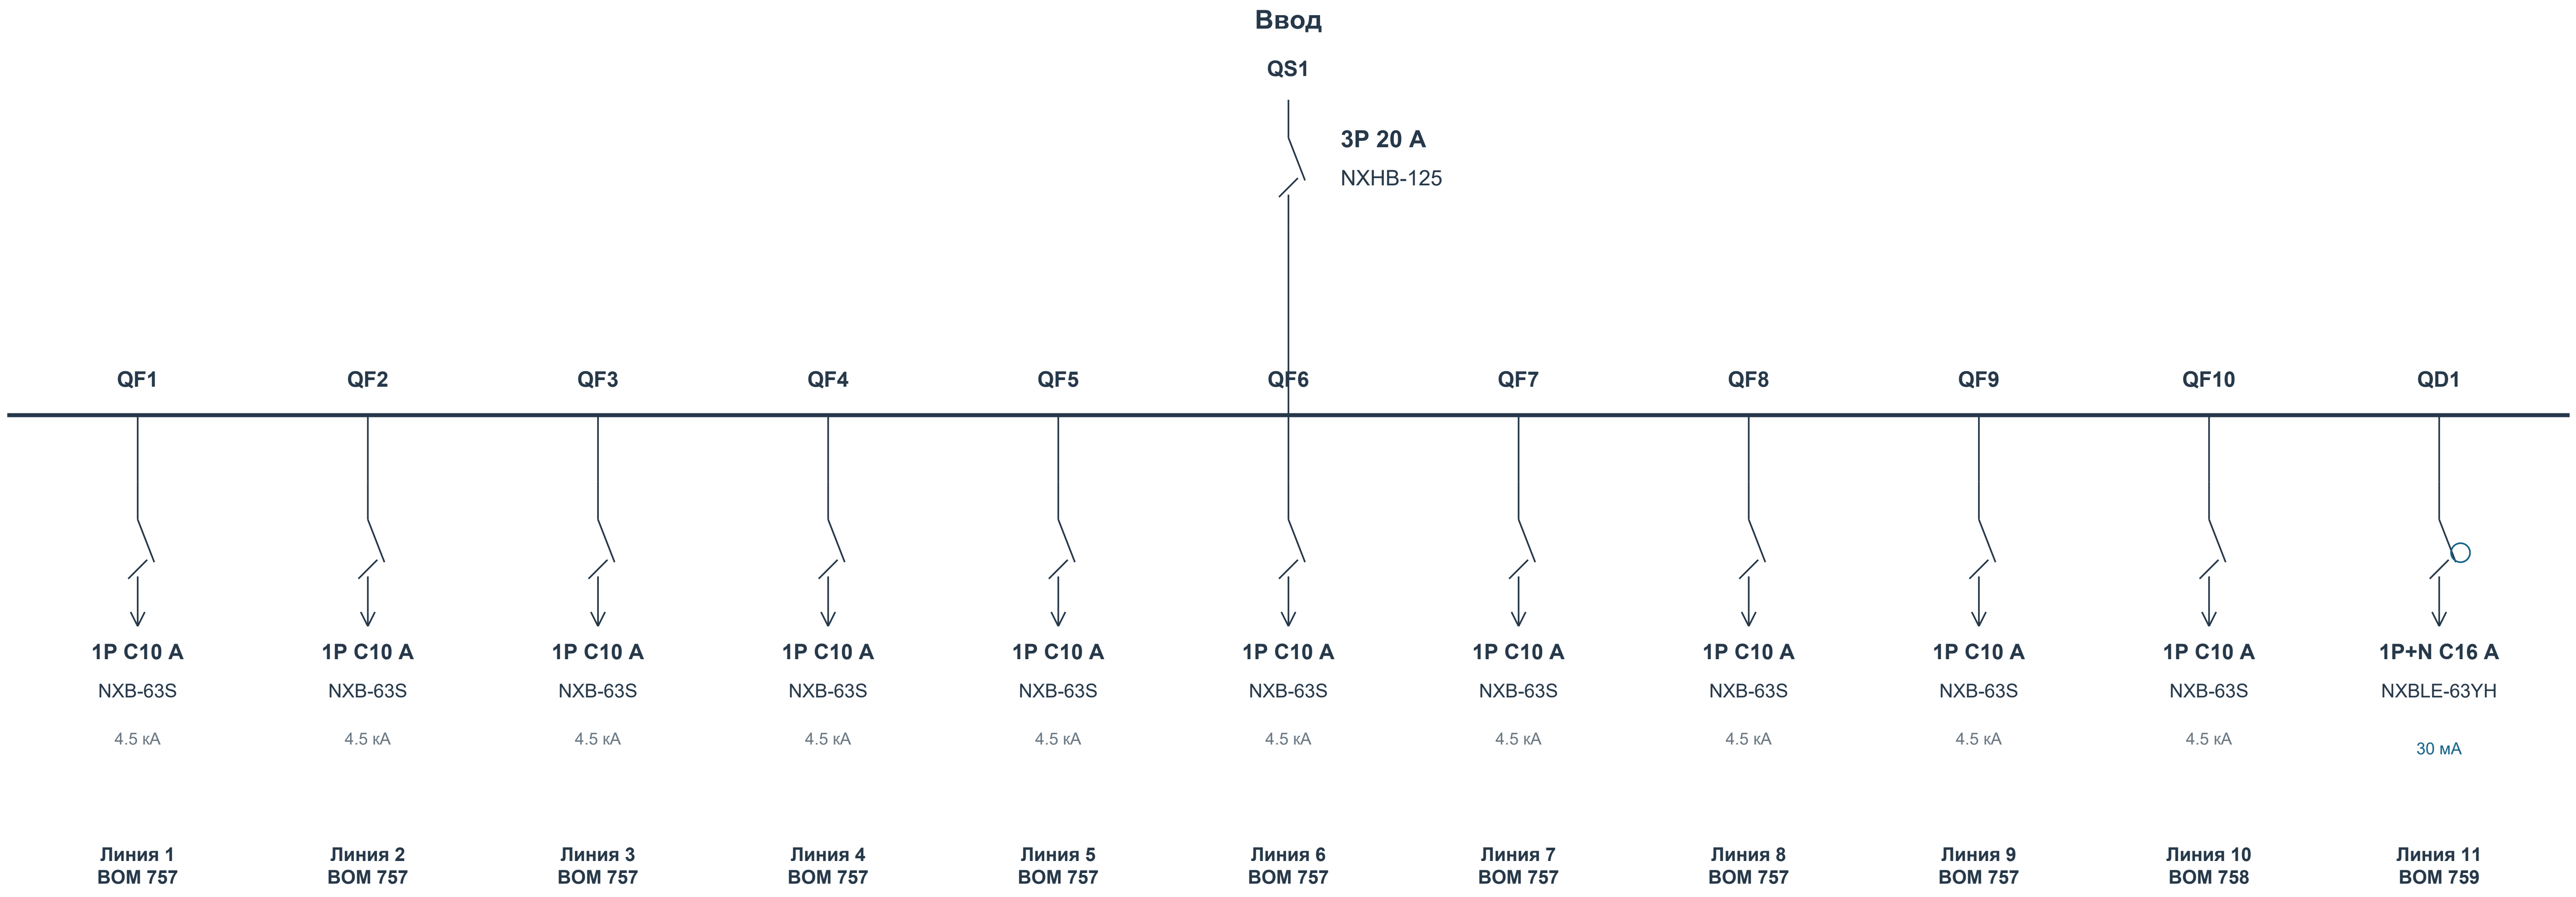
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QD1
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 757
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 757
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 757
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 757
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 757
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 757
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 757
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 8
BOM 757
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 9
BOM 757
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 10
BOM 758
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 11
BOM 759

Управление / учет: KM1 - KM5 256054 × 5

Данные исходного проекта: Ру 5.99 кВт | Рр 5,99 кВт | Ip 9,59 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

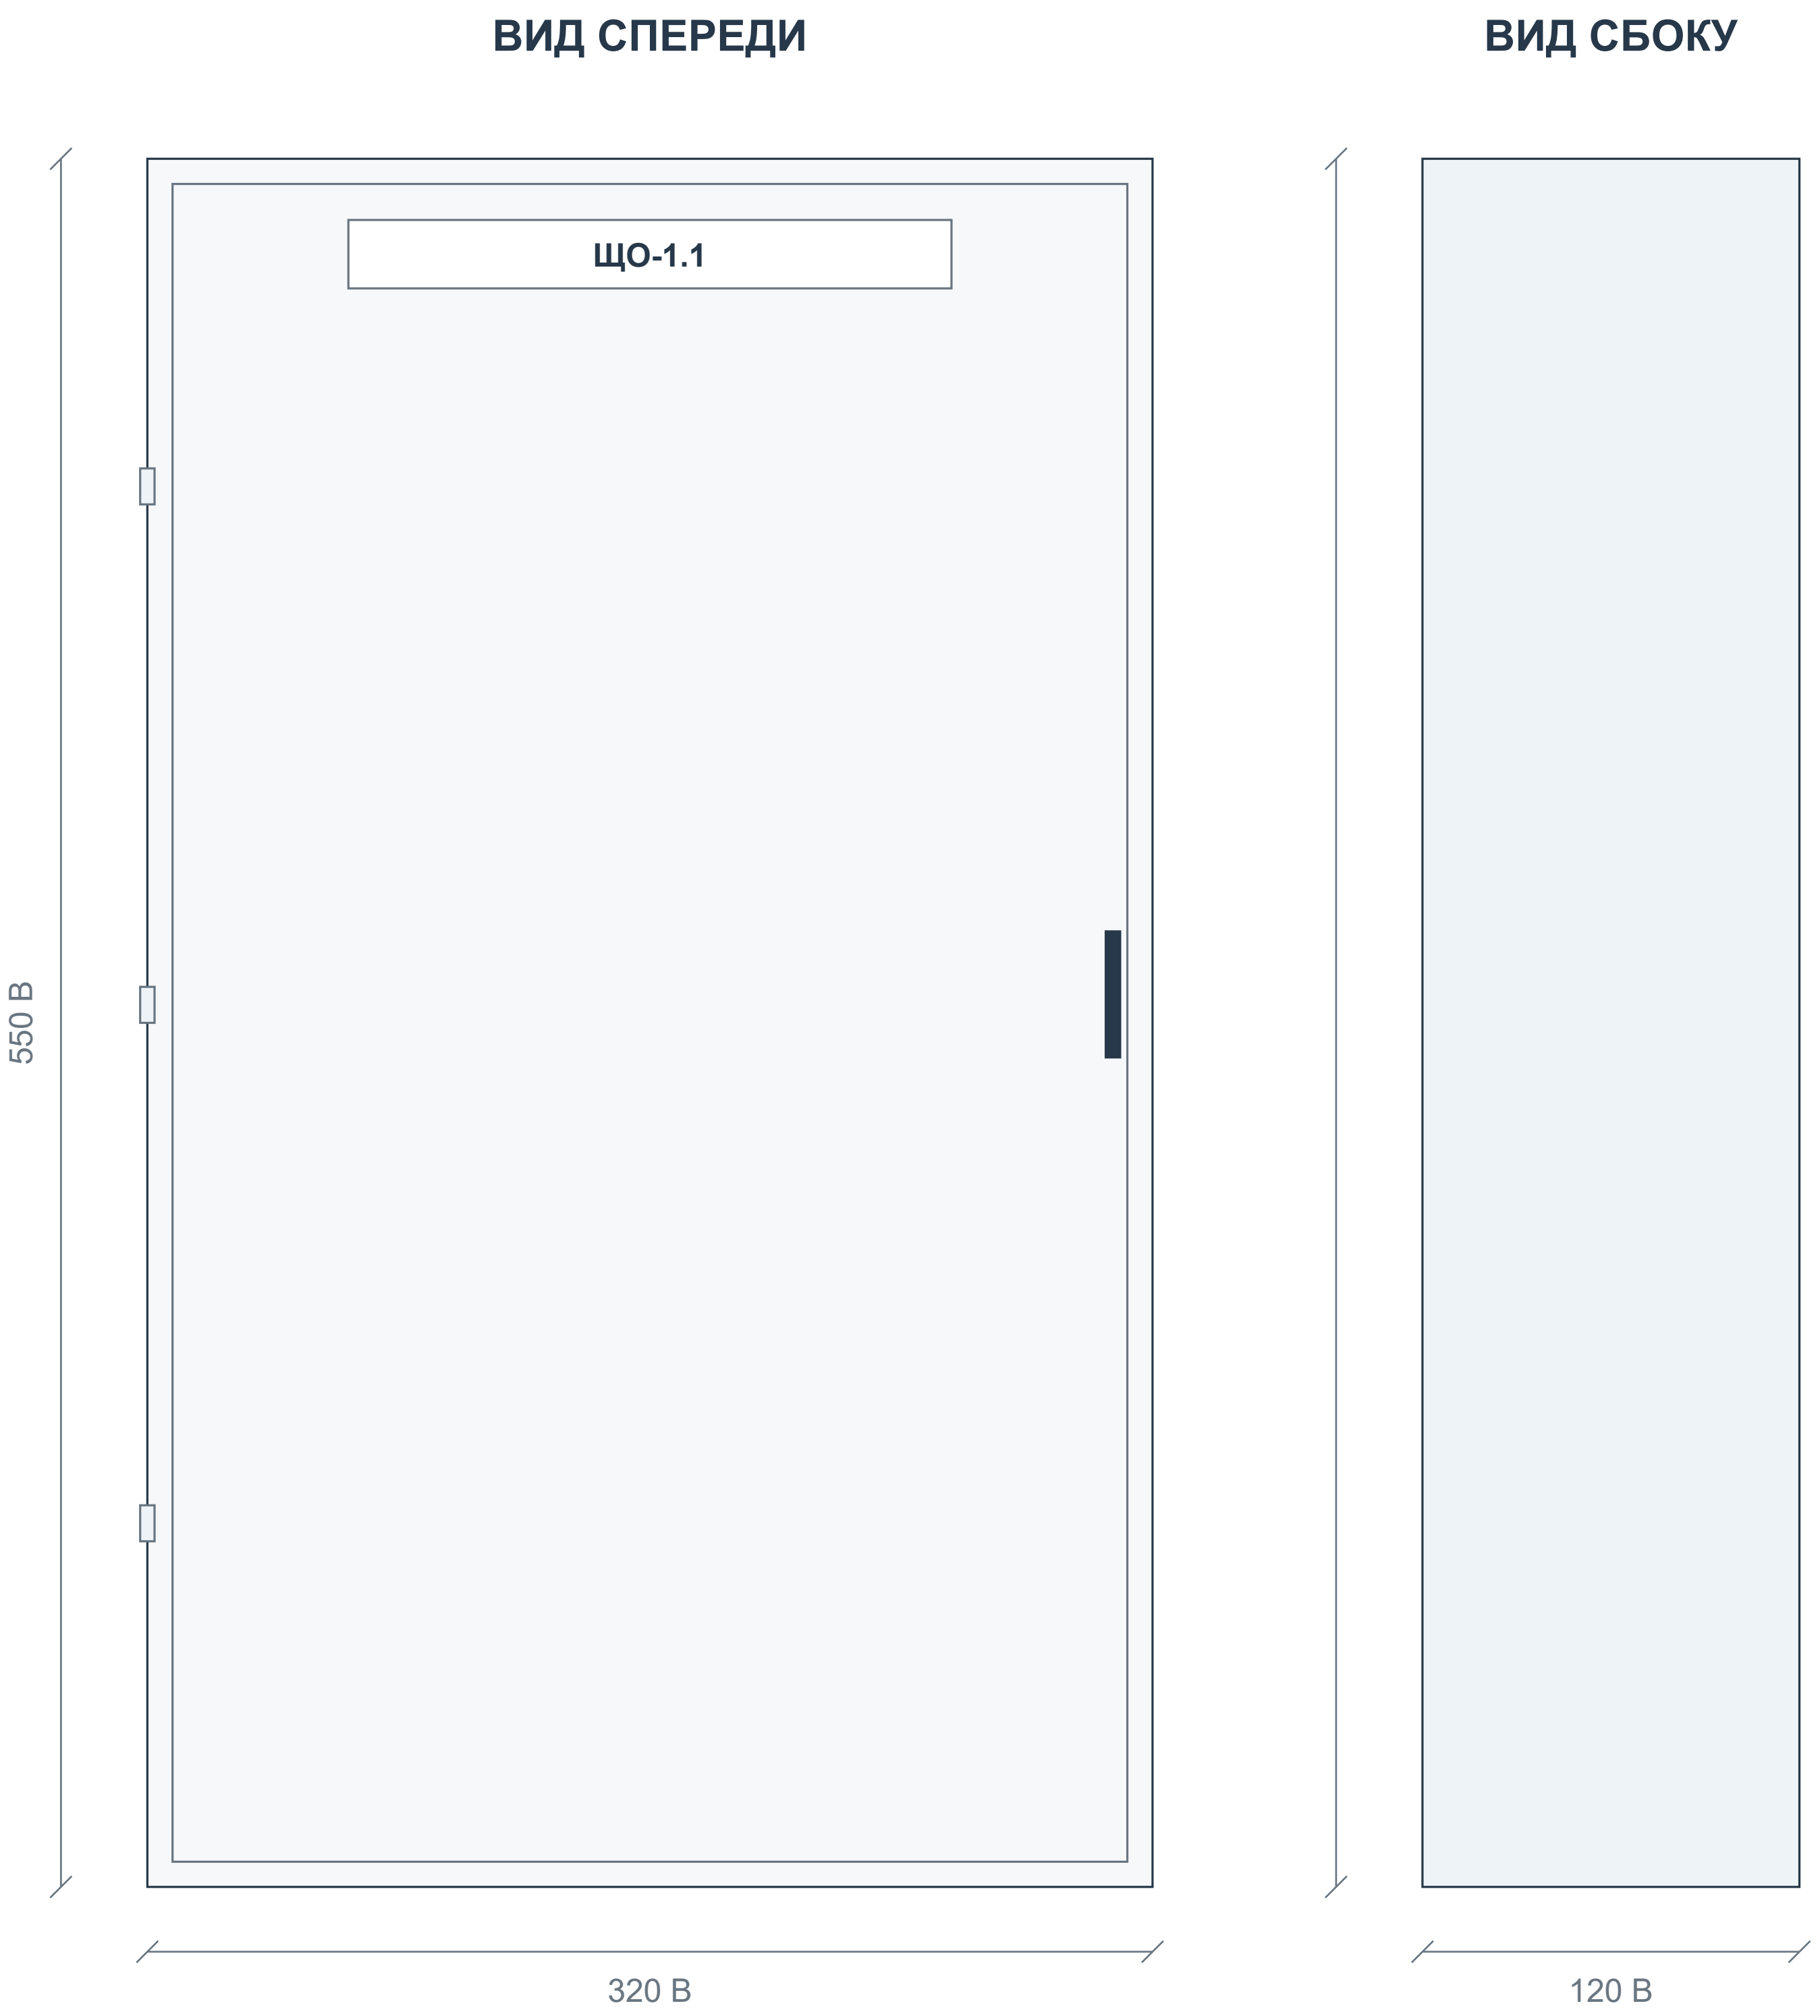

Корпус: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

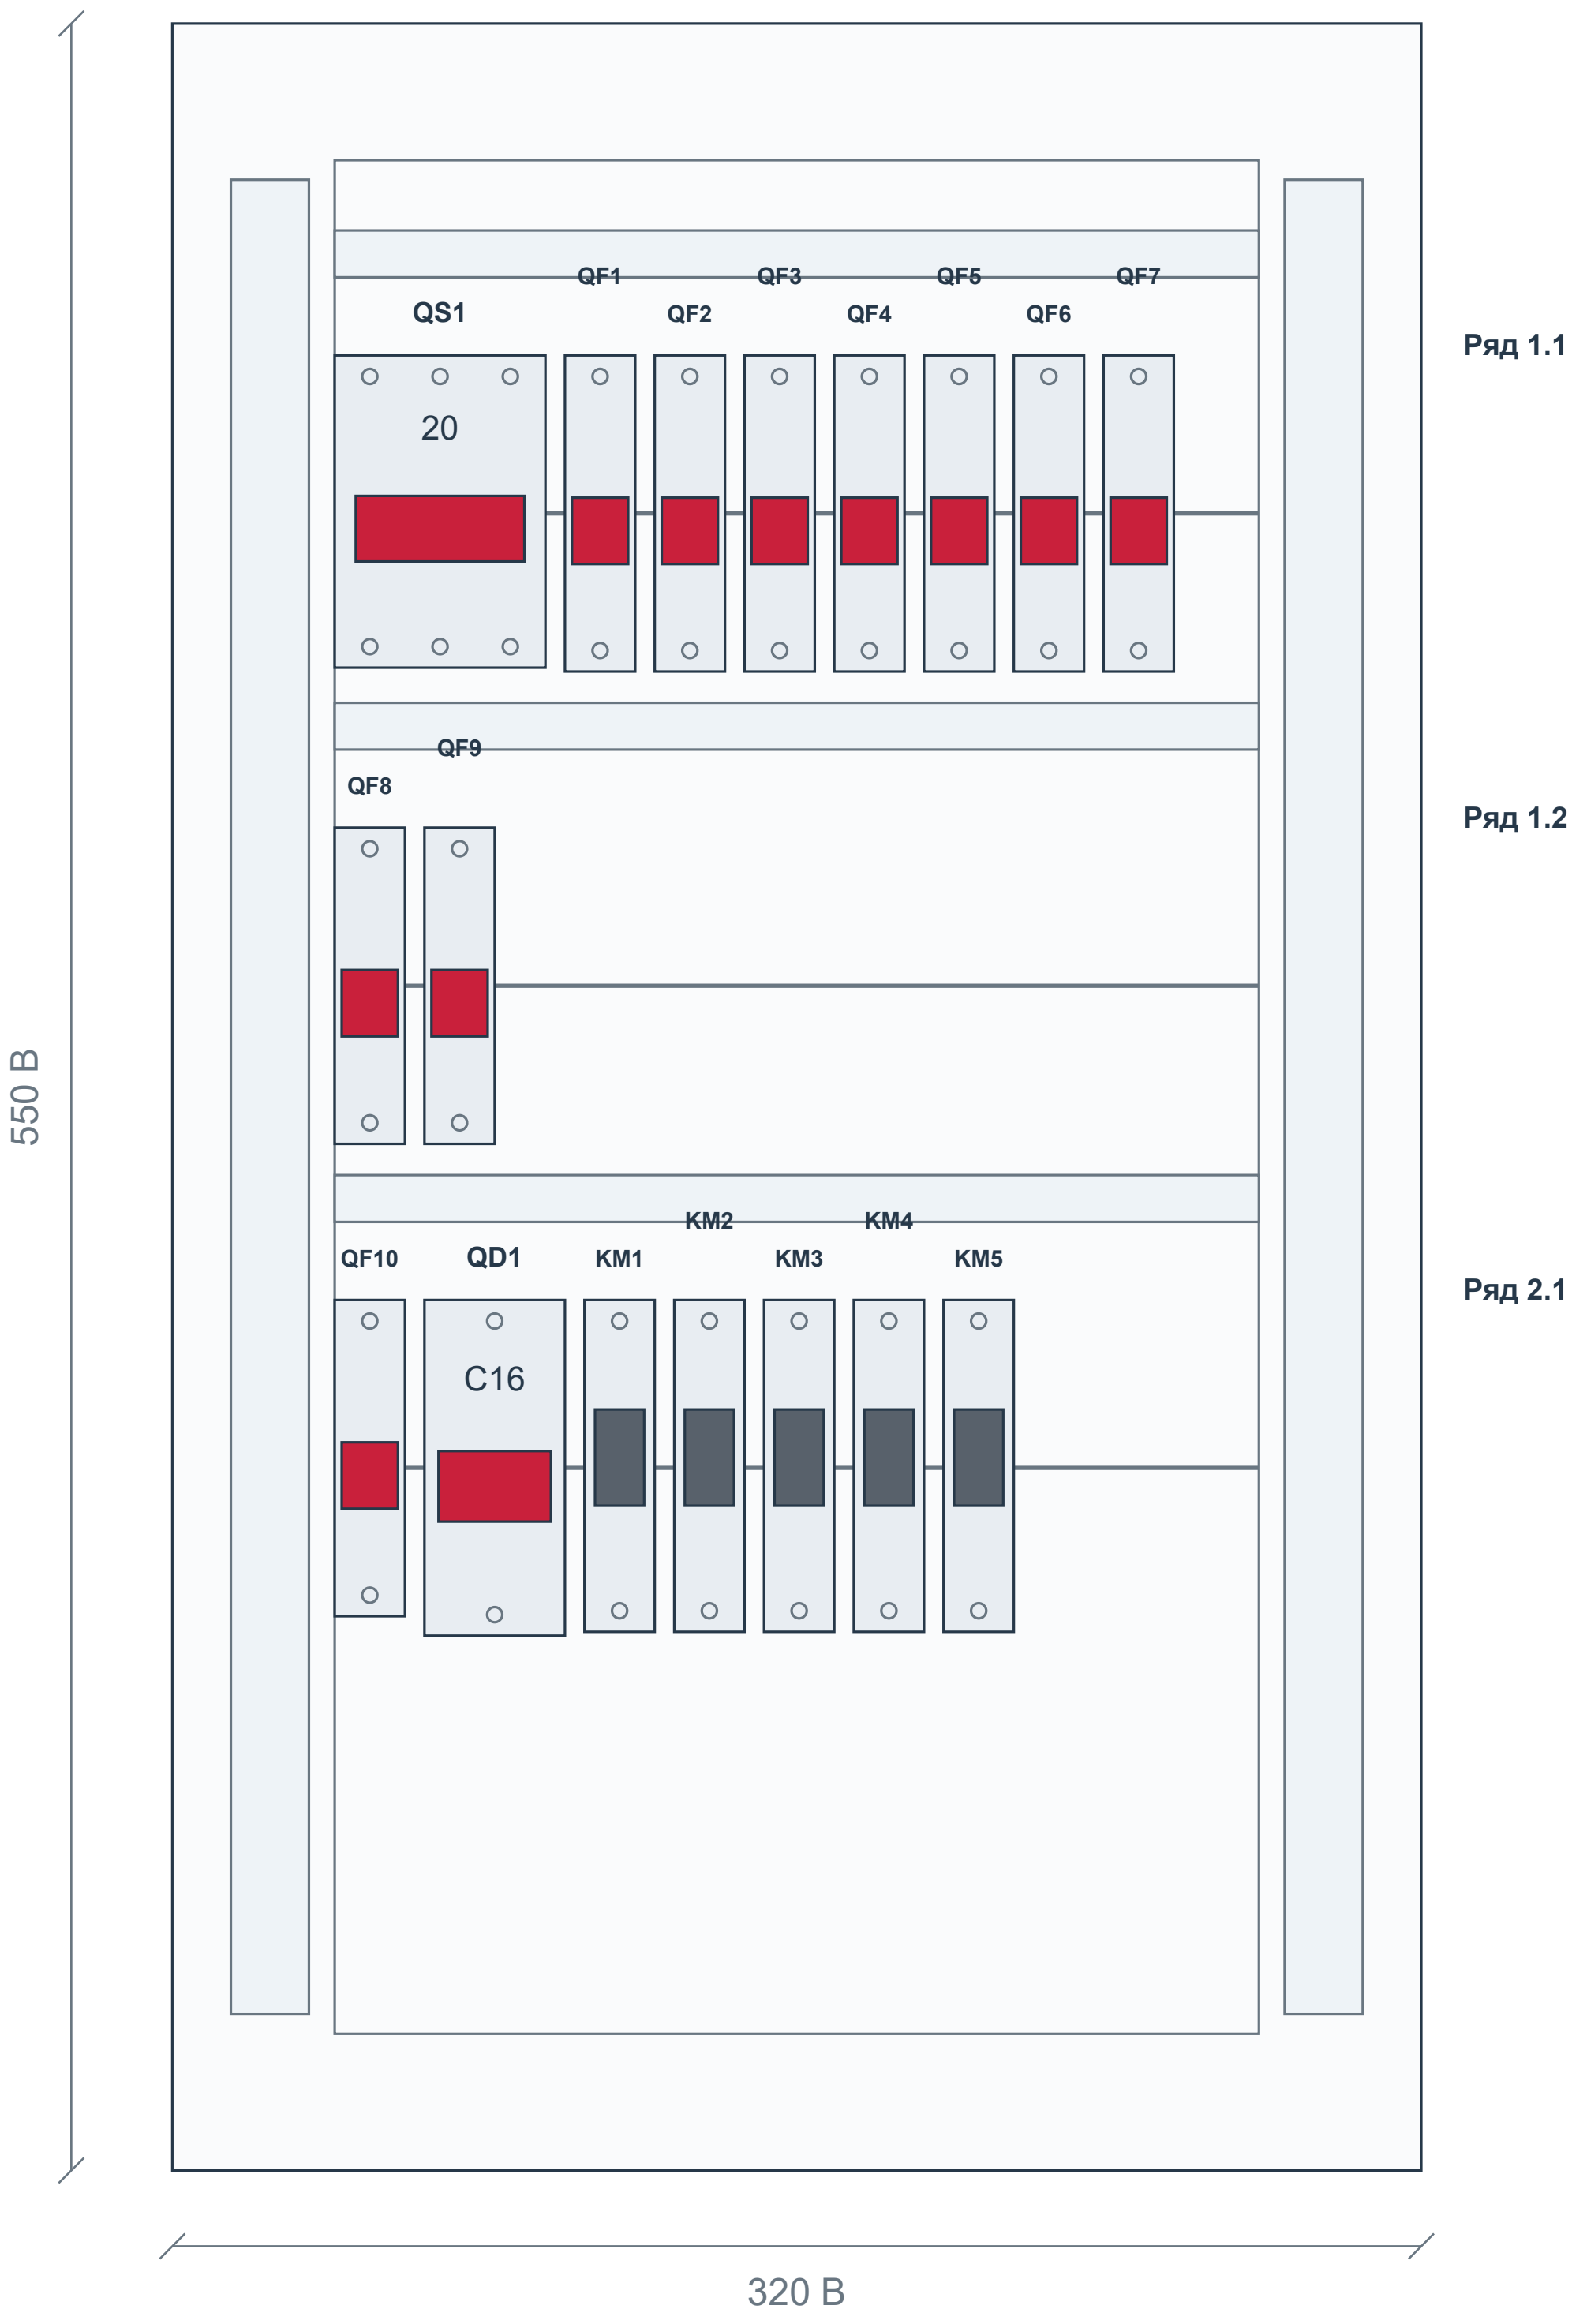

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	756	1.1	41.6	85	54 × 80
QF1 - QF9	NXB-63S	757	1.1/1.2	100.6...238.6 / 41.6...64.6	85/206	18 × 81
QF10	NXB-63S	758	2.1	41.6	327	18 × 81
QD1	NXBLE-63YH	759	2.1	64.6	327	36 × 86
KM1 - KM5	256054	760	2.1	105.6...197.6	327	18 × 85

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Ряды с недостаточной шириной разделены на подряды. Новые расстояния и способ крепления согласовать.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Актуальная спецификация

ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 775 | ЭОМ, PDF стр. 42

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
776	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
777	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
778	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
779	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
780	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
781	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 42

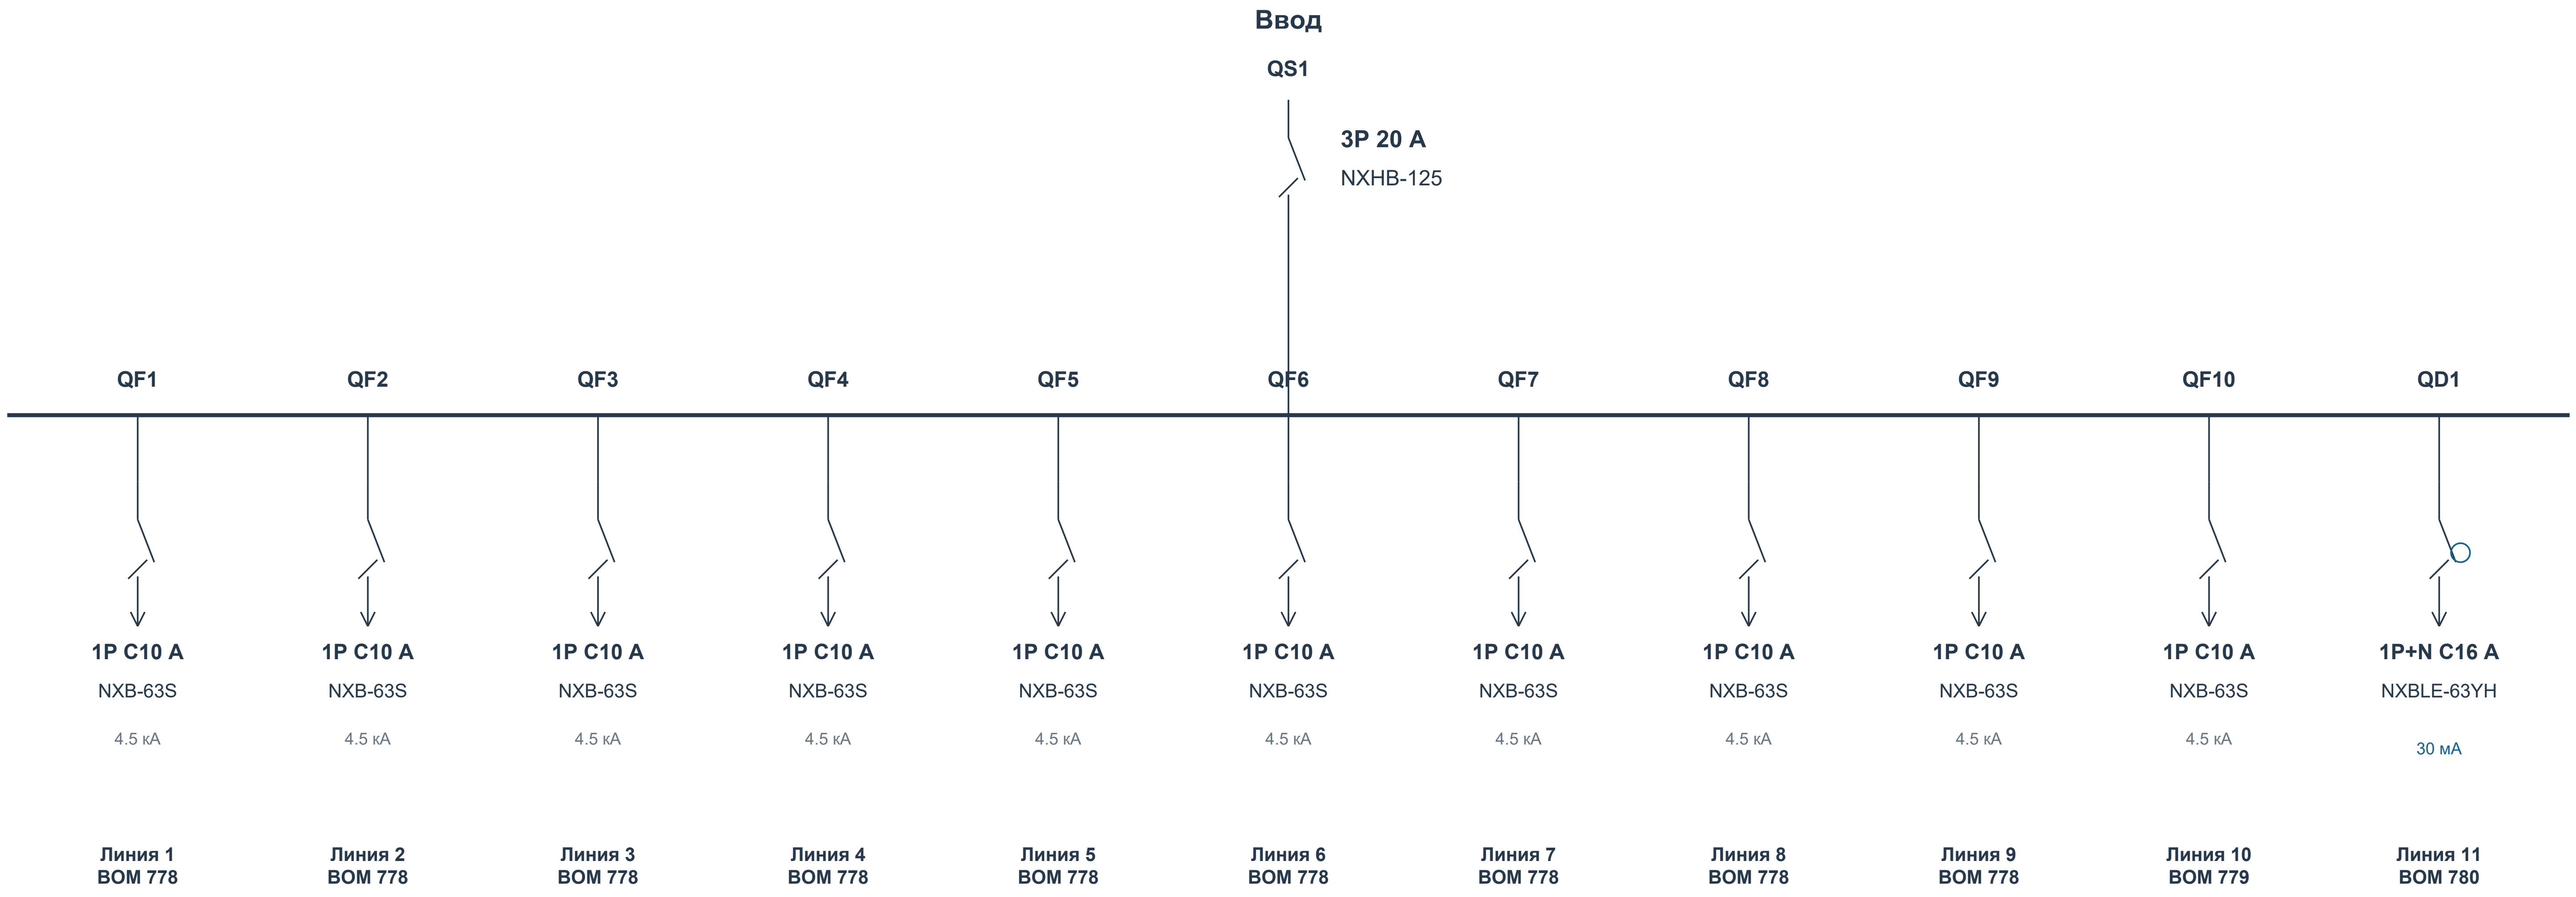
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QD1
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 778
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 778
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 778
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 778
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 778
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 778
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 778
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 8
BOM 778
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 9
BOM 778
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 10
BOM 779
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 11
BOM 780

Управление / учет: КМ1 - КМ2 256054 × 2

Данные исходного проекта: Ру 4.56 кВт | Рр 4,56 кВт | Iр 7,30 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

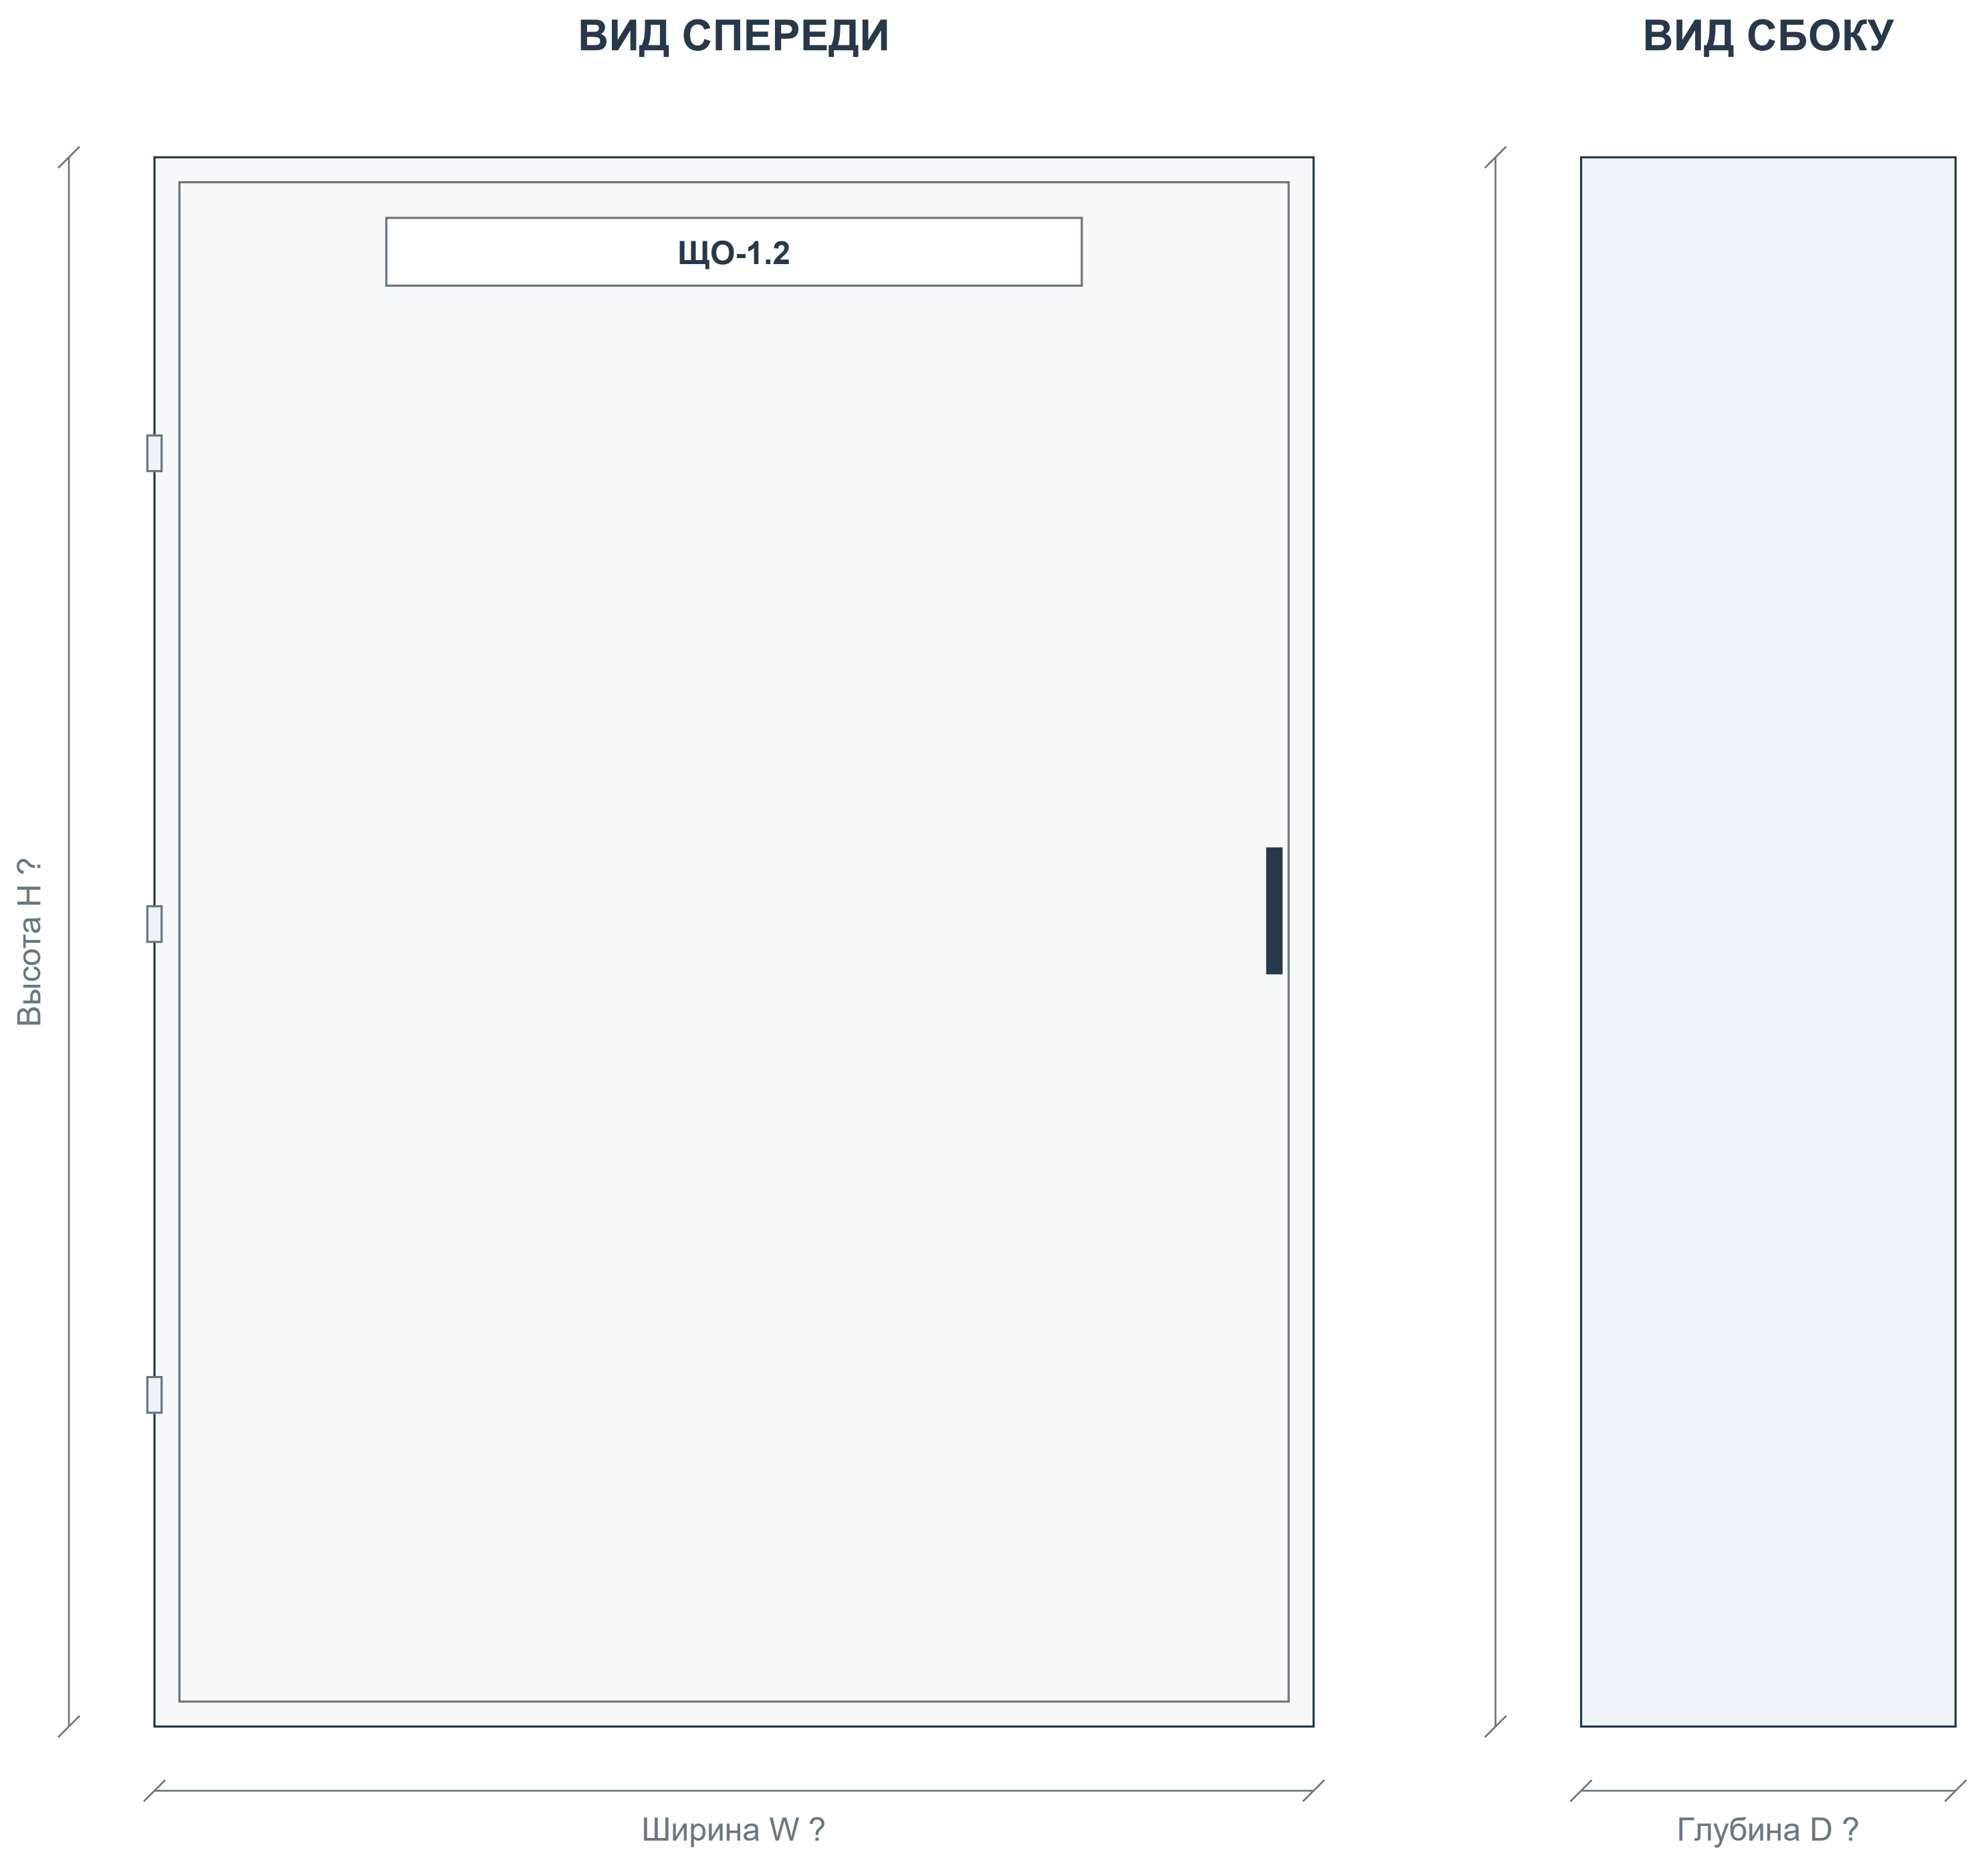

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

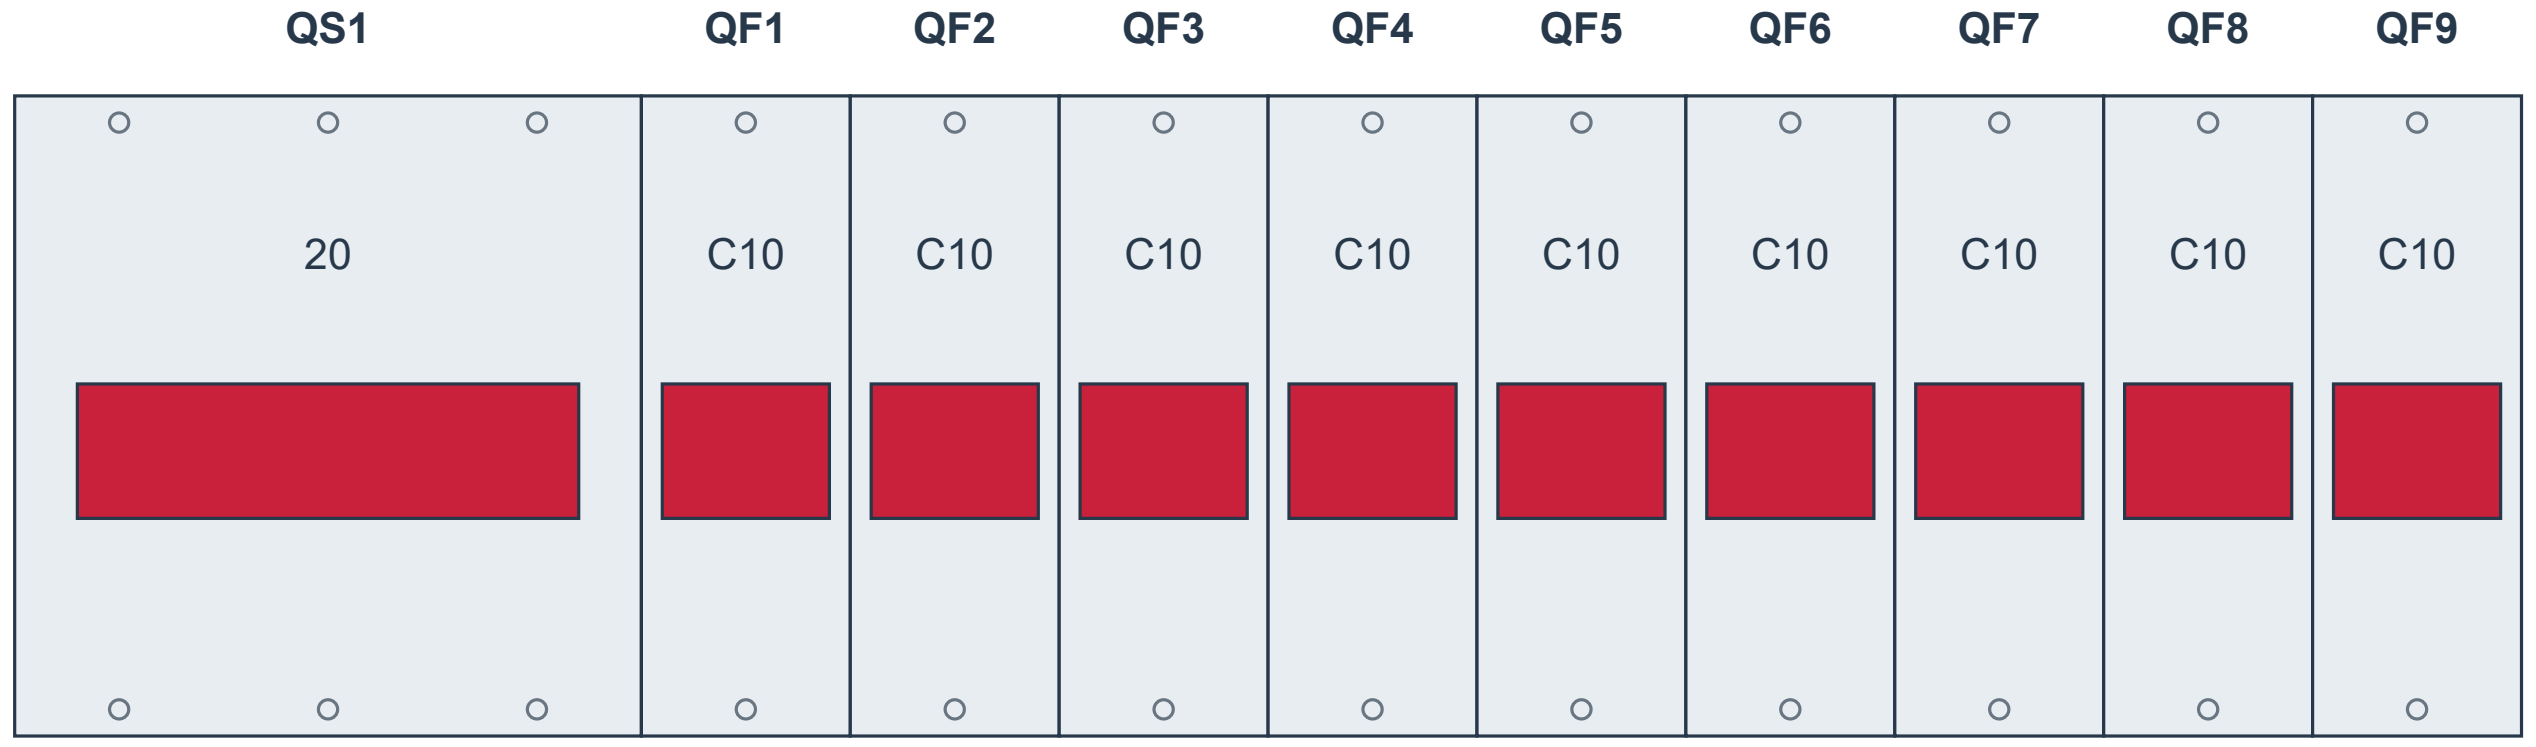

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

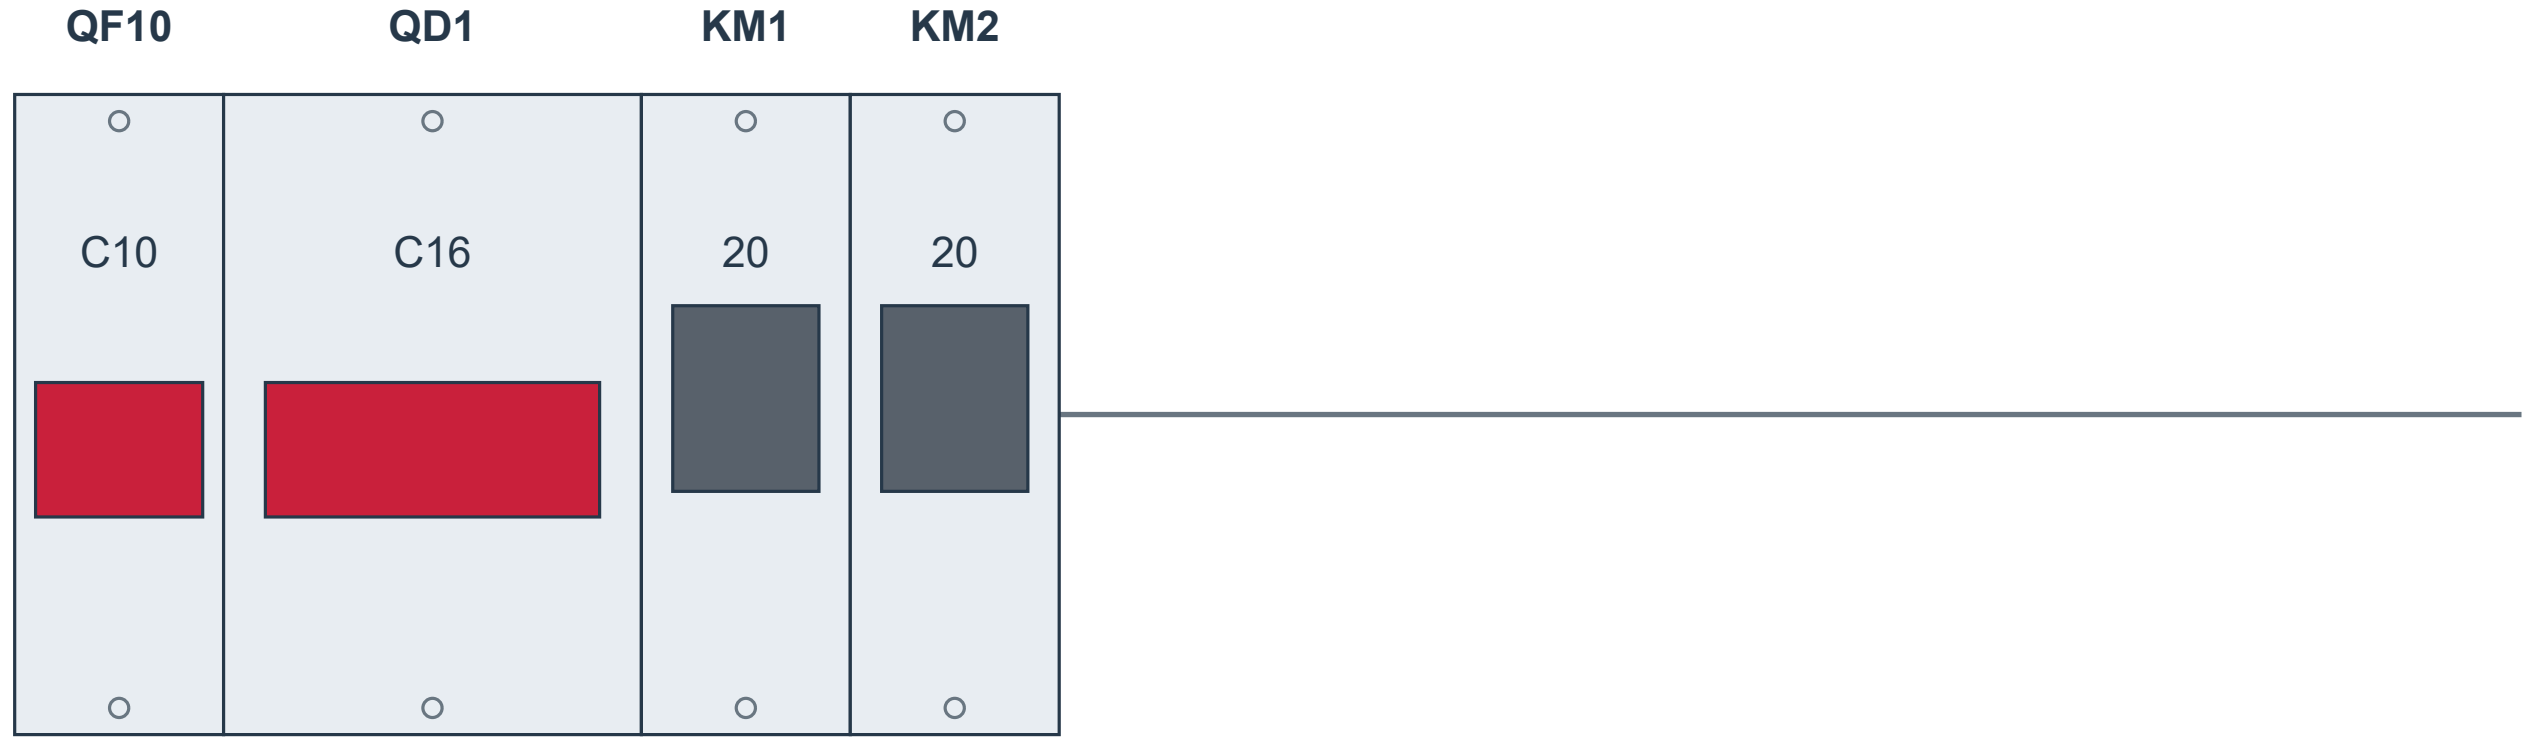

Сумма ширин: 90 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	777	1	0	?	54 B
QF1 - QF9	NXB-63S	778	1	54...198	?	18 B
QF10	NXB-63S	779	2	0	?	18 B
QD1	NXBLE-63YH	780	2	18	?	36 B
KM1 - KM2	256054	781	2	54...72	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Актуальная спецификация

ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | ВОМ стр. 796 | ЭОМ, PDF стр. 43

ВОМ стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
797	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
798	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
799	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
800	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
801	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	7	7	chint	Отход.

Количества: полный ВОМ, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: ВОМ для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 43

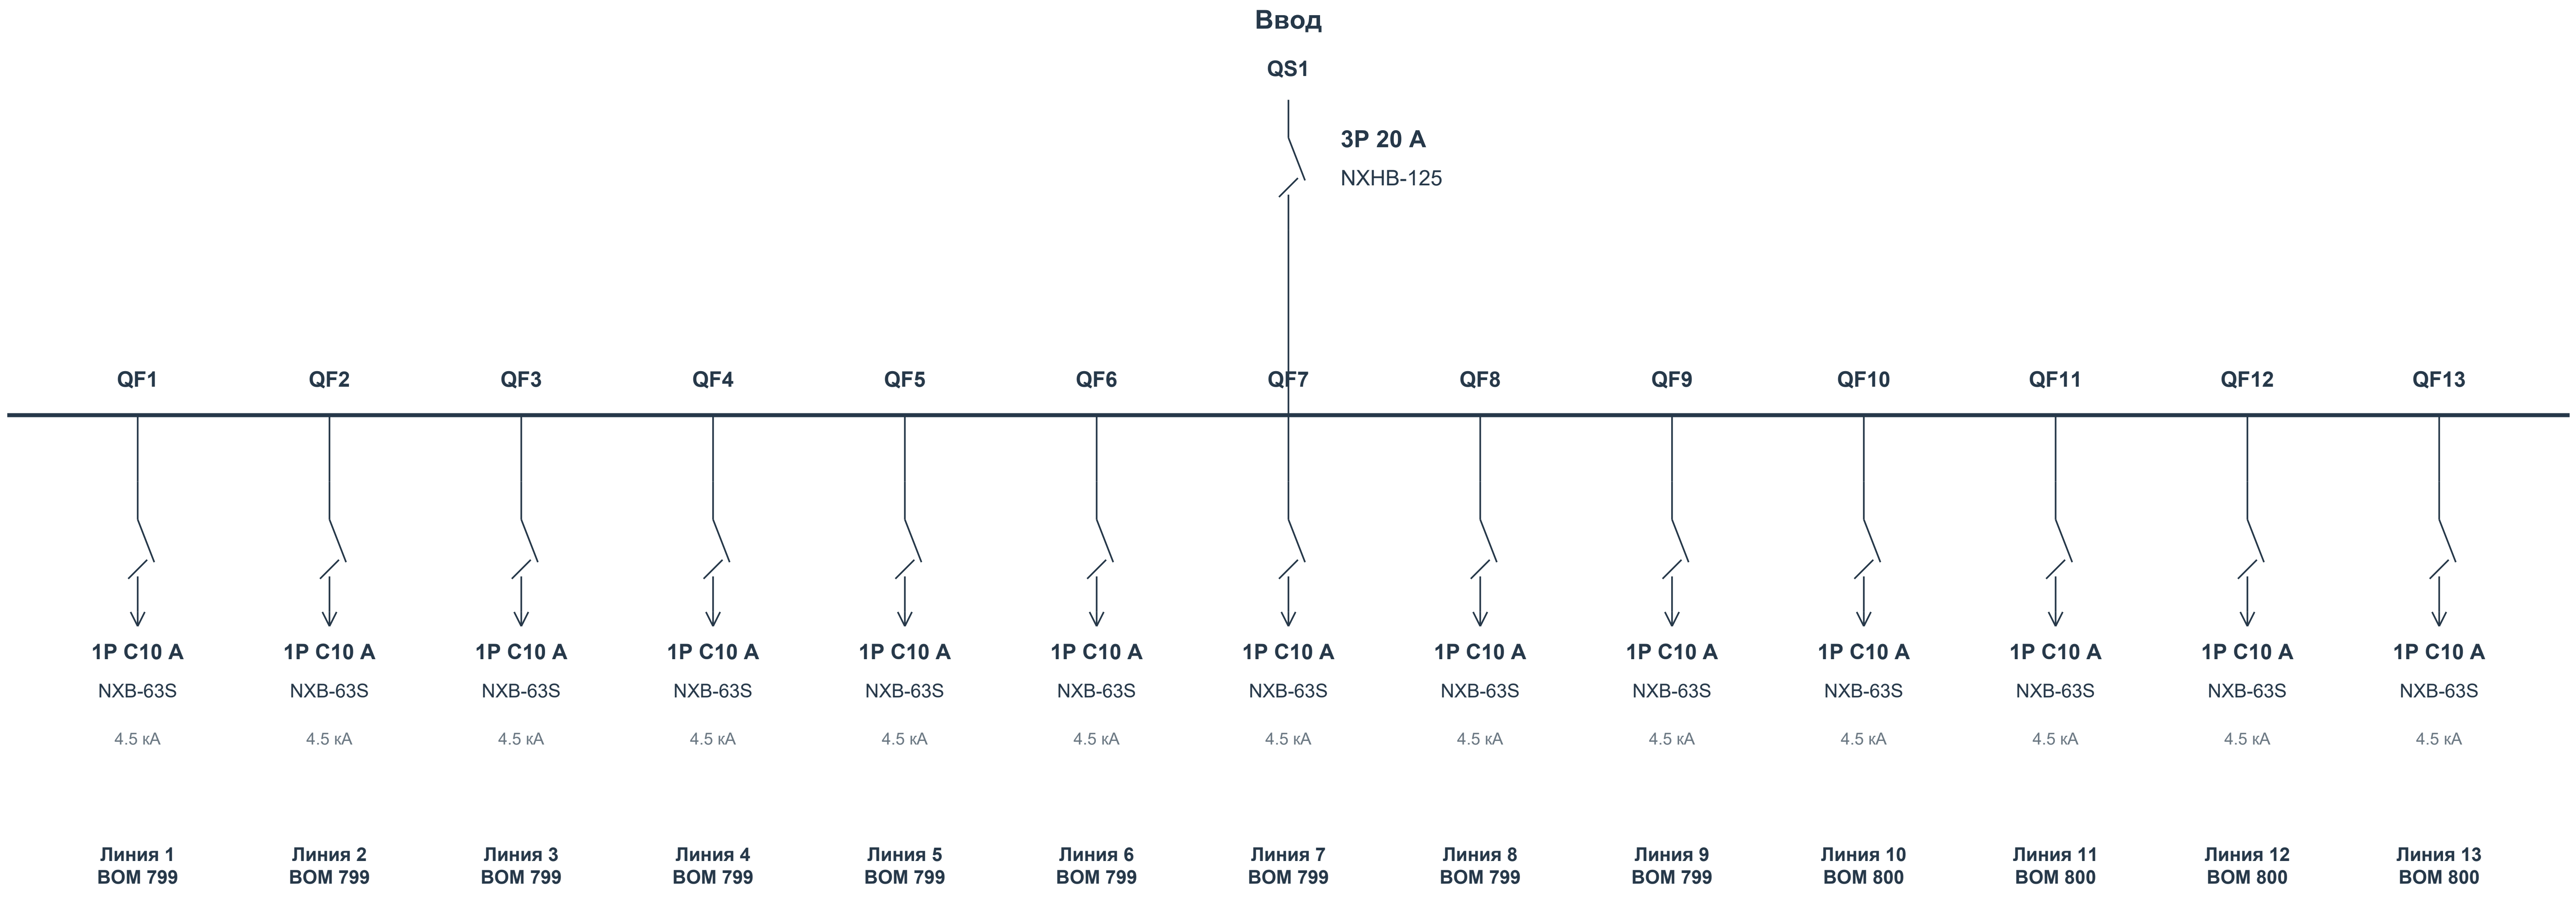
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QF11
QF12
QF13
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 799
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 799
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 799
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 799
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 799
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 799
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 799
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 8
BOM 799
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 9
BOM 799
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 10
BOM 800
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 11
BOM 800
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 12
BOM 800
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 13
BOM 800

Управление / учет: KM1 - KM7 256054 × 7

Данные исходного проекта: Ру 7.17 кВт | Рр 7,17 кВт | Ір 11,48 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: ВОМ. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

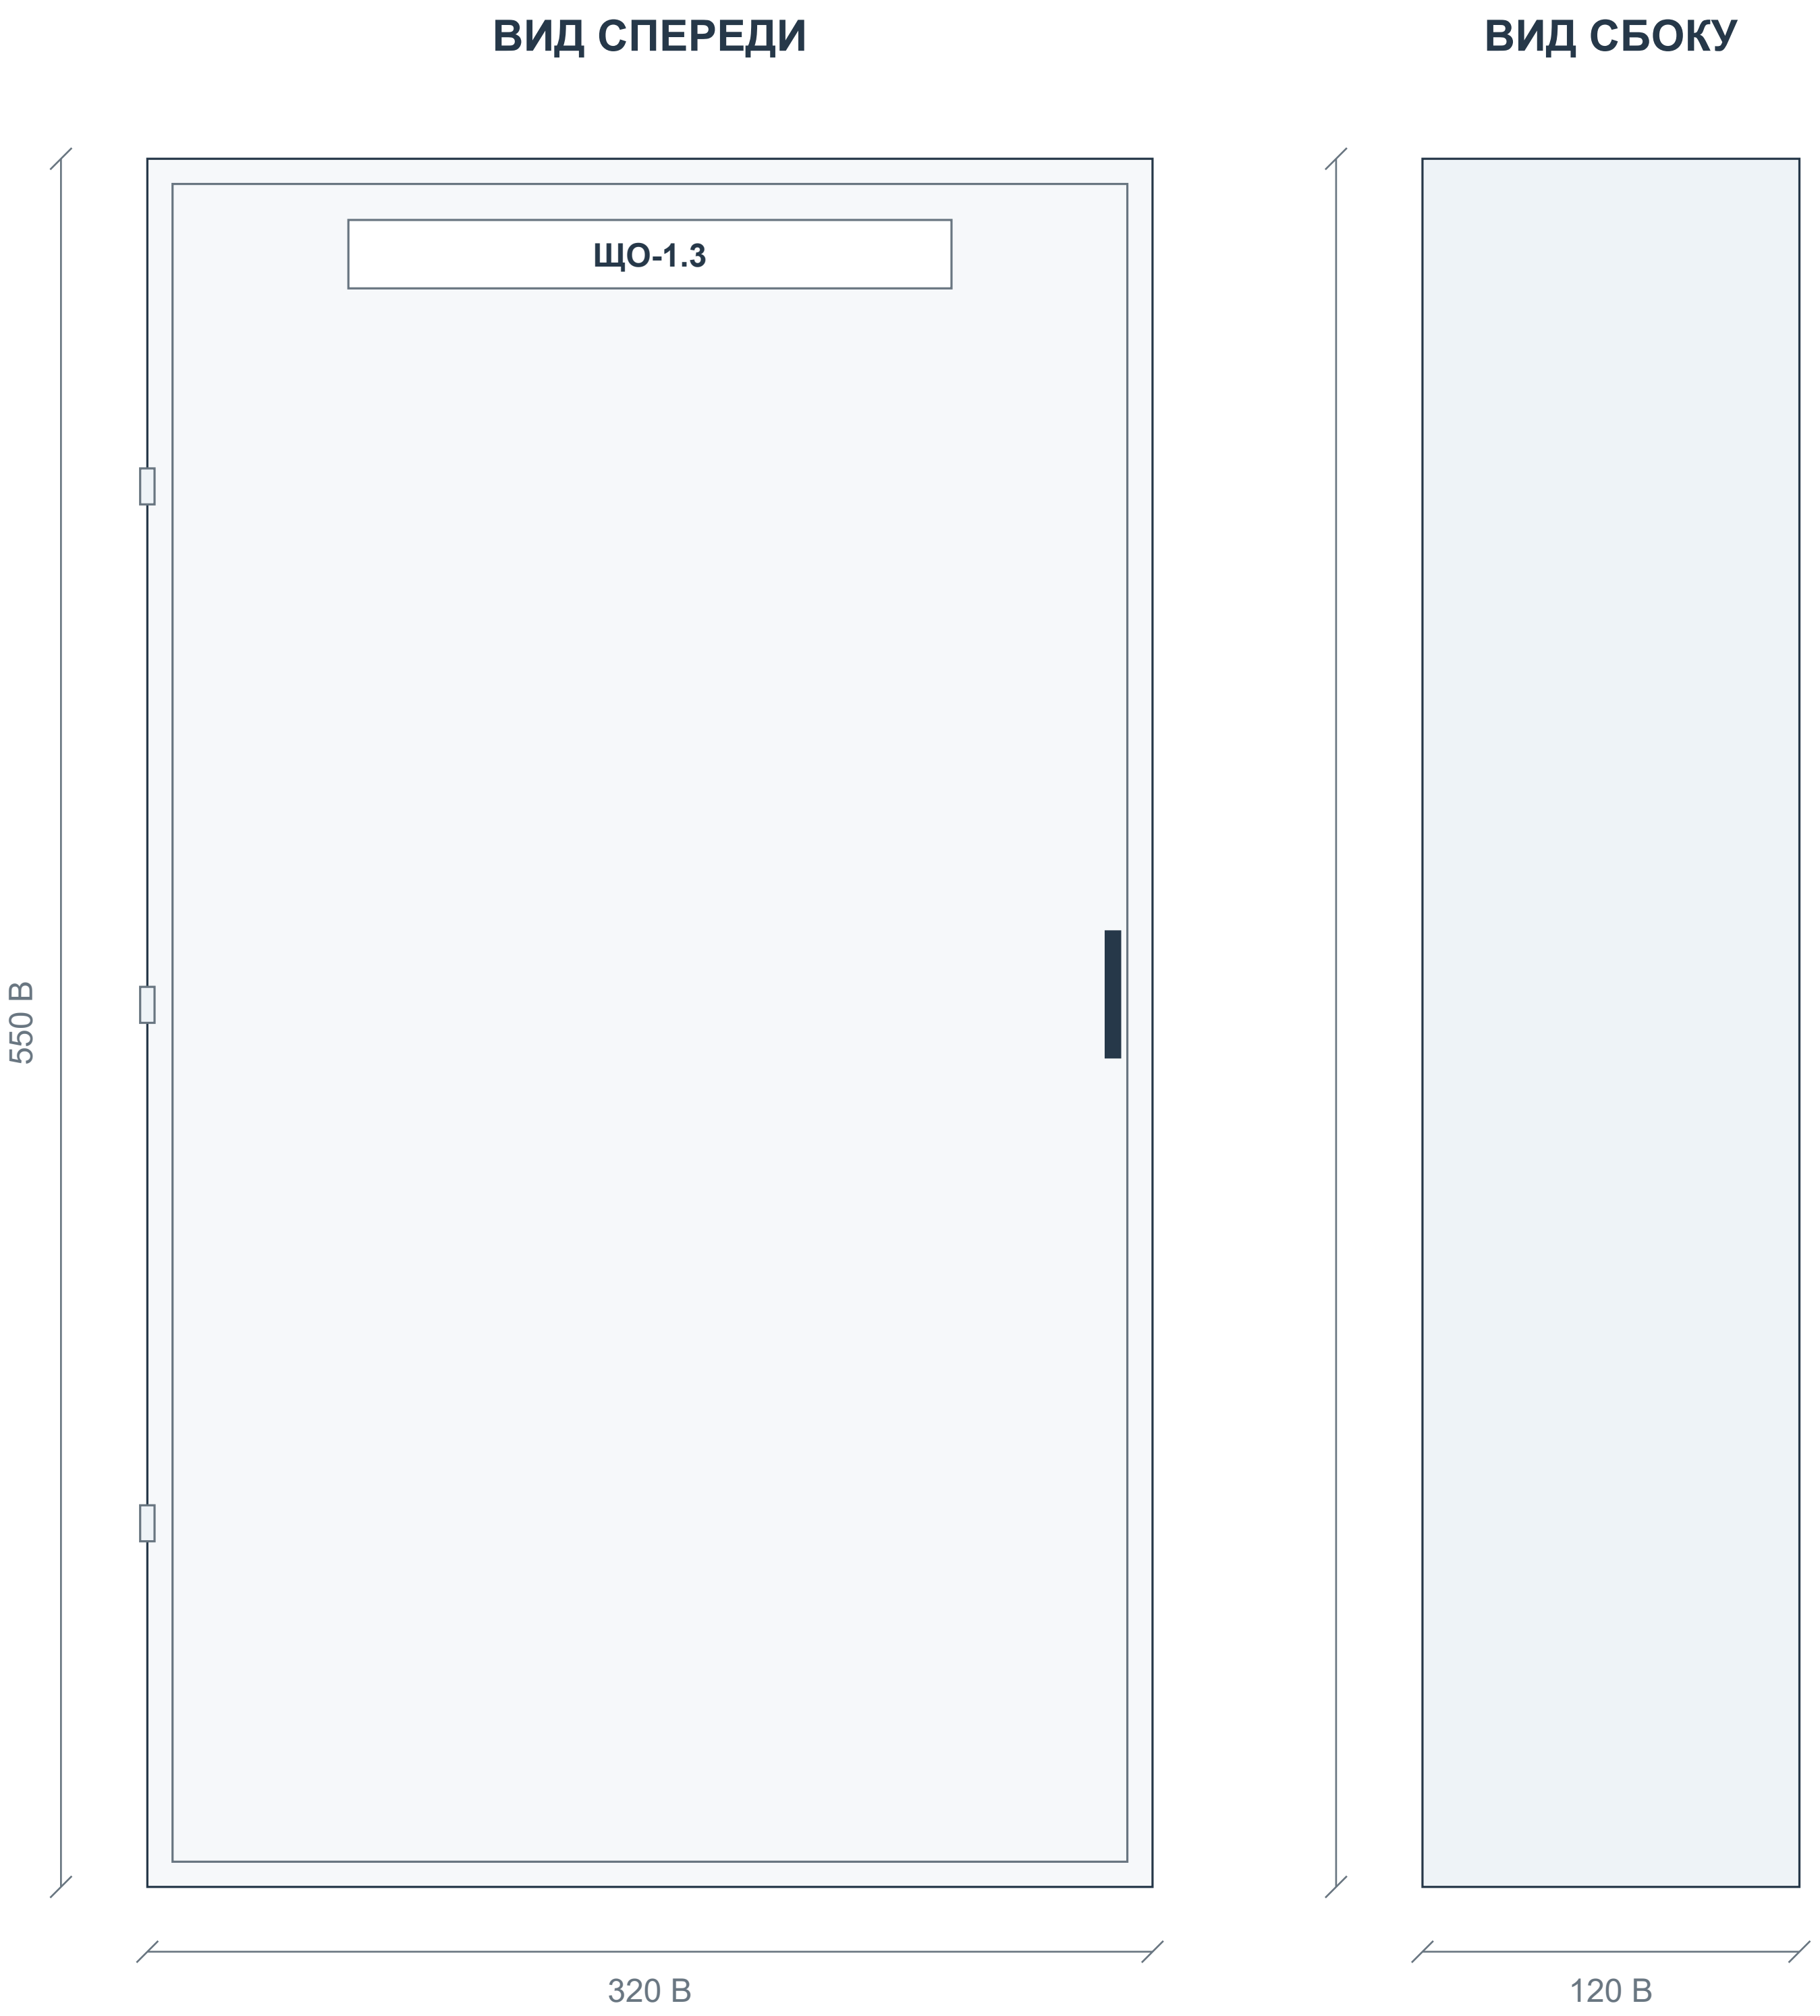

Корпус: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550х320х120) (IEK)

Габаритное описание и количество секций - ВОМ. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по ВОМ. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем ВОМ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

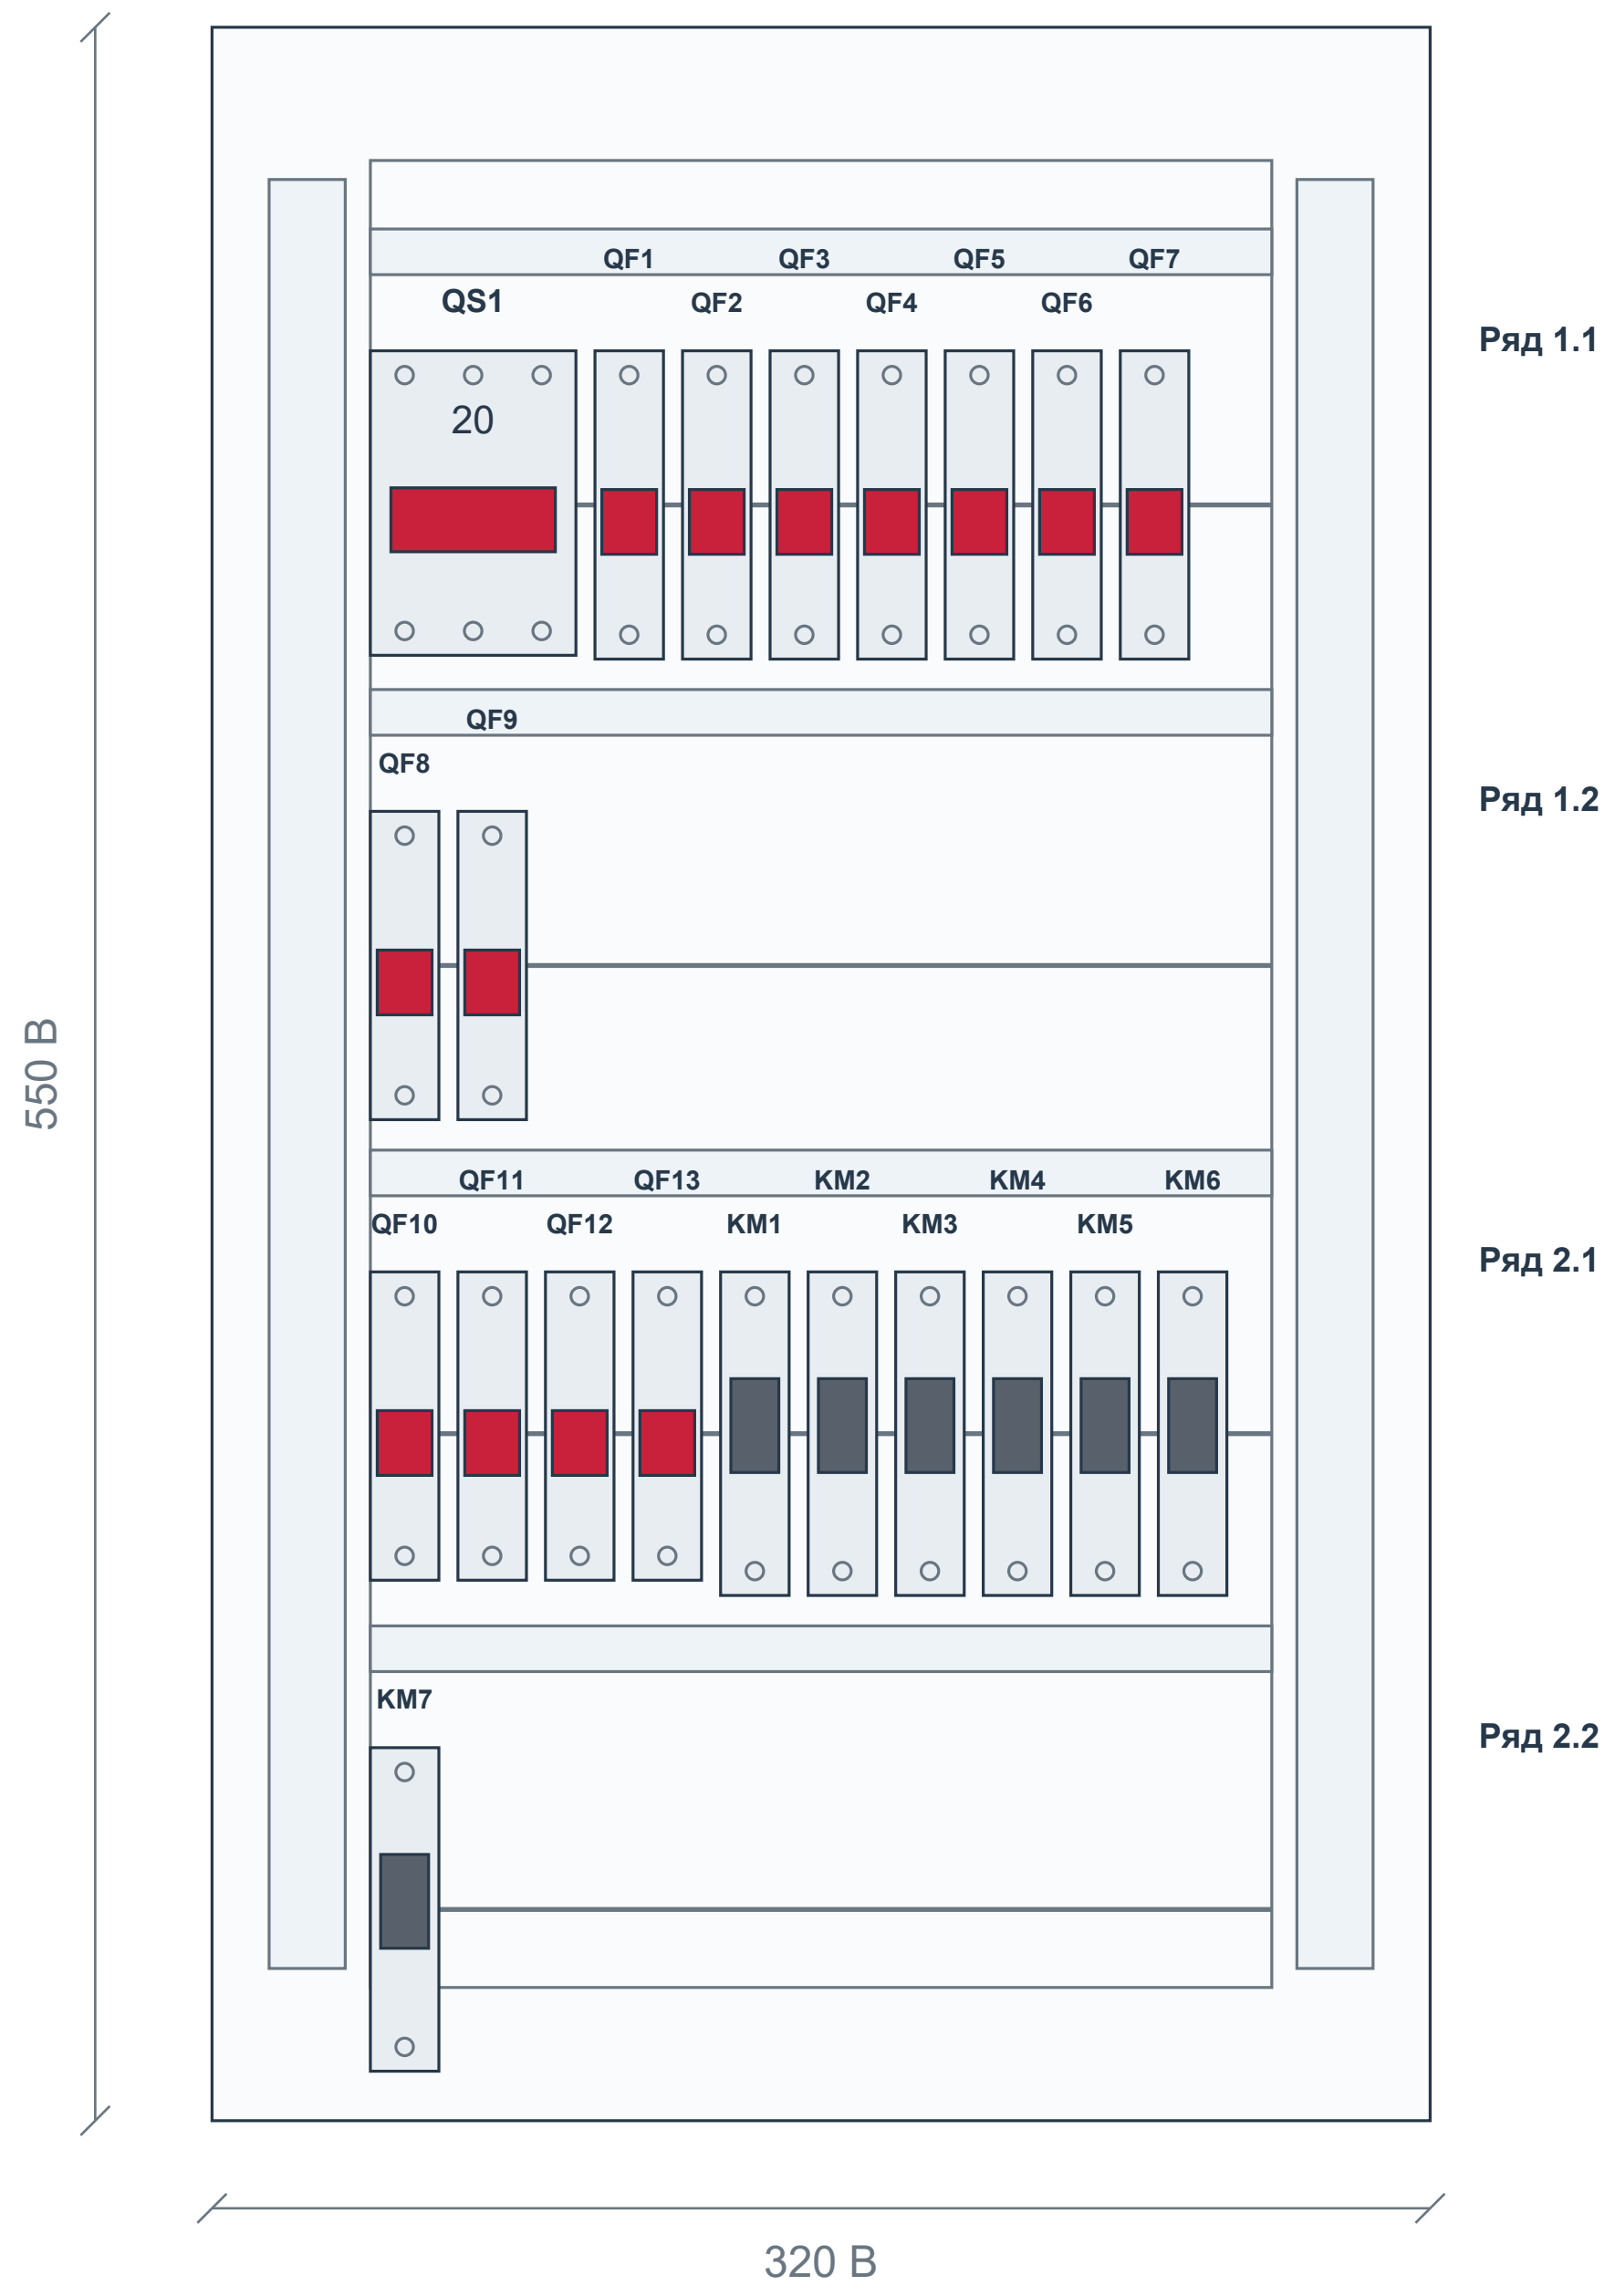

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	798	1.1	41.6	85	54 × 80
QF1 - QF9	NXB-63S	799	1.1/1.2	100.6...238.6 / 41.6...64.6	85/206	18 × 81
QF10 - QF13	NXB-63S	800	2.1	41.6...110.6	327	18 × 81
KM1 - KM7	256054	801	2.1/2.2	133.6...248.6 / 41.6	327/452	18 × 85

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

КОНТРОЛЬ: предложенная компоновка по высоте превышает корпус. Требуется переразмещение / другой корпус; изготовление не разрешено.

Ряды с недостаточной шириной разделены на подряды. Новые расстояния и способ крепления согласовать.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Актуальная спецификация

ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 814 | ЭОМ, PDF стр. 44

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
815	713-09054	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
816	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
817	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	7	7	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: ВОМ. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 44

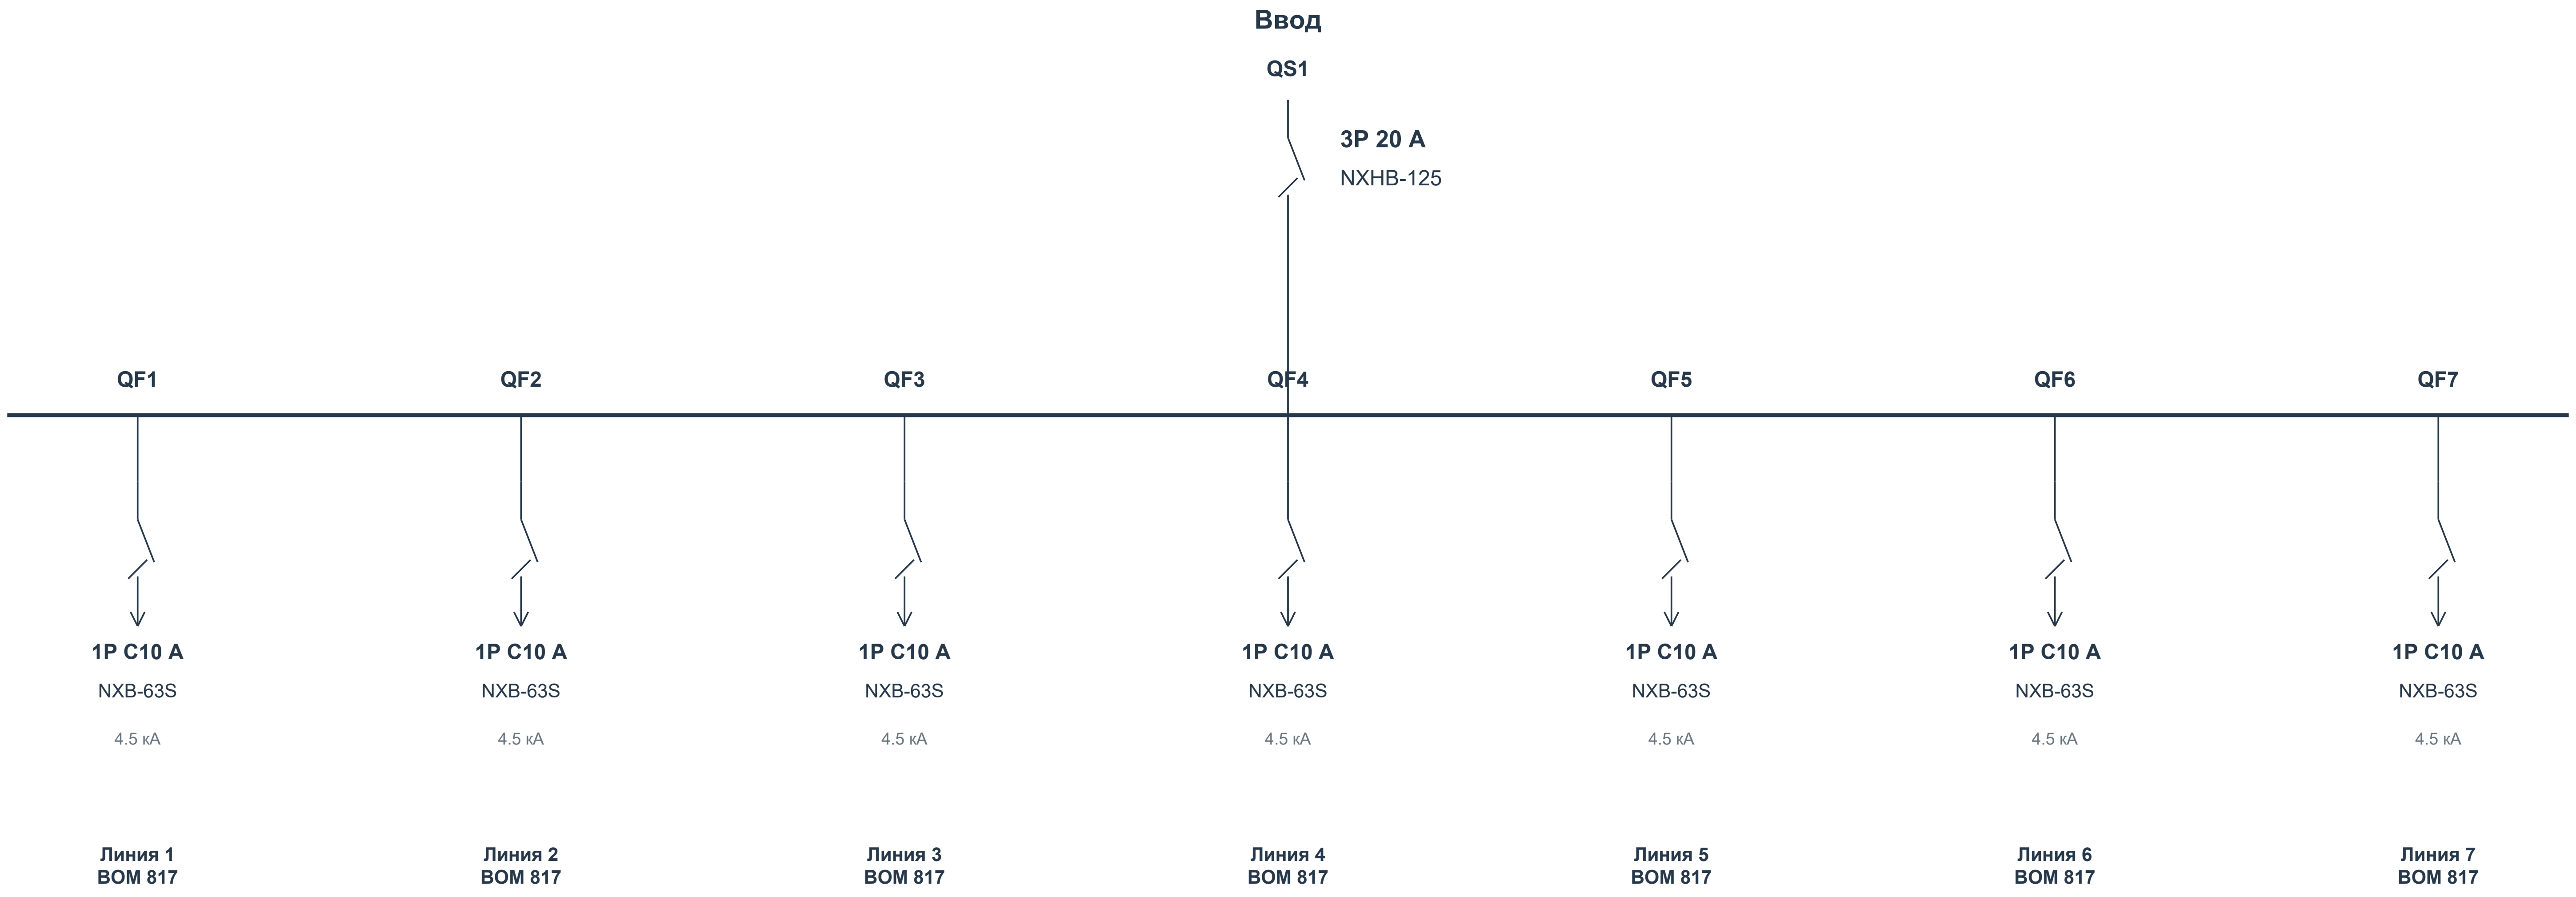
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 817
Линия 2
BOM 817
Линия 3
BOM 817
Линия 4
BOM 817
Линия 5
BOM 817
Линия 6
BOM 817
Линия 7
BOM 817

Данные исходного проекта: Ру 2.10 кВт | Рр 2,10 кВт | Iр 3,36 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий ВОМ.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

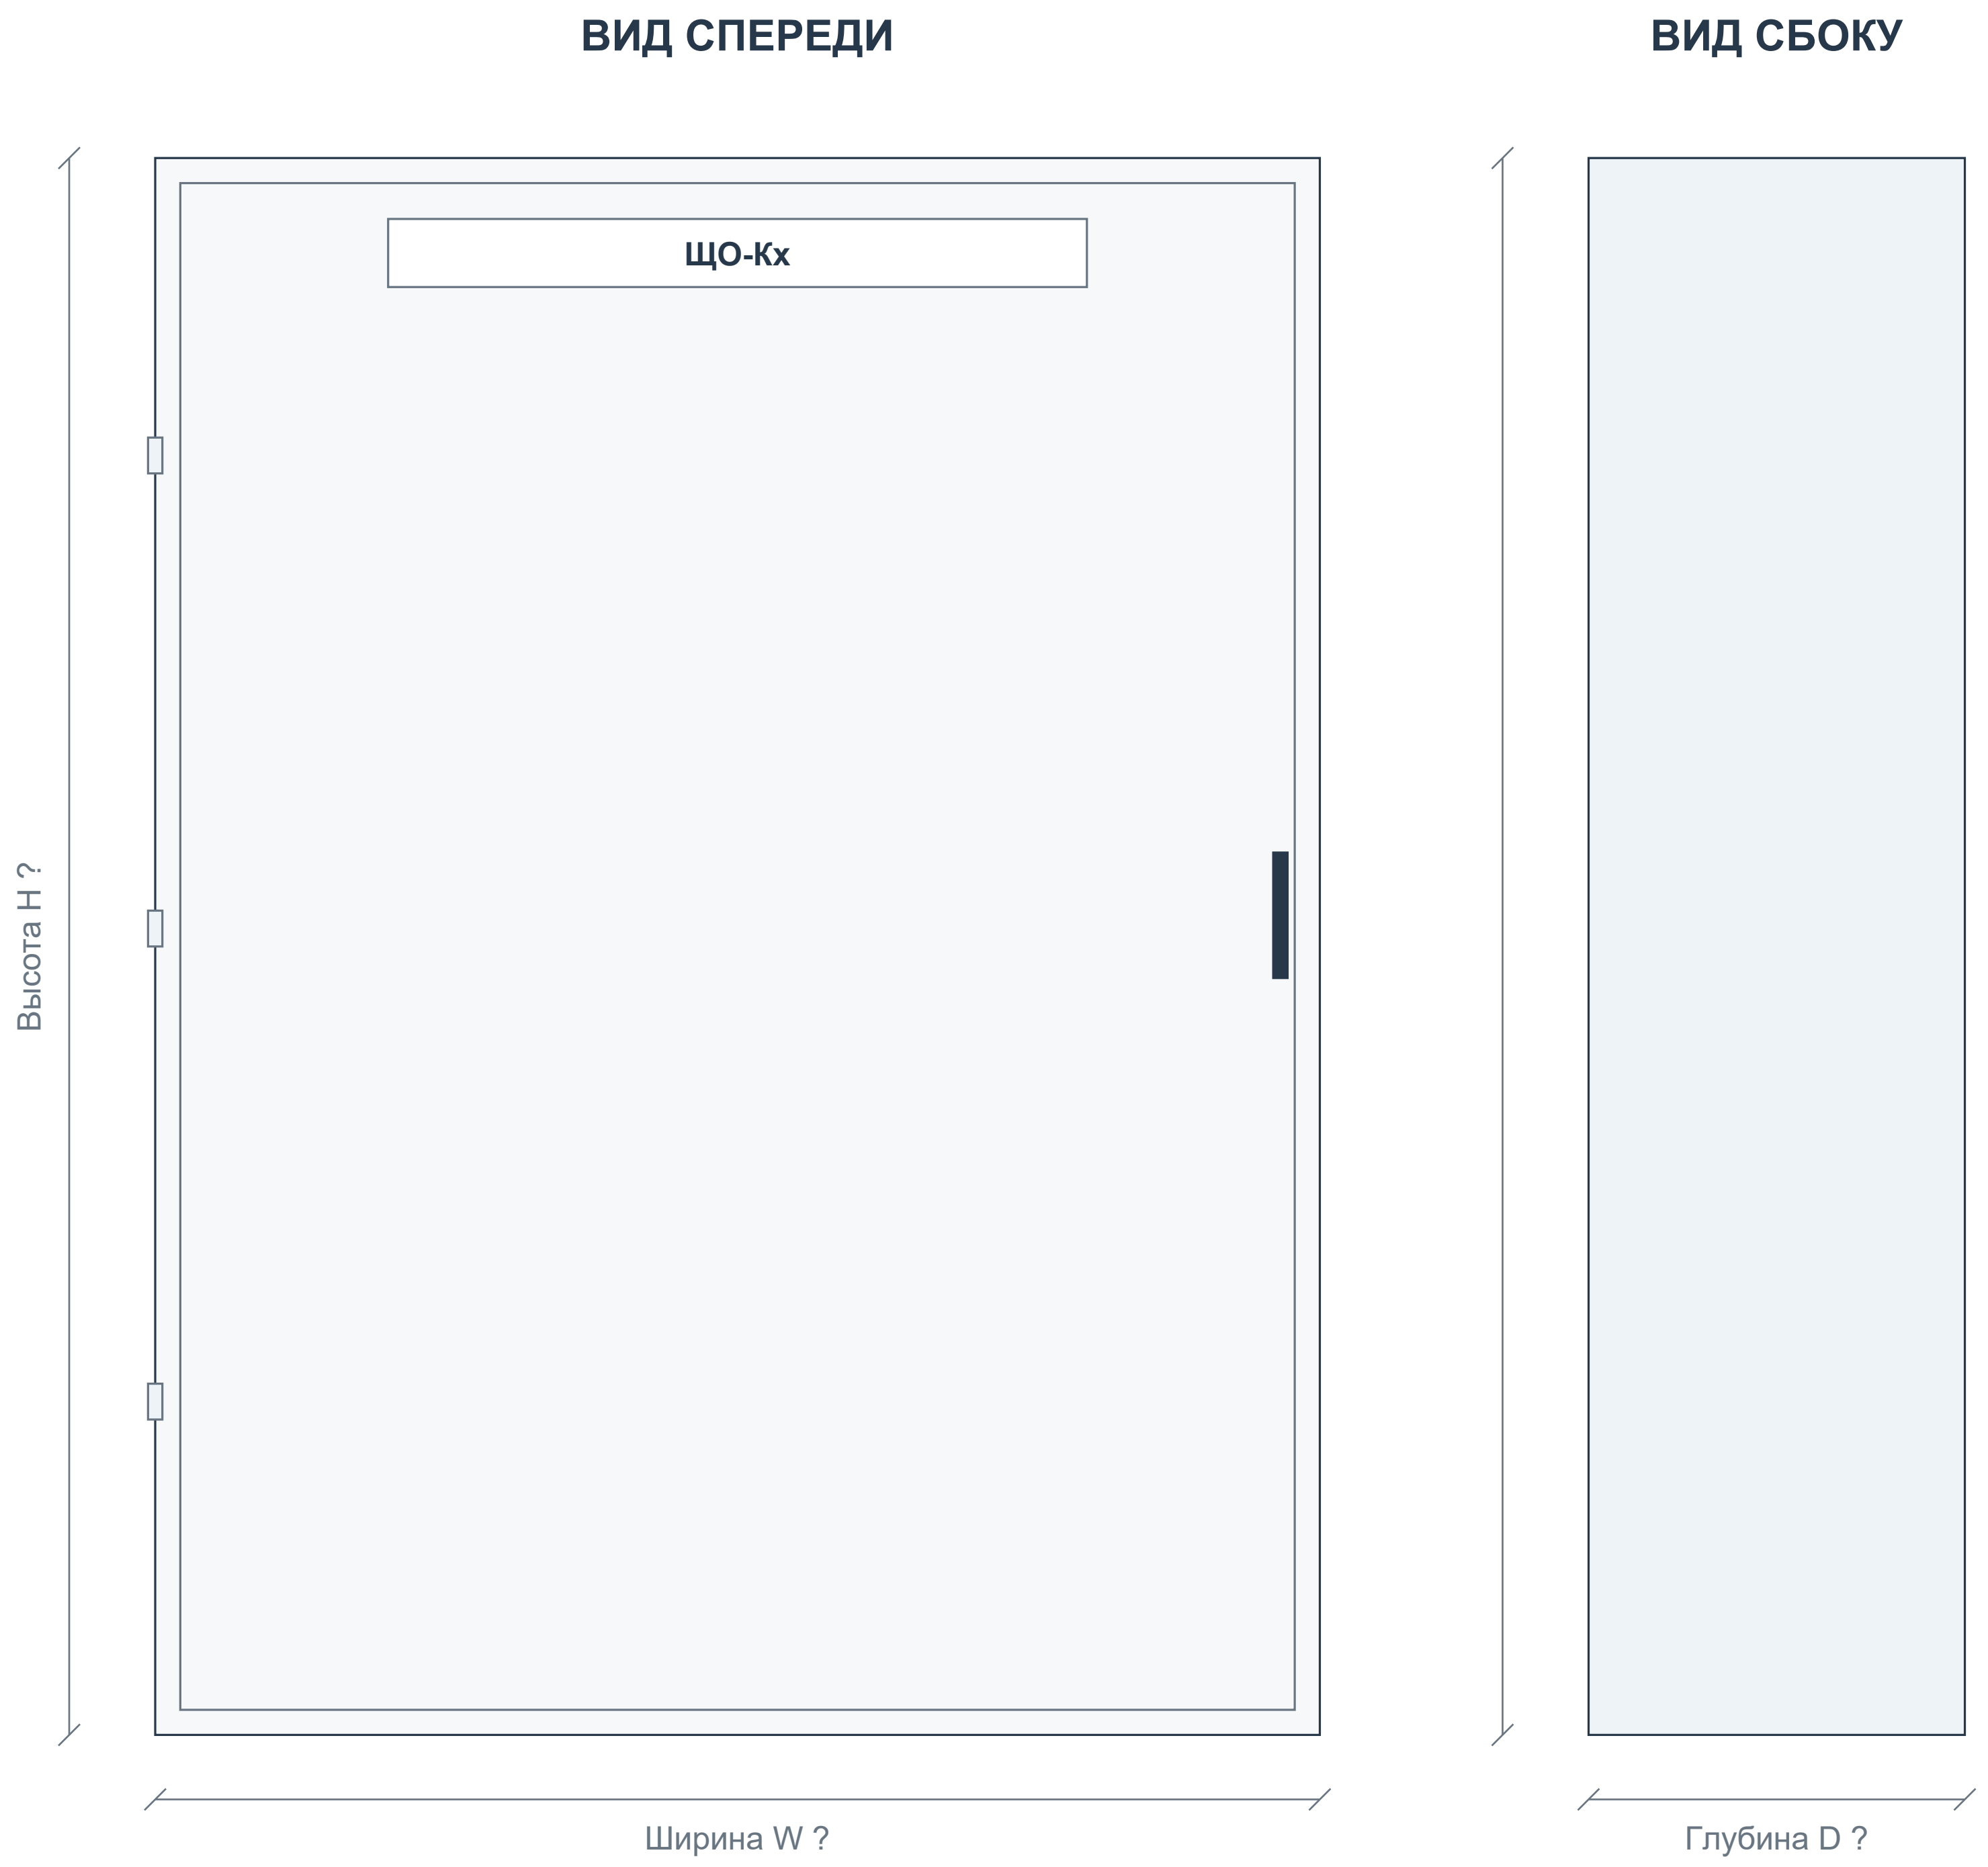

Корпус: Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

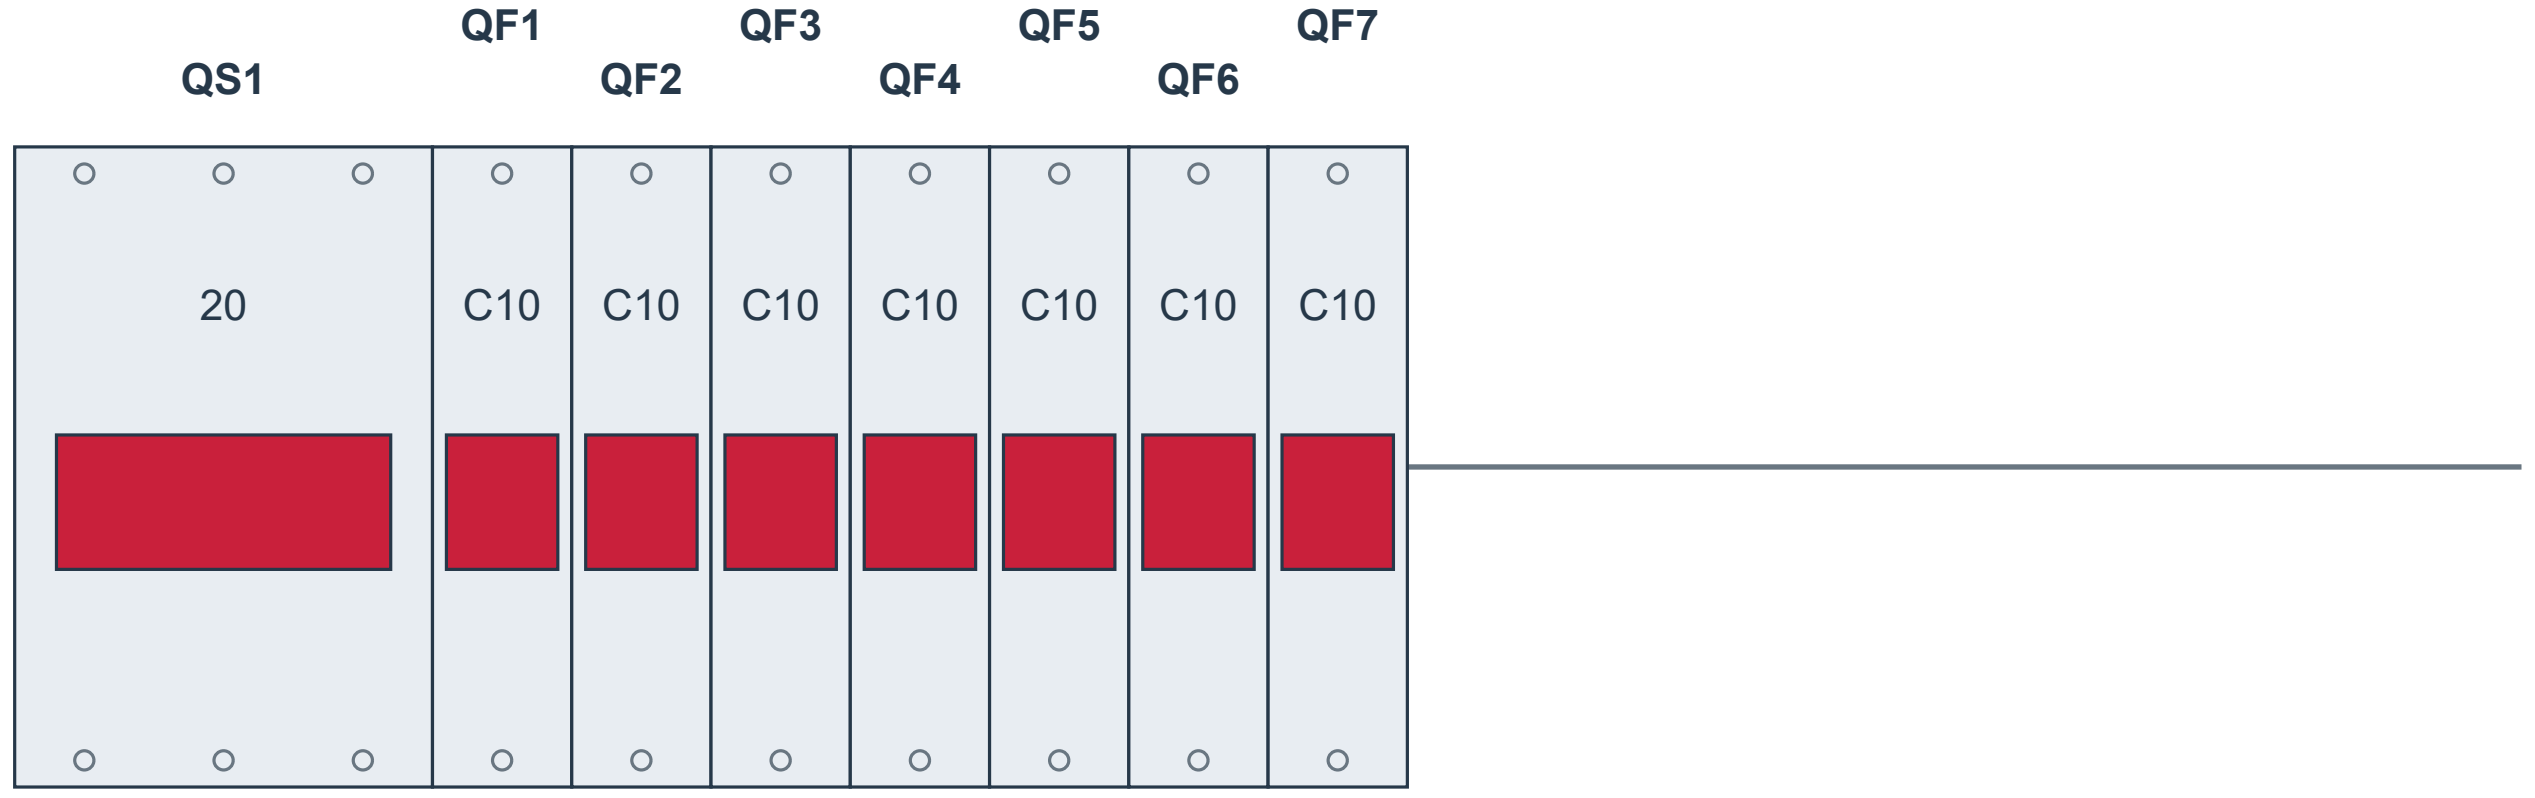

Сумма ширин: 180 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	816	1	0	?	54 B
QF1 - QF7	NXB-63S	817	1	54...162	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 18 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Актуальная спецификация

ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 829 | ЭОМ, PDF стр. 45

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
830	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
831	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
832	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
833	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	8	8	chint	Отход.
834	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	4	4	chint	Отход.
835	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	4	4	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 45

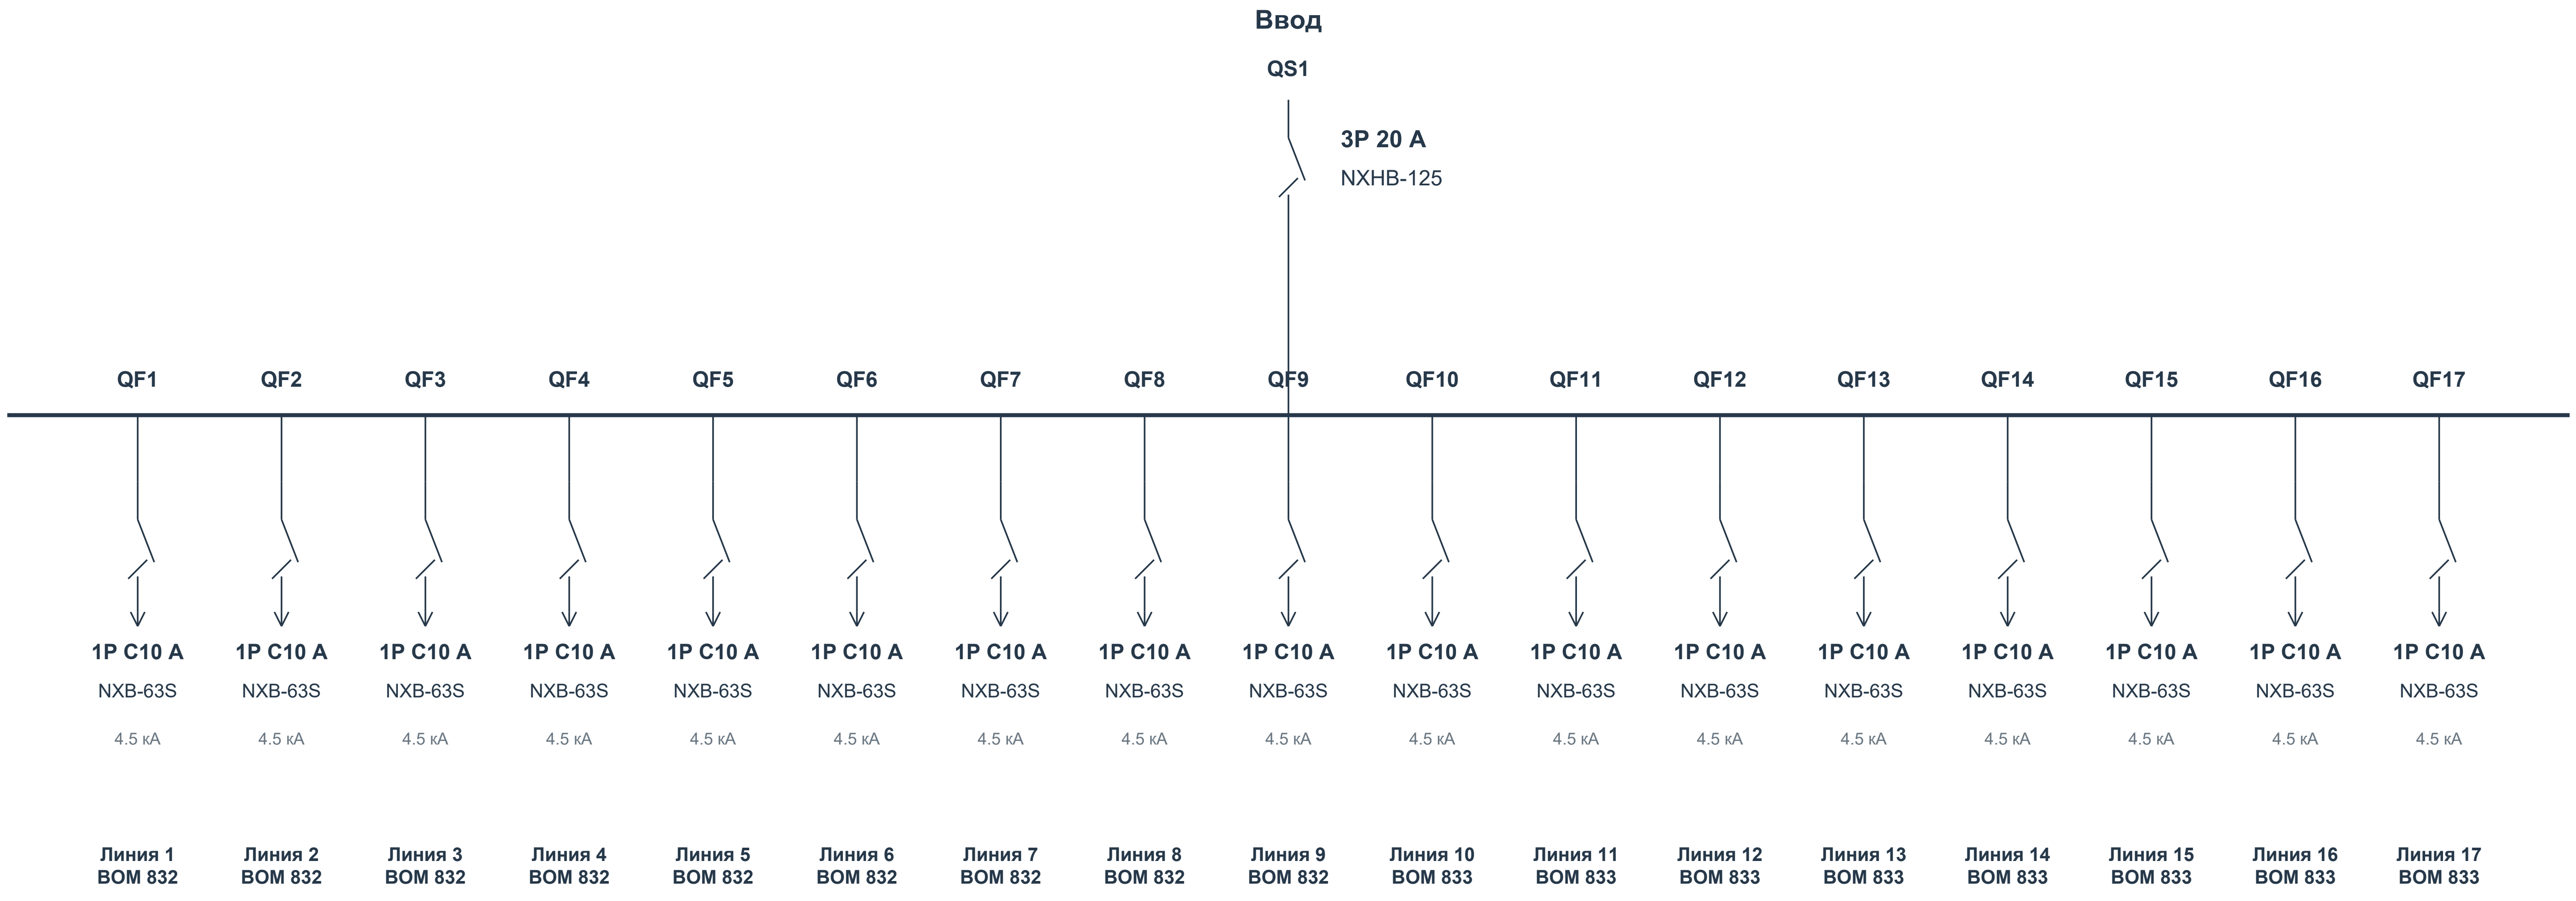
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QF11
QF12
QF13
QF14
QF15
QF16
QF17
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 832
Линия 2
BOM 832
Линия 3
BOM 832
Линия 4
BOM 832
Линия 5
BOM 832
Линия 6
BOM 832
Линия 7
BOM 832
Линия 8
BOM 832
Линия 9
BOM 832
Линия 10
BOM 833
Линия 11
BOM 833
Линия 12
BOM 833
Линия 13
BOM 833
Линия 14
BOM 833
Линия 15
BOM 833
Линия 16
BOM 833
Линия 17
BOM 833

Управление / учет: KM1 - KM8 256054 × 8

Данные исходного проекта: Ру 4.08 кВт | Рр 4,08 кВт | Ip 6,53 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

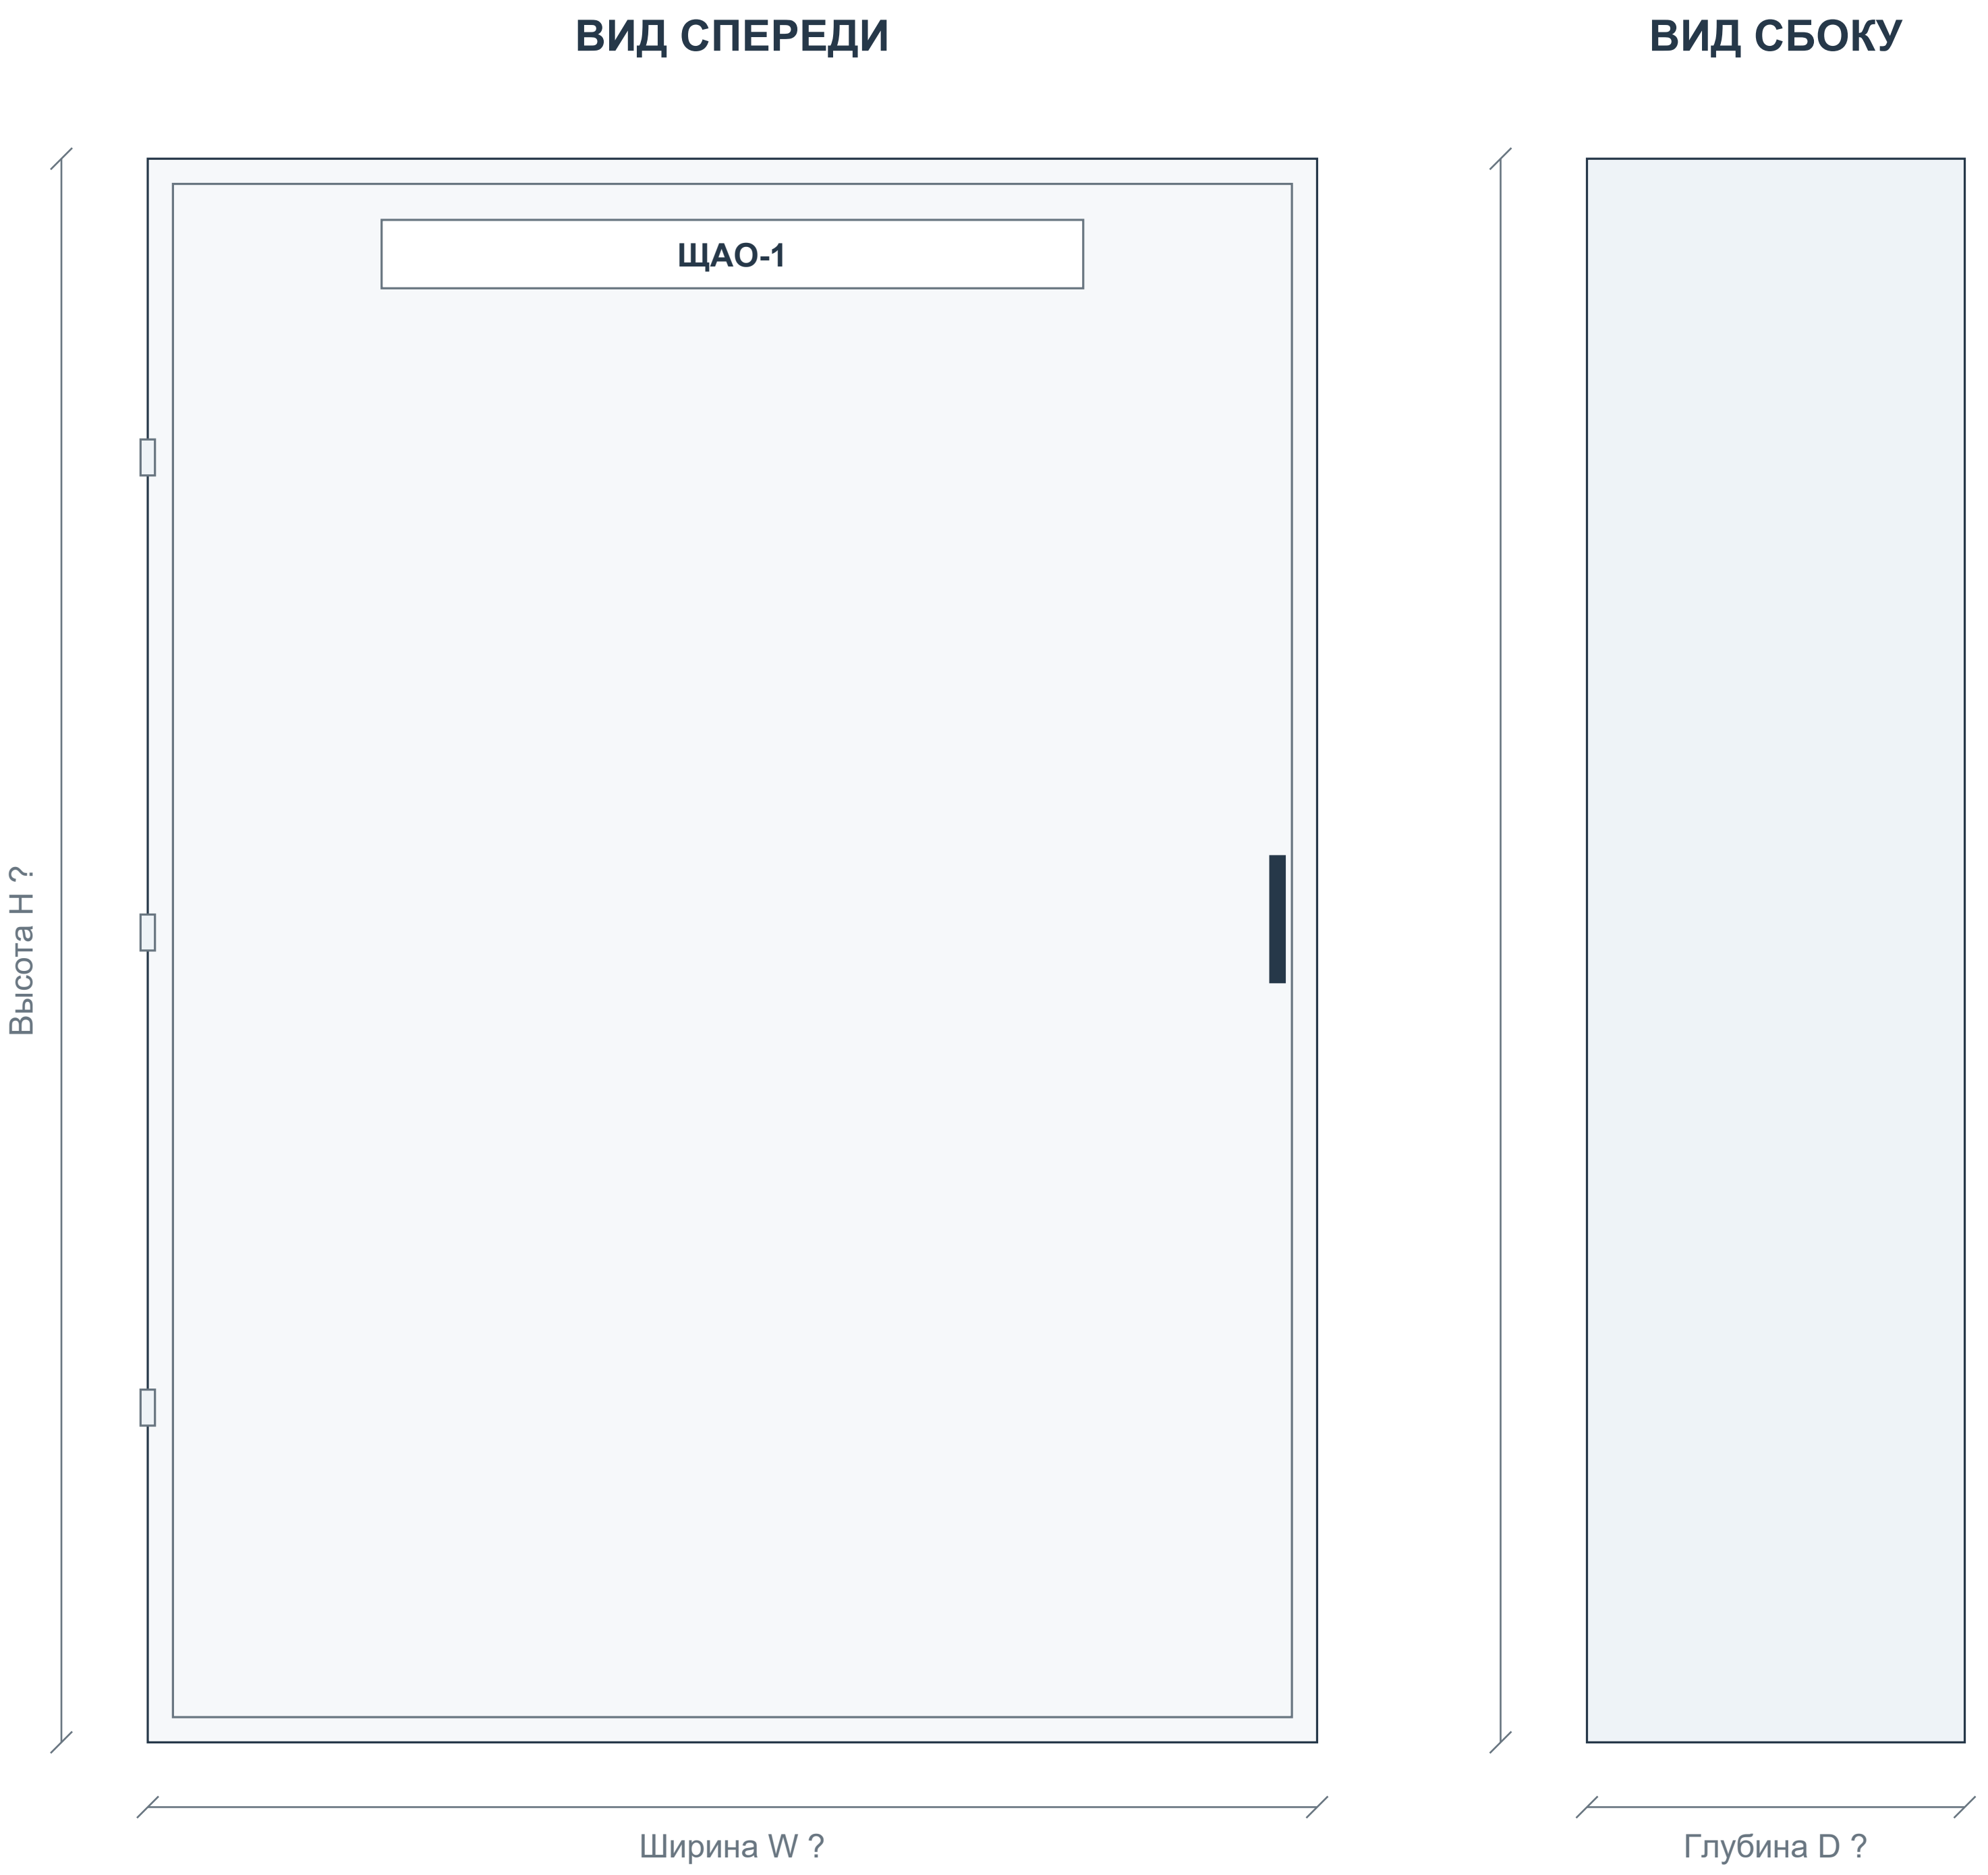

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

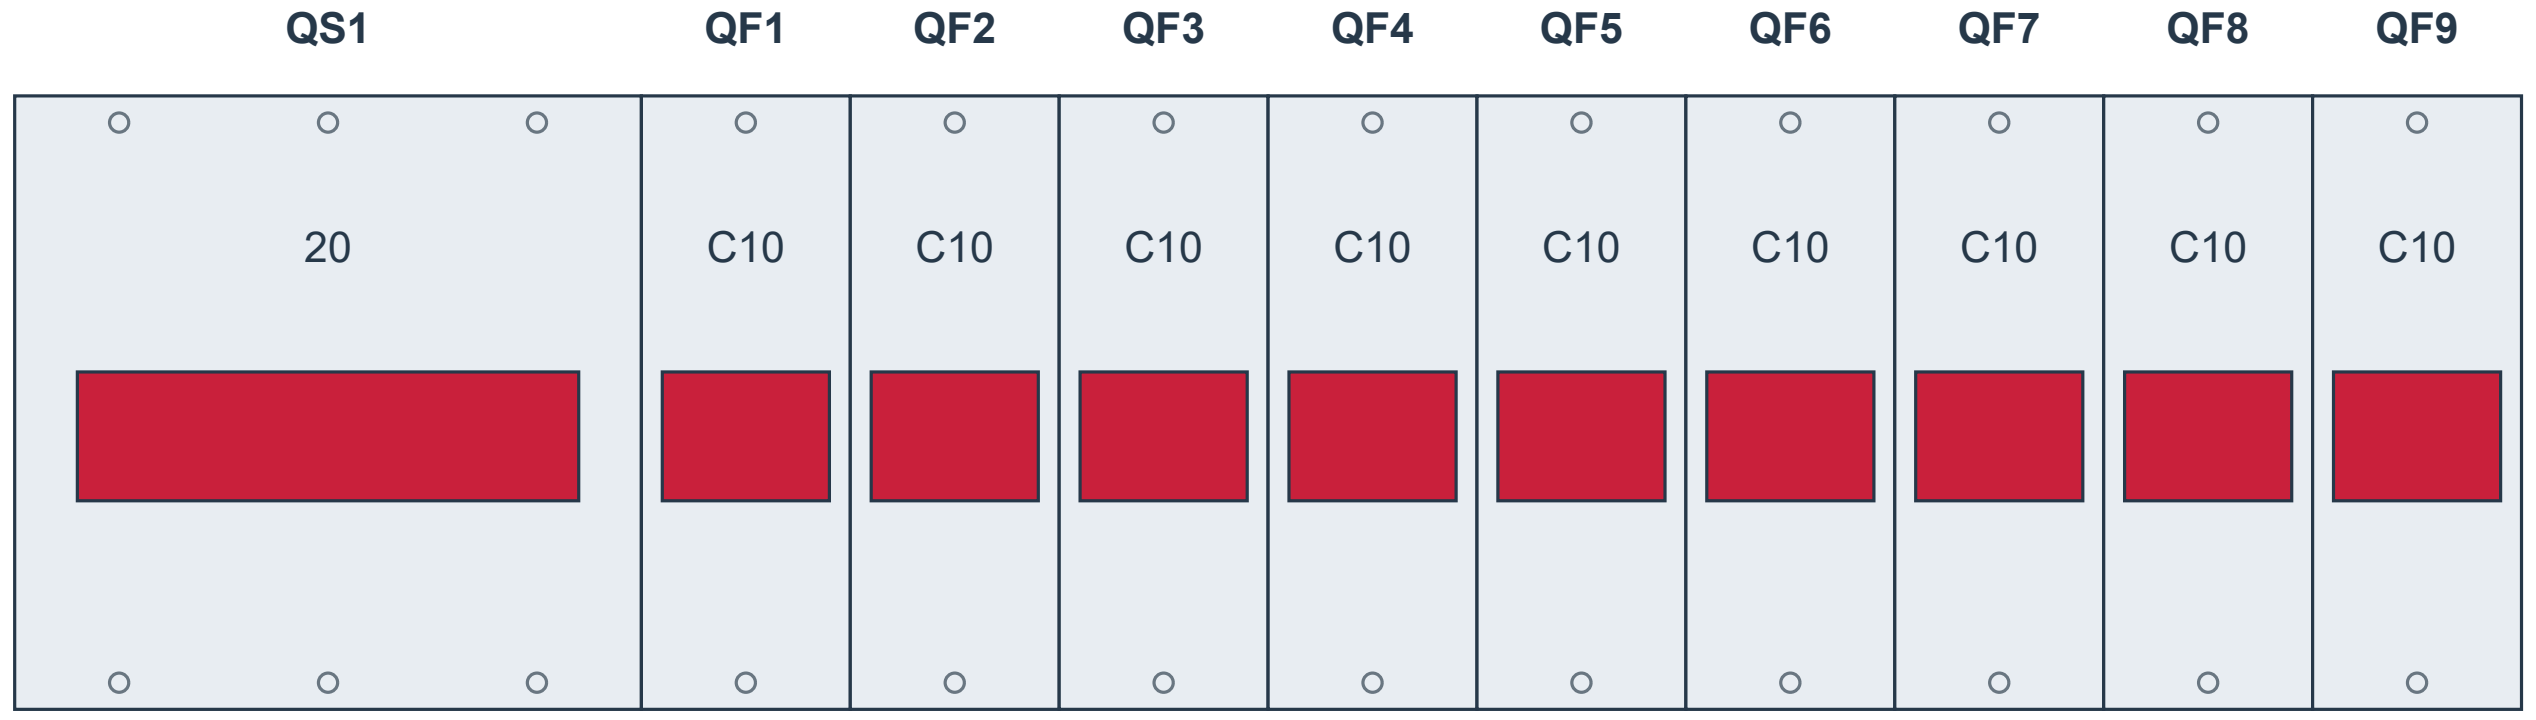
QS1
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
20
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

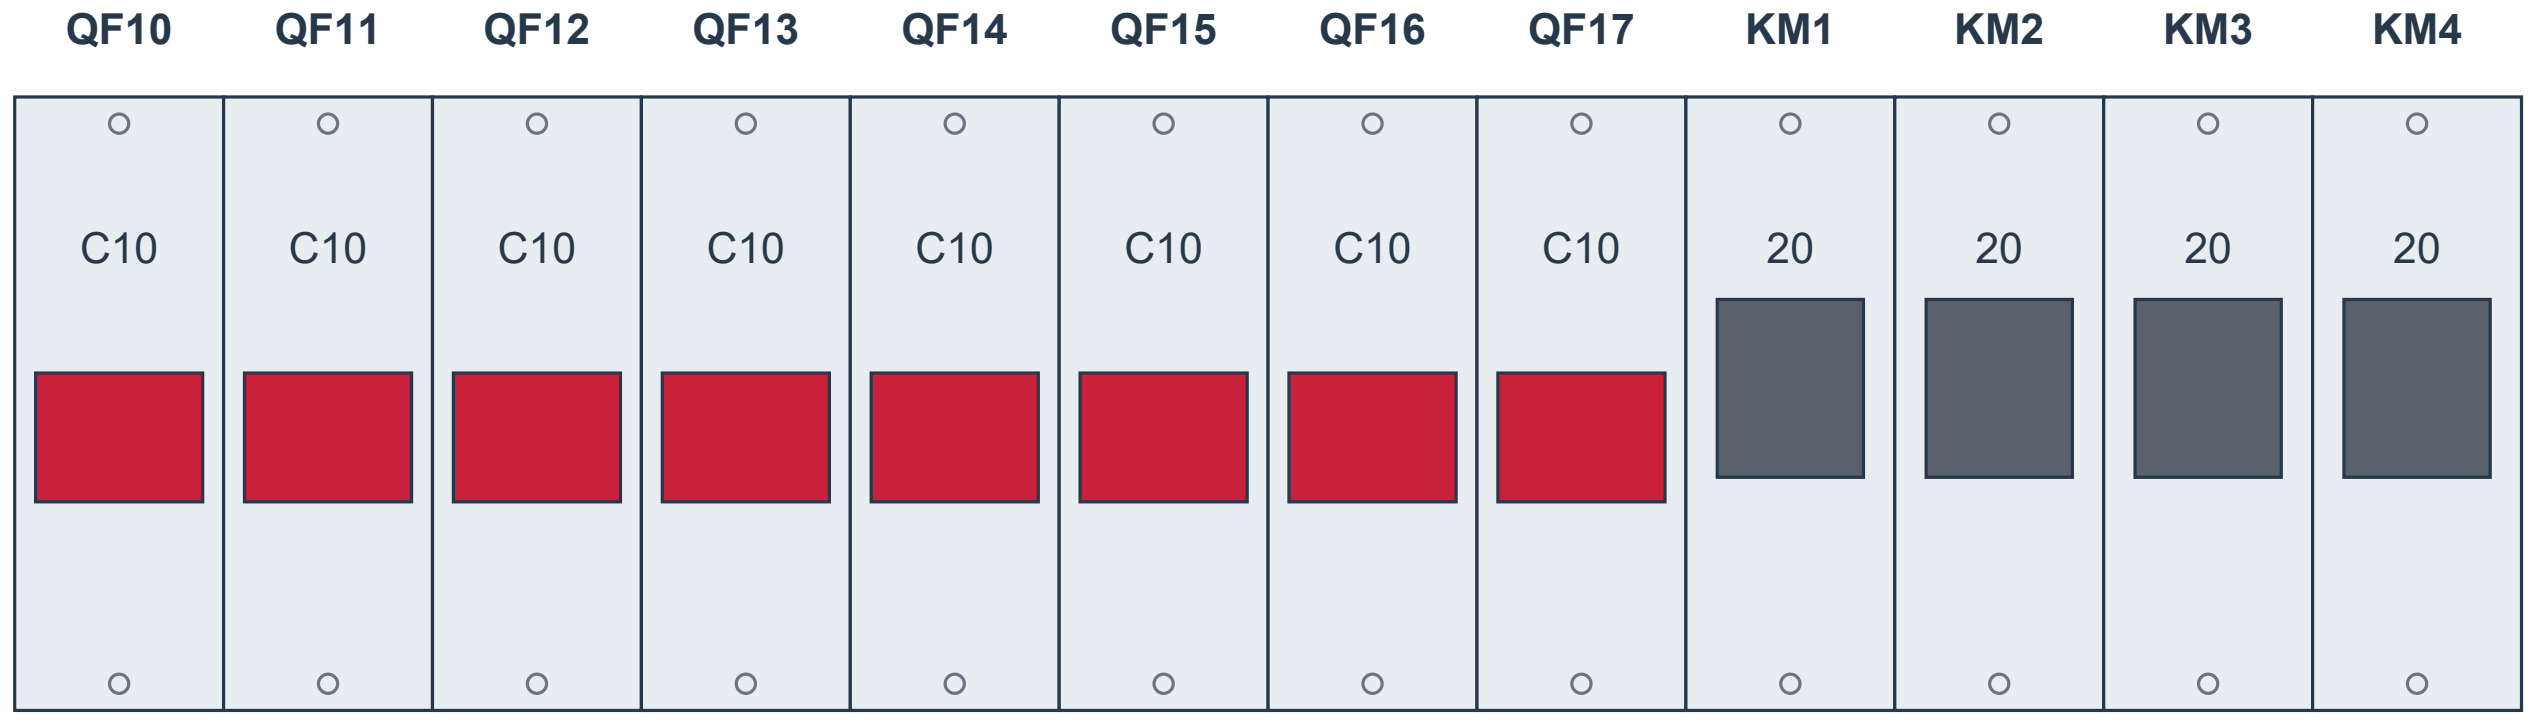
QF10
QF11
QF12
QF13
QF14
QF15
QF16
QF17
KM1
KM2
KM3
KM4
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
20
20
20
20

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 3 | модульная раскладка D

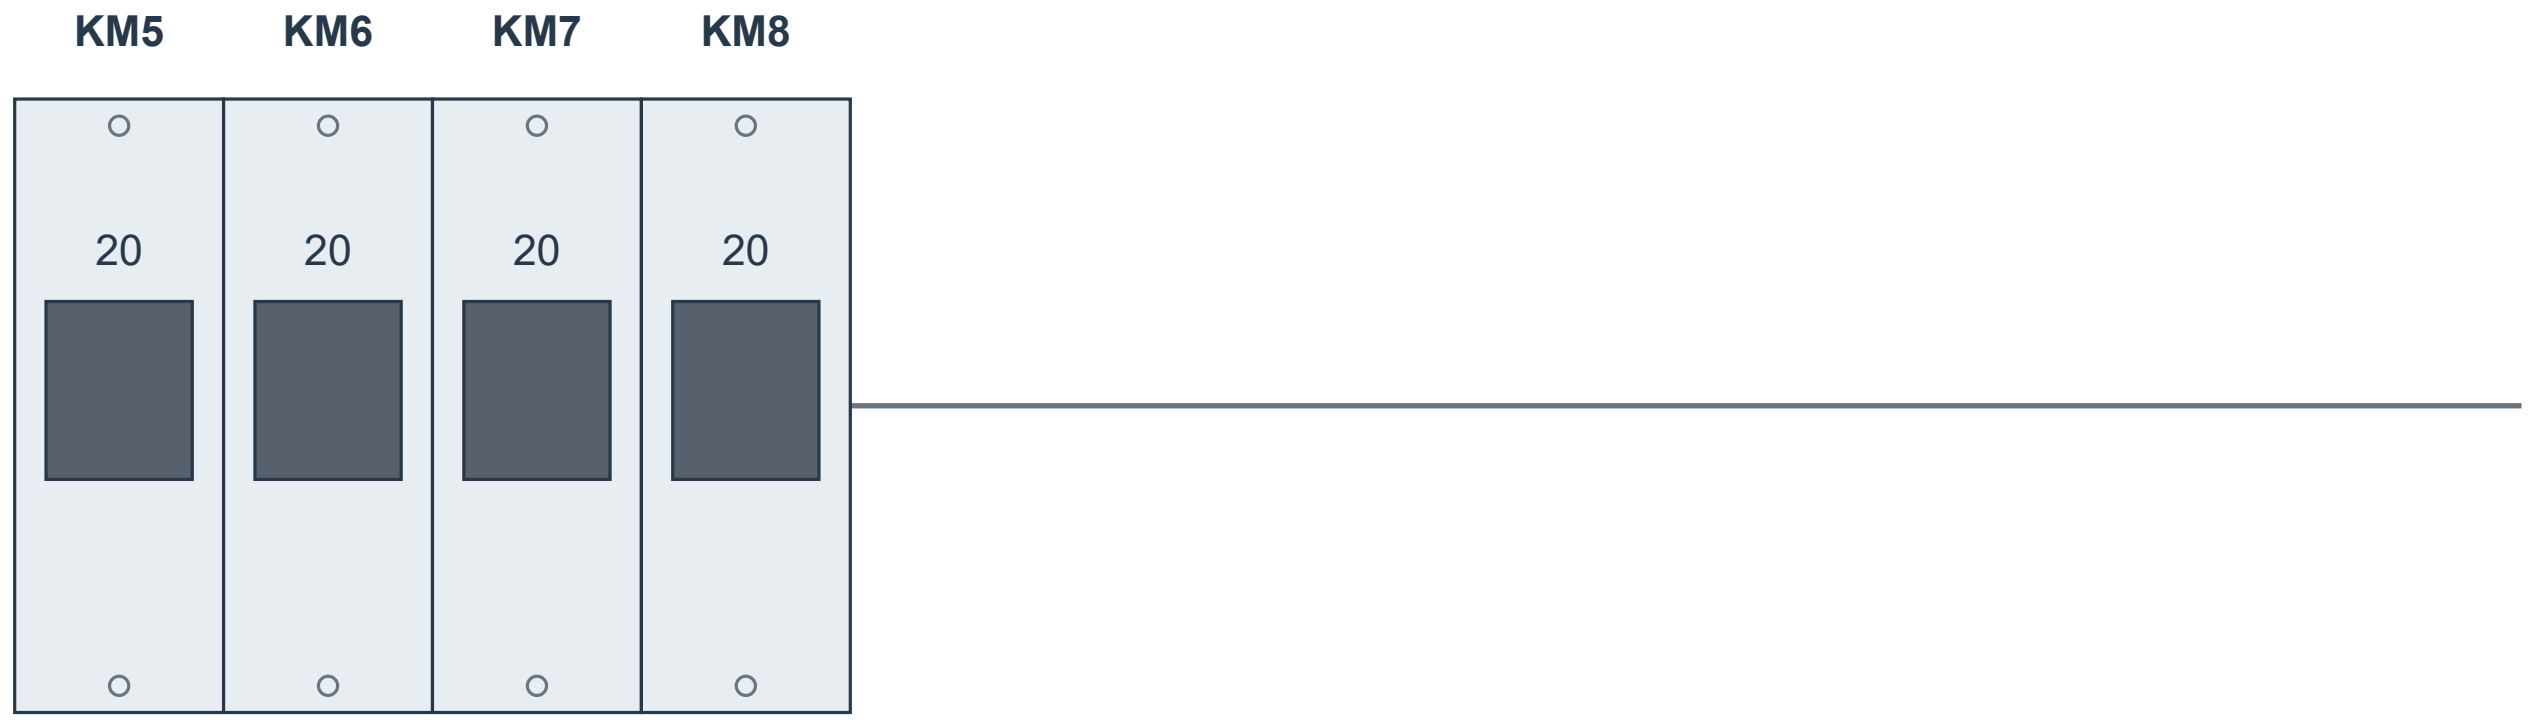
KM5
KM6
KM7
KM8
20
20
20
20

Сумма ширин: 72 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	831	1	0	?	54 B
QF1 - QF9	NXB-63S	832	1	54...198	?	18 B
QF10 - QF17	NXB-63S	833	2	0...126	?	18 B
KM1 - KM4	256054	834	2	144...198	?	18 B
KM5 - KM8	256054	835	3	0...54	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Актуальная спецификация

ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 848 | ЭОМ, PDF стр. 47

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
849	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
850	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
851	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
852	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
853	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 47

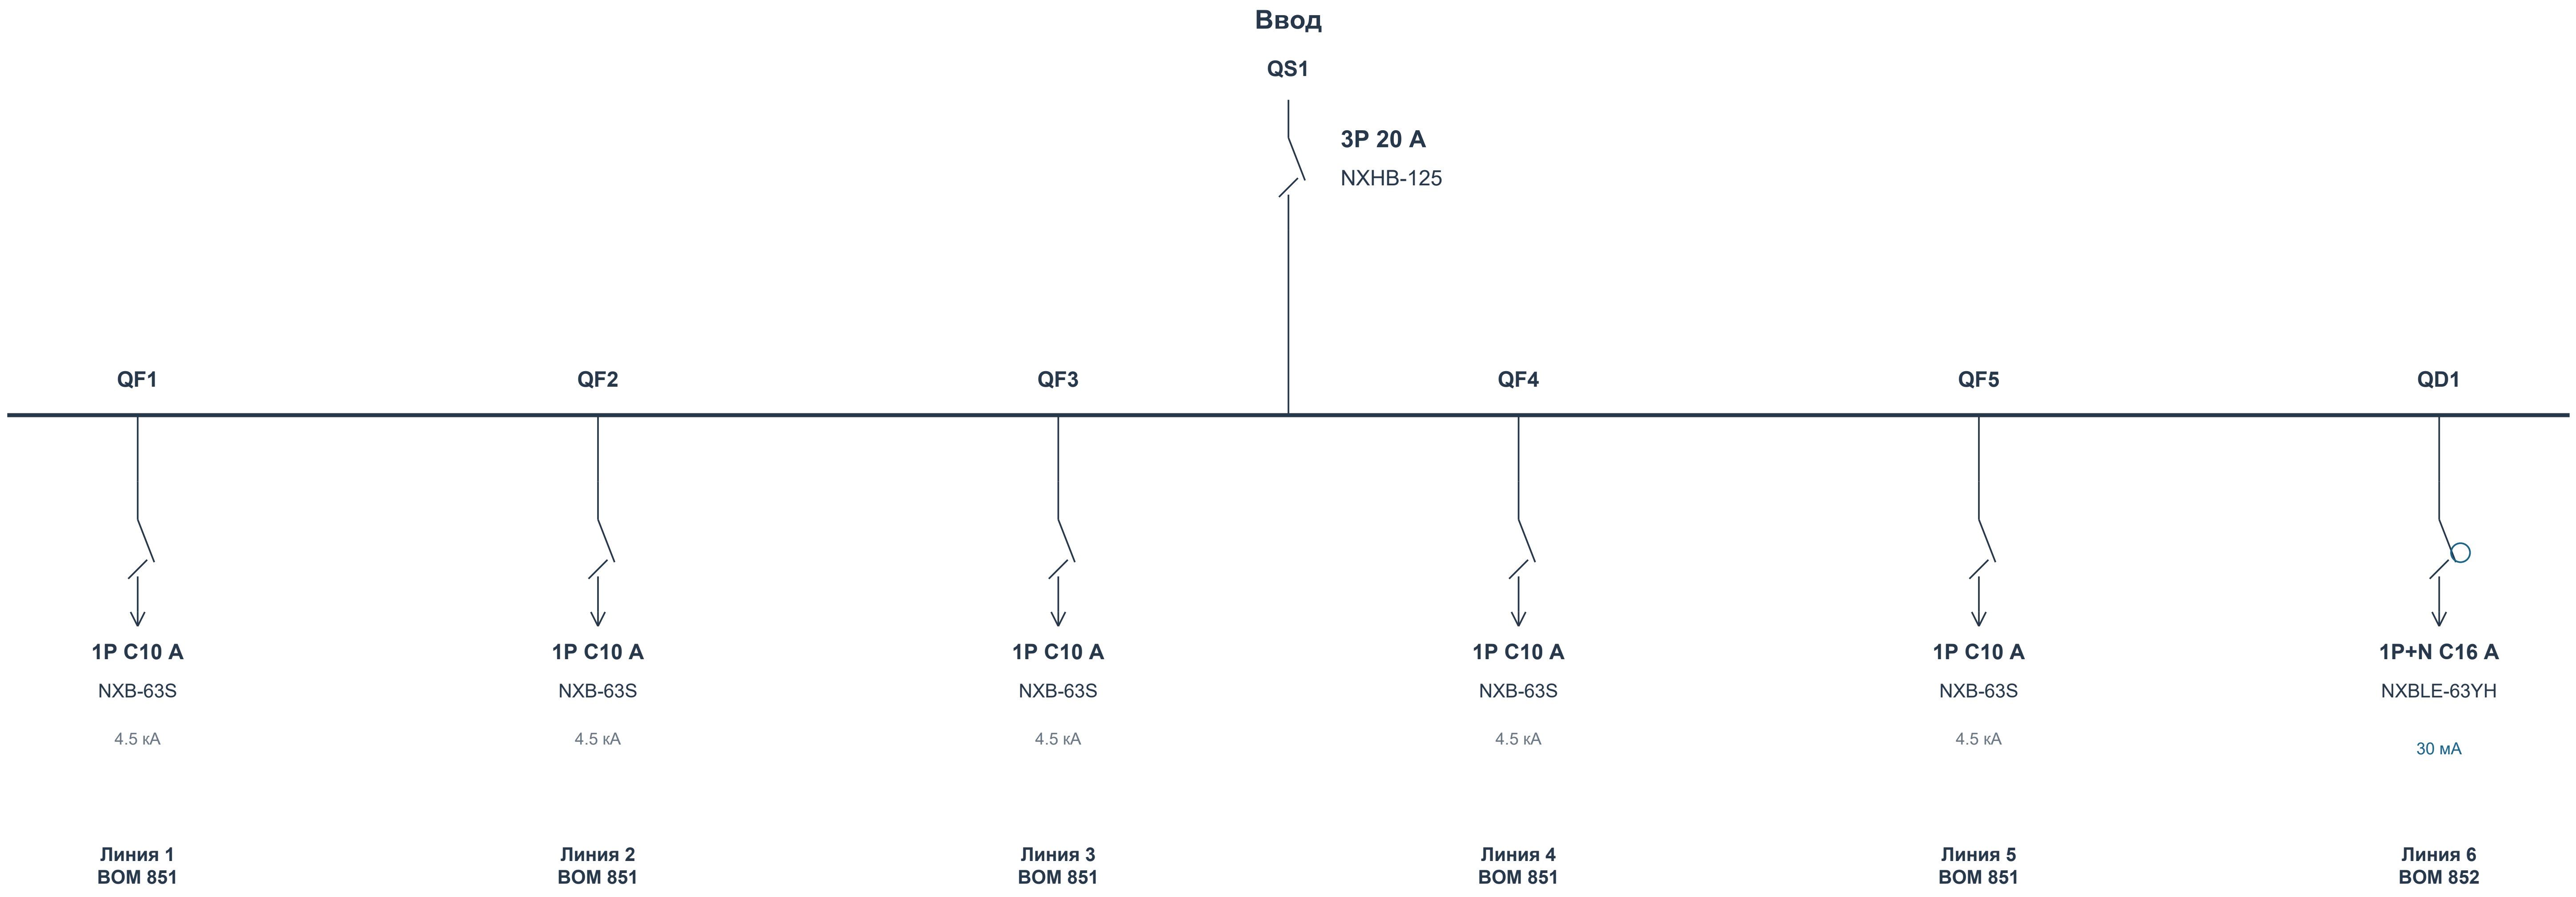
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QD1
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 851
Линия 2
BOM 851
Линия 3
BOM 851
Линия 4
BOM 851
Линия 5
BOM 851
Линия 6
BOM 852

Управление / учет: KM1 256054 × 1

Данные исходного проекта: Ру 4.77 кВт | Рр 4,77 кВт | Ір 7,64 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

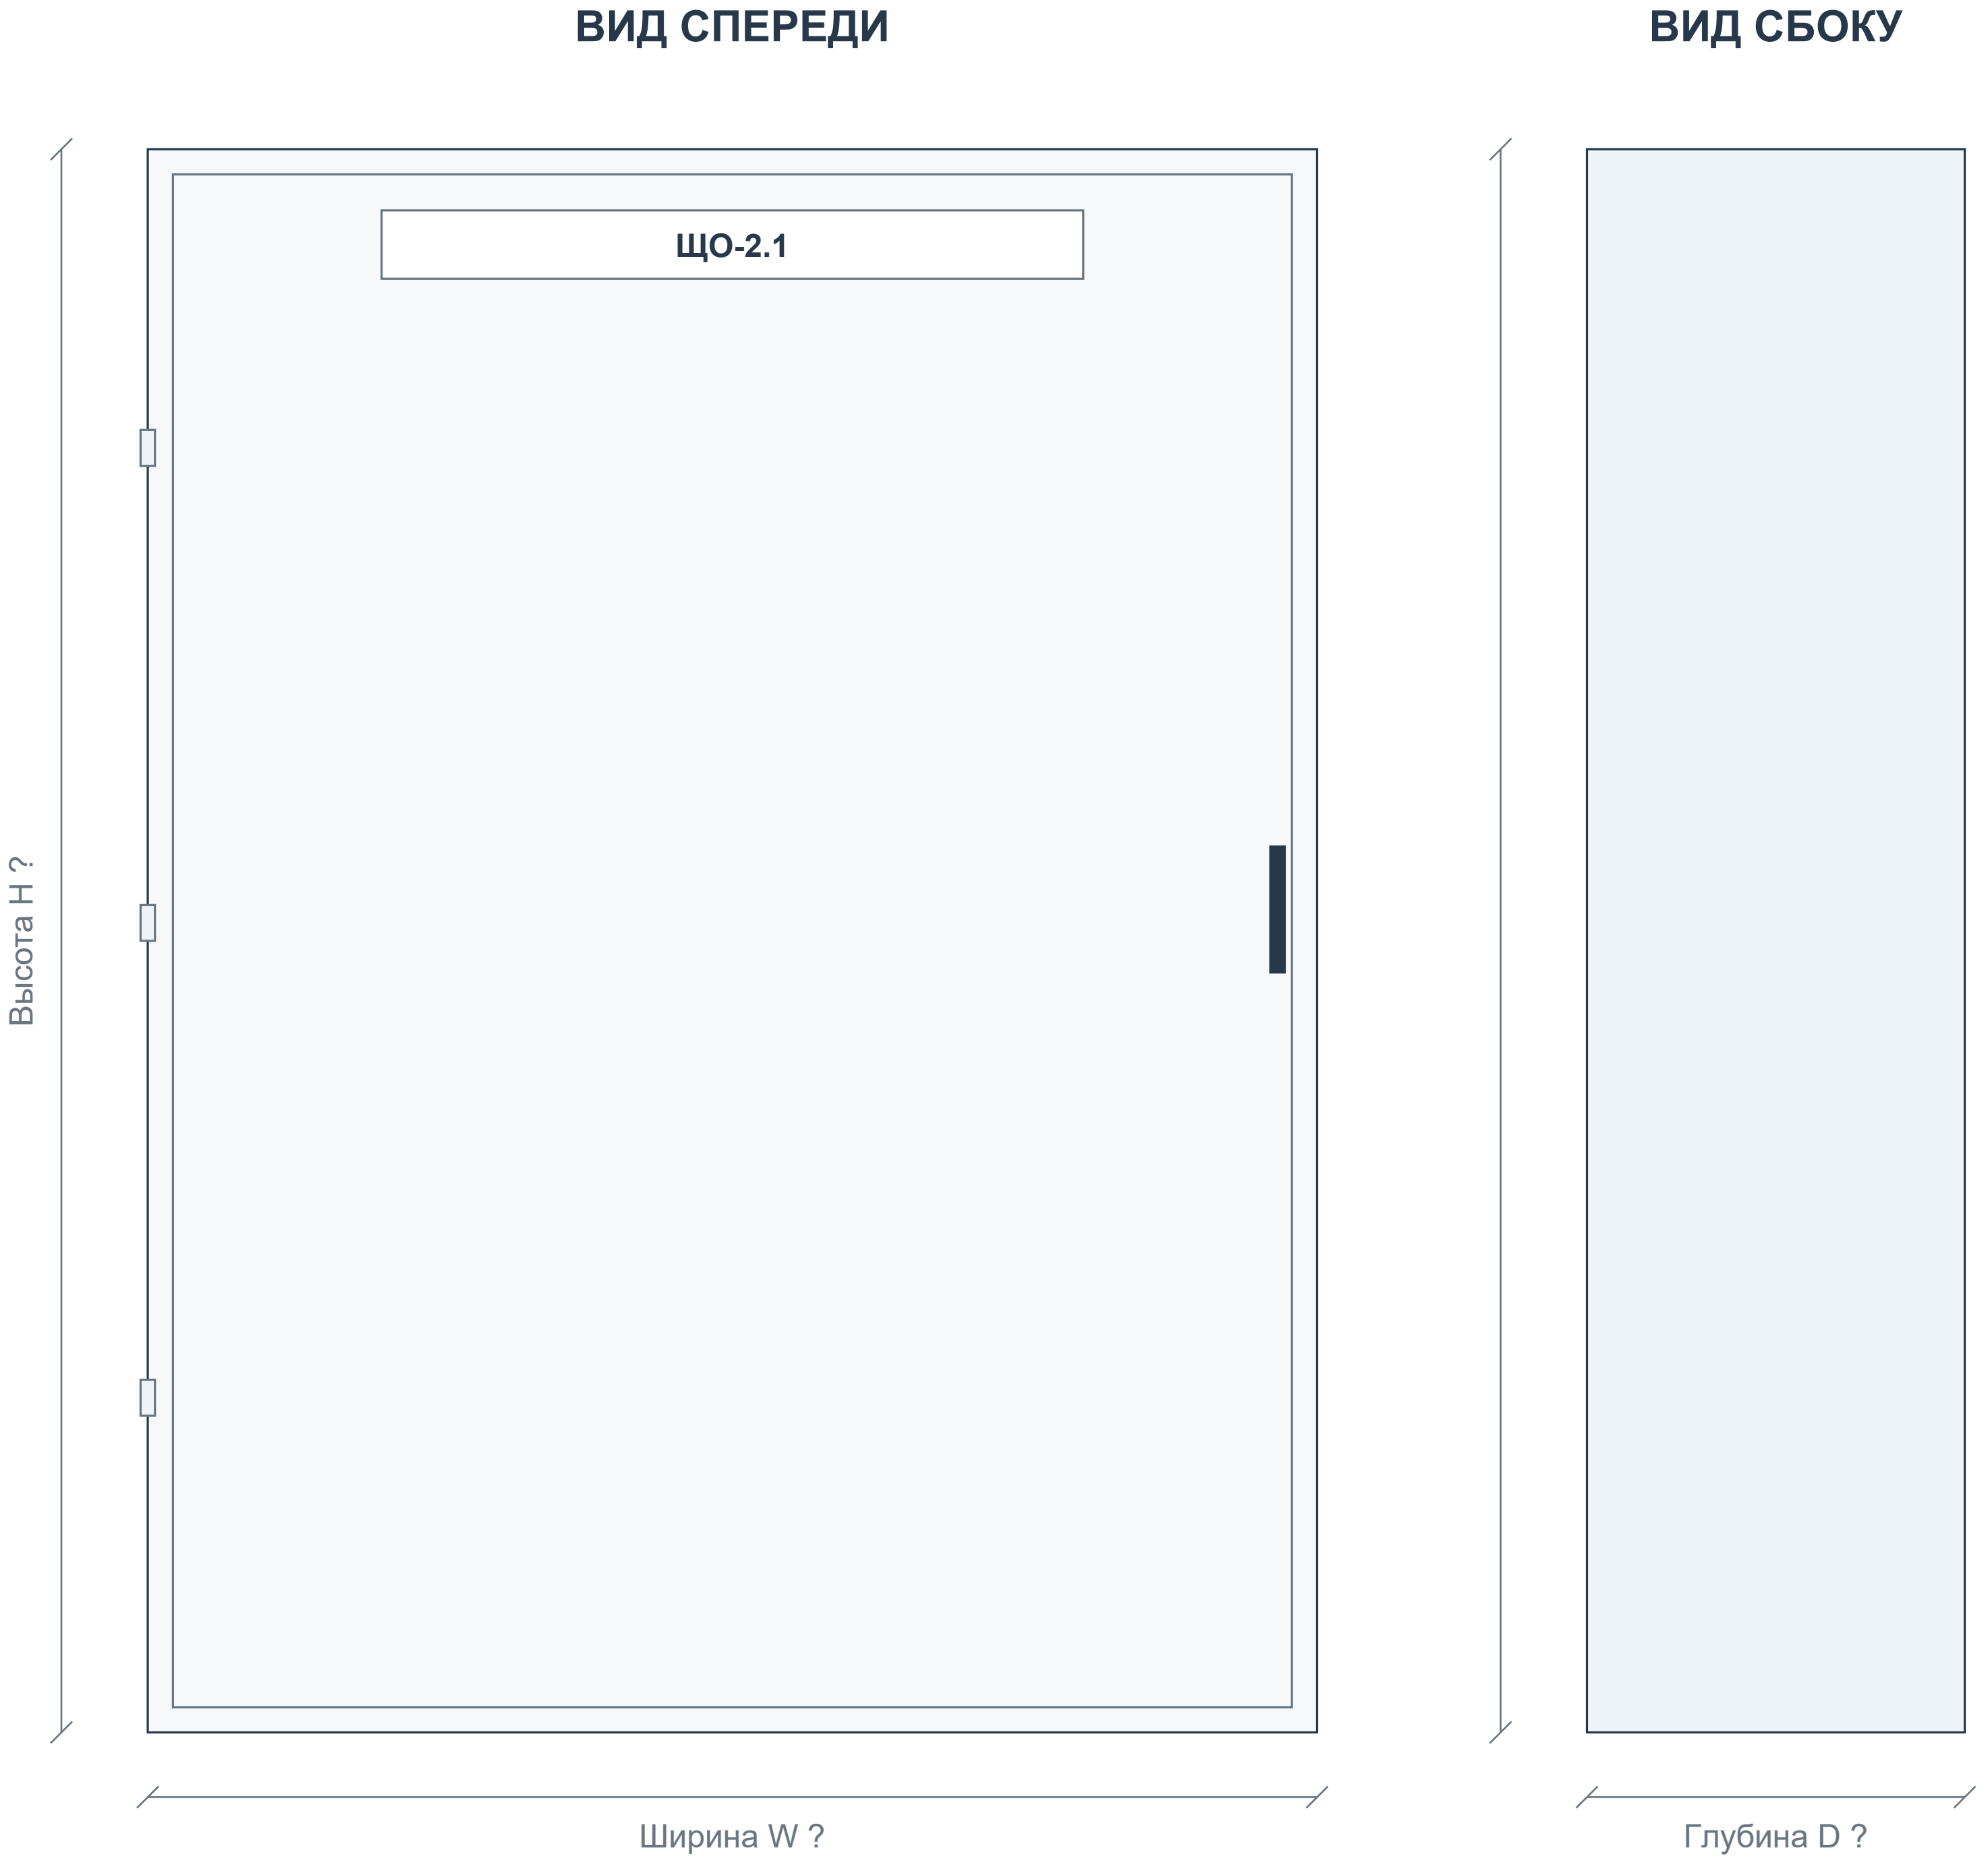

Корпус: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

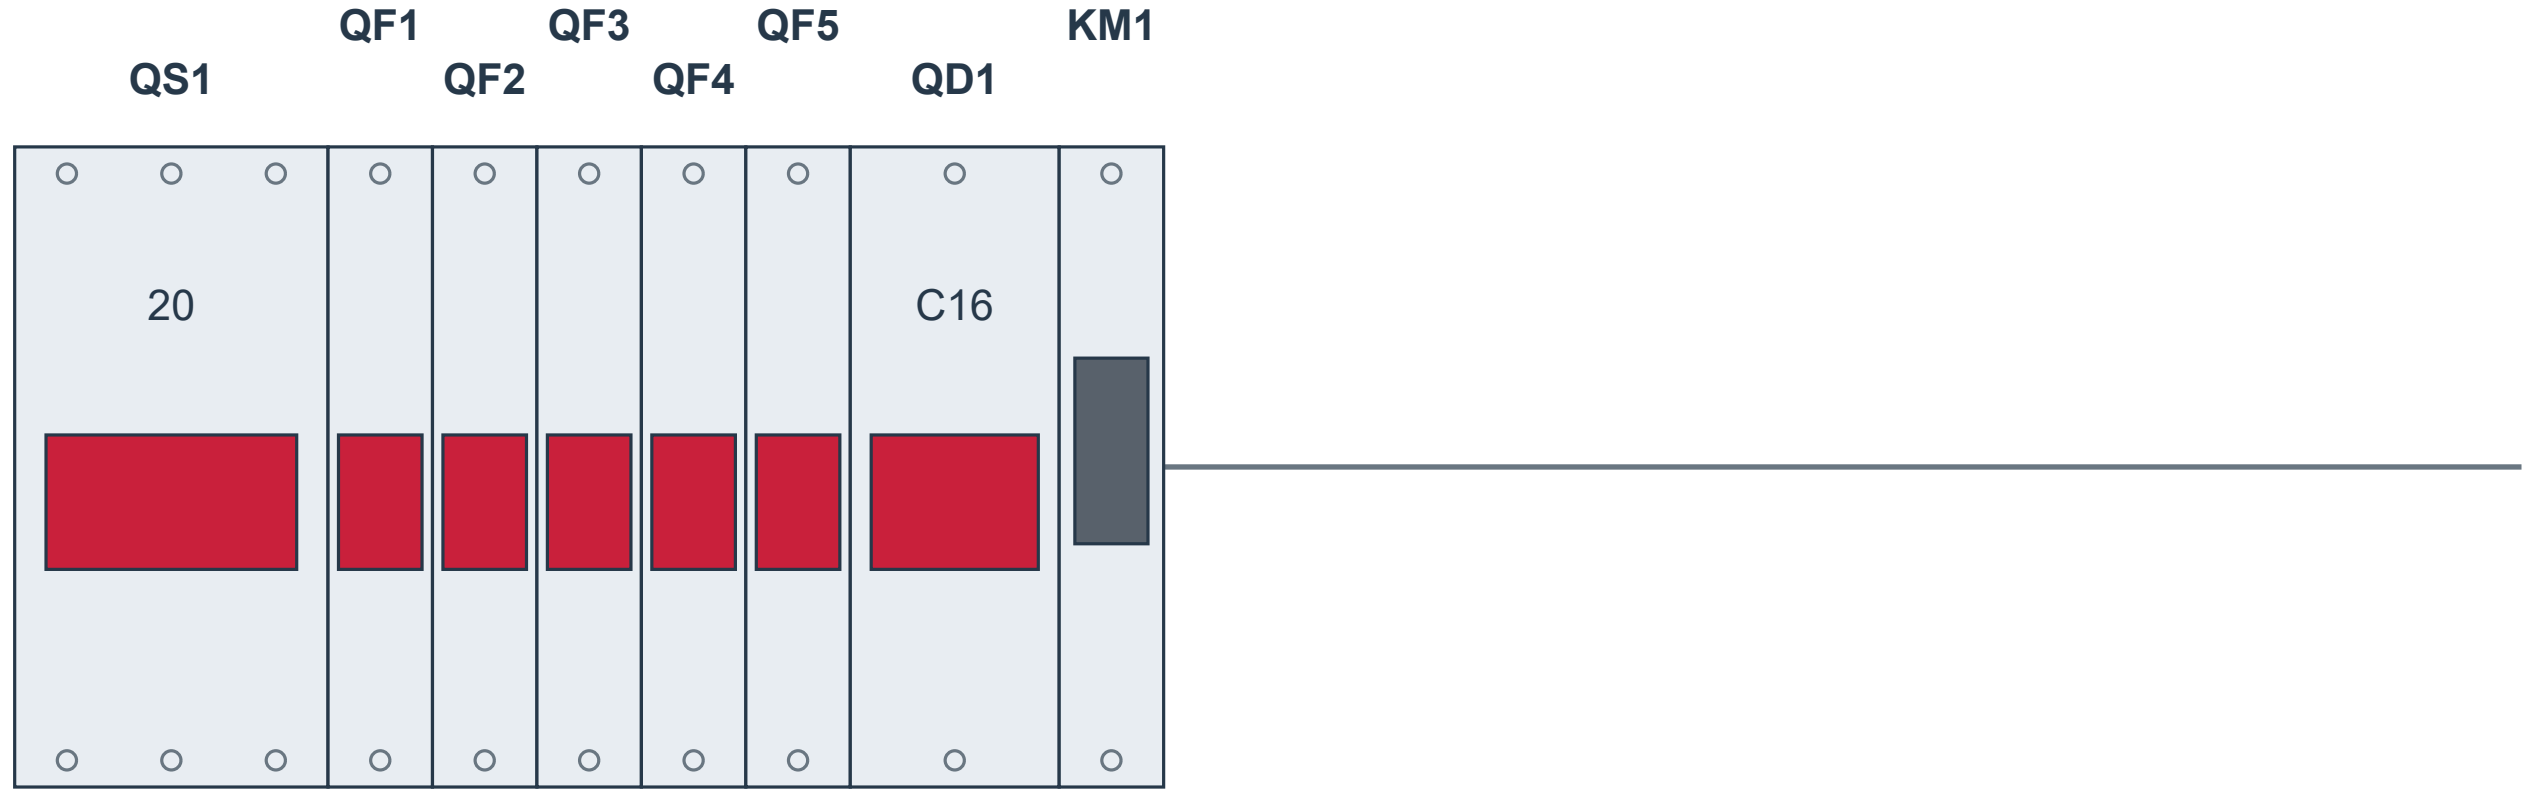

Сумма ширин: 198 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	850	1	0	?	54 B
QF1 - QF5	NXB-63S	851	1	54...126	?	18 B
QD1	NXBLE-63YH	852	1	144	?	36 B
KM1	256054	853	1	180	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Актуальная спецификация

ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 867 | ЭОМ, PDF стр. 48

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
868	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
869	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
870	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	7	7	chint	Отход.
871	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
872	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 48

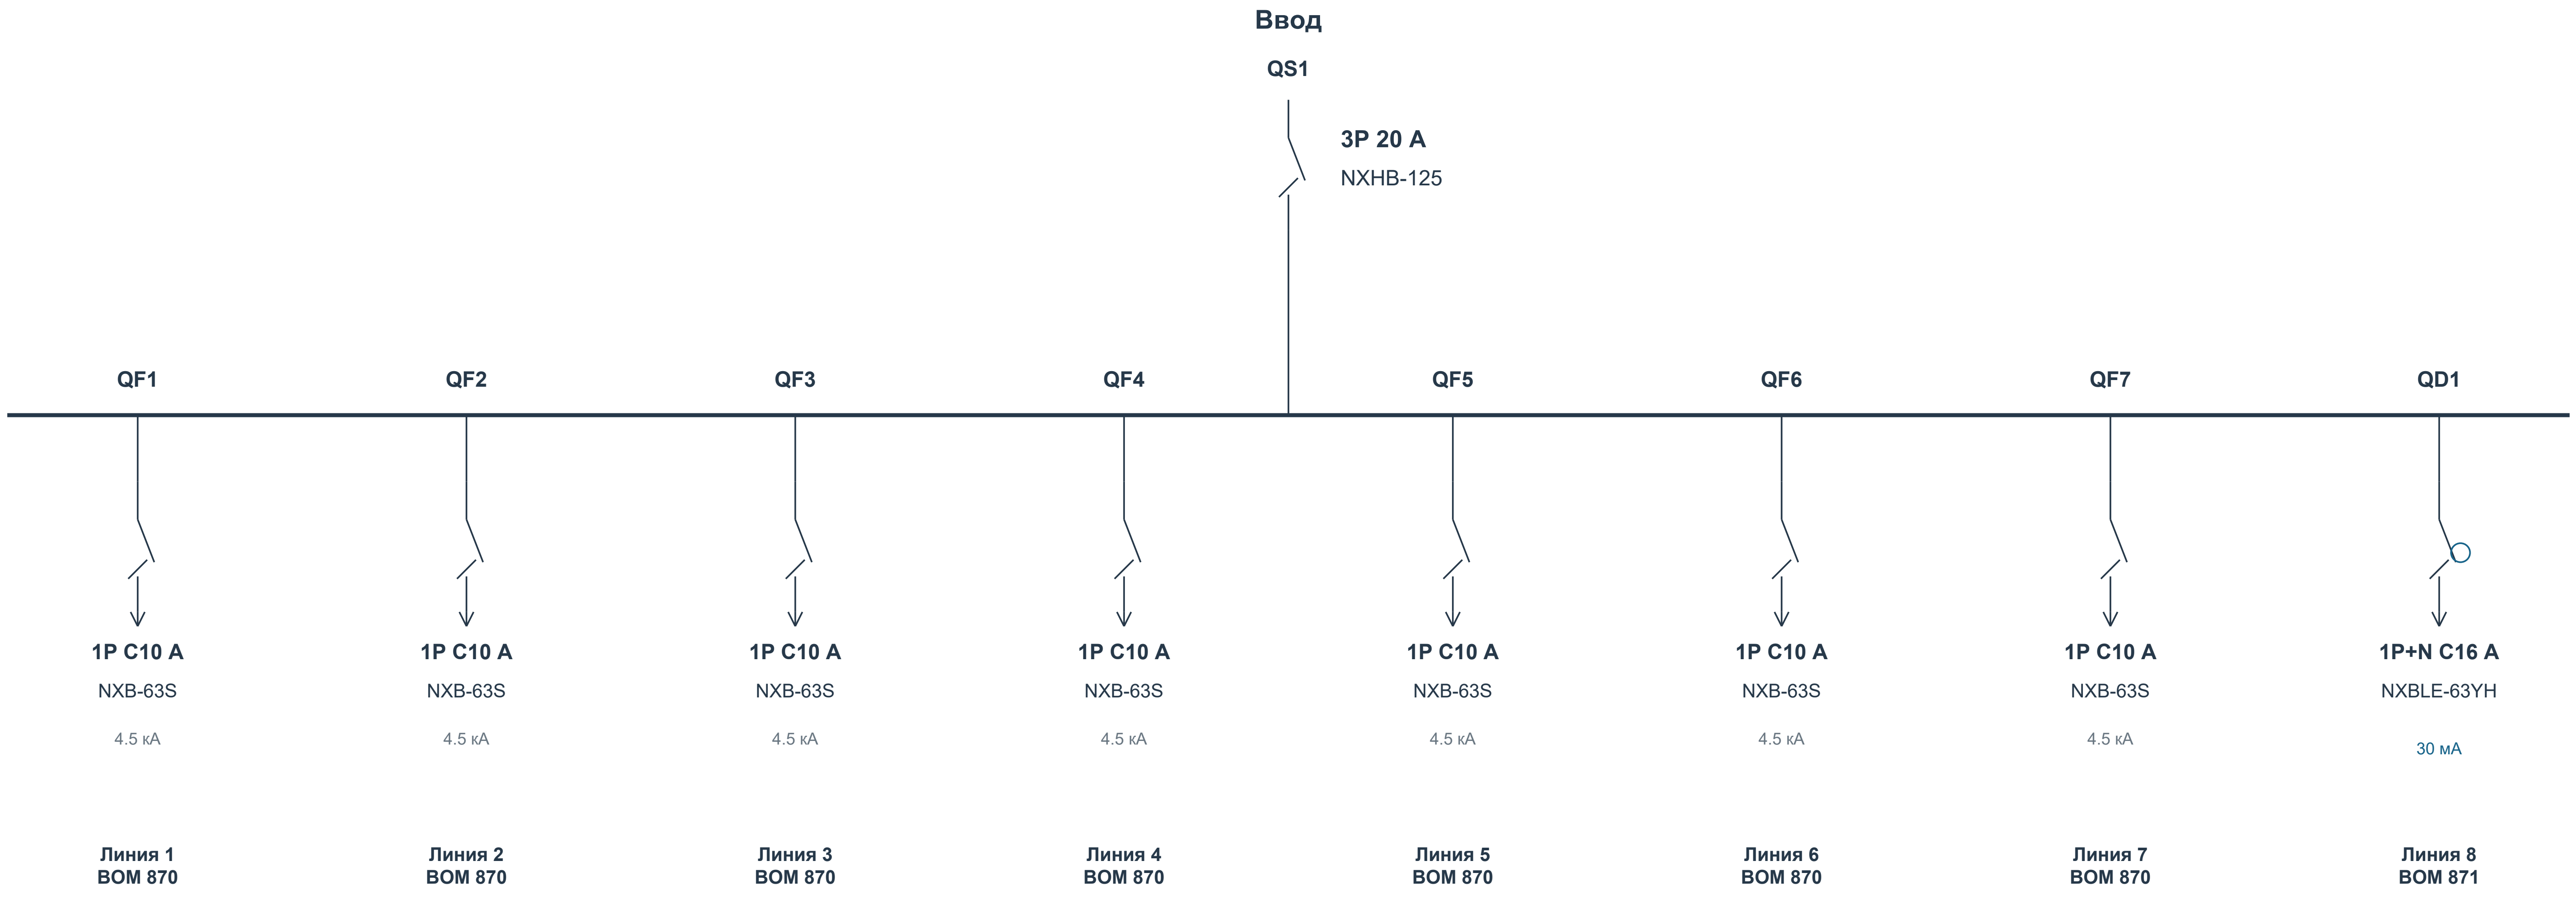
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QD1
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 870
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 870
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 870
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 870
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 870
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 870
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 870
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 871

Управление / учет: KM1 256054 × 1

Данные исходного проекта: Ру 4.46 кВт | Рр 4,46 кВт | Ip 7,14 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

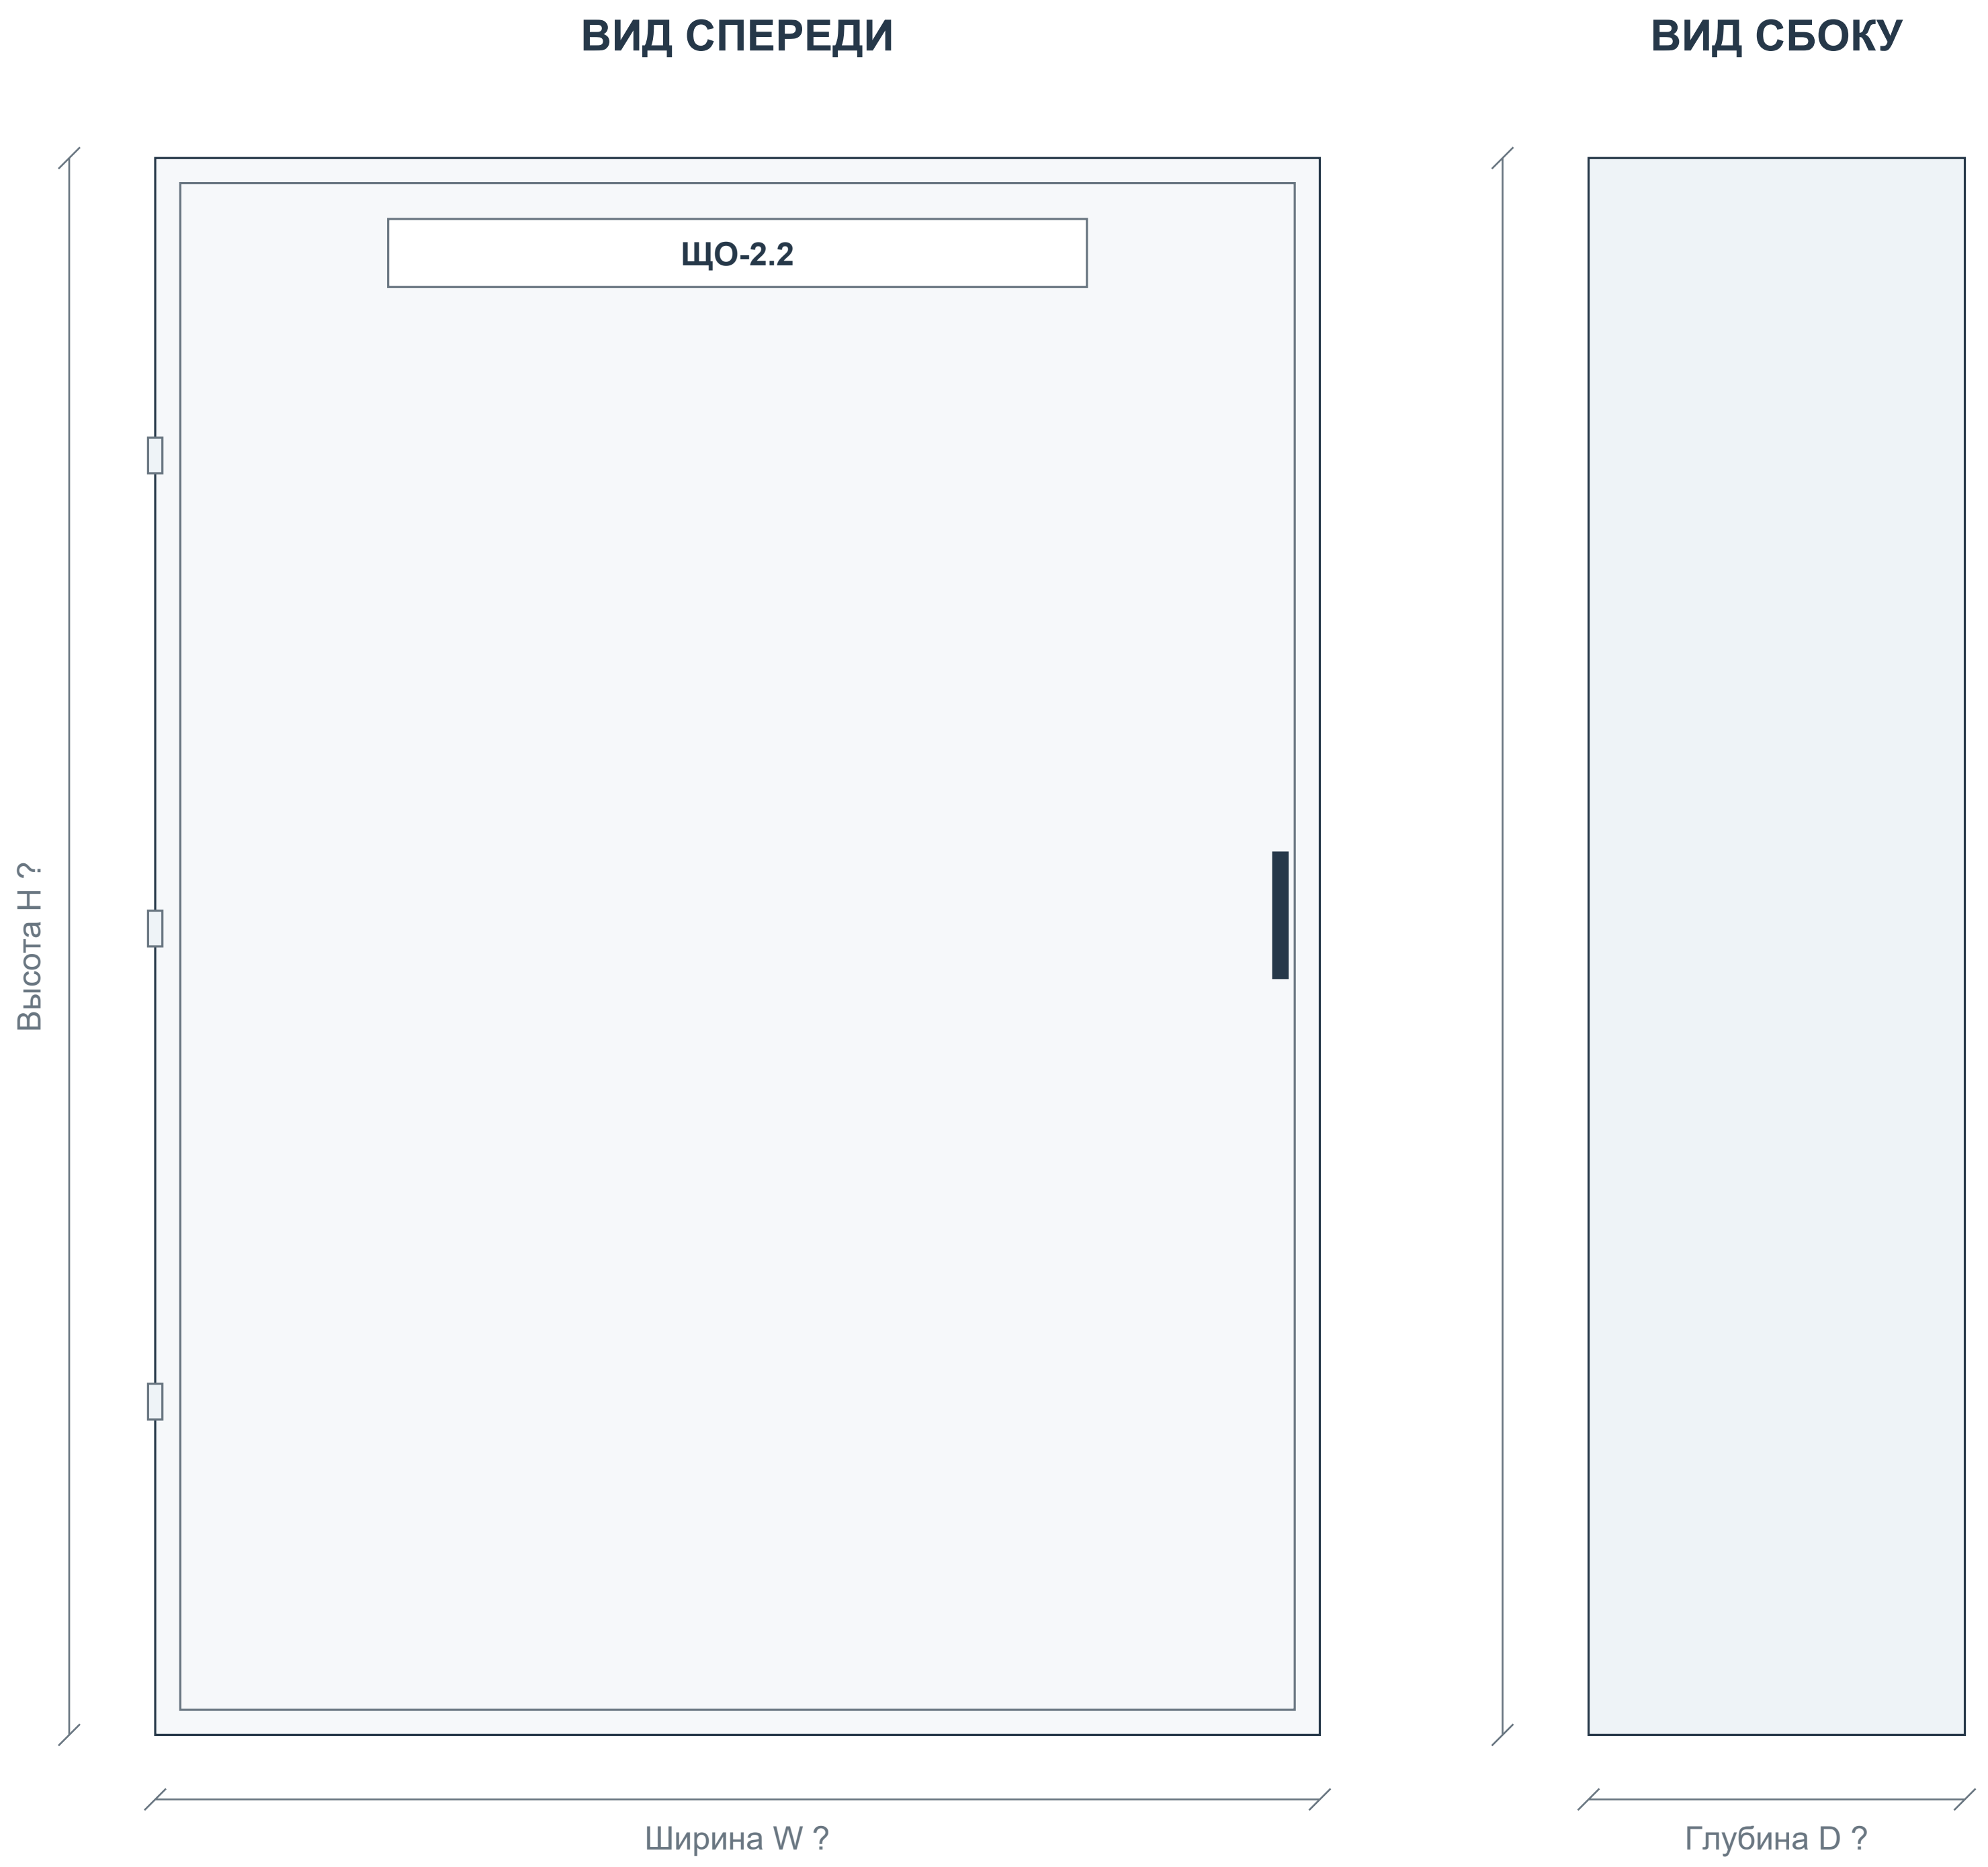

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

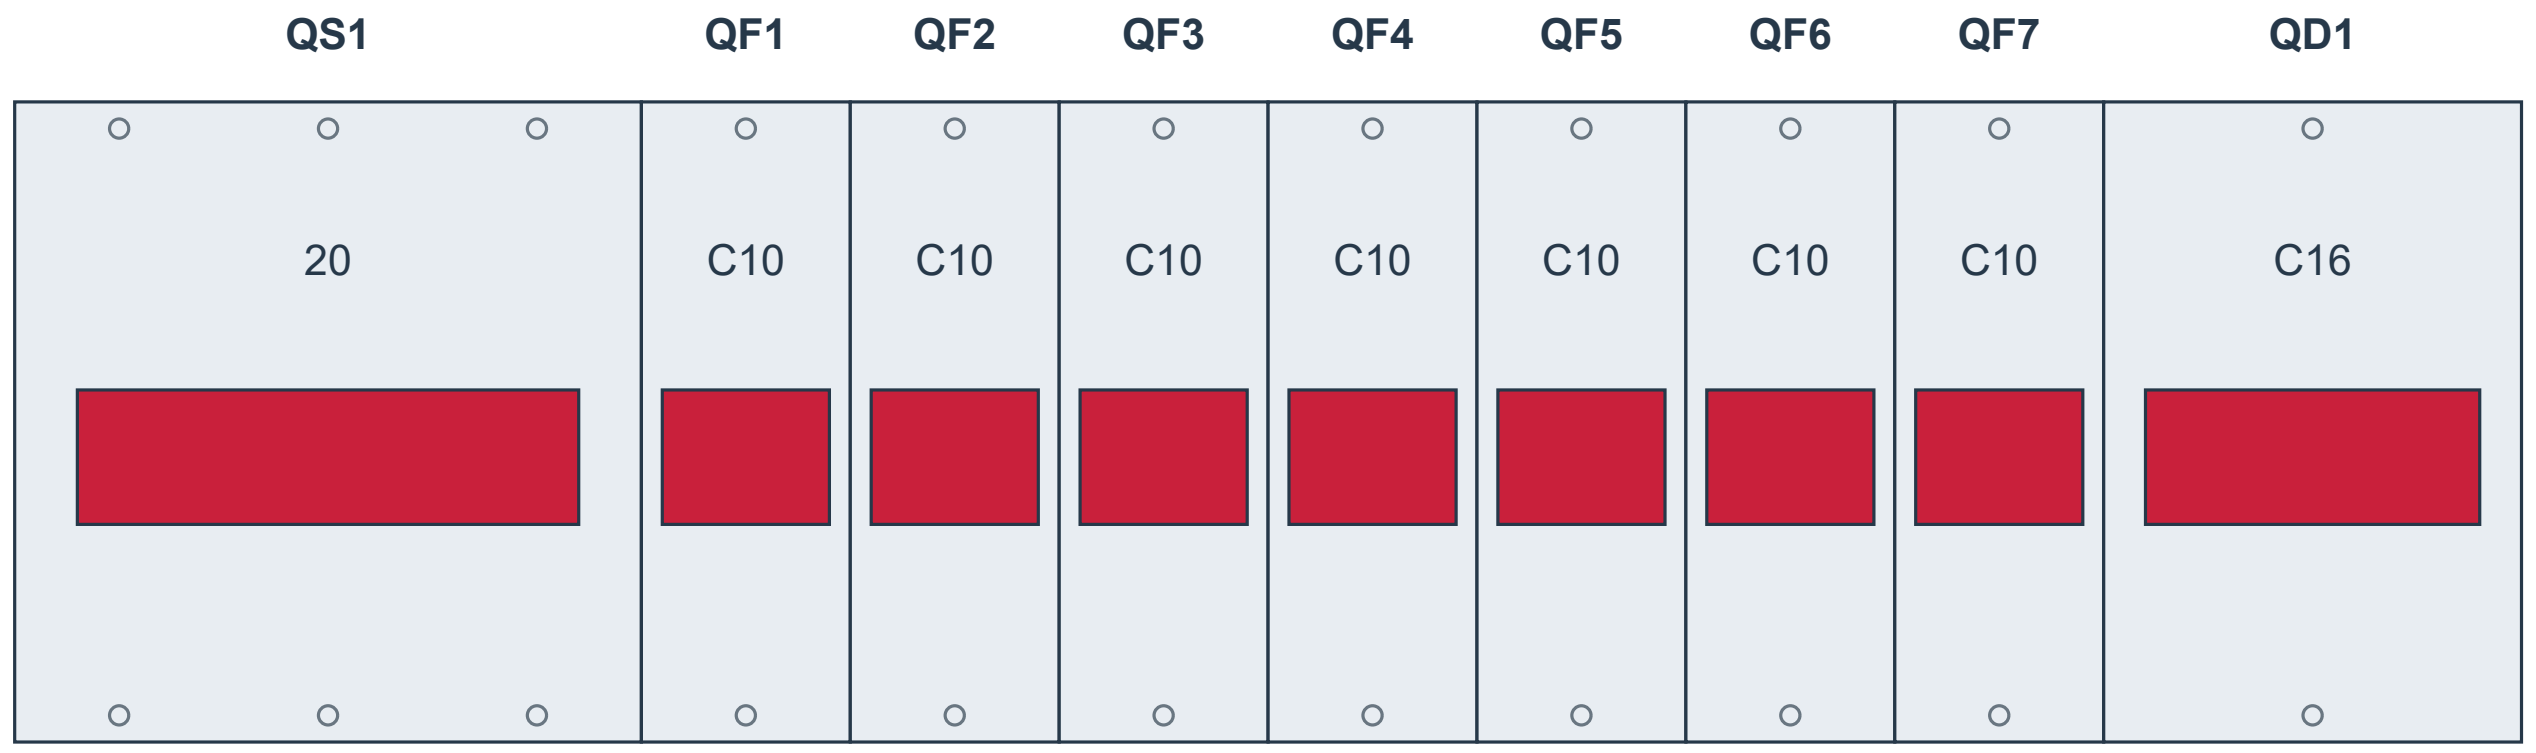

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

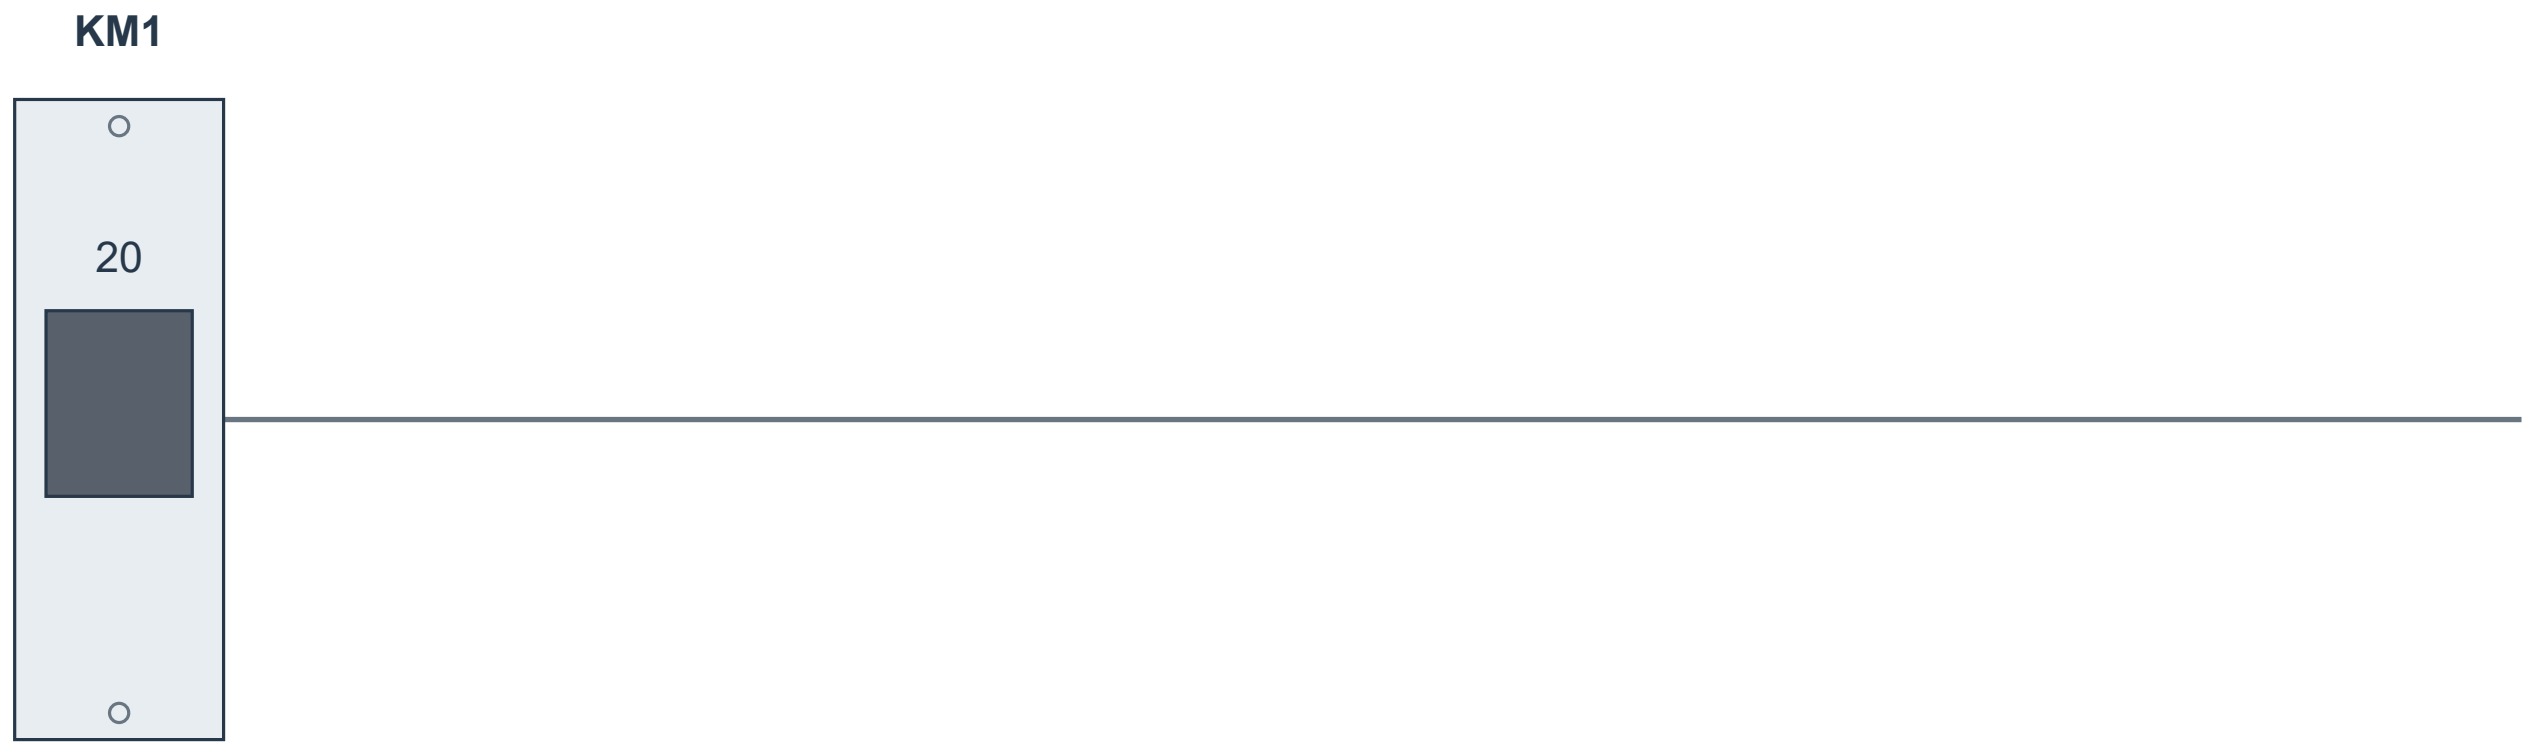

Сумма ширин: 18 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	869	1	0	?	54 B
QF1 - QF7	NXB-63S	870	1	54...162	?	18 B
QD1	NXBLE-63YH	871	1	180	?	36 B
KM1	256054	872	2	0	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Актуальная спецификация

ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 886 | ЭОМ, PDF стр. 49

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
887	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
888	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
889	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
890	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
891	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
892	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 49

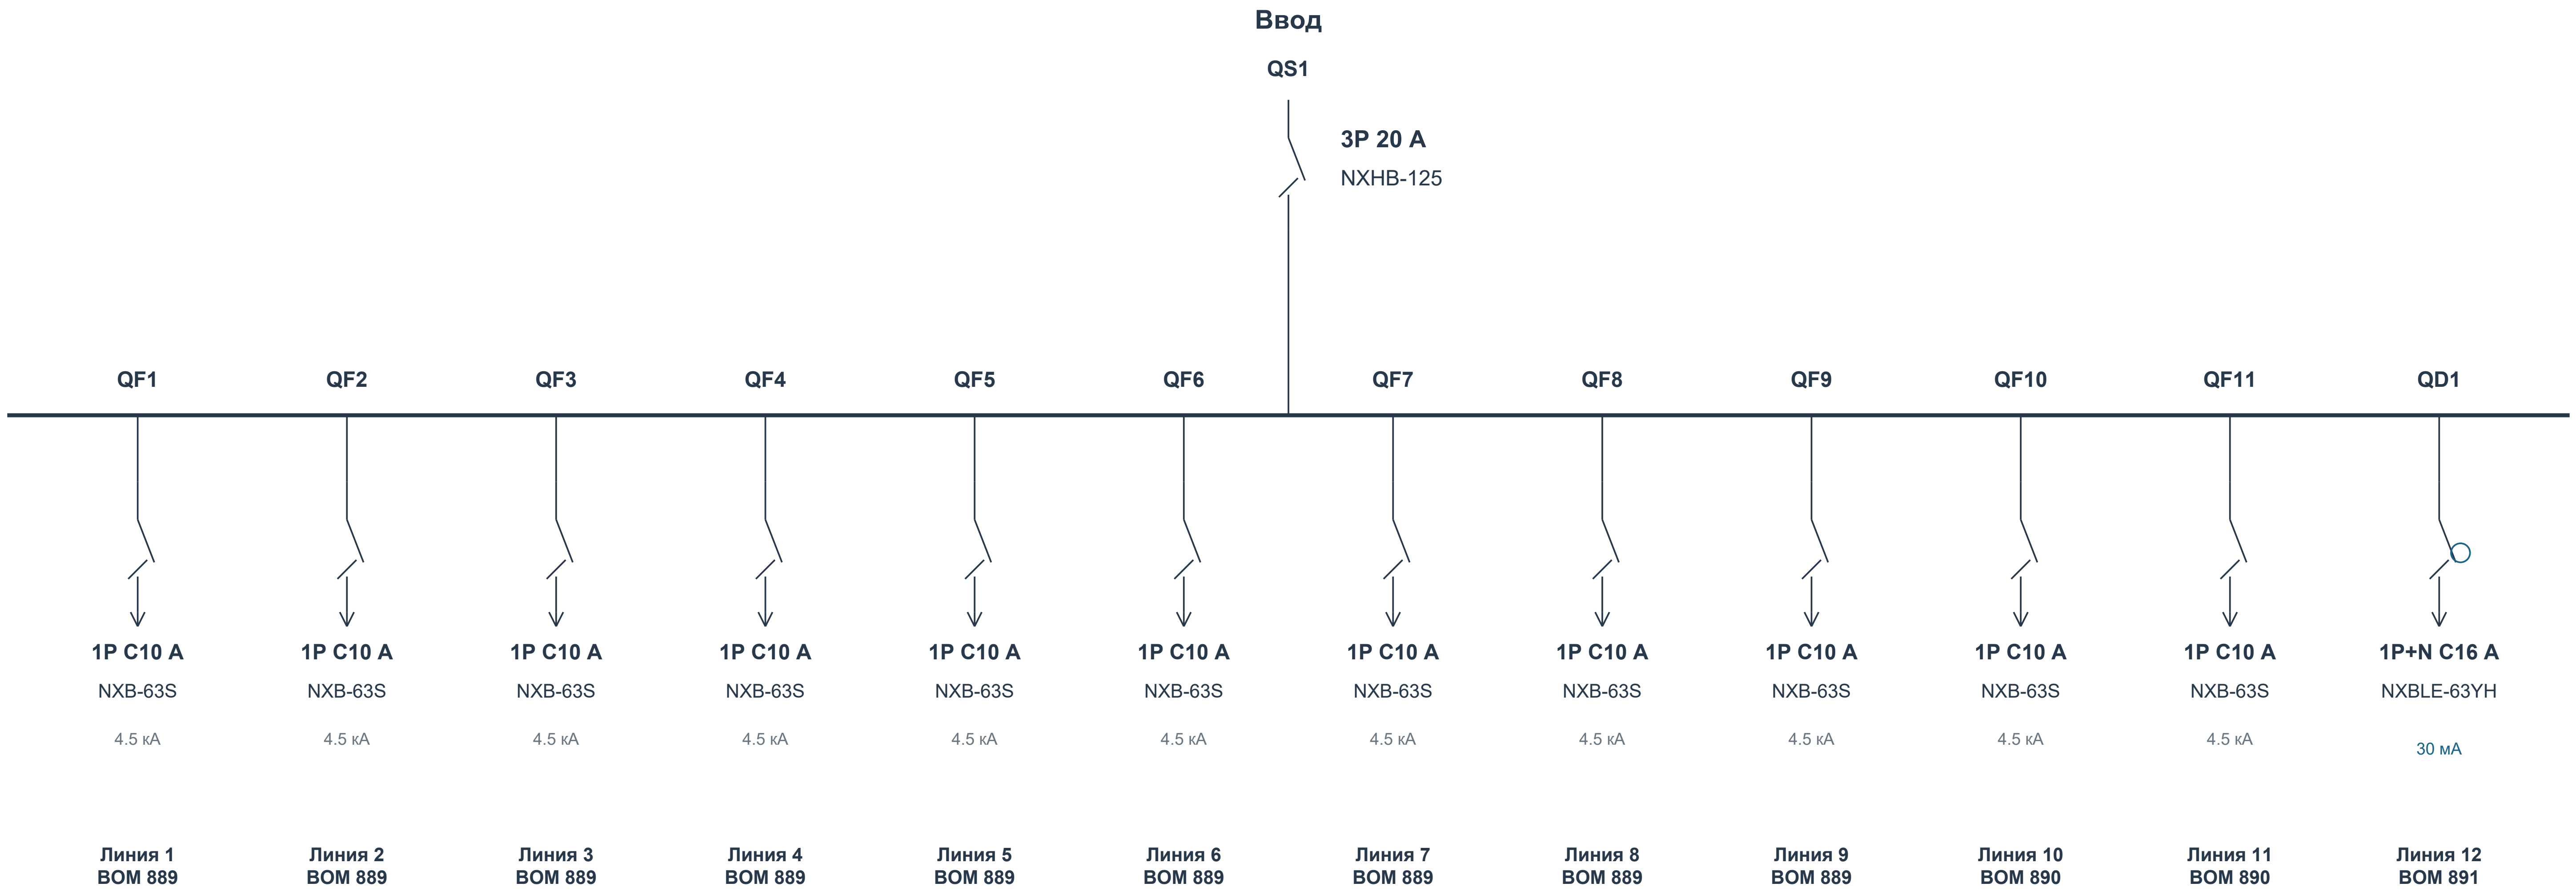
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 889
QF2
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 889
QF3
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 889
QF4
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 889
QF5
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 889
QF6
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 889
QF7
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 889
QF8
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 8
BOM 889
QF9
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 9
BOM 889
QF10
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 10
BOM 890
QF11
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 11
BOM 890
QD1
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 12
BOM 891

Управление / учет: KM1 - KM2 256054 × 2

Данные исходного проекта: Ру 7.48 кВт | Рр 7,48 кВт | Iр 11,98 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

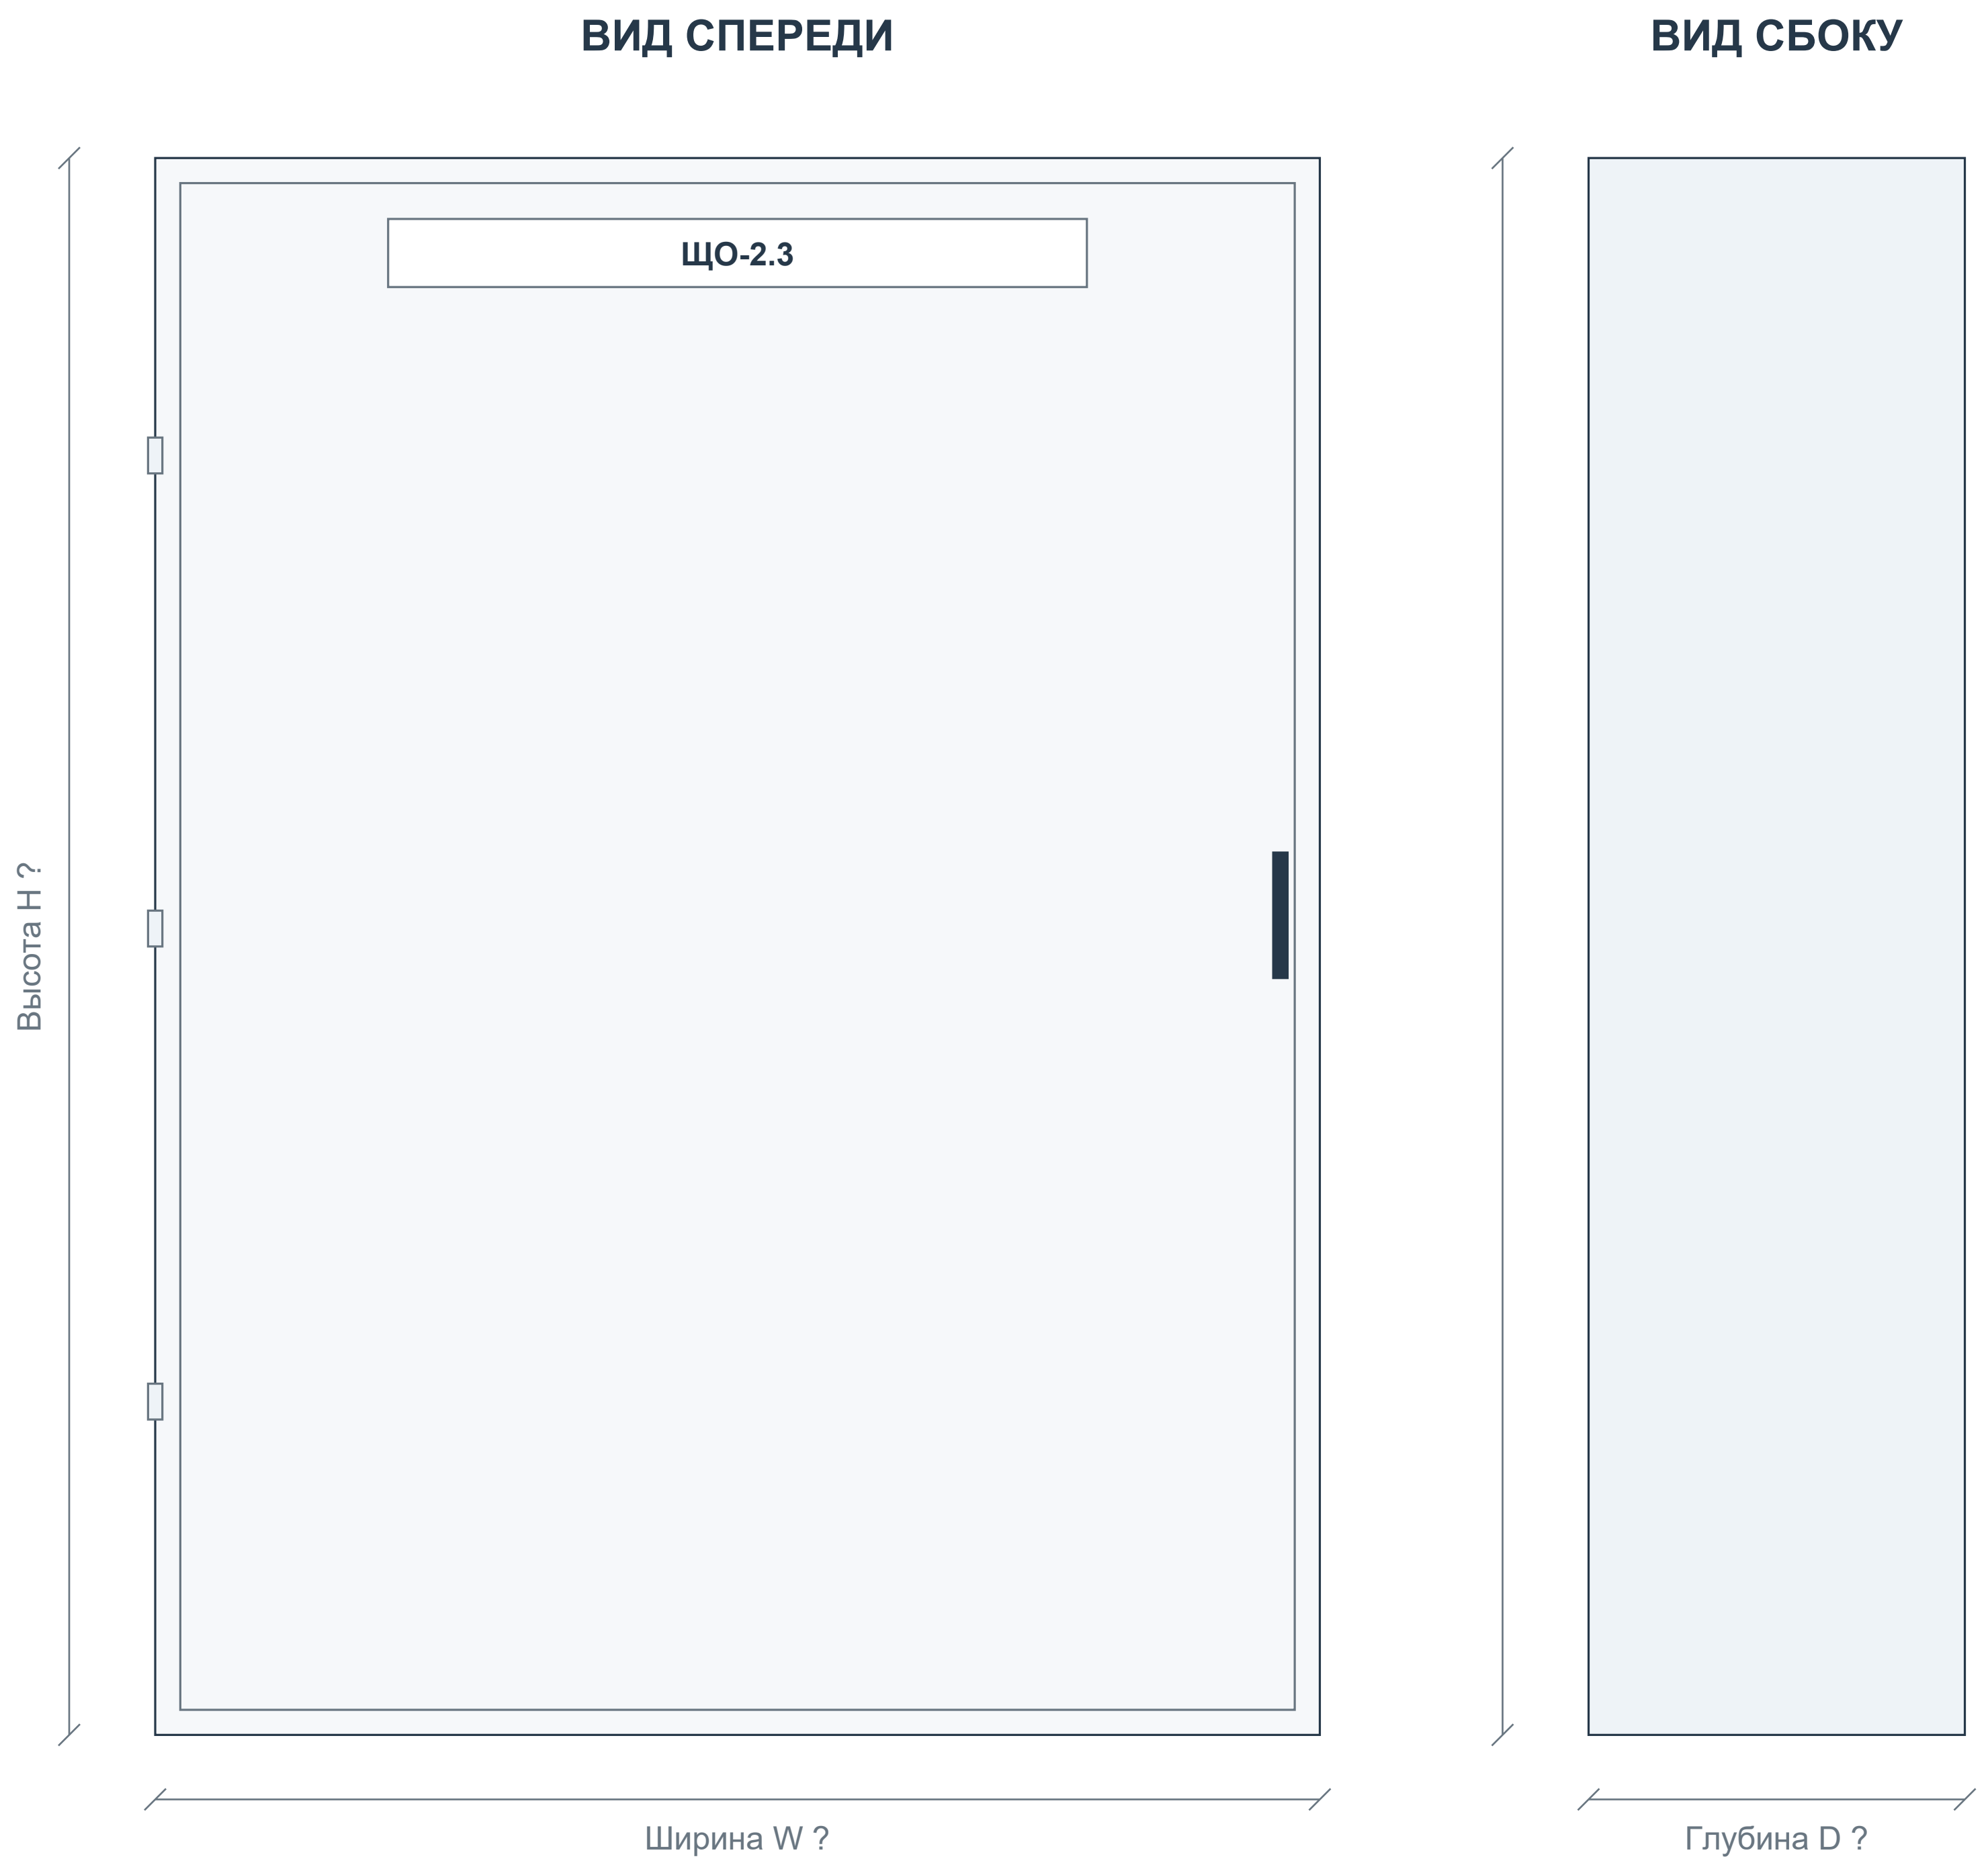

Корпус: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

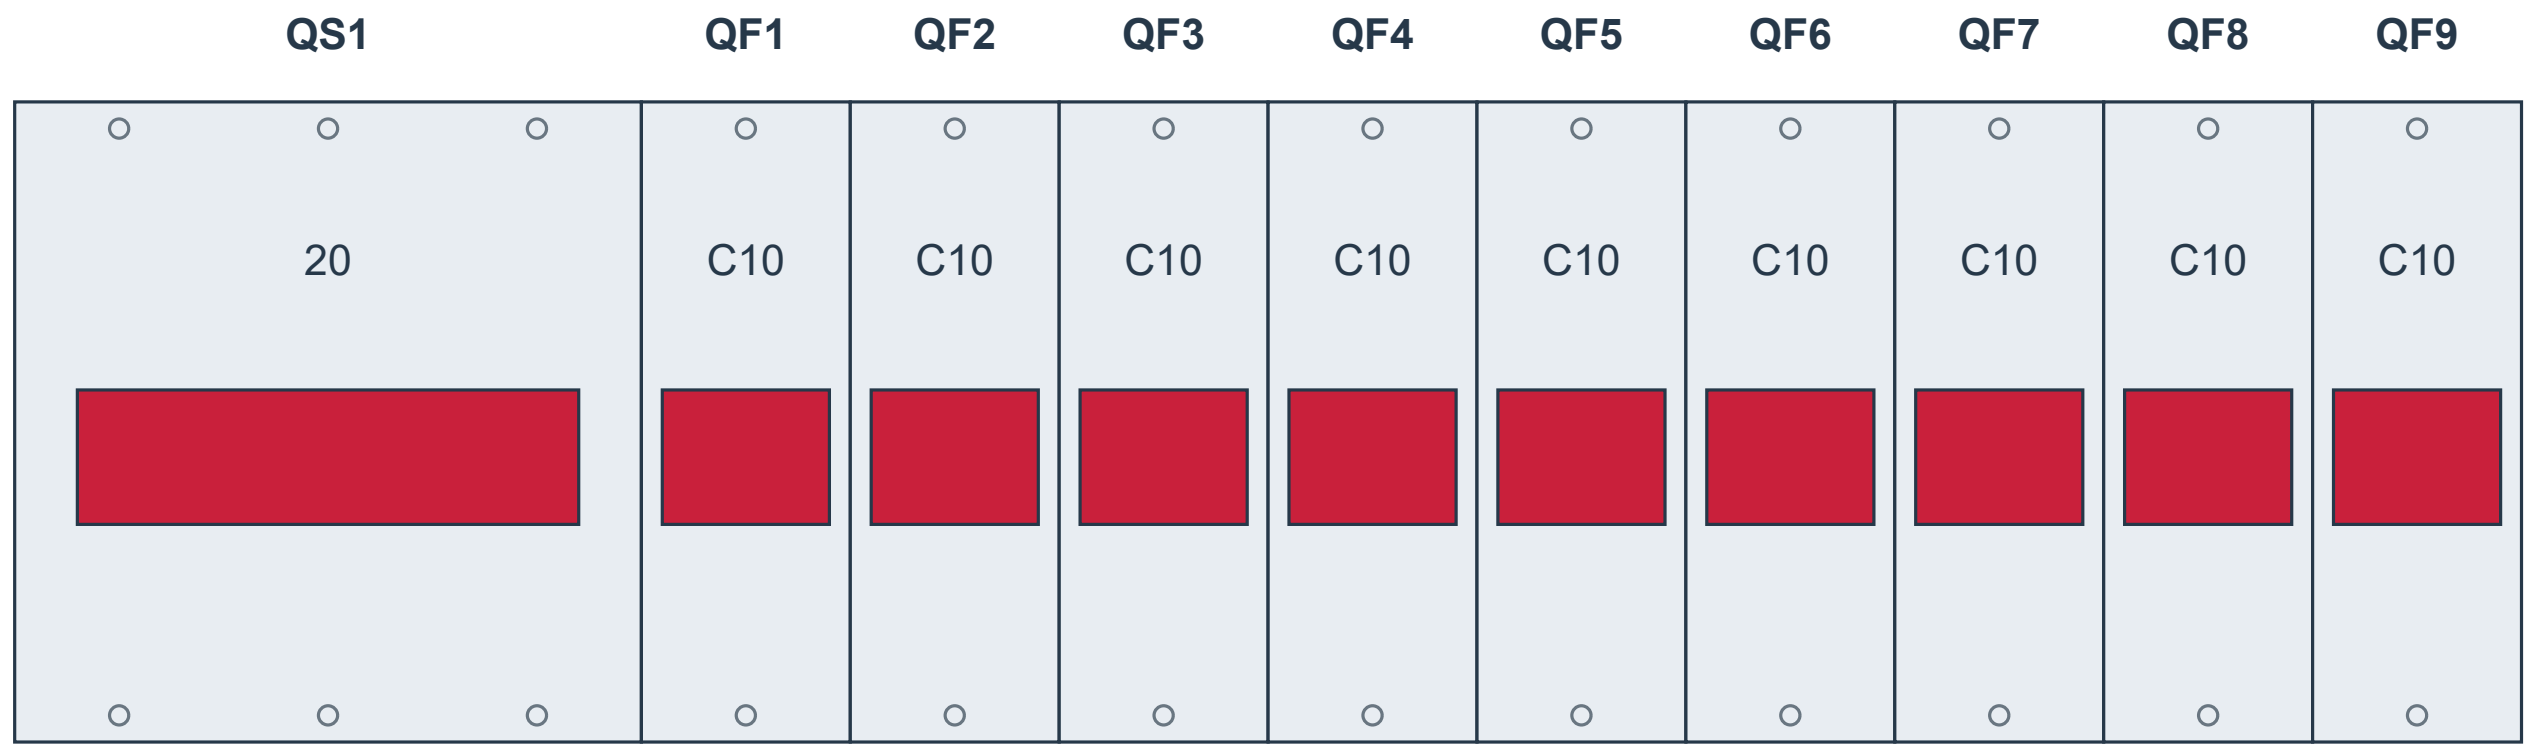

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

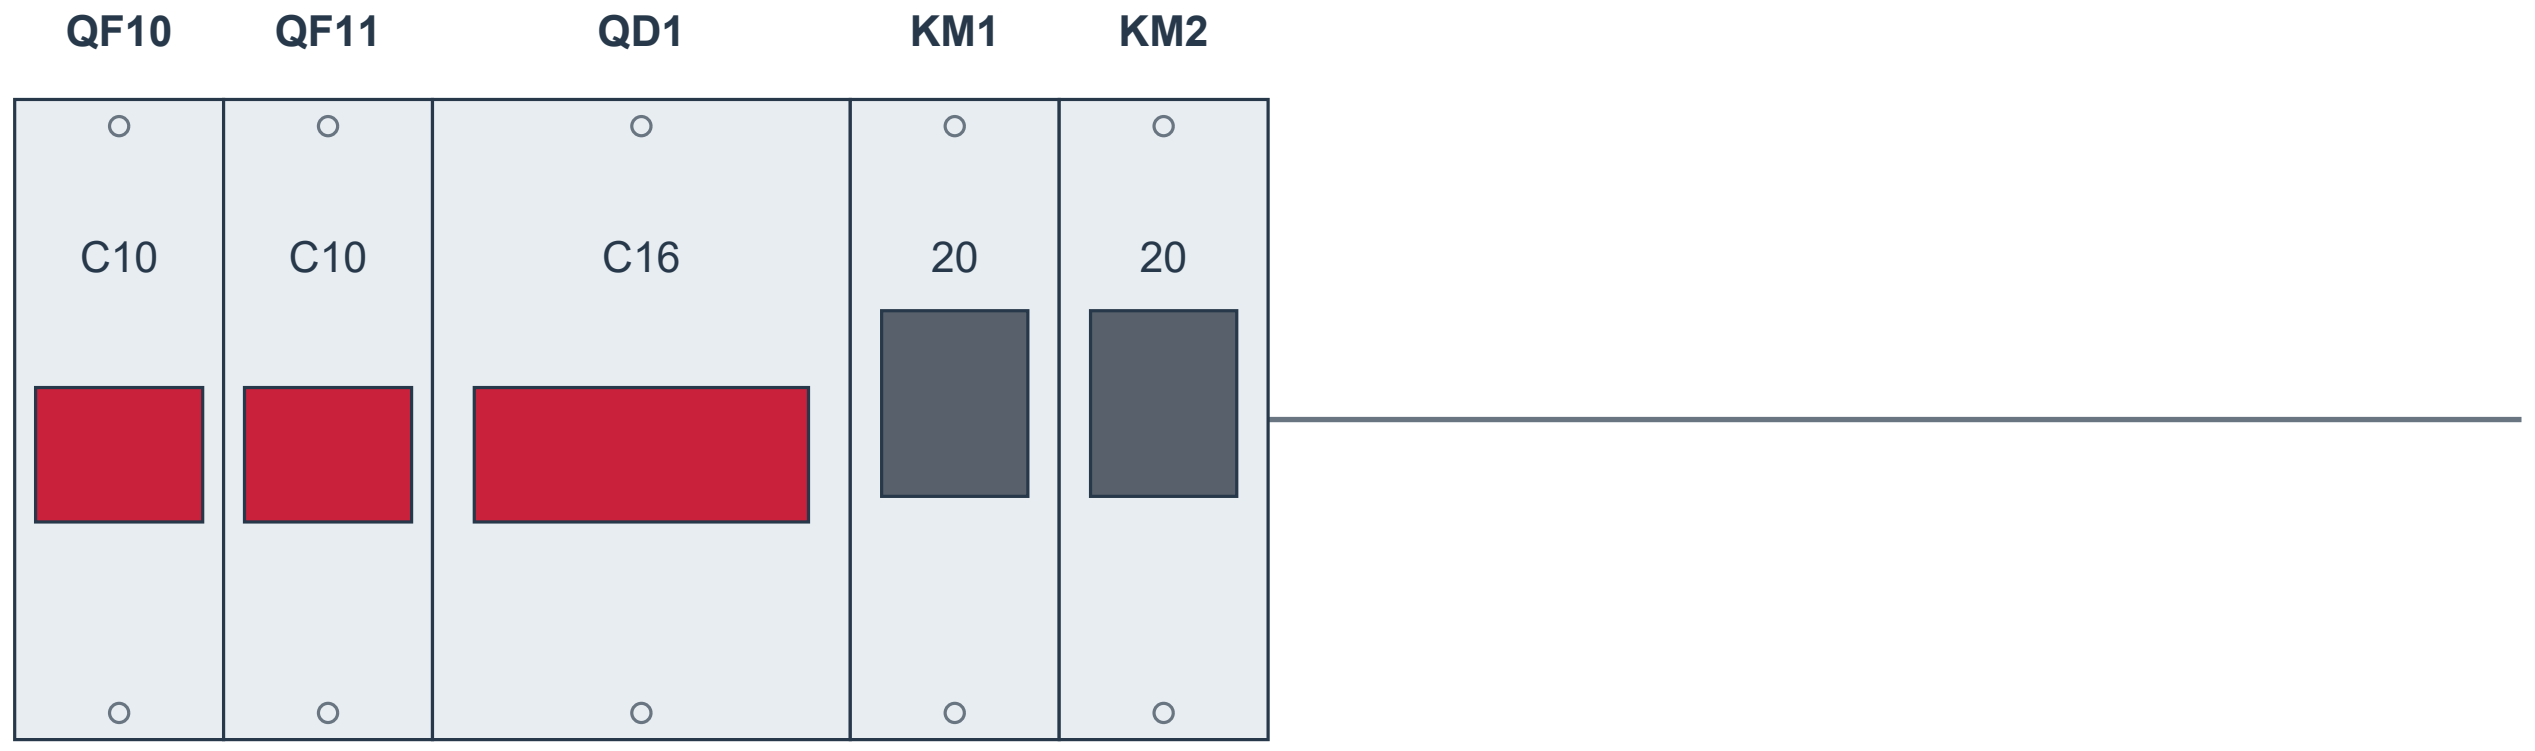

Сумма ширин: 108 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	888	1	0	?	54 B
QF1 - QF9	NXB-63S	889	1	54...198	?	18 B
QF10 - QF11	NXB-63S	890	2	0...18	?	18 B
QD1	NXBLE-63YH	891	2	36	?	36 B
KM1 - KM2	256054	892	2	72...90	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Актуальная спецификация

ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 907 | ЭОМ, PDF стр. 50

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
908	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
909	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
910	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
911	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 50

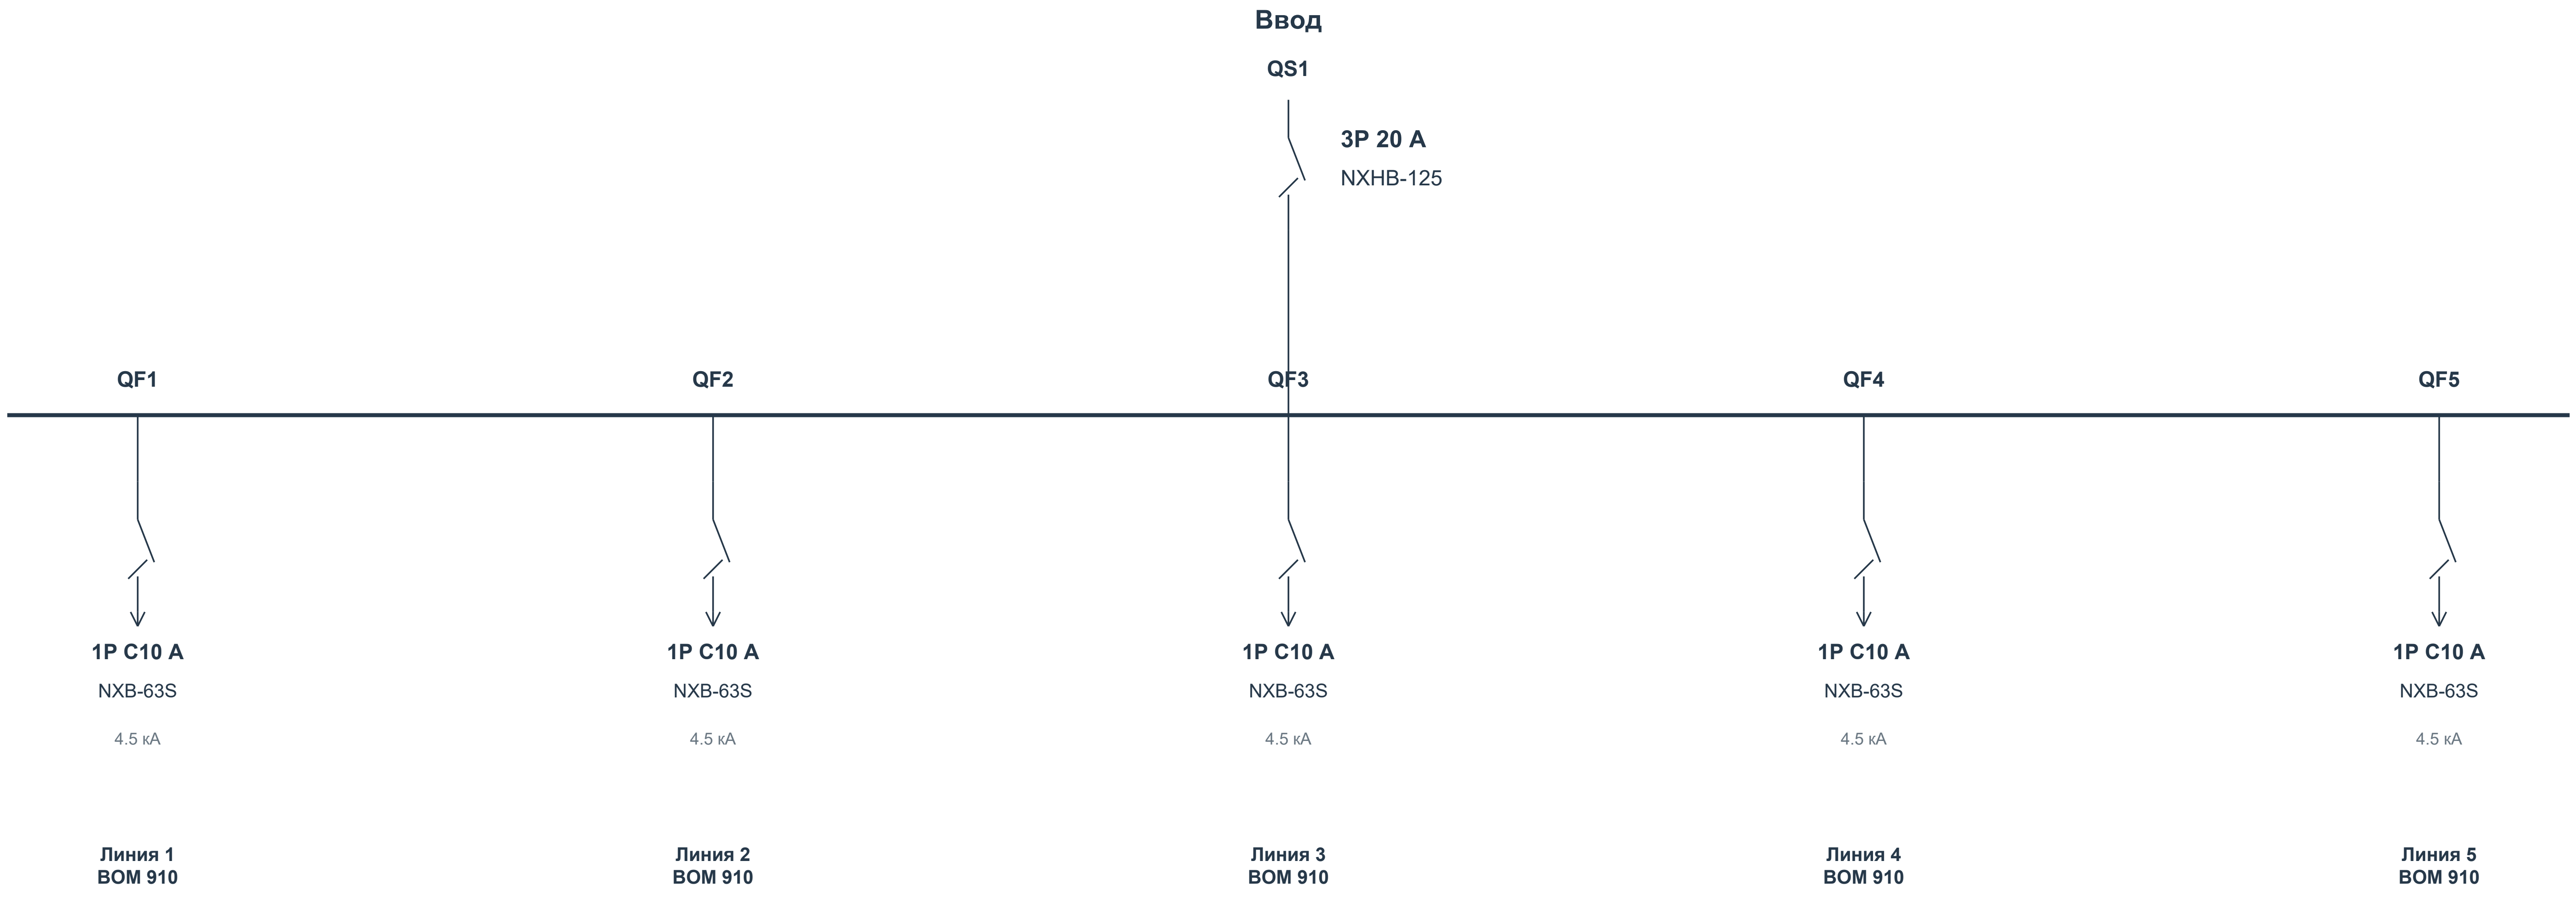
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 910
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 910
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 910
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 910
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 910

Управление / учет: KM1 - KM2 256054 × 2

Данные исходного проекта: Ру 1.42 кВт | Рр 1,42 кВт | Ip 2,27 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

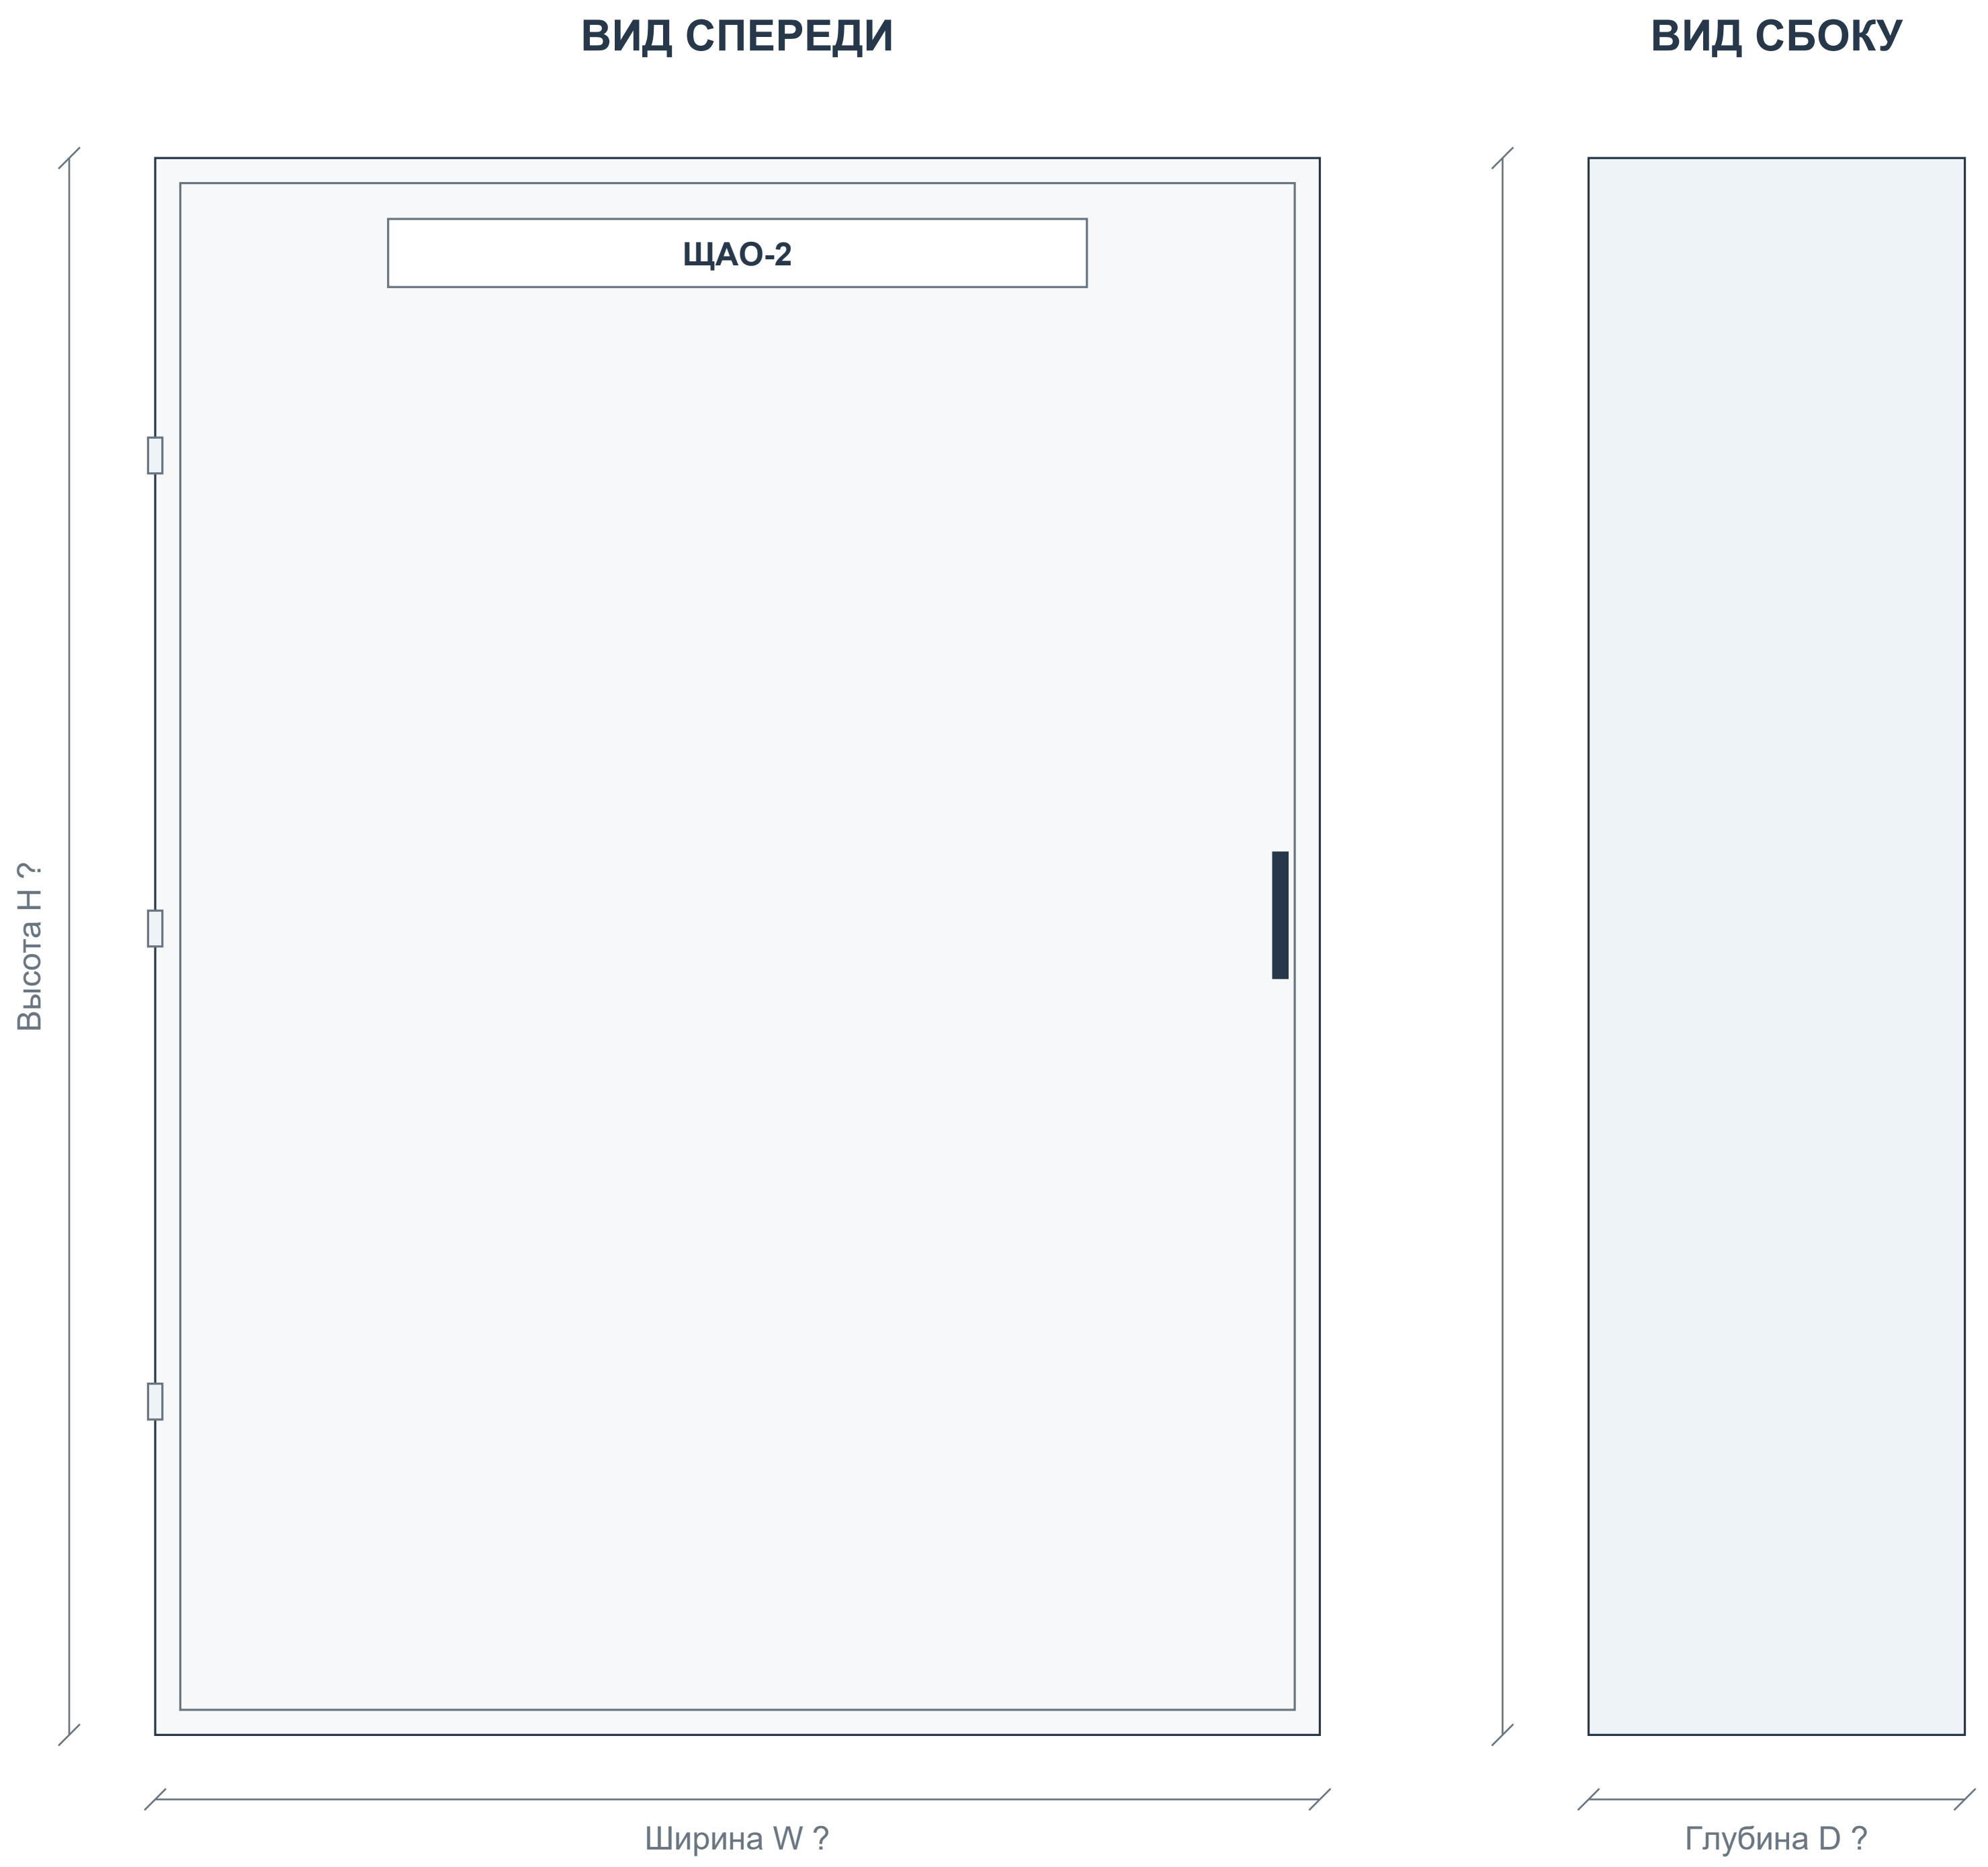

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

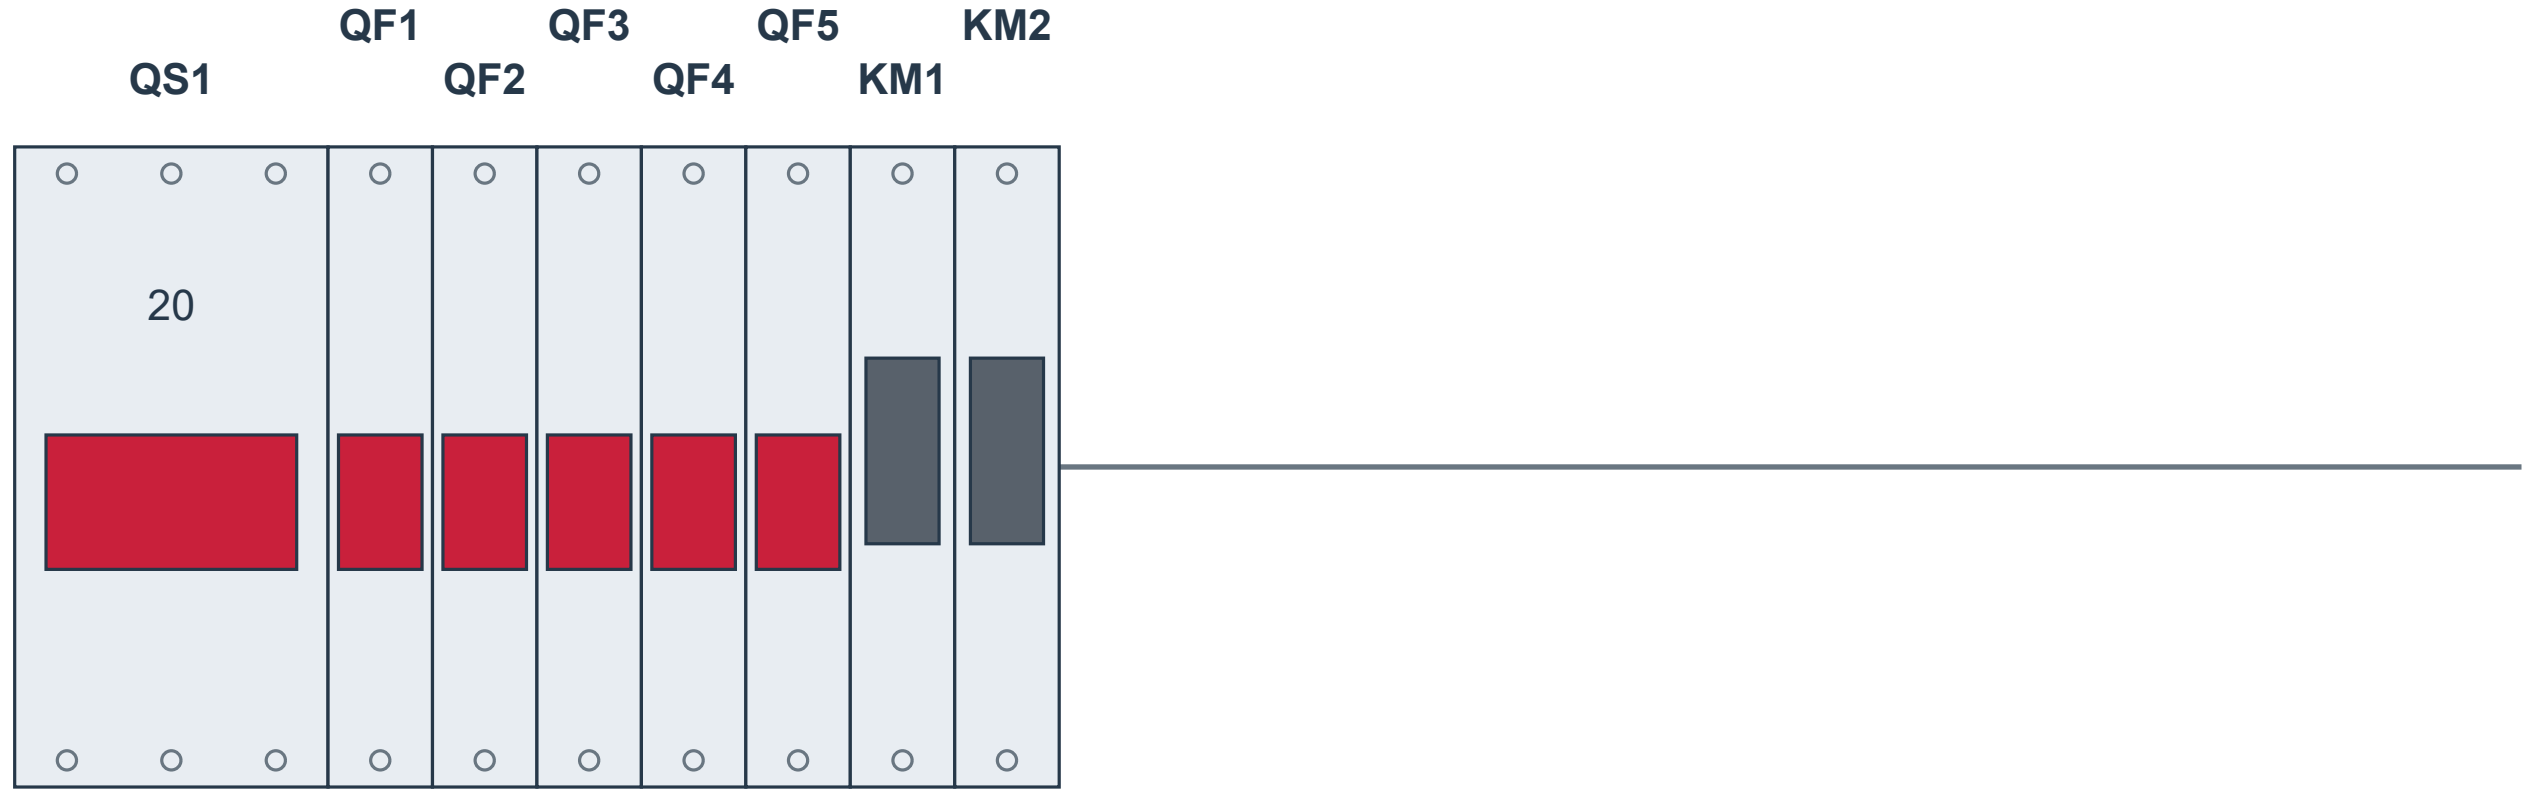

Сумма ширин: 180 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	909	1	0	?	54 B
QF1 - QF5	NXB-63S	910	1	54...126	?	18 B
KM1 - KM2	256054	911	1	144...162	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Актуальная спецификация

ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 923 | ЭОМ, PDF стр. 51

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
924	713-09050	5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
925	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
926	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
927	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 51

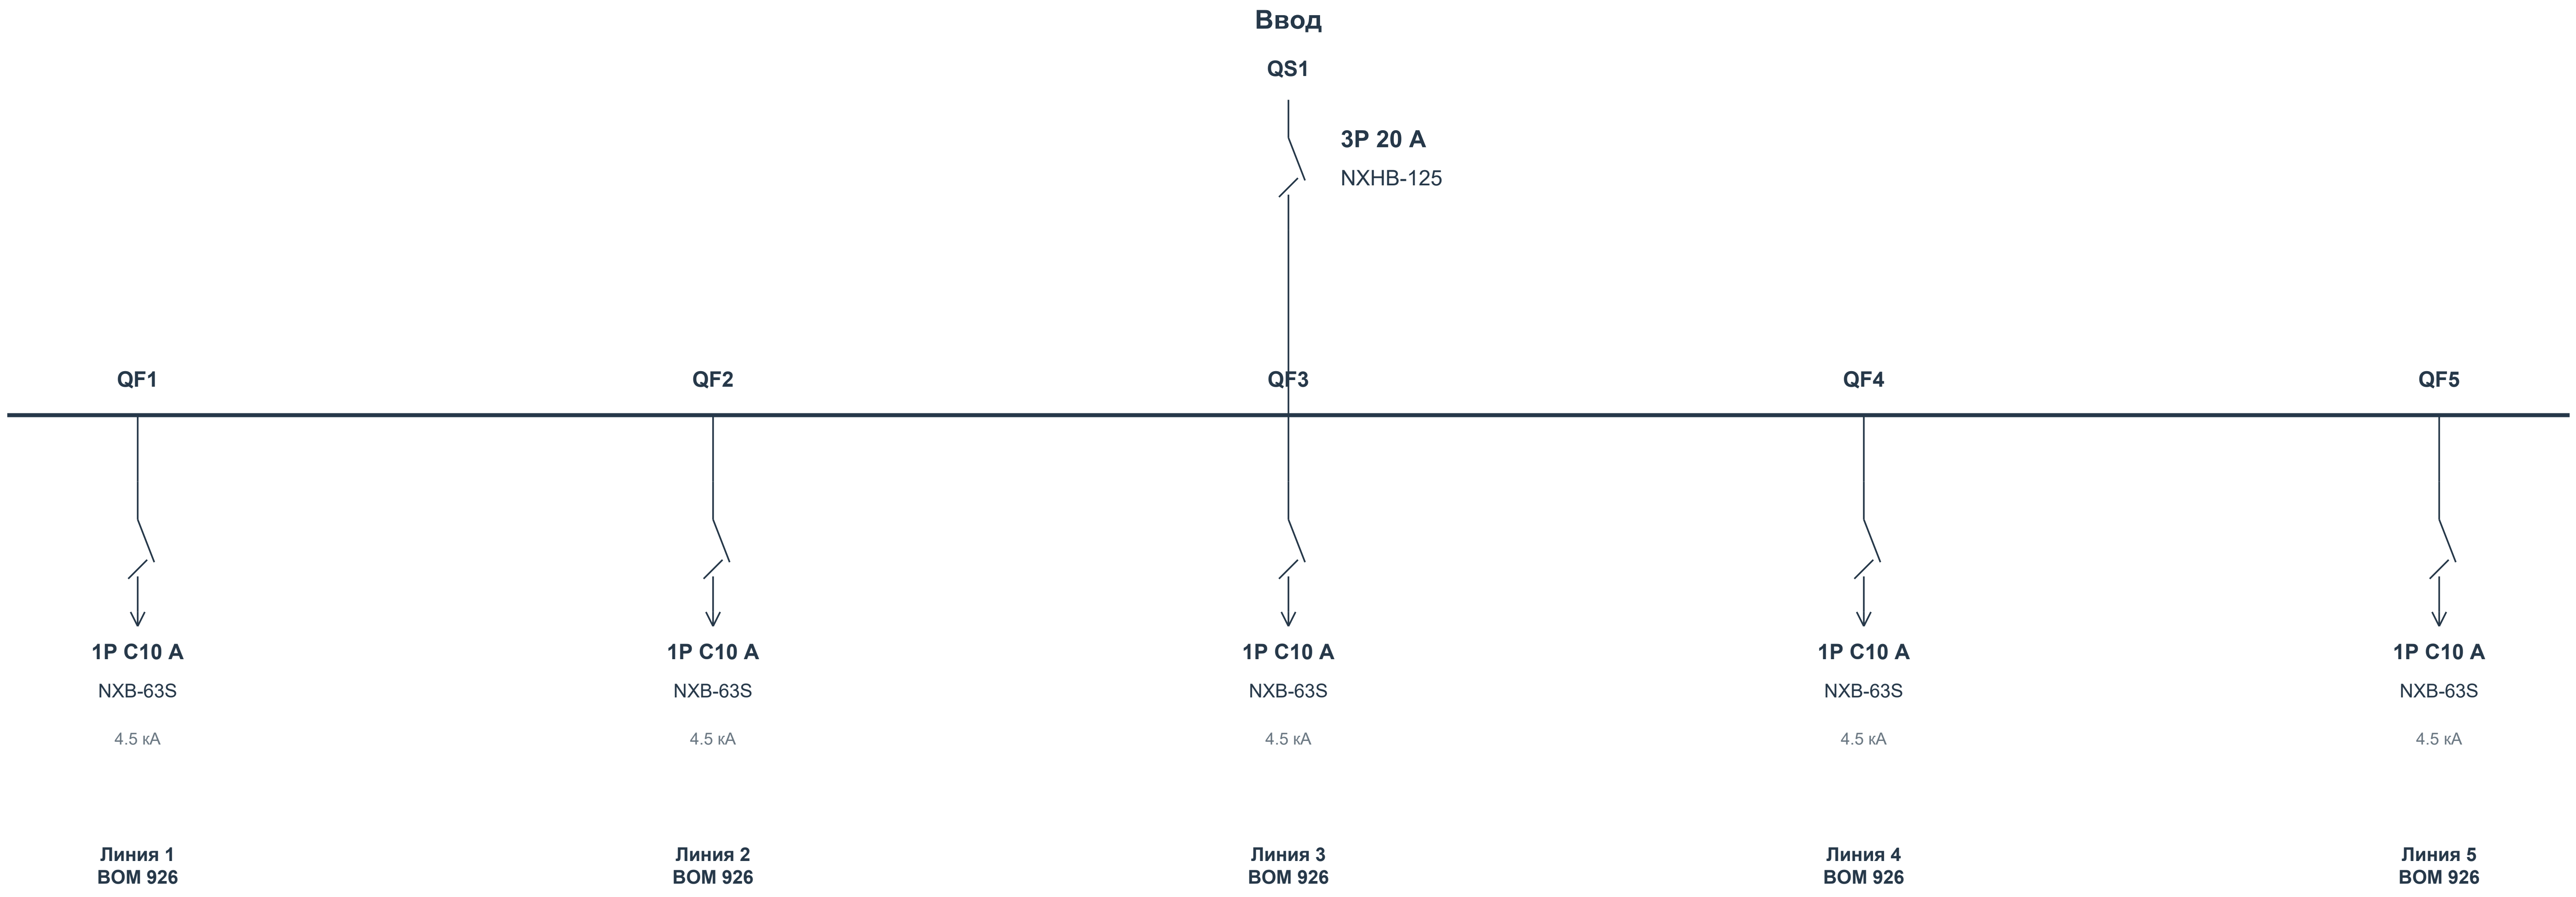
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 926
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 926
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 926
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 926
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 926

Управление / учет: KM1 256054 × 1

Данные исходного проекта: Ру 4.15 кВт | Рр 4,15 кВт | Ip 6,64 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

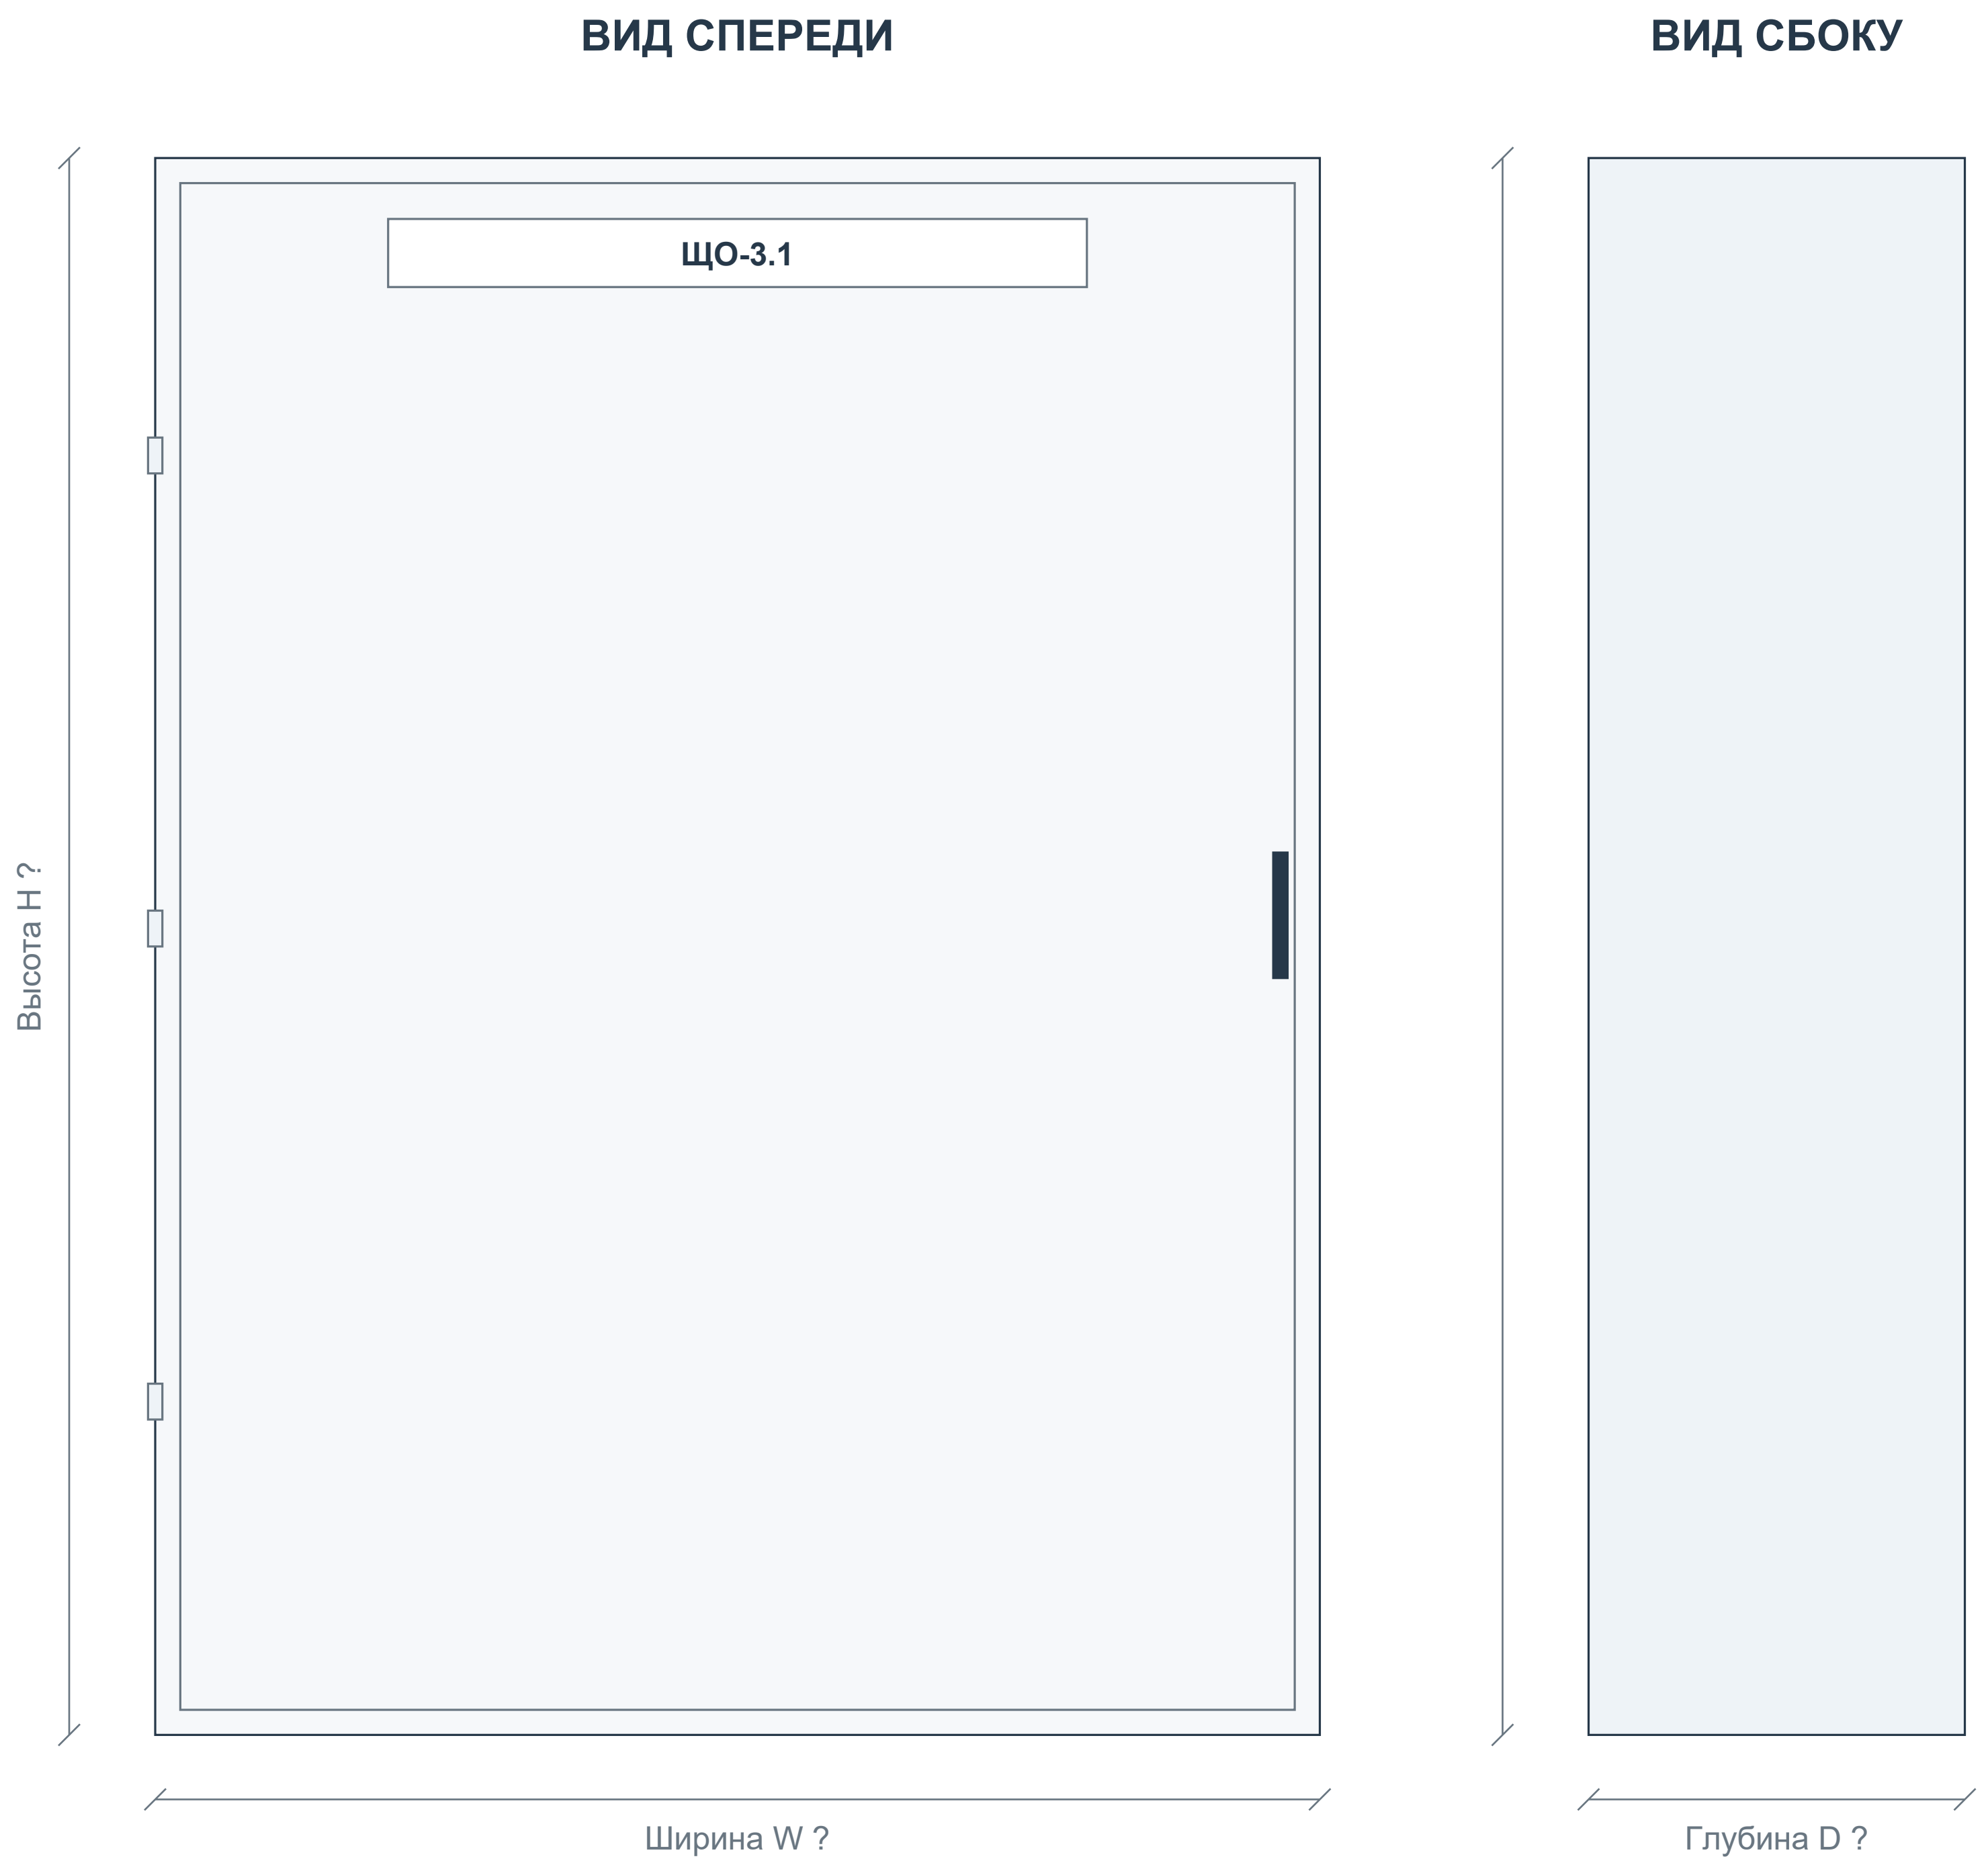

Корпус: 5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

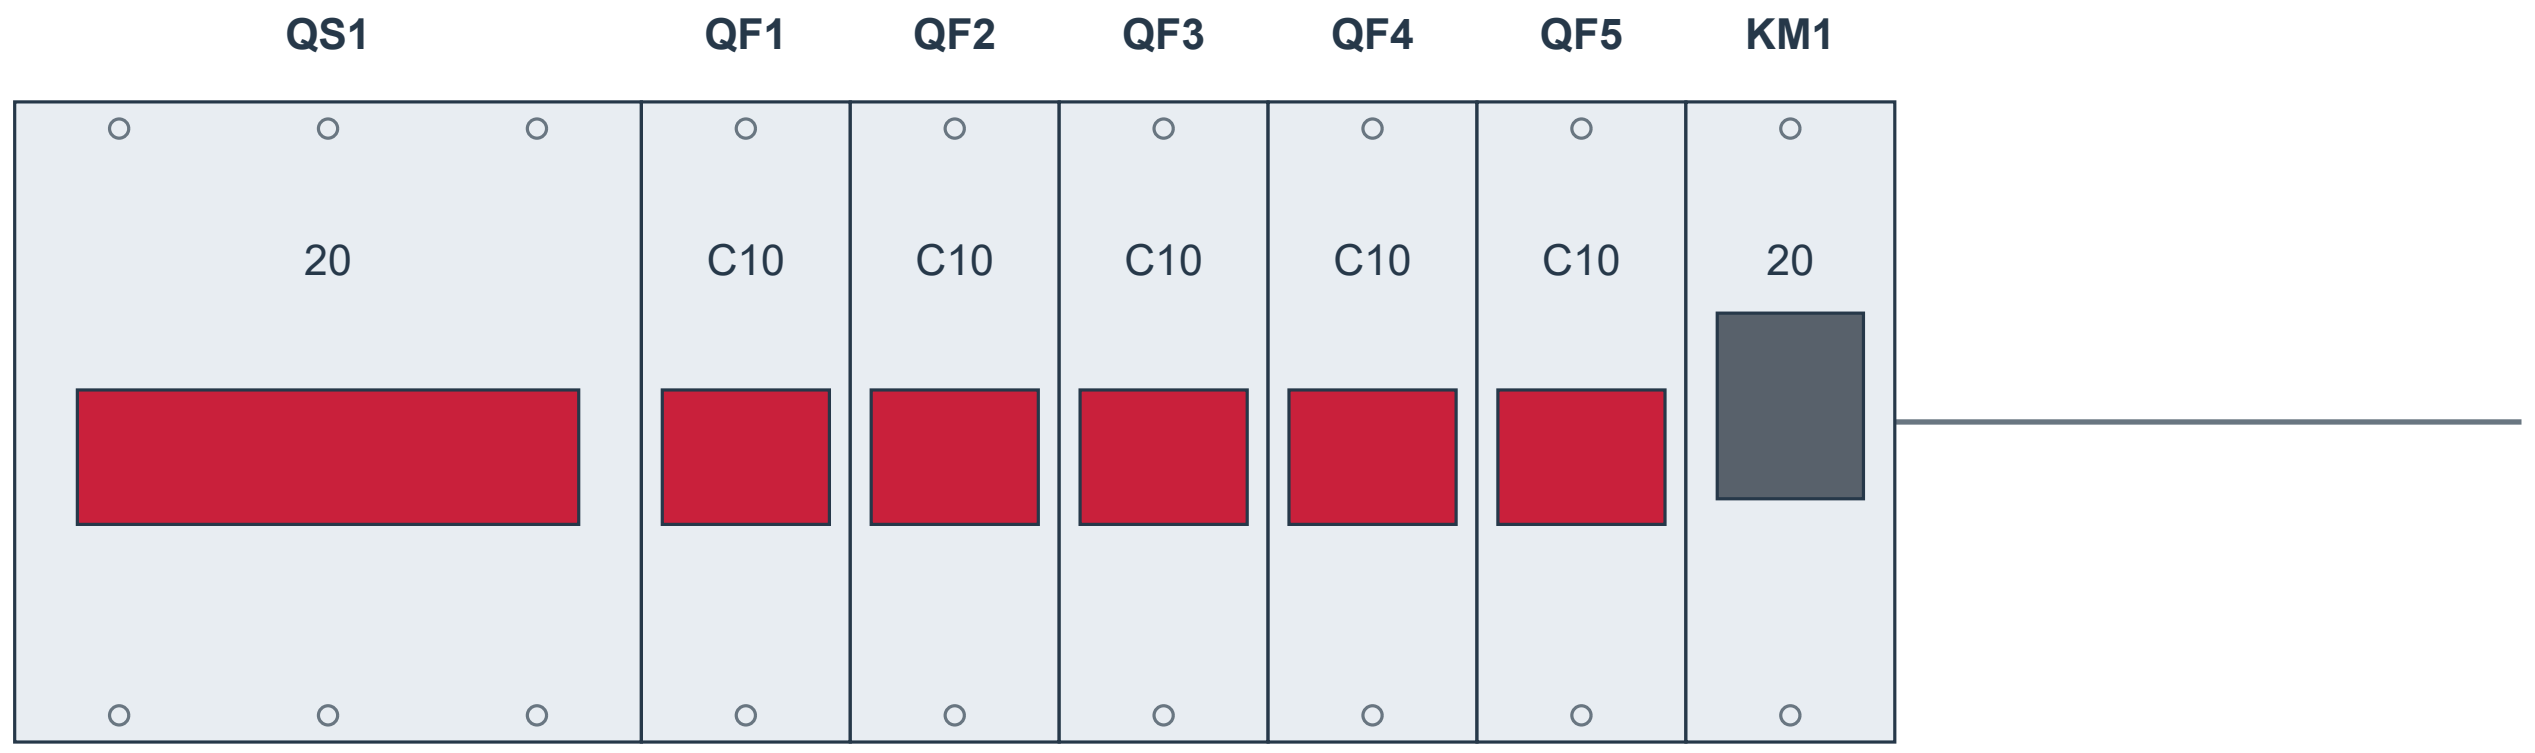

Сумма ширин: 162 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	925	1	0	?	54 B
QF1 - QF5	NXB-63S	926	1	54...126	?	18 B
KM1	256054	927	1	144	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 12 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Актуальная спецификация

ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 939 | ЭОМ, PDF стр. 52

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
940	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
941	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
942	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	6	6	chint	Отход.
943	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
944	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
945	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 52

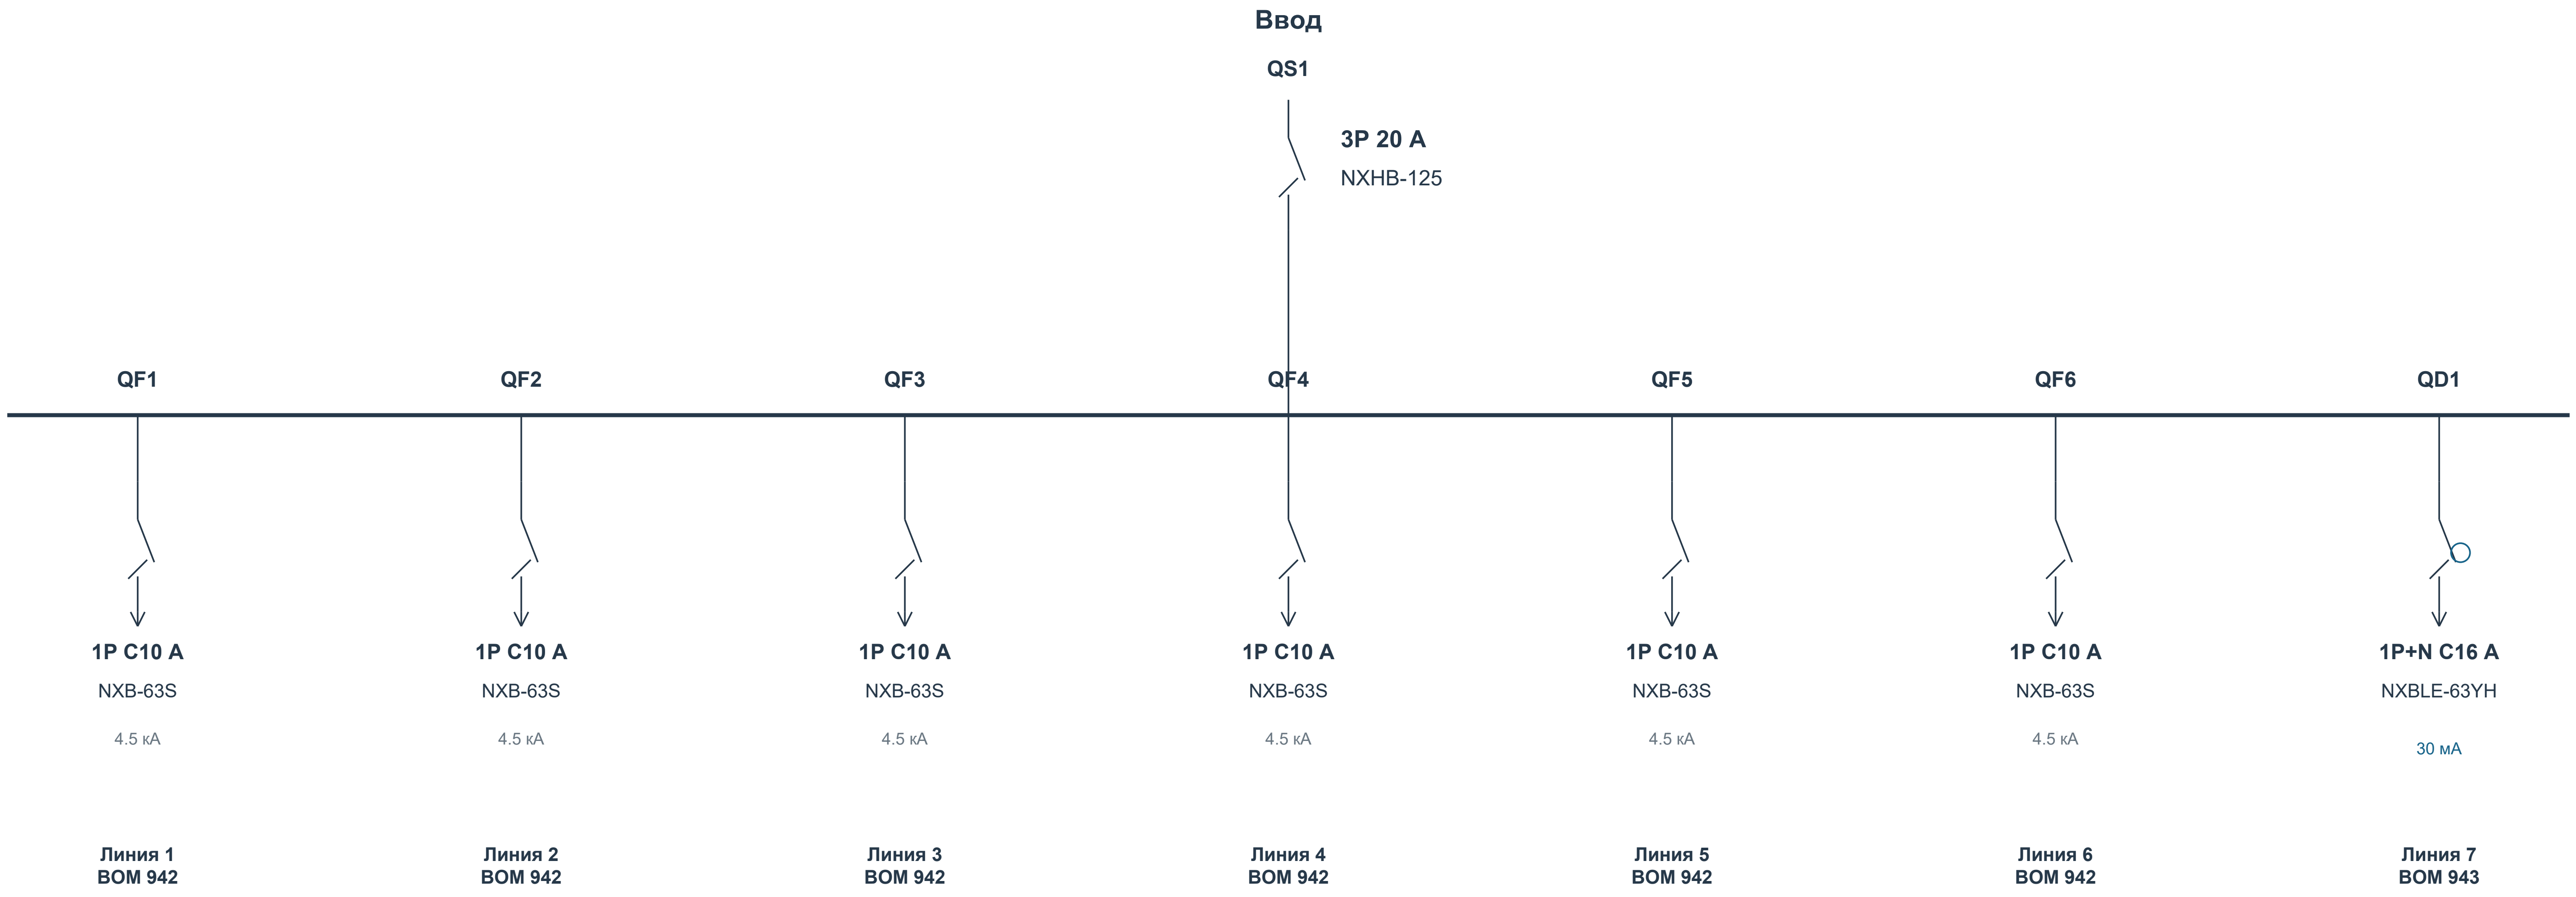
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QD1
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 942
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 942
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 942
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 942
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 942
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 942
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 943

Управление / учет: KM1 - KM4 256054 × 4

Данные исходного проекта: Ру 2.49 кВт | Рр 2,49 кВт | Iр 3,99 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

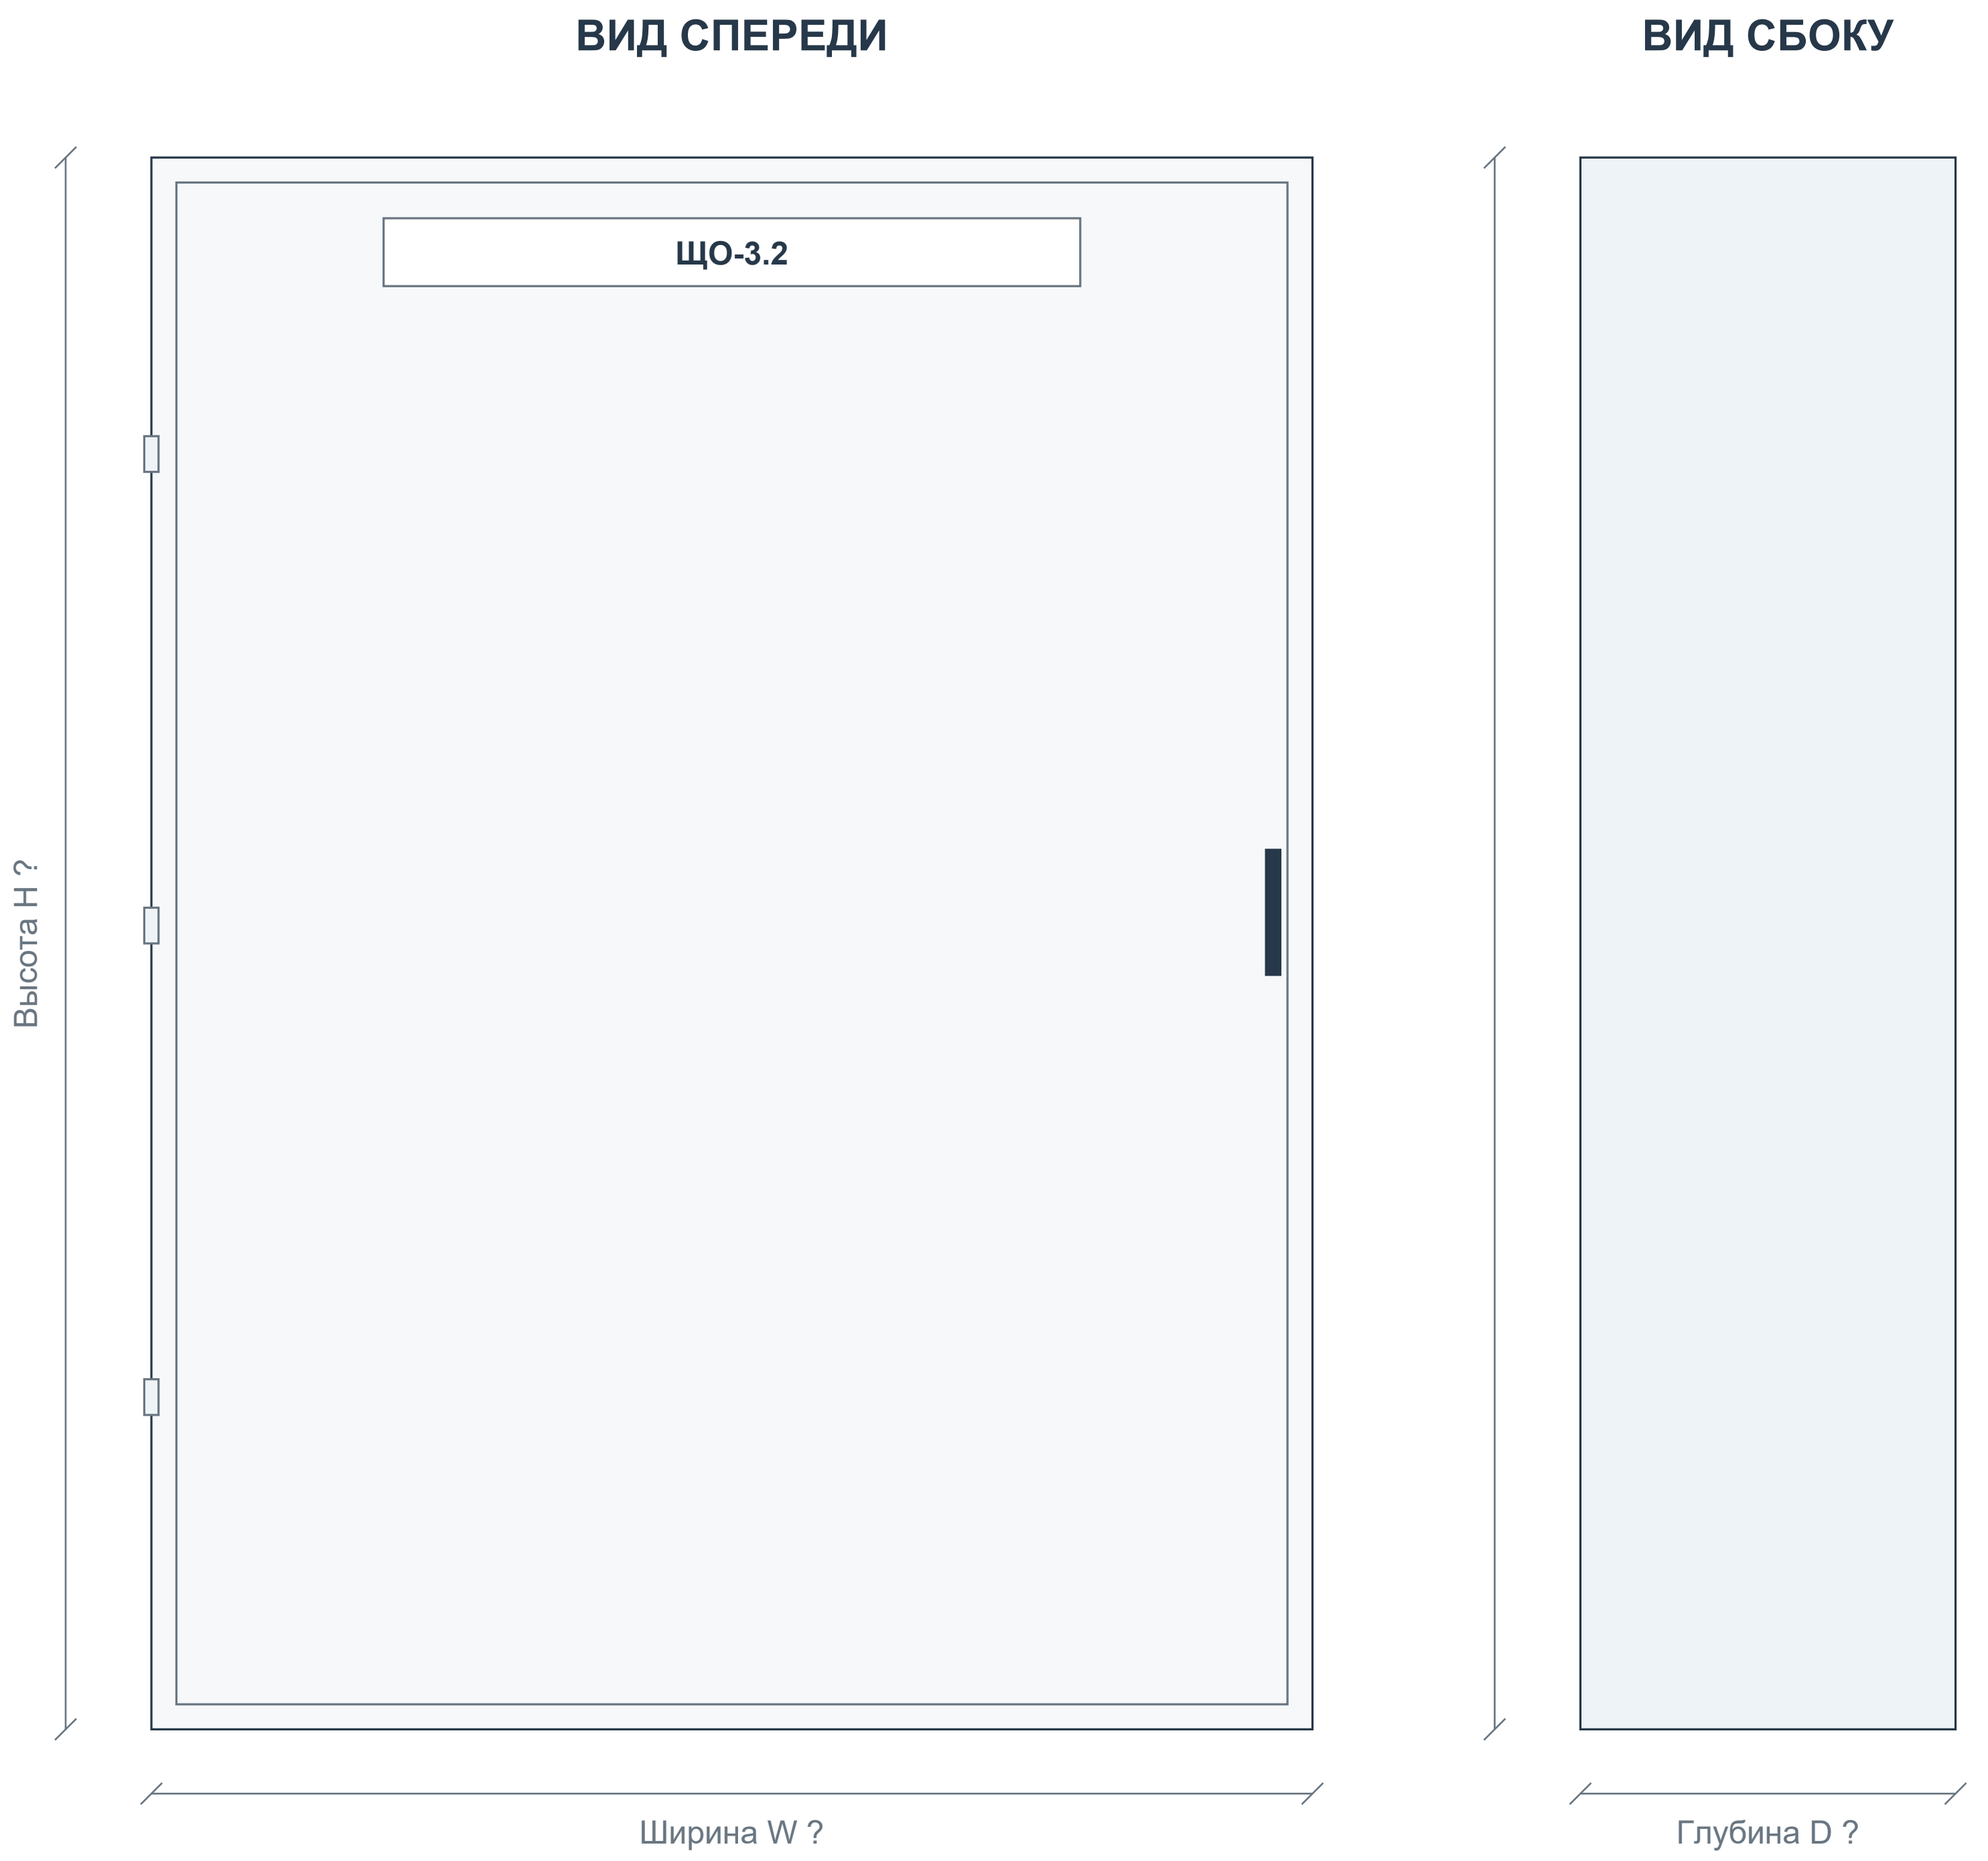

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

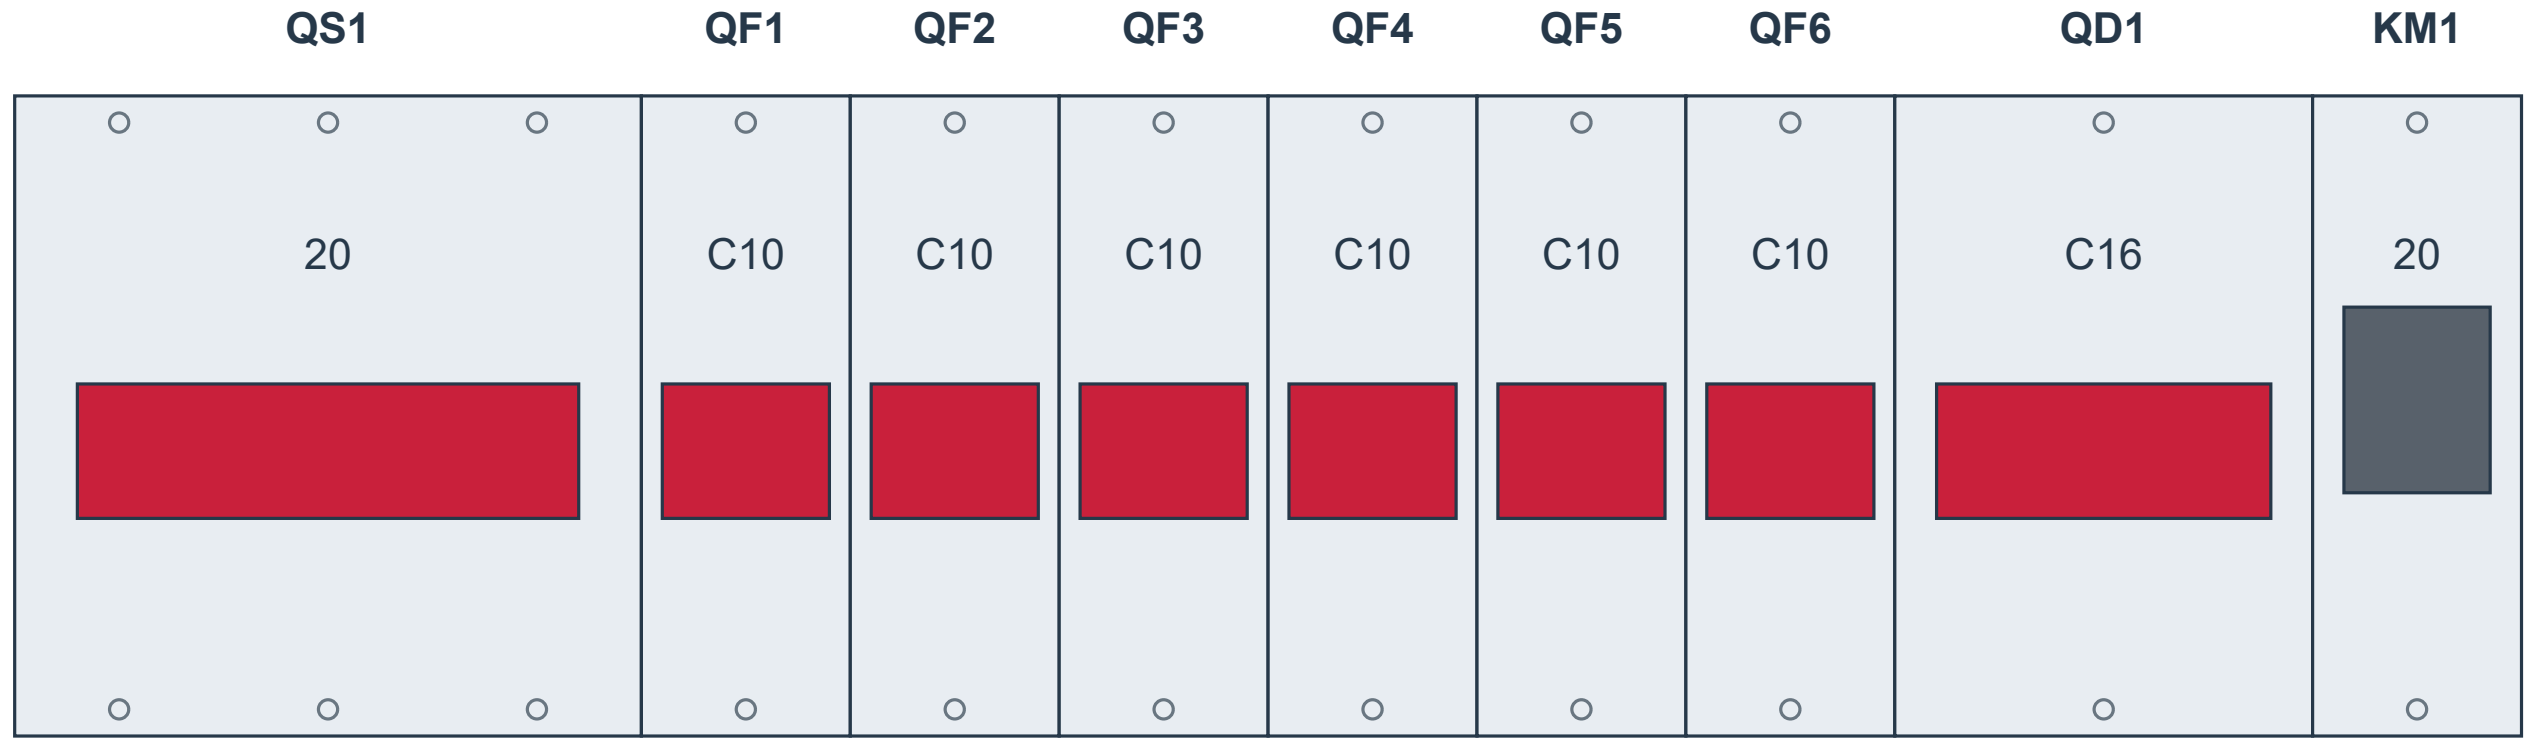

Сумма ширин: 216 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	941	1	0	?	54 B
QF1 - QF6	NXB-63S	942	1	54...144	?	18 B
QD1	NXBLE-63YH	943	1	162	?	36 B
KM1	256054	944	1	198	?	18 B
KM2 - KM4	256054	945	2	0...36	?	18 B

Ряд 2 | модульная раскладка D

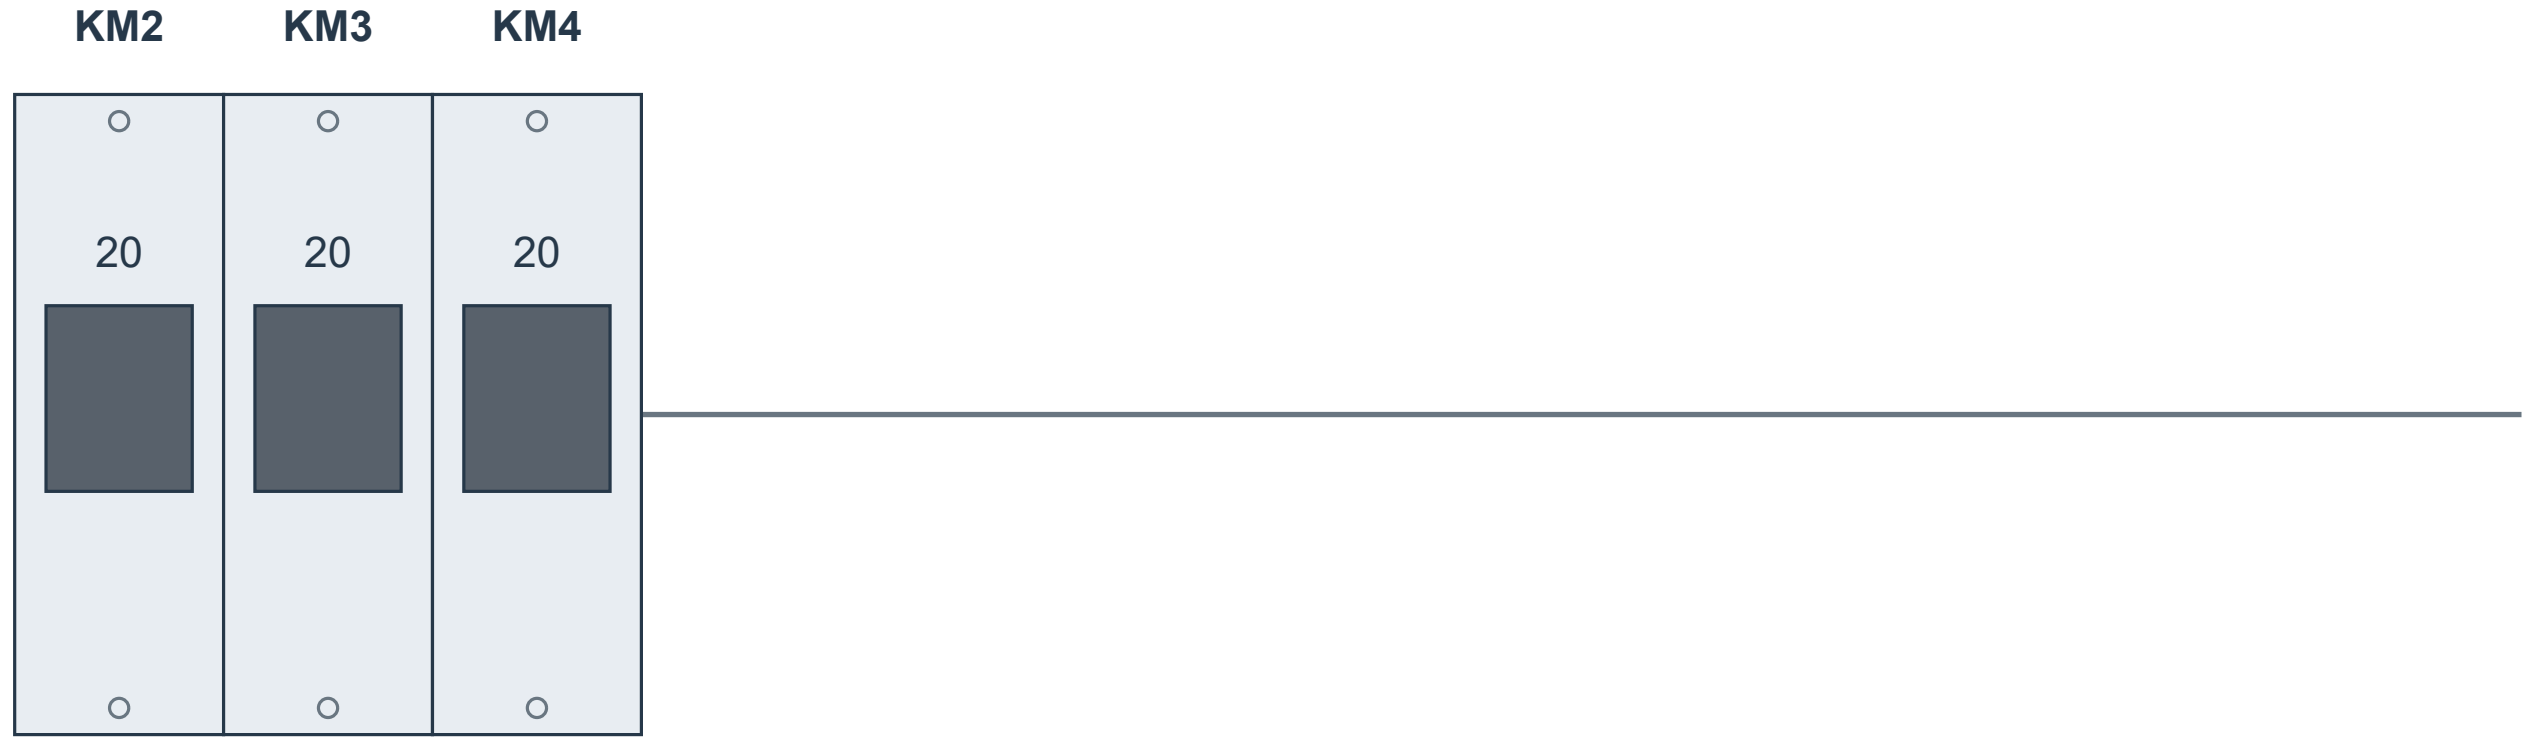

Сумма ширин: 54 мм B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Актуальная спецификация

ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 959 | ЭОМ, PDF стр. 53

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
960	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
961	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
962	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
963	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
964	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 53

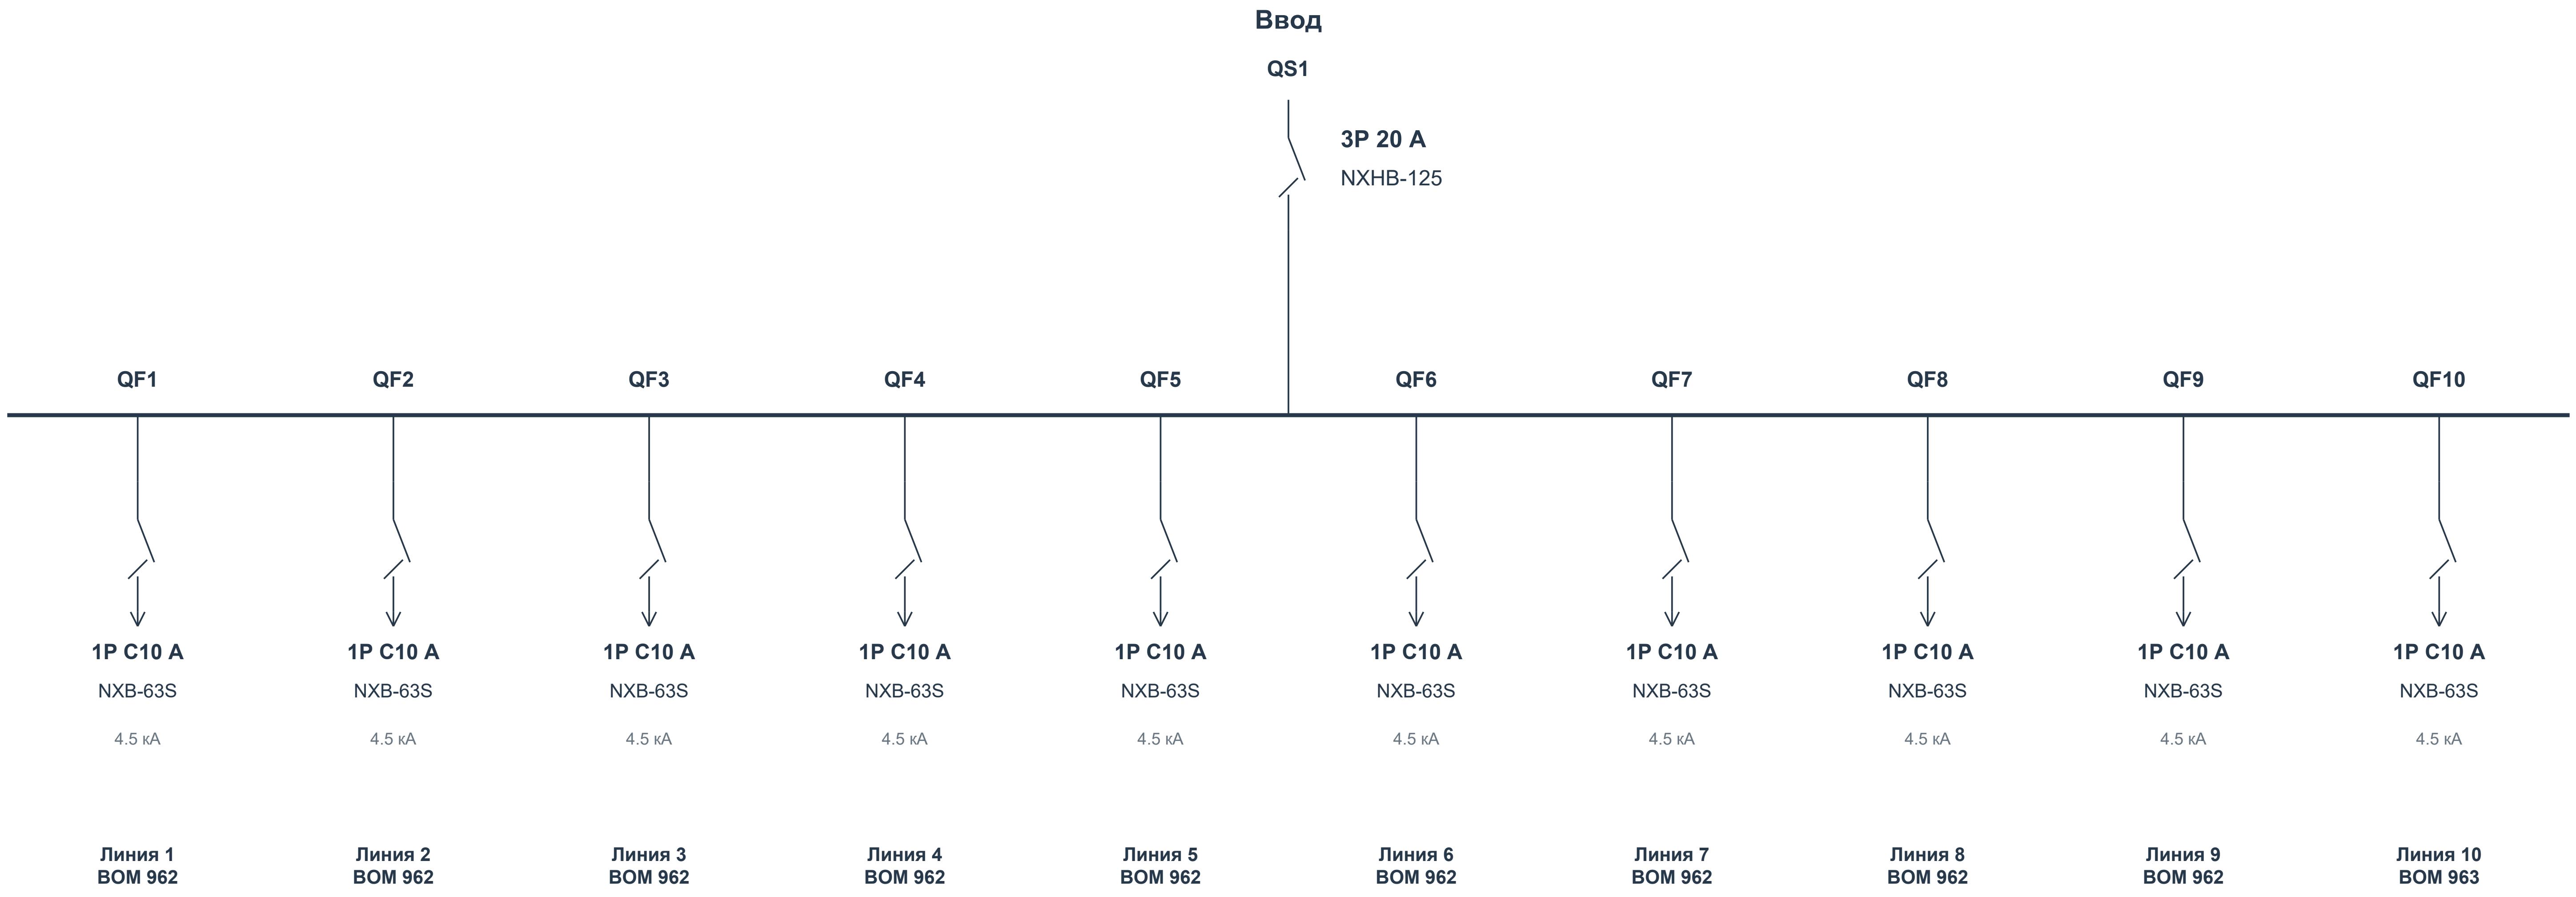
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 962
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 962
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 962
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 962
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 962
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 962
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 962
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 8
BOM 962
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 9
BOM 962
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 10
BOM 963

Управление / учет: KM1 - KM2 256054 × 2

Данные исходного проекта: Ру 7.38 кВт | Рр 7,38 кВт | Ip 11,82 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

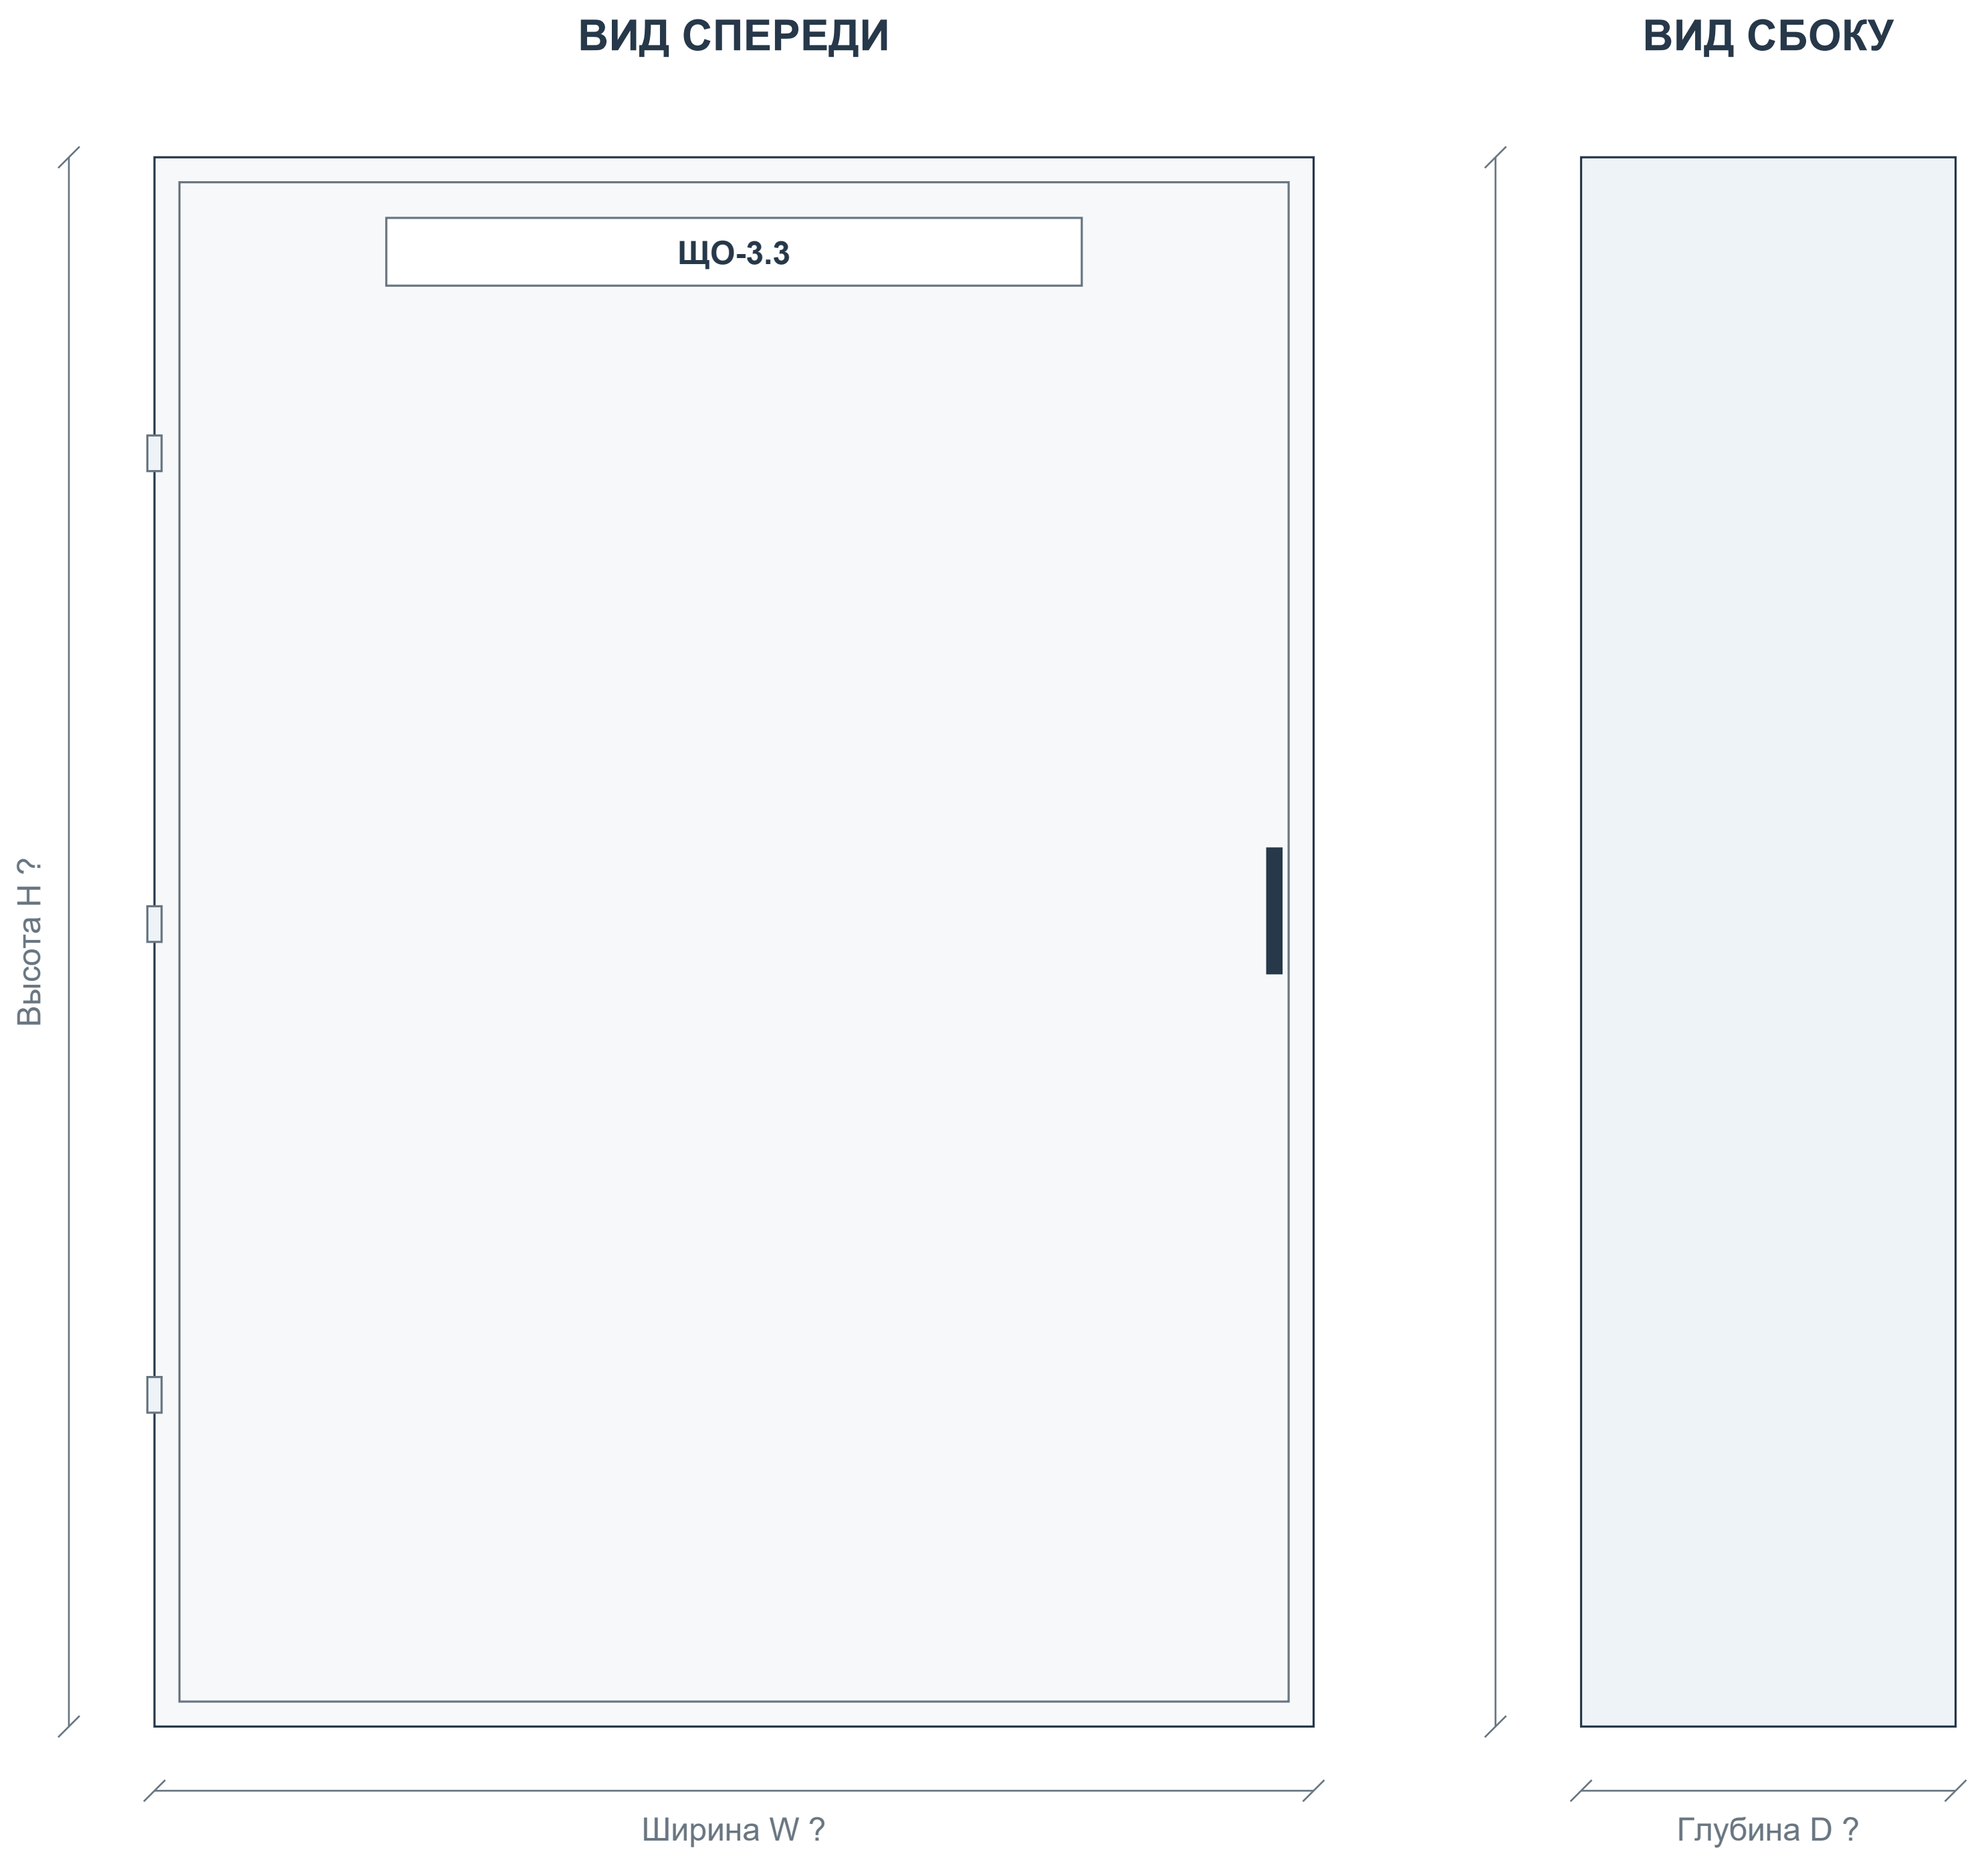

Корпус: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

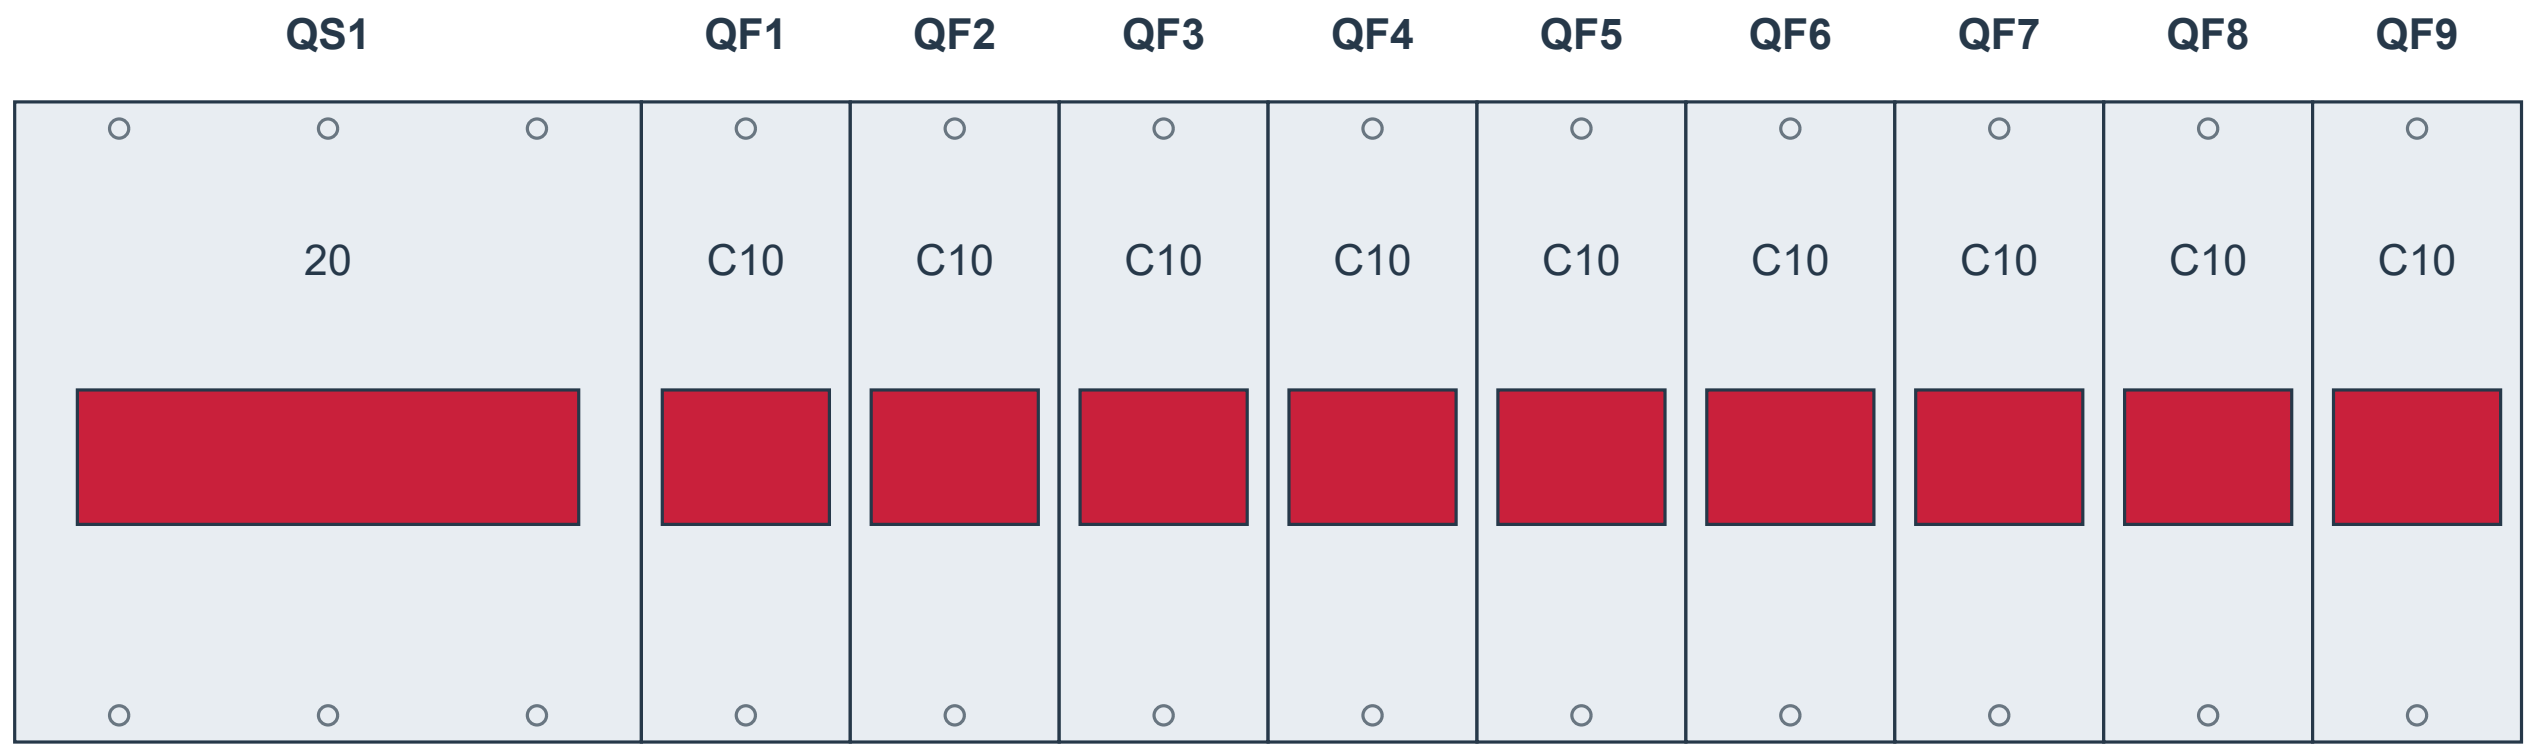

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

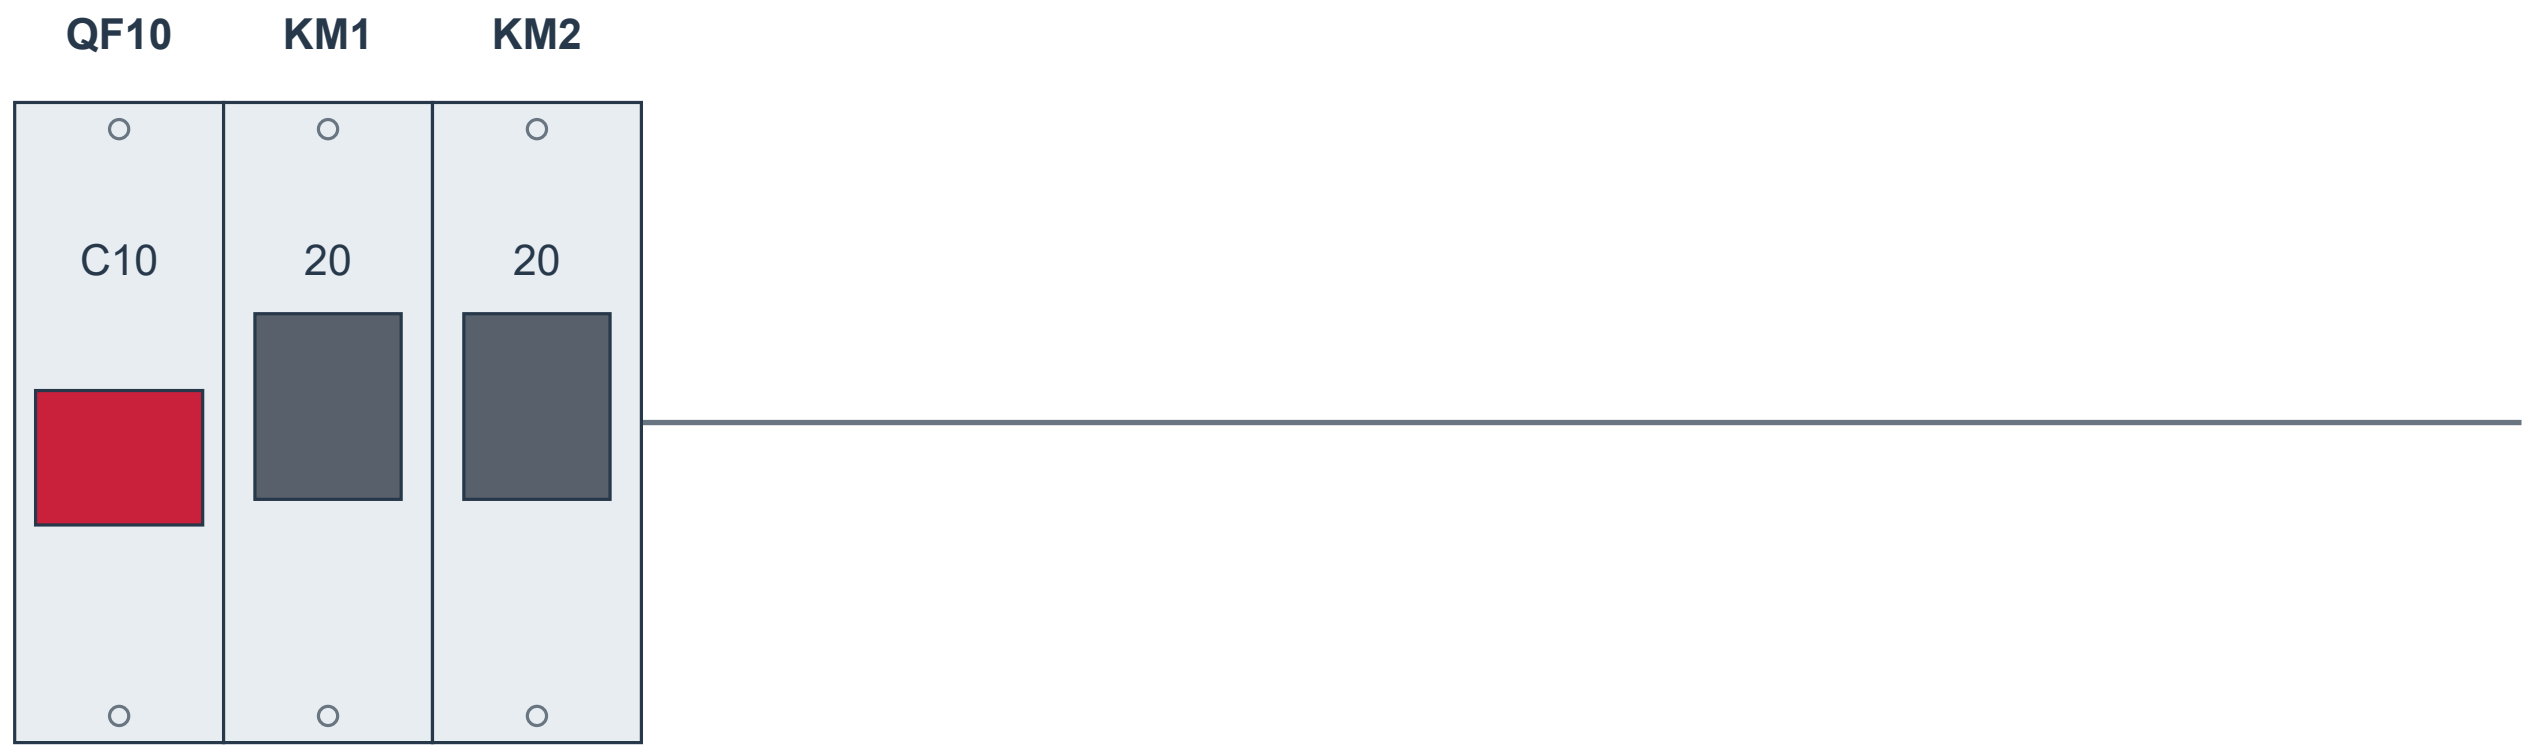

Сумма ширин: 54 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	961	1	0	?	54 B
QF1 - QF9	NXB-63S	962	1	54...198	?	18 B
QF10	NXB-63S	963	2	0	?	18 B
KM1 - KM2	256054	964	2	18...36	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Актуальная спецификация

ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 978 | ЭОМ, PDF стр. 54

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
979	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
980	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
981	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
982	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 54

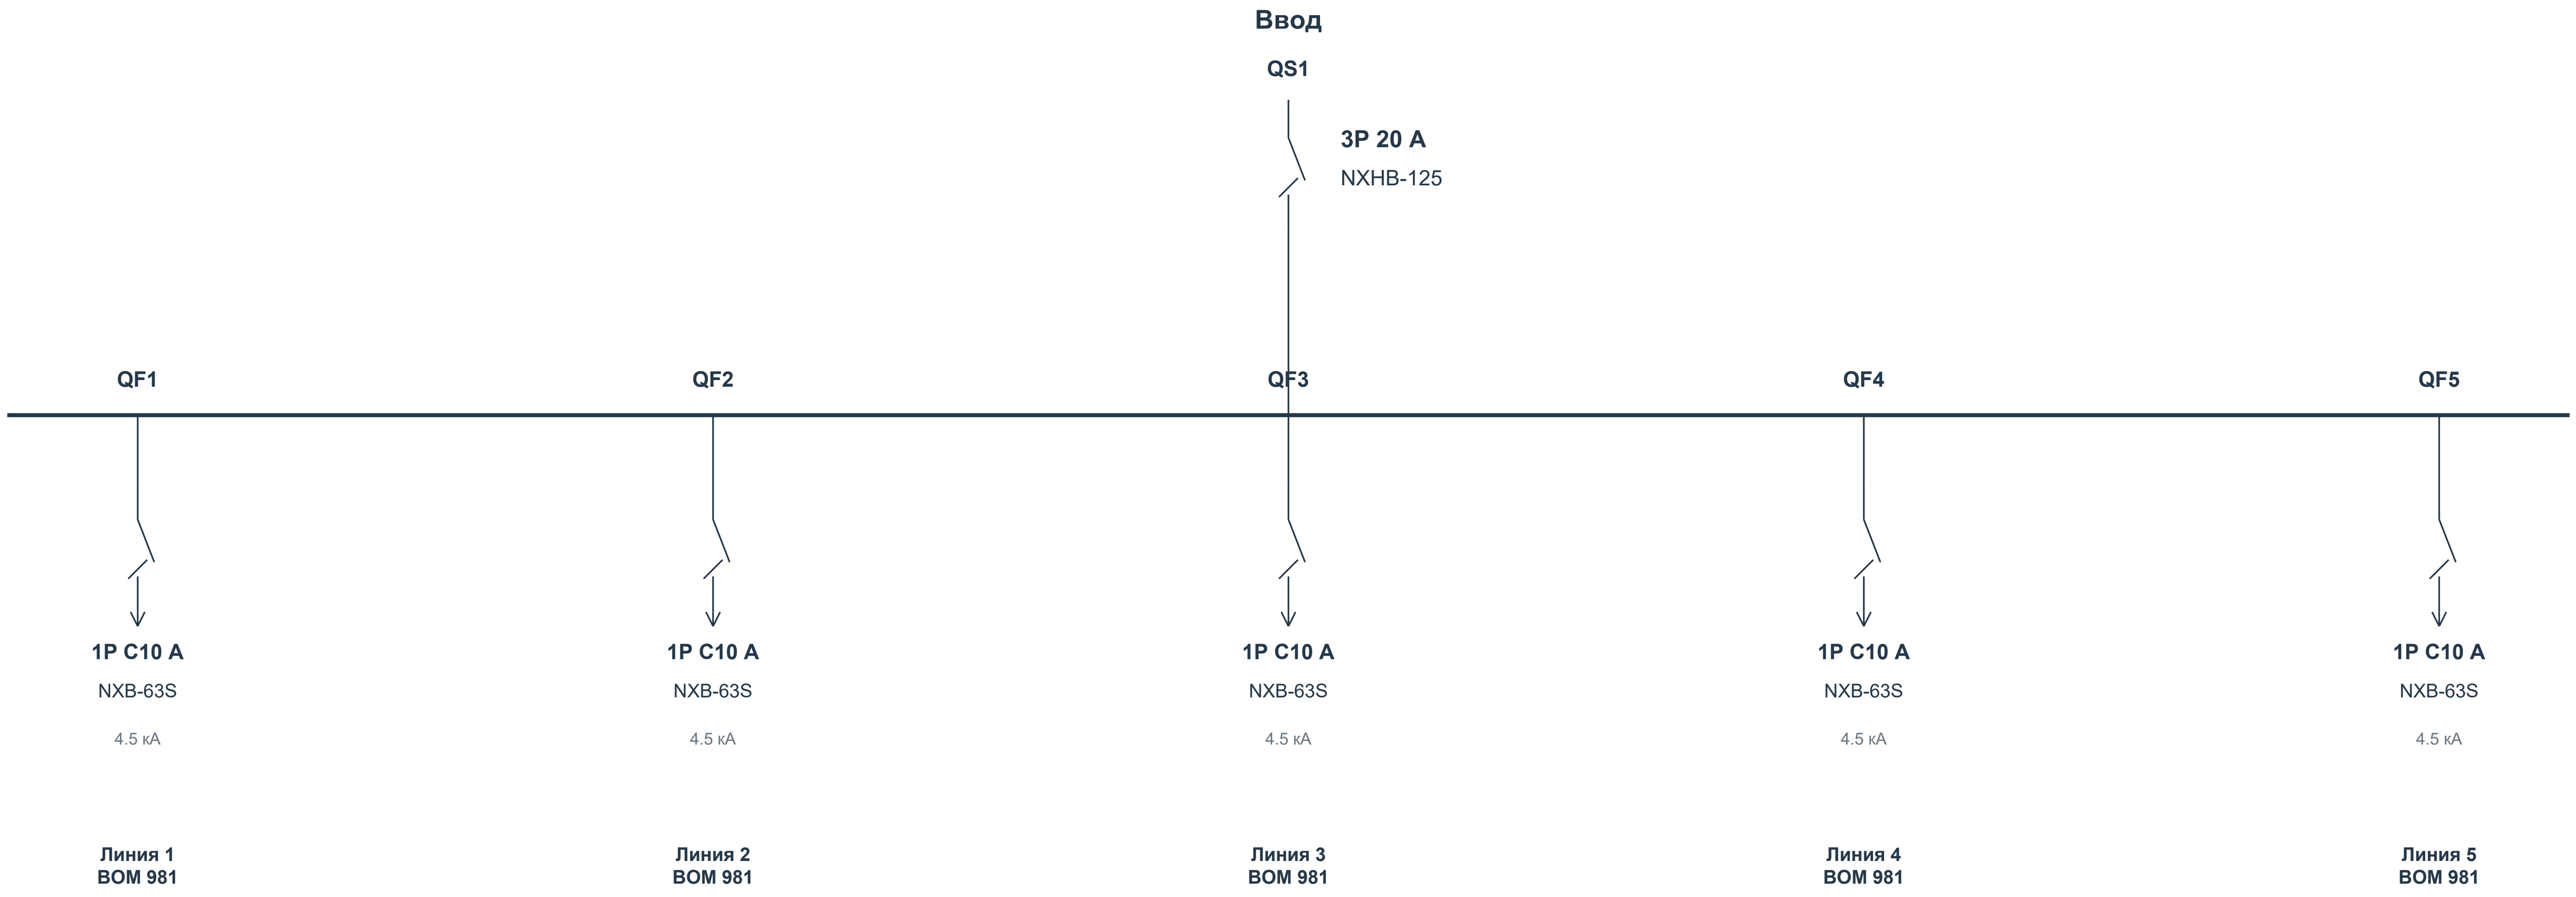
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 981
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 981
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 981
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 981
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 981

Управление / учет: KM1 - KM3 256054 × 3

Данные исходного проекта: Ру 0.88 кВт | Рр 0,88 кВт | Ip 1,41 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

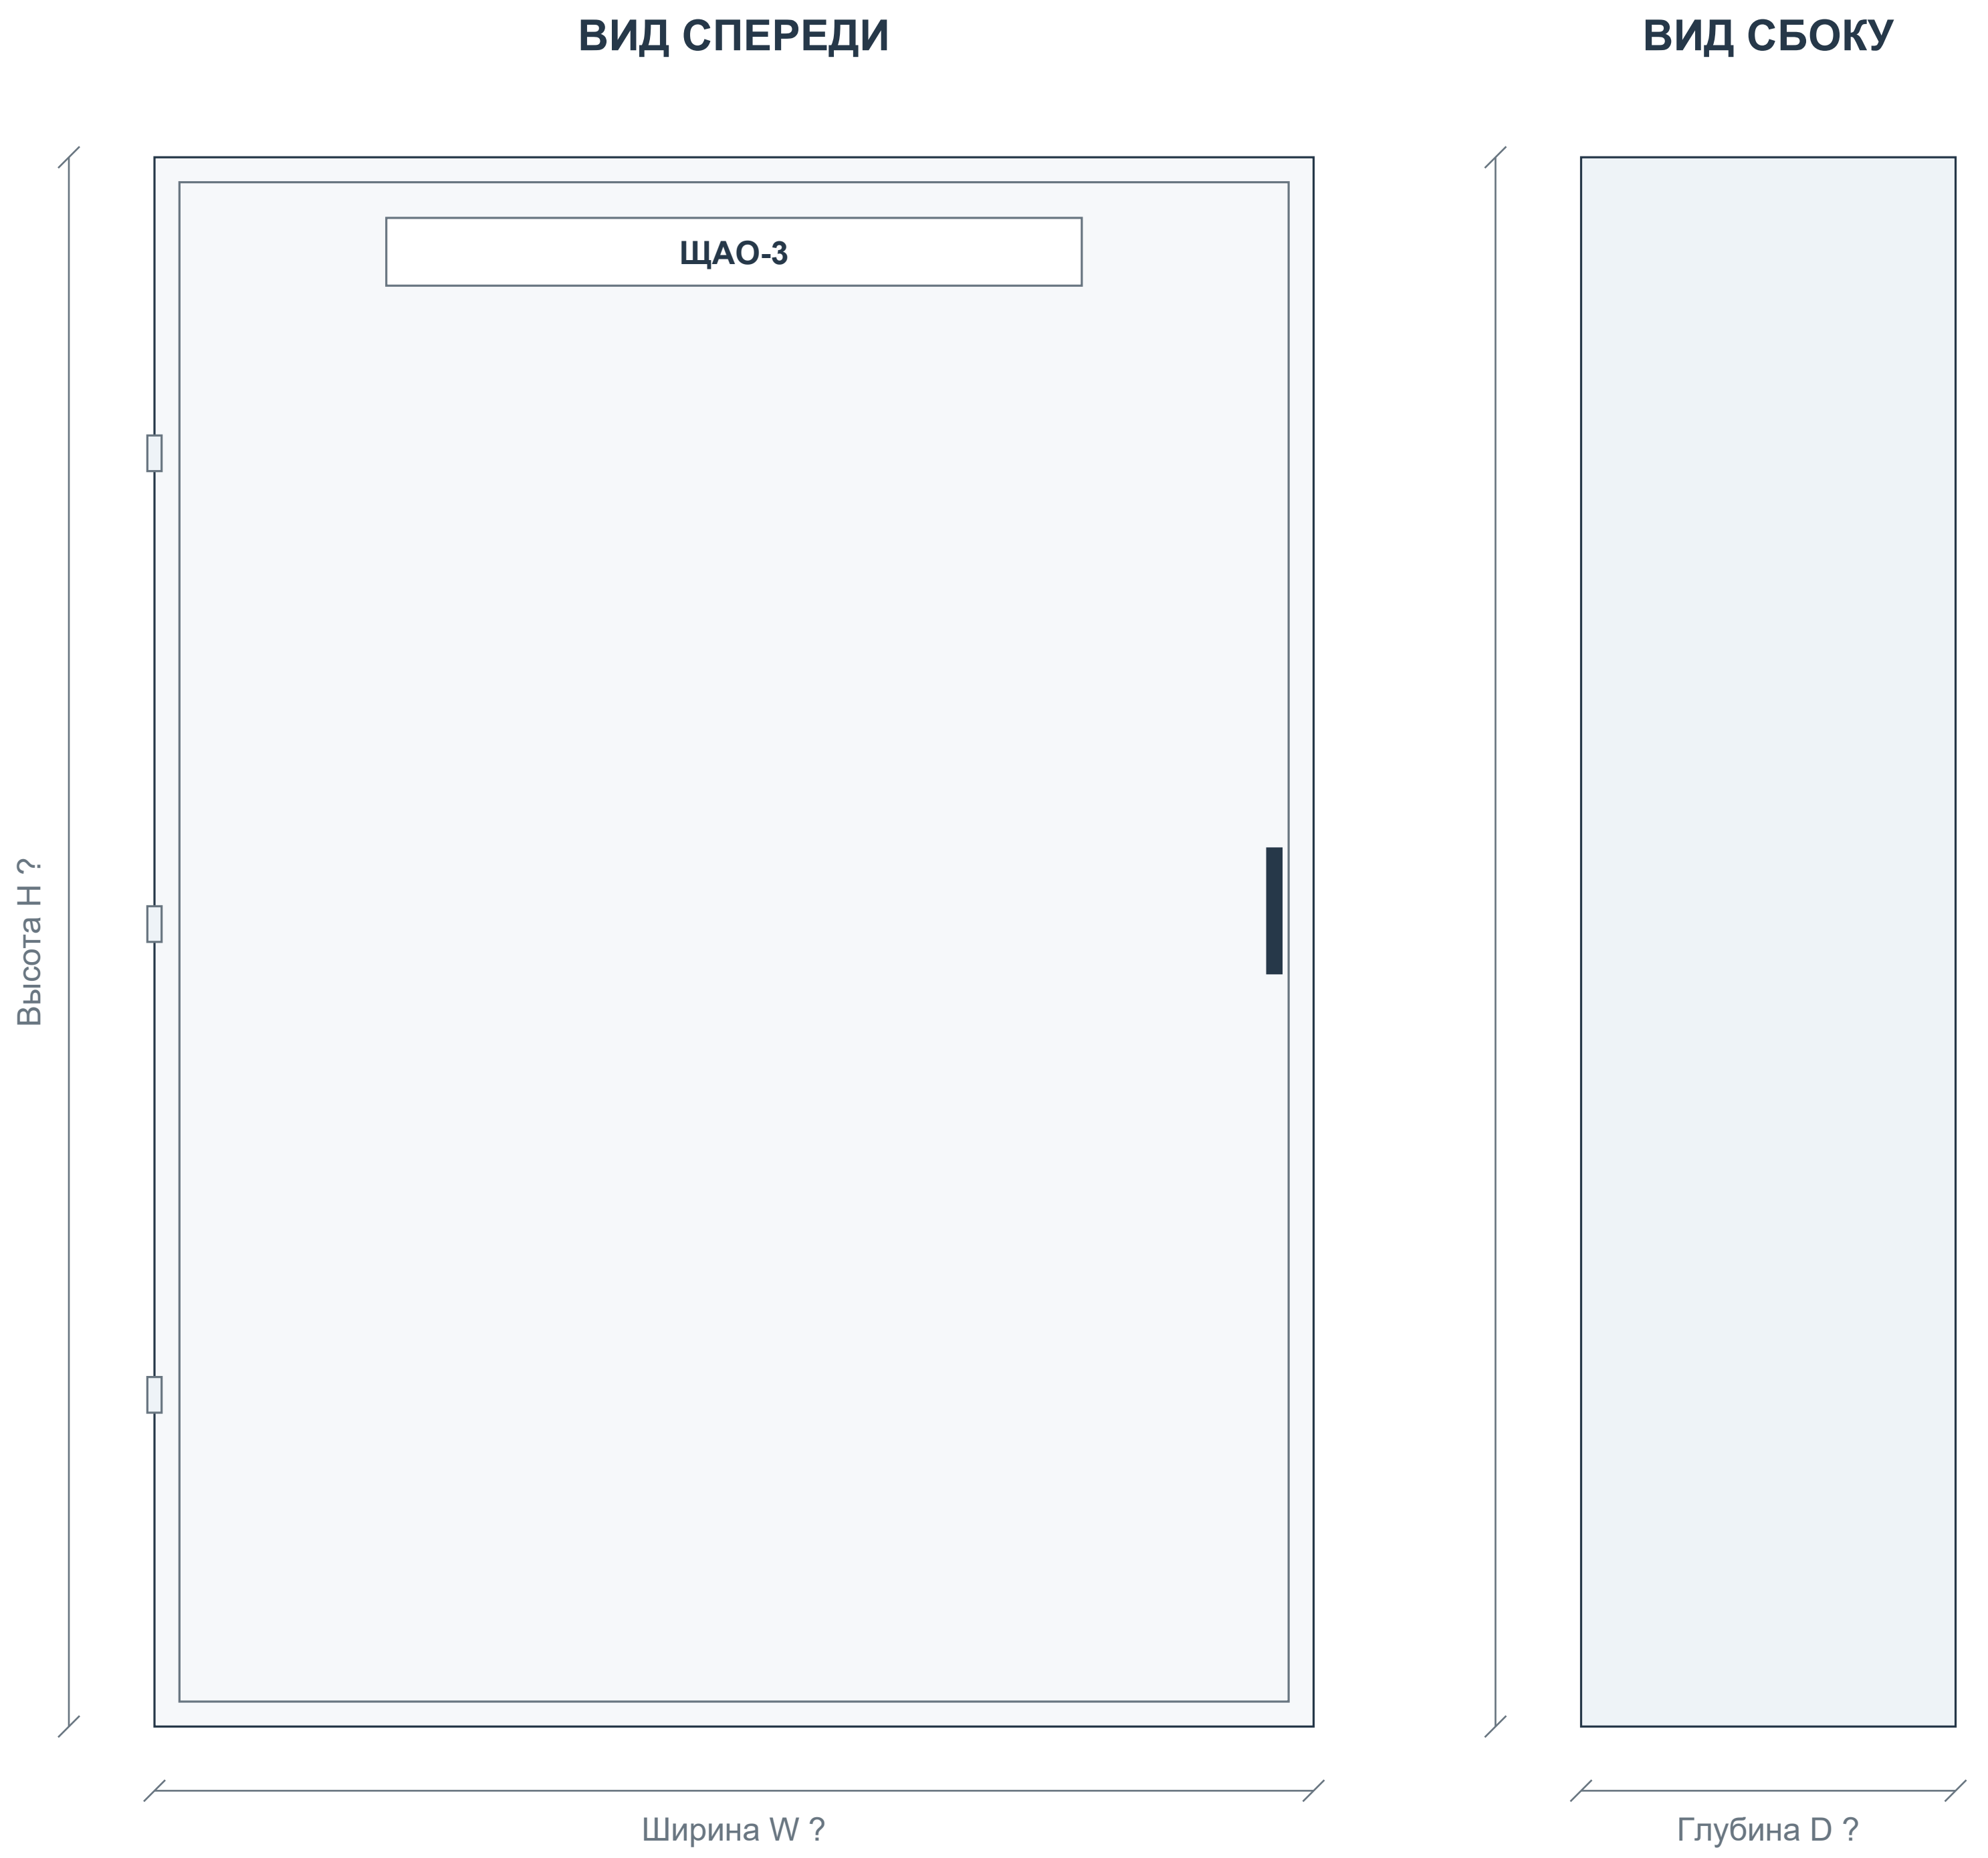

Корпус: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

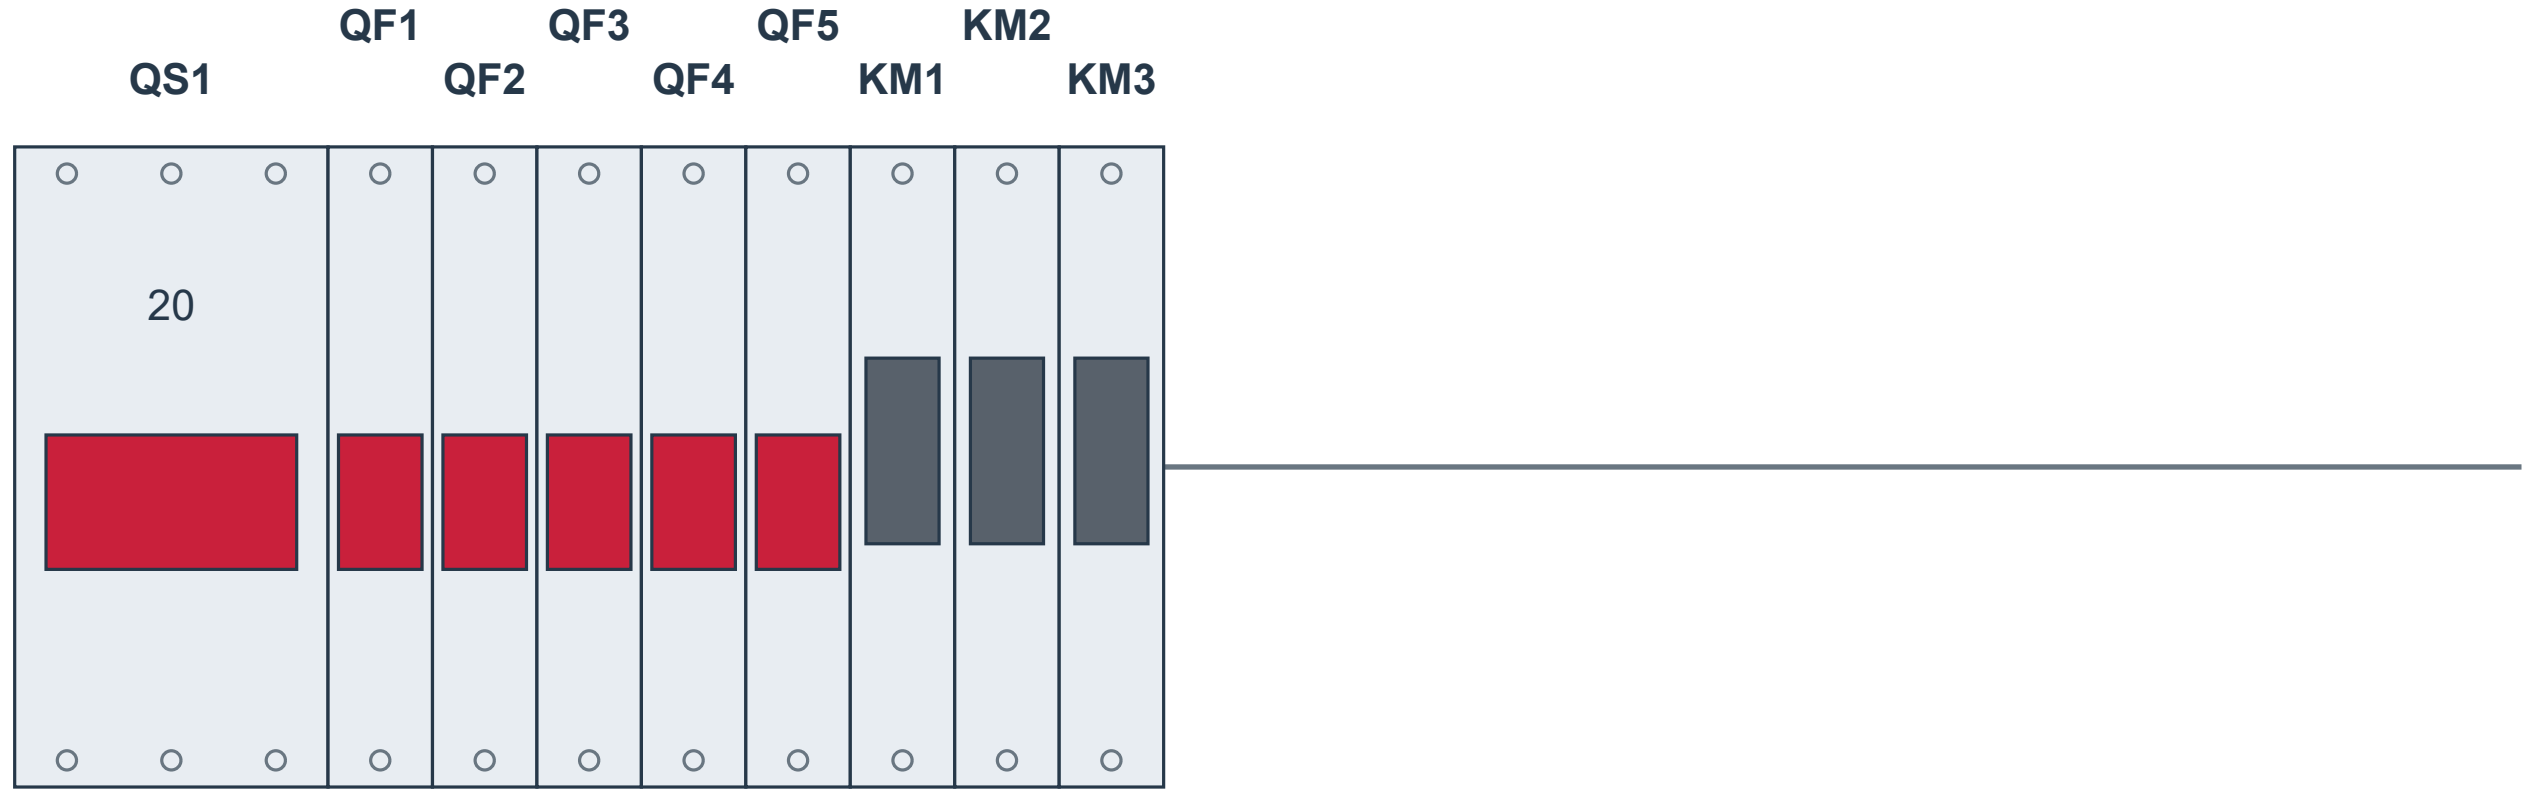

Сумма ширин: 198 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	980	1	0	?	54 B
QF1 - QF5	NXB-63S	981	1	54...126	?	18 B
KM1 - KM3	256054	982	1	144...180	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 24 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Актуальная спецификация

ЩСН (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 994 | ЭОМ, PDF стр. 55

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
995	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
996	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
997	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
998	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
999	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 55

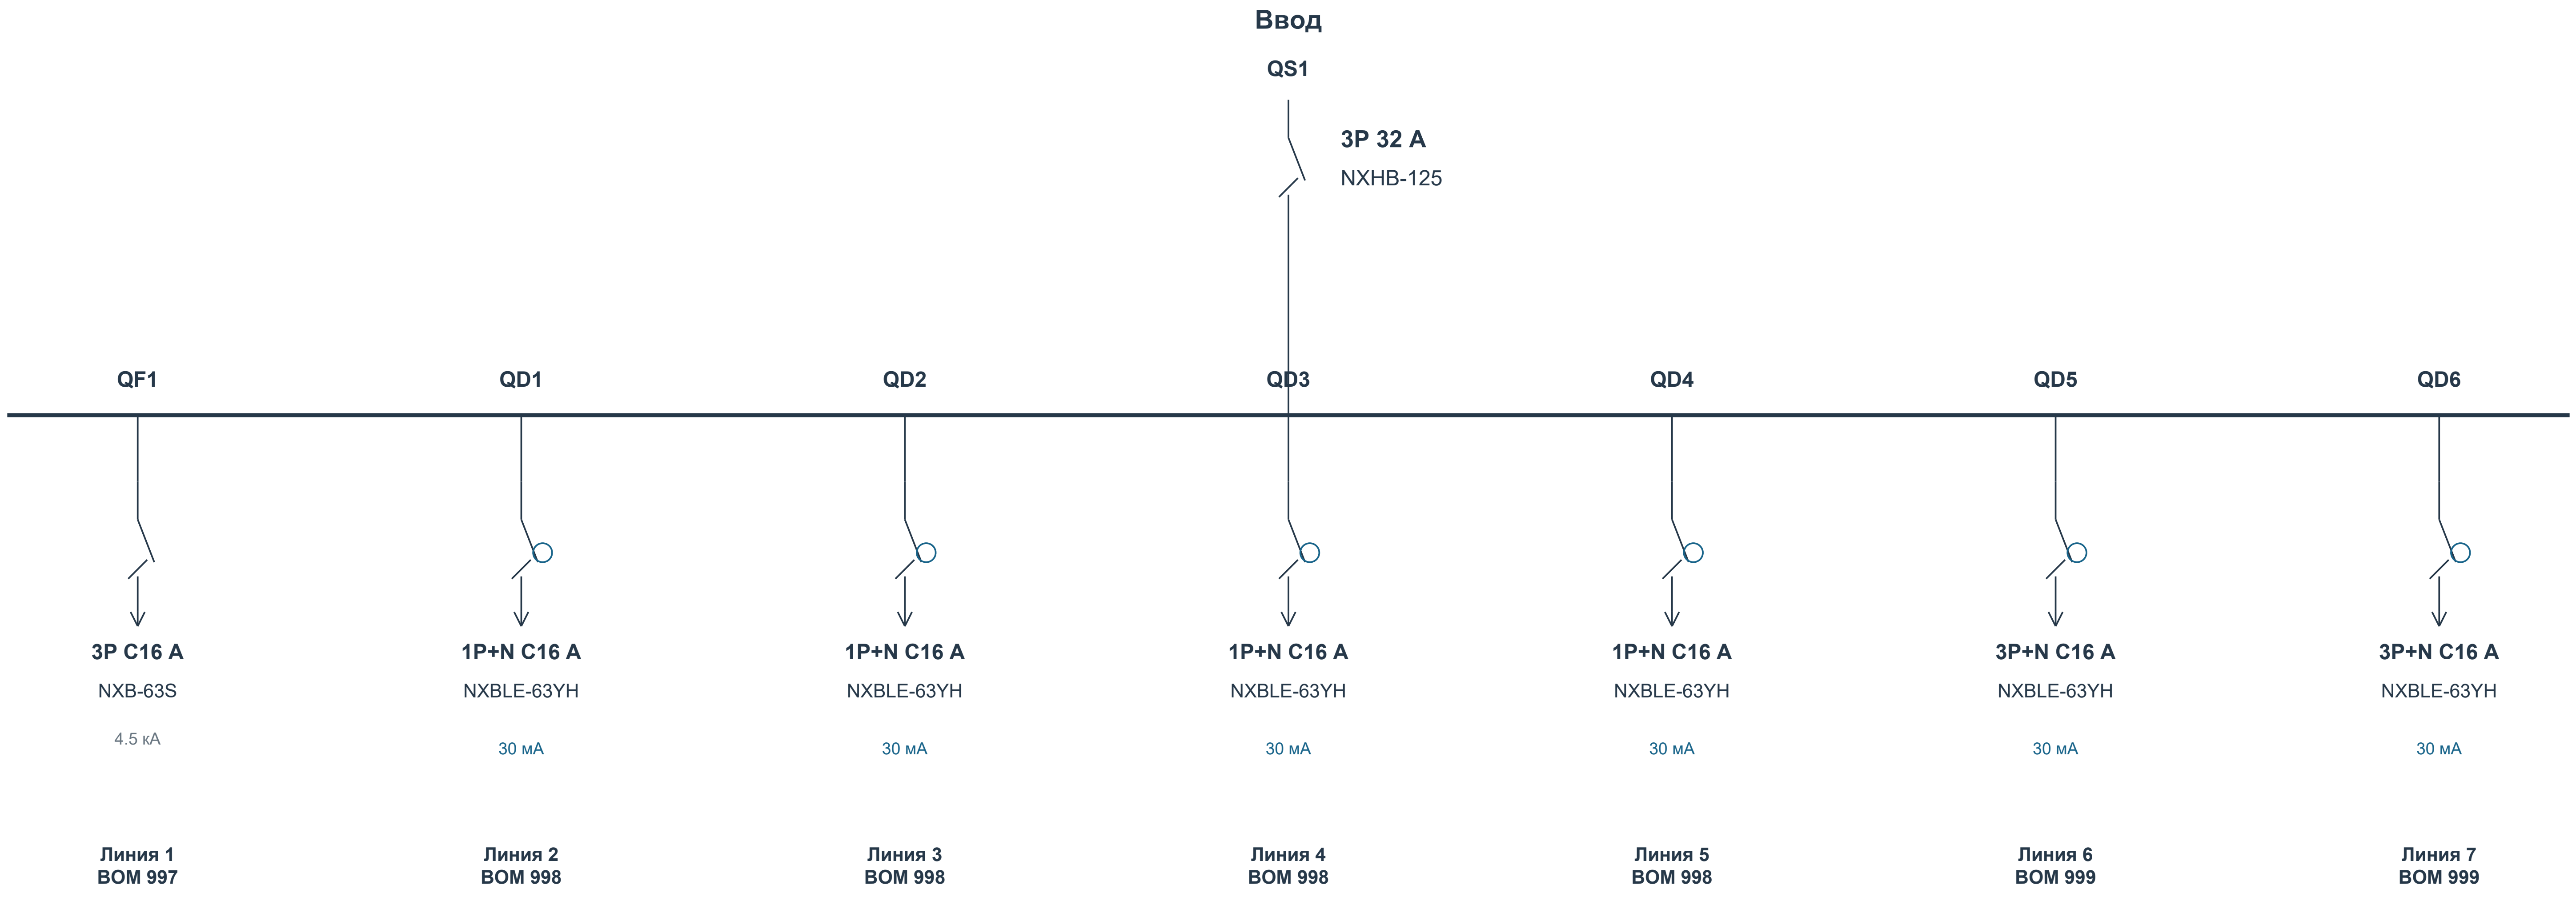
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
3P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
3P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
3P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 997
Линия 2
BOM 998
Линия 3
BOM 998
Линия 4
BOM 998
Линия 5
BOM 998
Линия 6
BOM 999
Линия 7
BOM 999

Данные исходного проекта: Ру 14.5 кВт | Рр 9,6 кВт | Ір 18,2 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

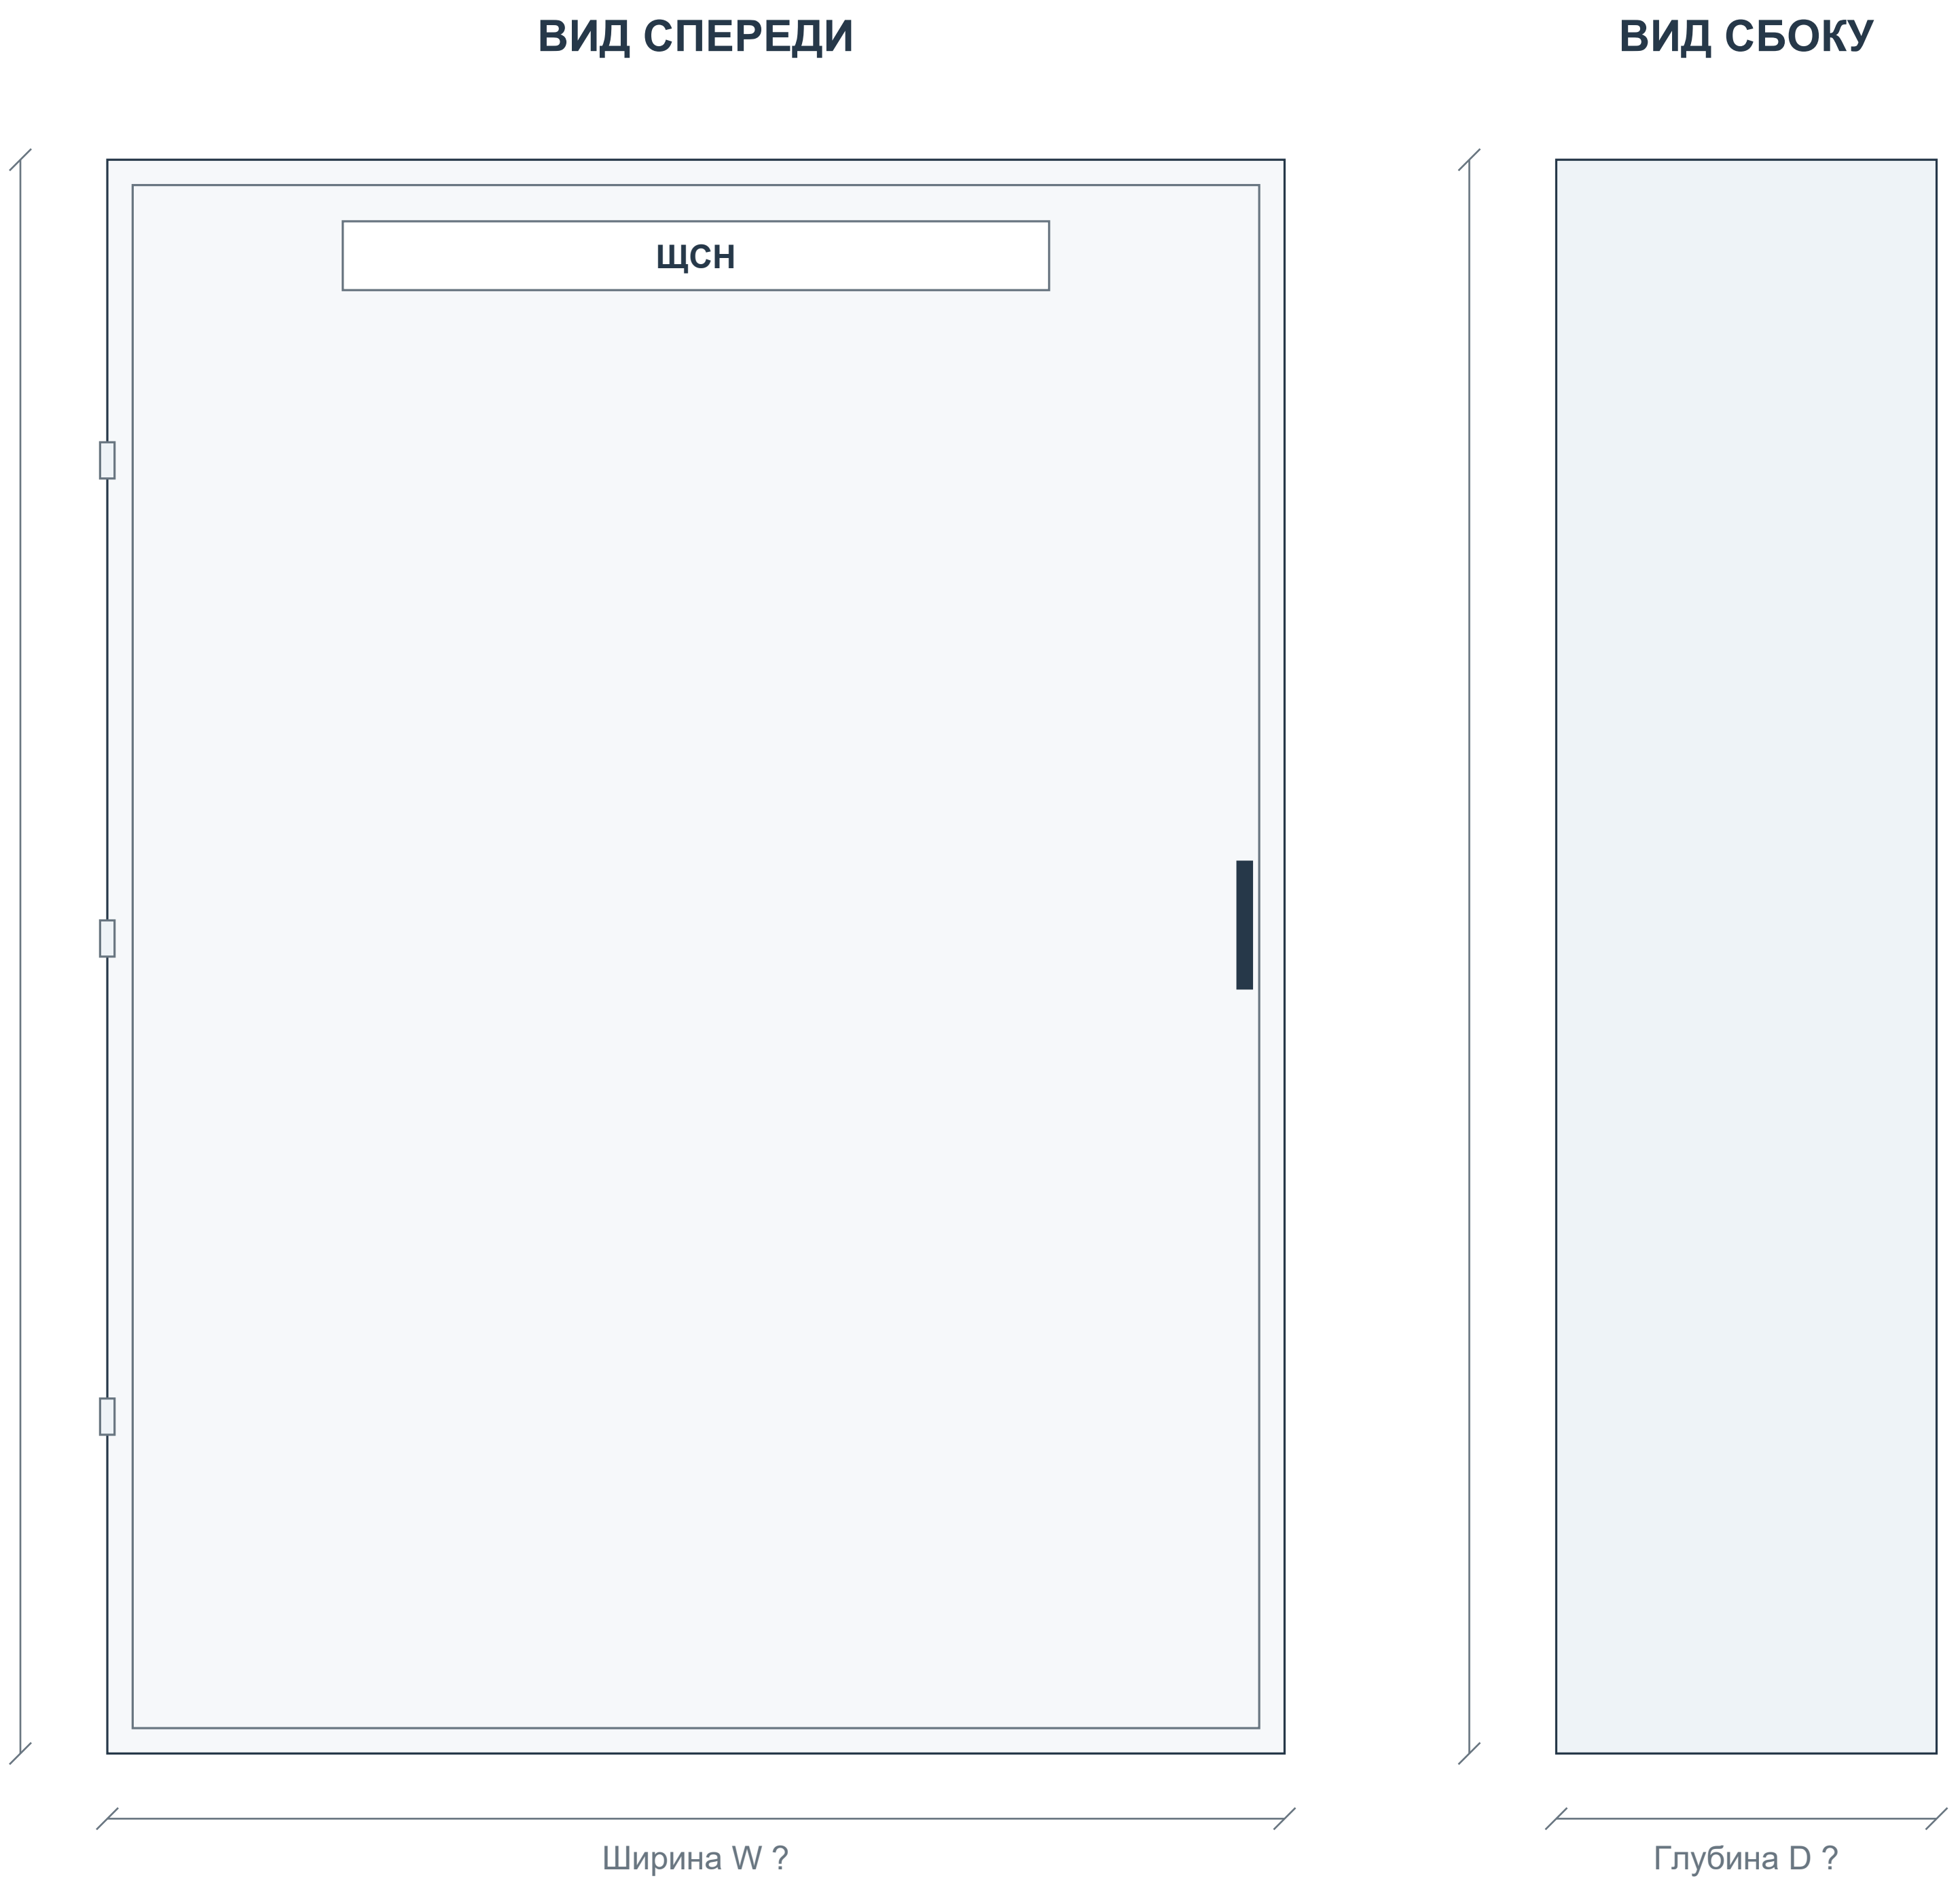

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

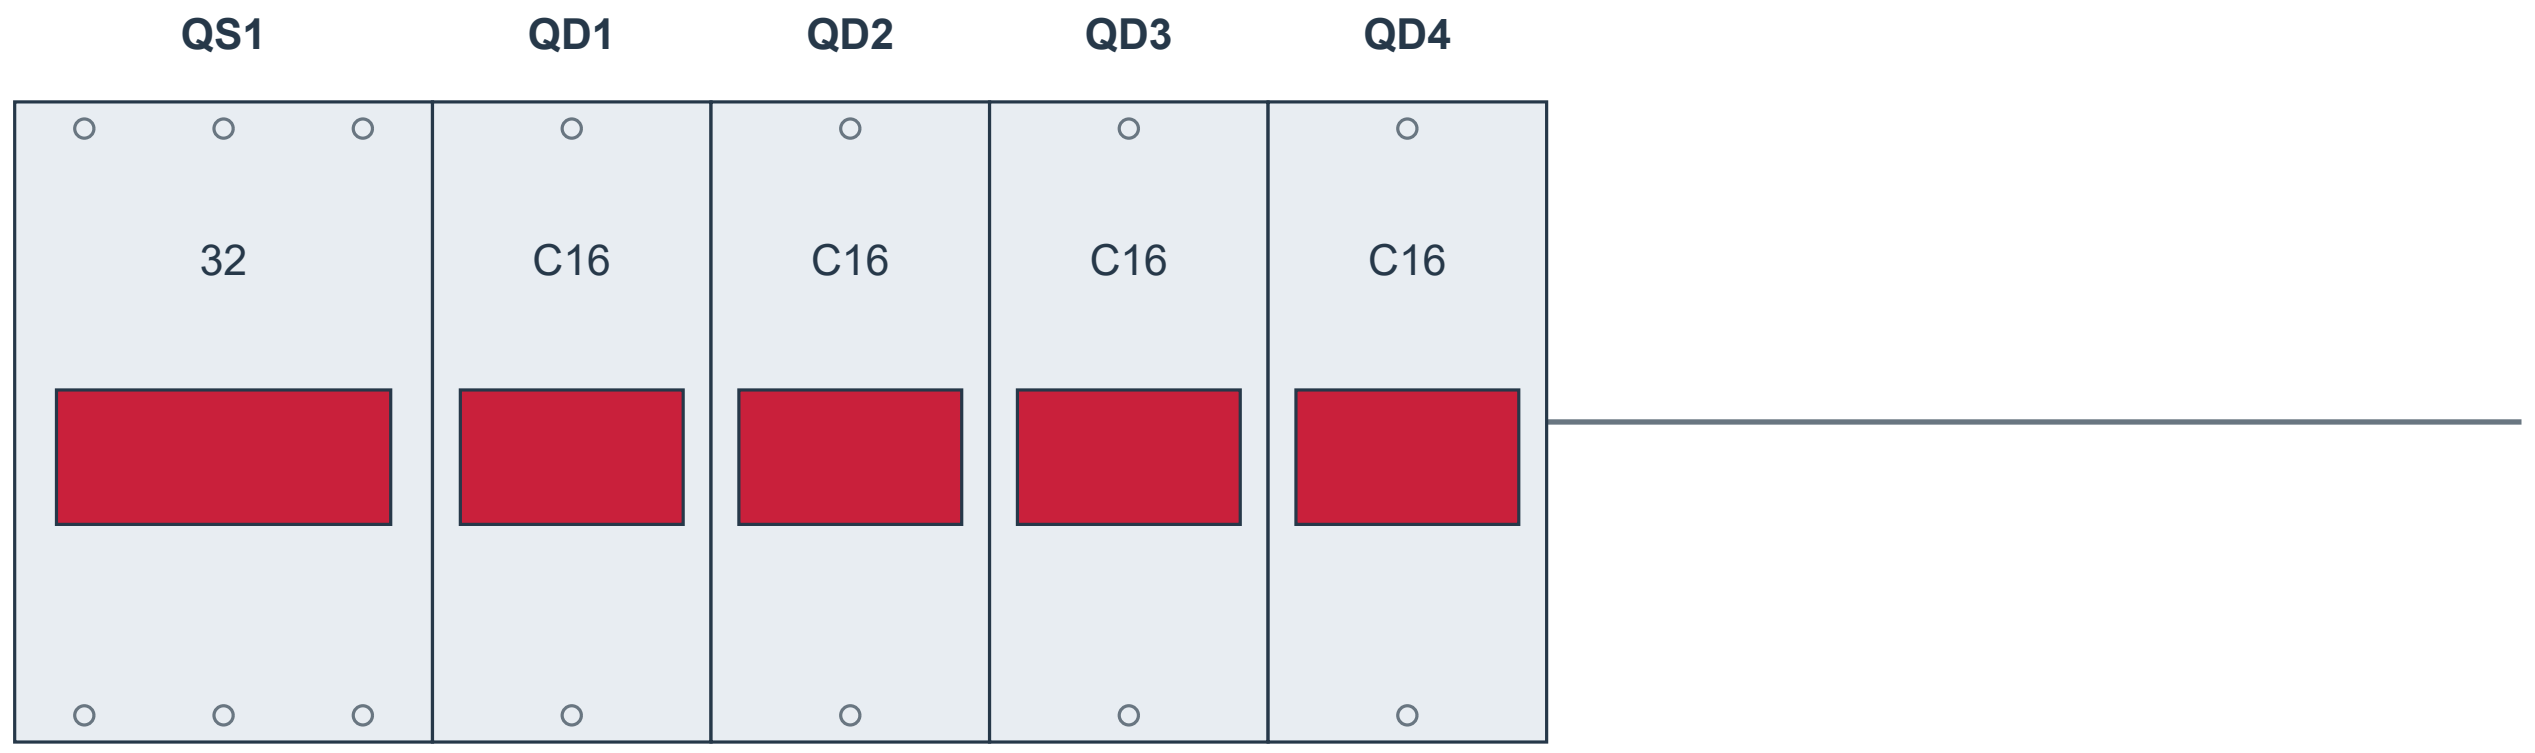

Сумма ширин: 198 мм В

Ряд 2 | модульная раскладка D

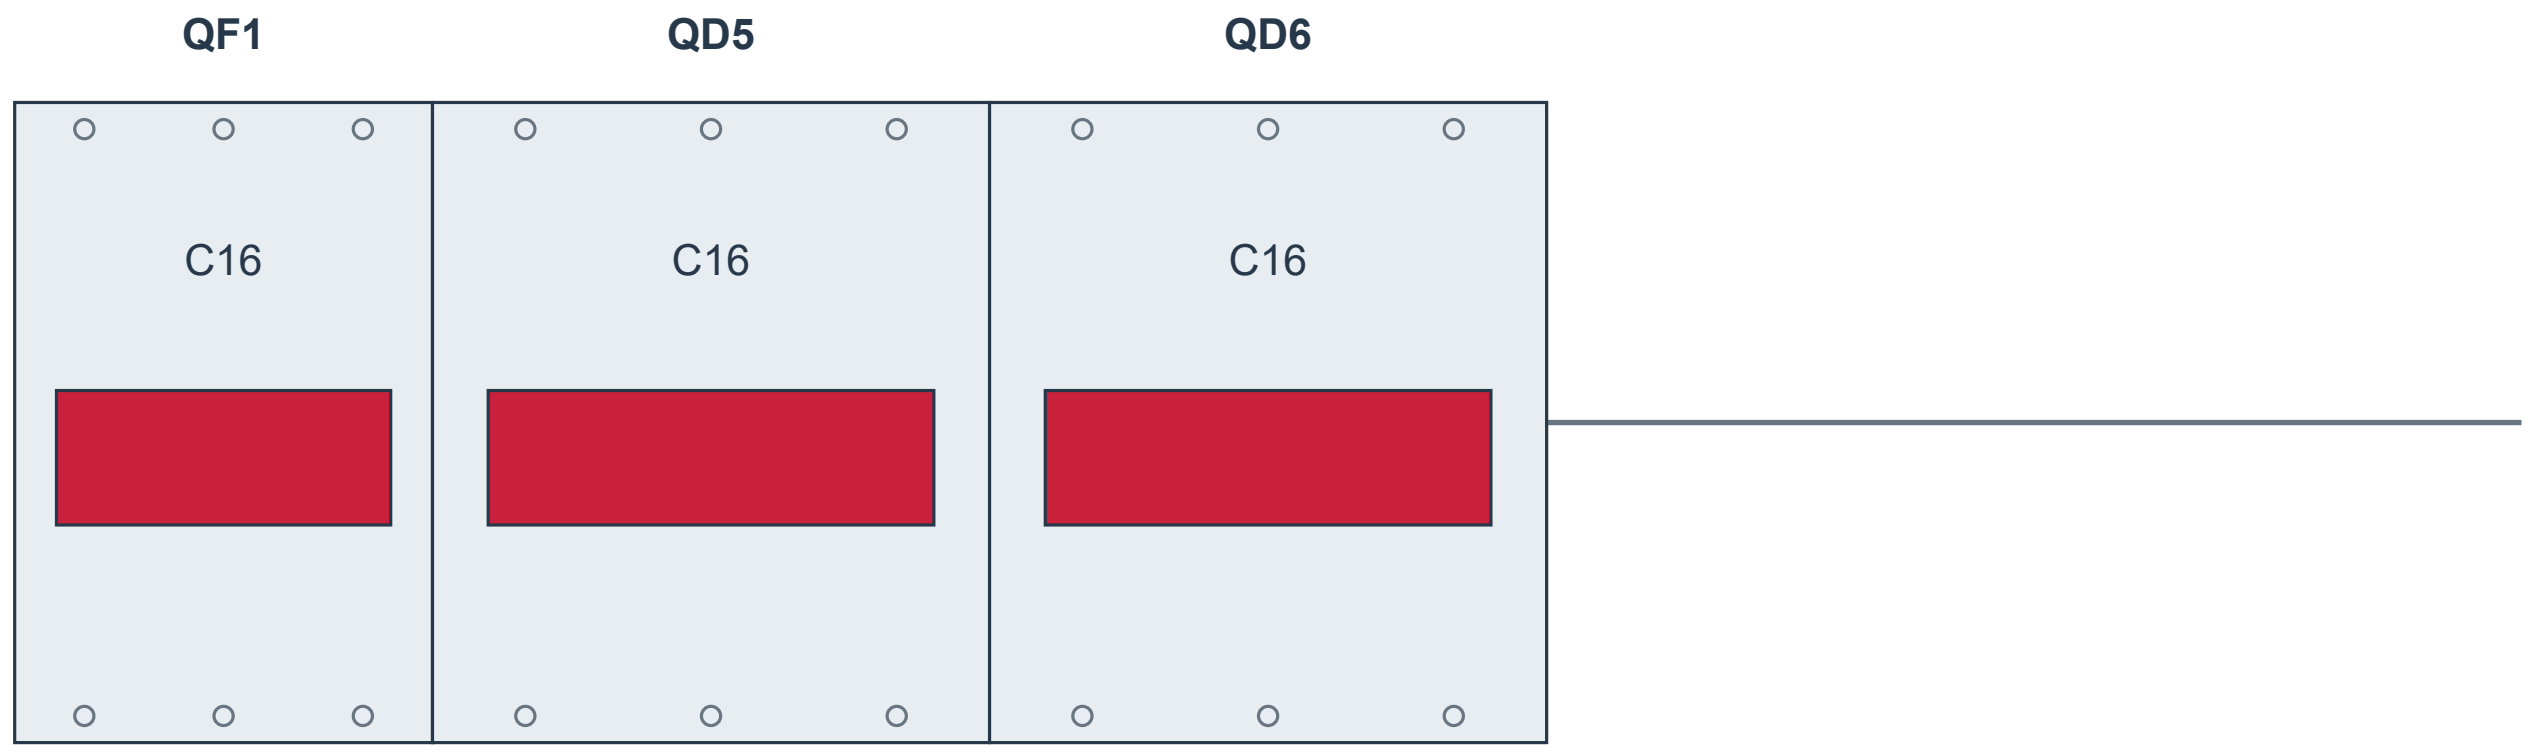

Сумма ширин: 198 мм В

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	996	1	0	?	54 B
QF1	NXB-63S	997	2	0	?	54 B
QD1 - QD4	NXBLE-63YH	998	1	54...162	?	36 B
QD5 - QD6	NXBLE-63YH	999	2	54...126	?	72 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Актуальная спецификация

ЩС-НП (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1014 | ЭОМ, PDF стр. 57

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1015	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1016	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1017	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1018	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1019	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 57

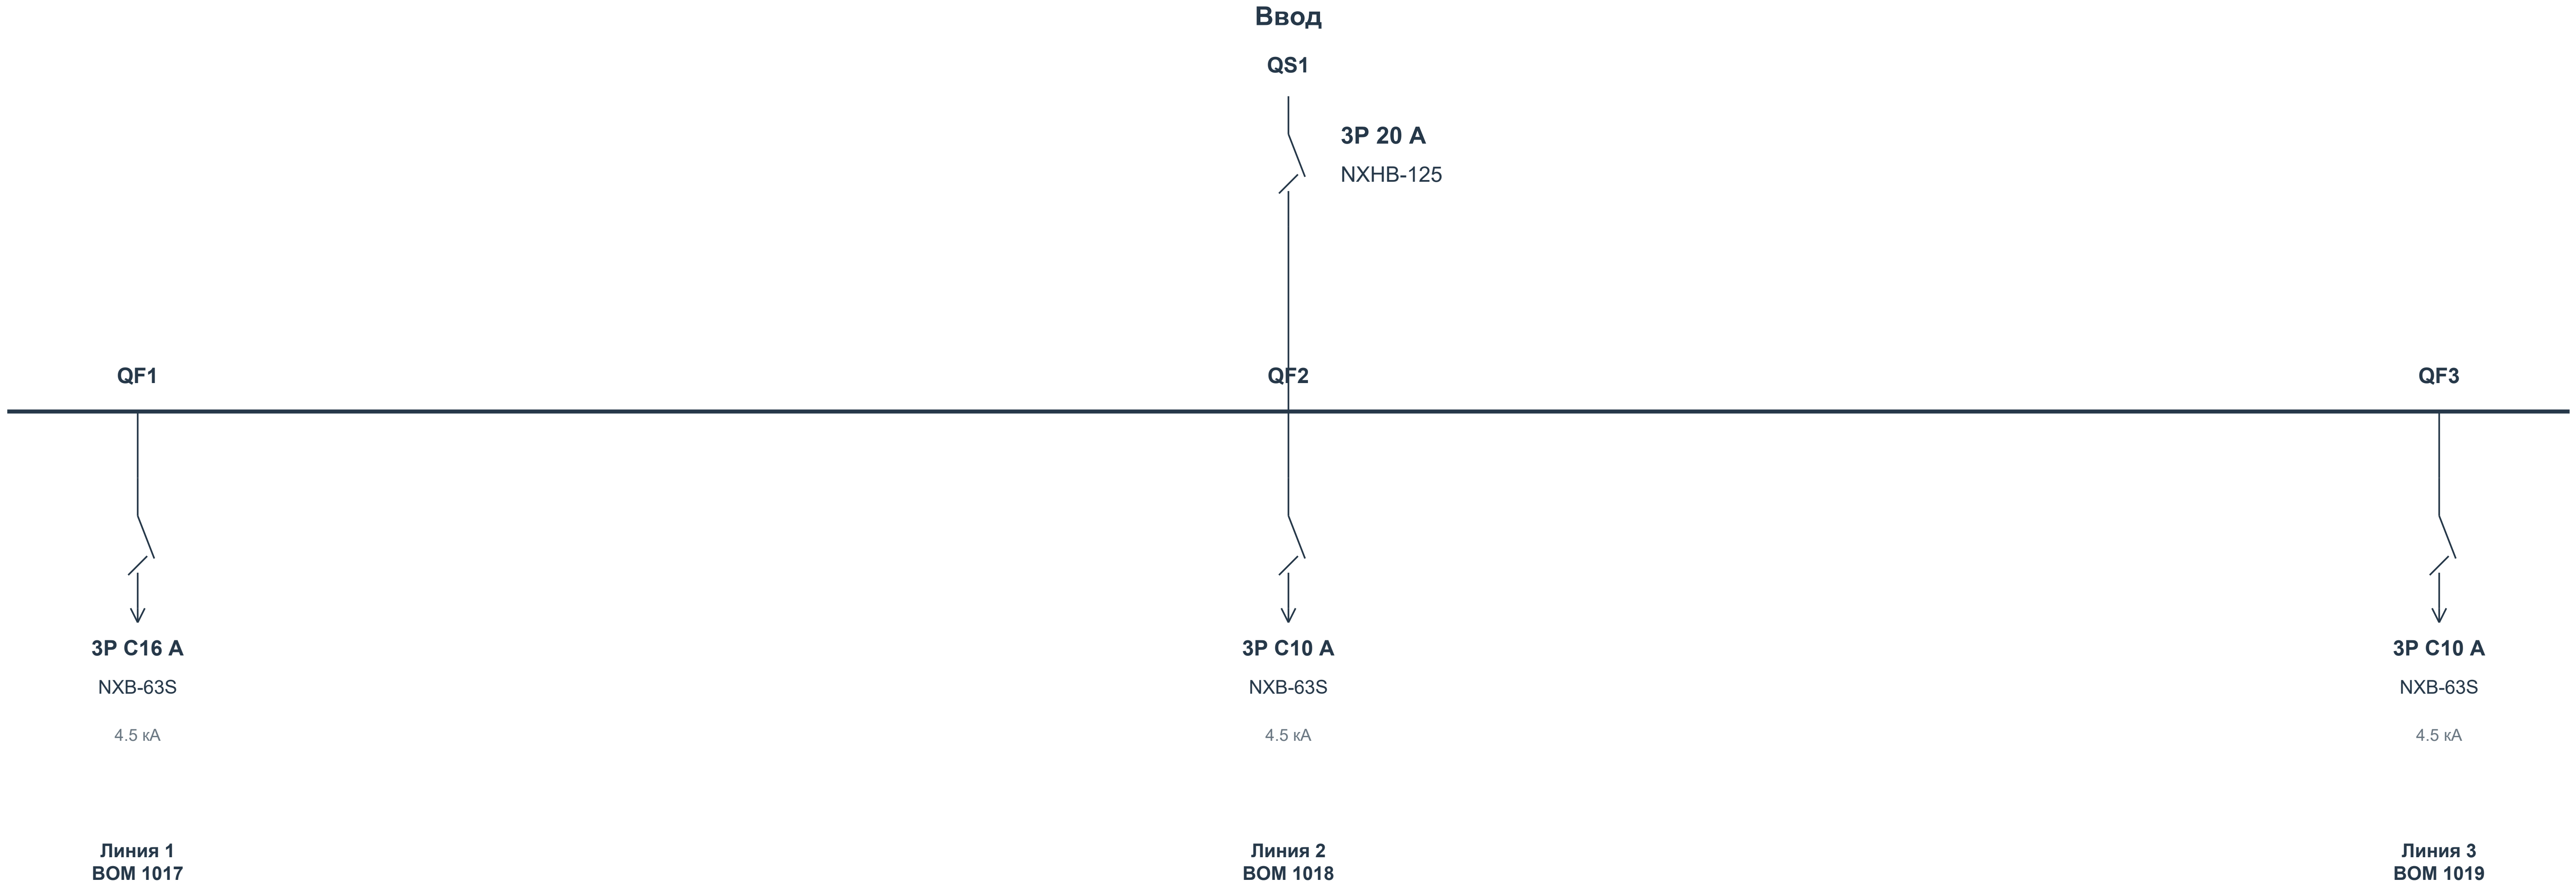
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
3P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1017
Линия 2
BOM 1018
Линия 3
BOM 1019

Данные исходного проекта: Ру 11.2 кВт | Рр 5,7 кВт | Ip 10,1 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

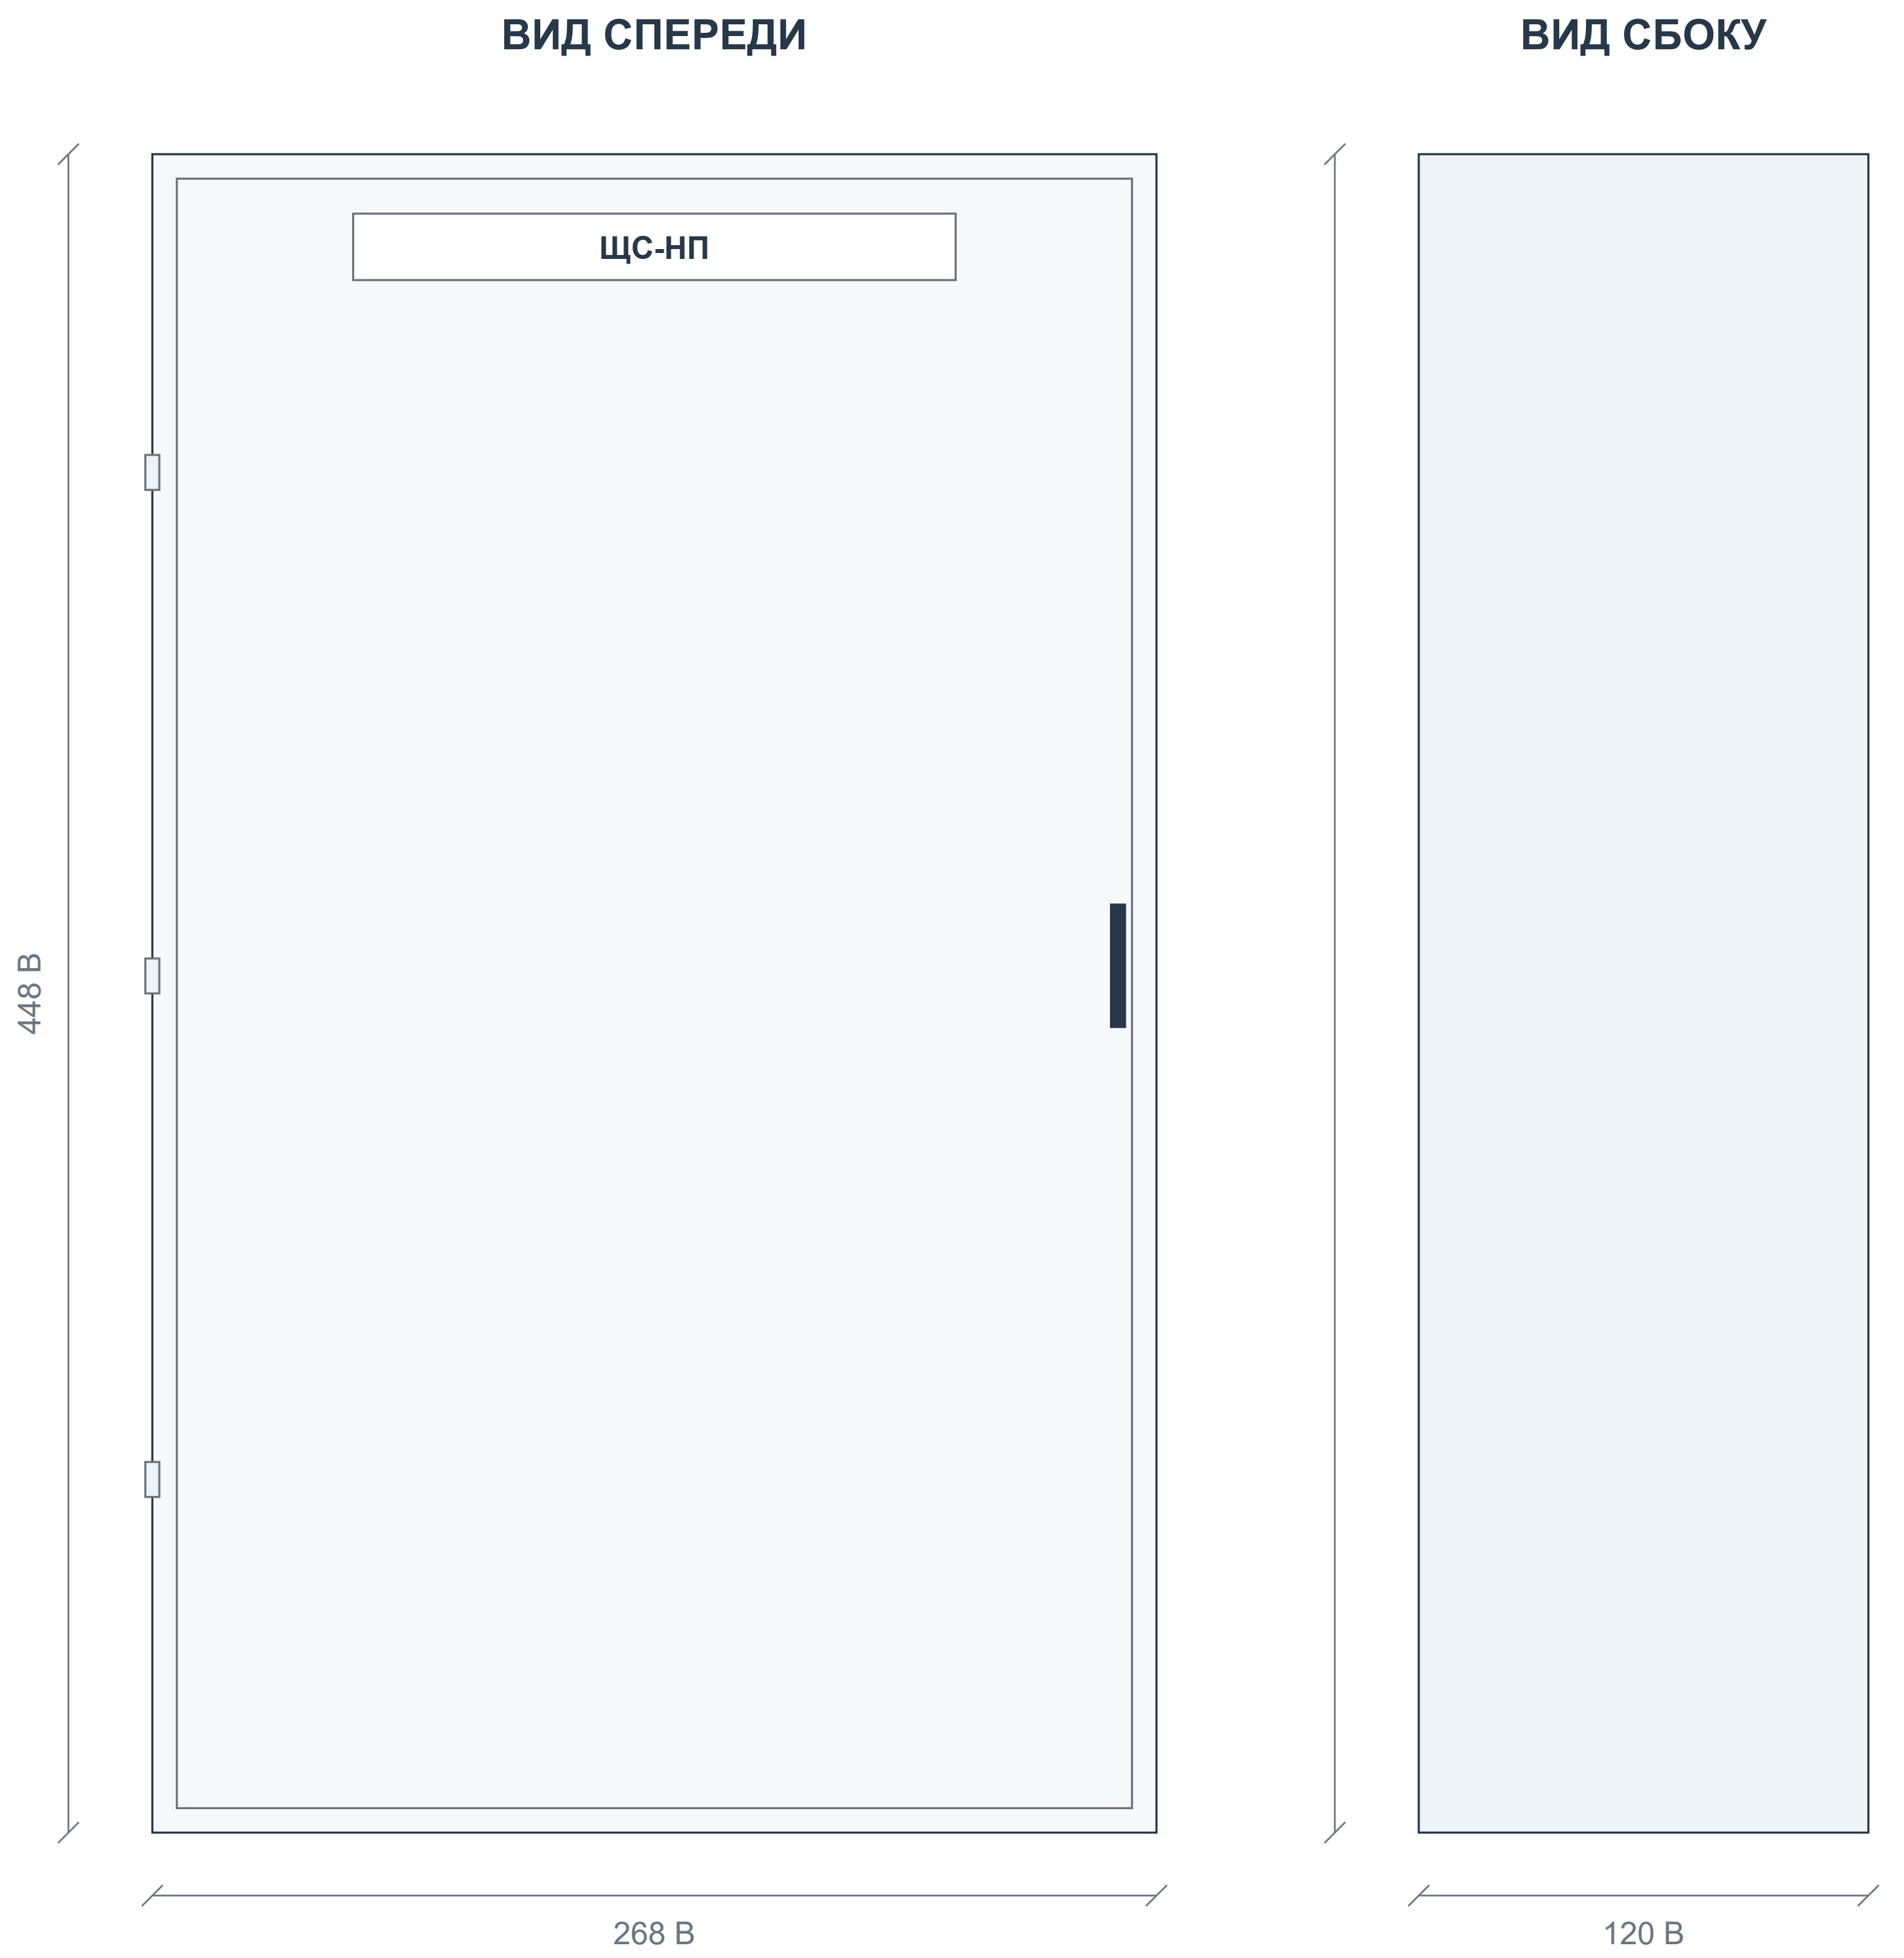

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

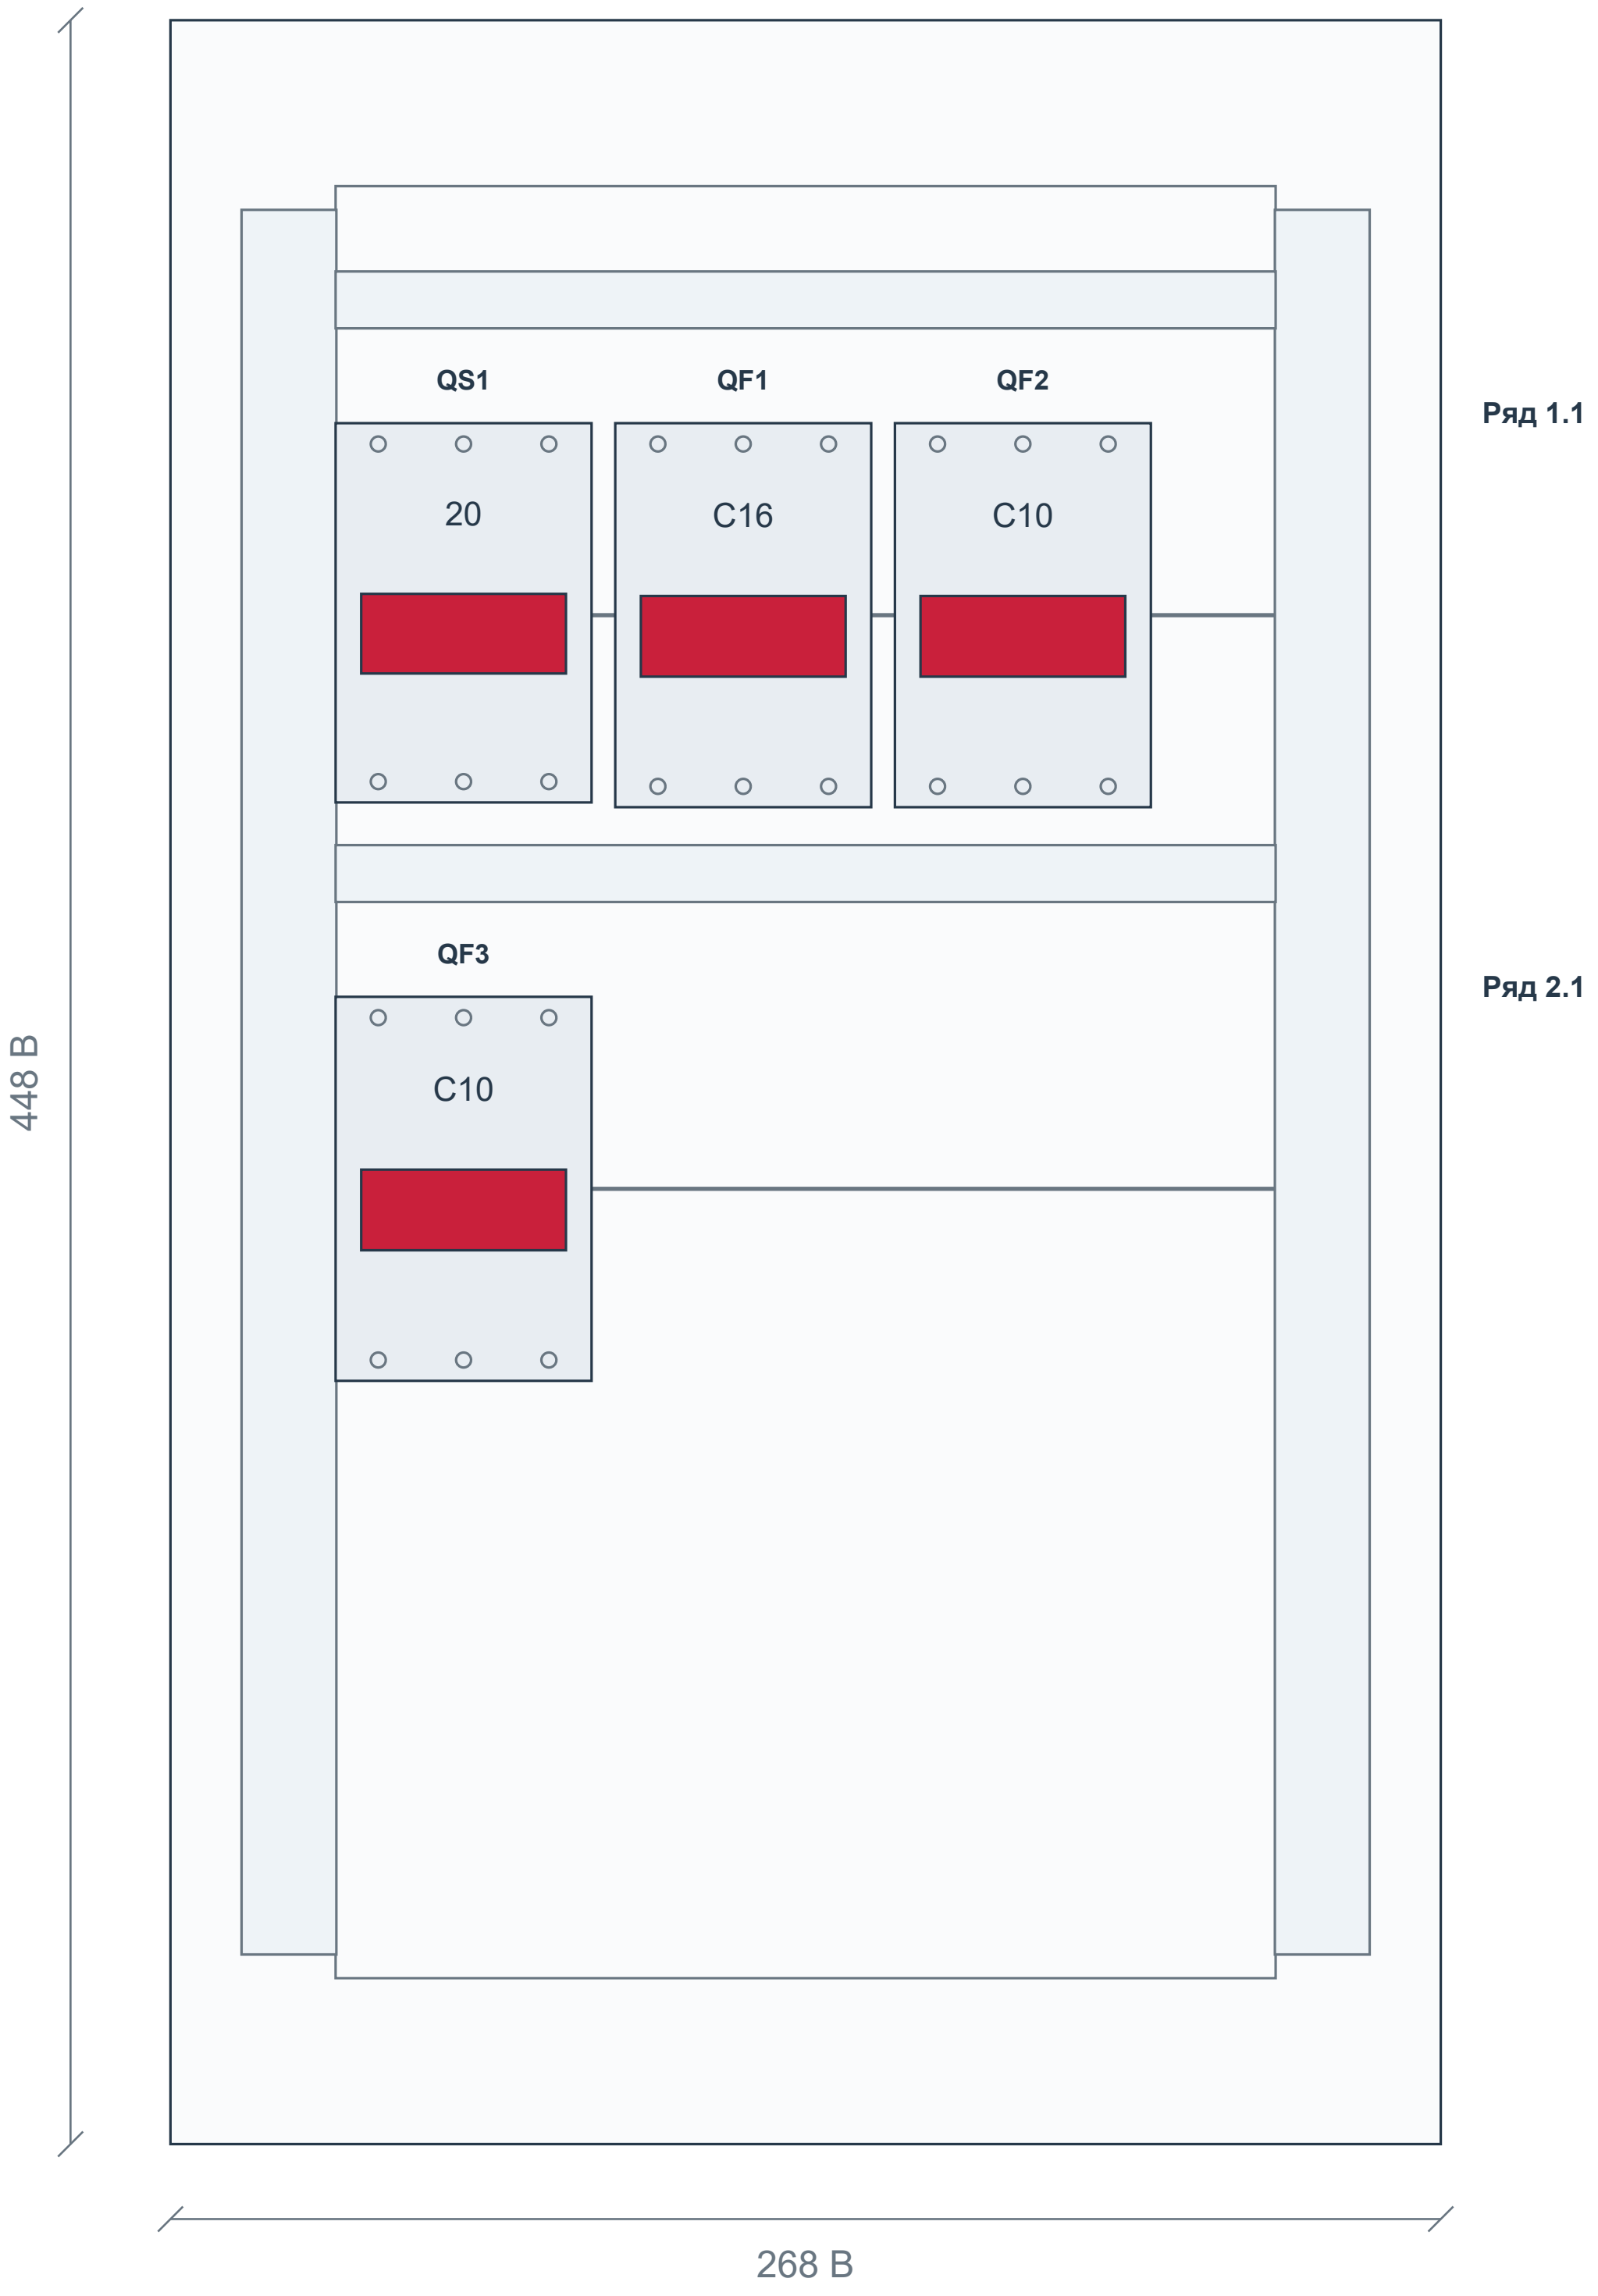

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	1016	1.1	34.84	85	54 × 80
QF1	NXB-63S	1017	1.1	93.84	85	54 × 81
QF2	NXB-63S	1018	1.1	152.84	85	54 × 81
QF3	NXB-63S	1019	2.1	34.84	206	54 × 81

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Актуальная спецификация

ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1033 | ЭОМ, PDF стр. 58

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1034	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1035	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1036	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	3	3	chint	Управл.
1037	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1038	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1039	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1040	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1041	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 58

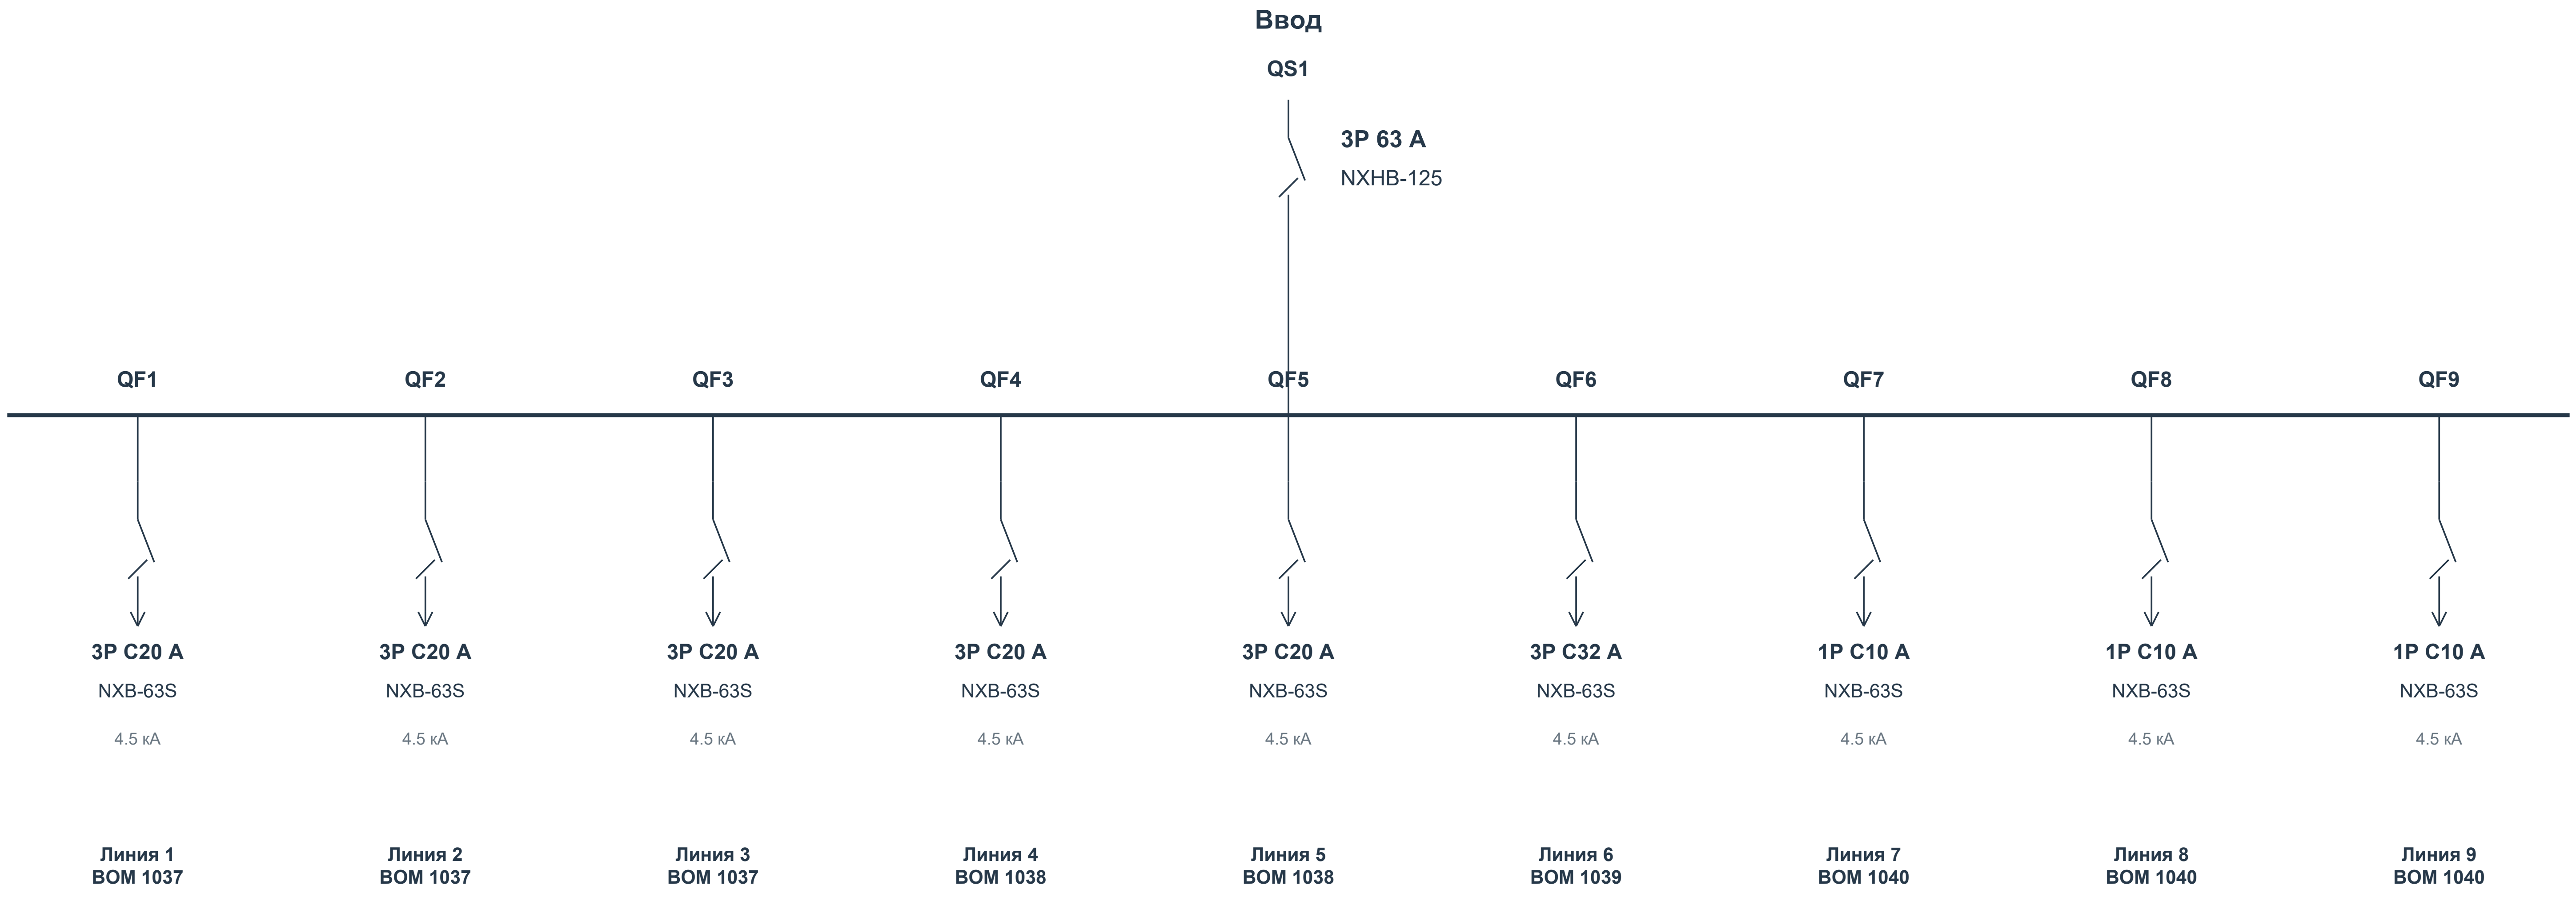
Ввод
QS1
3P 63 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1037
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 1037
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 1037
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 1038
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 1038
3P C32 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 1039
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 1040
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 8
BOM 1040
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 9
BOM 1040

Управление / учет: MX1 - MX3 SHT-X1 × 3; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 38.2 кВт | Рр 28,7 кВт | Ір 51,3 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

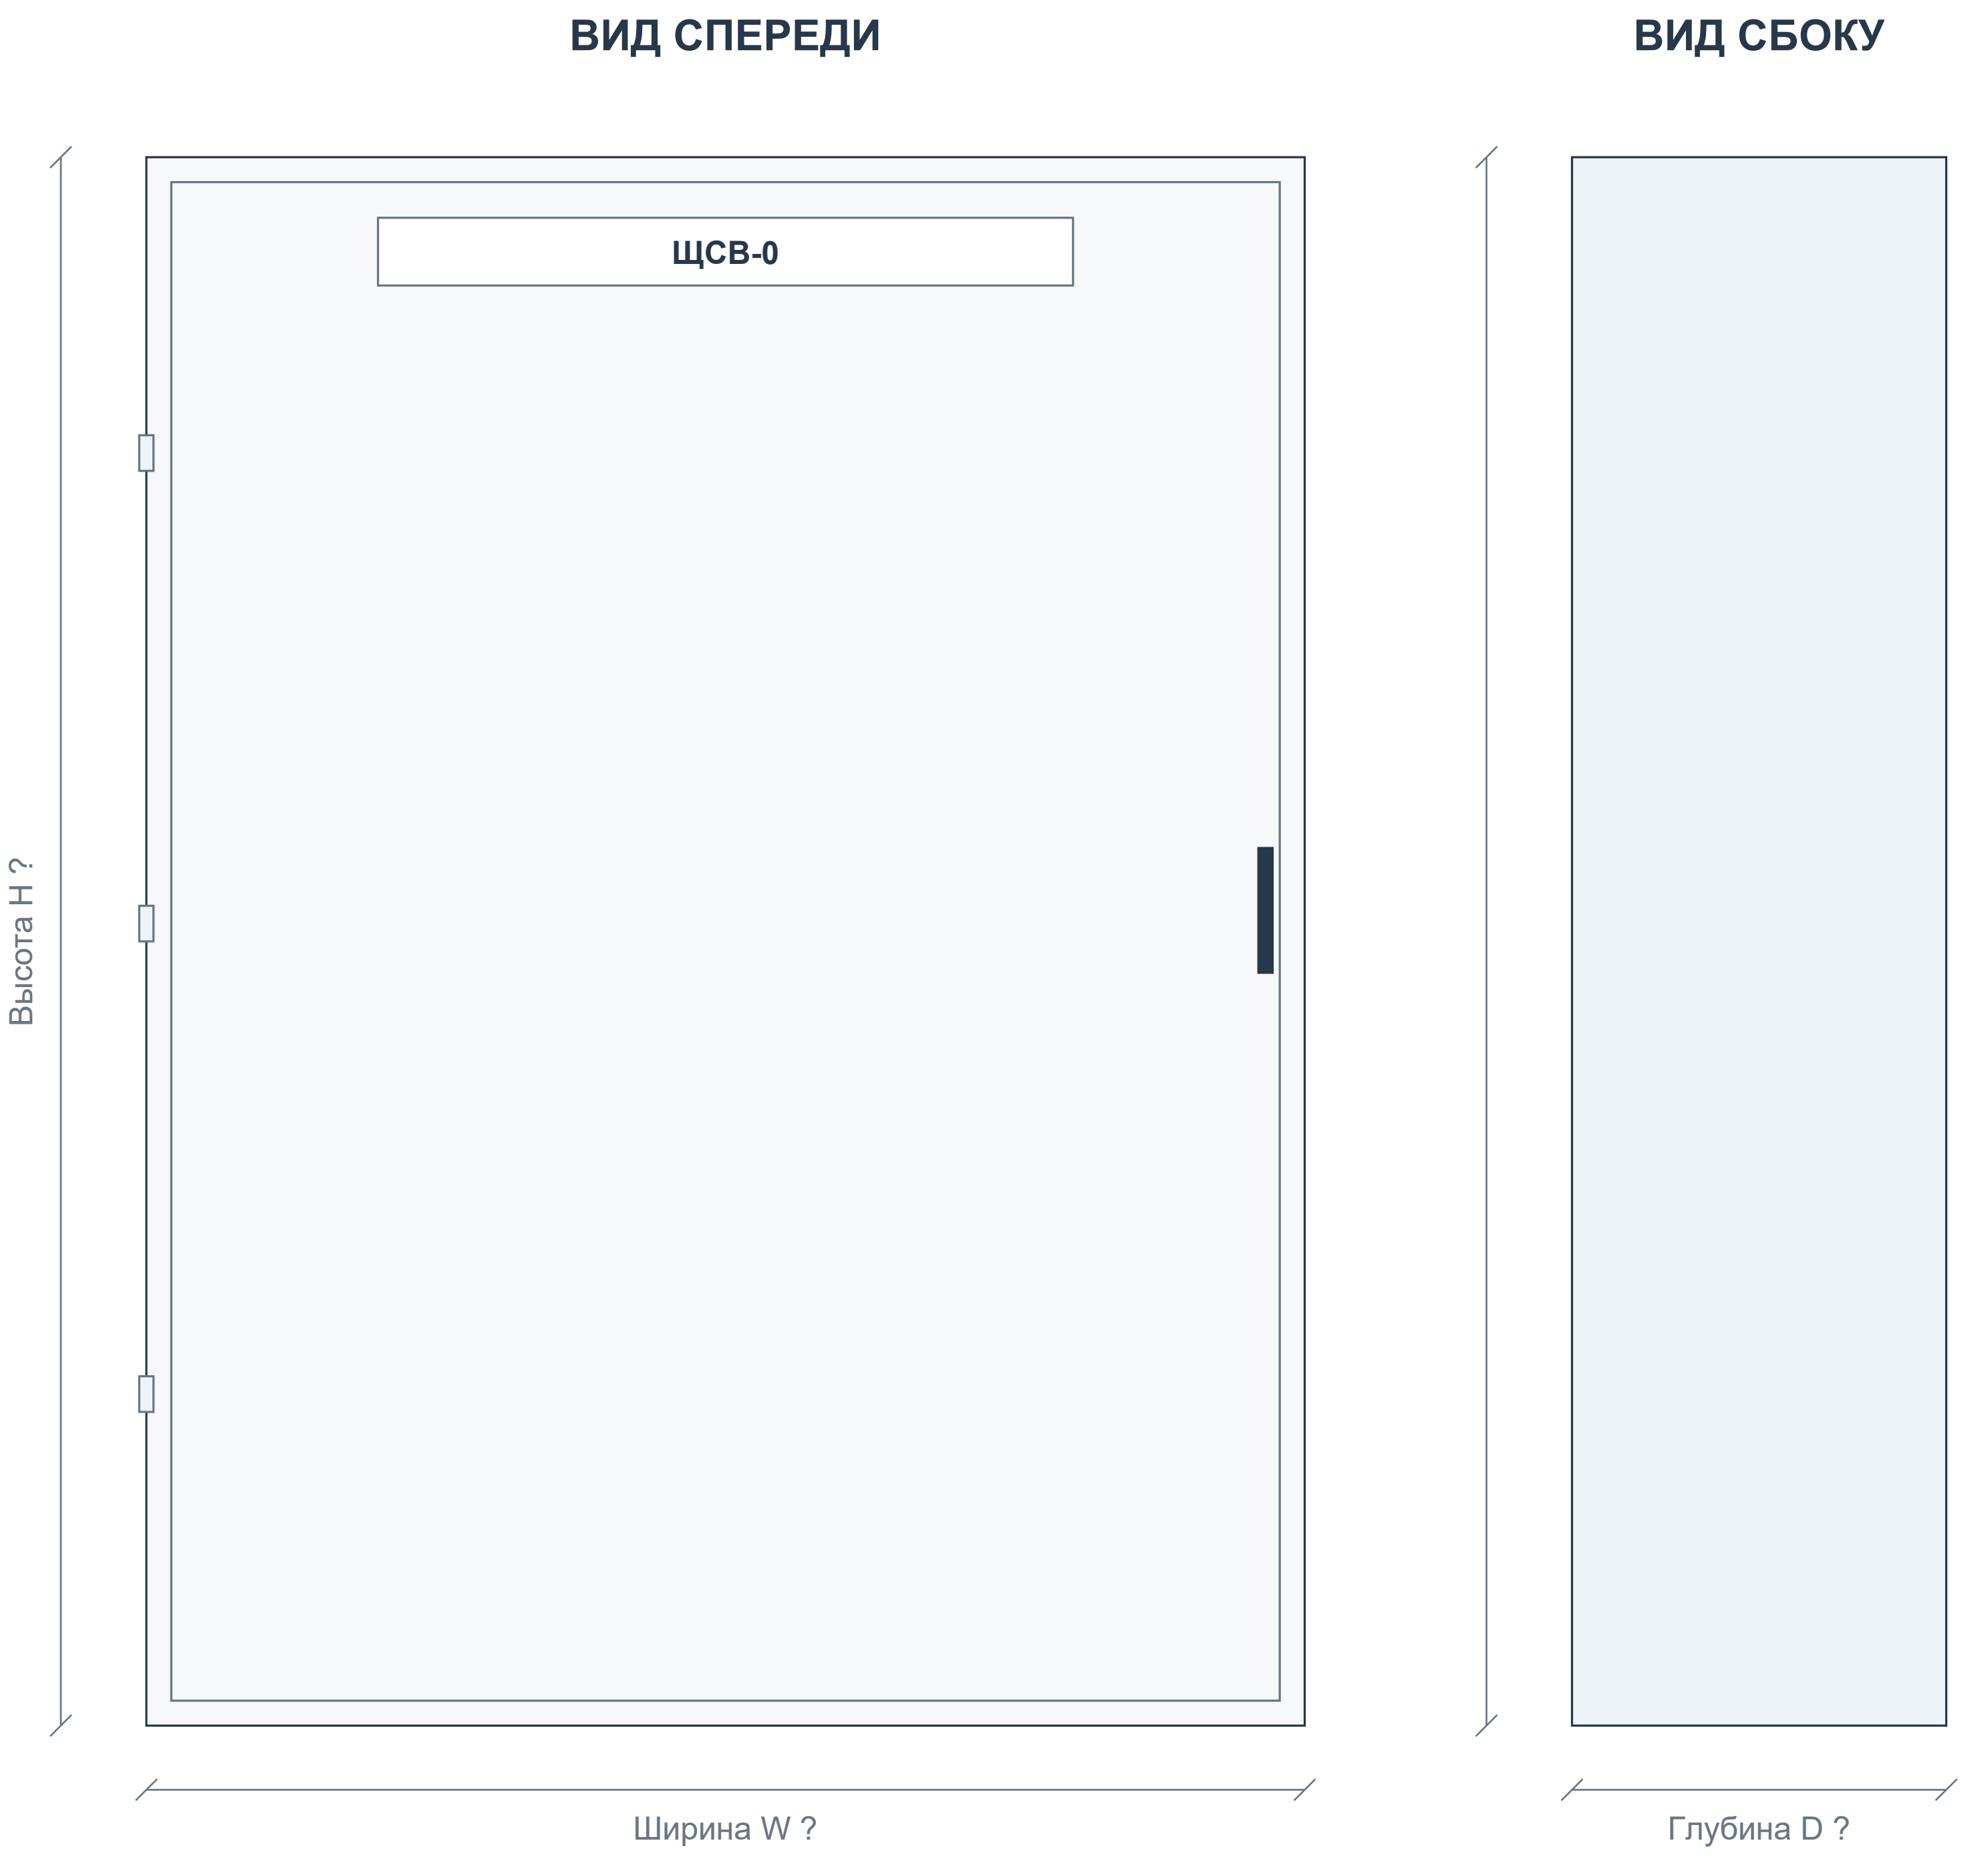

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

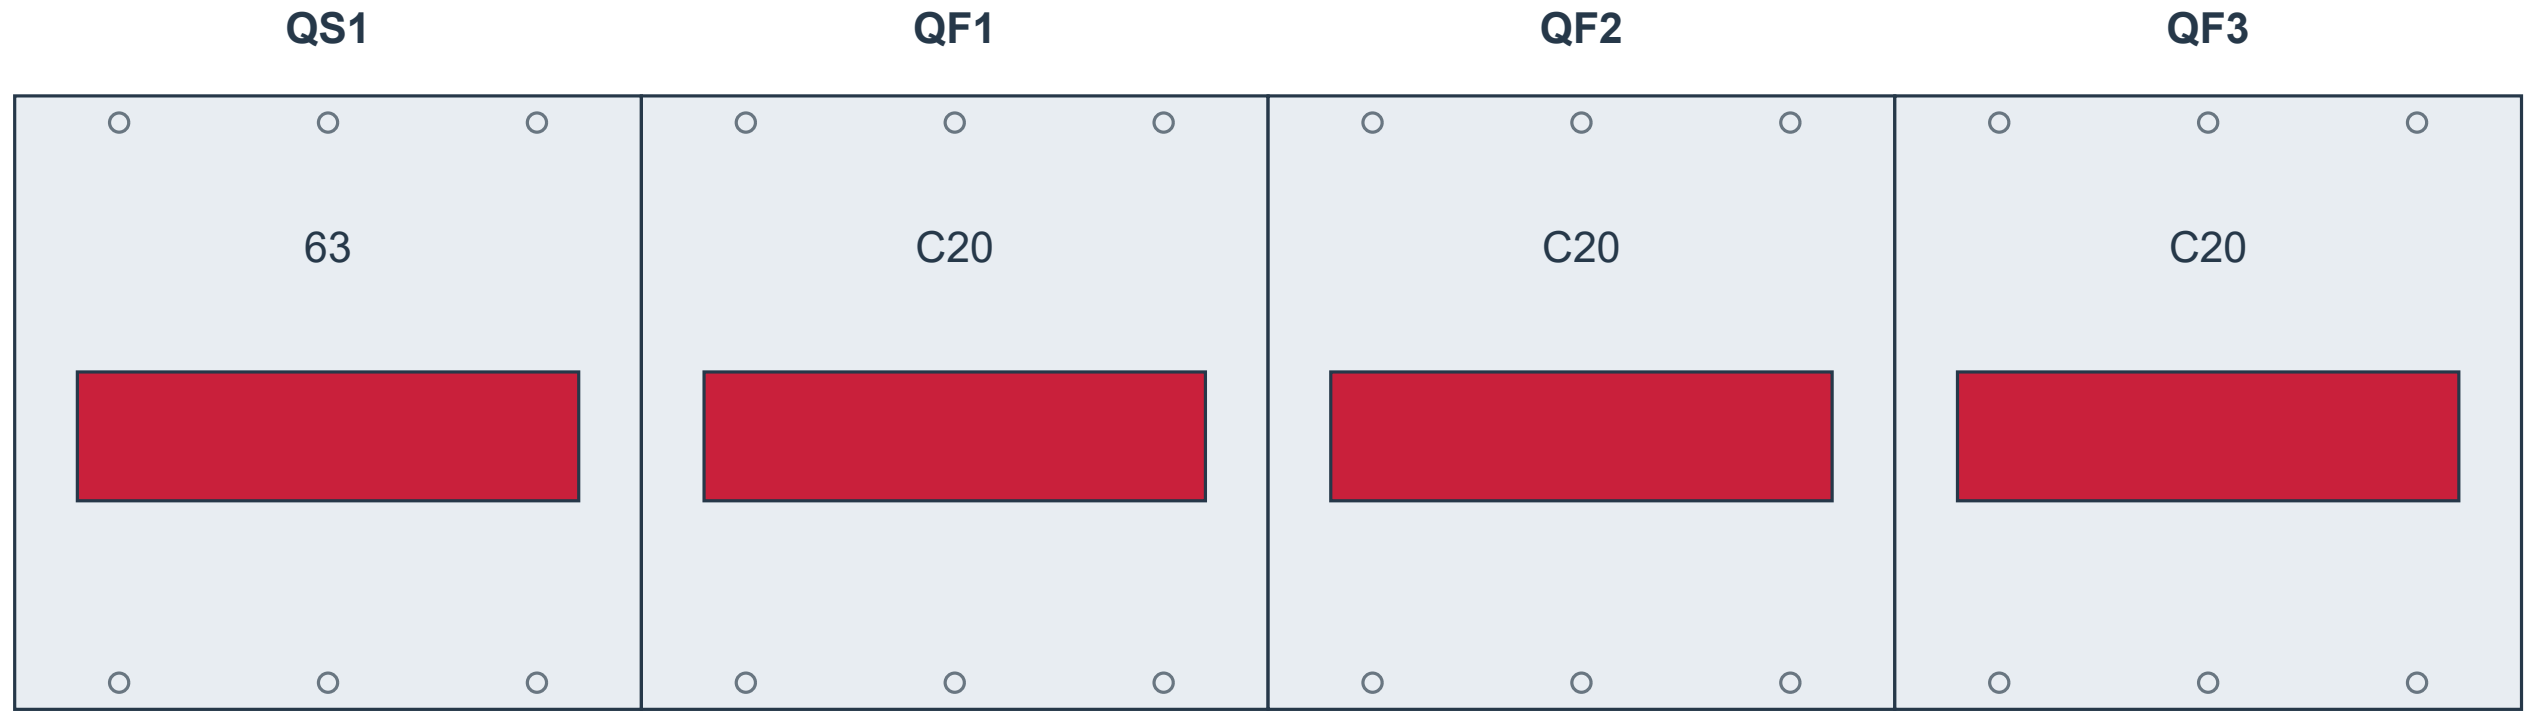

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

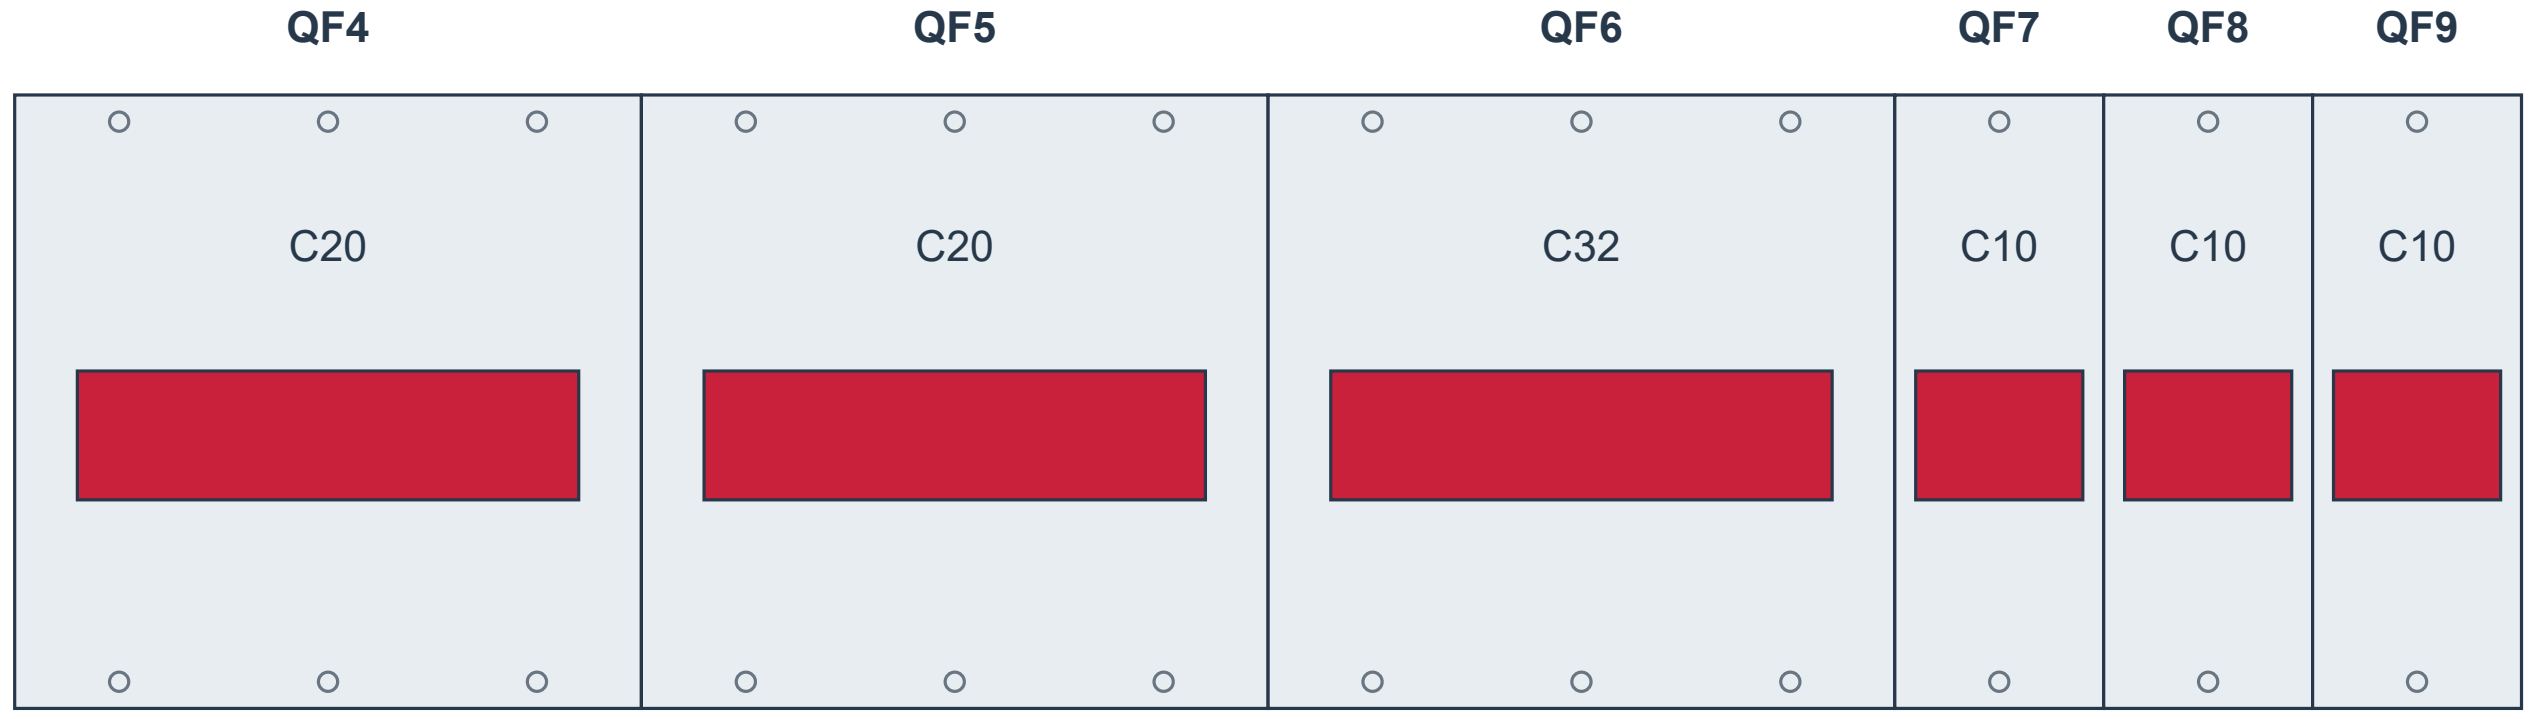

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 3 | модульная раскладка D

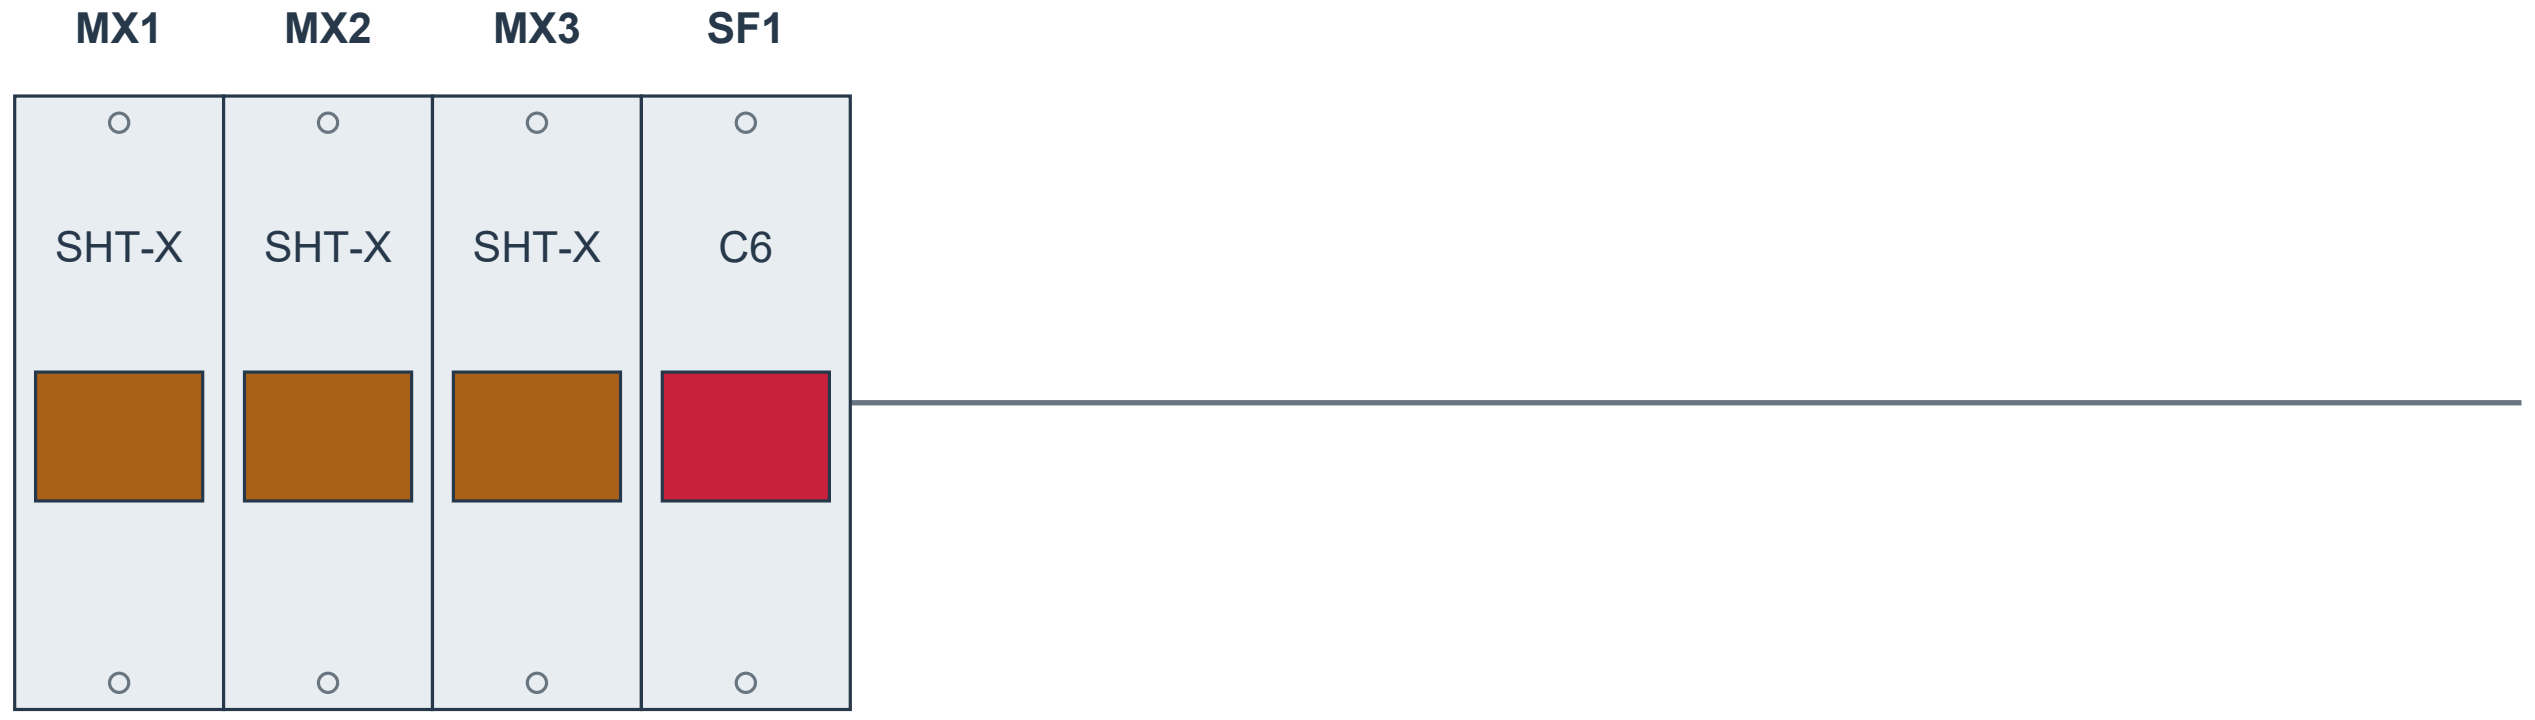

Сумма ширин: 72 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	1035	1	0	?	54 B
MX1 - MX3	SHT-X1	1036	3	0...36	?	18 B
QF1 - QF3	NXB-63S	1037	1	54...162	?	54 B
QF4 - QF5	NXB-63S	1038	2	0...54	?	54 B
QF6	NXB-63S	1039	2	108	?	54 B
QF7 - QF9	NXB-63S	1040	2	162...198	?	18 B
SF1	NXB-63S	1041	3	54	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Актуальная спецификация

ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1056 | ЭОМ, PDF стр. 59

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1057	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1058	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1059	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1060	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка С (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1061	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка С (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1062	296831	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка С (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1063	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка С (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1064	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка С (R)	шт	1	1	chint	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 59

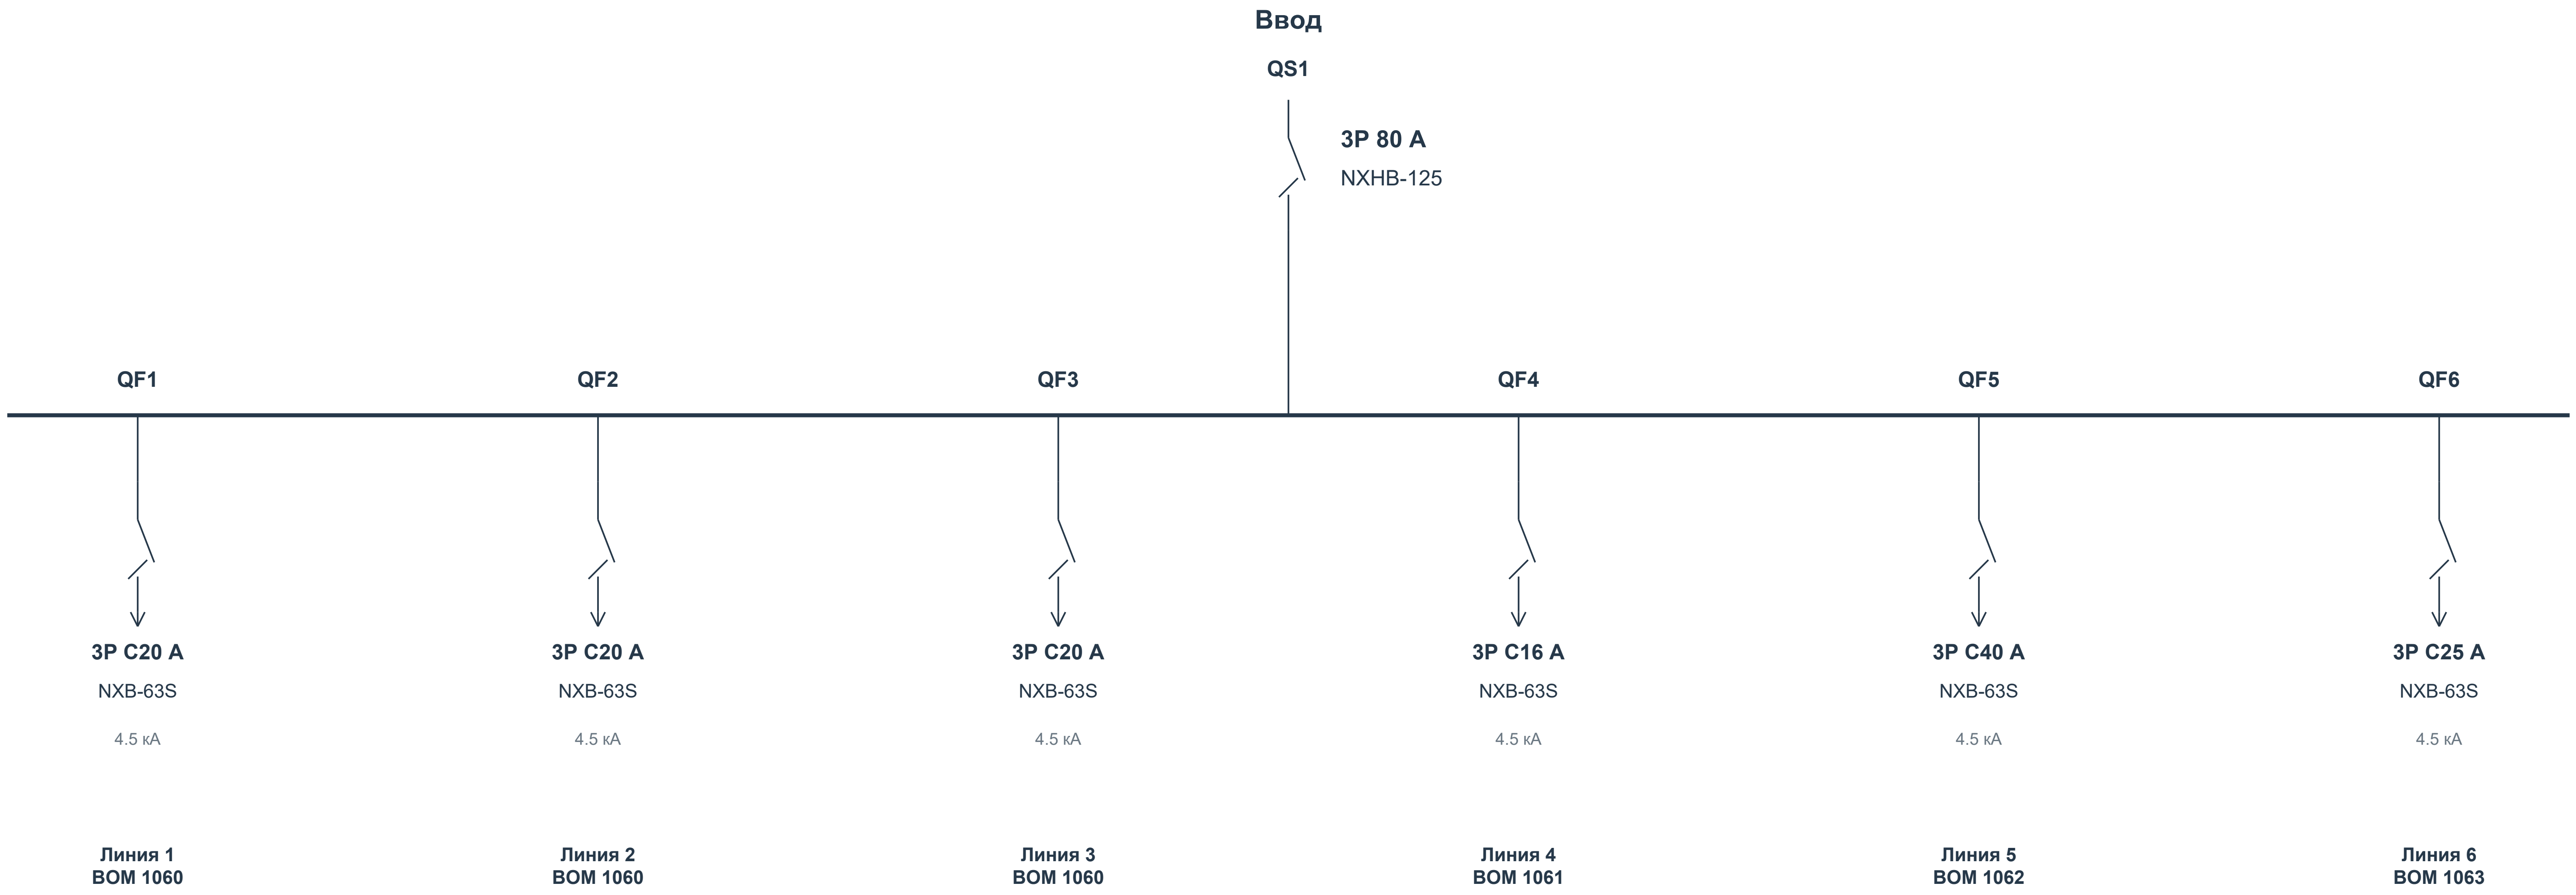
Ввод
QS1
3P 80 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C40 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1060
Линия 2
BOM 1060
Линия 3
BOM 1060
Линия 4
BOM 1061
Линия 5
BOM 1062
Линия 6
BOM 1063

Управление / учет: MX1 - MX2 SHT-X1 × 2; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 47.4 кВт | Рр 37,0 кВт | Iр 66,1 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

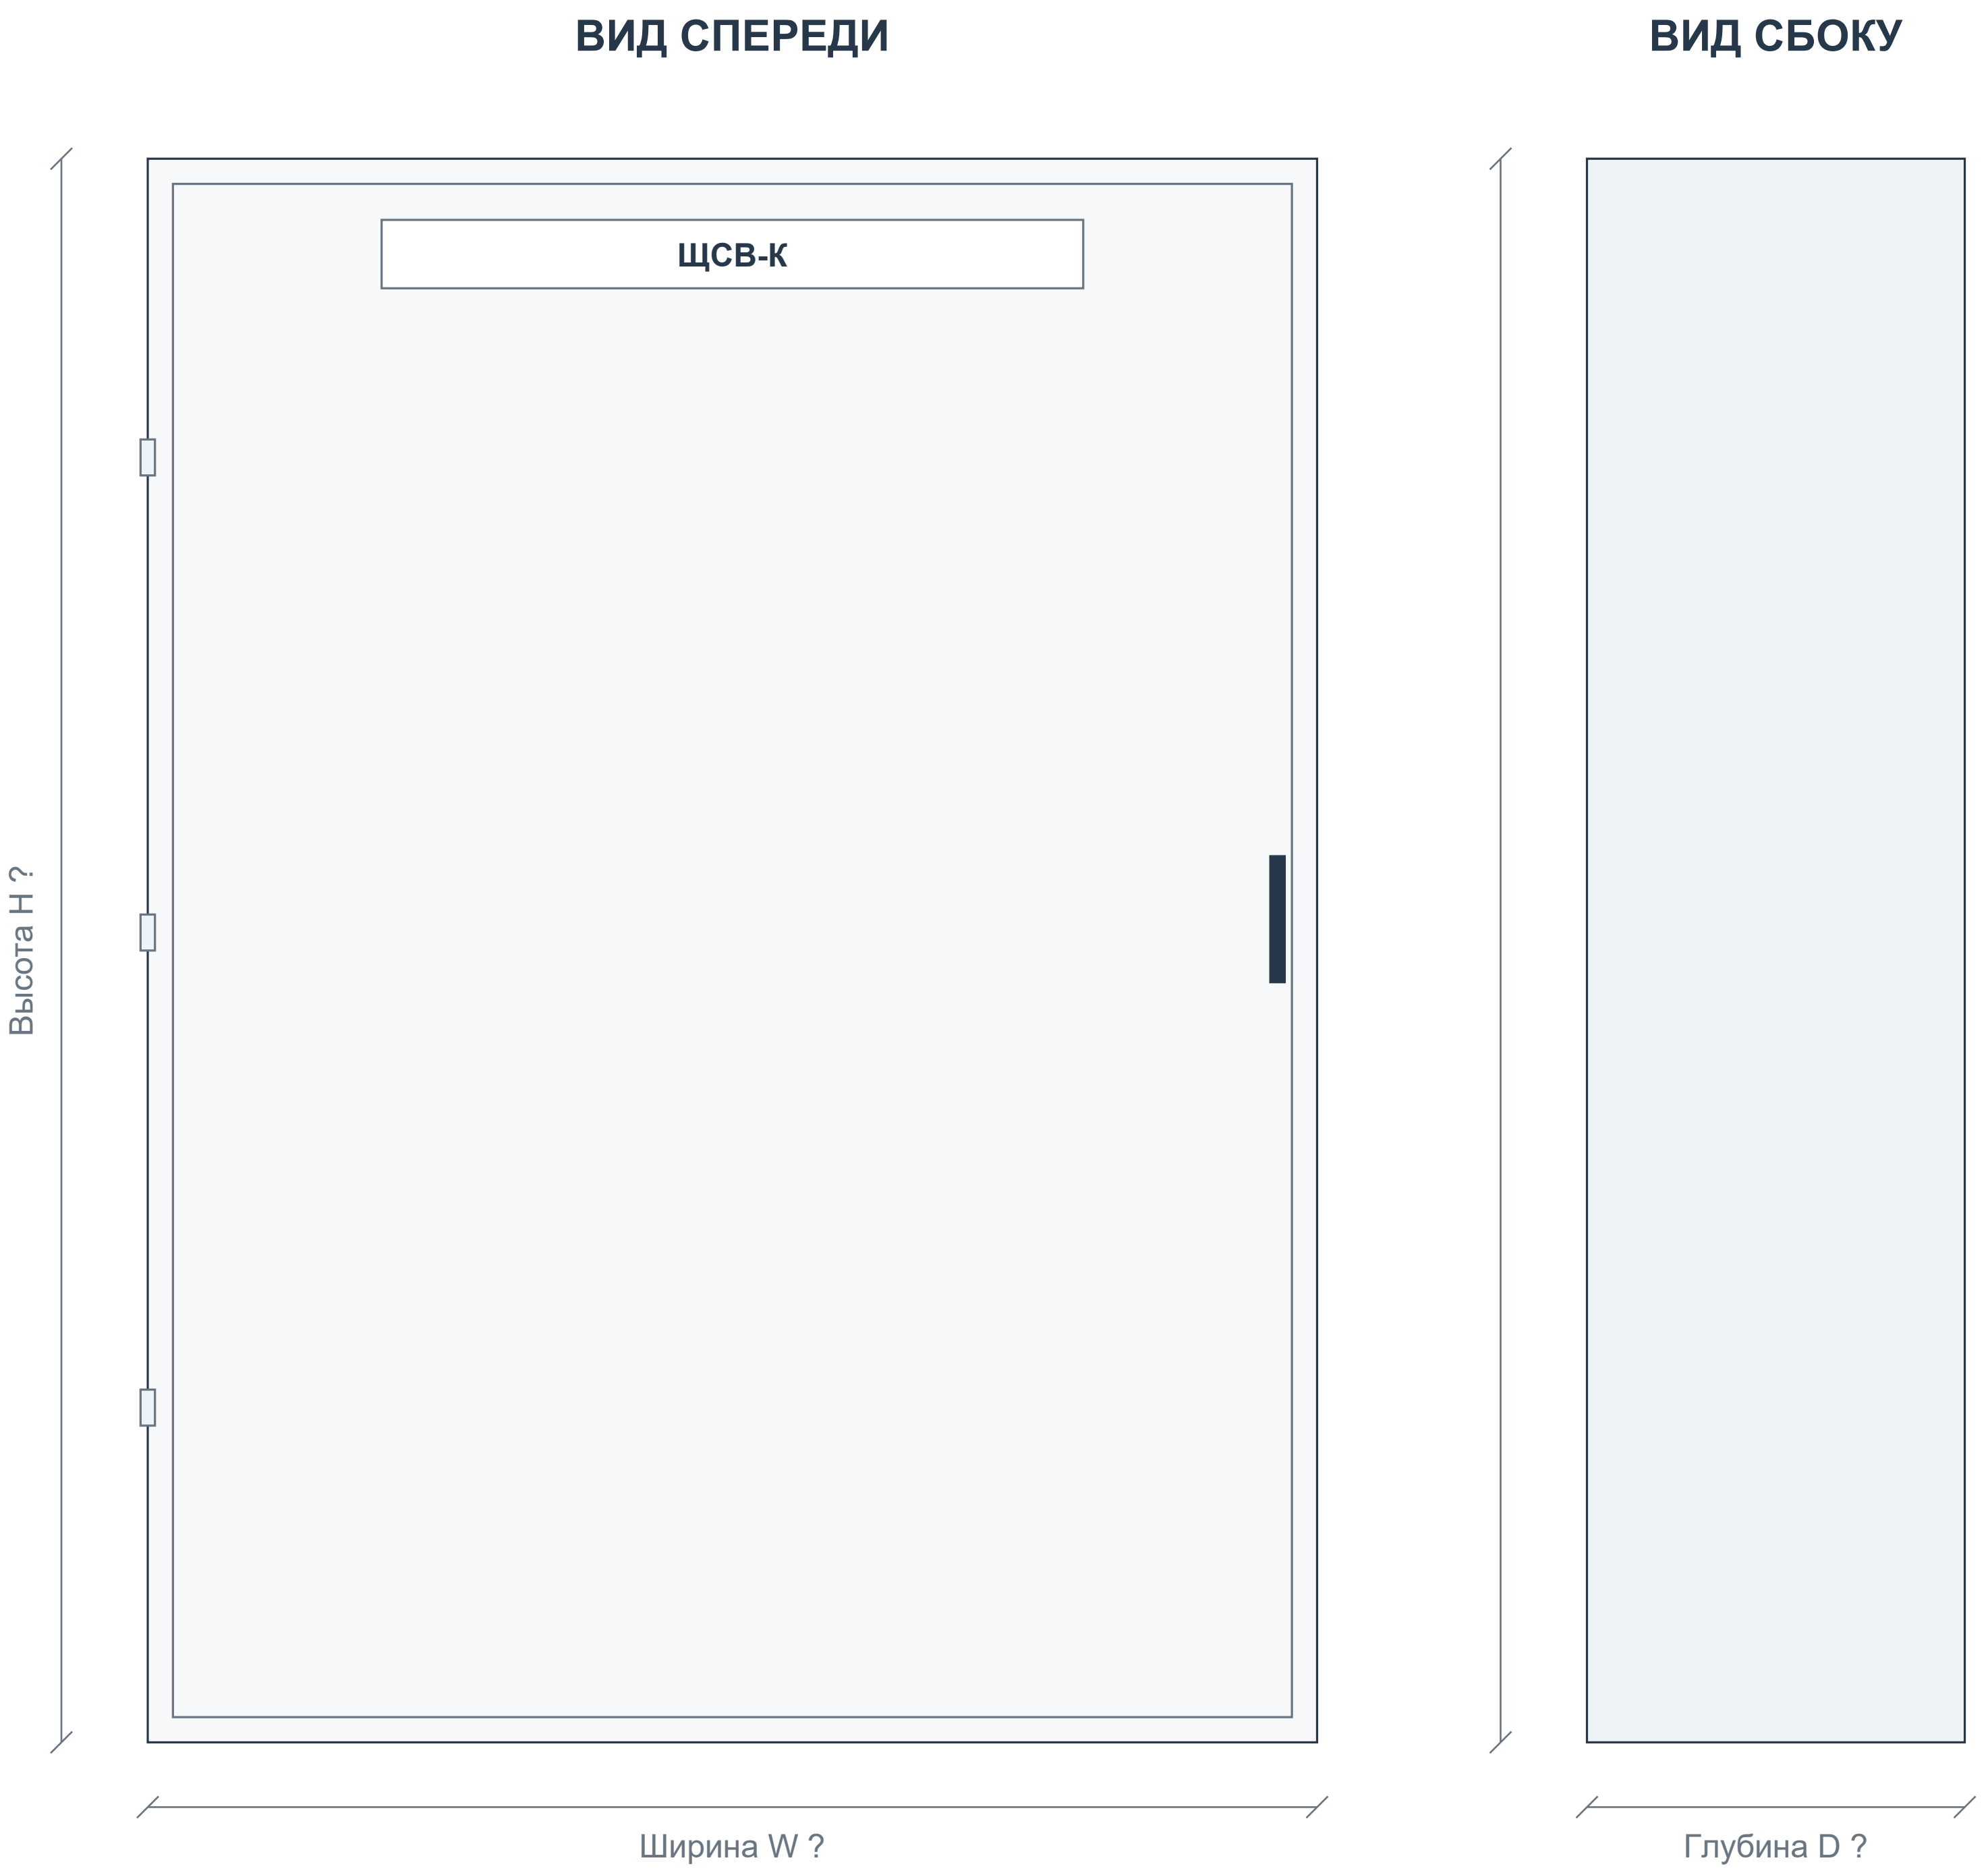

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

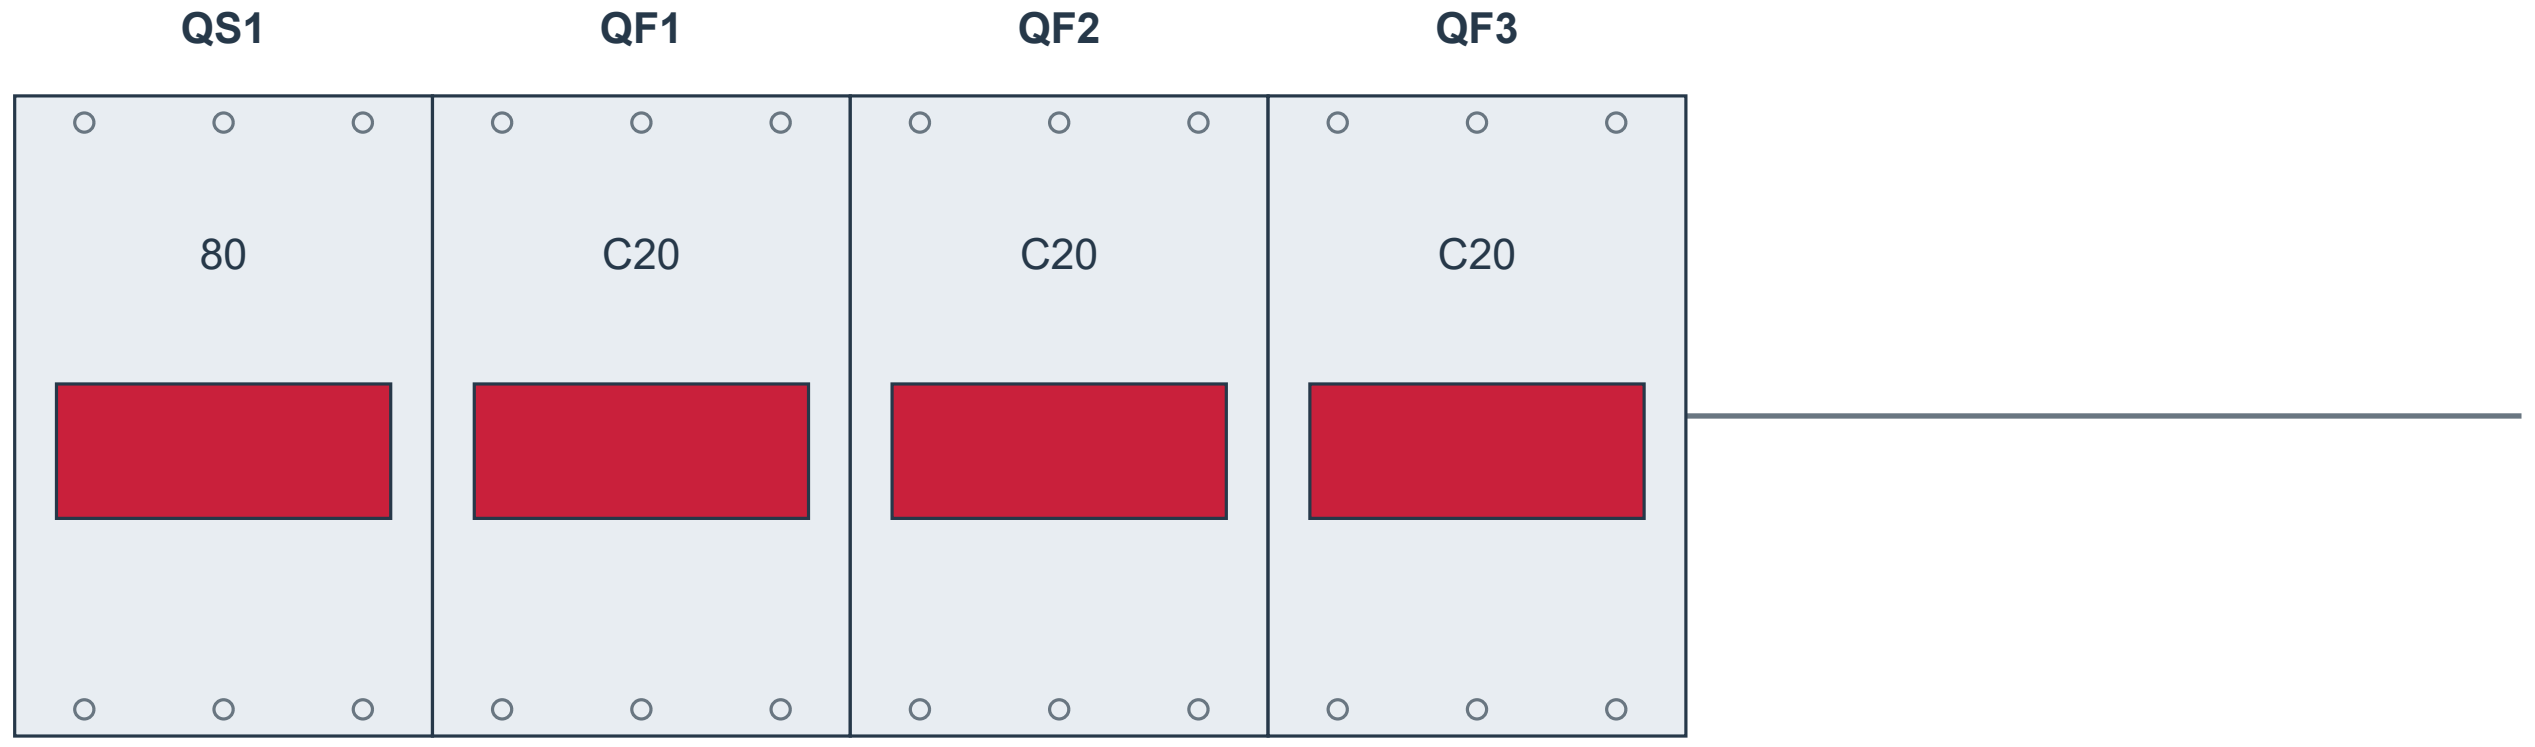

Сумма ширин: 216 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

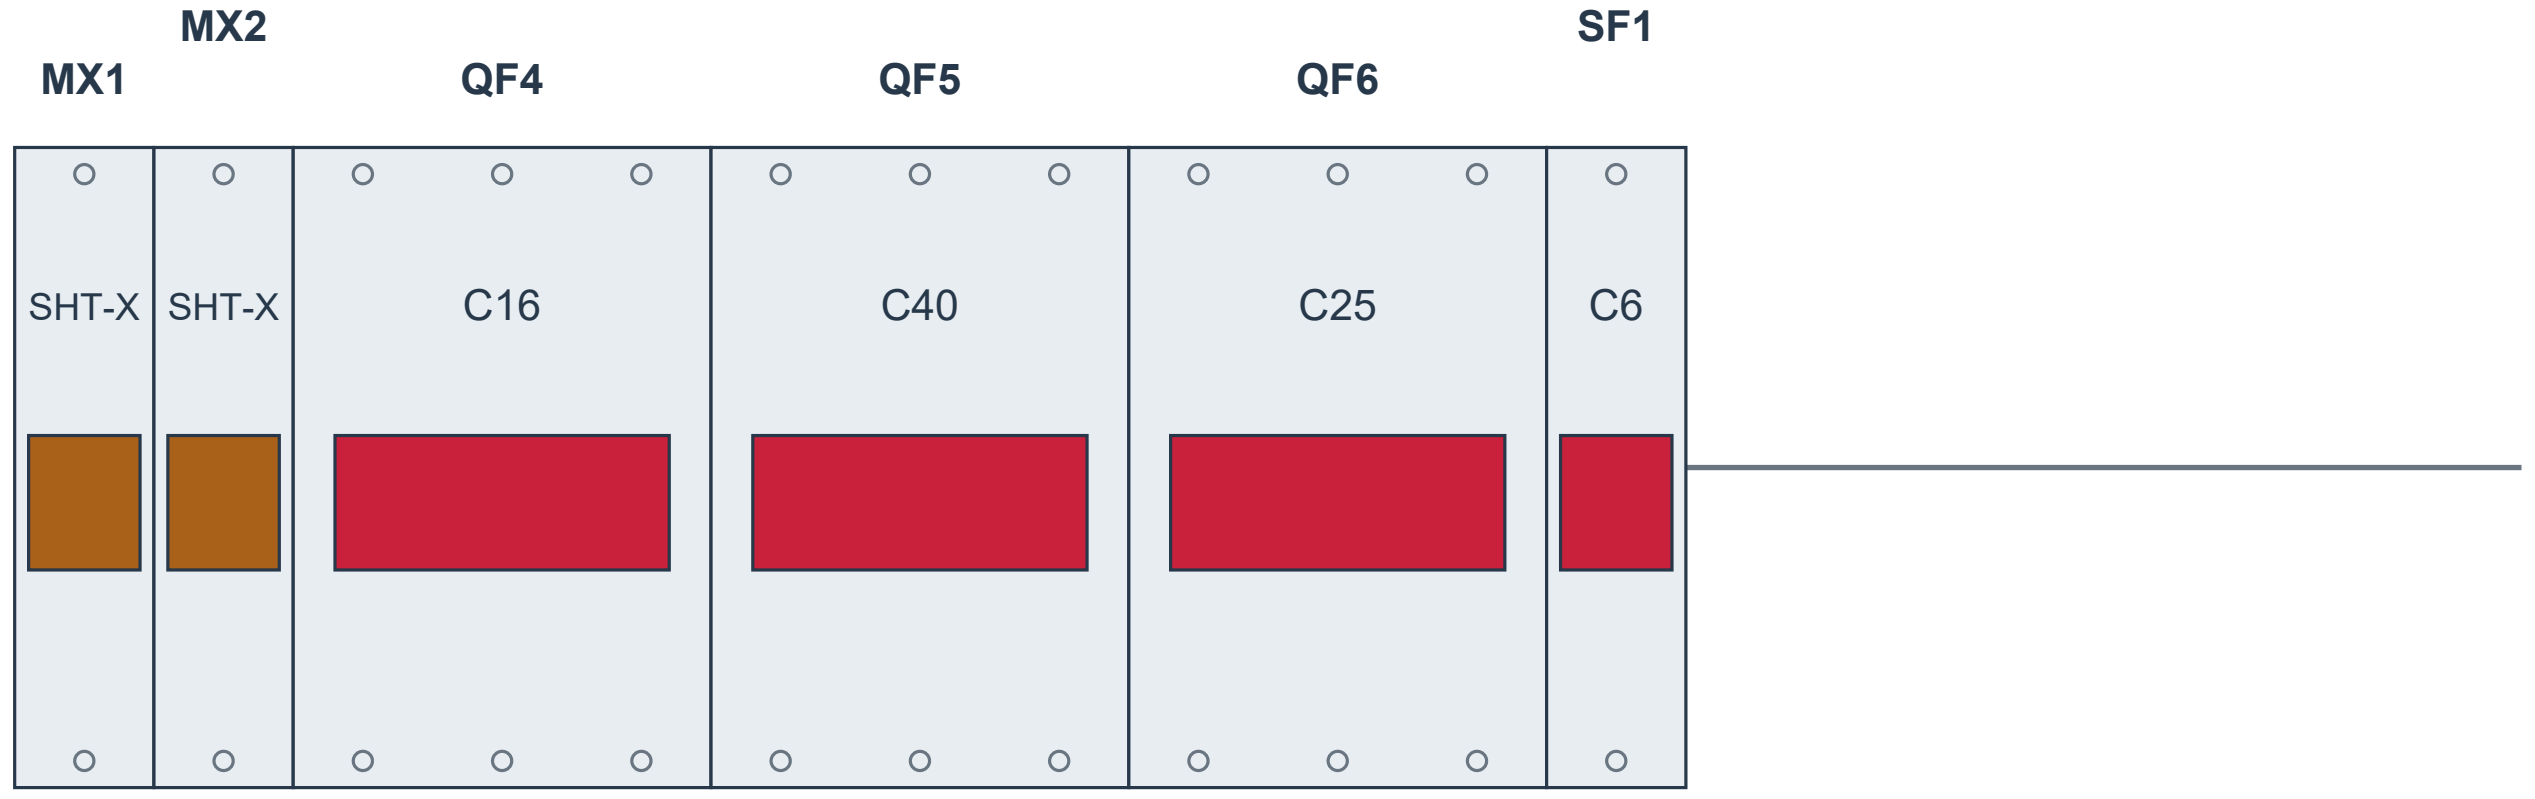

Сумма ширин: 216 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	1058	1	0	?	54 B
MX1 - MX2	SHT-X1	1059	2	0...18	?	18 B
QF1 - QF3	NXB-63S	1060	1	54...162	?	54 B
QF4	NXB-63S	1061	2	36	?	54 B
QF5	NXB-63S	1062	2	90	?	54 B
QF6	NXB-63S	1063	2	144	?	54 B
SF1	NXB-63S	1064	2	198	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Актуальная спецификация

ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1079 | ЭОМ, PDF стр. 61

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1080	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1081	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	7	7	chint	Отход.
1082	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип А, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1083	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1084	PYS-004	Терморегулятор РТ330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту)	шт	1	1	pys	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 61

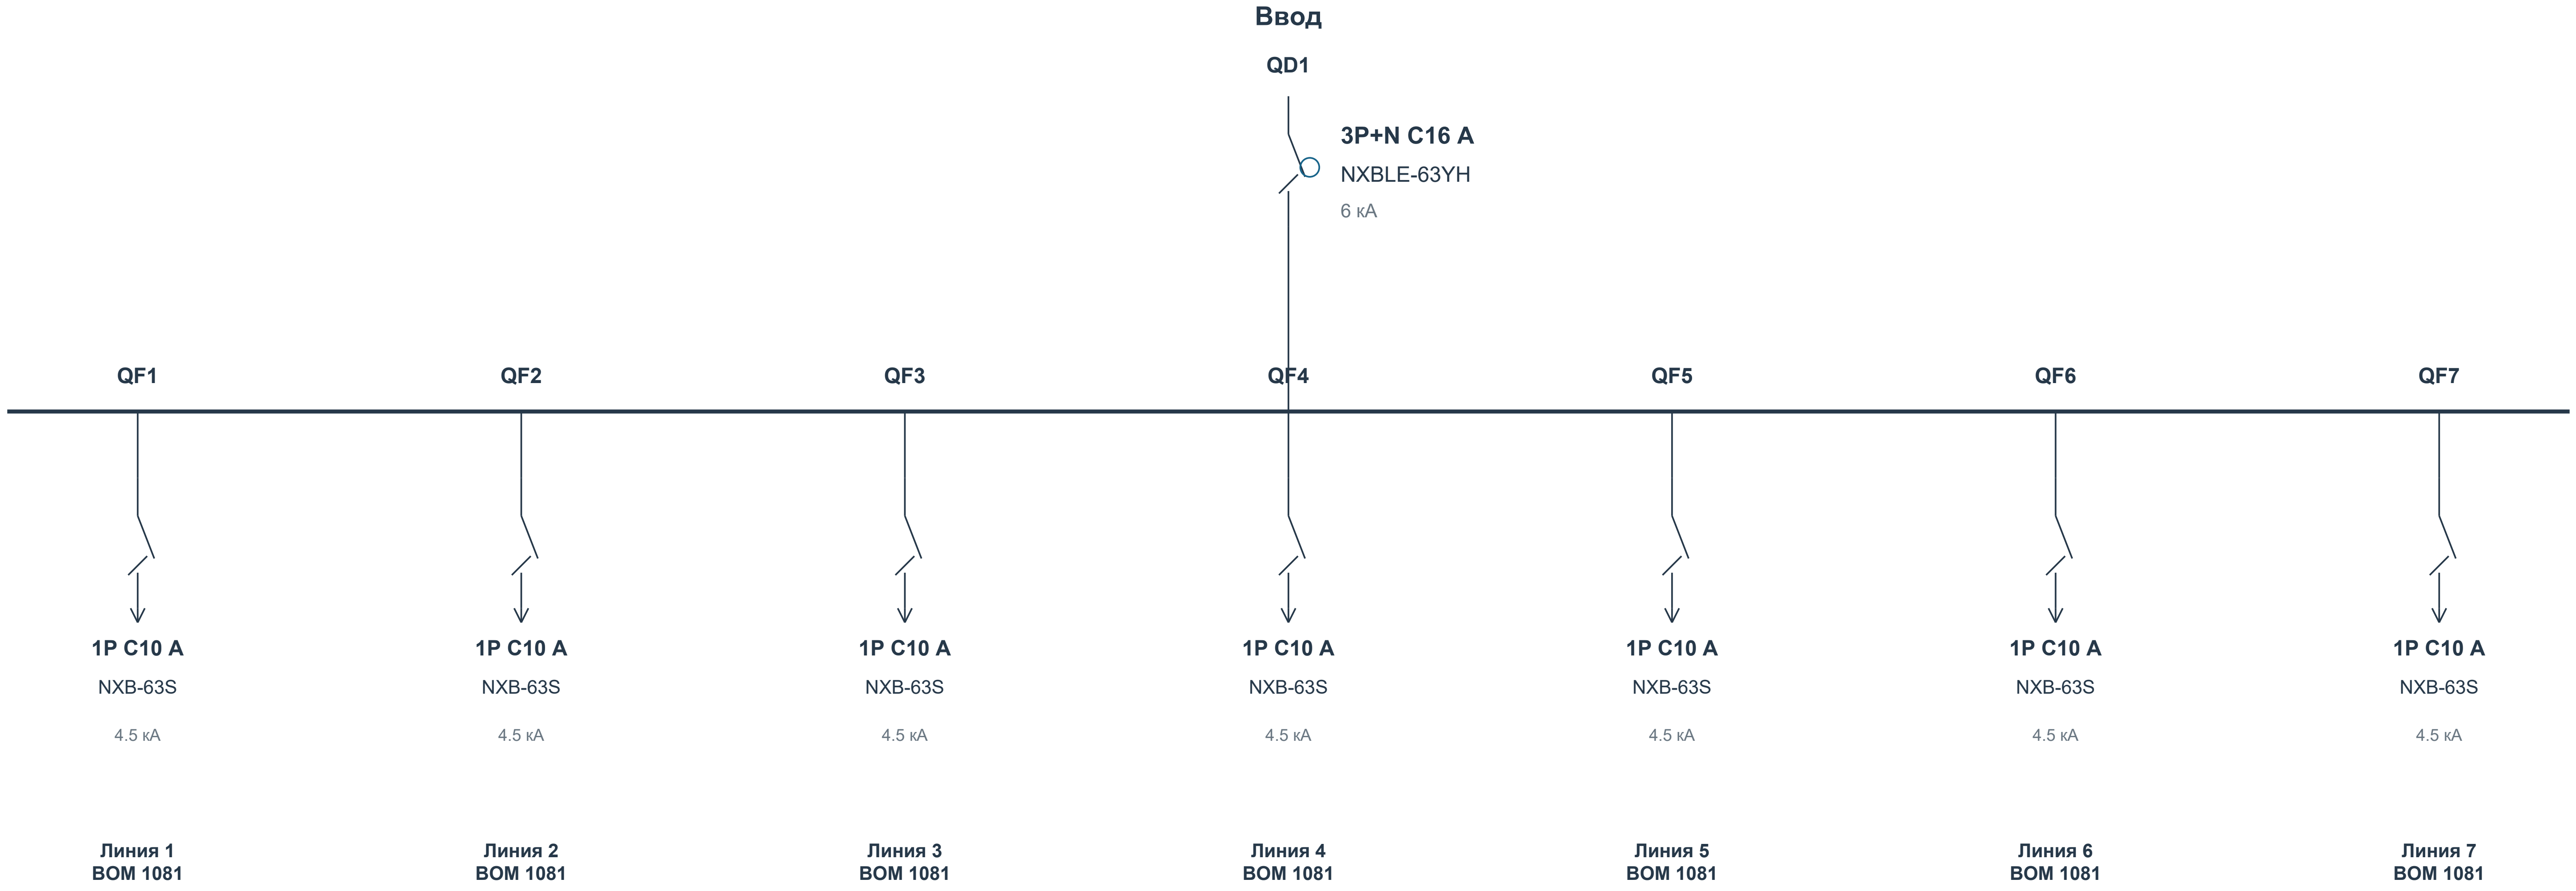
Ввод
QD1
3P+N C16 A
NXBLE-63YH
6 кА
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1081
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 1081
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 1081
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 1081
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 1081
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 1081
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 1081

Управление / учет: KM1 NXC-25 × 1; KA1 PT330 × 1

Данные исходного проекта: Ру 3.2 кВт | Рр 3,2 кВт | Iр 5,1 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

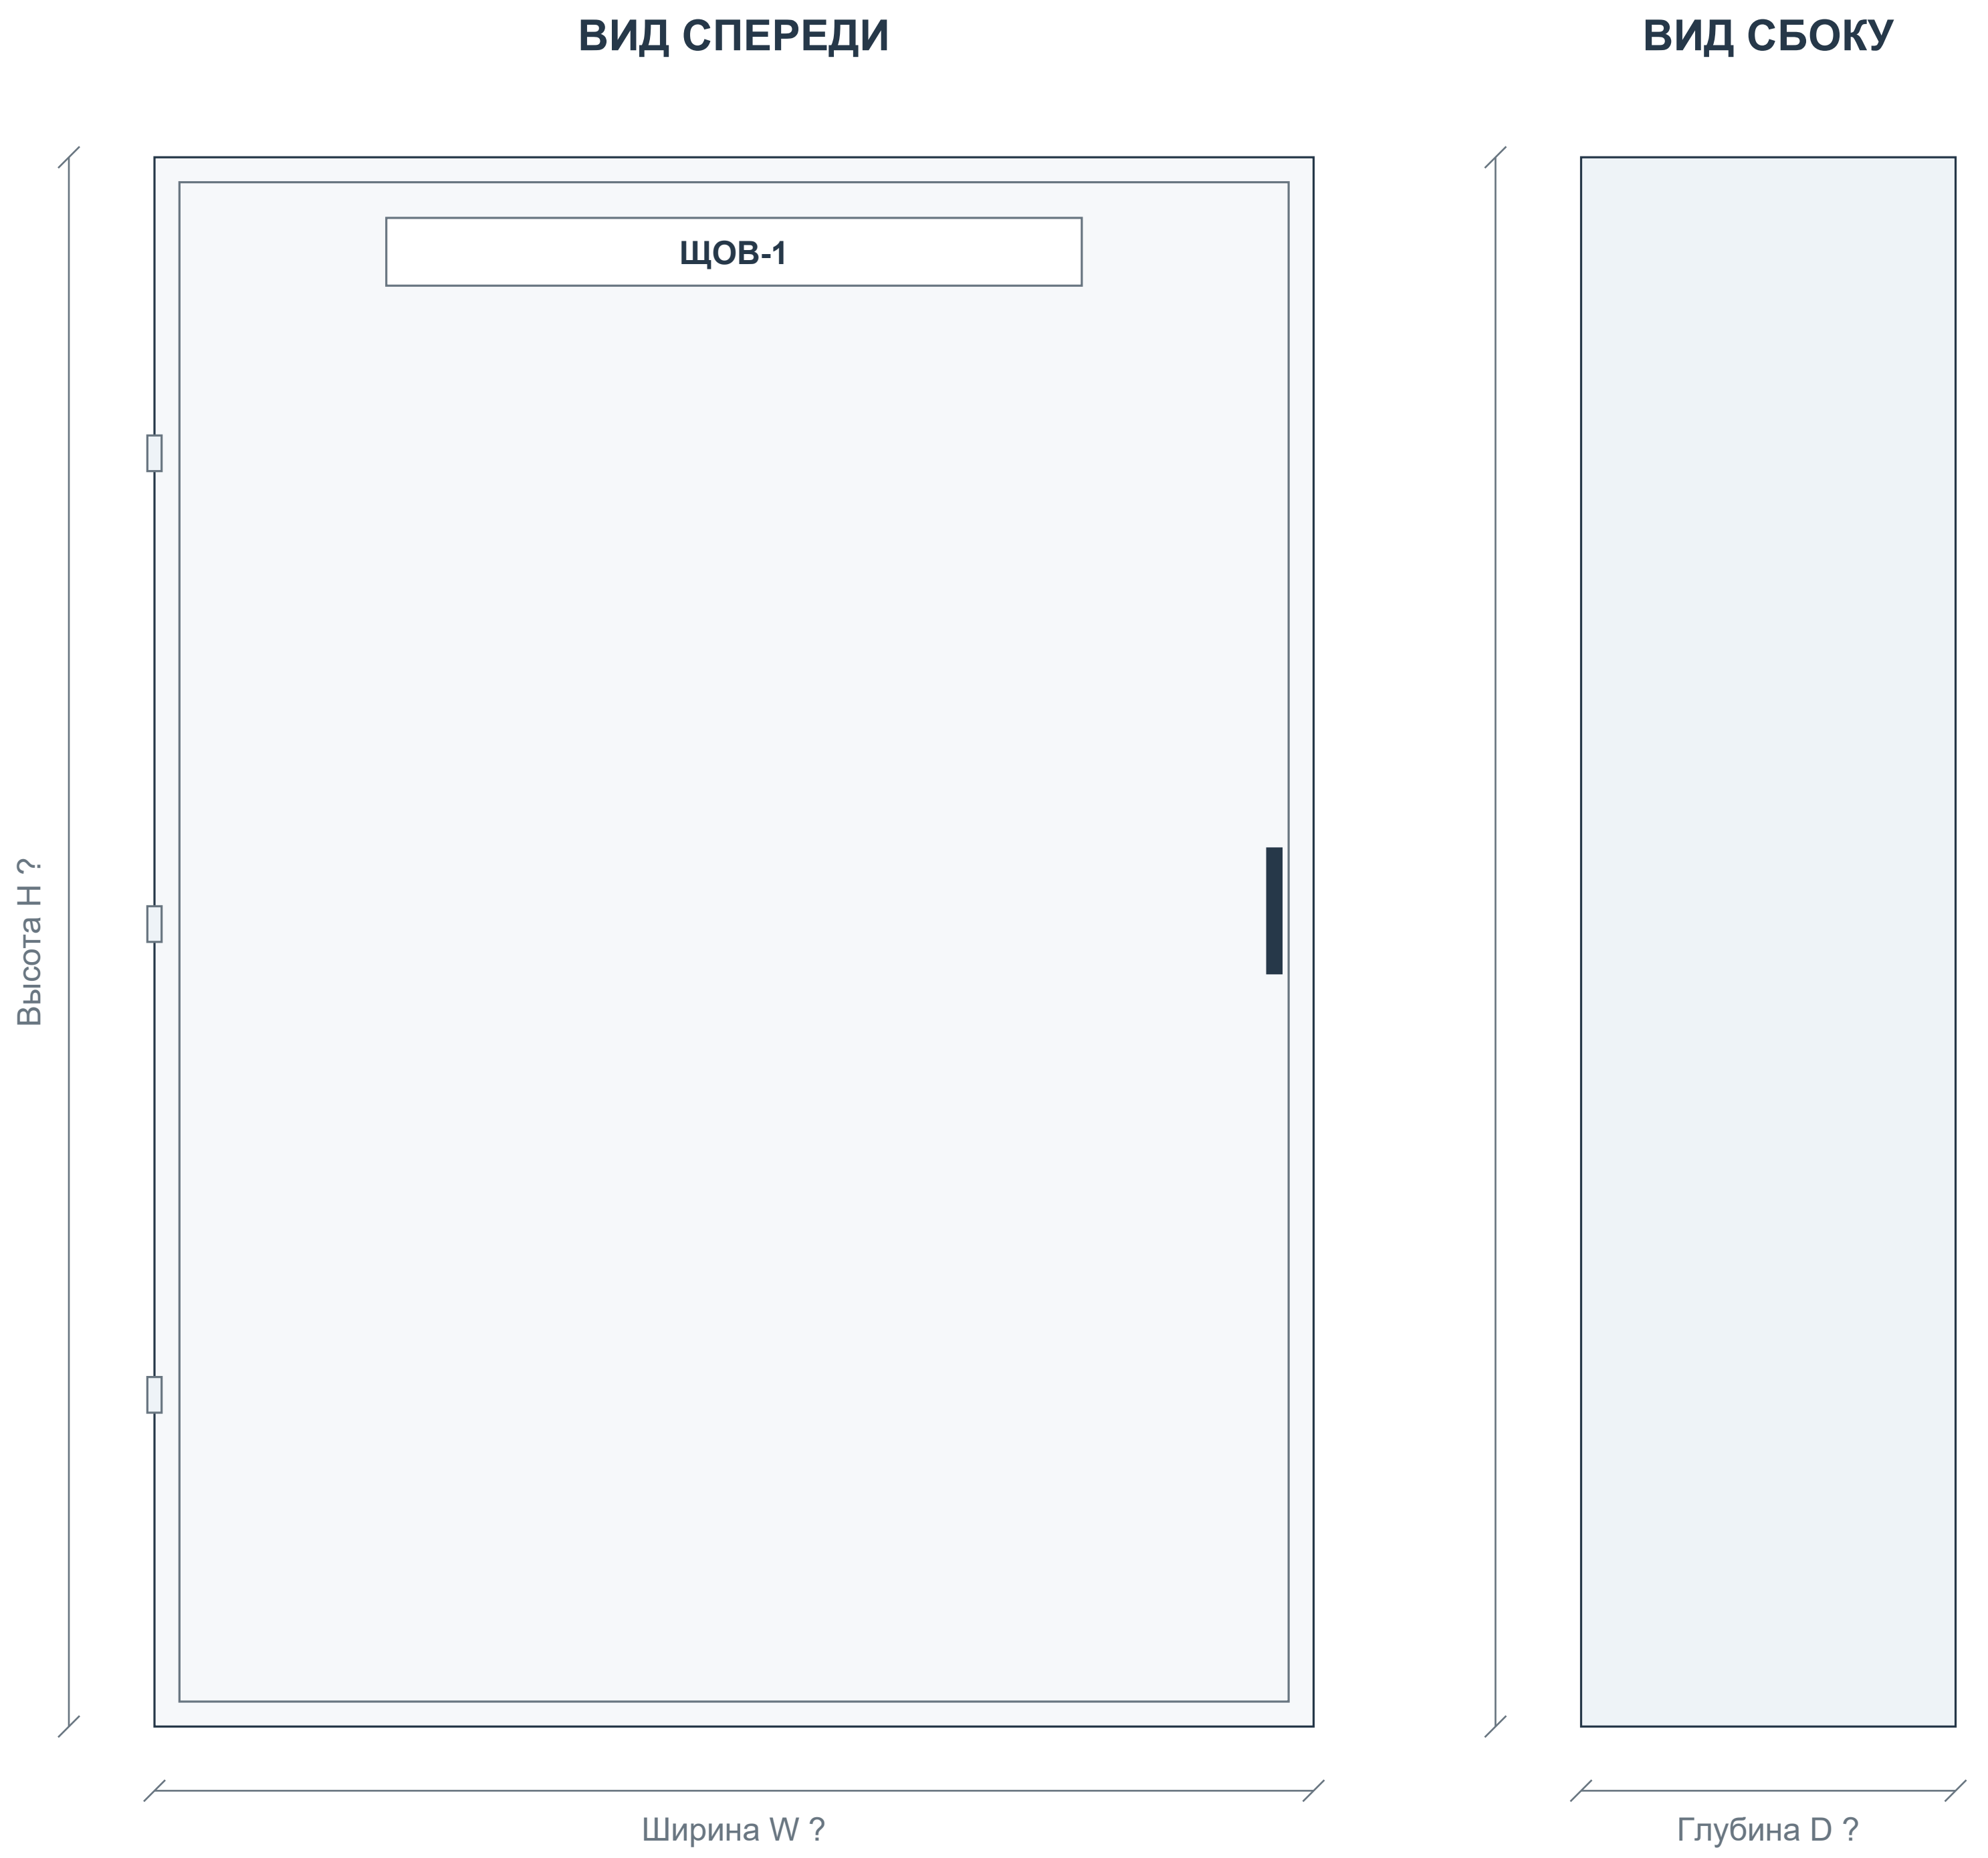

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

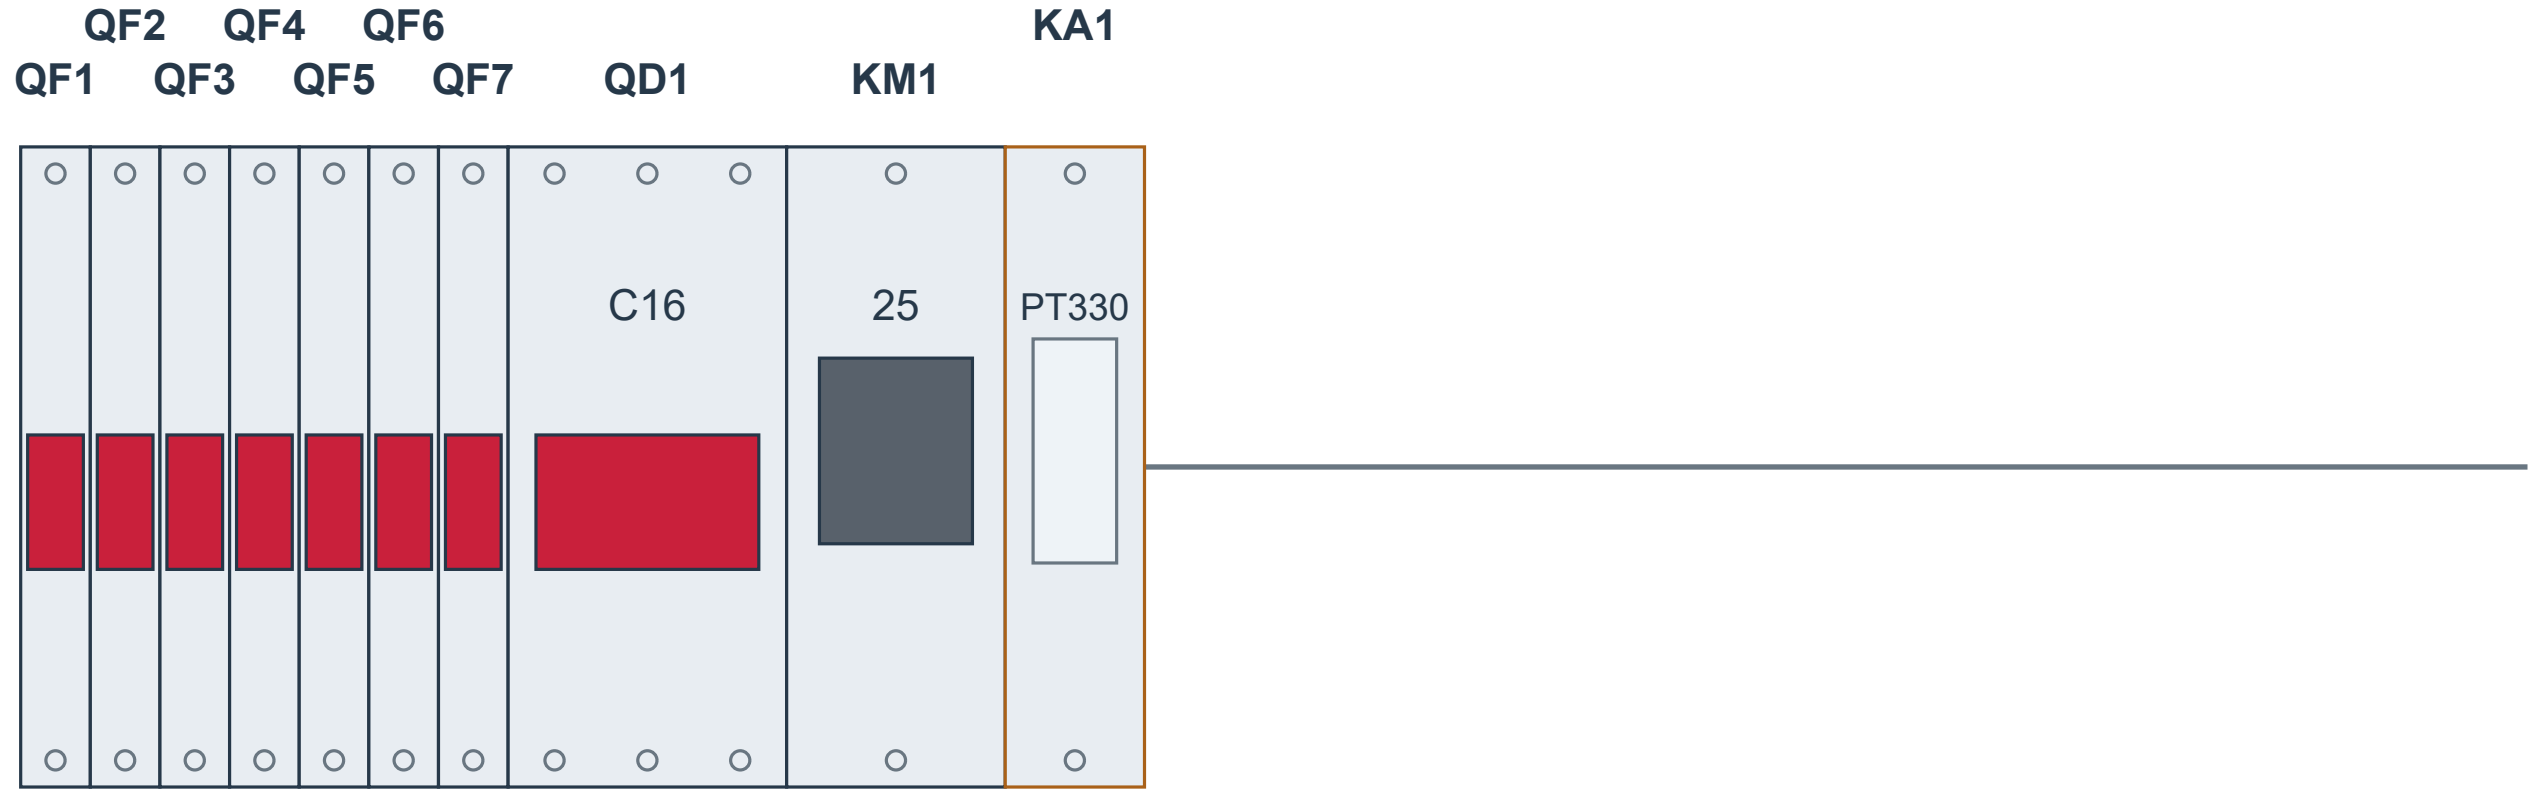

Сумма ширин: 254.5 мм B + ?

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QF1 - QF7	NXB-63S	1081	1	0...108	?	18 B
QD1	NXBLE-63YH	1082	1	126	?	72 B
KM1	NXC-25	1083	1	198	?	56.5 B
KA1	PT330	1084	1	254.5	?	?

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

У 1 аппаратов габариты не заполнены; янтарные контуры условные. Фактический размер и посадку проверить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Актуальная спецификация

ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1100 | ЭОМ, PDF стр. 62

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1101	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1102	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1103	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1104	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1105	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1106	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 62

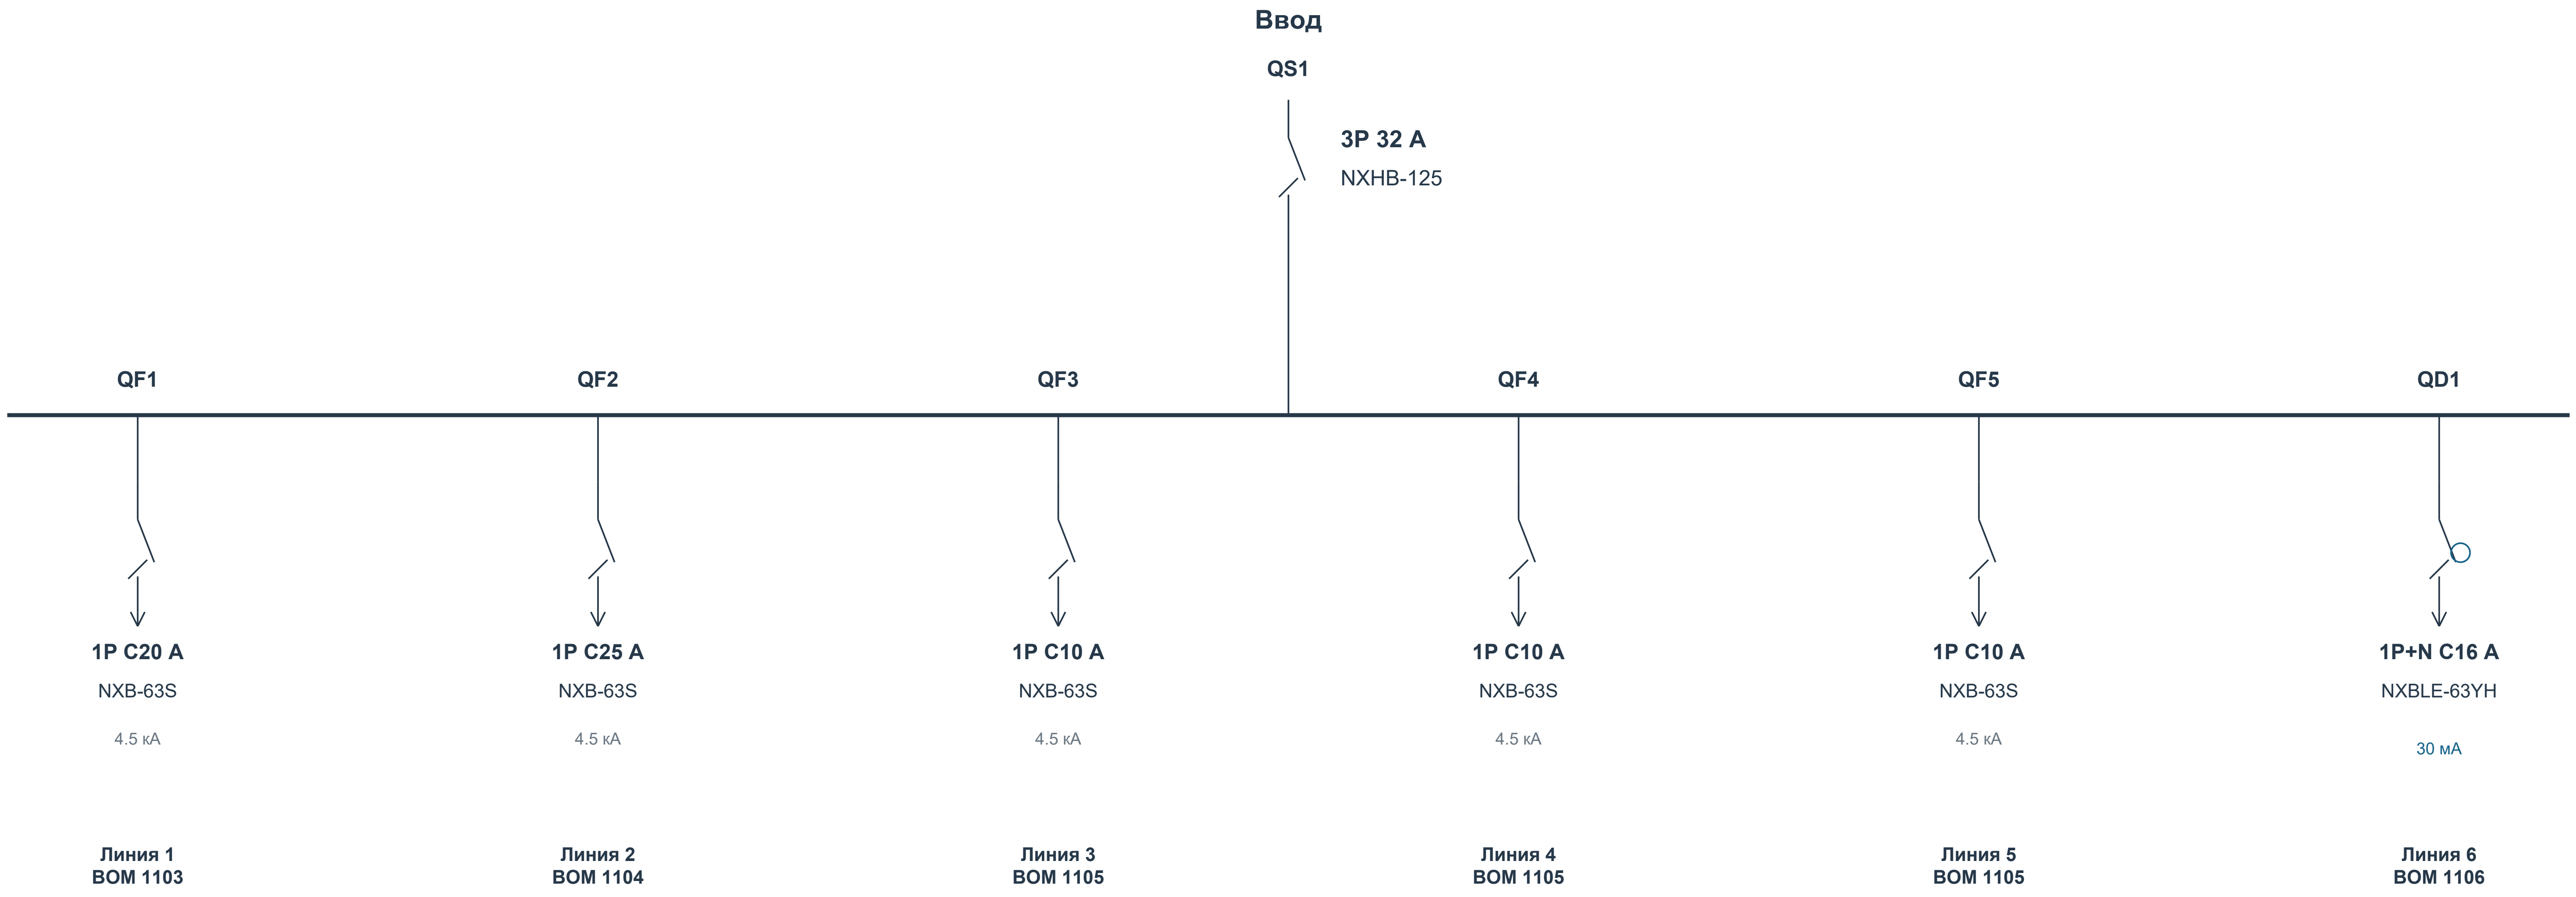
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QD1
1P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 1103
Линия 2
BOM 1104
Линия 3
BOM 1105
Линия 4
BOM 1105
Линия 5
BOM 1105
Линия 6
BOM 1106

Данные исходного проекта: Ру 9.63 кВт | Рр 9,63 кВт | Iр 15,4 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

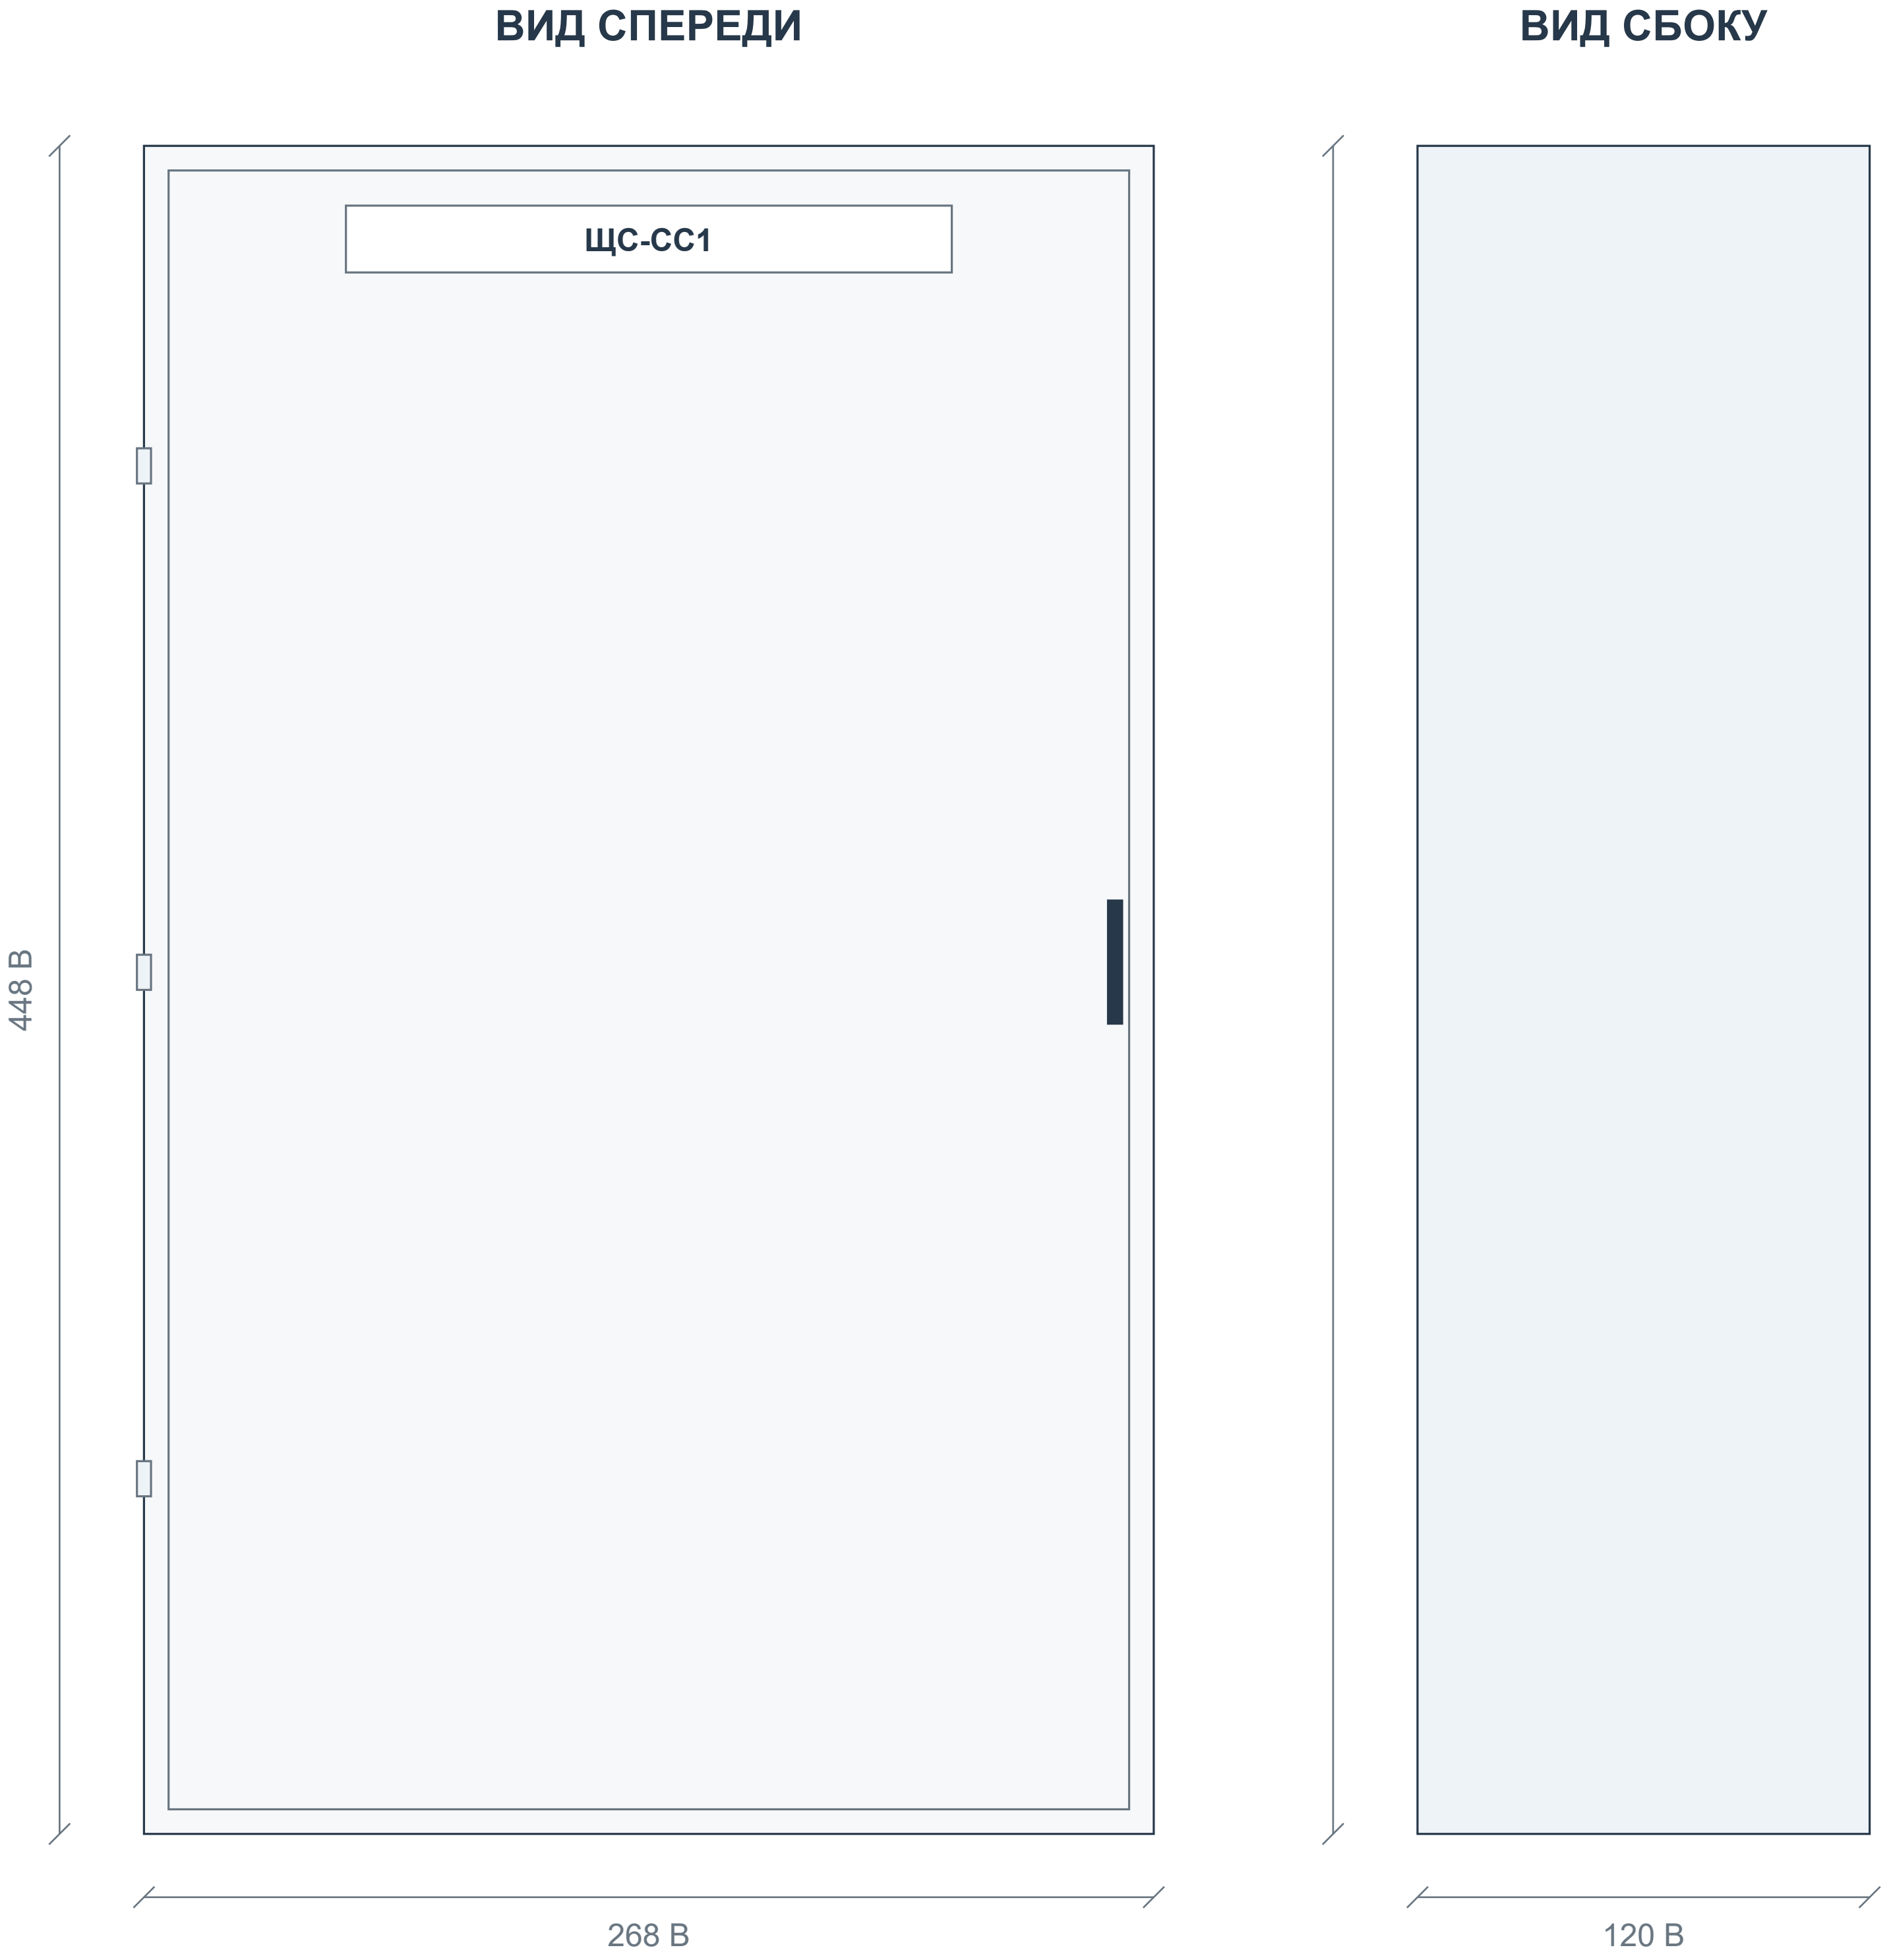

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448х268х120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

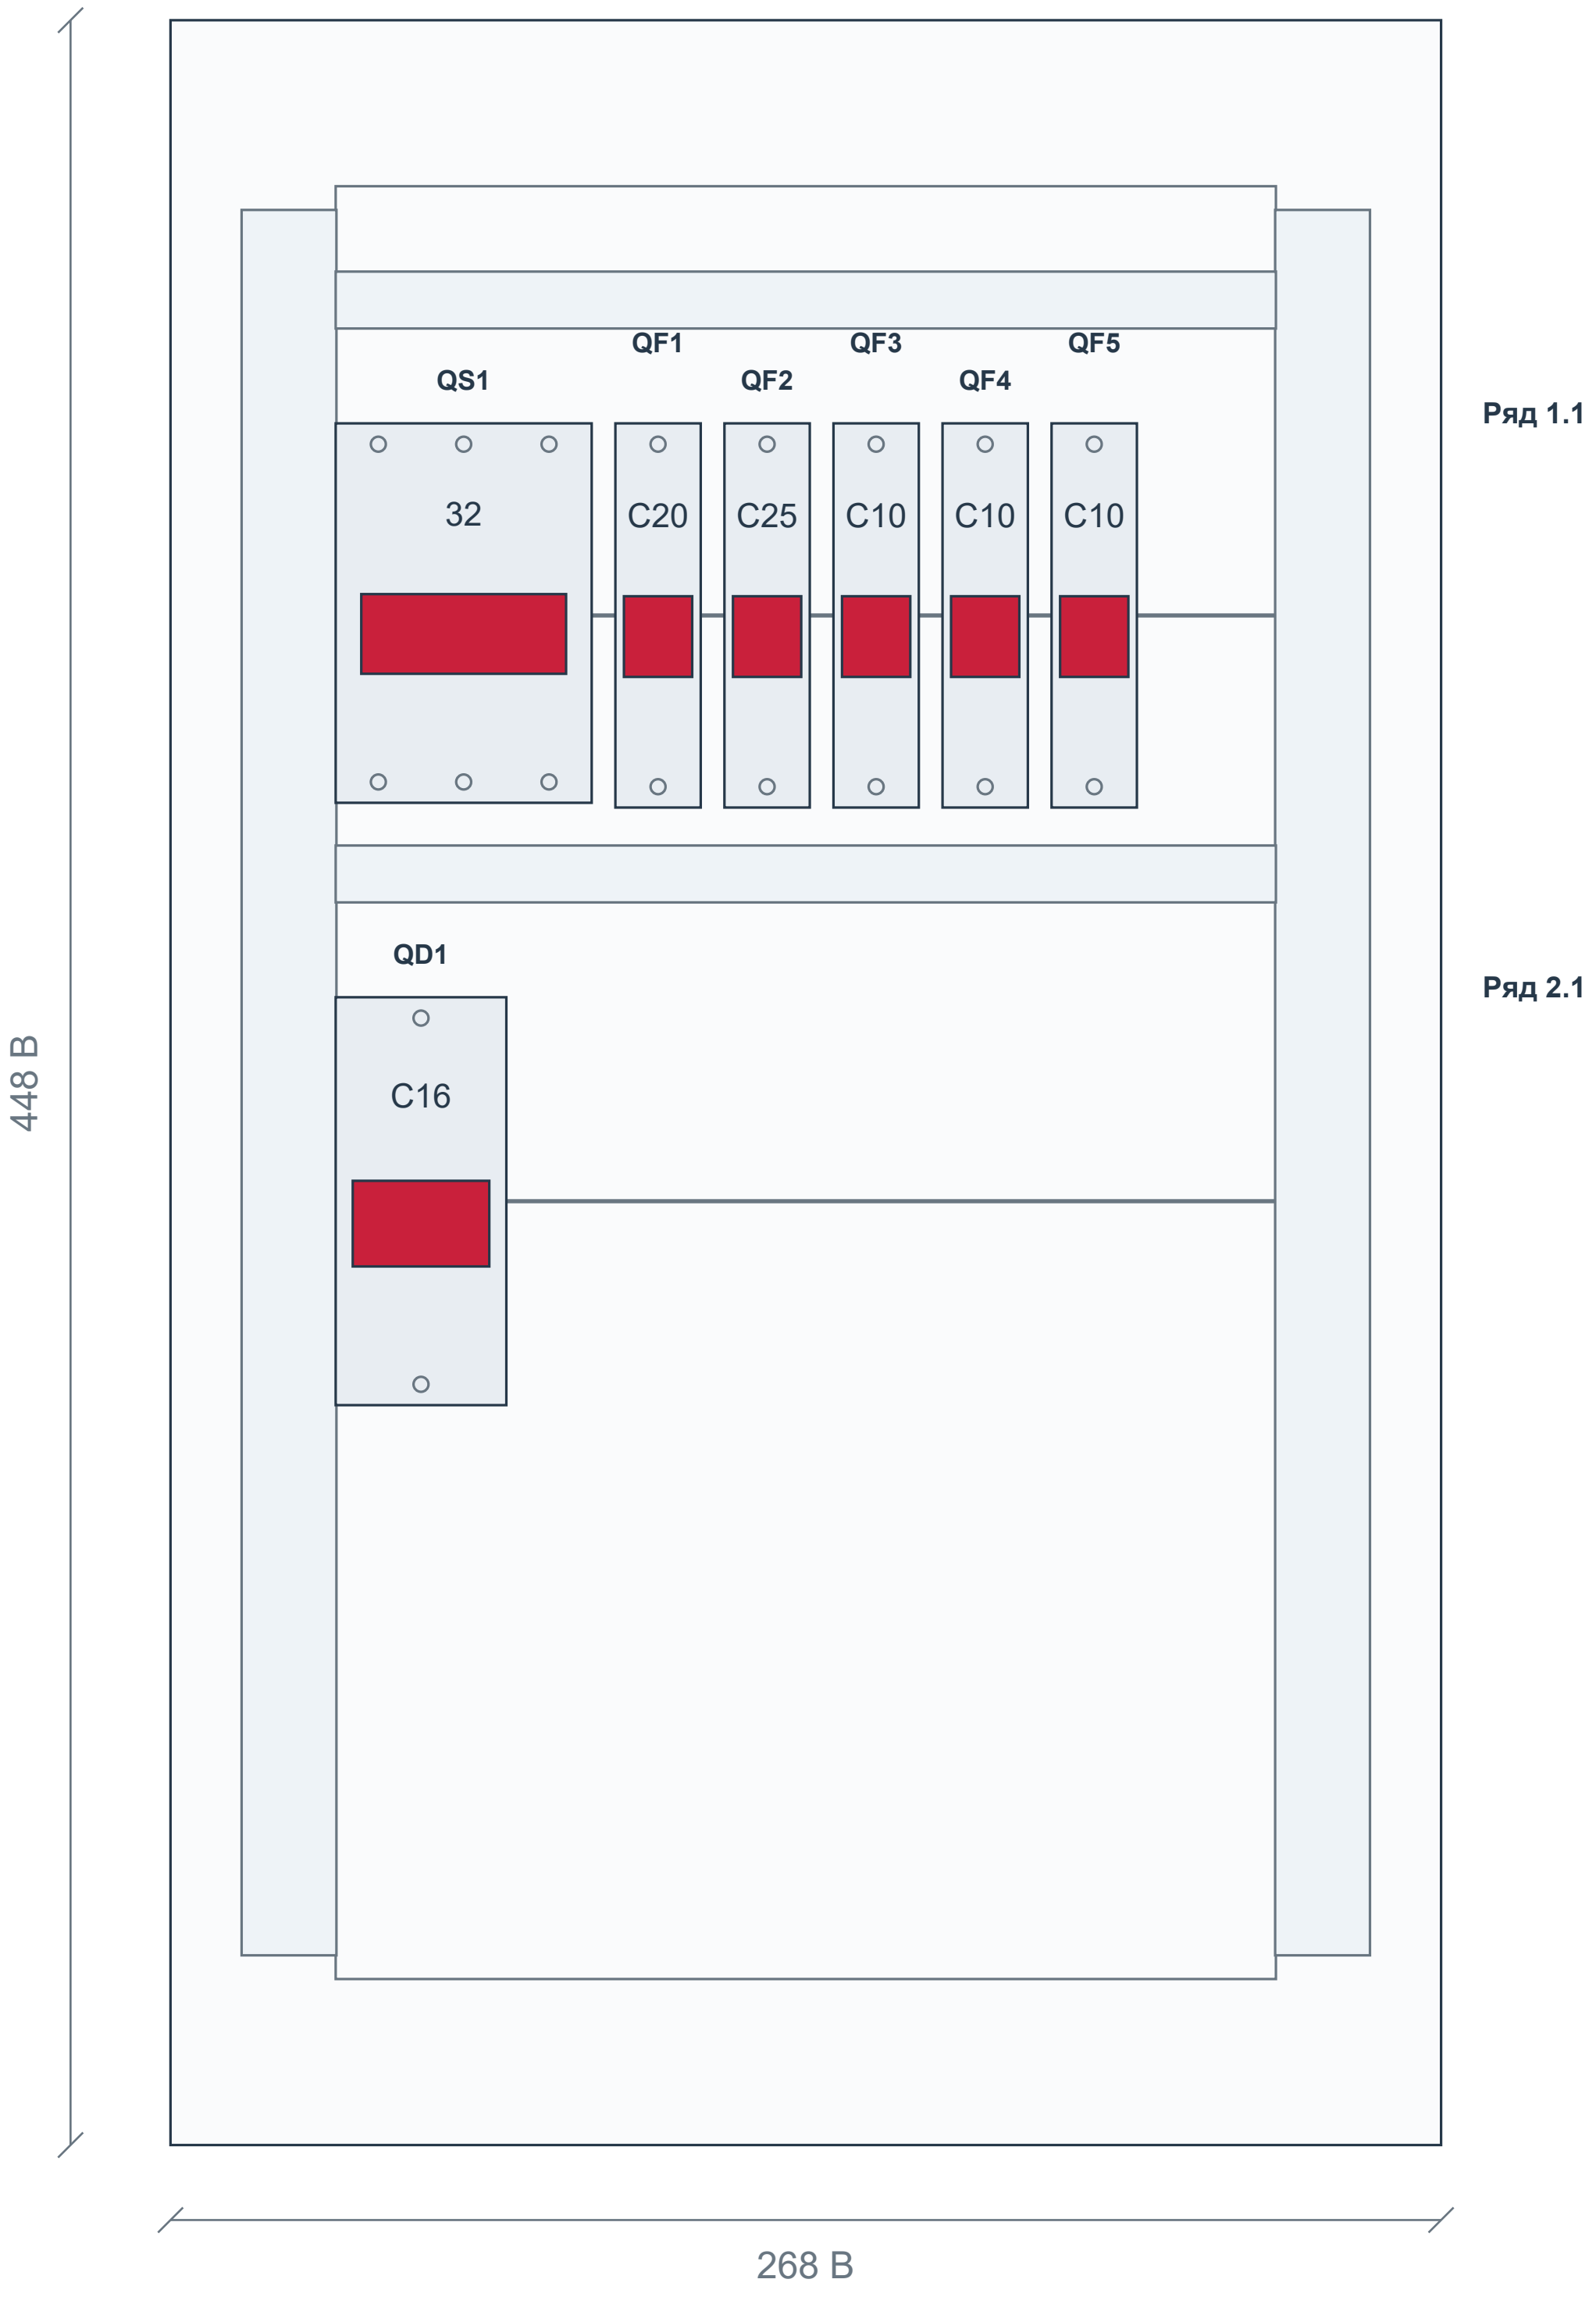

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	1102	1.1	34.84	85	54 × 80
QF1	NXB-63S	1103	1.1	93.84	85	18 × 81
QF2	NXB-63S	1104	1.1	116.84	85	18 × 81
QF3 - QF5	NXB-63S	1105	1.1	139.84...185.84	85	18 × 81
QD1	NXBLE-63YH	1106	2.1	34.84	206	36 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Актуальная спецификация

ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1120 | ЭОМ, PDF стр. 63

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1121	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1122	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1123	296831	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1124	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1125	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1126	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1127	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1128	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 63

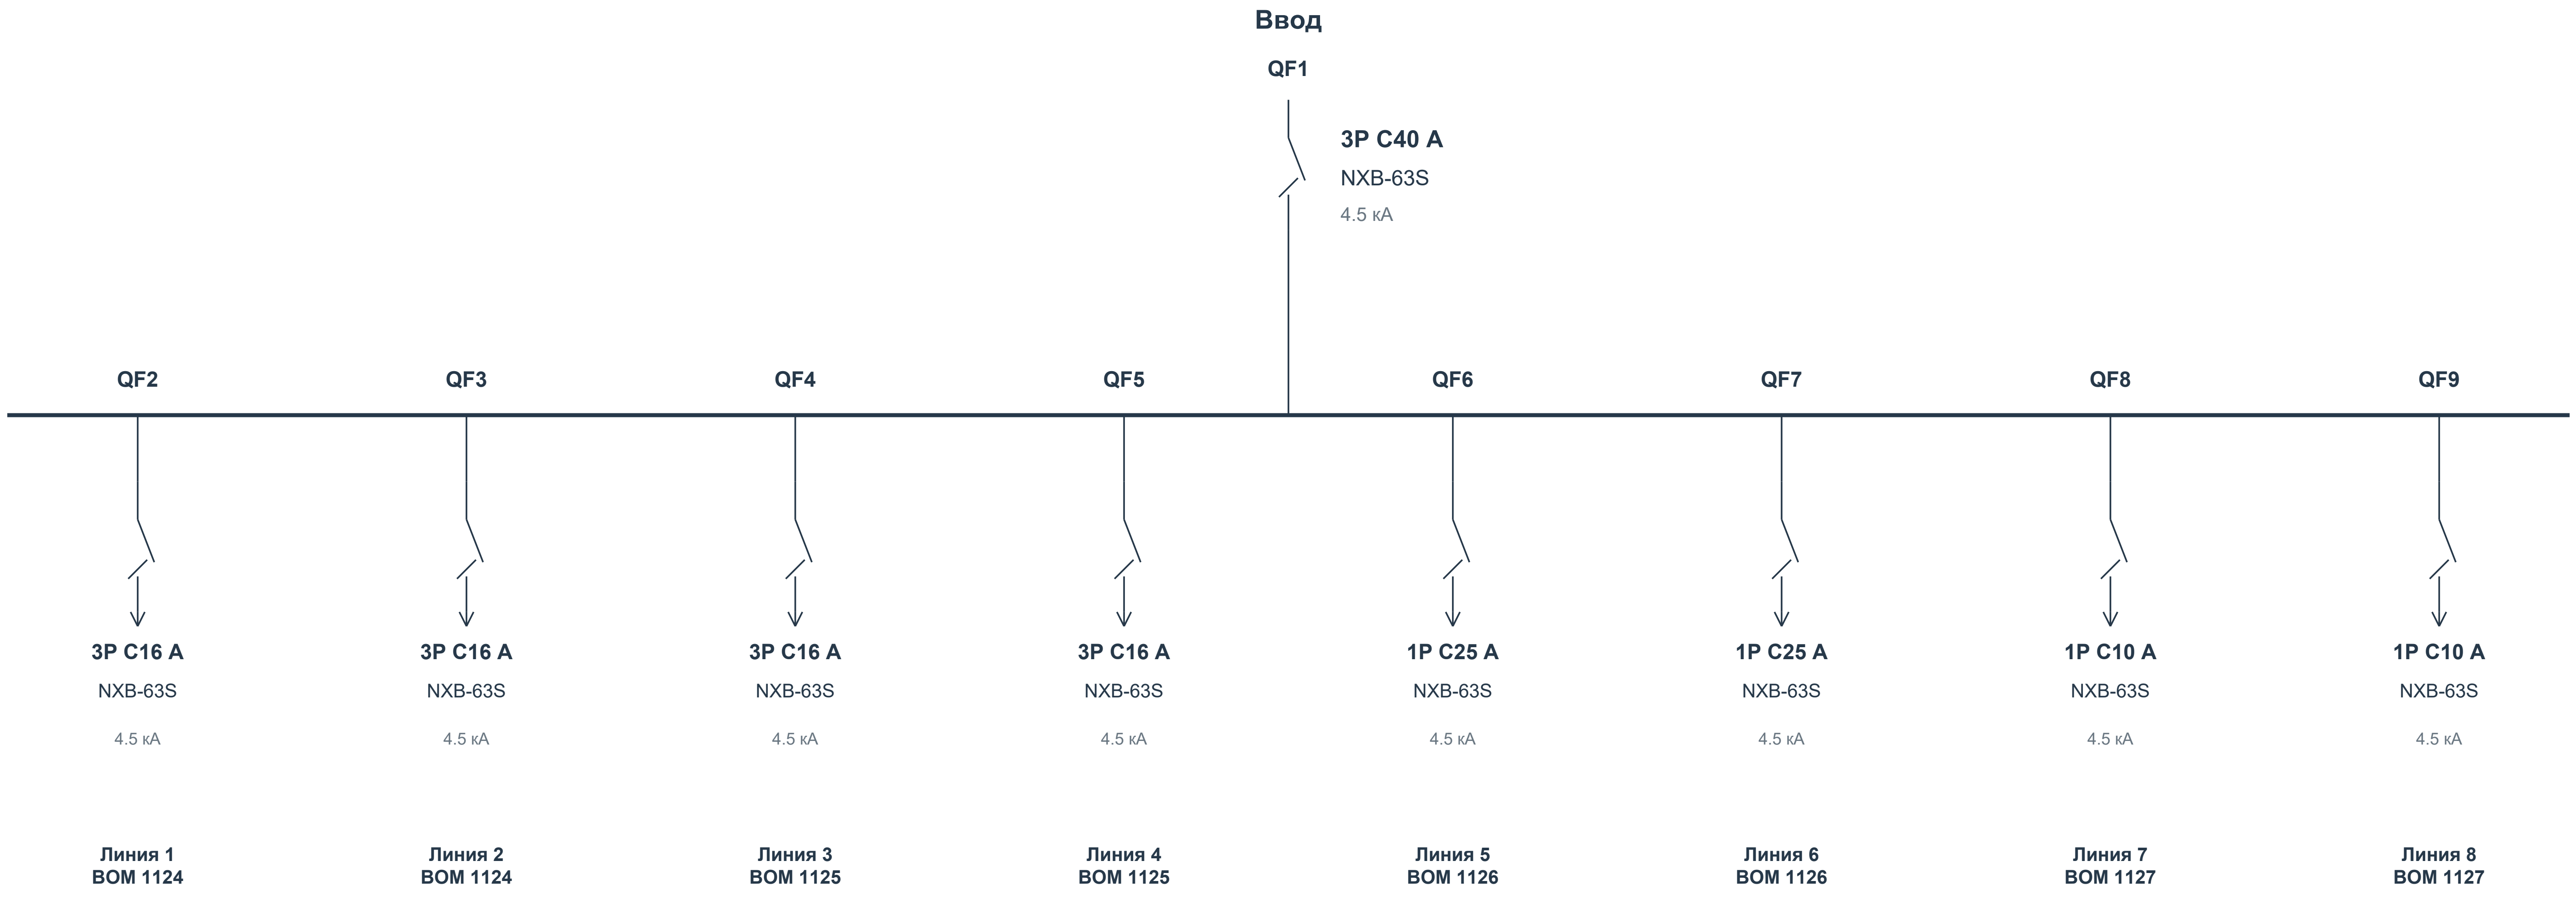
Ввод
QF1
3P C40 A
NXB-63S
4.5 кА
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
3P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
3P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1124
Линия 2
BOM 1124
Линия 3
BOM 1125
Линия 4
BOM 1125
Линия 5
BOM 1126
Линия 6
BOM 1126
Линия 7
BOM 1127
Линия 8
BOM 1127

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 30.8 кВт | Рр 21,5 кВт | Iр 33,4 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

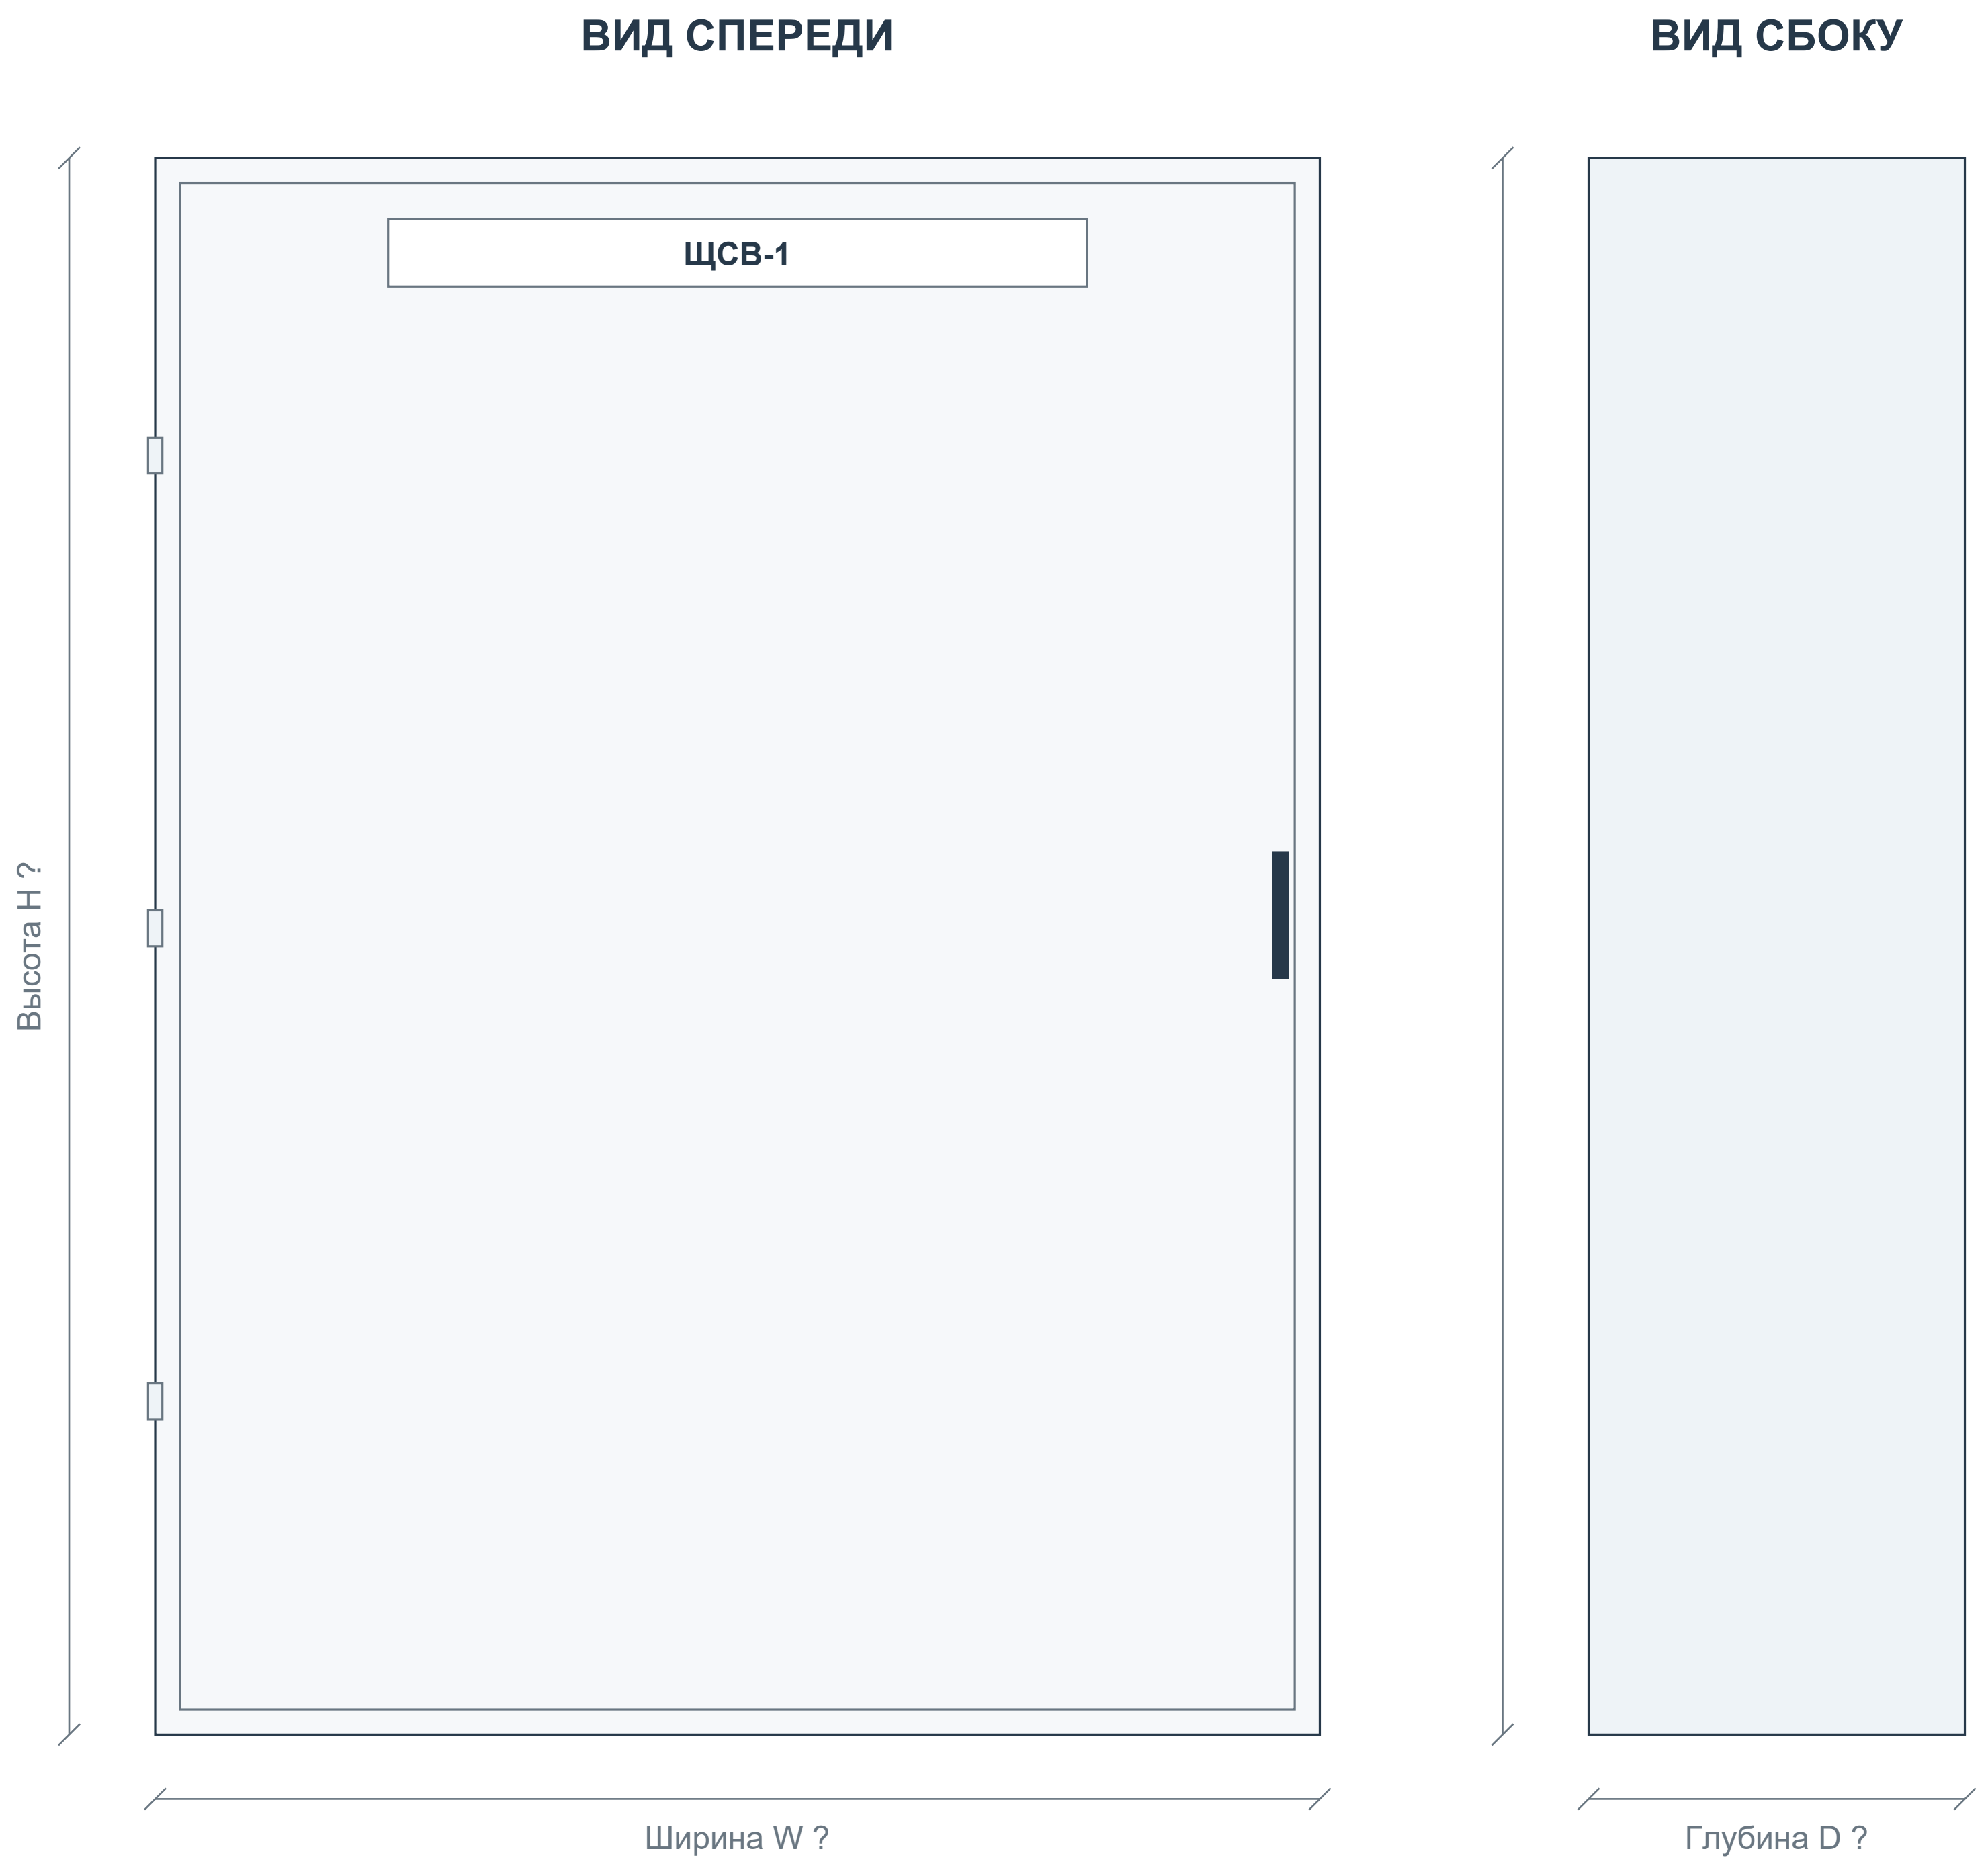

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

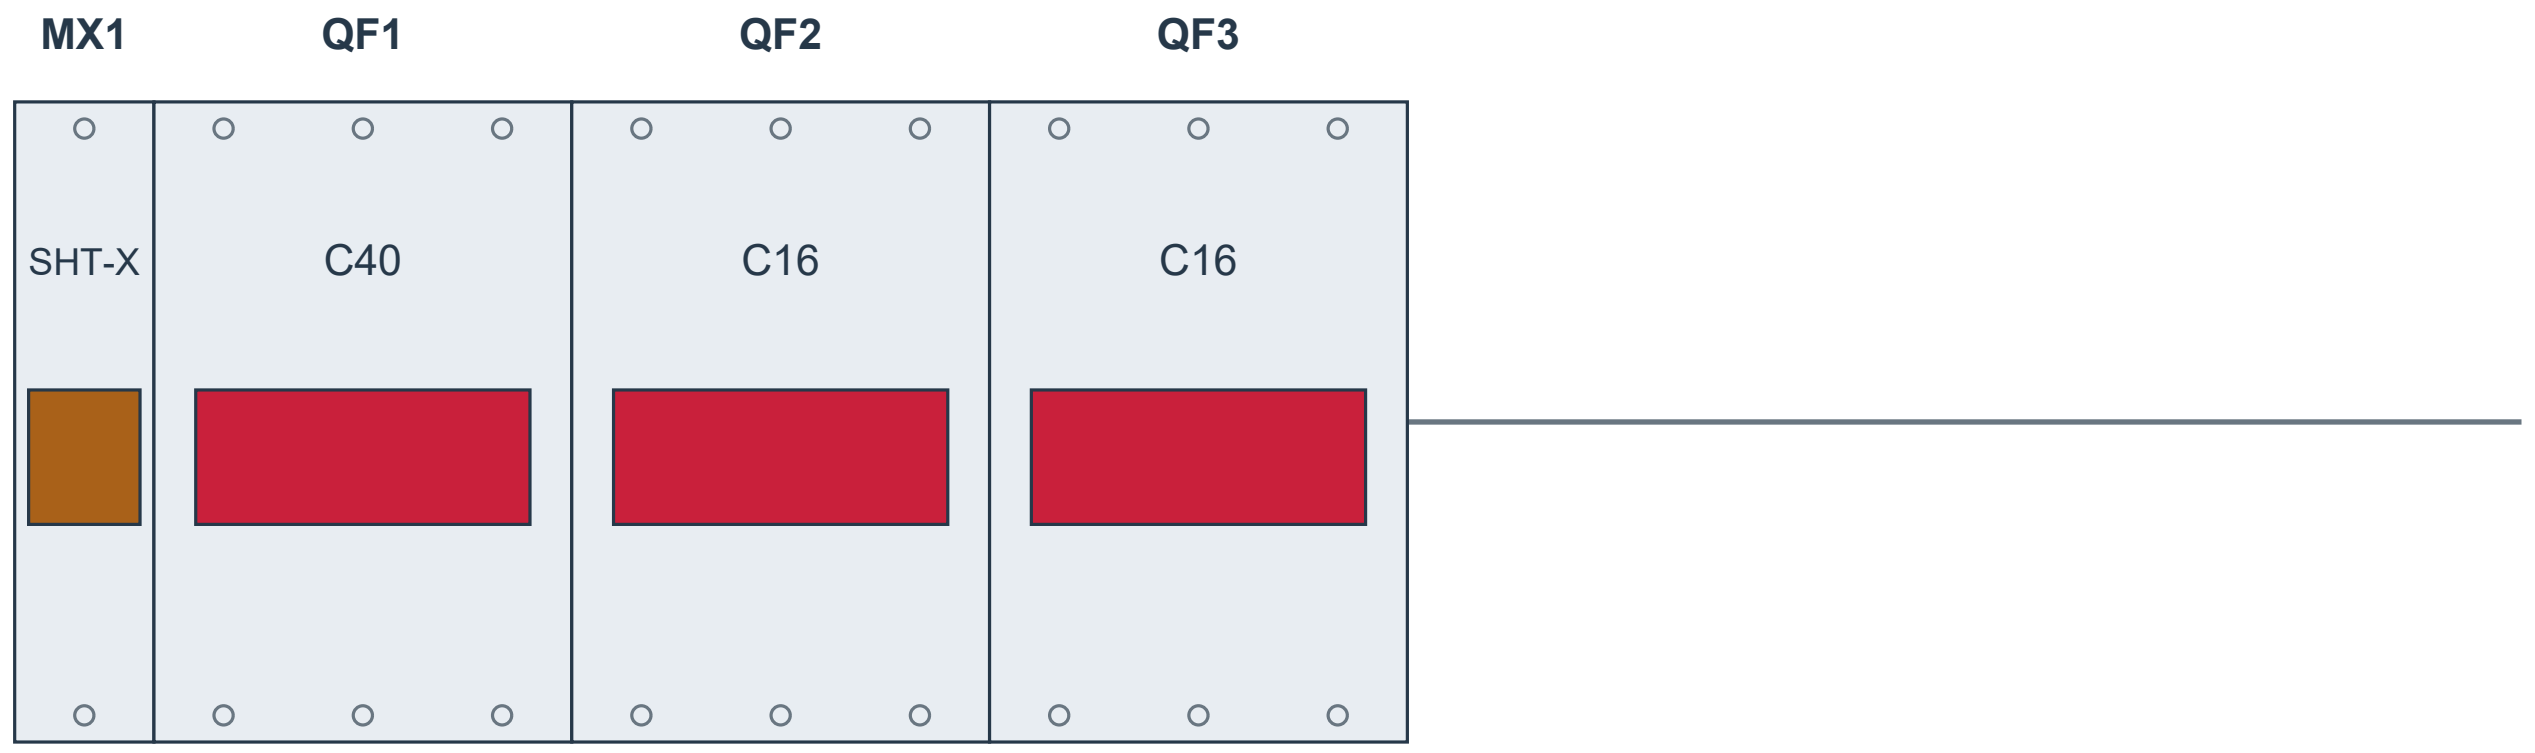

Сумма ширин: 180 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

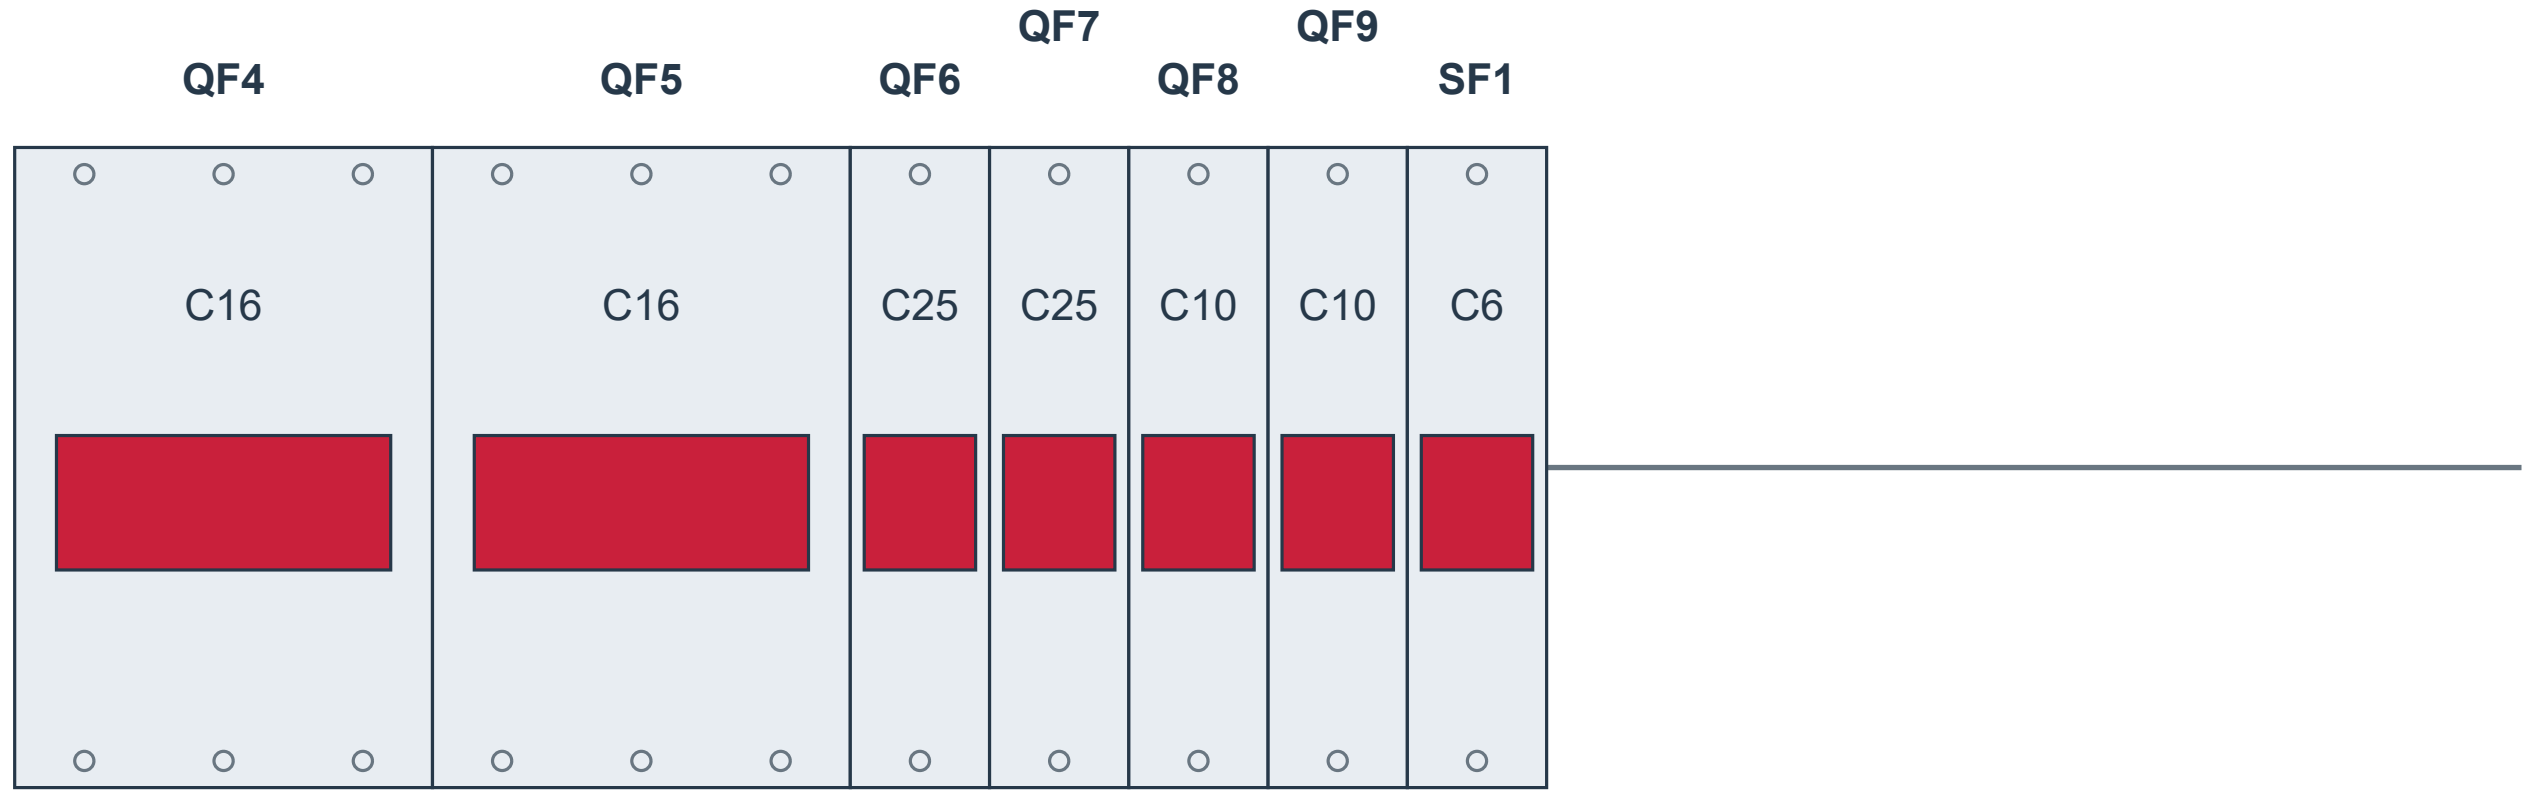

Сумма ширин: 198 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	1122	1	0	?	18 B
QF1	NXB-63S	1123	1	18	?	54 B
QF2 - QF3	NXB-63S	1124	1	72...126	?	54 B
QF4 - QF5	NXB-63S	1125	2	0...54	?	54 B
QF6 - QF7	NXB-63S	1126	2	108...126	?	18 B
QF8 - QF9	NXB-63S	1127	2	144...162	?	18 B
SF1	NXB-63S	1128	2	180	?	18 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Актуальная спецификация

ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1143 | ЭОМ, PDF стр. 64

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1144	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1145	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1146	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1147	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1148	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 64

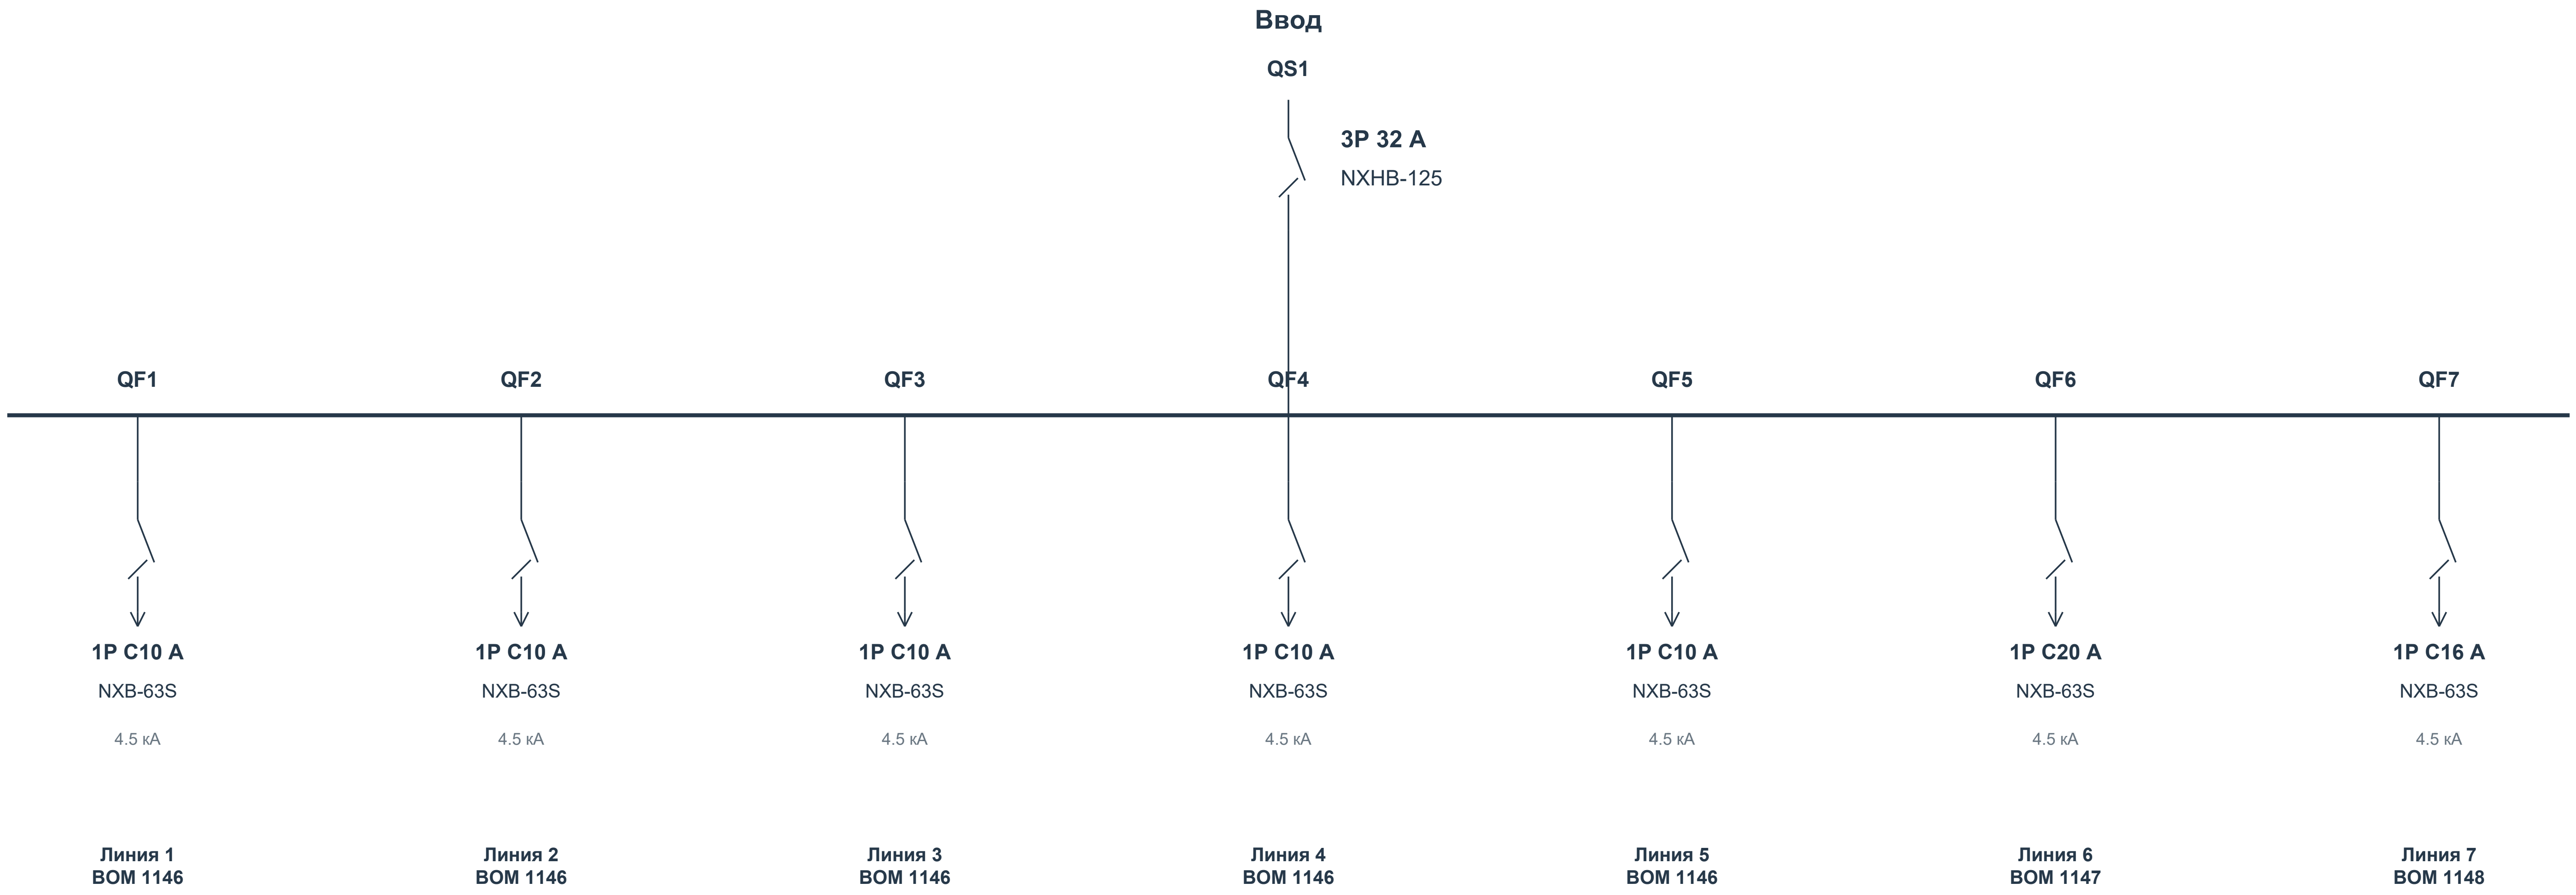
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1146
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 1146
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 1146
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 1146
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 1146
1P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 1147
1P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 1148

Данные исходного проекта: Ру 3.22 кВт | Рр 3,22 кВт | Ip 7,5 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

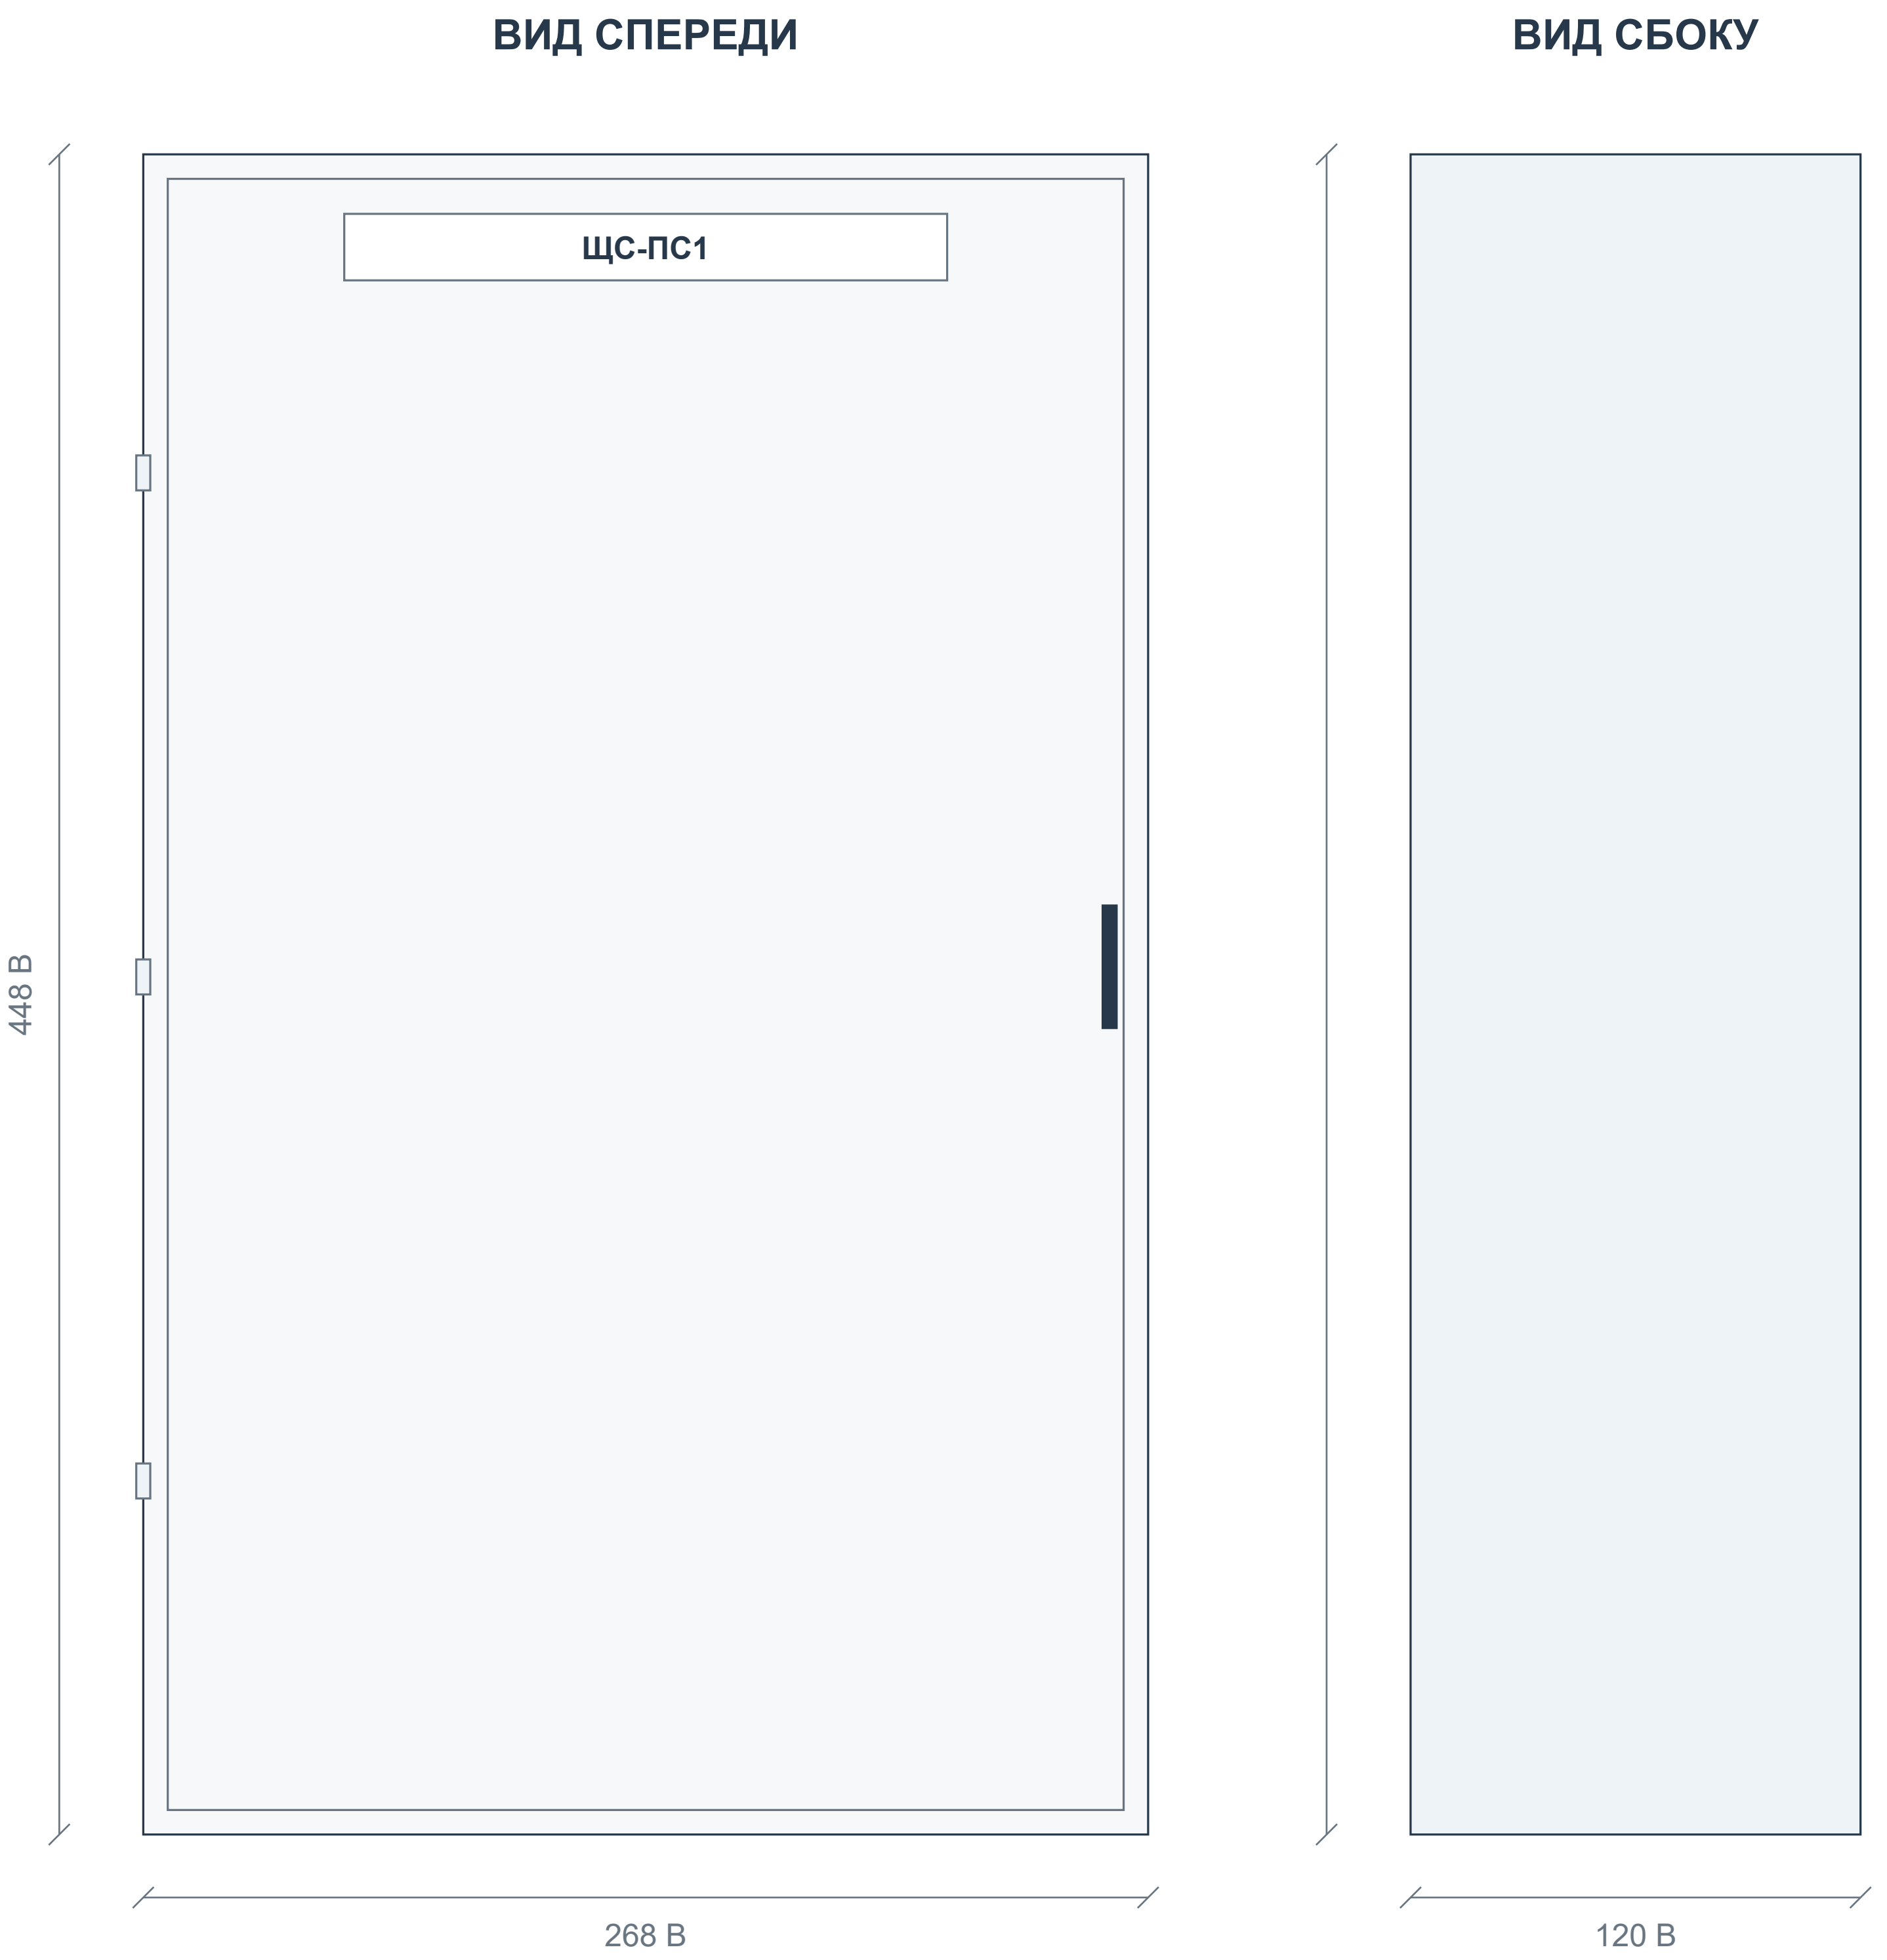

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

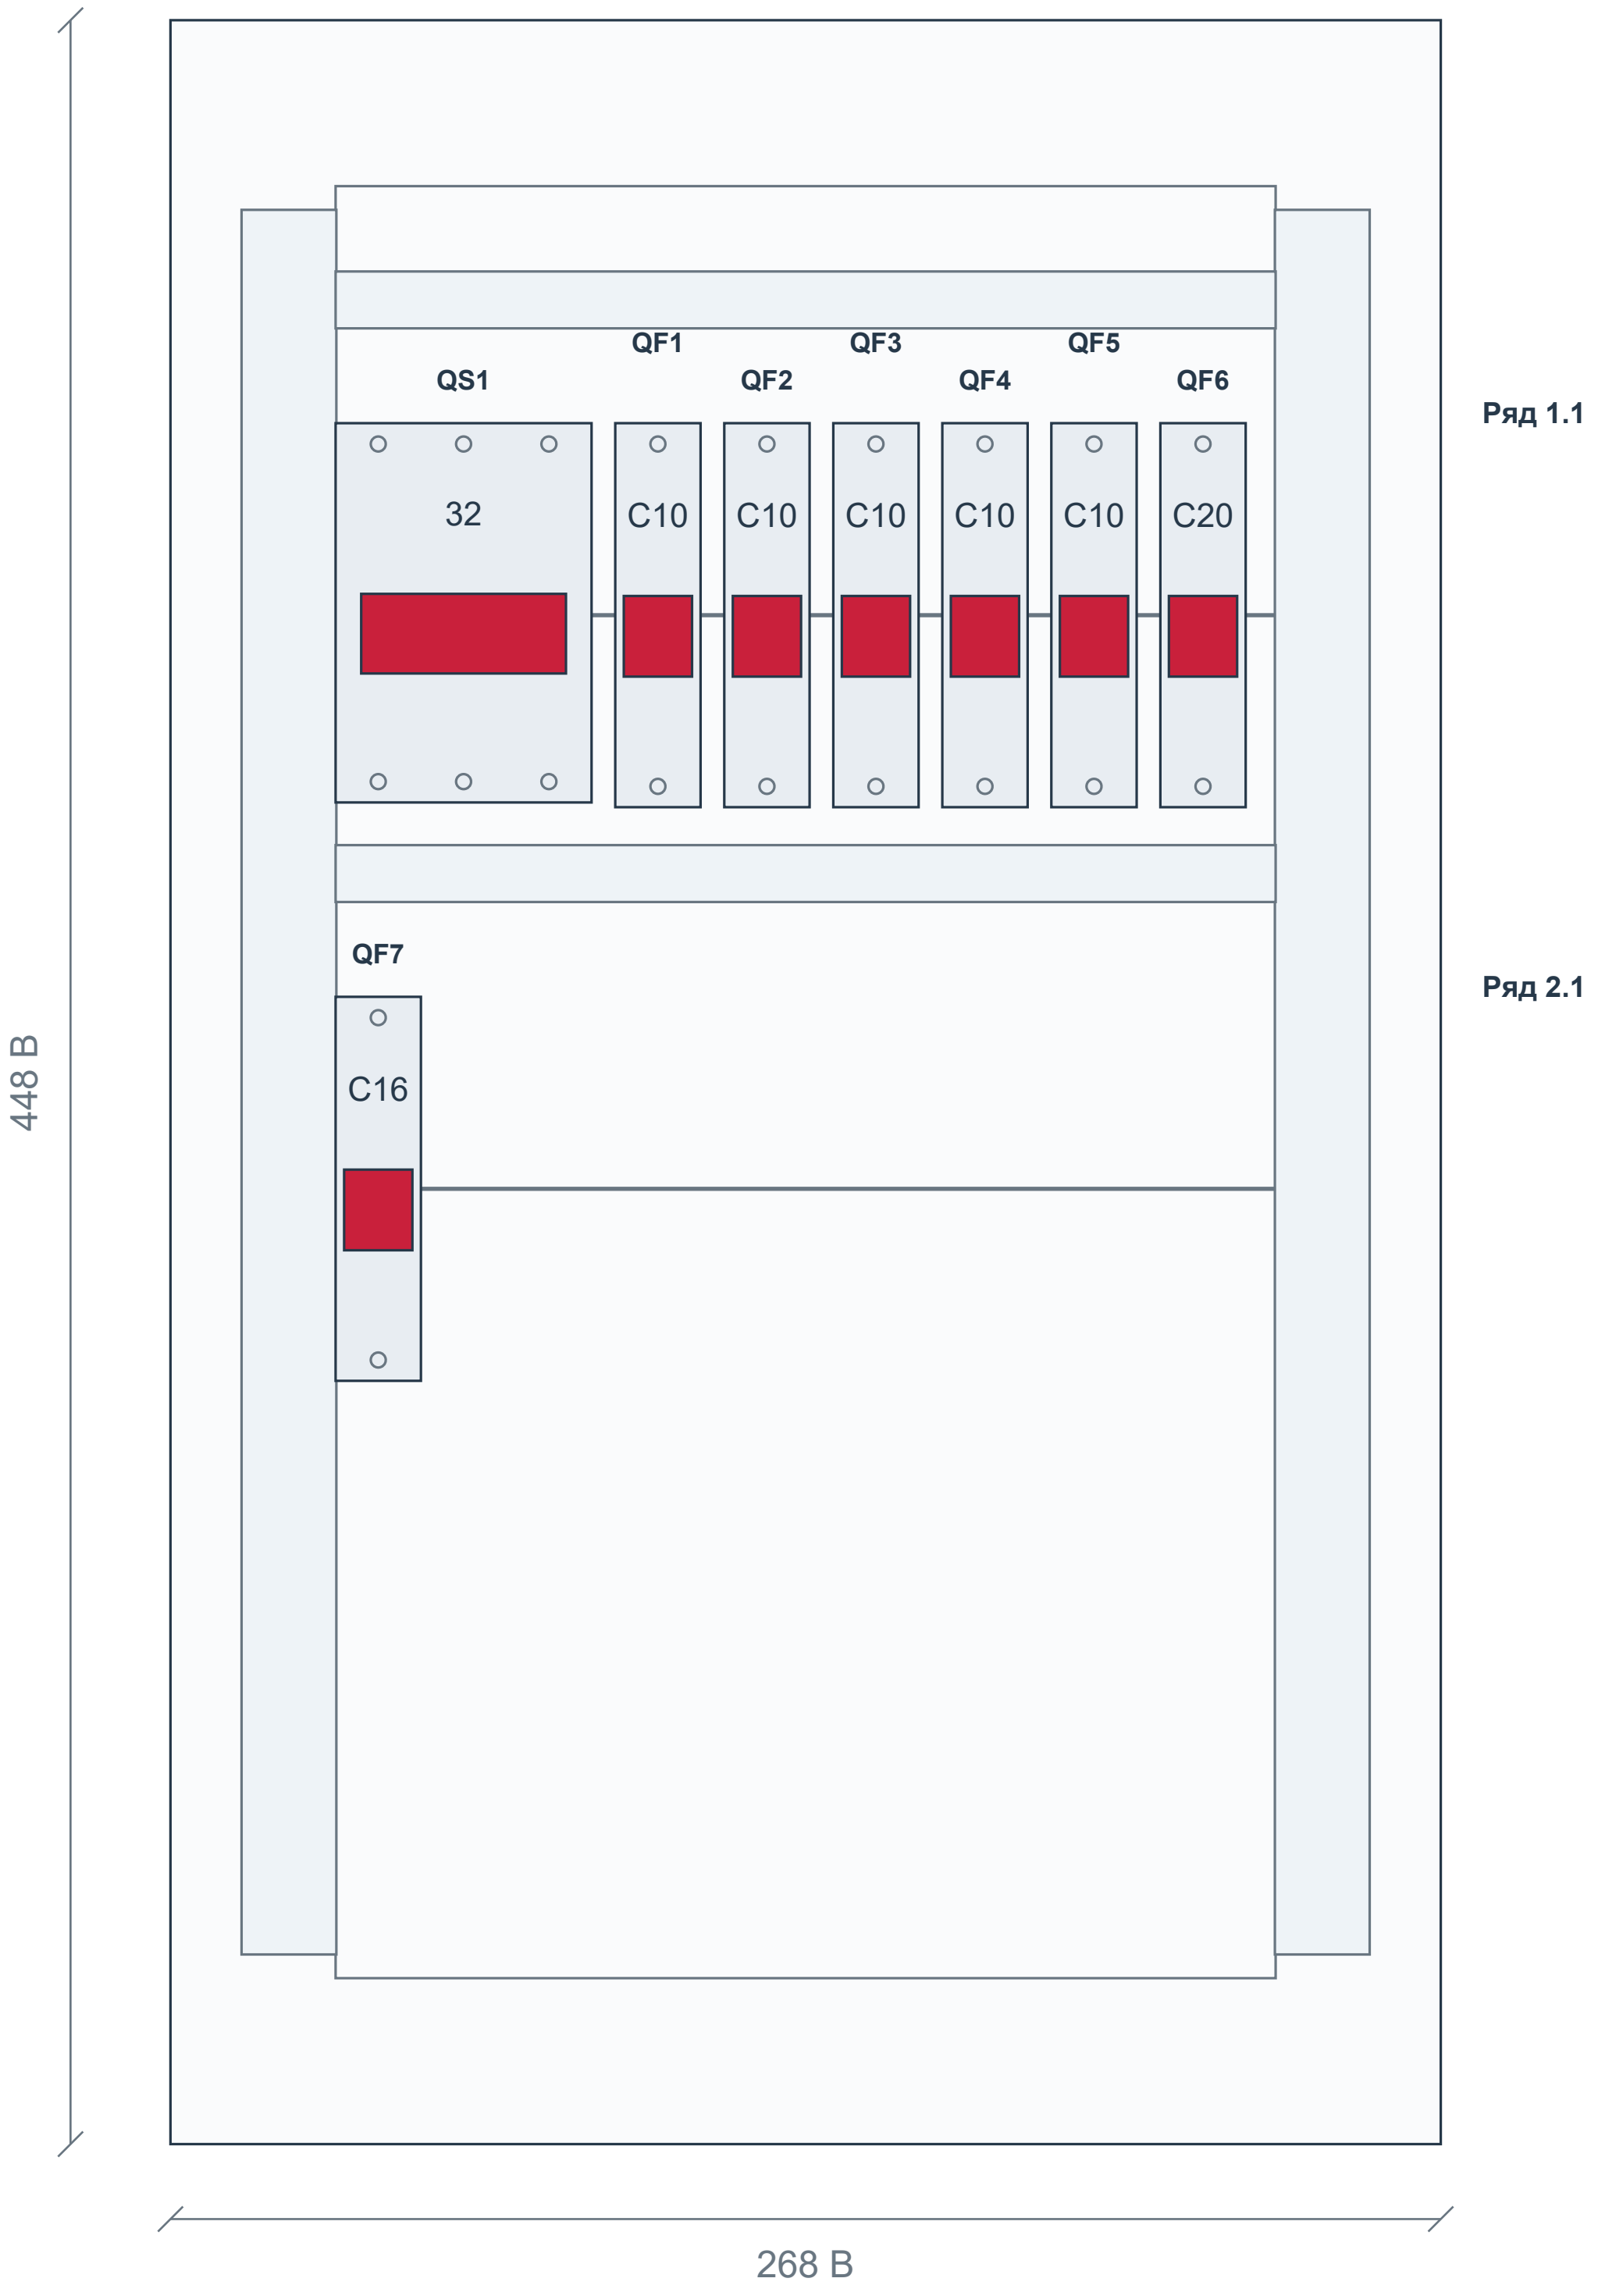

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	1145	1.1	34.84	85	54 × 80
QF1 - QF5	NXB-63S	1146	1.1	93.84...185.84	85	18 × 81
QF6	NXB-63S	1147	1.1	208.84	85	18 × 81
QF7	NXB-63S	1148	2.1	34.84	206	18 × 81

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Актуальная спецификация

ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1162 | ЭОМ, PDF стр. 65

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1163	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1164	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1165	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1166	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1167	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 65

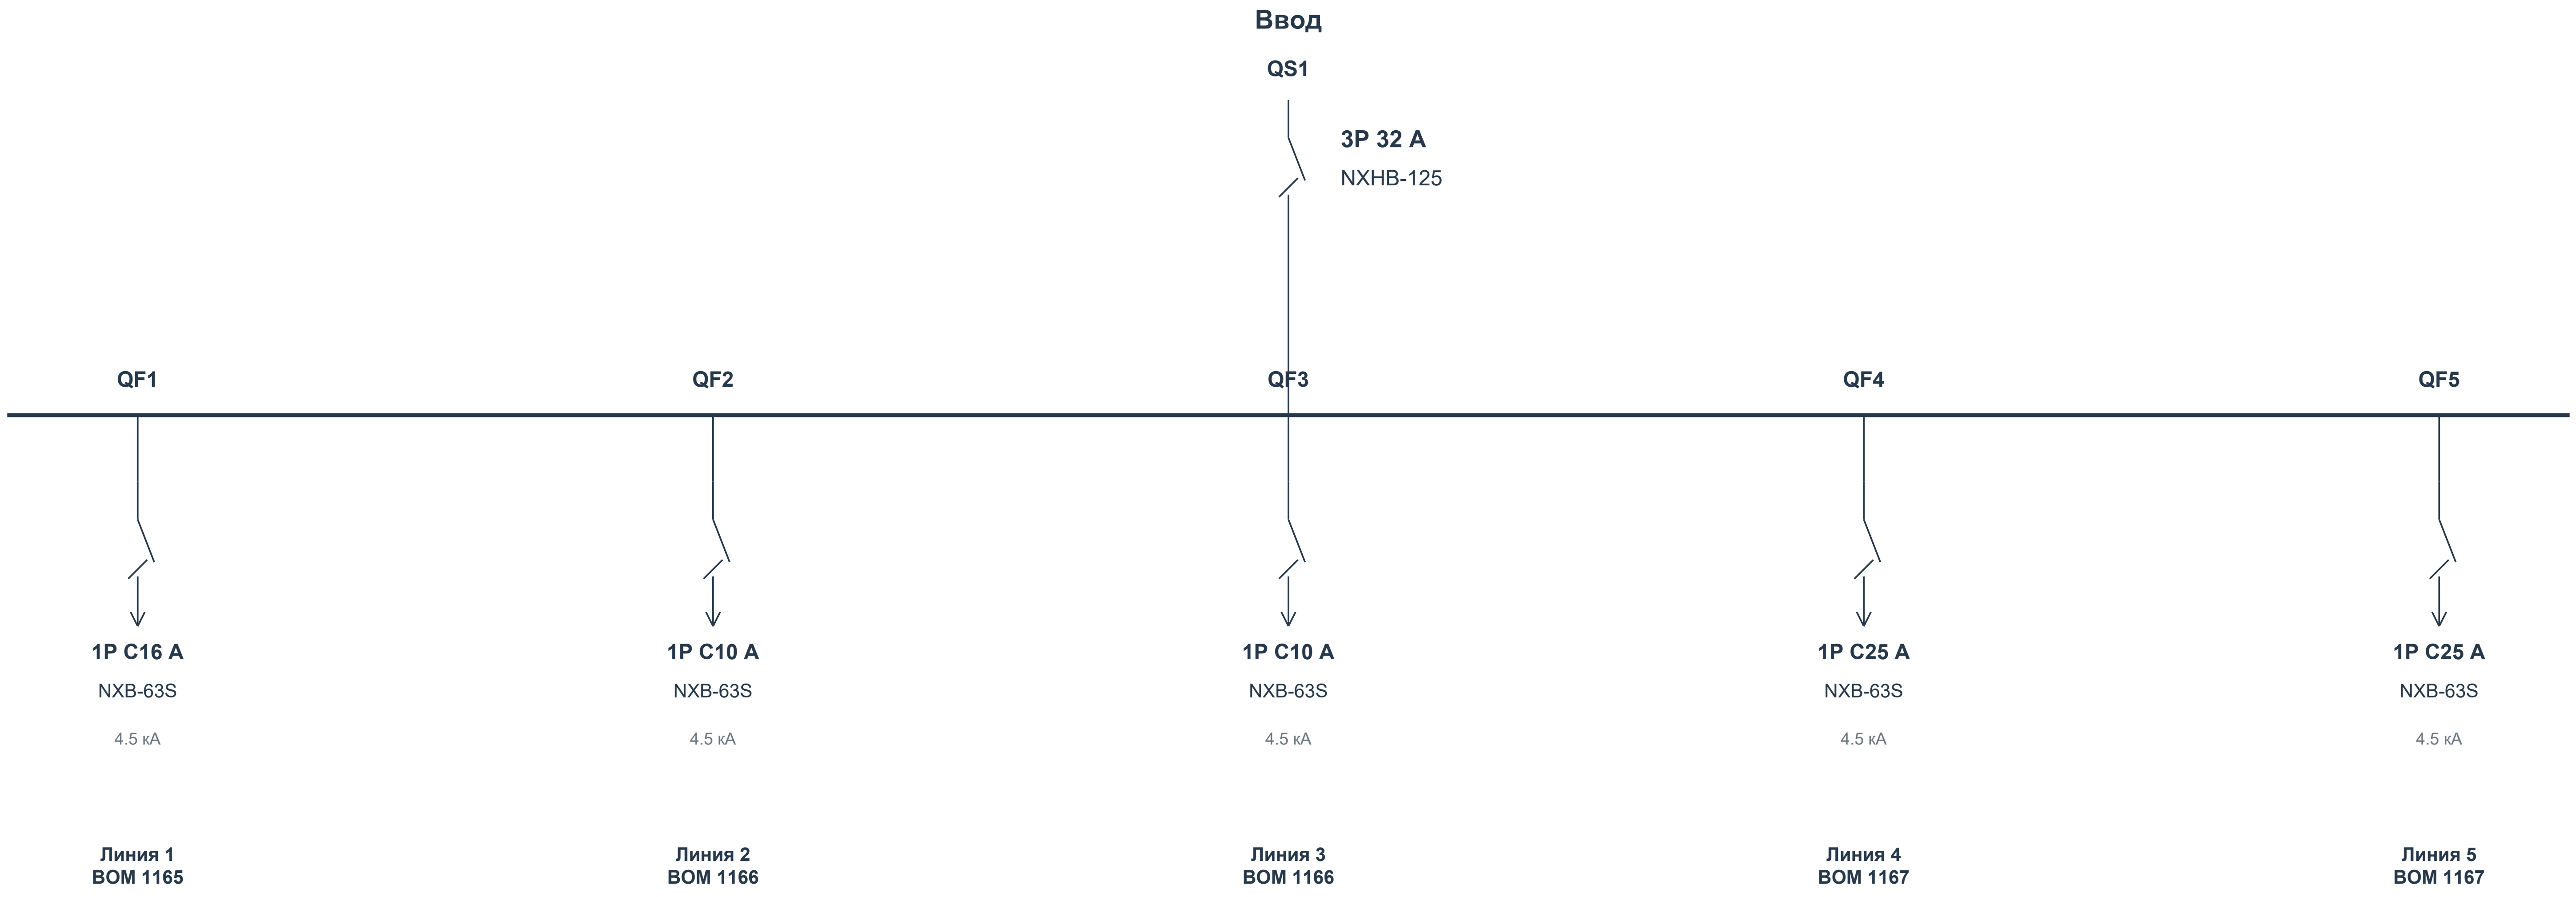
Ввод
QS1
3P 32 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
1P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C25 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1165
Линия 2
BOM 1166
Линия 3
BOM 1166
Линия 4
BOM 1167
Линия 5
BOM 1167

Данные исходного проекта: Py 11.8 кВт | Pp 11,8 кВт | Ip 18,9 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

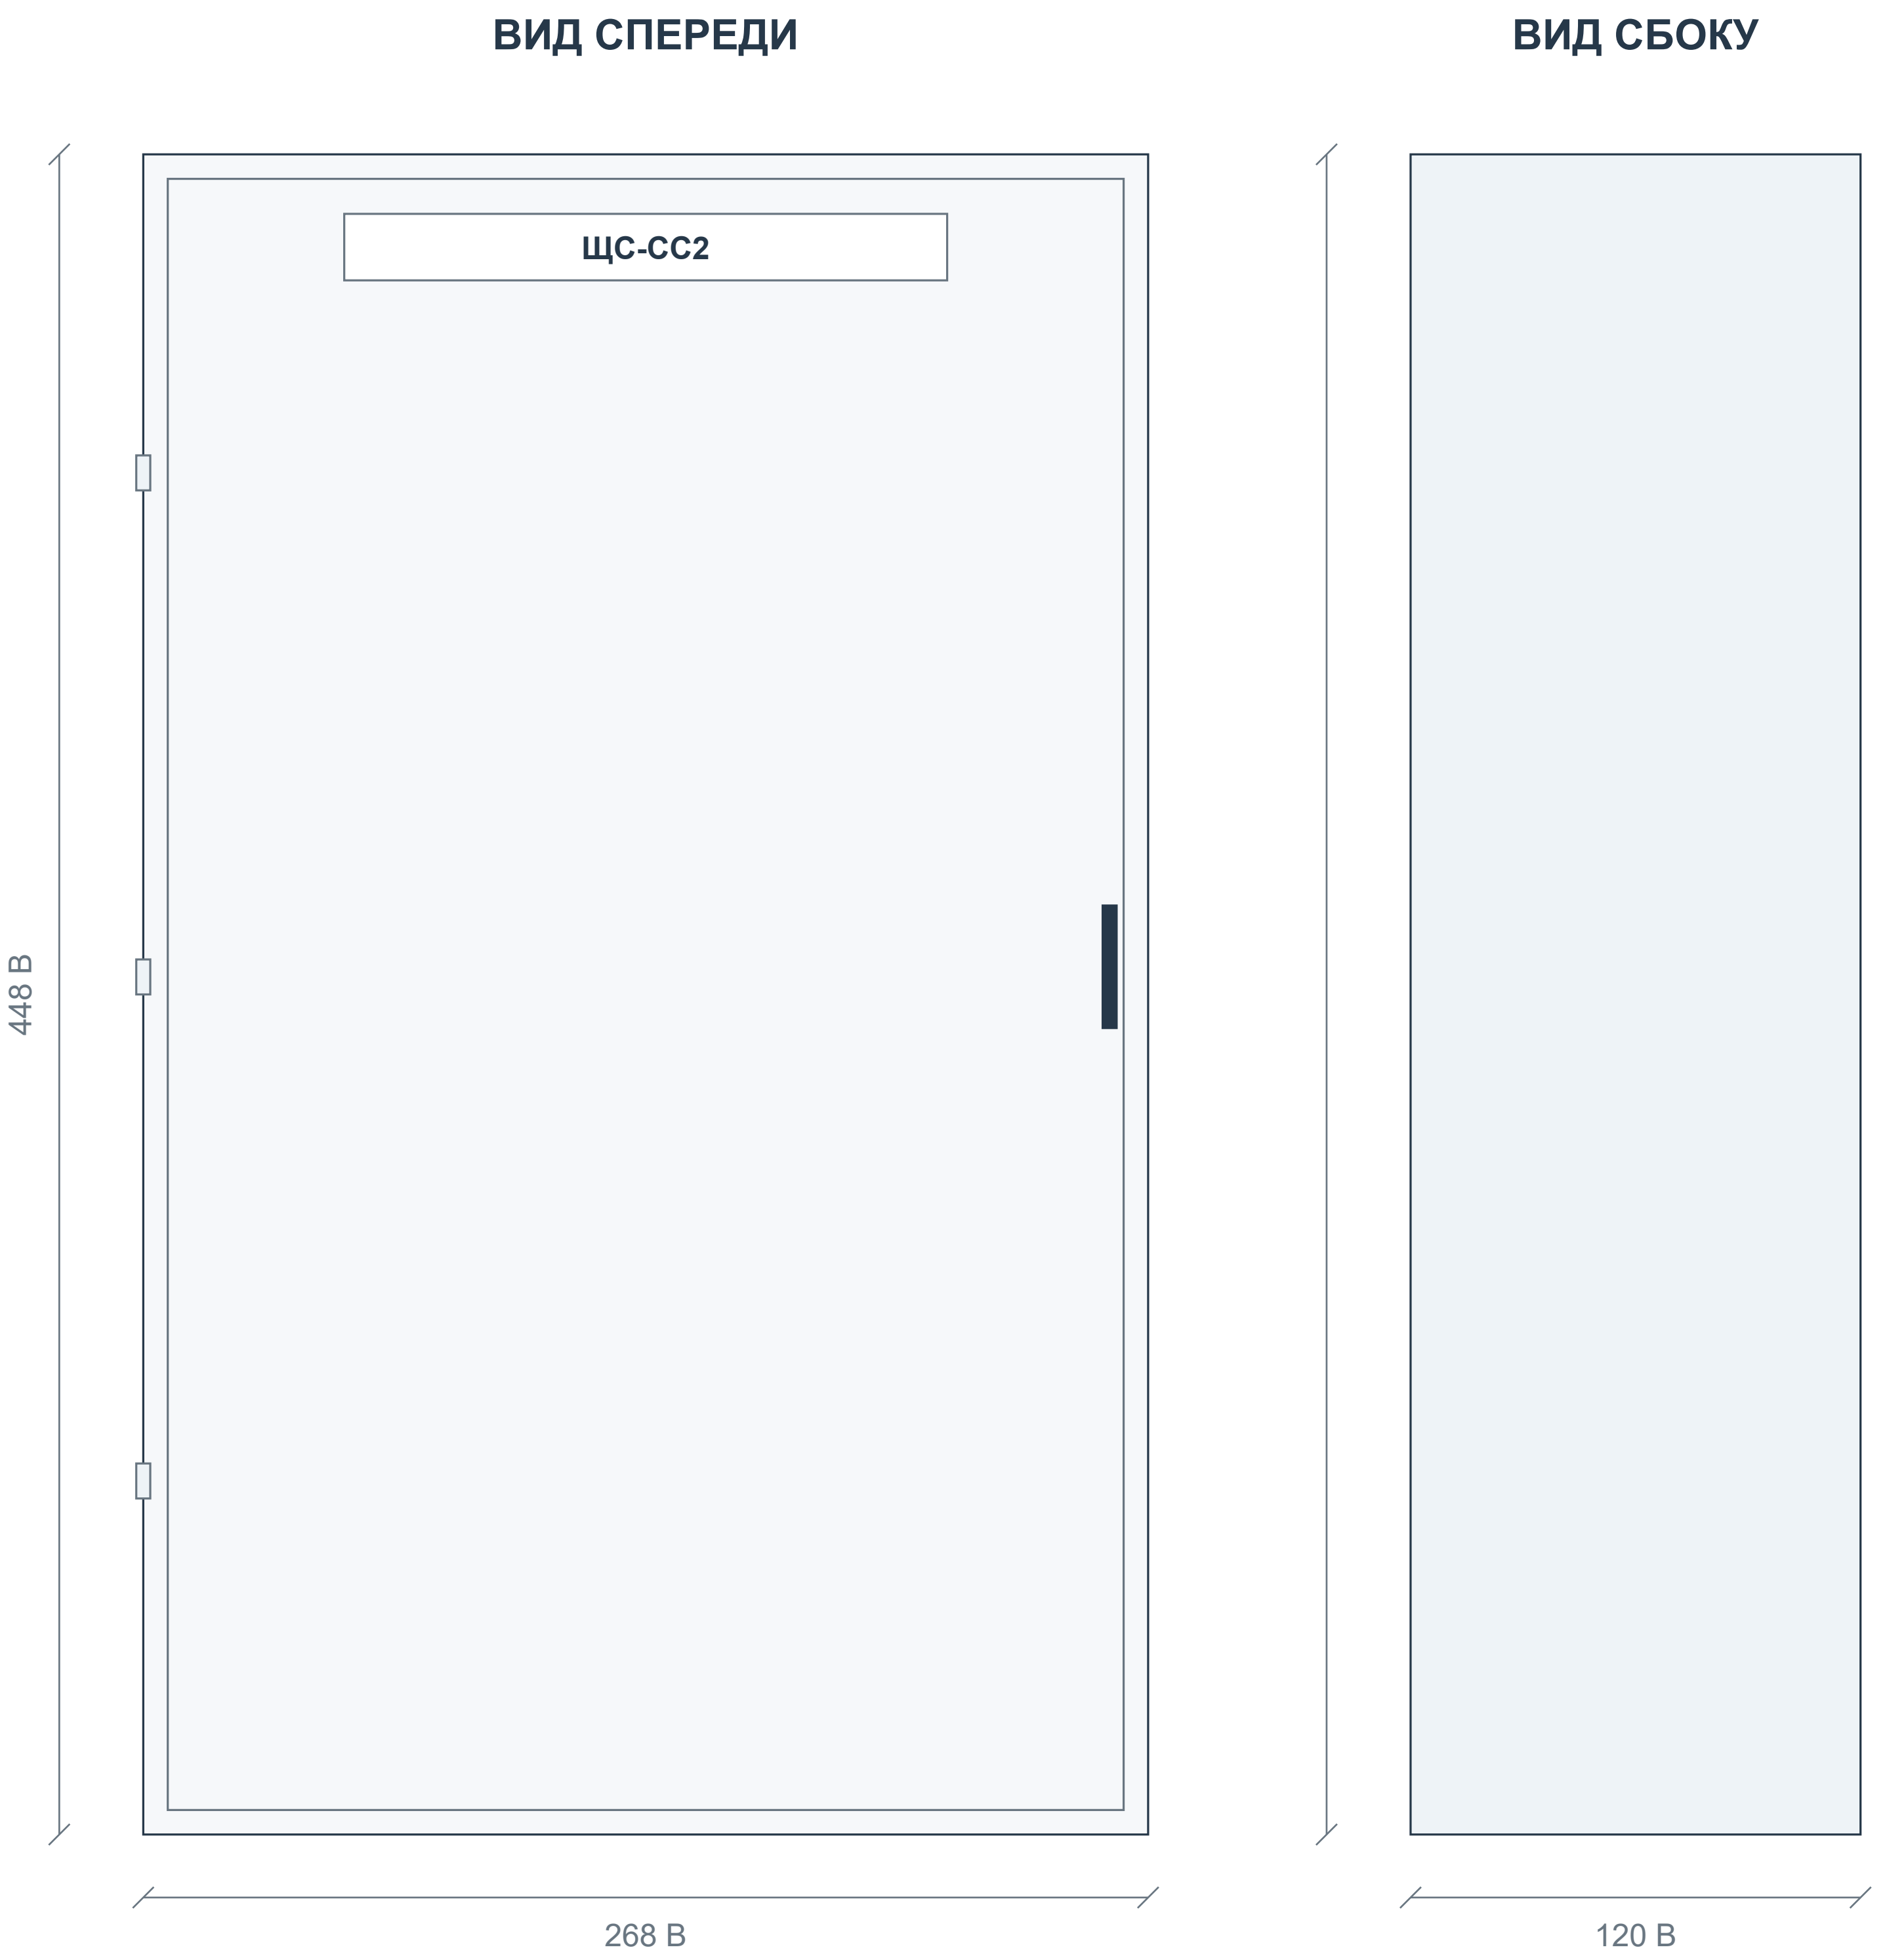

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

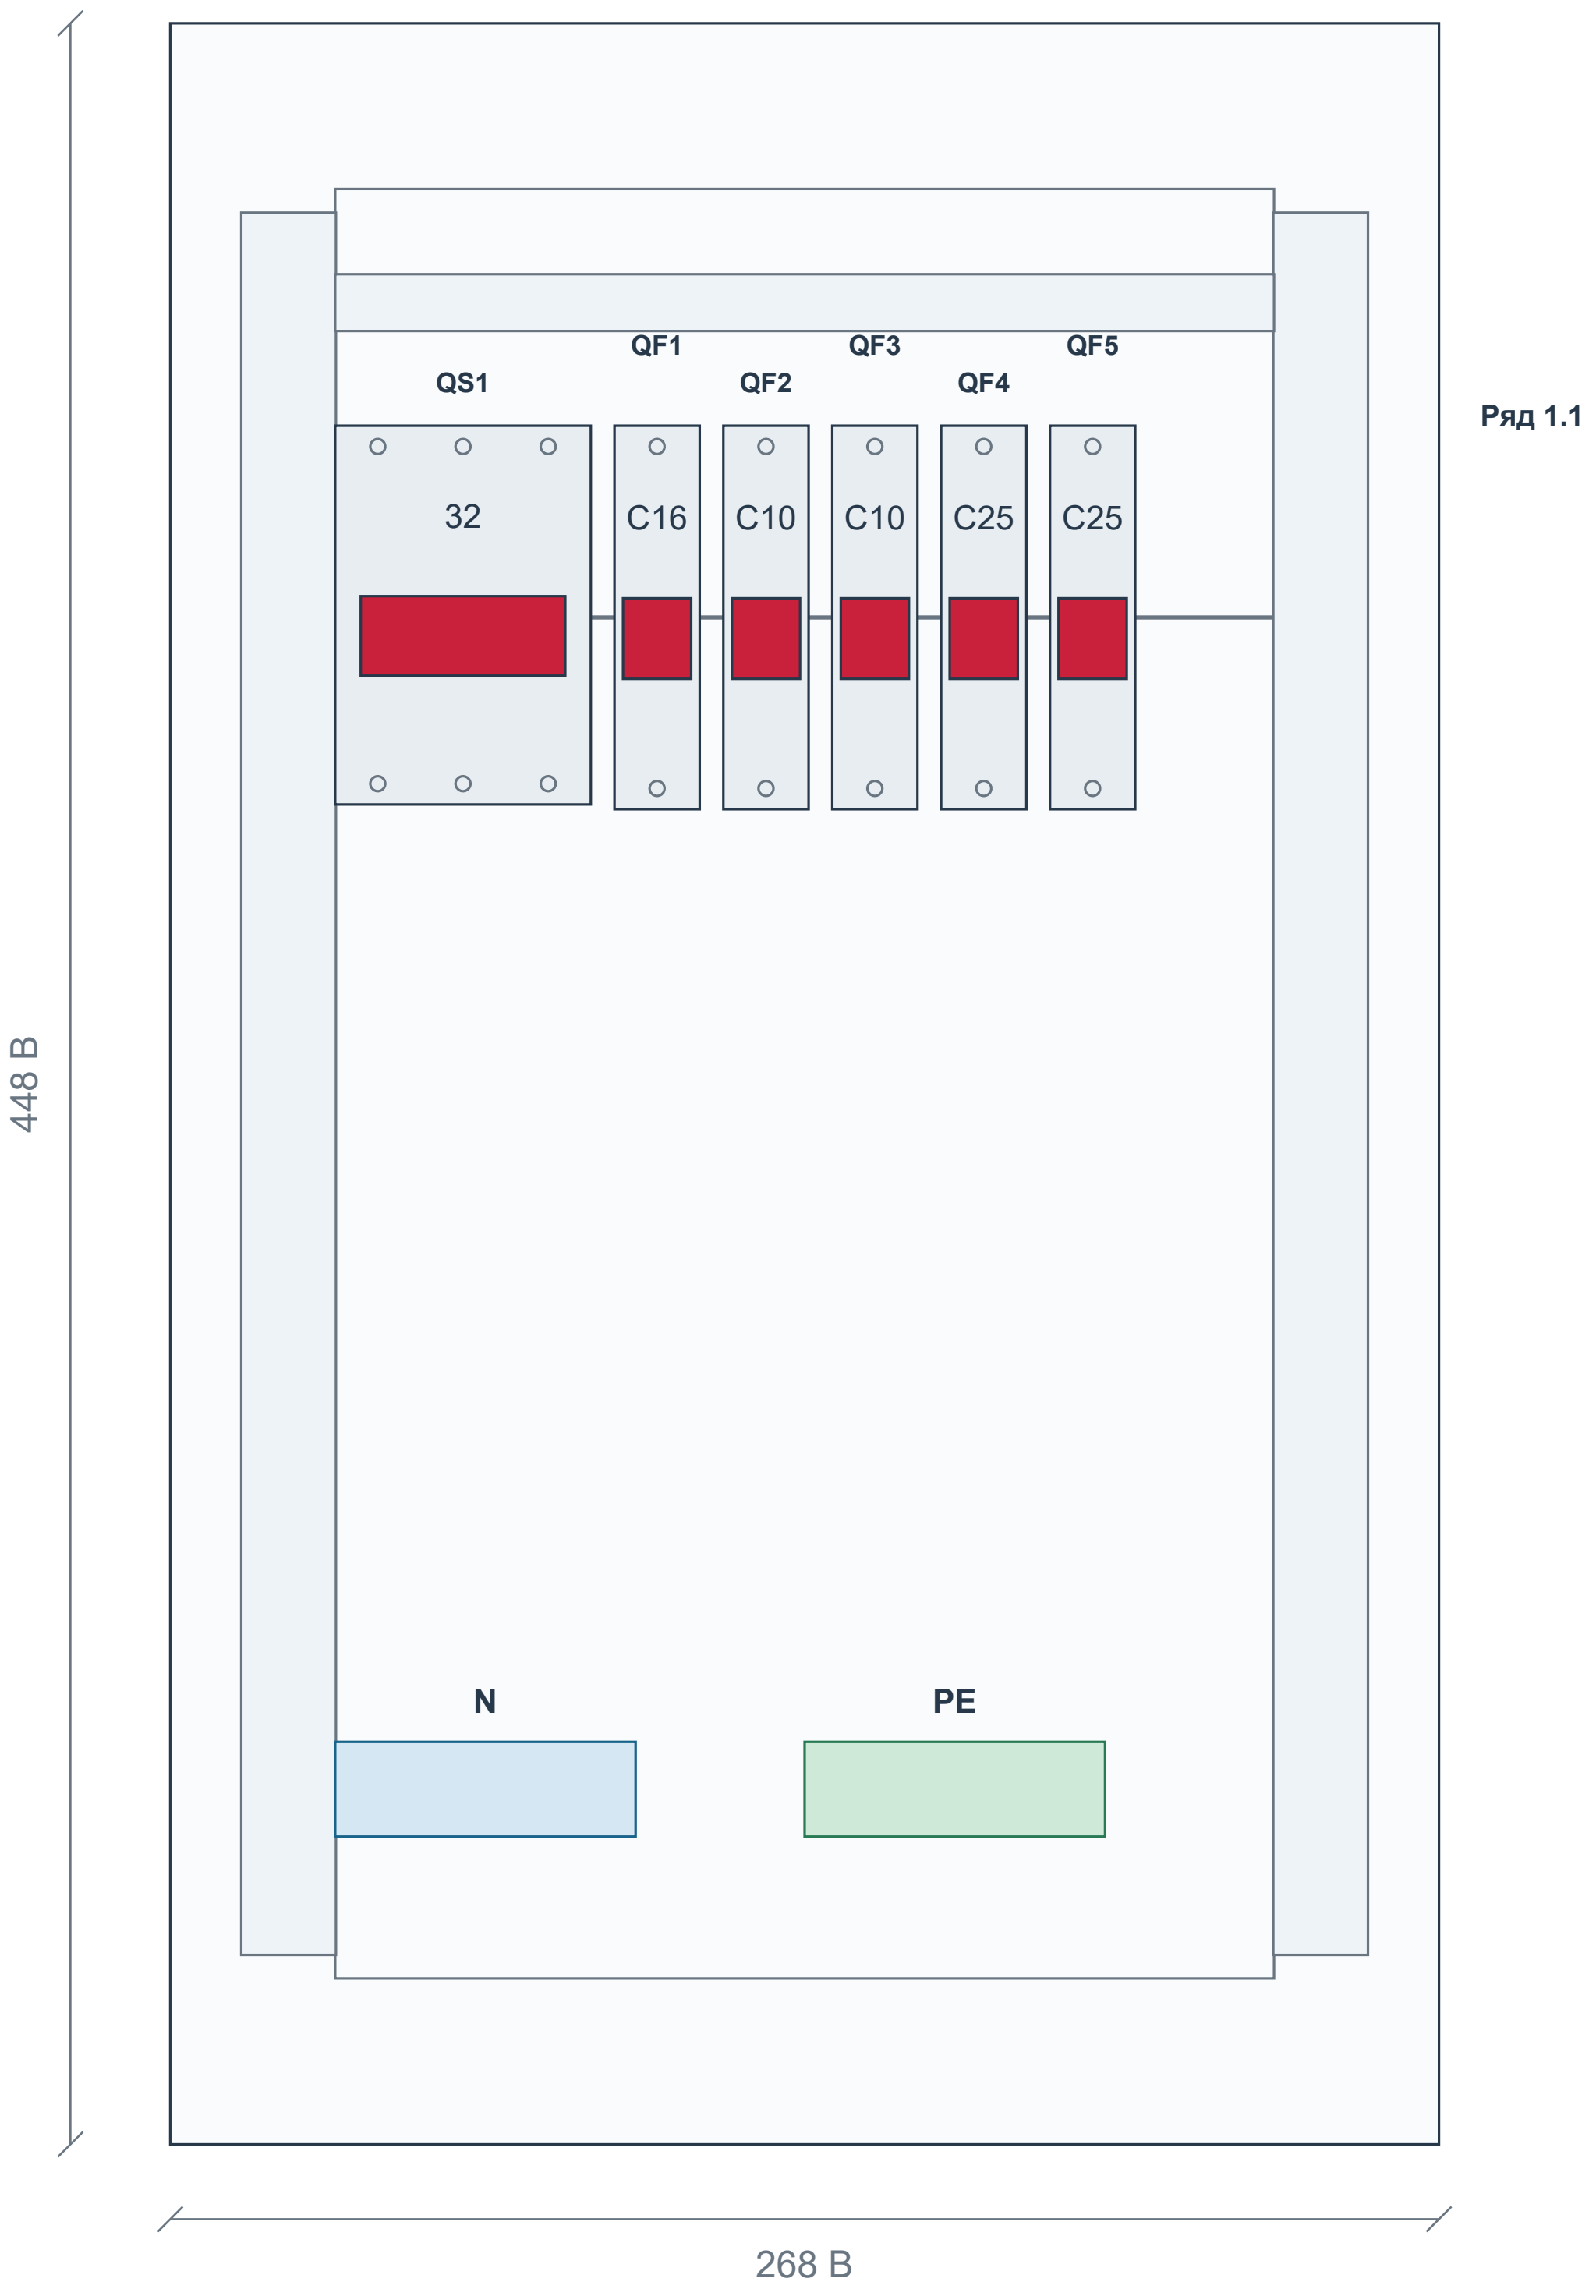

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	1164	1.1	34.84	85	54 × 80
QF1	NXB-63S	1165	1.1	93.84	85	18 × 81
QF2 - QF3	NXB-63S	1166	1.1	116.84...139.84	85	18 × 81
QF4 - QF5	NXB-63S	1167	1.1	162.84...185.84	85	18 × 81

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Актуальная спецификация

ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1179 | ЭОМ, PDF стр. 66

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1180	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1181	193166	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1182	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 66

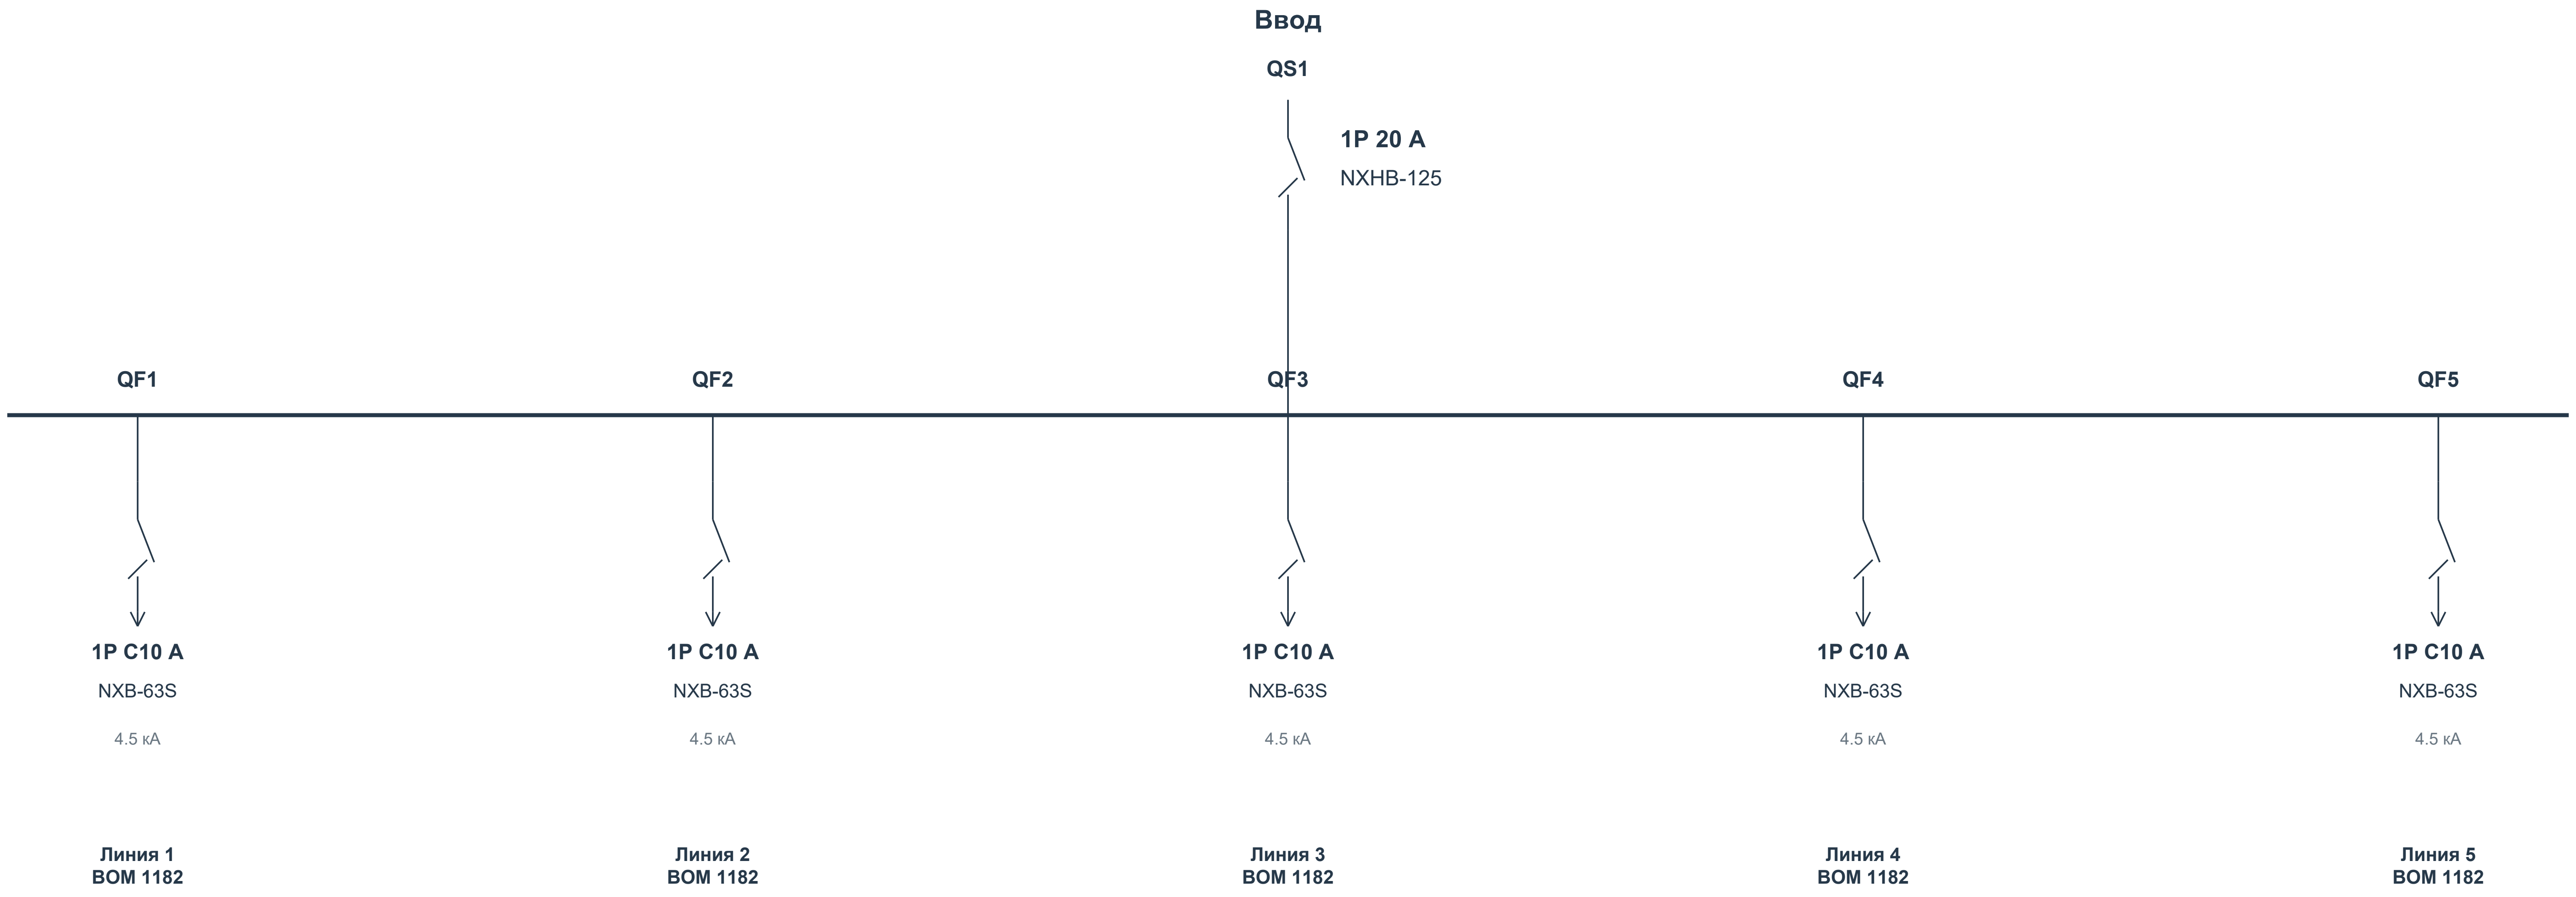
Ввод
QS1
1P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1182
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 1182
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 1182
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 1182
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 1182

Данные исходного проекта: Ру 0.344 кВт | Рр 0,344 кВт | Iр 2,4 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

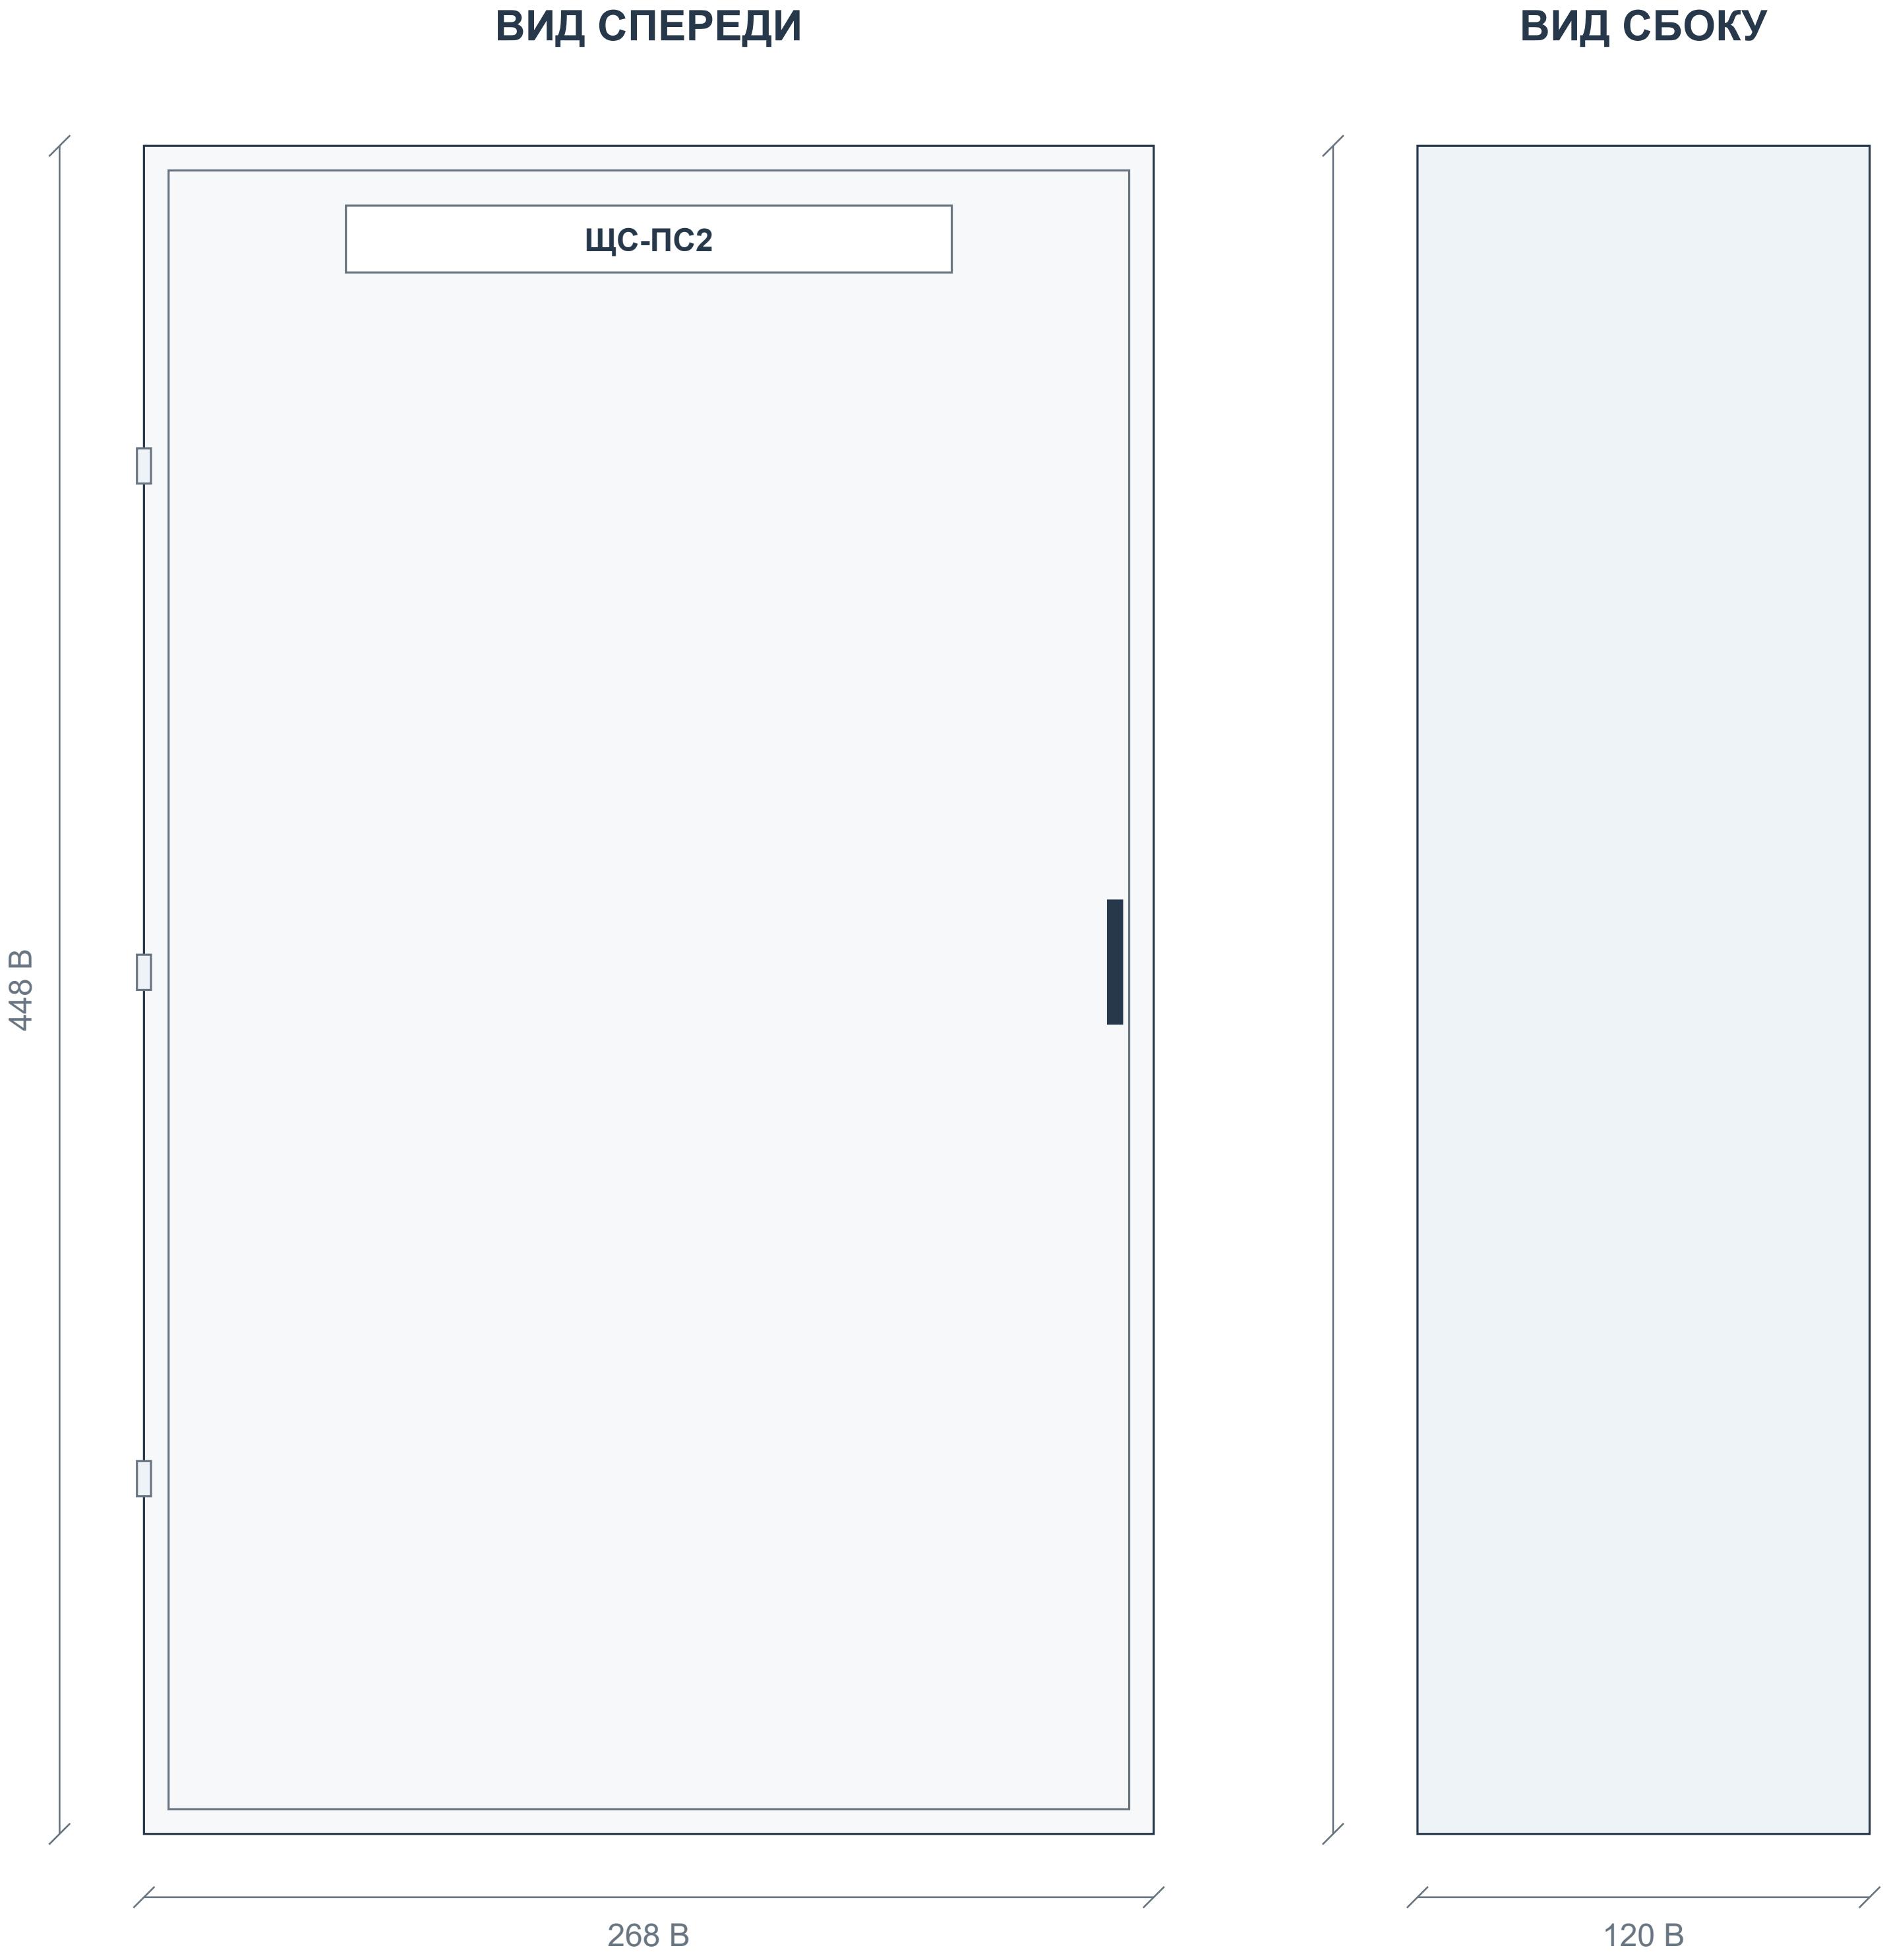

Корпус: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

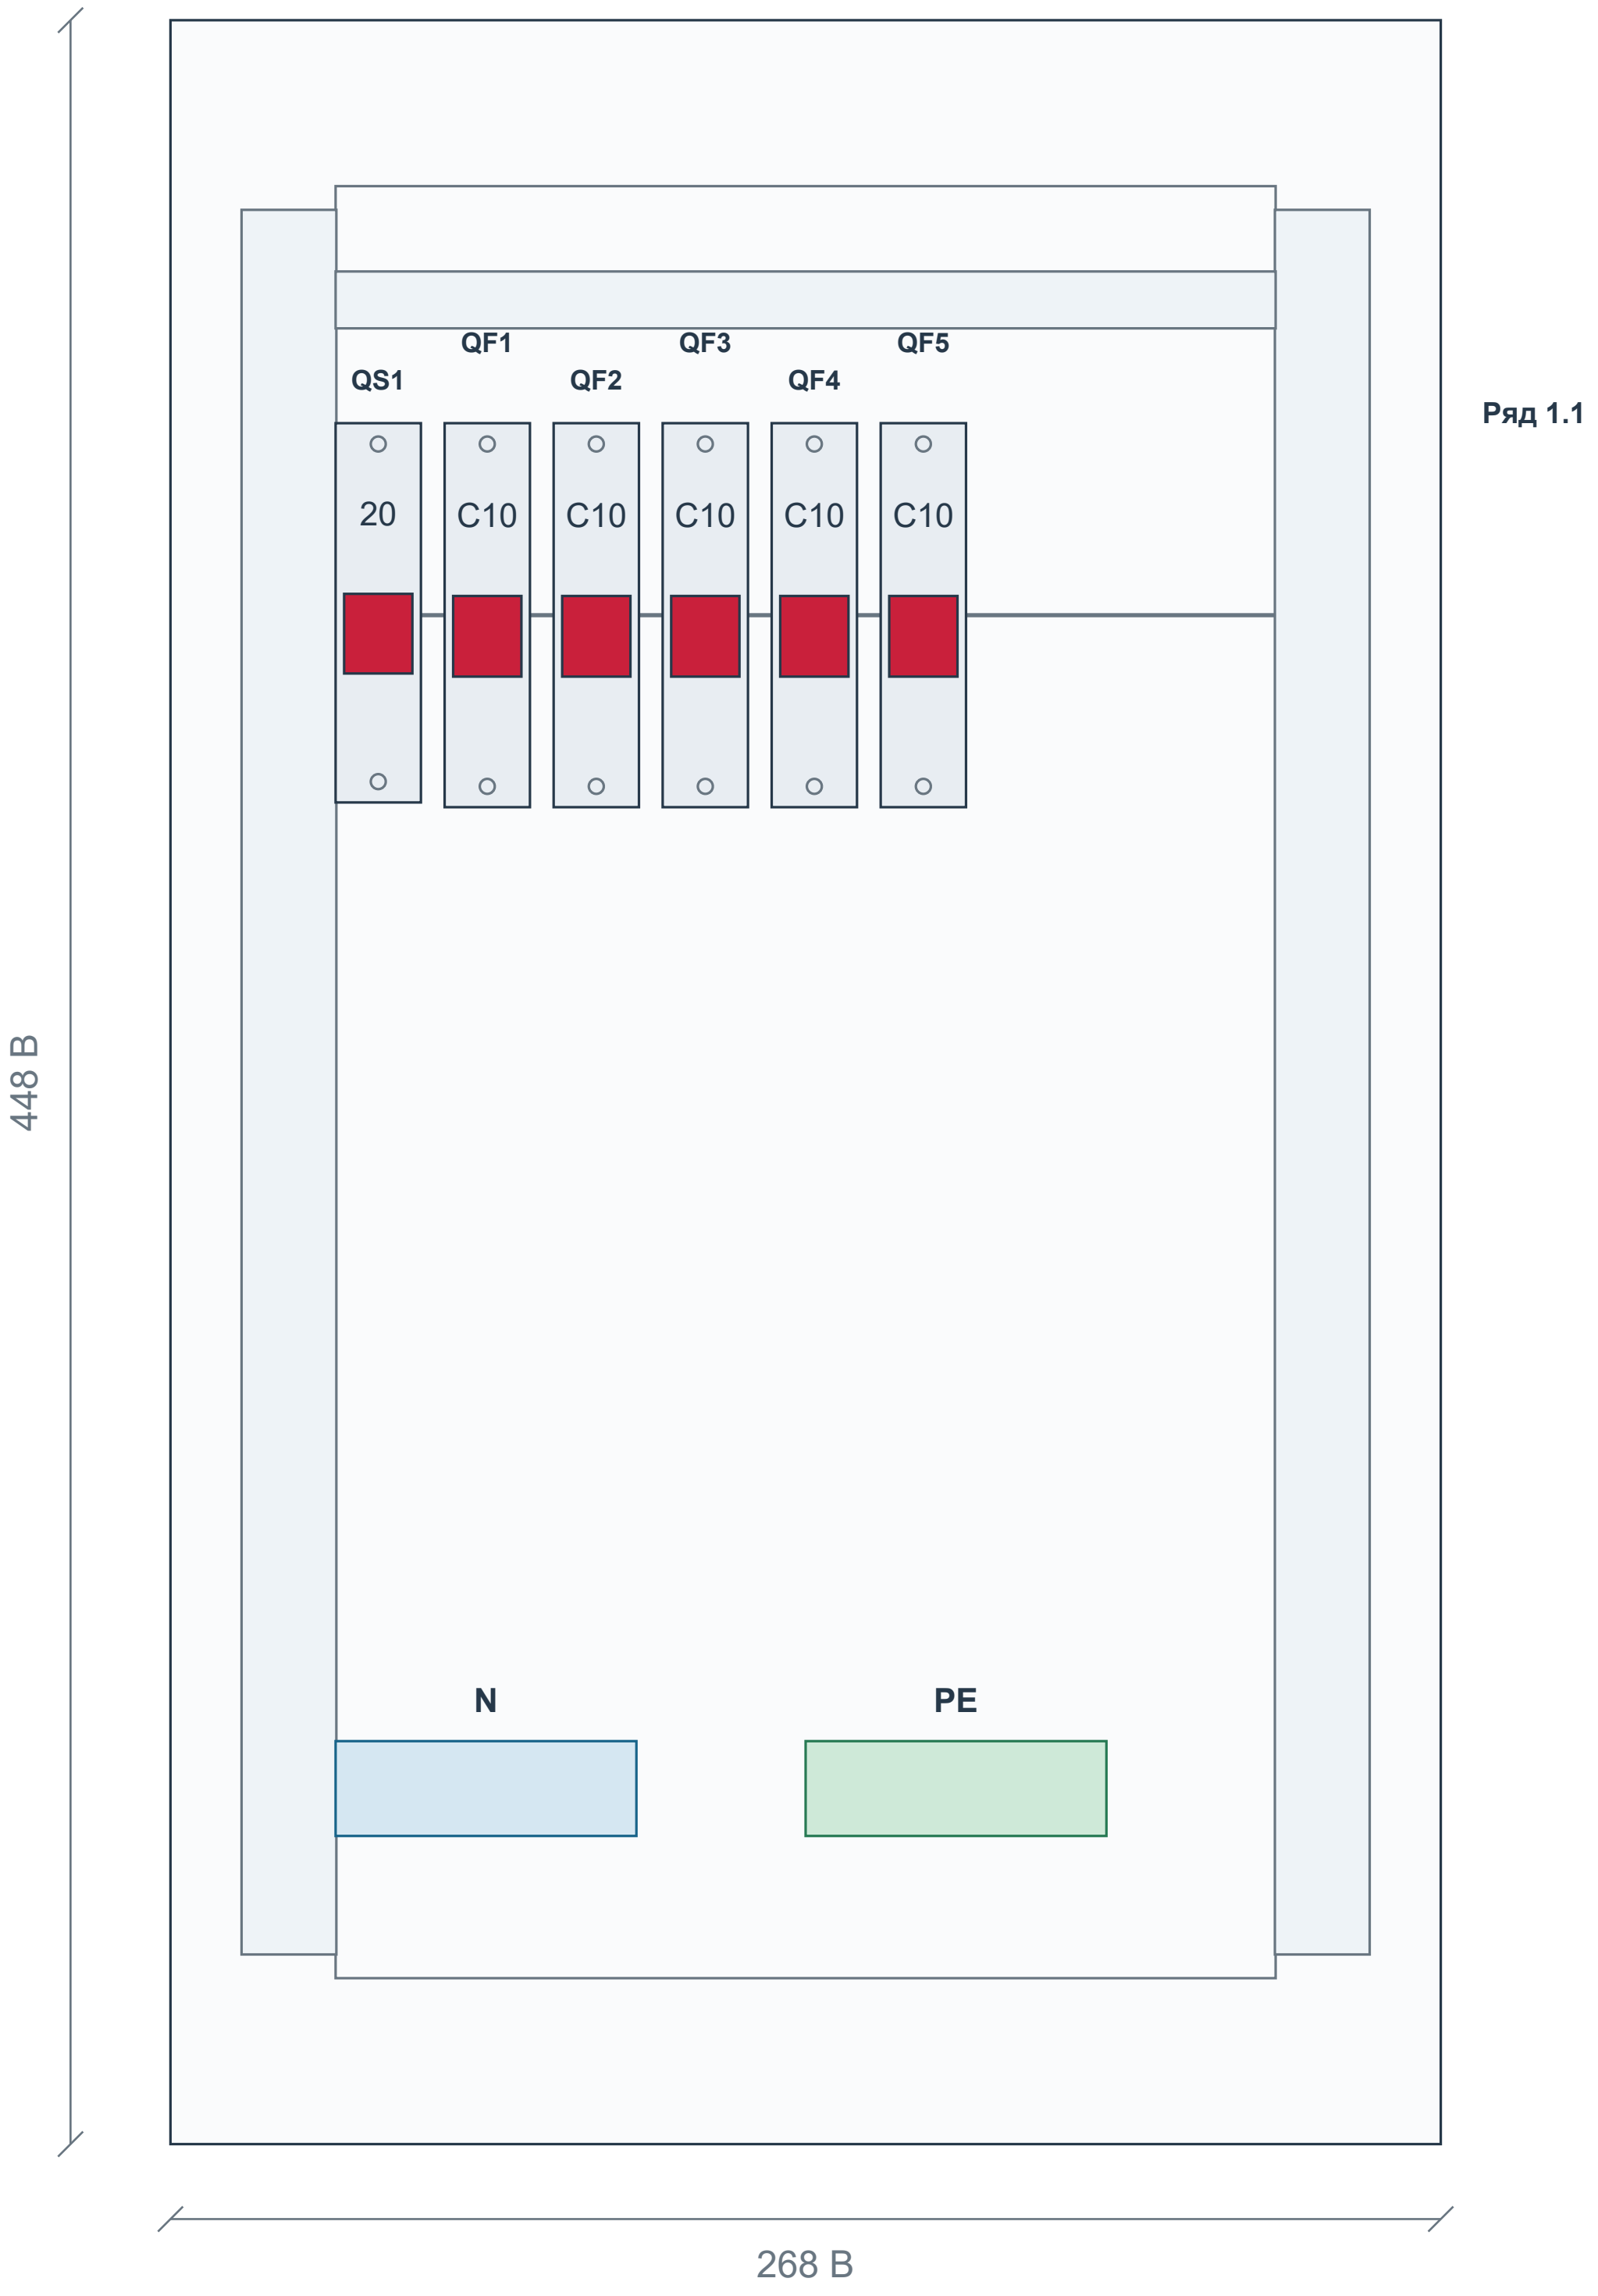

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	1181	1.1	34.84	85	18 × 80
QF1 - QF5	NXB-63S	1182	1.1	57.84...149.84	85	18 × 81

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Актуальная спецификация

ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1194 | ЭОМ, PDF стр. 67

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1195	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1196	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
1197	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1198	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1199	PYS-004	Терморегулятор РТ330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту)	шт	1	1	pys	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 67

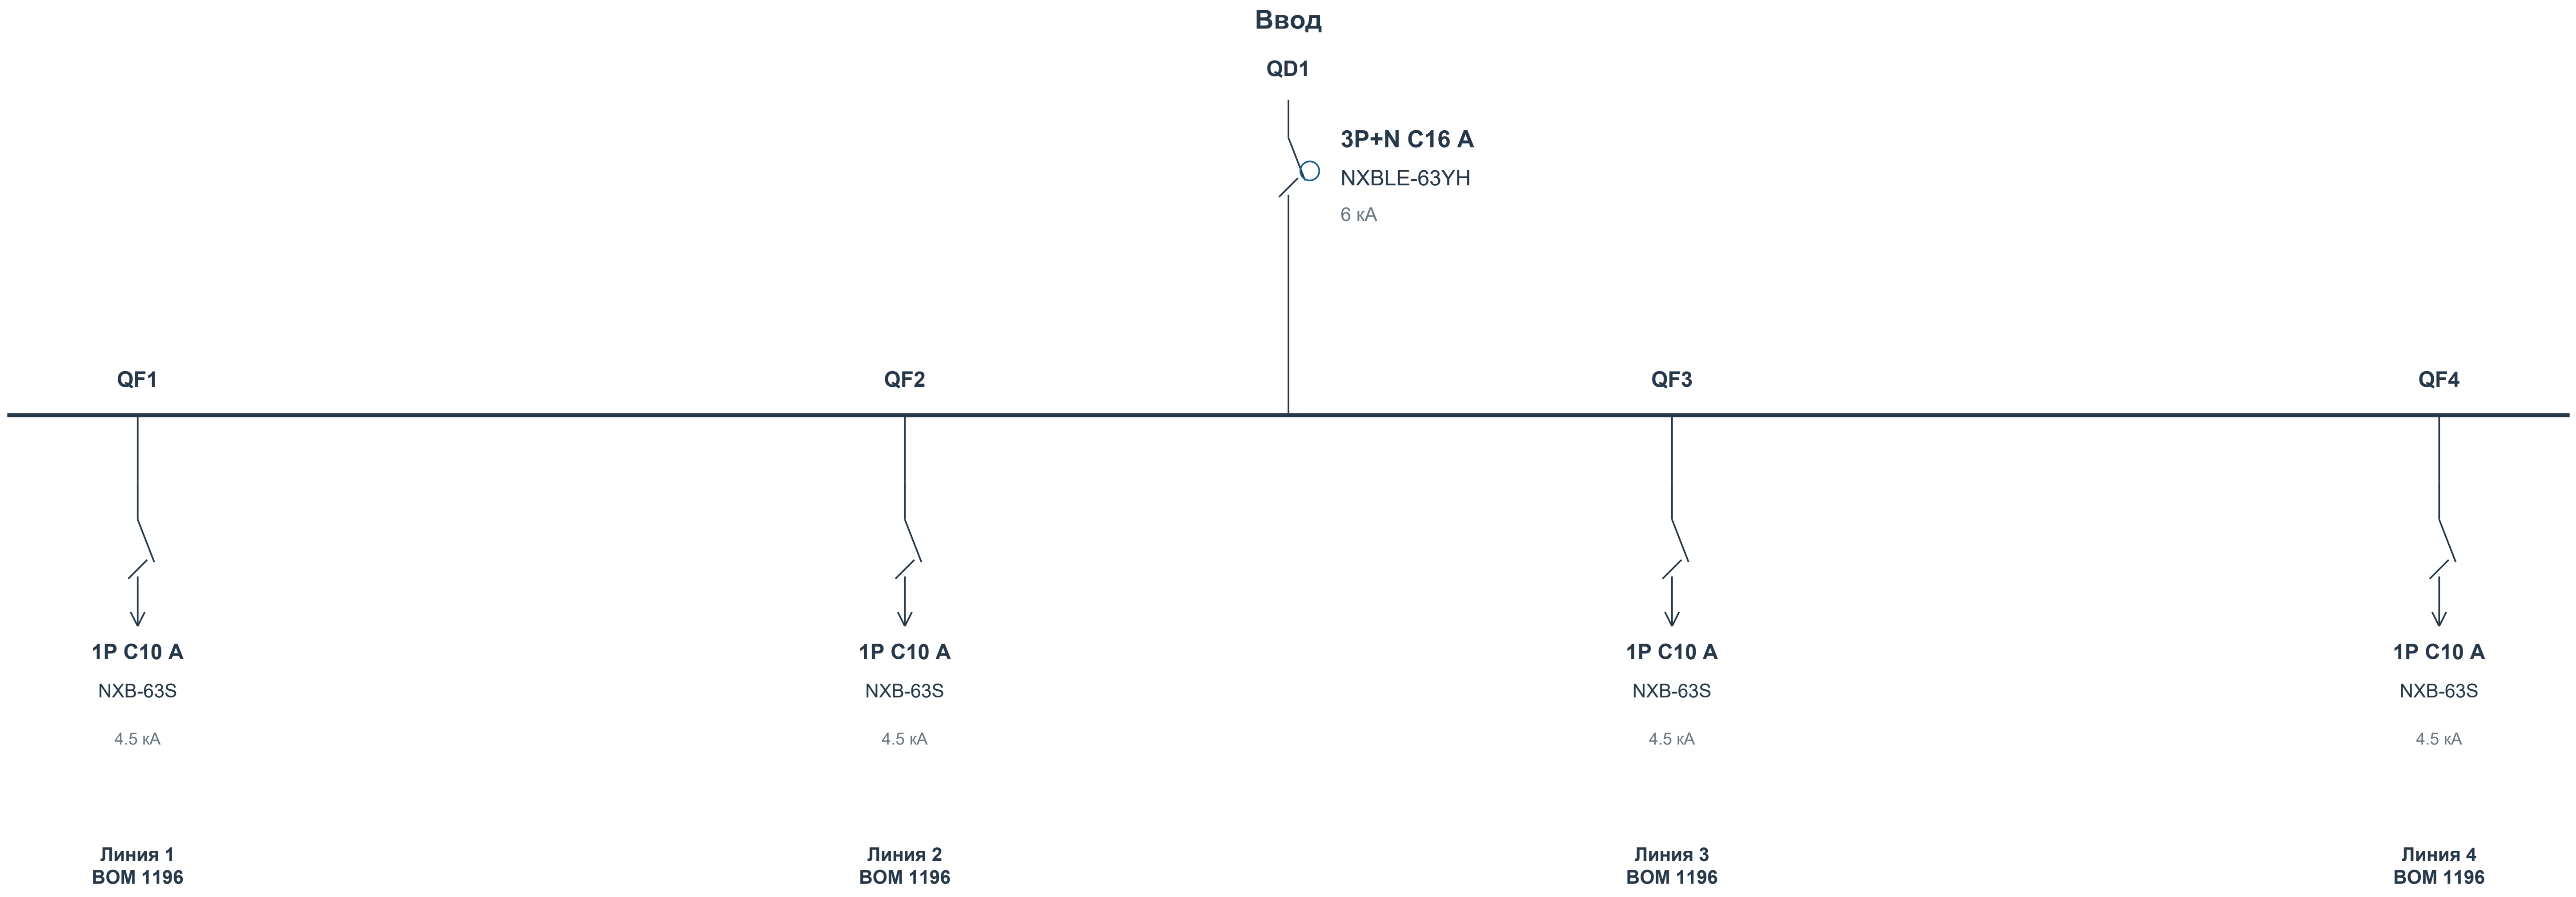
Ввод
QD1
3P+N C16 A
NXBLE-63YH
6 кА
QF1
QF2
QF3
QF4
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1196
Линия 2
BOM 1196
Линия 3
BOM 1196
Линия 4
BOM 1196

Управление / учет: KM1 NXC-25 × 1; KA1 PT330 × 1

Данные исходного проекта: Ру 2.2 кВт | Рр 2,2 кВт | Iр 3,6 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

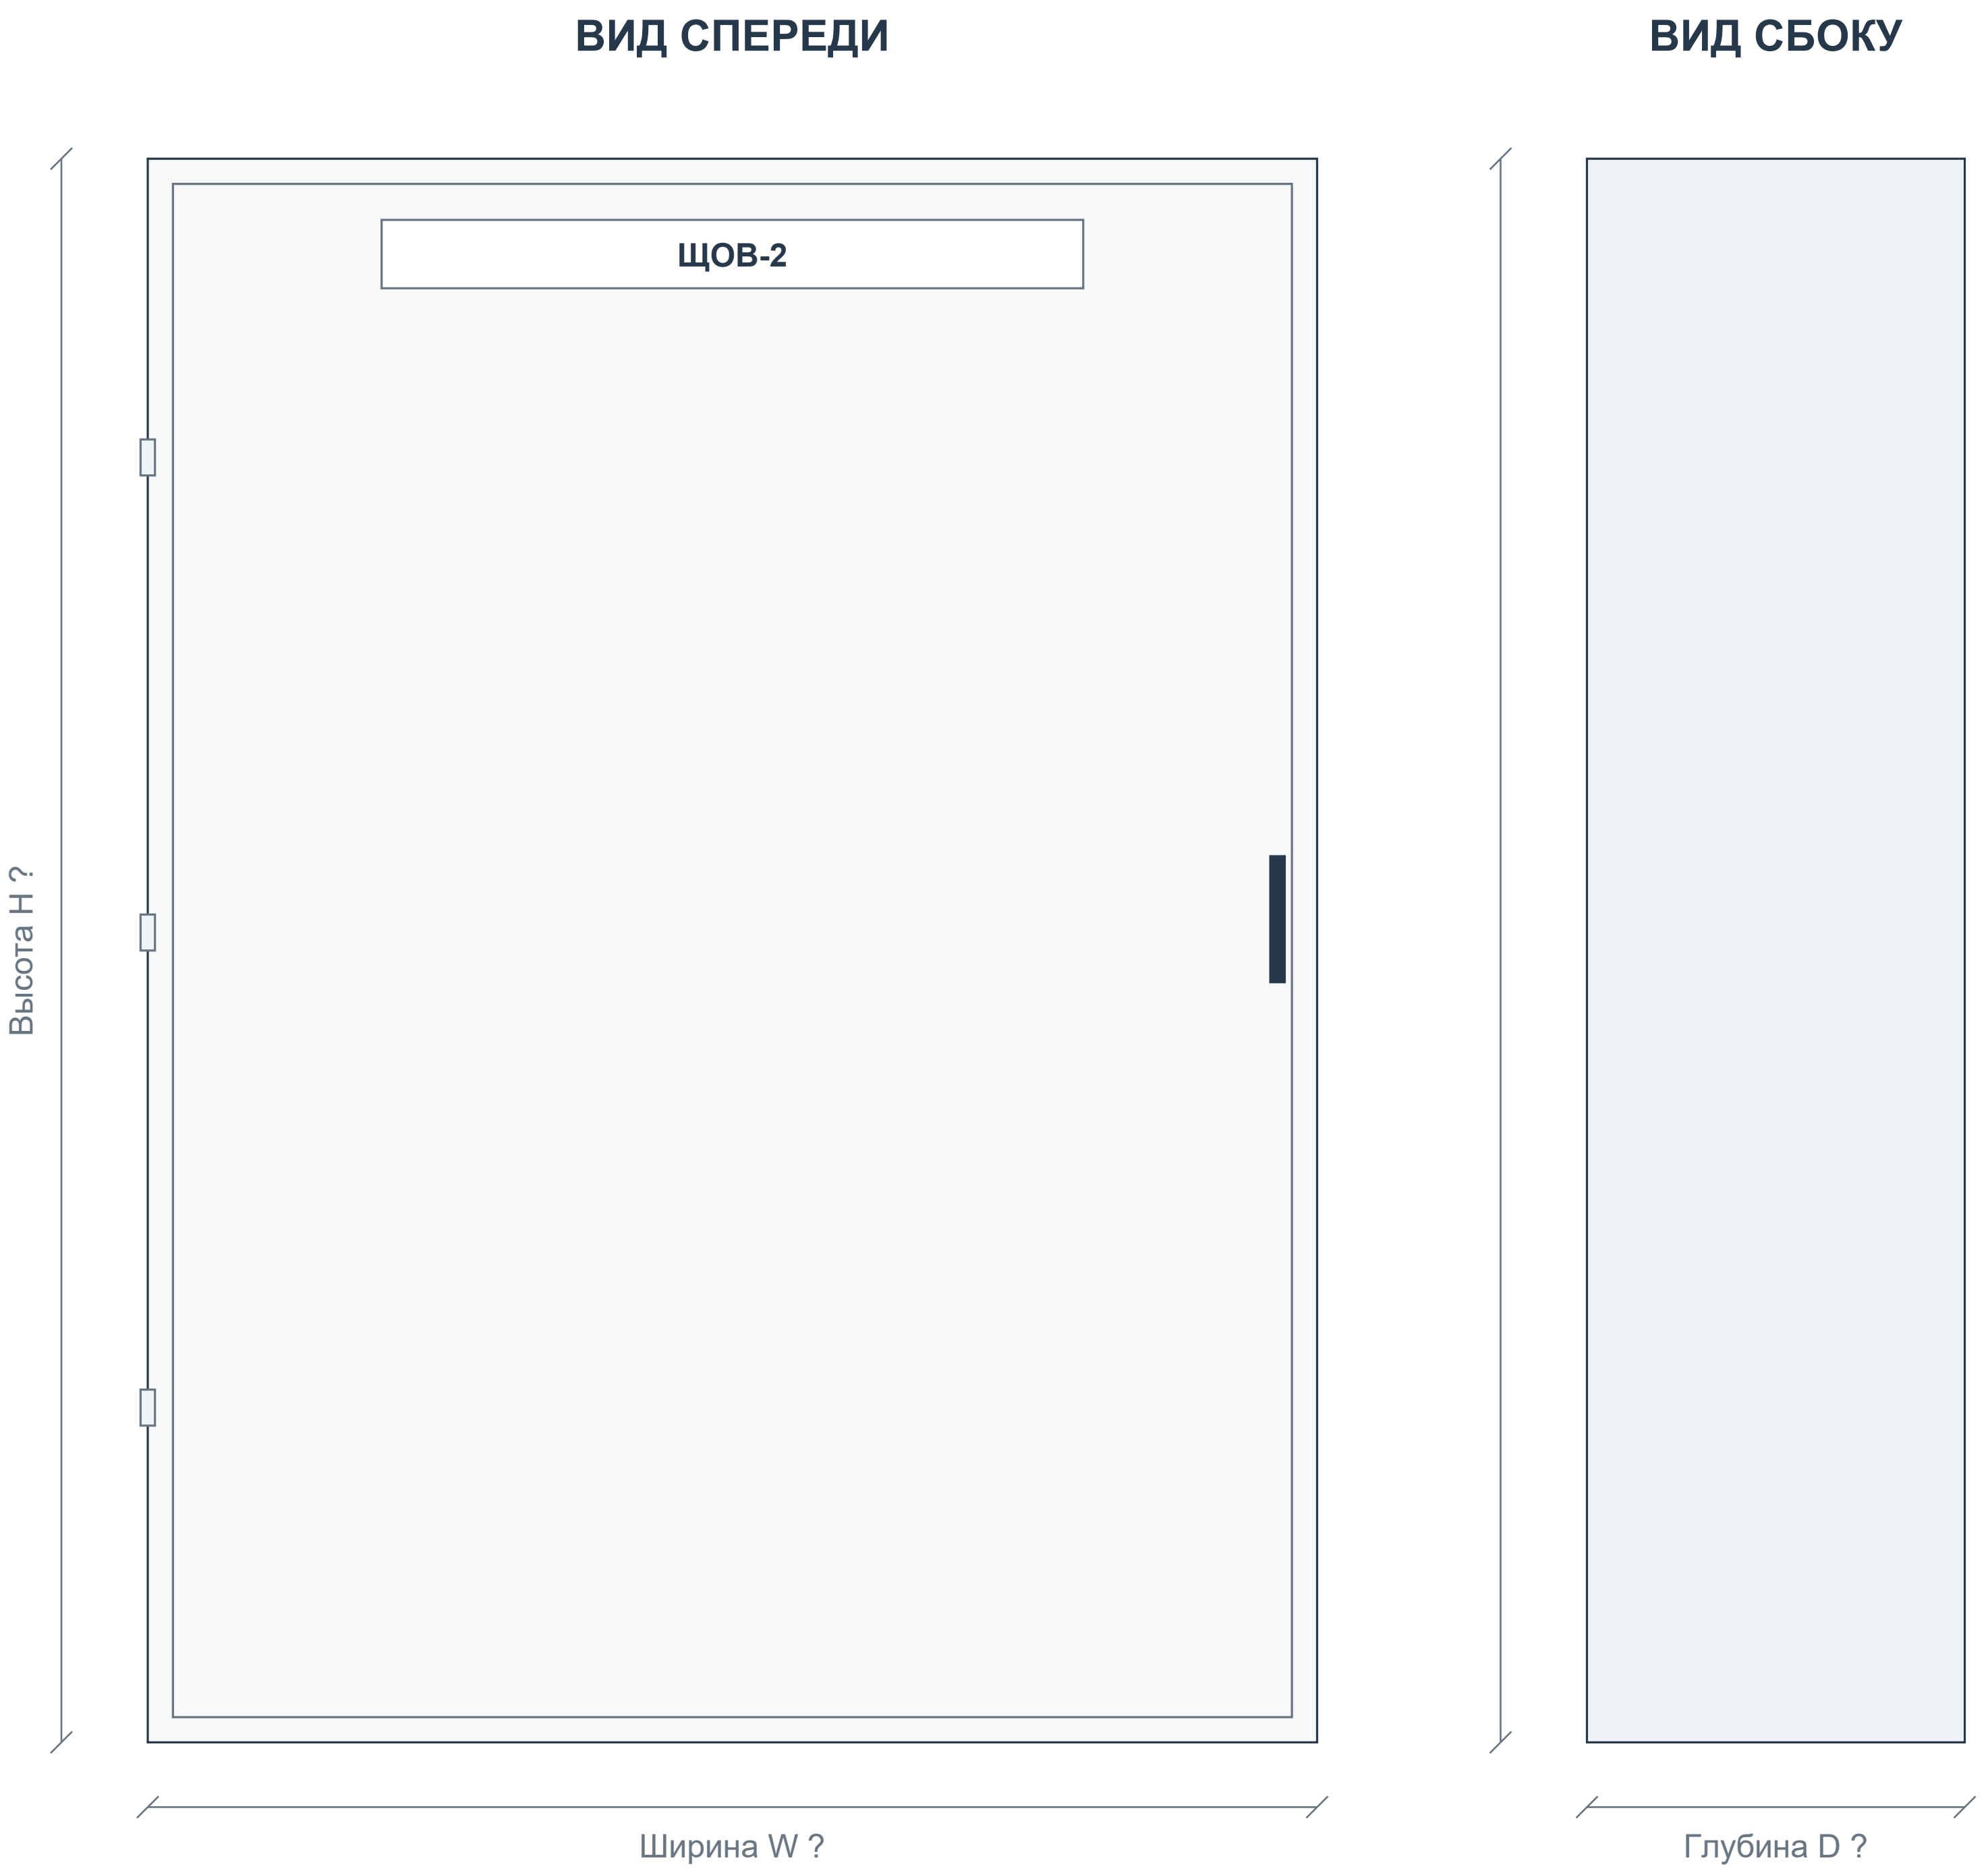

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

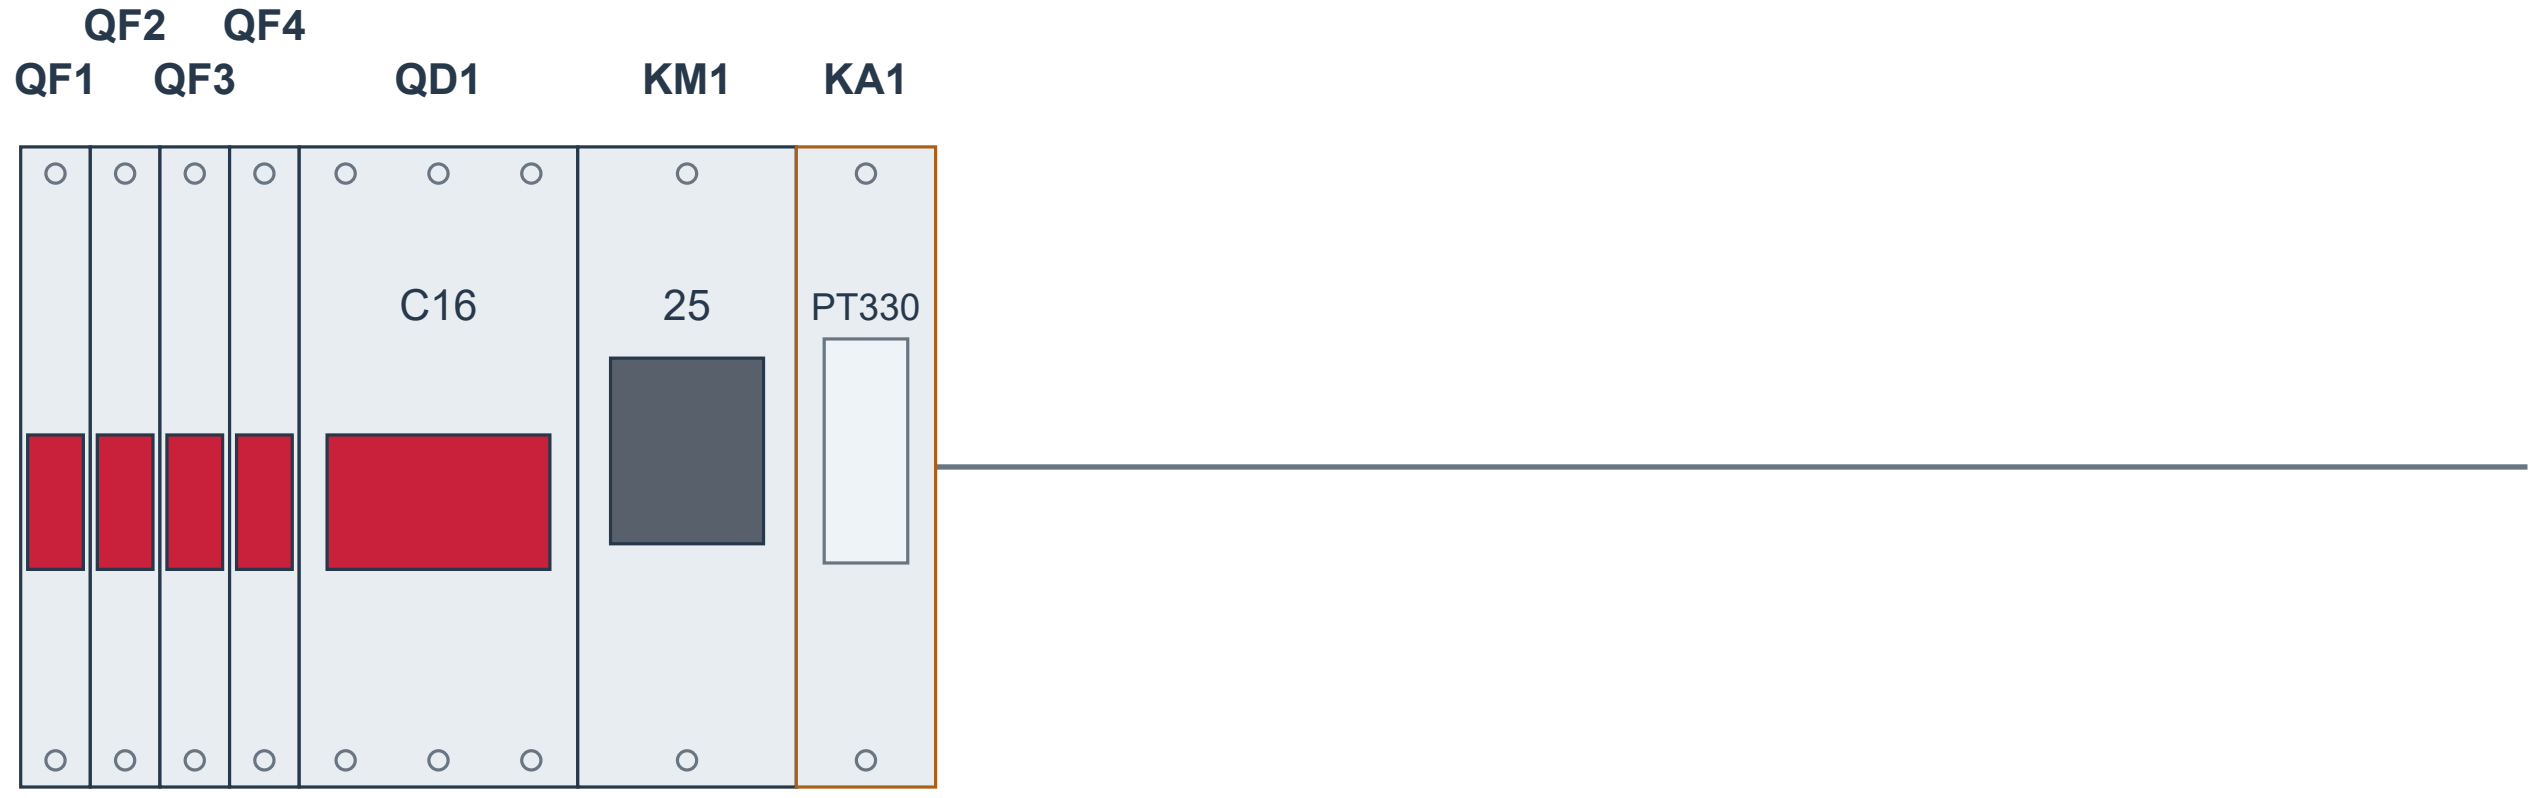

Сумма ширин: 200.5 мм В + ?

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QF1 - QF4	NXB-63S	1196	1	0...54	?	18 B
QD1	NXBLE-63YH	1197	1	72	?	72 B
KM1	NXC-25	1198	1	144	?	56.5 B
KA1	PT330	1199	1	200.5	?	?

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

У 1 аппаратов габариты не заполнены; янтарные контуры условные. Фактический размер и посадку проверить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Актуальная спецификация

ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1215 | ЭОМ, PDF стр. 68

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1216	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1217	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1218	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1219	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1220	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 68

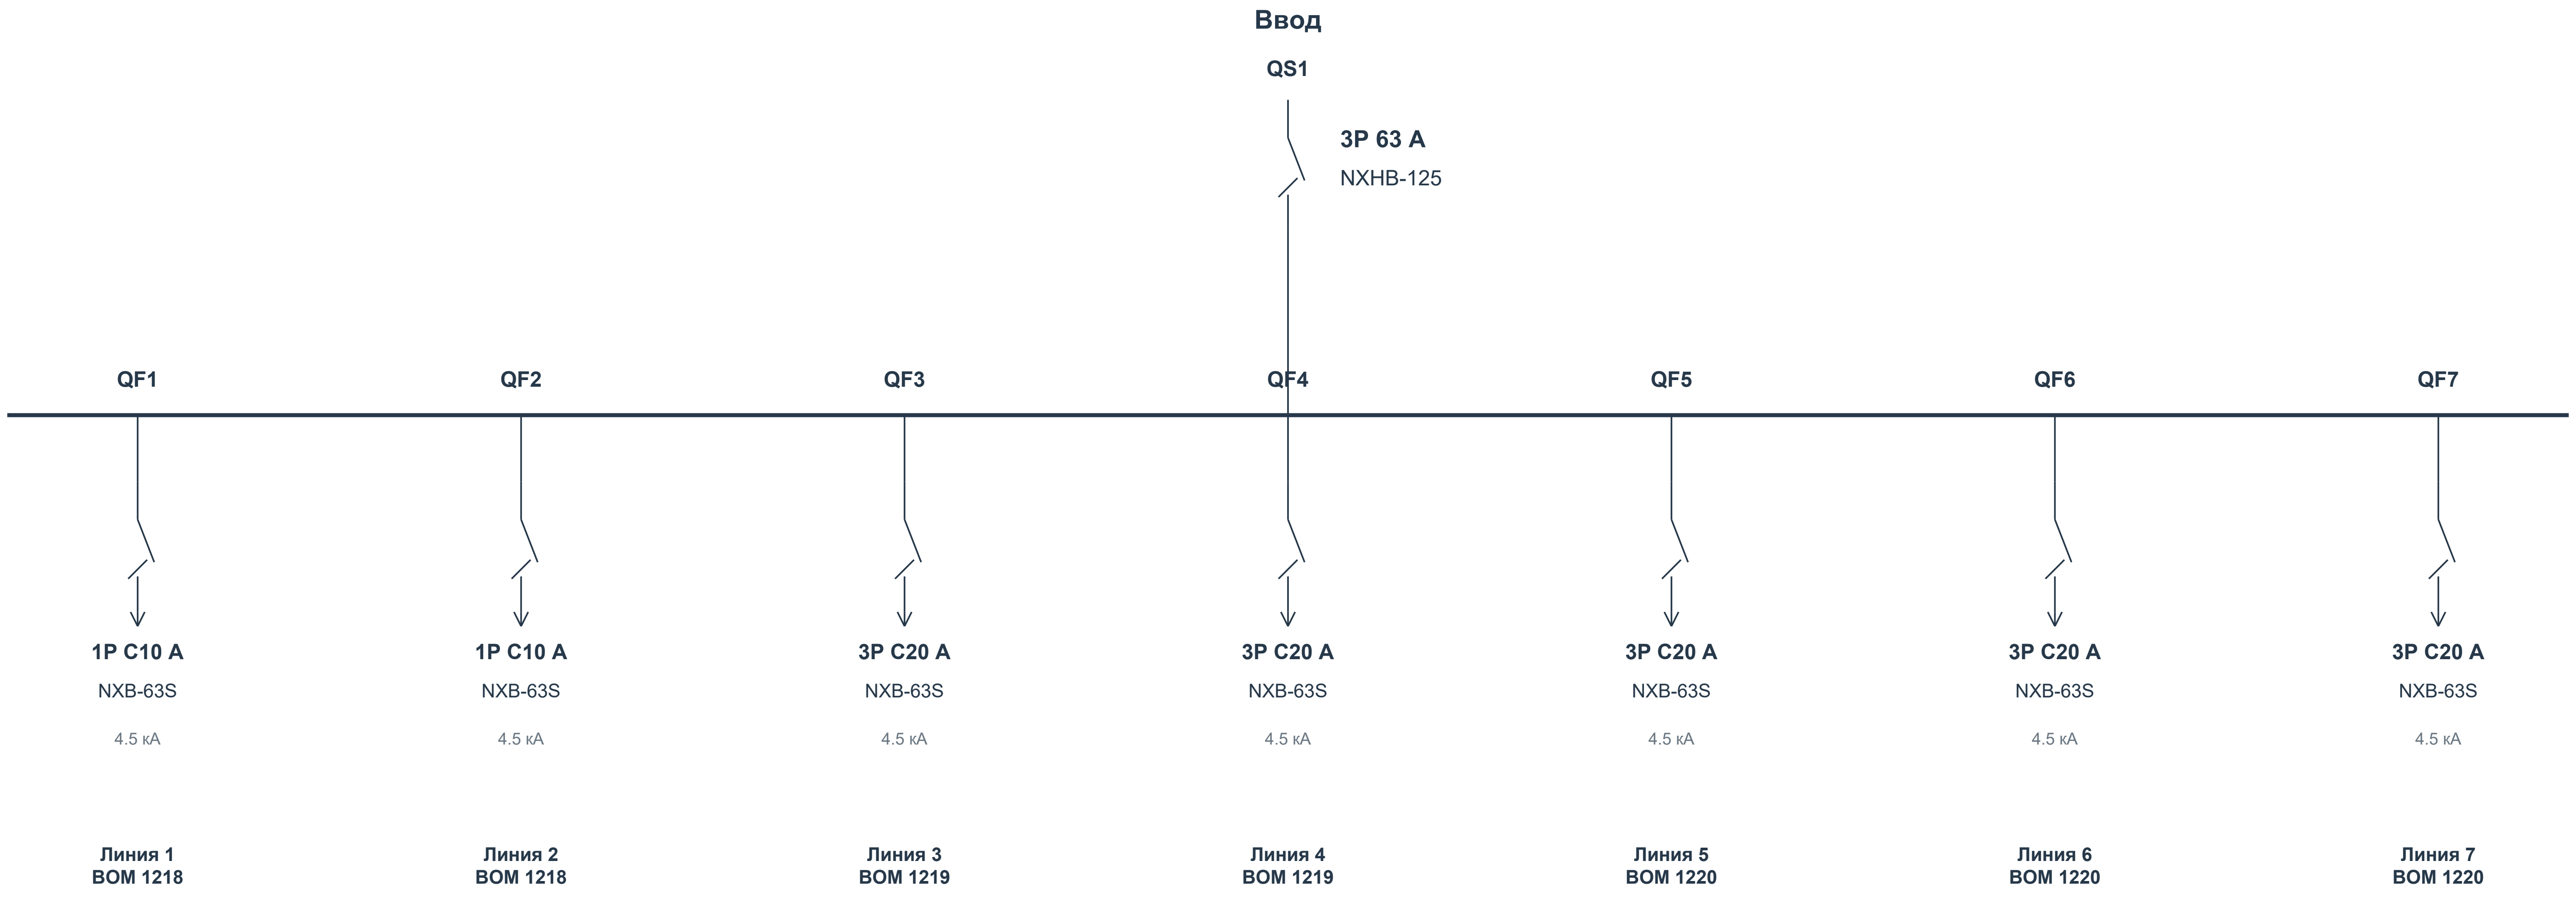
Ввод
QS1
3P 63 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1218
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 1218
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 1219
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 1219
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 1220
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 1220
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 1220

Данные исходного проекта: Ру 29.1 кВт | Рр 29,1 кВт | Iр 50,2 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

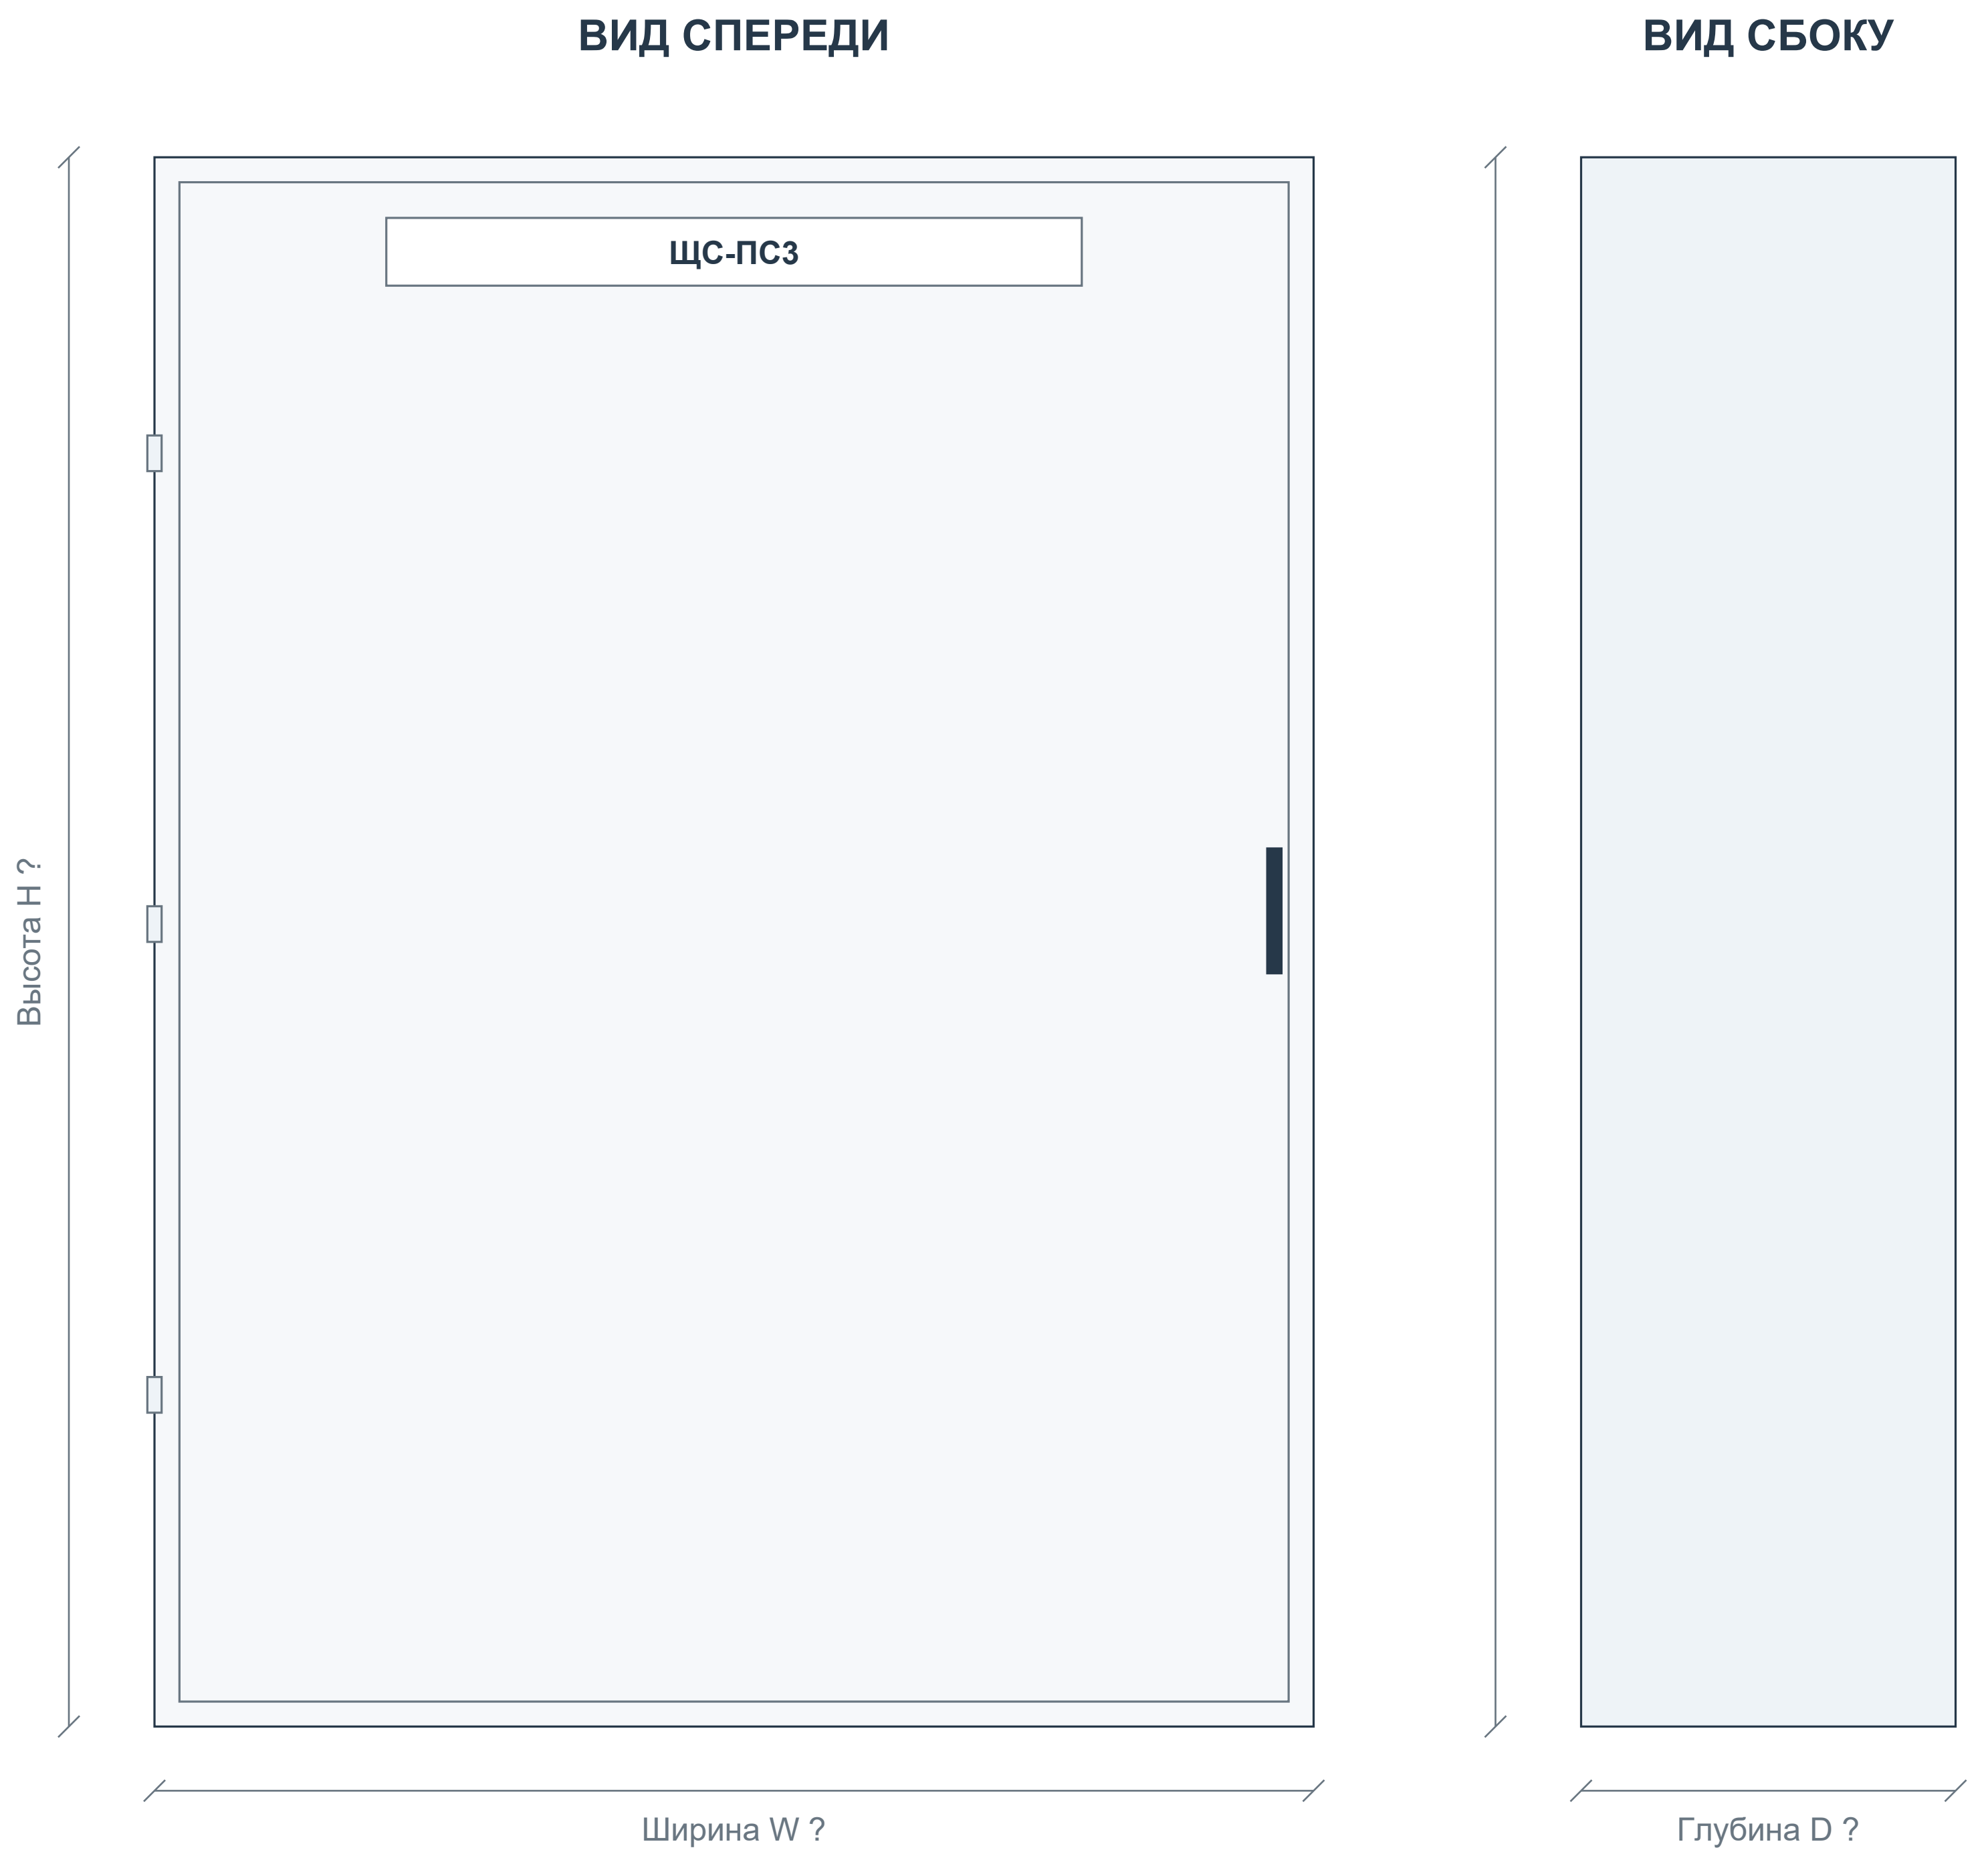

Корпус: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

W/H/D отсутствуют либо порядок размеров неоднозначен. Размеры не назначены; получить паспорт корпуса.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

Ряд 1 | модульная раскладка D

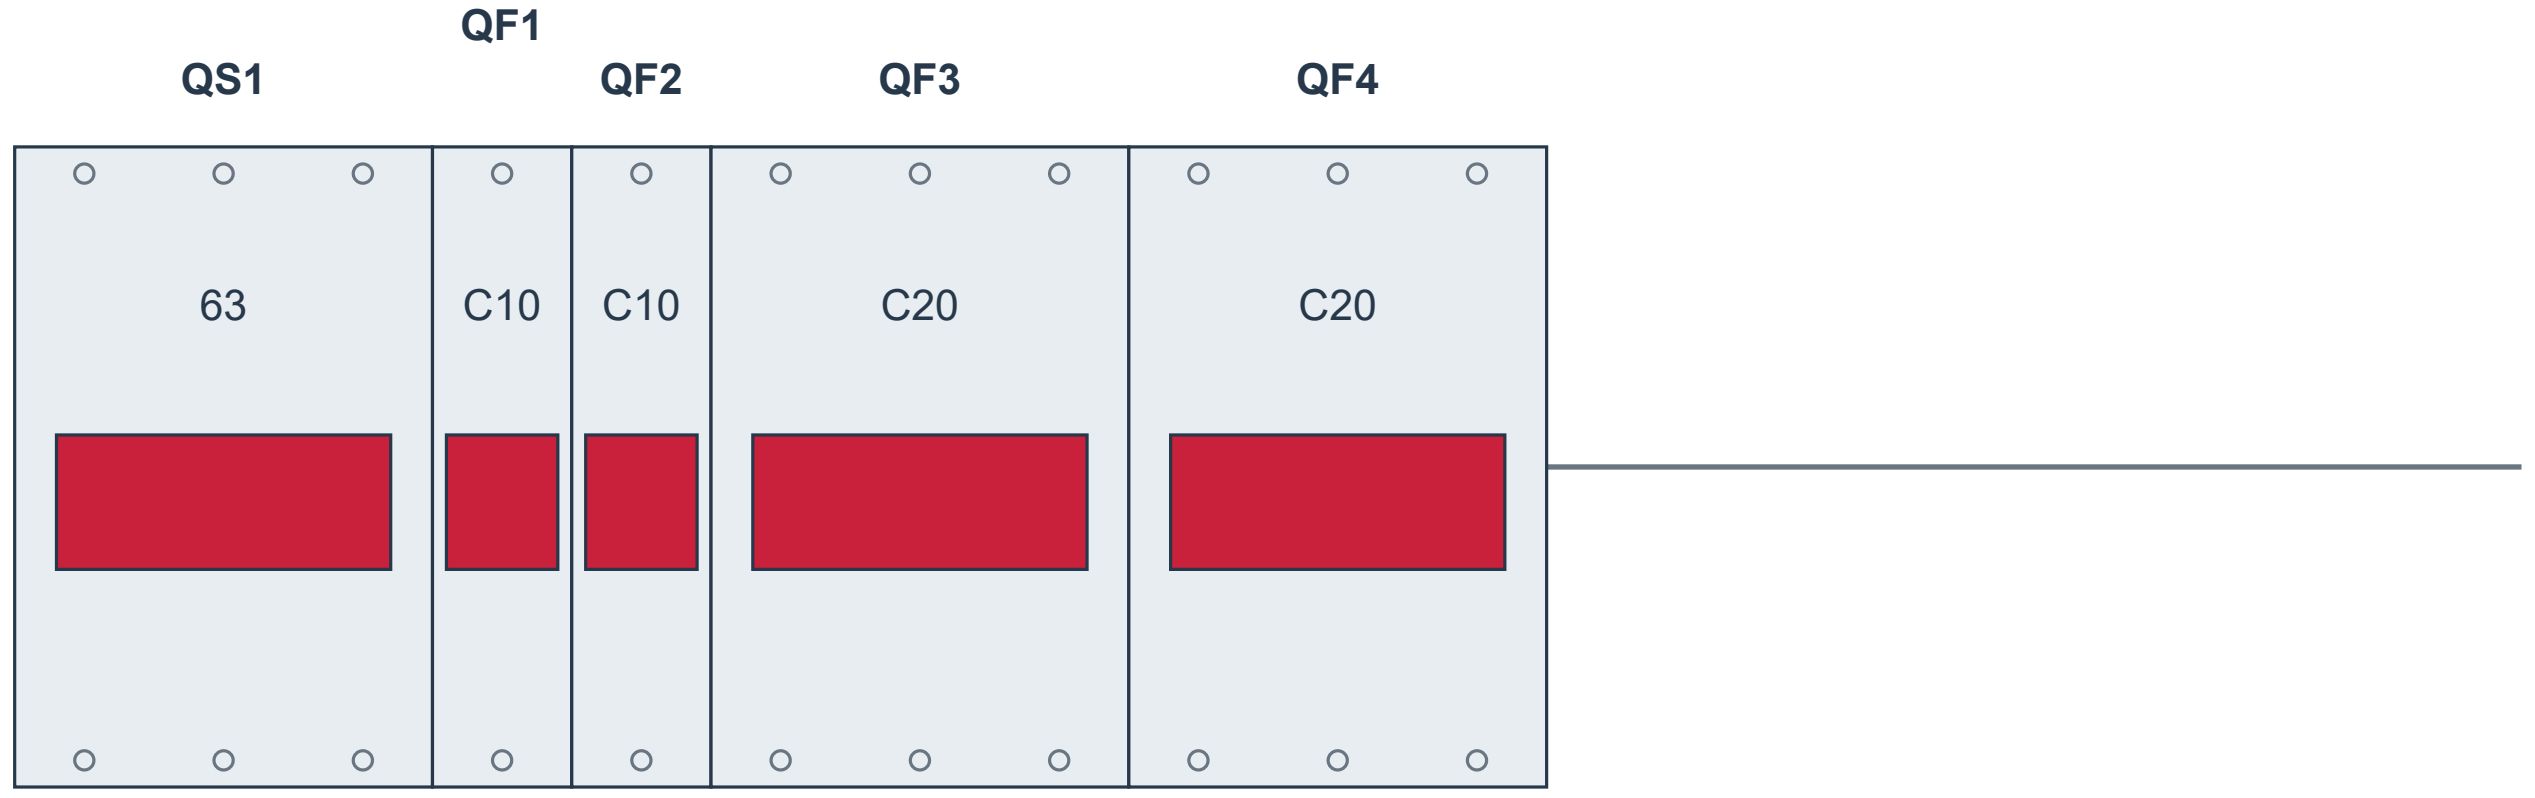

Сумма ширин: 198 мм B

Ряд 2 | модульная раскладка D

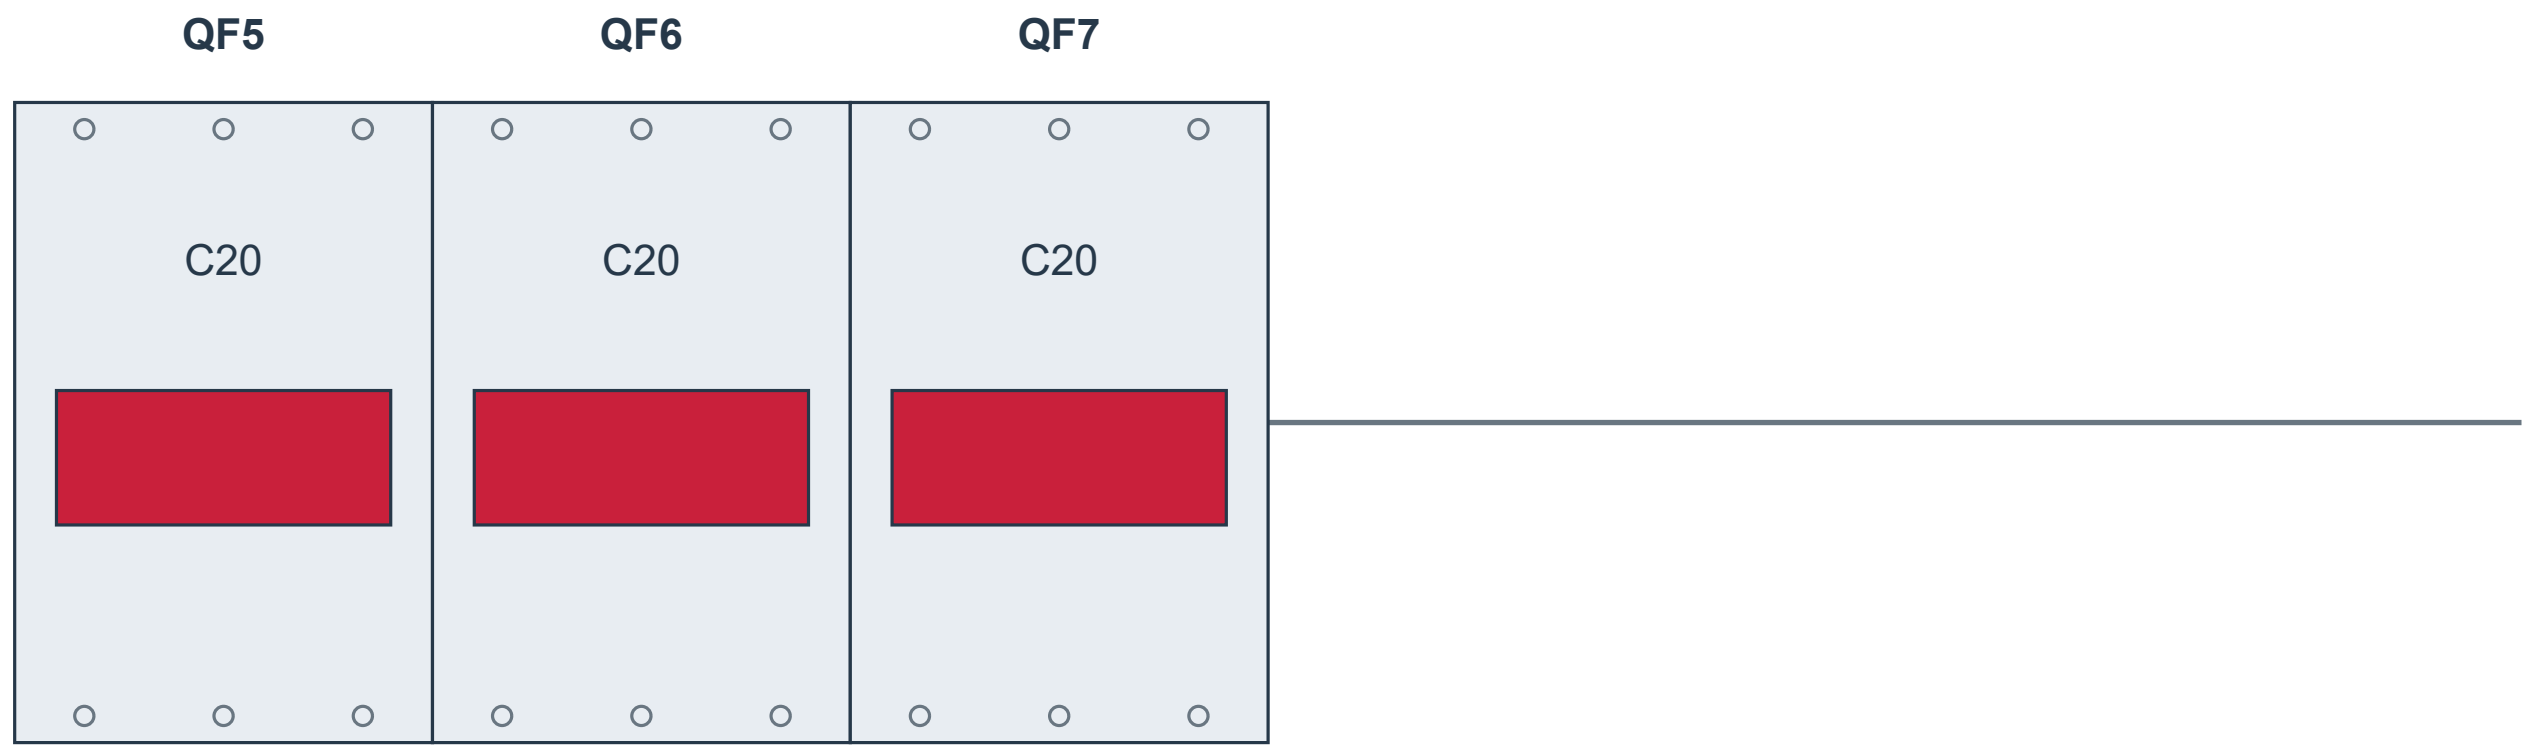

Сумма ширин: 162 мм B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	1217	1	0	?	54 B
QF1 - QF2	NXB-63S	1218	1	54...72	?	18 B
QF3 - QF4	NXB-63S	1219	1	90...144	?	54 B
QF5 - QF7	NXB-63S	1220	2	0...108	?	54 B

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

W/H/D корпуса и расстояния между рейками не заданы. Модульная раскладка D не является подтверждением физической вместимости.

Корпус по описанию BOM: 36 модулей. Уточнить распределение емкости по рядам.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Актуальная спецификация

ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1233 | ЭОМ, PDF стр. 2

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1234	719-15923	Мет. Щит ВРУ (2000х800х600)+10 база (TS)	шт	3	3	teksan f	Корпус
1235	393267	Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления	шт	2	2	chint	Ввод
1236	256796	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3В 250А (R)	шт	2	2	chint	Ввод
1237	PYS-001	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	шт	2	2	pys	Учет
1238	270300101	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK	шт	6	6	ekt	Учет
1239	816139	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1240	813874	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1241	813873	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
1242	813877	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1243	813876	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1244	813875	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1245	179870	Авт. выкл. NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1246	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Управл.
1248	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R)	шт	4	4	chint	Управл.
1249	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	шт	4	4	chint	Управл.
1250	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	4	4	chint	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 2

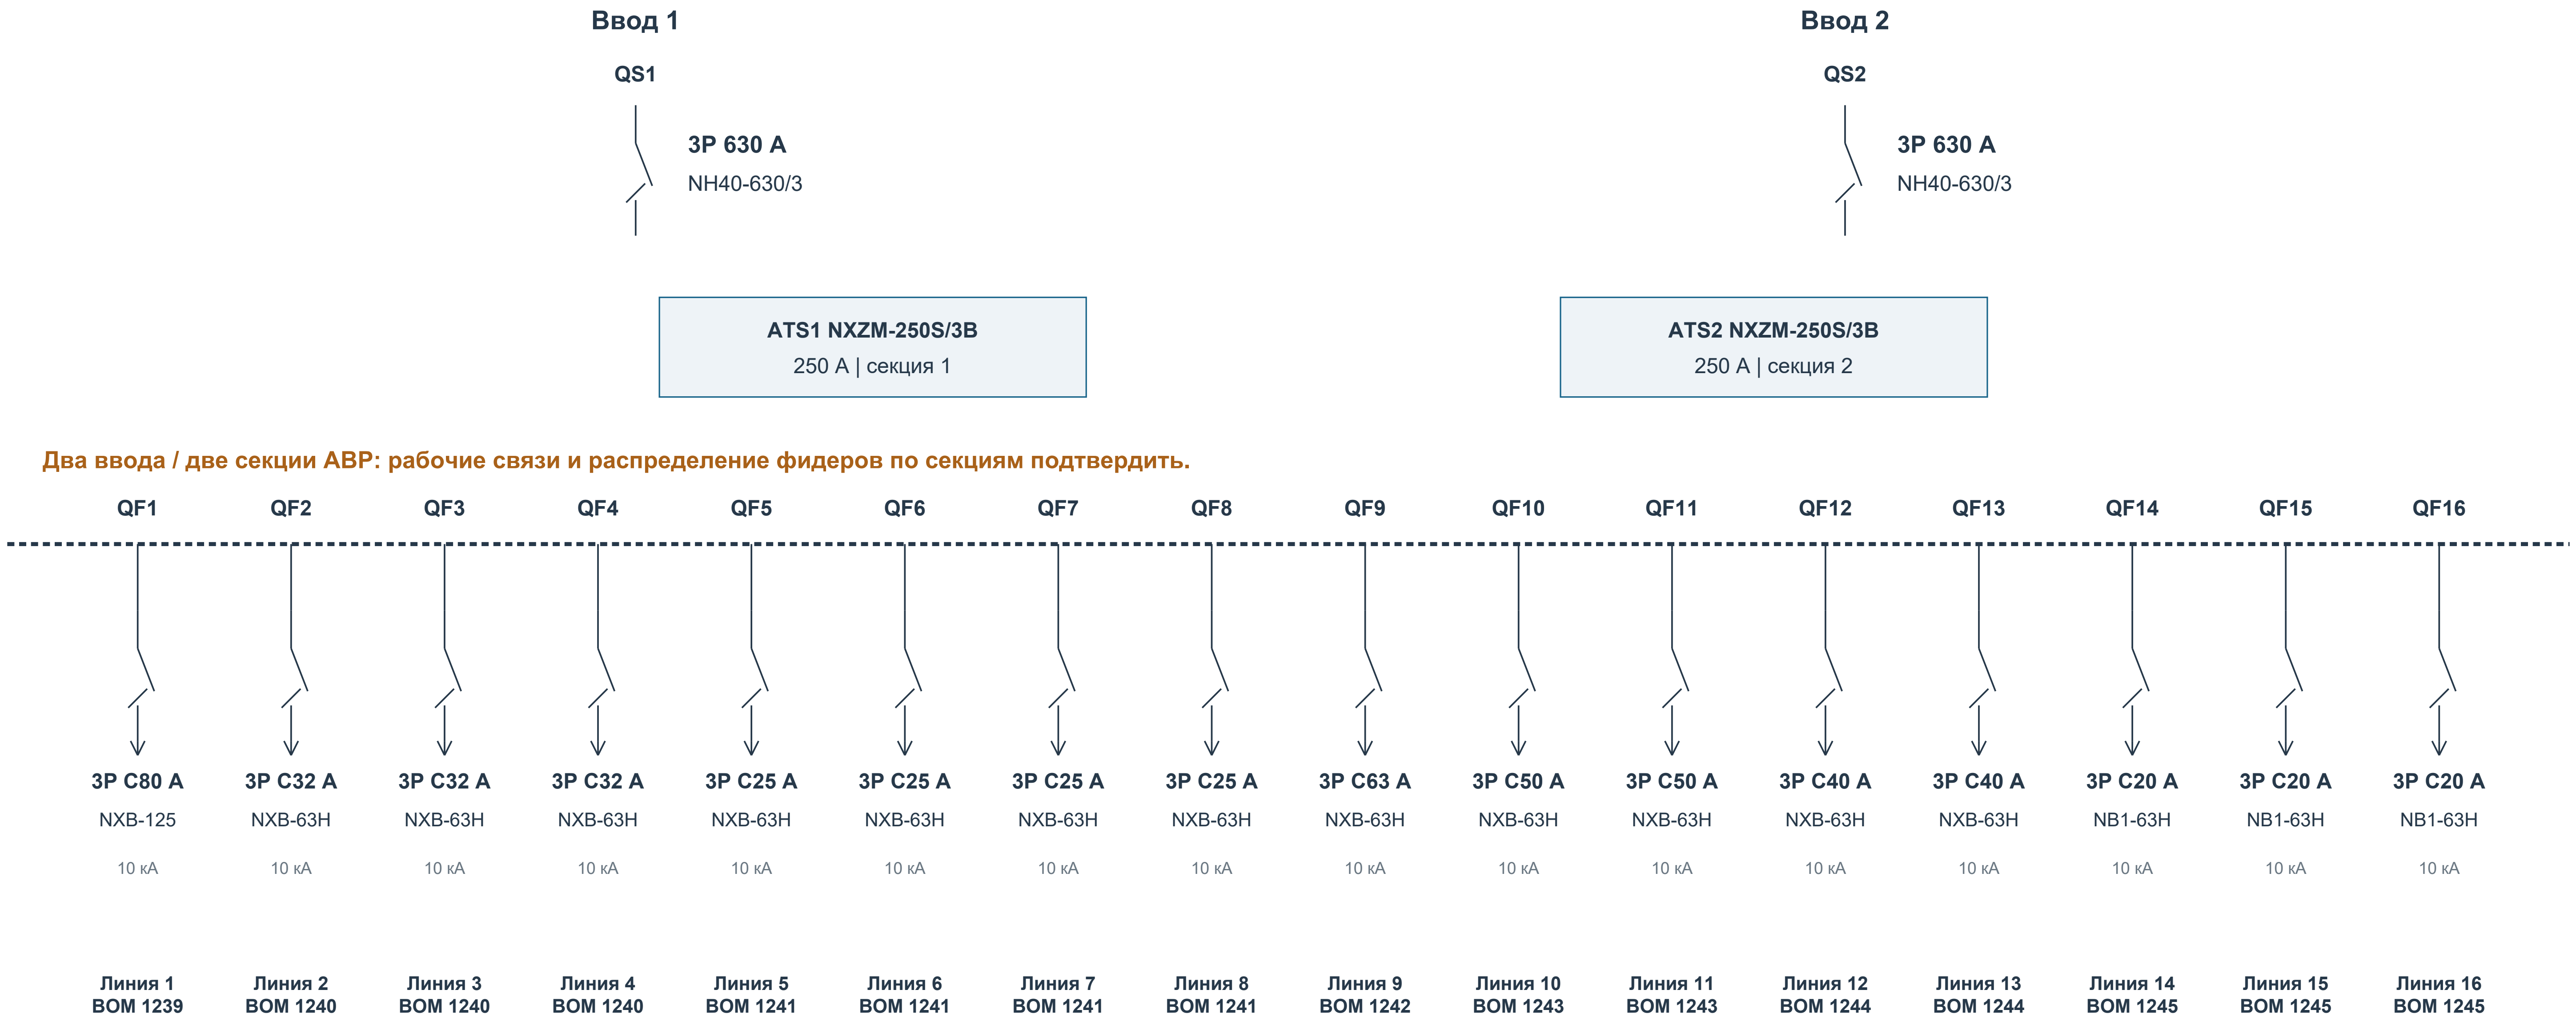

Два ввода / две секции АВР: рабочие связи и распределение фидеров по секциям подтвердить.

Аппарат	Номинал	Тип	Откл. способность	Линия	BOM
QF1	3P C80 A	NXB-125	10 кА	Линия 1	BOM 1239
QF2	3P C32 A	NXB-63H	10 кА	Линия 2	BOM 1240
QF3	3P C32 A	NXB-63H	10 кА	Линия 3	BOM 1240
QF4	3P C32 A	NXB-63H	10 кА	Линия 4	BOM 1240
QF5	3P C25 A	NXB-63H	10 кА	Линия 5	BOM 1241
QF6	3P C25 A	NXB-63H	10 кА	Линия 6	BOM 1241
QF7	3P C25 A	NXB-63H	10 кА	Линия 7	BOM 1241
QF8	3P C25 A	NXB-63H	10 кА	Линия 8	BOM 1241
QF9	3P C63 A	NXB-63H	10 кА	Линия 9	BOM 1242
QF10	3P C50 A	NXB-63H	10 кА	Линия 10	BOM 1243
QF11	3P C50 A	NXB-63H	10 кА	Линия 11	BOM 1243
QF12	3P C40 A	NXB-63H	10 кА	Линия 12	BOM 1244
QF13	3P C40 A	NXB-63H	10 кА	Линия 13	BOM 1244
QF14	3P C20 A	NB1-63H	10 кА	Линия 14	BOM 1245
QF15	3P C20 A	NB1-63H	10 кА	Линия 15	BOM 1245
QF16	3P C20 A	NB1-63H	10 кА	Линия 16	BOM 1245

Управление / учет: PI1 - PI2 МИРТЕК-32 × 2; TA1 - TA6 ТТИ-А × 6; SF1 - SF4 NXB-63S × 4; HL1 - HL12 ND16-22D/2 × 12

Данные исходного проекта: Ру 234,2 кВт | Рр 151,9 кВт | Ip 253,9 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

ВИД СПЕРЕДИ

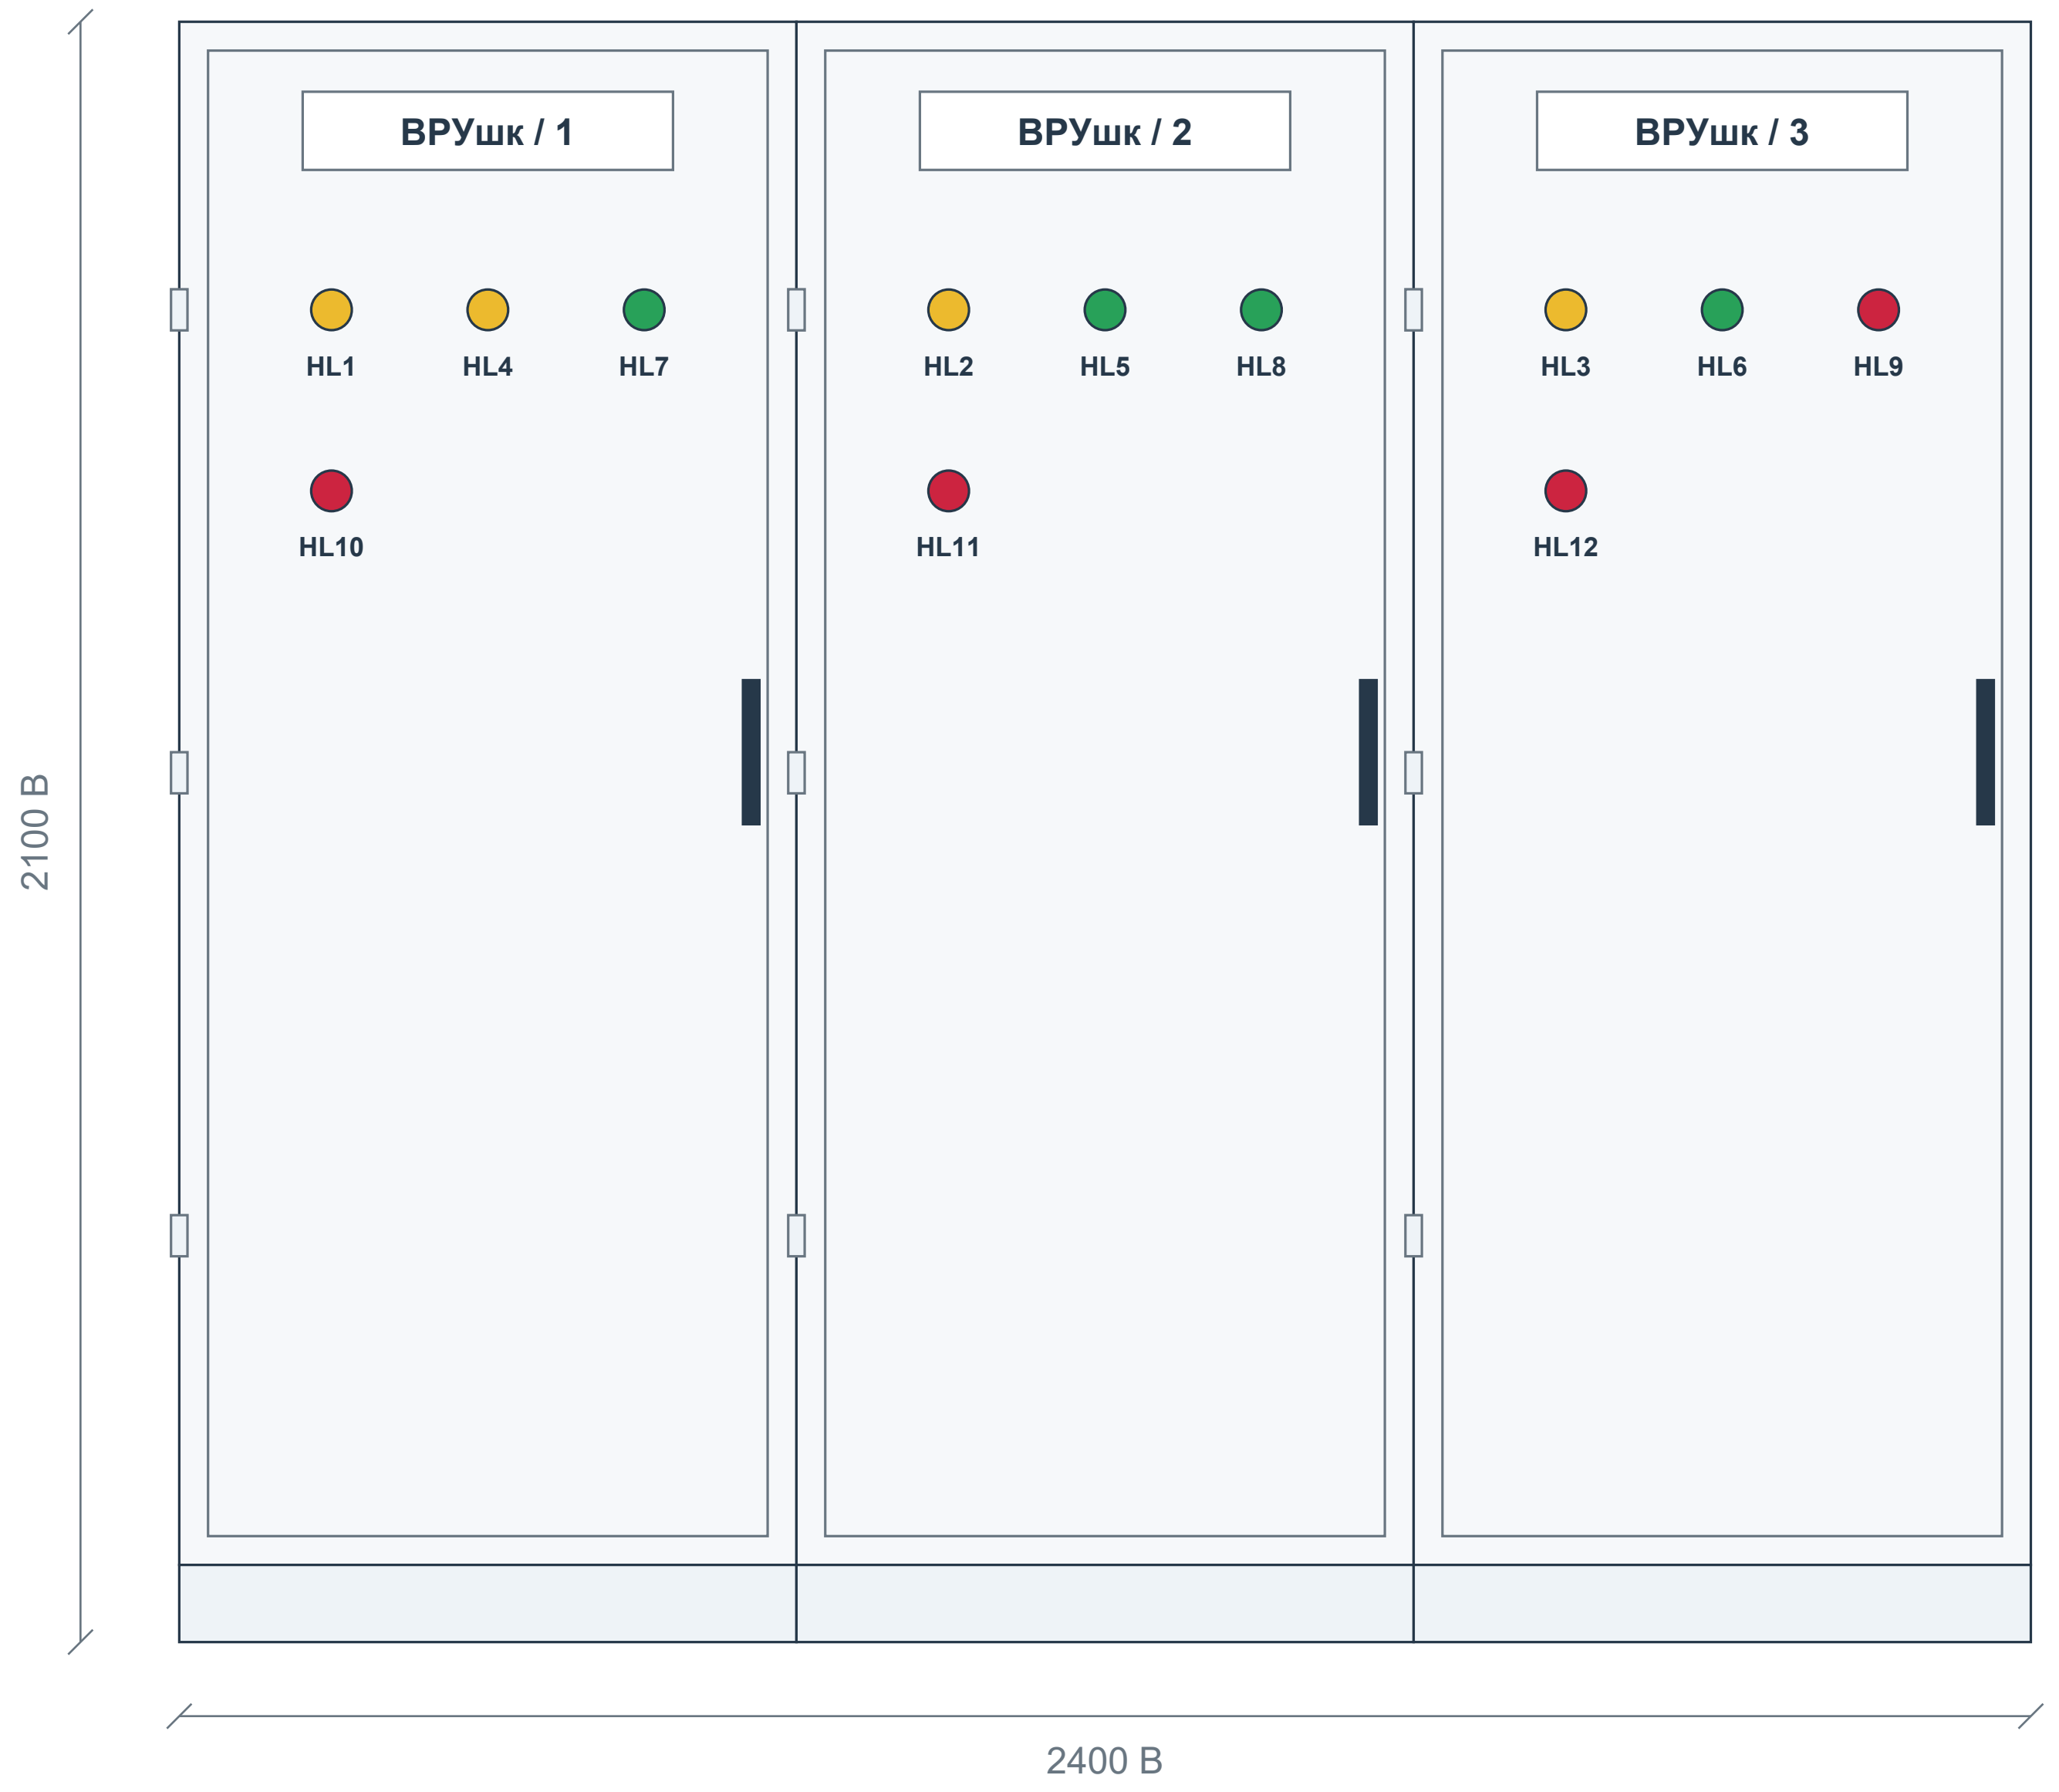

ВИД СБОКУ

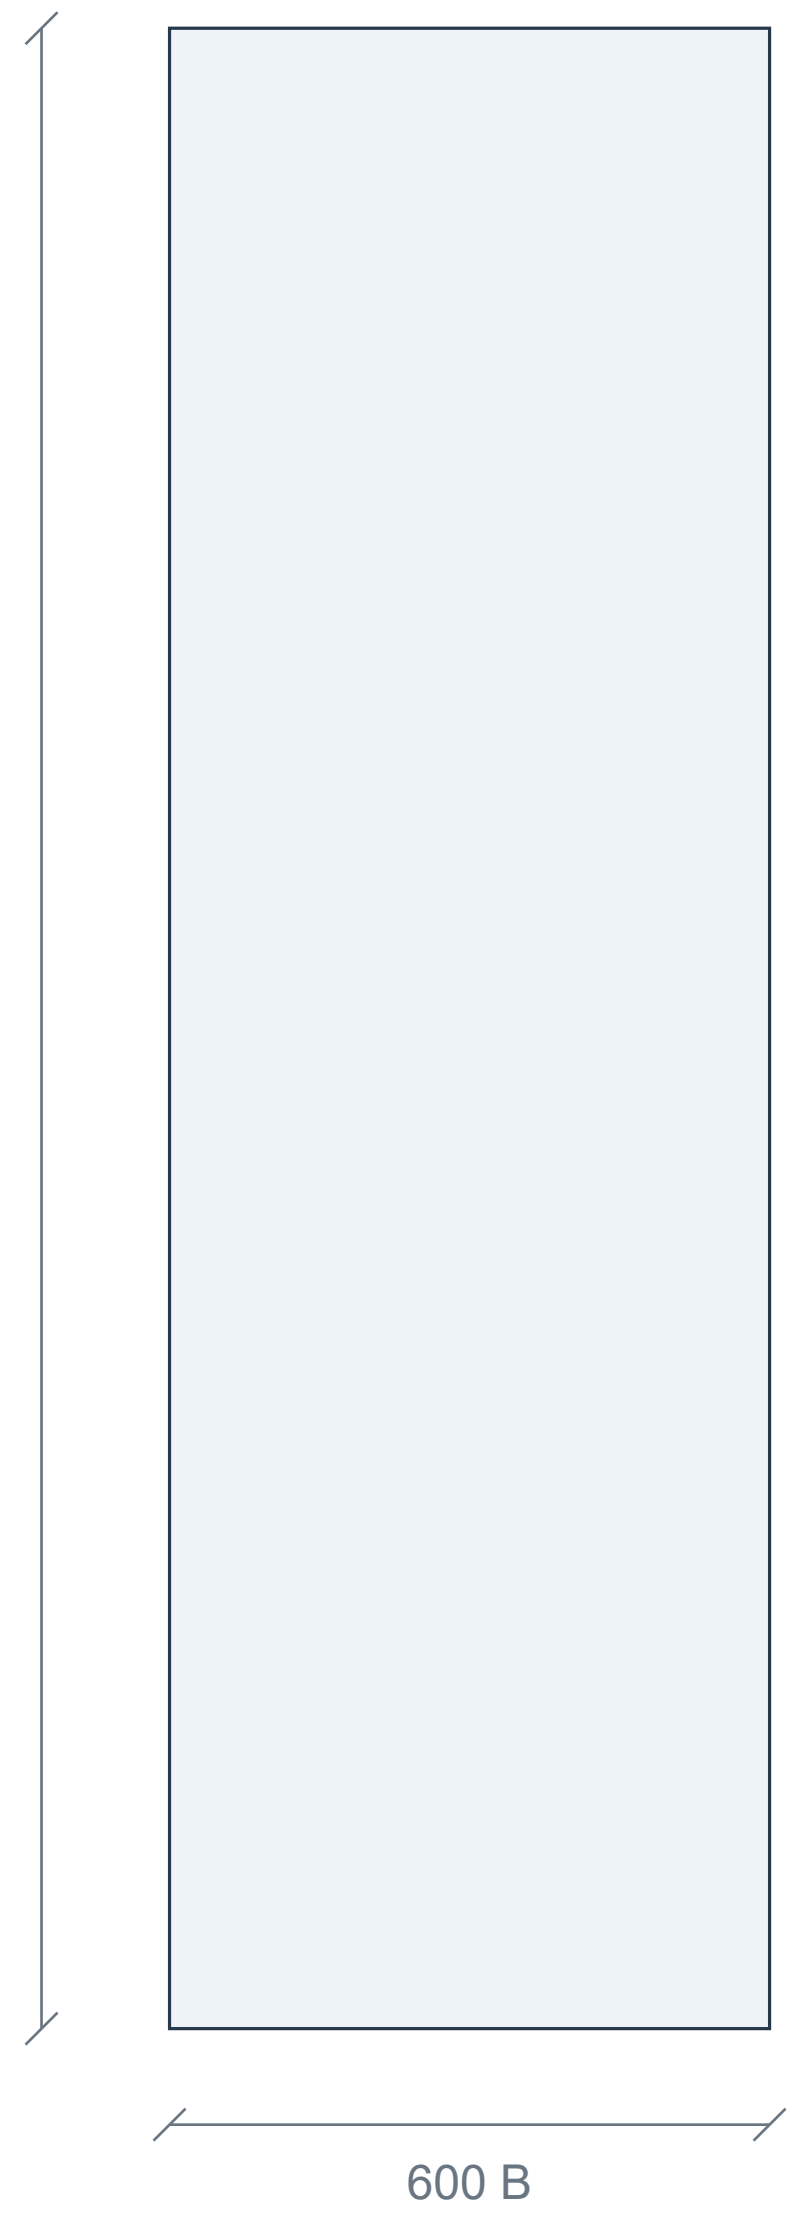

Корпус: Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 12 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

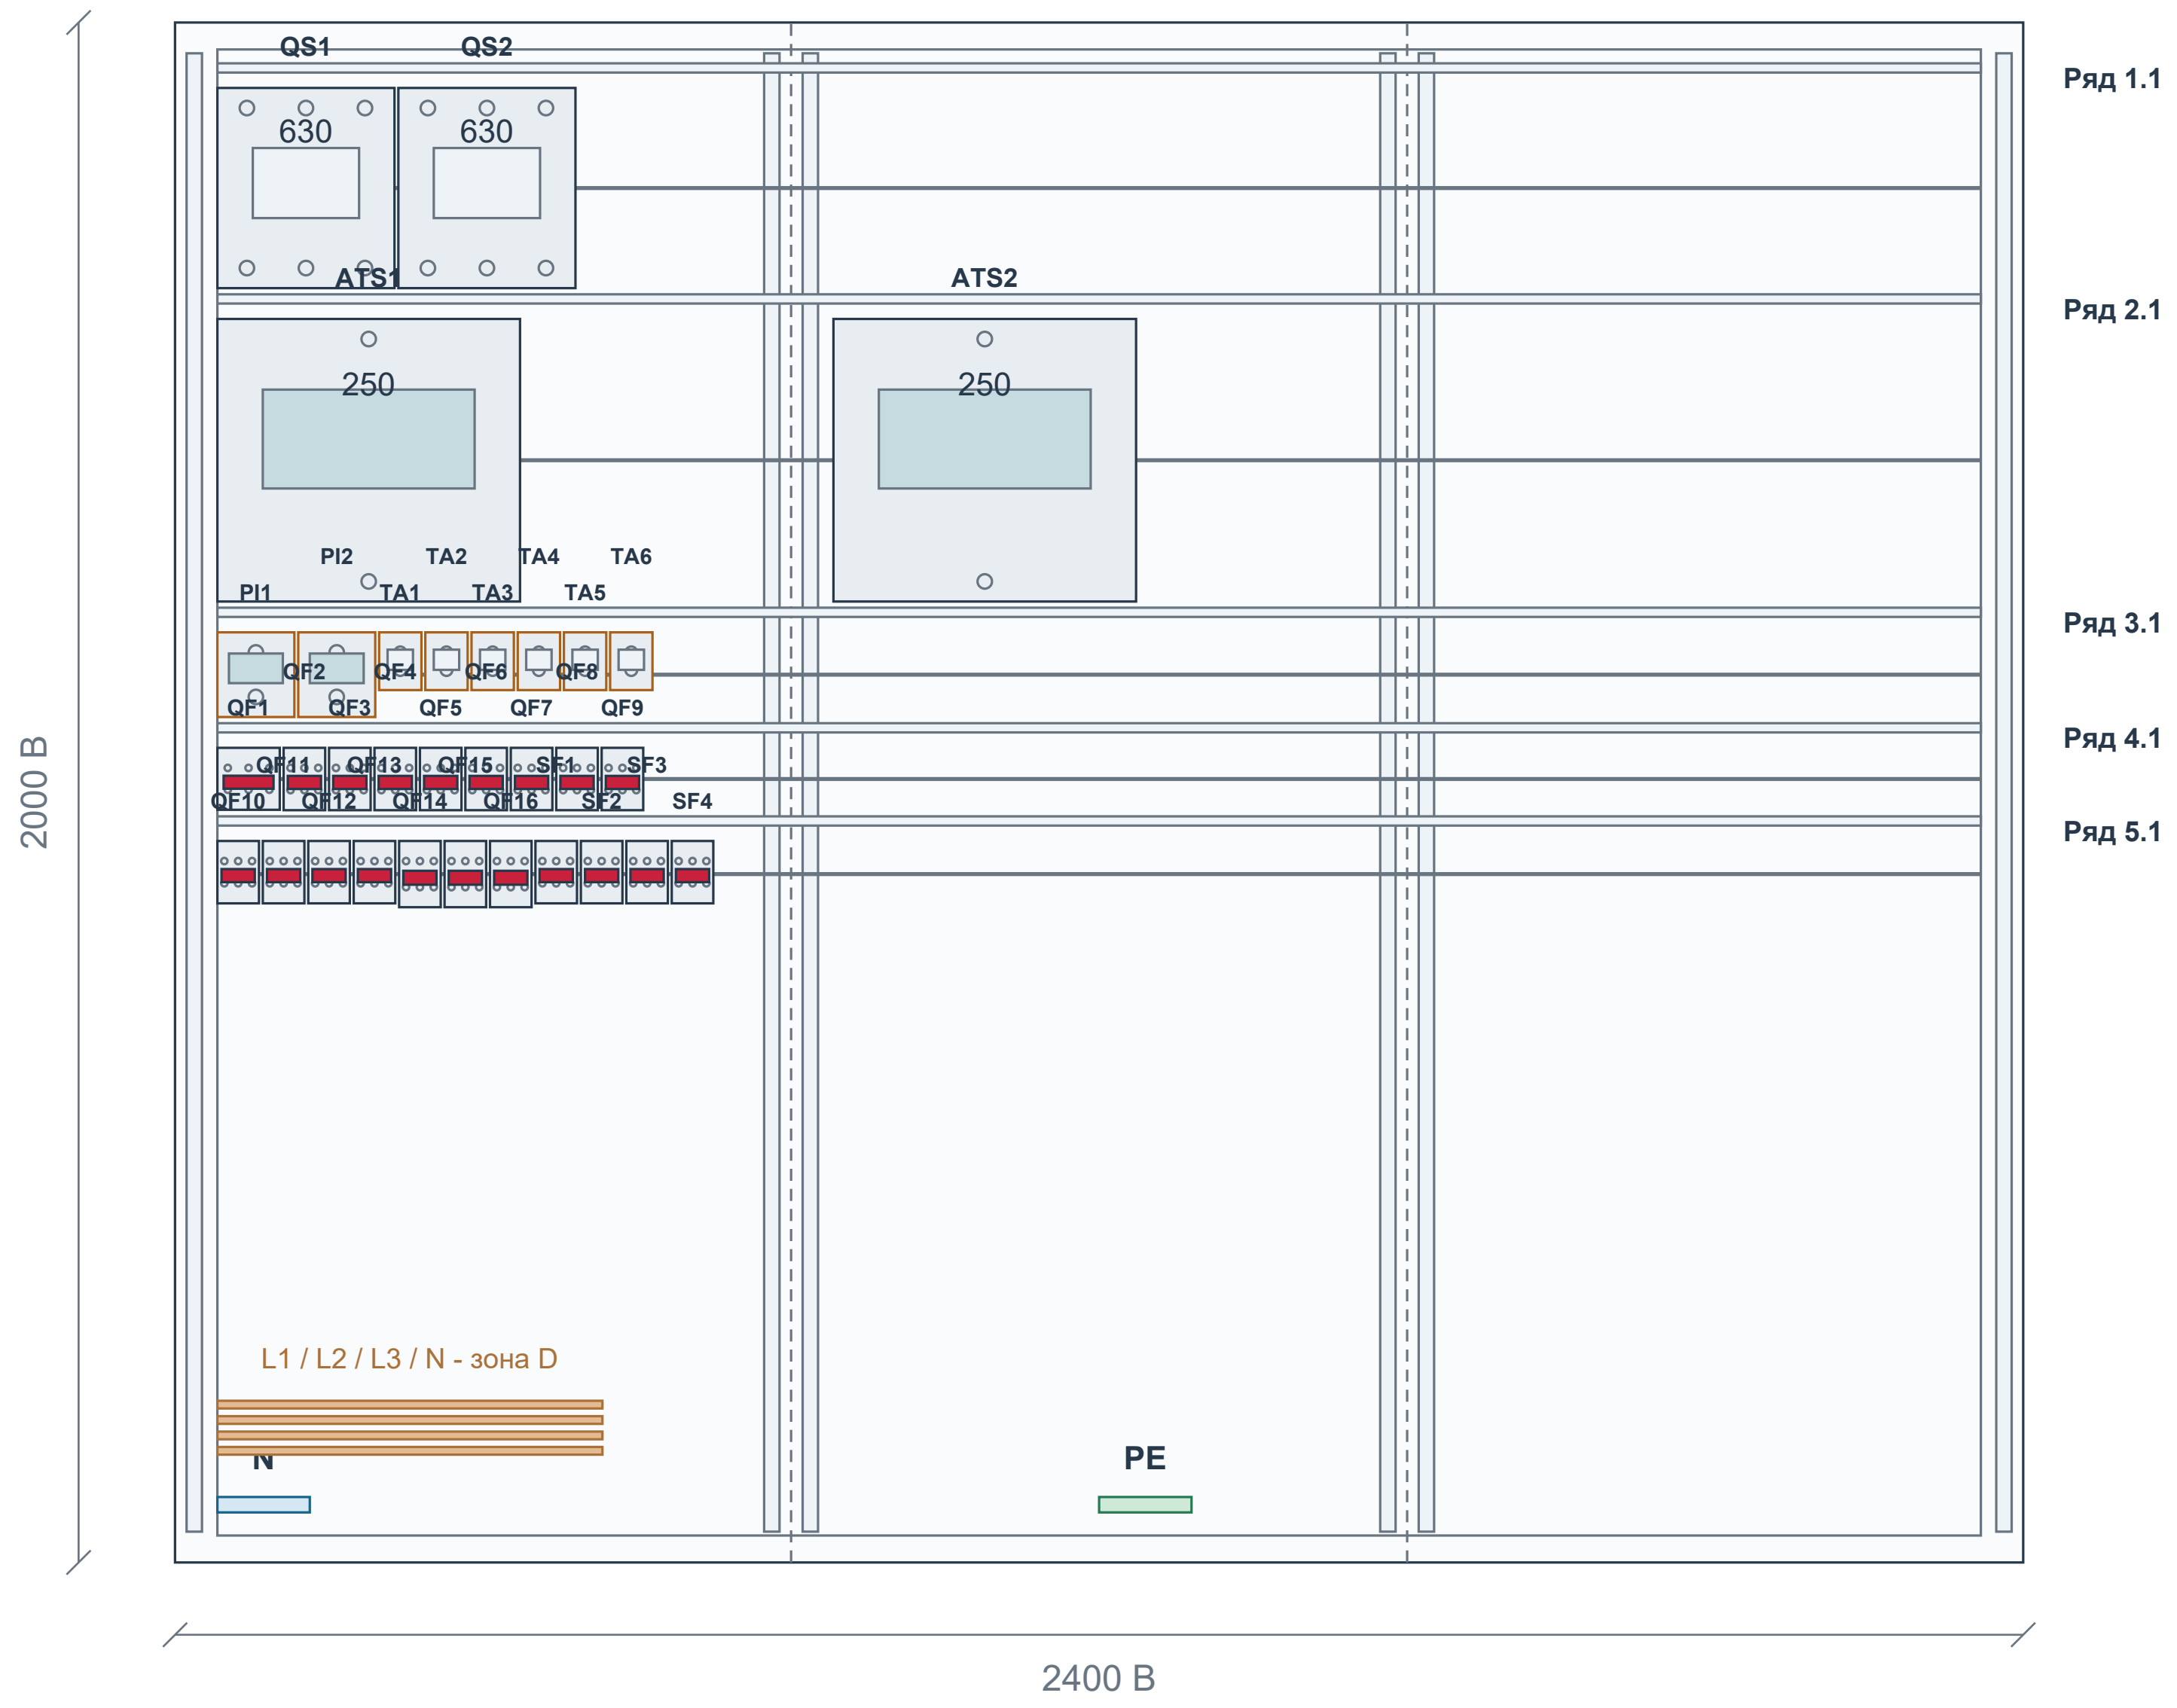
2000 В
2400 В
QS1
QS2
630
630
ATS1
ATS2
250
250
PI1
PI2
TA1
TA2
TA3
TA4
TA5
TA6
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QF11
QF12
QF13
QF14
QF15
QF16
SF1
SF2
SF3
SF4
L1 / L2 / L3 / N - зона D
N
PE
Ряд 1.1
Ряд 2.1
Ряд 3.1
Ряд 4.1
Ряд 5.1

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1 - QS2	NH40-630/3	1235	1.1	55...290	85	230 × 260
ATS1 - ATS2	NXZM-250S/3B	1236	2.1	55...855	385	393 × 367
PI1 - PI2	МИРТЕК-32	1237	3.1	55...160	792	?
TA1 - TA6	ТТИ-А	1238	3.1	265...565	792	?
QF1	NXB-125	1239	4.1	55	942	81 × 80.5
QF2 - QF4	NXB-63H	1240	4.1	141...259	942	54 × 81
QF5 - QF8	NXB-63H	1241	4.1	318...495	942	54 × 81
QF9	NXB-63H	1242	4.1	554	942	54 × 81
QF10 - QF11	NXB-63H	1243	5.1	55...114	1063	54 × 81
QF12 - QF13	NXB-63H	1244	5.1	173...232	1063	54 × 81
QF14 - QF16	NB1-63H	1245	5.1	291...409	1063	54 × 86
SF1 - SF4	NXB-63S	1246	5.1	468...645	1063	54 × 81

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

У 8 аппаратов габариты не заполнены; янтарные контуры условные. Фактический размер и посадку проверить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Актуальная спецификация

ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1272 | ЭОМ, PDF стр. 2

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1273	719-15923	Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)	шт	2	2	teksan f	Корпус
1274	256780	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3В 125А (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1275	PYS-001	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	шт	1	1	pys	Учет
1276	ст-9951729	Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!!	шт	3	3	ekt	Учет
1277	179870	Авт. выкл. NB1-63H 3P 20А 10кА х-ка С (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1278	813874	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32А 10кА х-ка С (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1279	813873	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25А 10кА х-ка С (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1280	813877	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63А 10кА х-ка С (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1281	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка С (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1283	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1284	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1285	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	2	2	chint	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 2

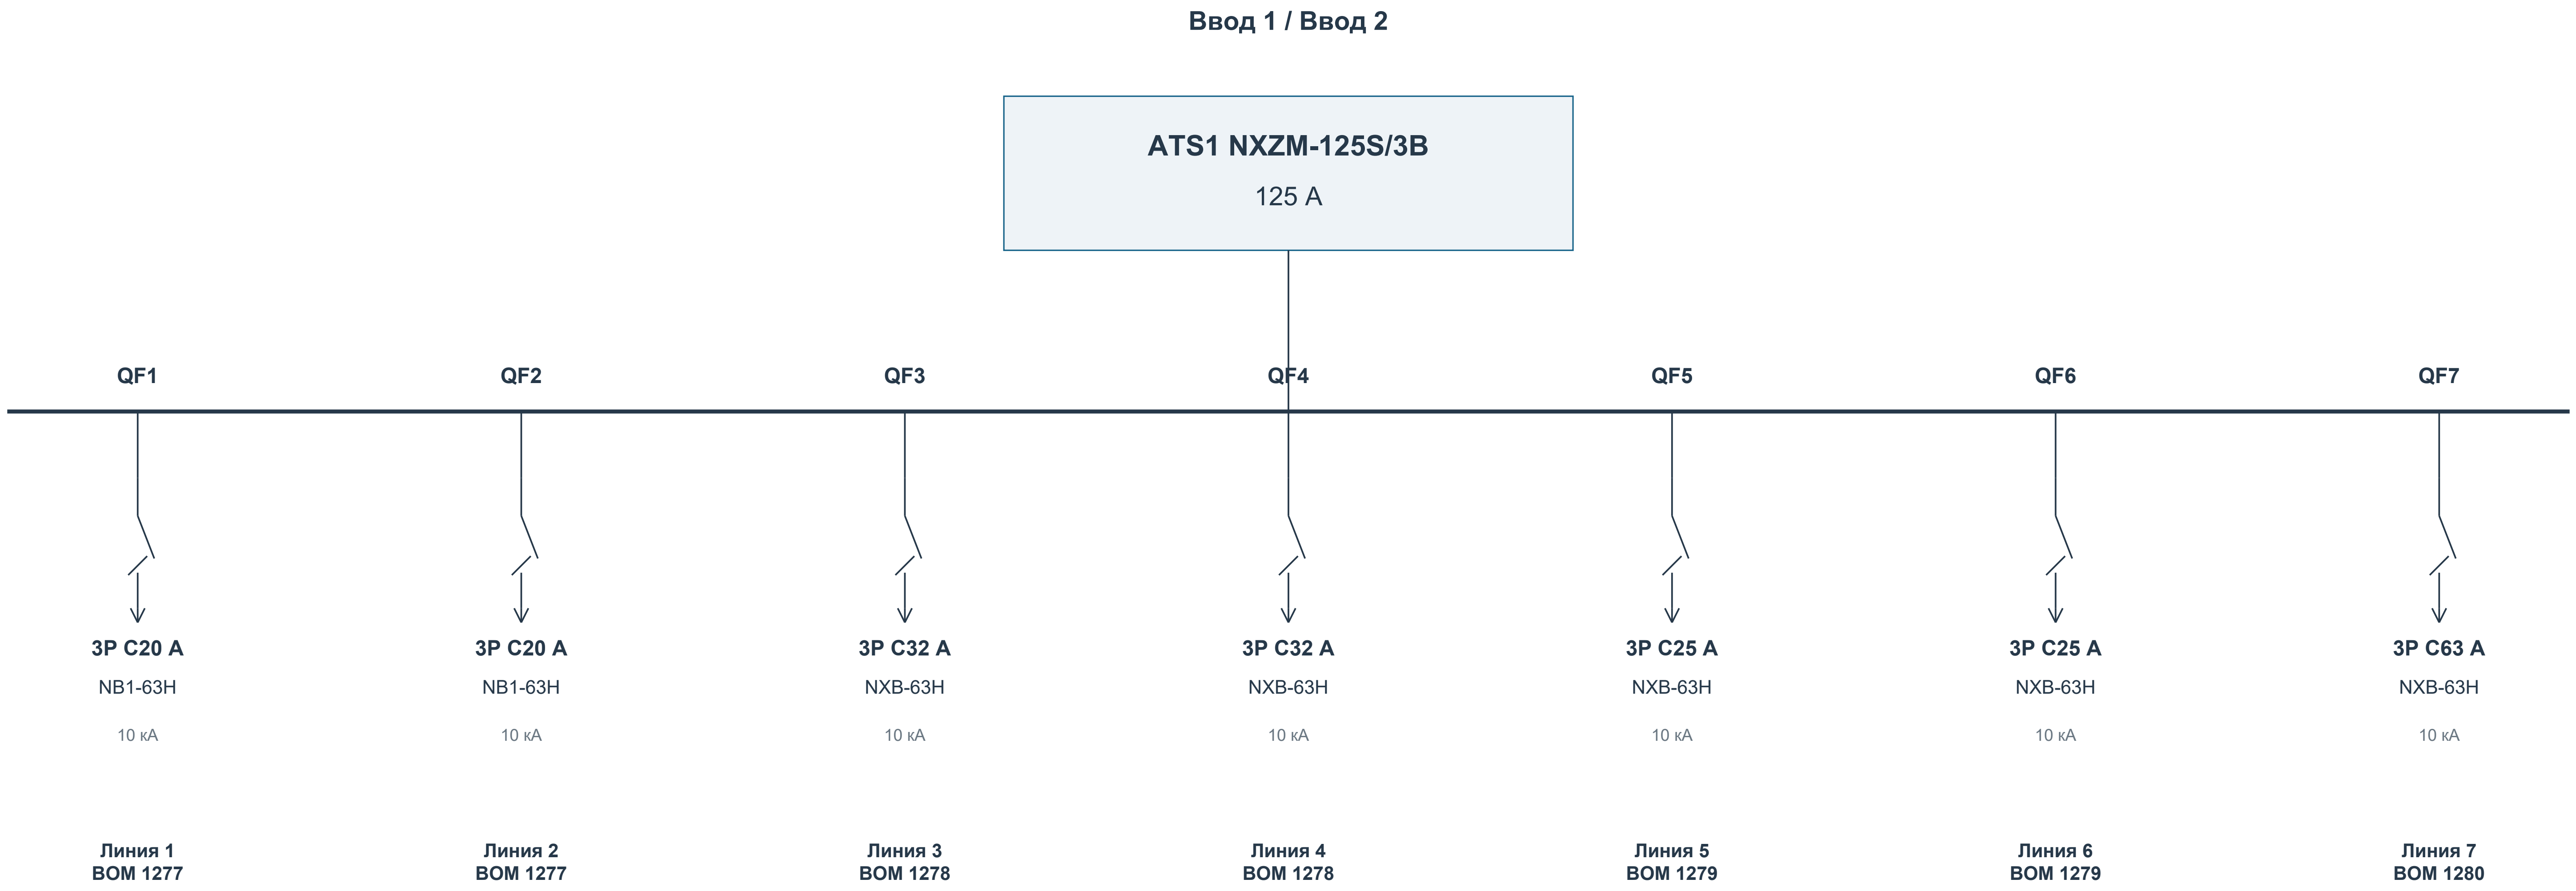
Ввод 1 / Ввод 2
ATS1 NXZM-125S/3B
125 A
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
3P C20 A
NB1-63H
10 кА
Линия 1
BOM 1277
3P C20 A
NB1-63H
10 кА
Линия 2
BOM 1277
3P C32 A
NXB-63H
10 кА
Линия 3
BOM 1278
3P C32 A
NXB-63H
10 кА
Линия 4
BOM 1278
3P C25 A
NXB-63H
10 кА
Линия 5
BOM 1279
3P C25 A
NXB-63H
10 кА
Линия 6
BOM 1279
3P C63 A
NXB-63H
10 кА
Линия 7
BOM 1280

Управление / учет: PI1 МИРТЕК-32 × 1; TA1 - TA3 ТТИ-А × 3; SF1 - SF2 NXB-63S × 2; HL1 - HL6 ND16-22D/2 × 6

Данные исходного проекта: Ру 234,2 кВт | Рр 151,9 кВт | Iр 253,9 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

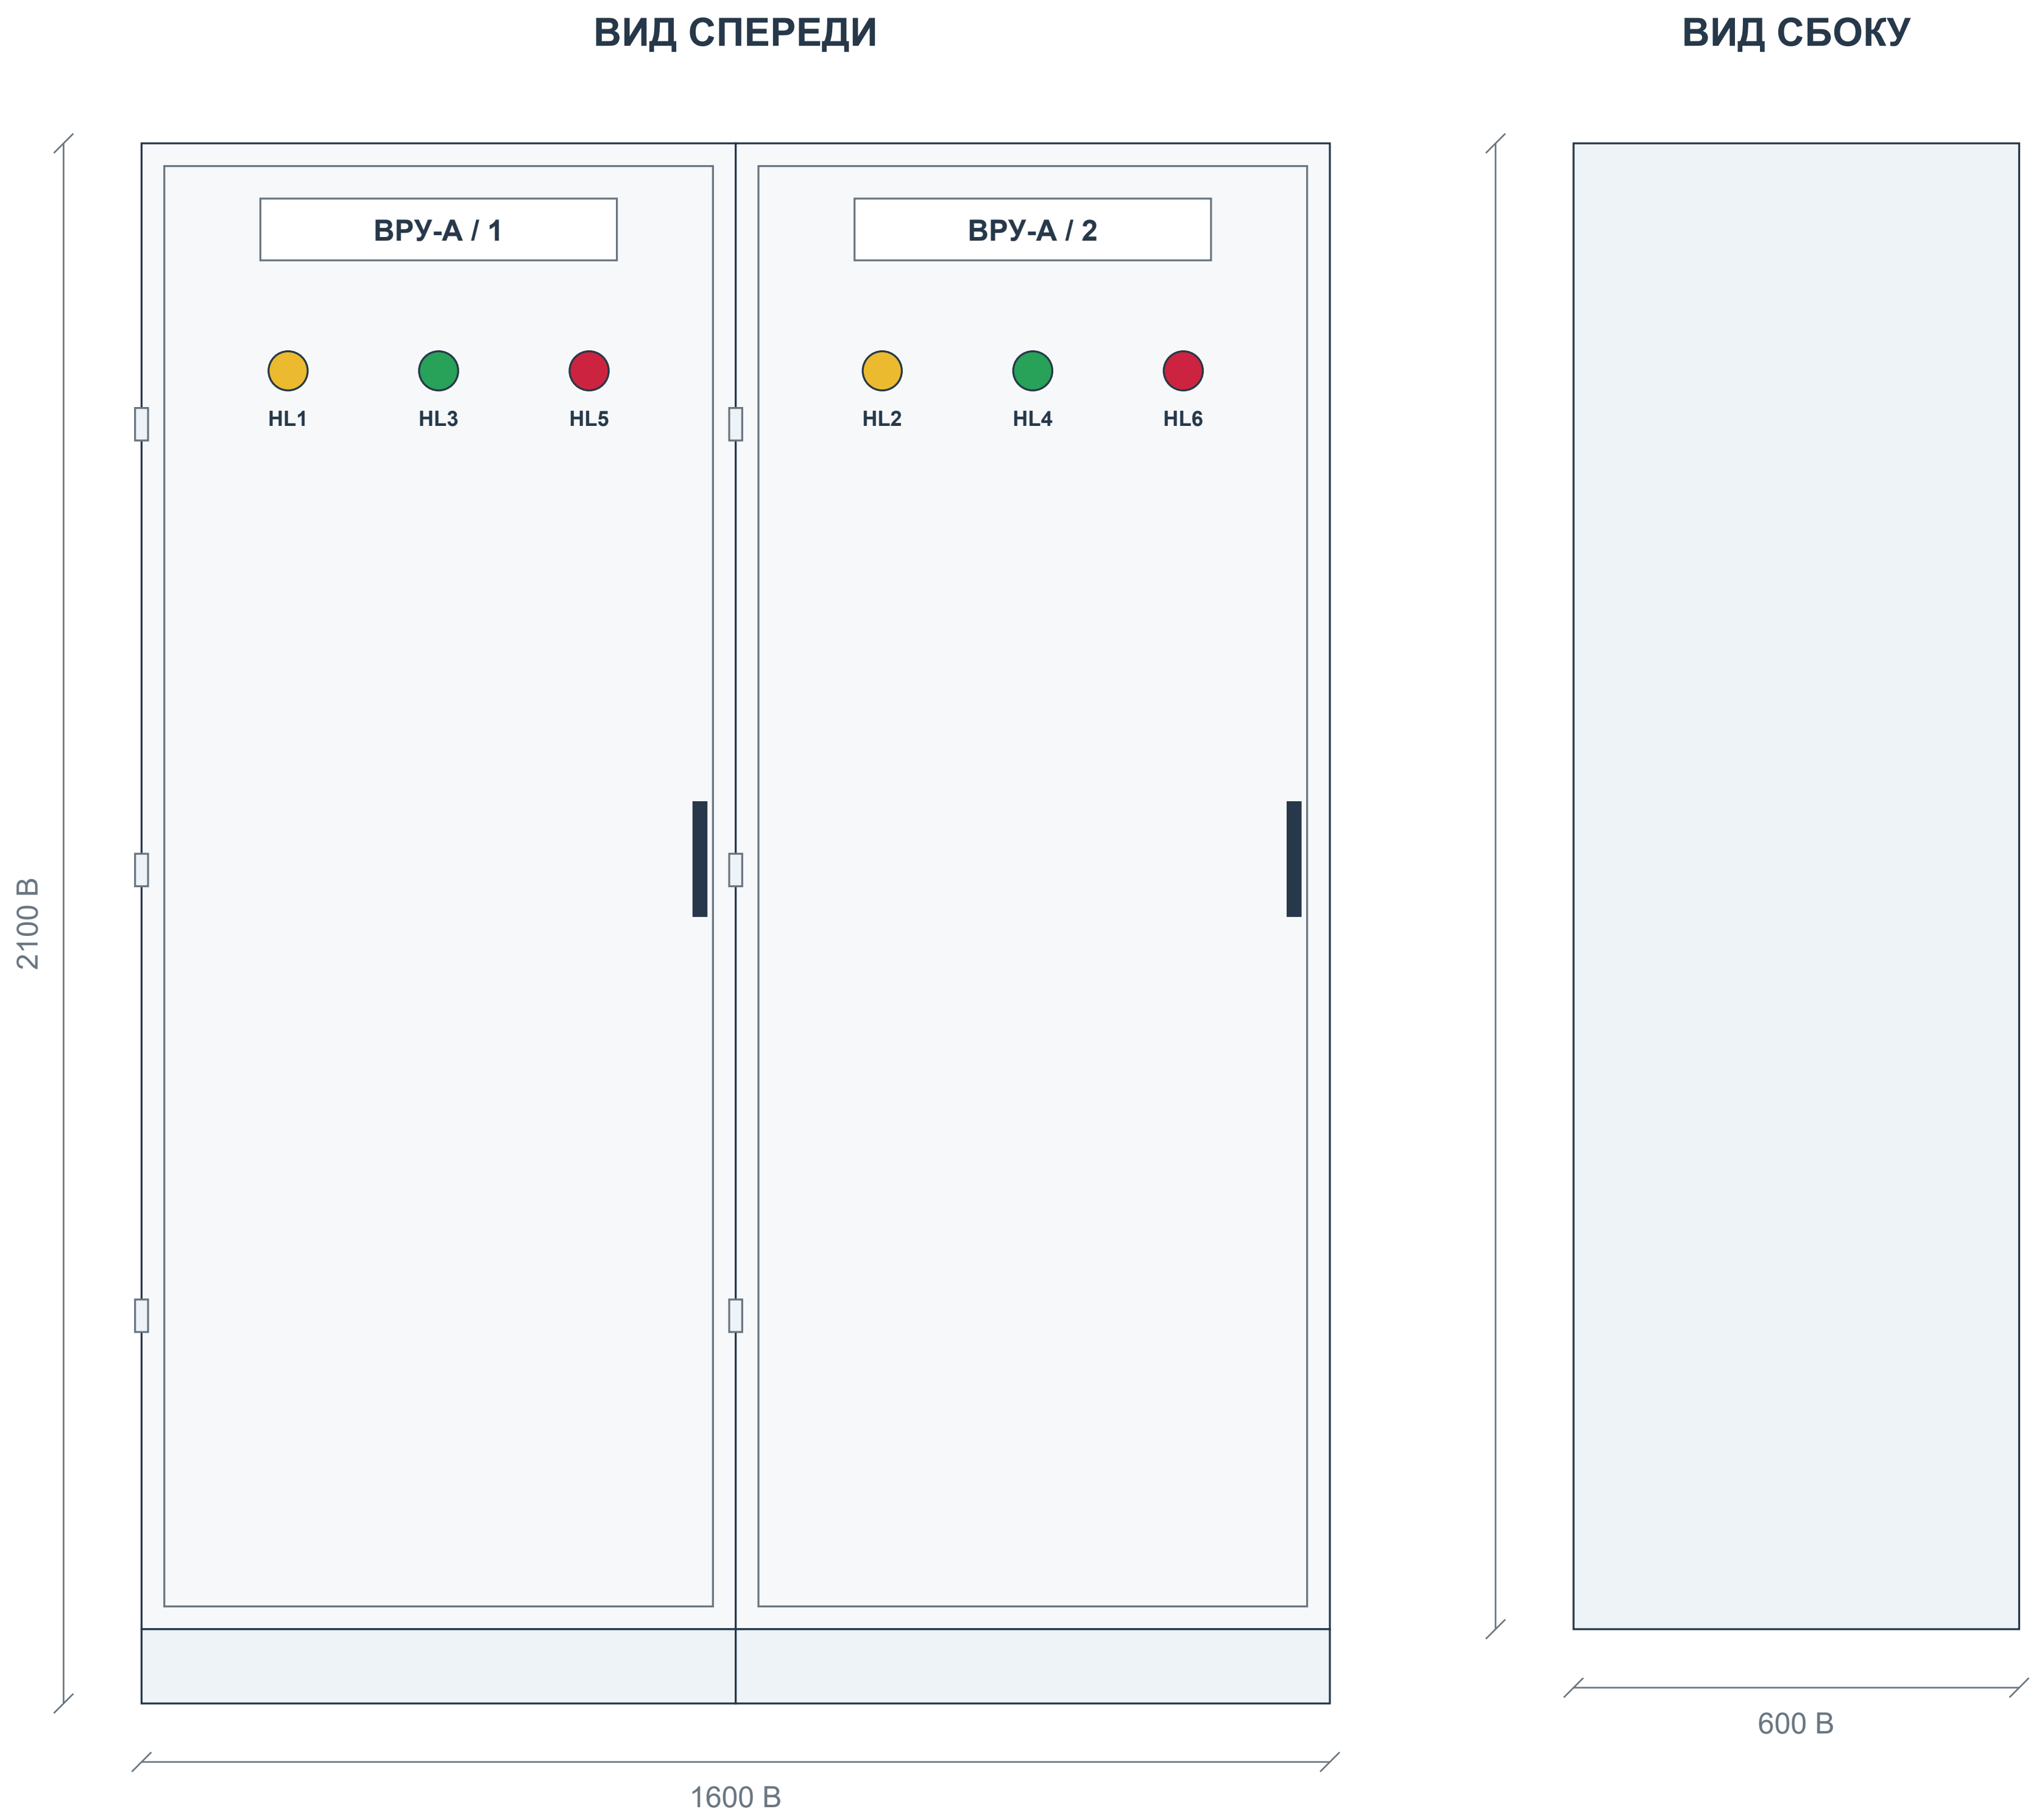

Корпус: Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 6 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

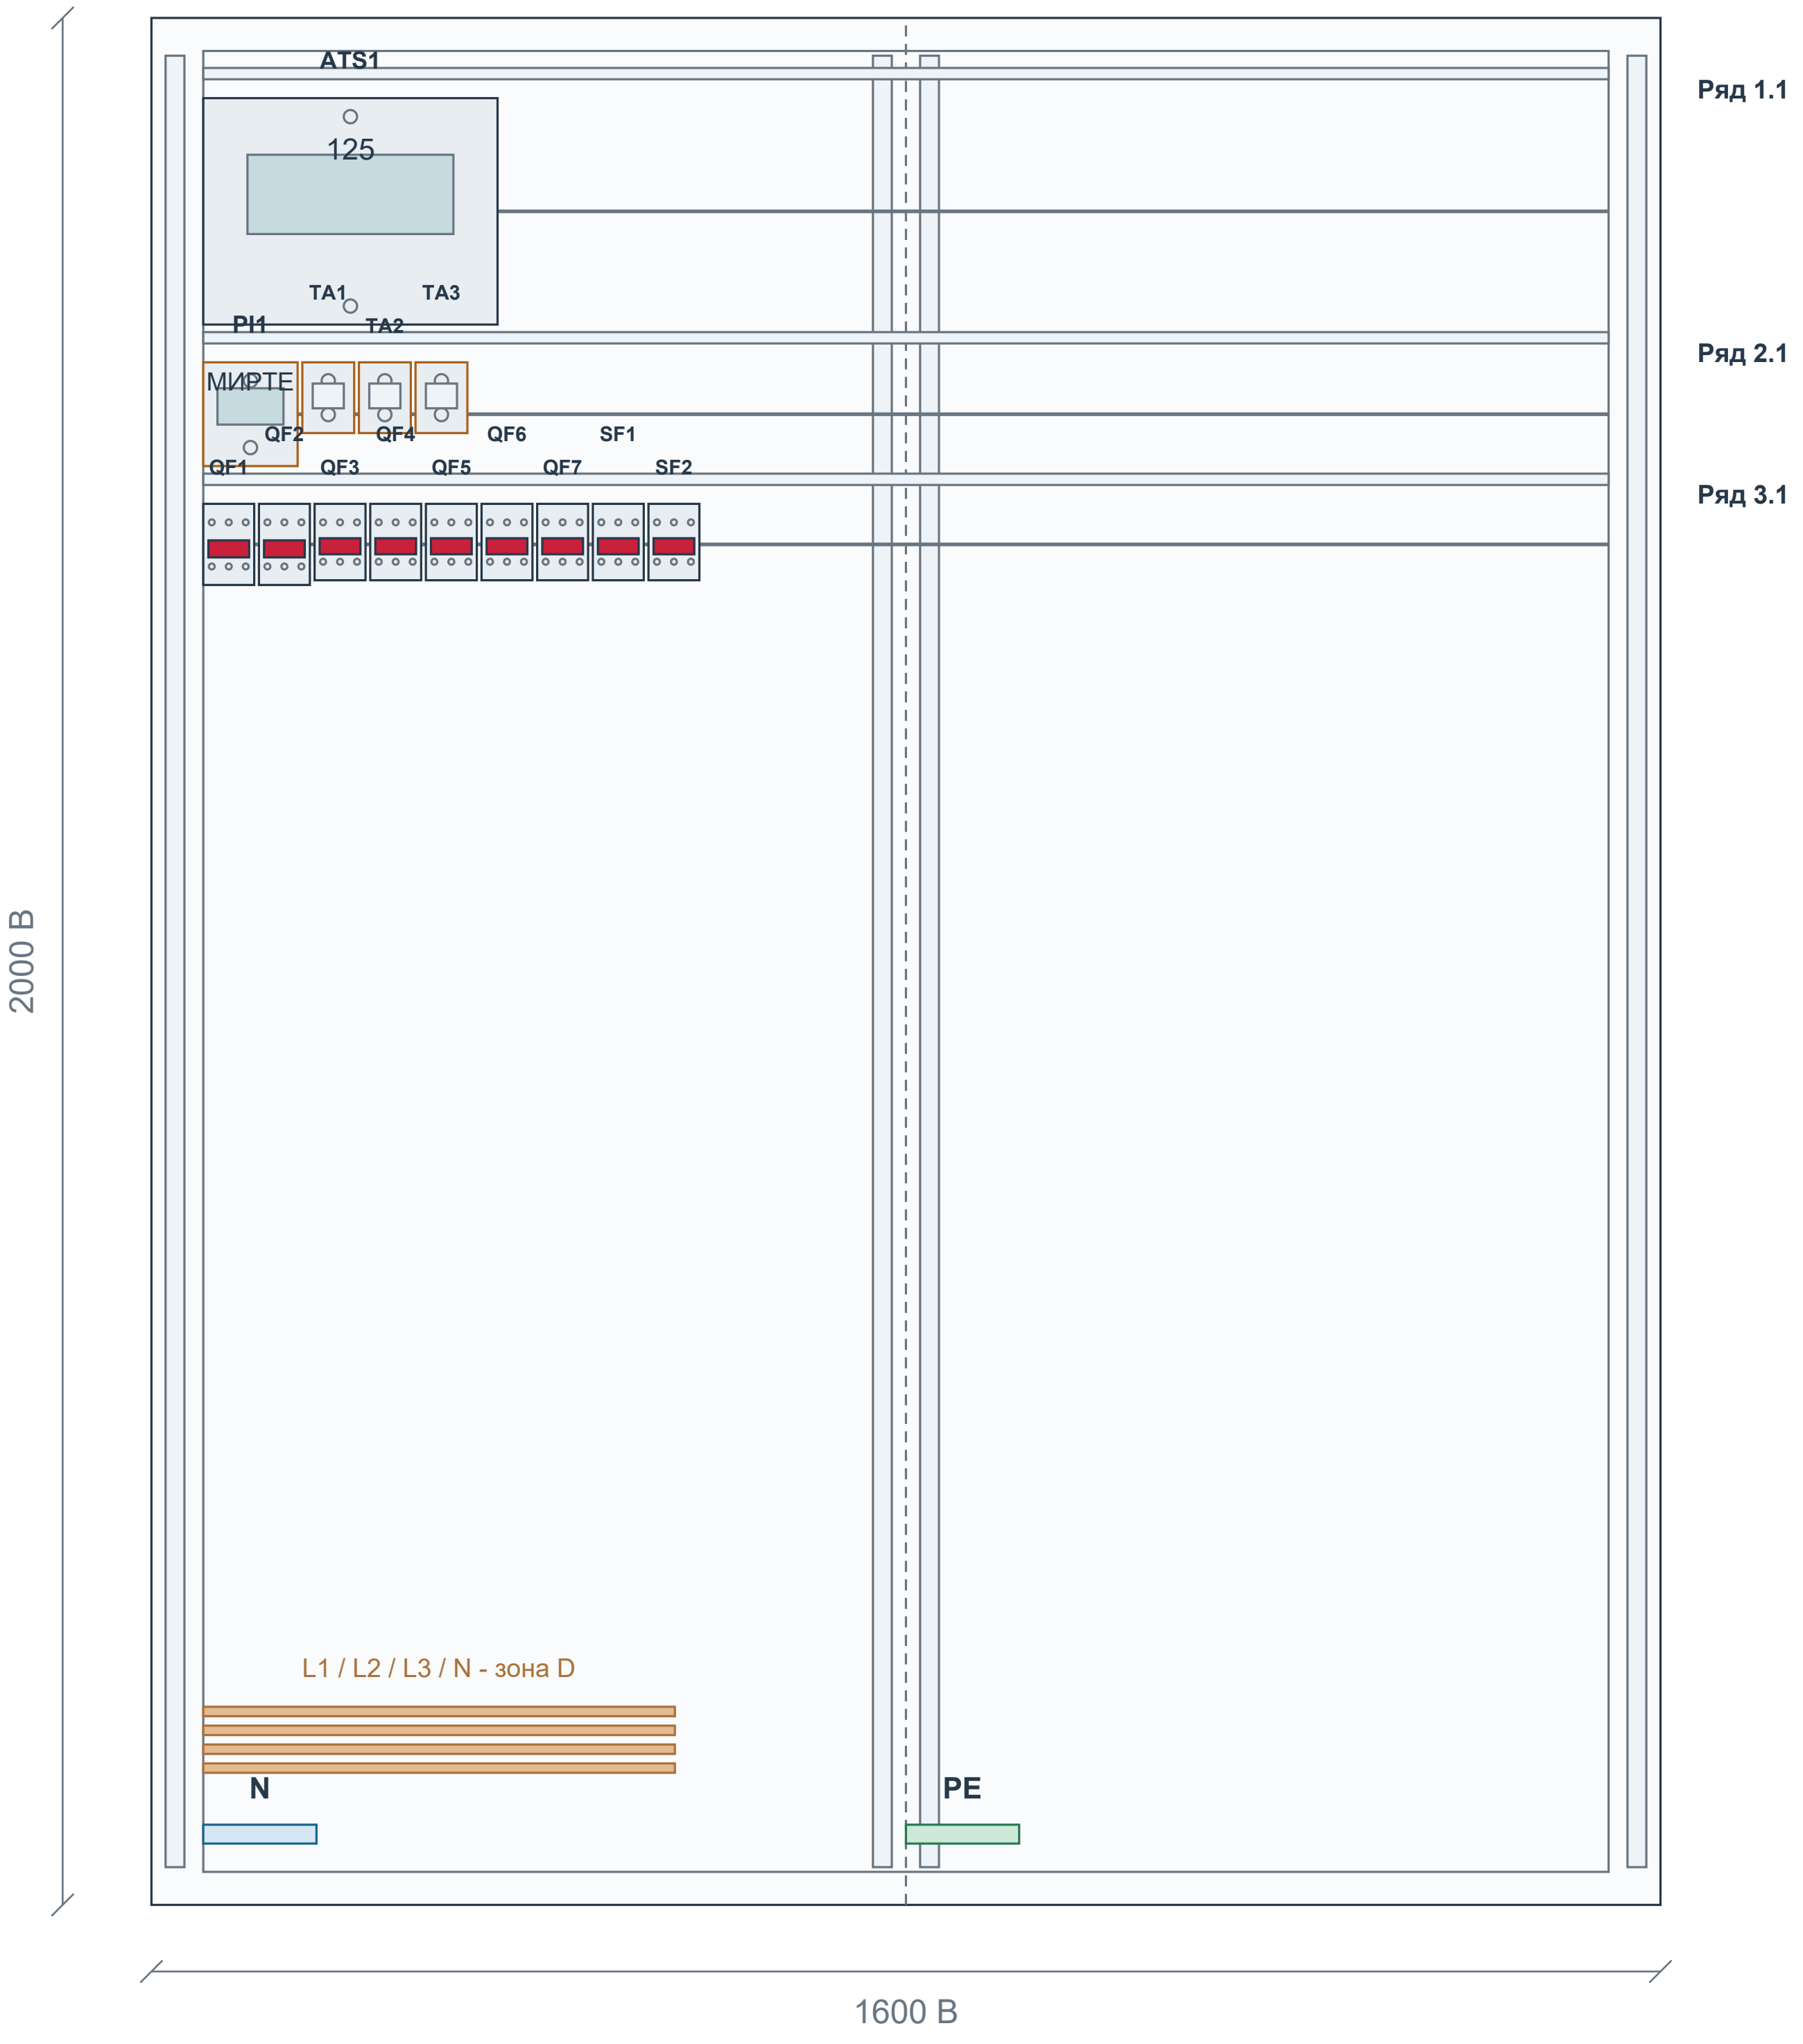

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
ATS1	NXZM-125S/3B	1274	1.1	55	85	312 × 240
PI1	МИРТЕК-32	1275	2.1	55	365	?
TA1 - TA3	ТТИ-А	1276	2.1	160...280	365	?
QF1 - QF2	NB1-63H	1277	3.1	55...114	515	54 × 86
QF3 - QF4	NXB-63H	1278	3.1	173...232	515	54 × 81
QF5 - QF6	NXB-63H	1279	3.1	291...350	515	54 × 81
QF7	NXB-63H	1280	3.1	409	515	54 × 81
SF1 - SF2	NXB-63S	1281	3.1	468...527	515	54 × 81

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

У 4 аппаратов габариты не заполнены; янтарные контуры условные. Фактический размер и посадку проверить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Актуальная спецификация

ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1306 | ЭОМ, PDF стр. 3

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1307	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	шт	2	2	teksan f	Корпус
1308	393393	Перекидной рубильник NH40-400/3CSW, 3P, 400A, 3 положения I-0-II , выносная рукоятка управления	шт	1	1	chint	Ввод
1309	521218	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400A	шт	3	3	chint	Ввод
1310	521189	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A	шт	3	3	chint	Отход.
1311	521234	Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125A	шт	3	3	chint	Отход.
1312	521340	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25A	шт	6	6	chint	Отход.
1313	521348	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80A	шт	3	3	chint	Отход.
1314	PYS-001	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	шт	1	1	pys	Учет
1315	270300025	Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK	шт	3	3	ekt	Учет
1316	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1317	521368	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	шт	3	3	chint	Ввод
1319	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1320	521367	Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	шт	3	3	chint	Отход.
1321	521366	Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A	шт	3	3	chint	Отход.
1322	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	шт	9	9	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 3

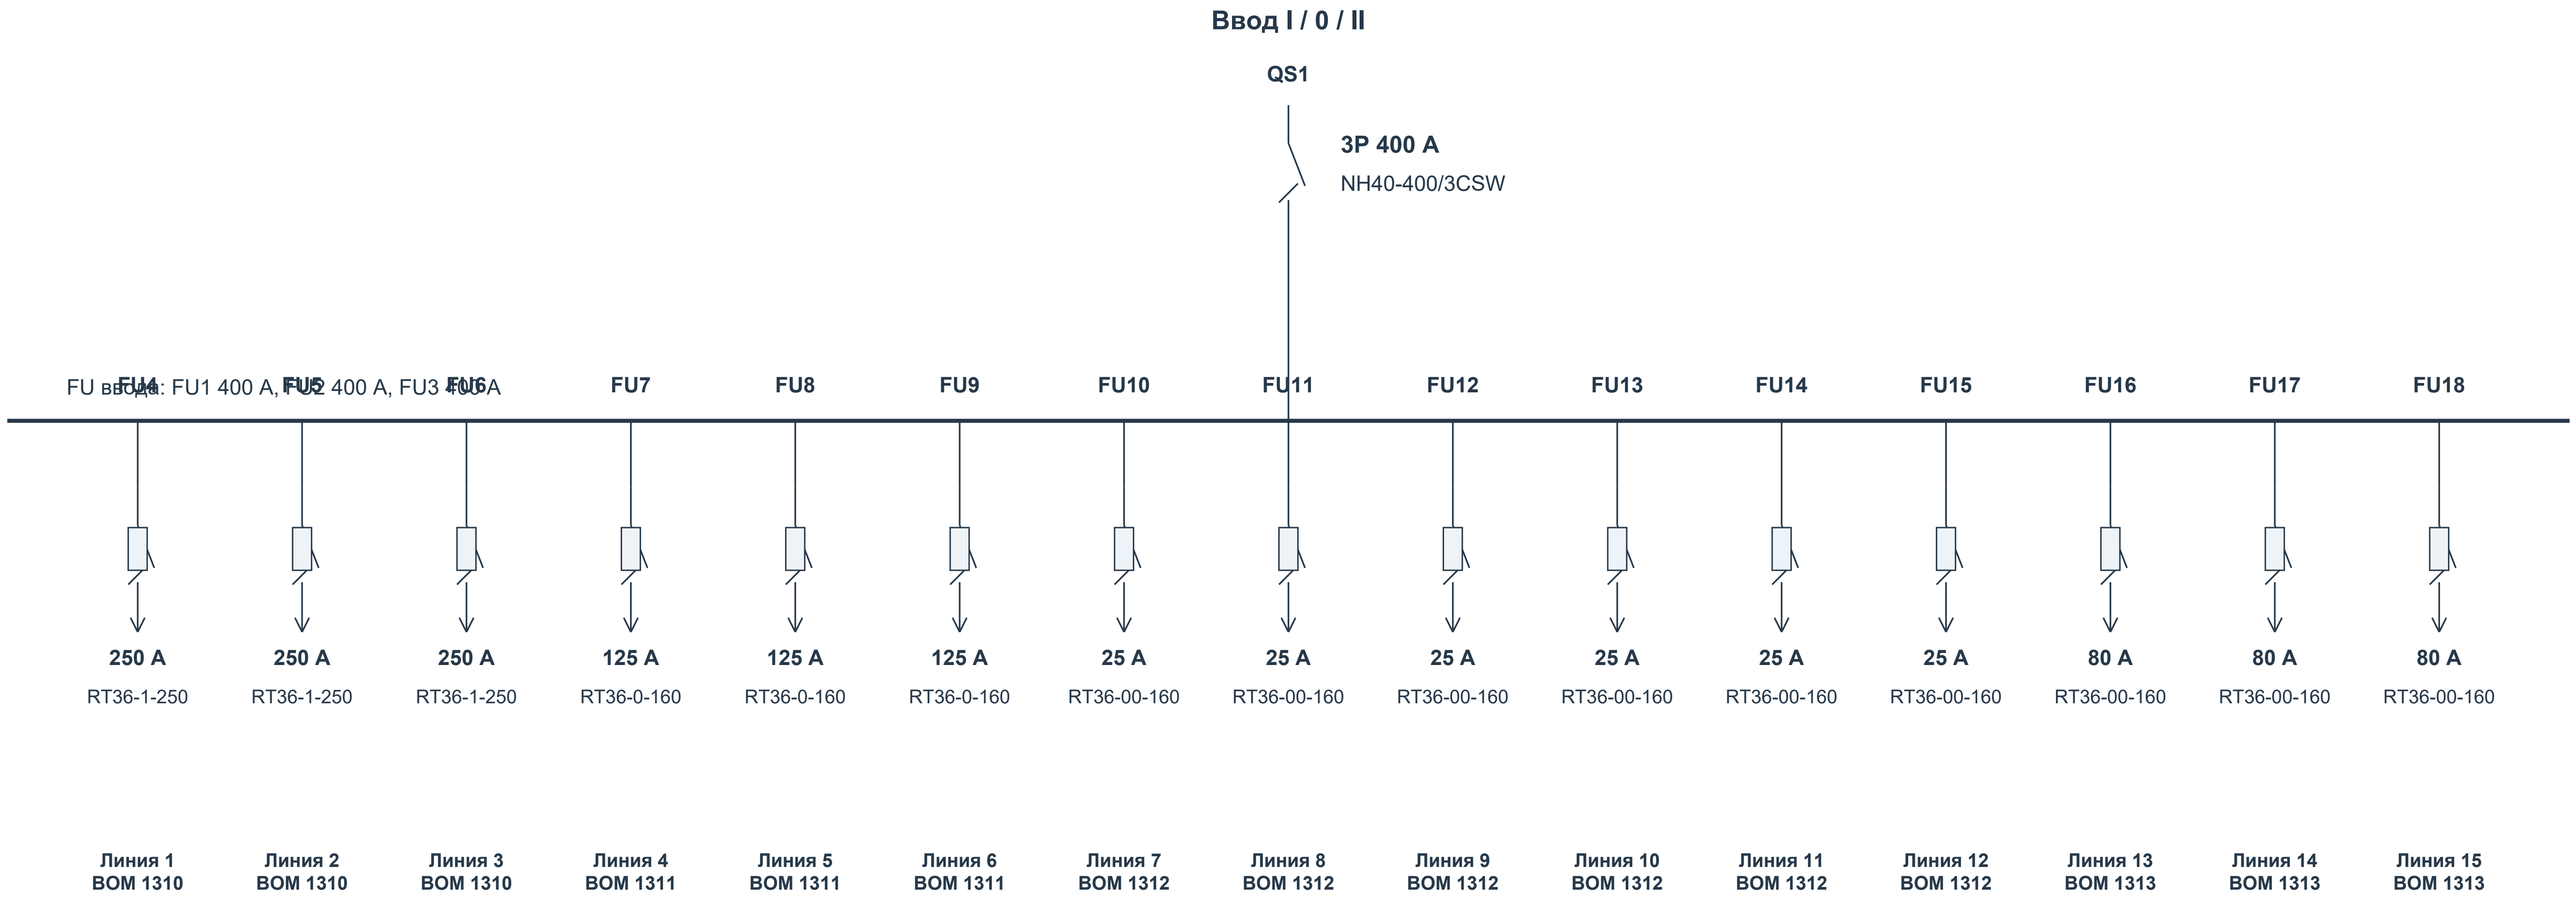
Ввод I / 0 / II
QS1
3P 400 A
NH40-400/3CSW
FU ввода: FU1 400 A, FU2 400 A, FU3 400 A
FU4
FU5
FU6
FU7
FU8
FU9
FU10
FU11
FU12
FU13
FU14
FU15
FU16
FU17
FU18
250 A
RT36-1-250
250 A
RT36-1-250
250 A
RT36-1-250
125 A
RT36-0-160
125 A
RT36-0-160
125 A
RT36-0-160
25 A
RT36-00-160
25 A
RT36-00-160
25 A
RT36-00-160
25 A
RT36-00-160
25 A
RT36-00-160
25 A
RT36-00-160
80 A
RT36-00-160
80 A
RT36-00-160
80 A
RT36-00-160
Линия 1
BOM 1310
Линия 2
BOM 1310
Линия 3
BOM 1310
Линия 4
BOM 1311
Линия 5
BOM 1311
Линия 6
BOM 1311
Линия 7
BOM 1312
Линия 8
BOM 1312
Линия 9
BOM 1312
Линия 10
BOM 1312
Линия 11
BOM 1312
Линия 12
BOM 1312
Линия 13
BOM 1313
Линия 14
BOM 1313
Линия 15
BOM 1313

Управление / учет: PI1 МИРТЕК-32 × 1; TA1 - TA3 ТТИ-40 × 3; SF1 - SF2 NXB-63S × 2; XA1 - XA3 RT36-2-400 × 3; HL1 - HL2 ND16-22D/2 × 2; XA4 - XA6 RT36-1-250 × 3; XA7 - XA9 RT36-0-160 × 3; XA10 - XA18 RT36-00-160 × 9

Данные исходного проекта: Ру 399.3 кВт | Рр 239,8 кВт | Iр 388,0 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

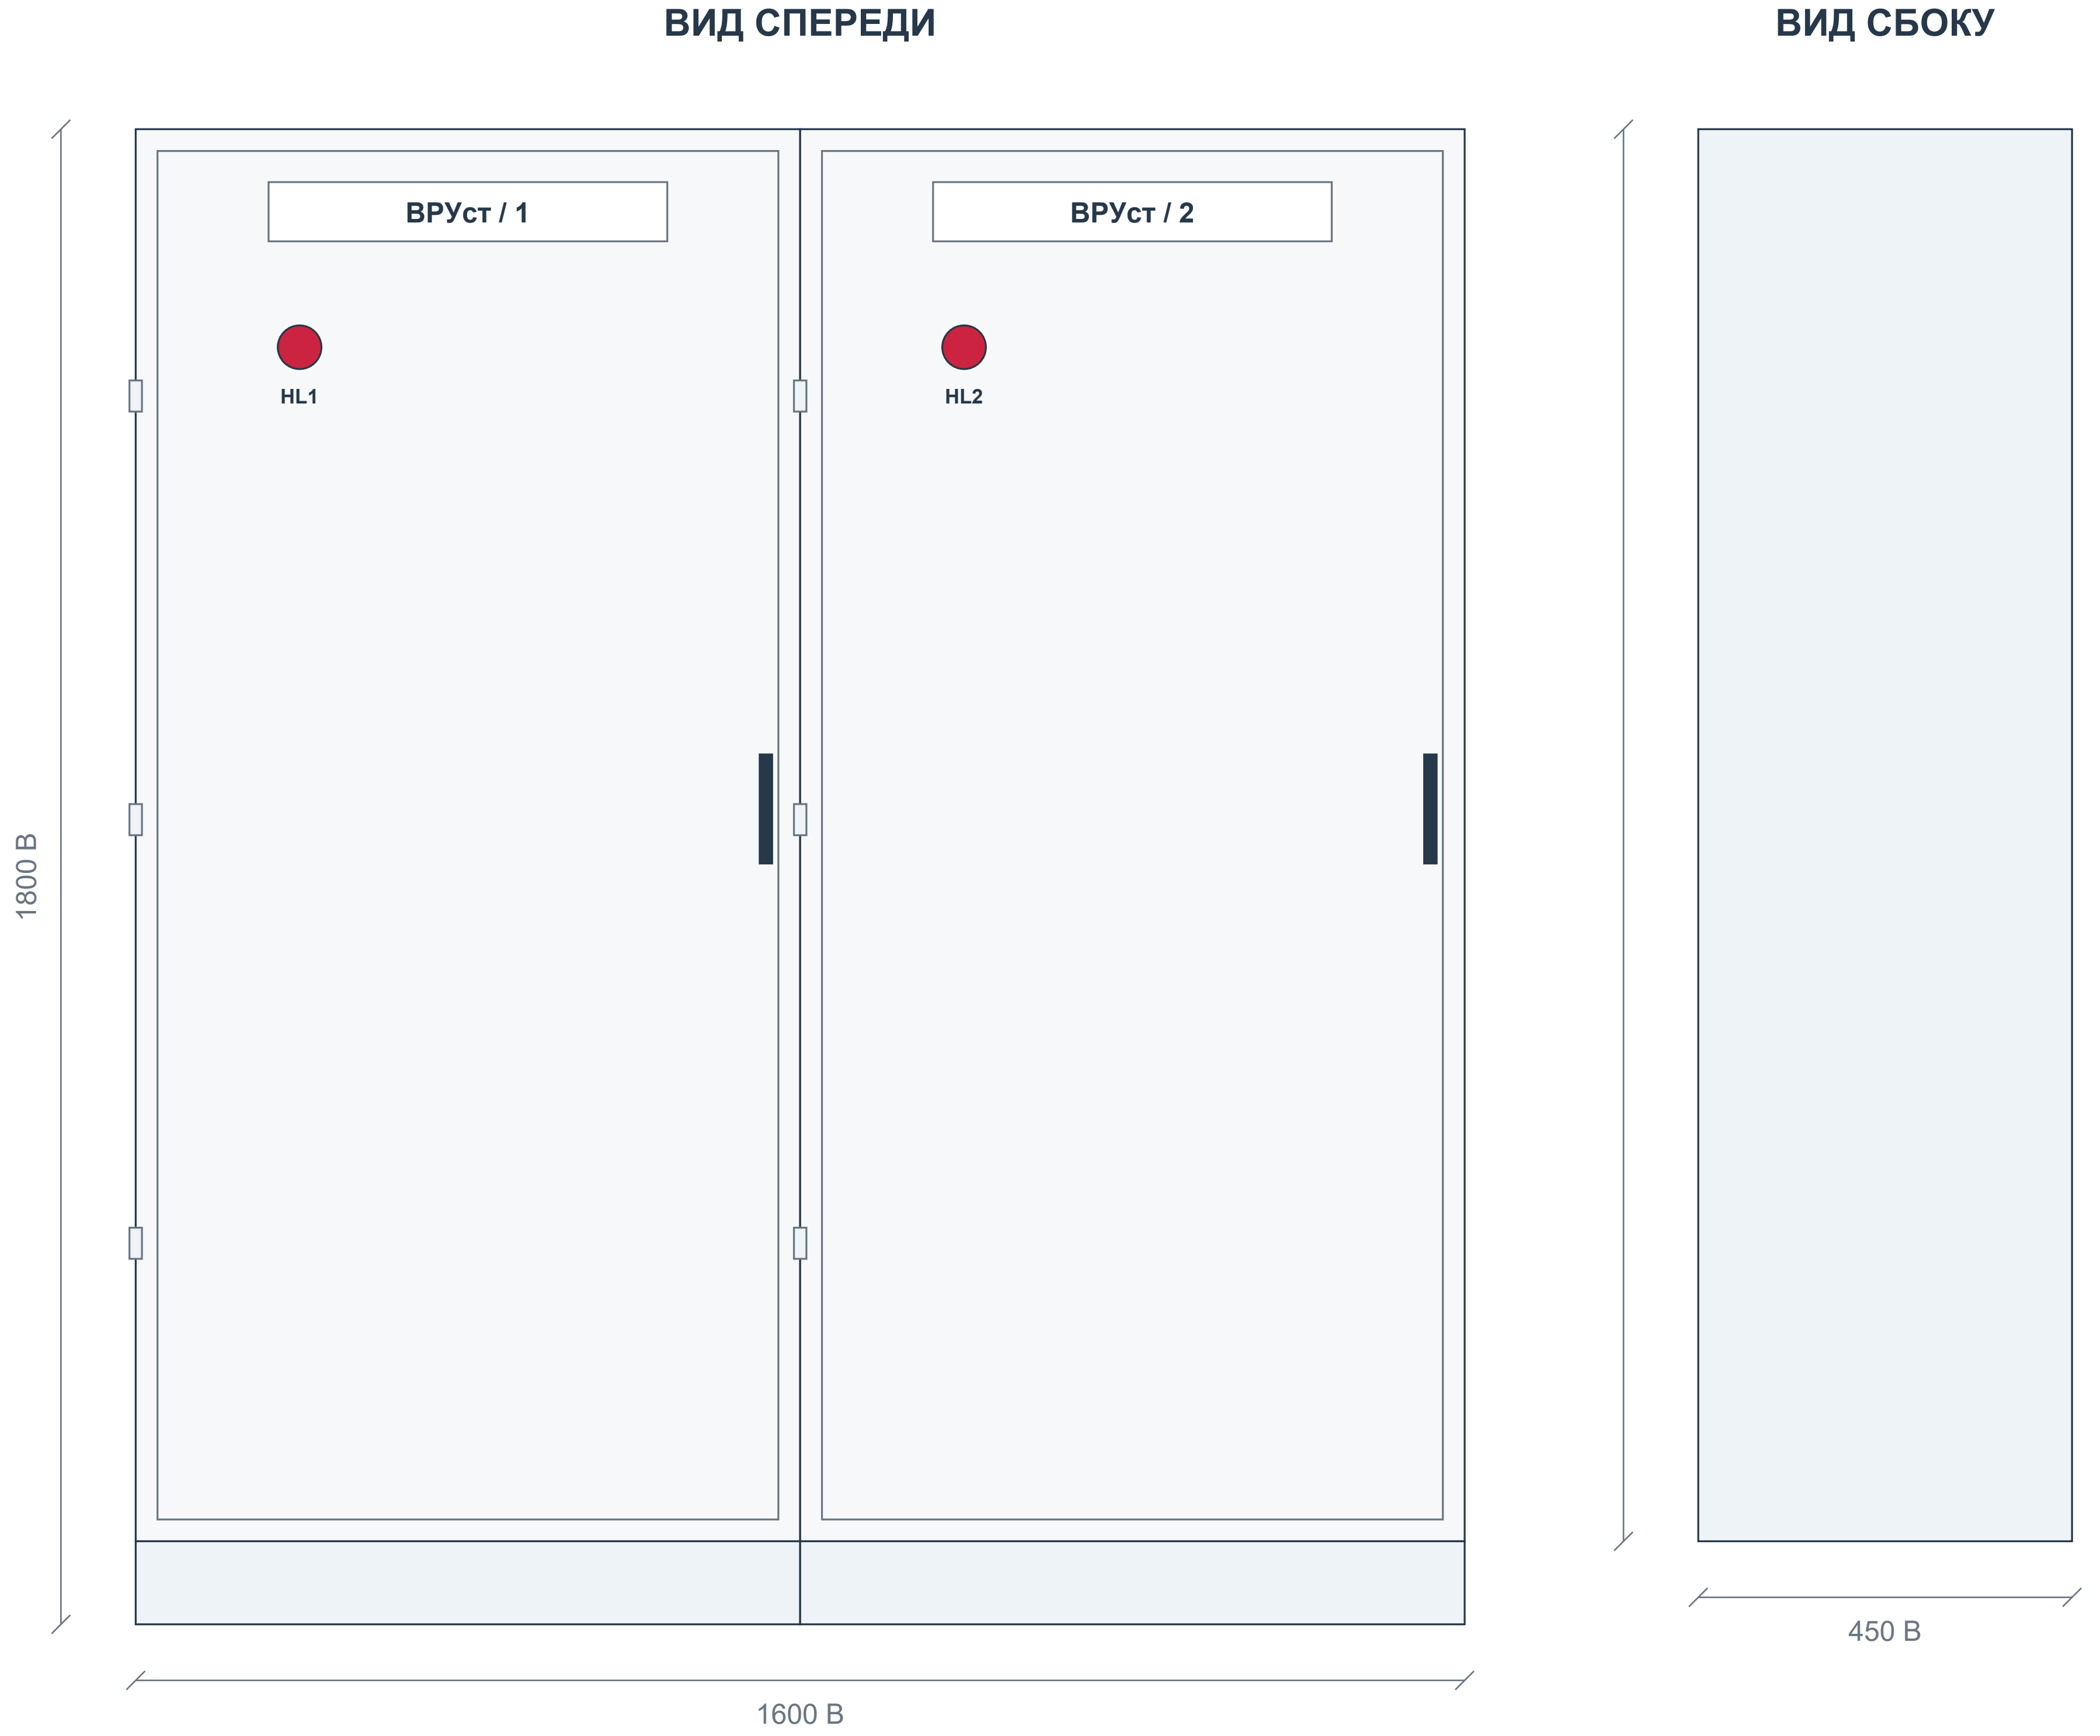

Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+10СМ База

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 2 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

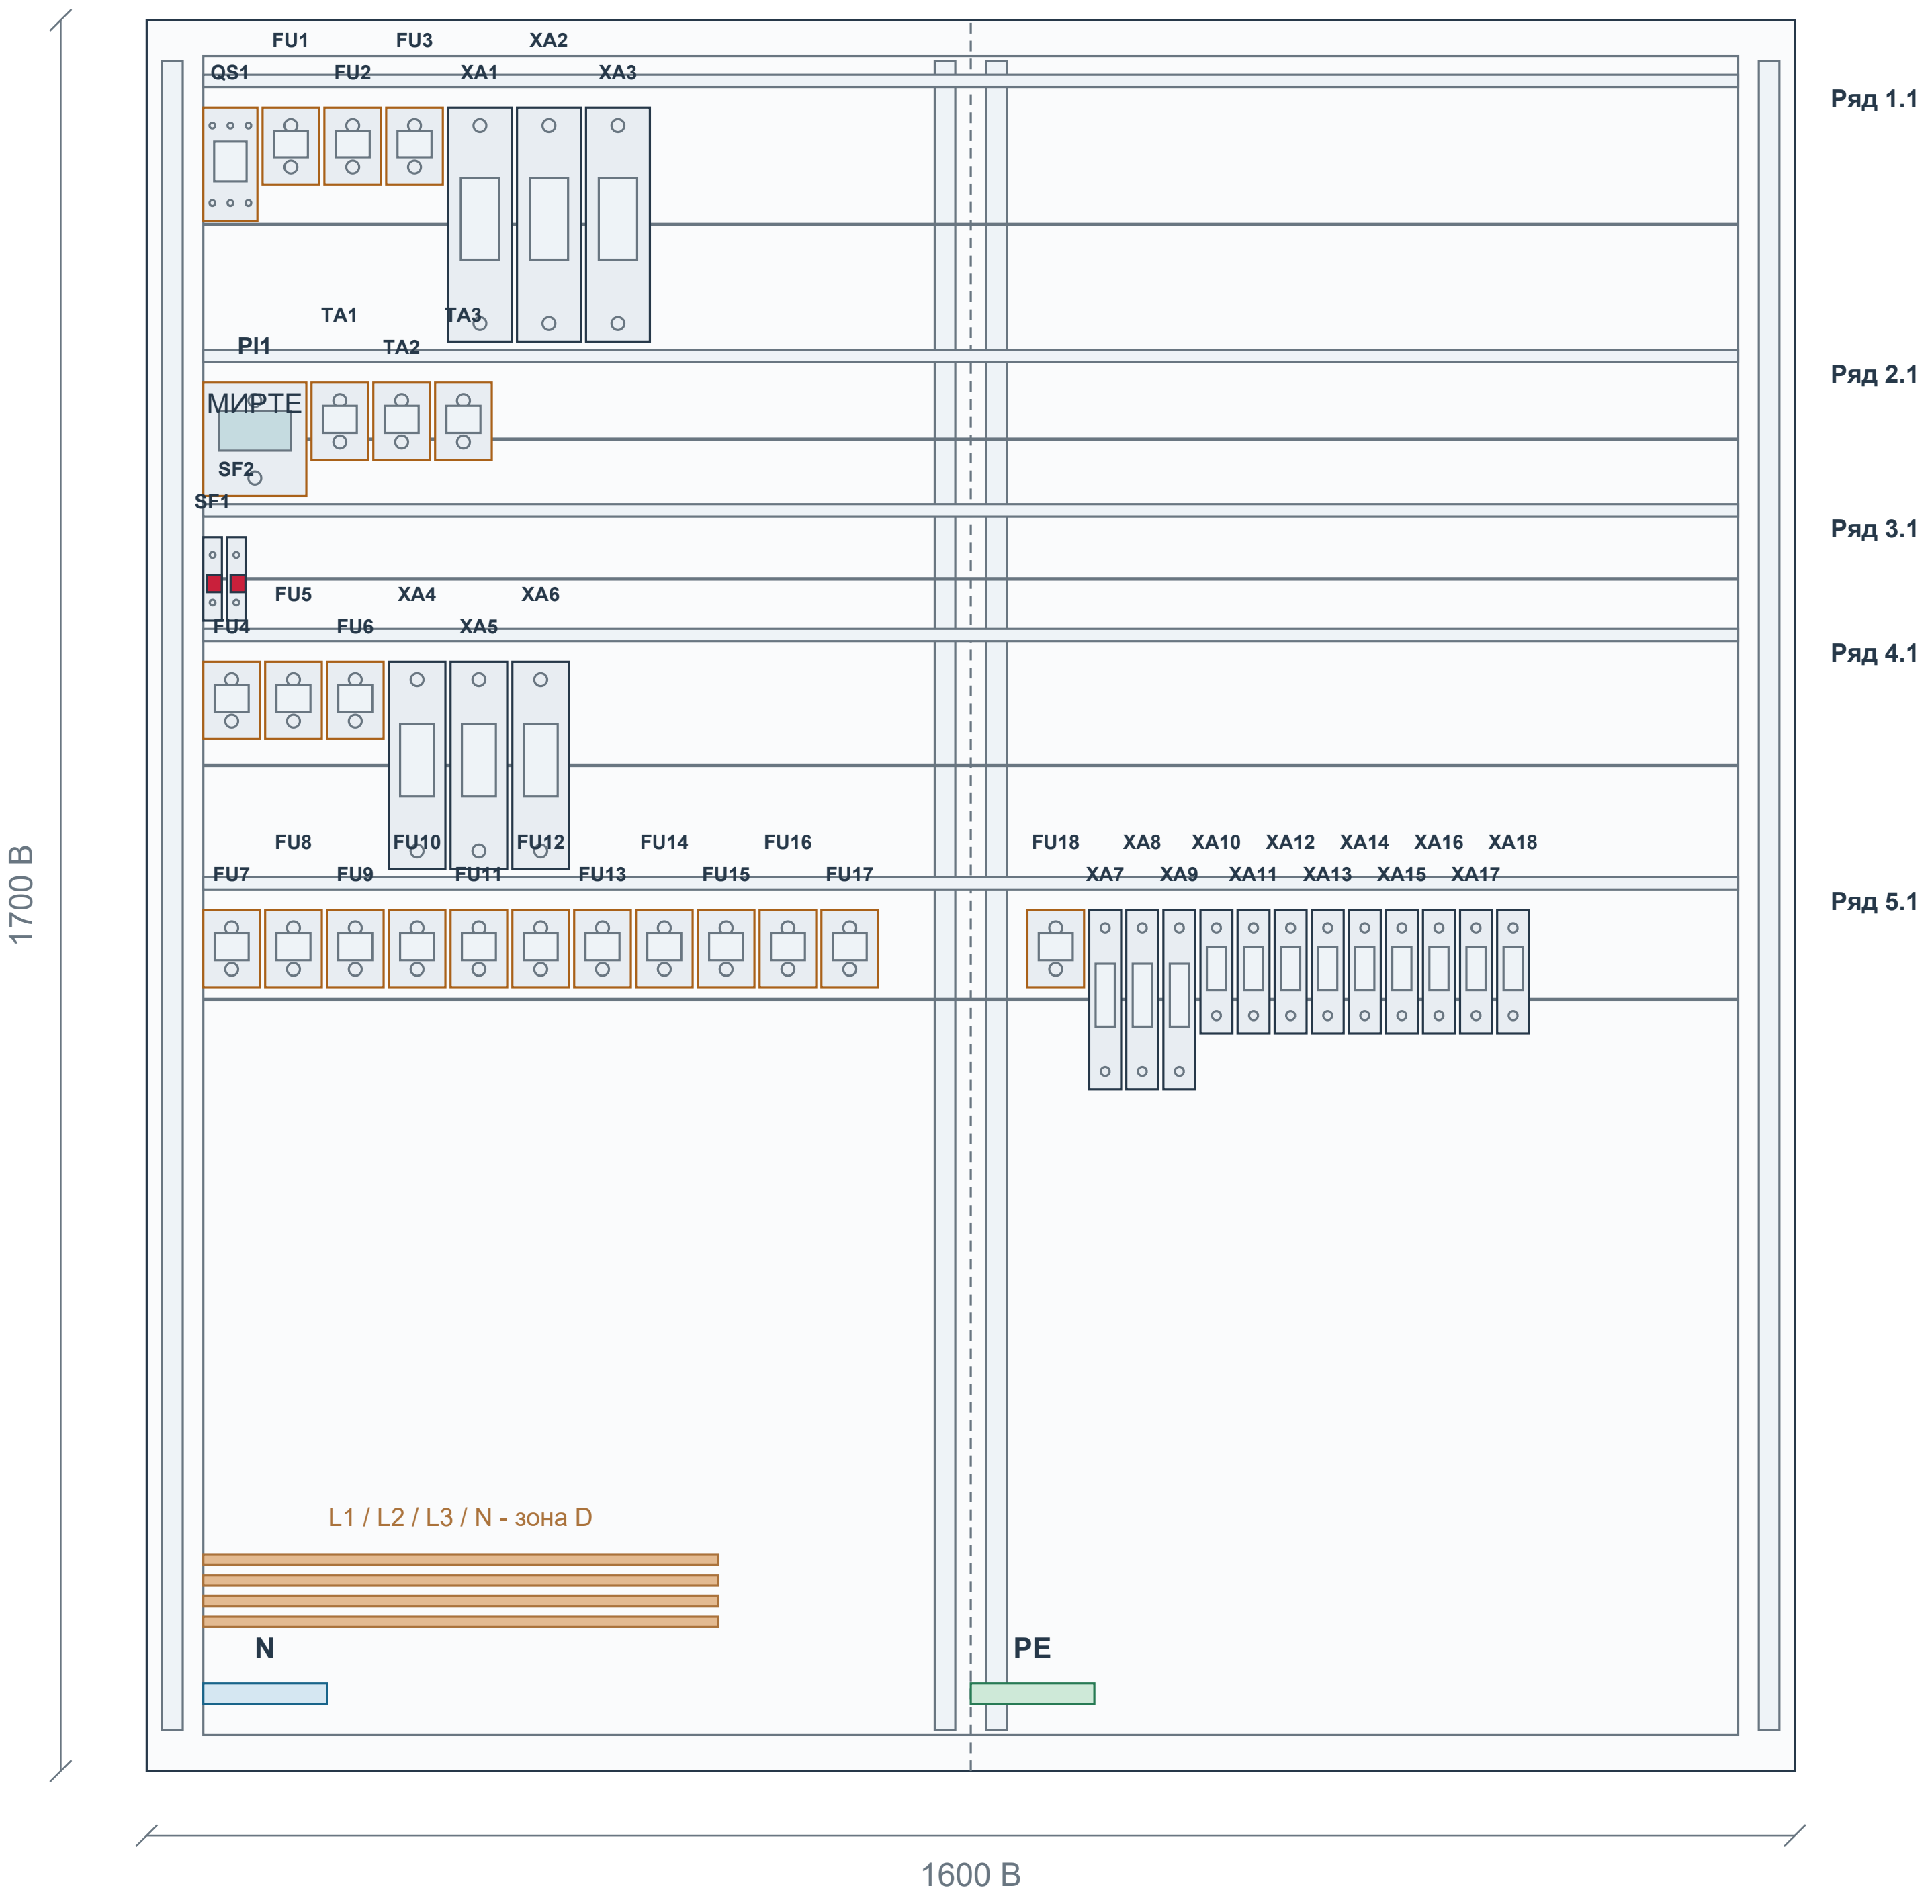
FU1
FU3
XA2
QS1
FU2
XA1
XA3
Ряд 1.1
TA1
TA3
PI1
TA2
Ряд 2.1
МИРТЕ
SF2
SF1
Ряд 3.1
FU5
XA4
XA6
FU4
FU6
XA5
Ряд 4.1
FU8
FU10
FU12
FU14
FU16
FU18
XA8
XA10
XA12
XA14
XA16
XA18
FU7
FU9
FU11
FU13
FU15
FU17
XA7
XA9
XA11
XA13
XA15
XA17
Ряд 5.1
L1 / L2 / L3 / N - зона D
N
PE
1700 B
1600 B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NH40-400/3CSW	1308	1.1	55	85	?
FU1 - FU3	RT36-2-400	1309	1.1	112.5...232.5	85	?
FU4 - FU6	RT36-1-250	1310	4.1	55...175	623	?
FU7 - FU9	RT36-0-160	1311	5.1	55...175	864	?
FU10 - FU15	RT36-00-160	1312	5.1	235...535	864	?
FU16 - FU18	RT36-00-160	1313	5.1	595...855	864	?
PI1	МИРТЕК-32	1314	2.1	55	352	?
TA1 - TA3	ТТИ-40	1315	2.1	160...280	352	?
SF1 - SF2	NXB-63S	1316	3.1	55...78	502	18 × 81
XA1 - XA3	RT36-2-400	1317	1.1	292.5...426.5	85	62 × 227
XA4 - XA6	RT36-1-250	1320	4.1	235...355	623	55 × 201
XA7 - XA9	RT36-0-160	1321	5.1	915...987	864	31 × 174
XA10 - XA18	RT36-00-160	1322	5.1	1023...1311	864	31 × 120

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

У 23 аппаратов габариты не заполнены; янтарные контуры условные. Фактический размер и посадку проверить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Актуальная спецификация

ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1339 | ЭОМ, PDF стр. 4

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1340	714-15115	Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1341	131368	Авт. выкл. NXM-250S/3P 225A 36кА (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1342	946972	Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый) (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1343	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1344	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1345	539860	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1346	539866	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1347	982188	Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 100mA тип AC 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1348	982189	Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C50 100mA тип AC 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 4

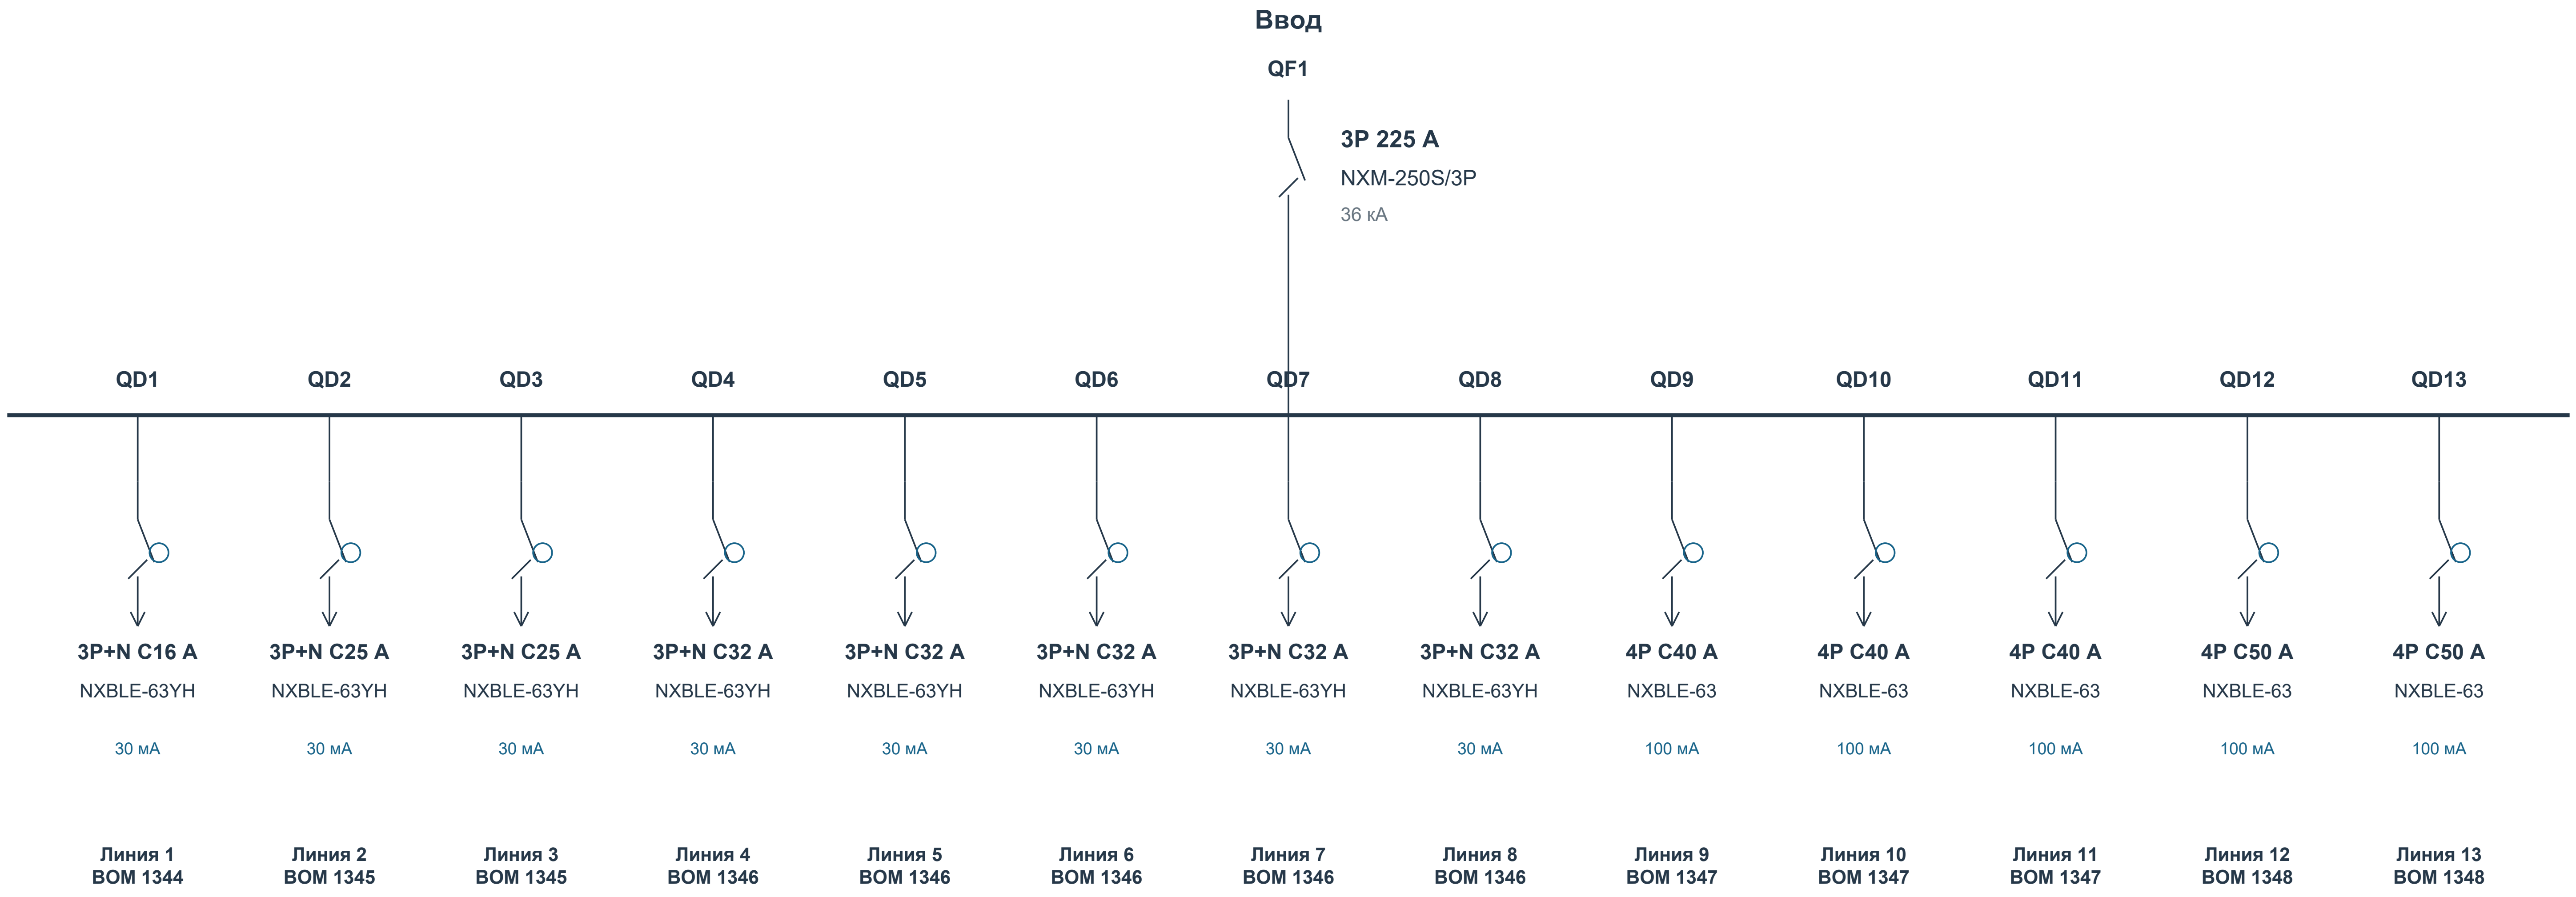
Ввод
QF1
3P 225 A
NXM-250S/3P
36 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
QD9
QD10
QD11
QD12
QD13
3P+N C16 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 1344
3P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 1345
3P+N C25 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 1345
3P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 1346
3P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 1346
3P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 1346
3P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 1346
3P+N C32 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 8
BOM 1346
4P C40 A
NXBLE-63
100 мА
Линия 9
BOM 1347
4P C40 A
NXBLE-63
100 мА
Линия 10
BOM 1347
4P C40 A
NXBLE-63
100 мА
Линия 11
BOM 1347
4P C50 A
NXBLE-63
100 мА
Линия 12
BOM 1348
4P C50 A
NXBLE-63
100 мА
Линия 13
BOM 1348

Управление / учет: MX1 SHT-M3 × 1; SF1 NXB-63S × 1

Данные исходного проекта: Ру 236.6 кВт | Рр 127,8 кВт | Ip 198,1 A

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

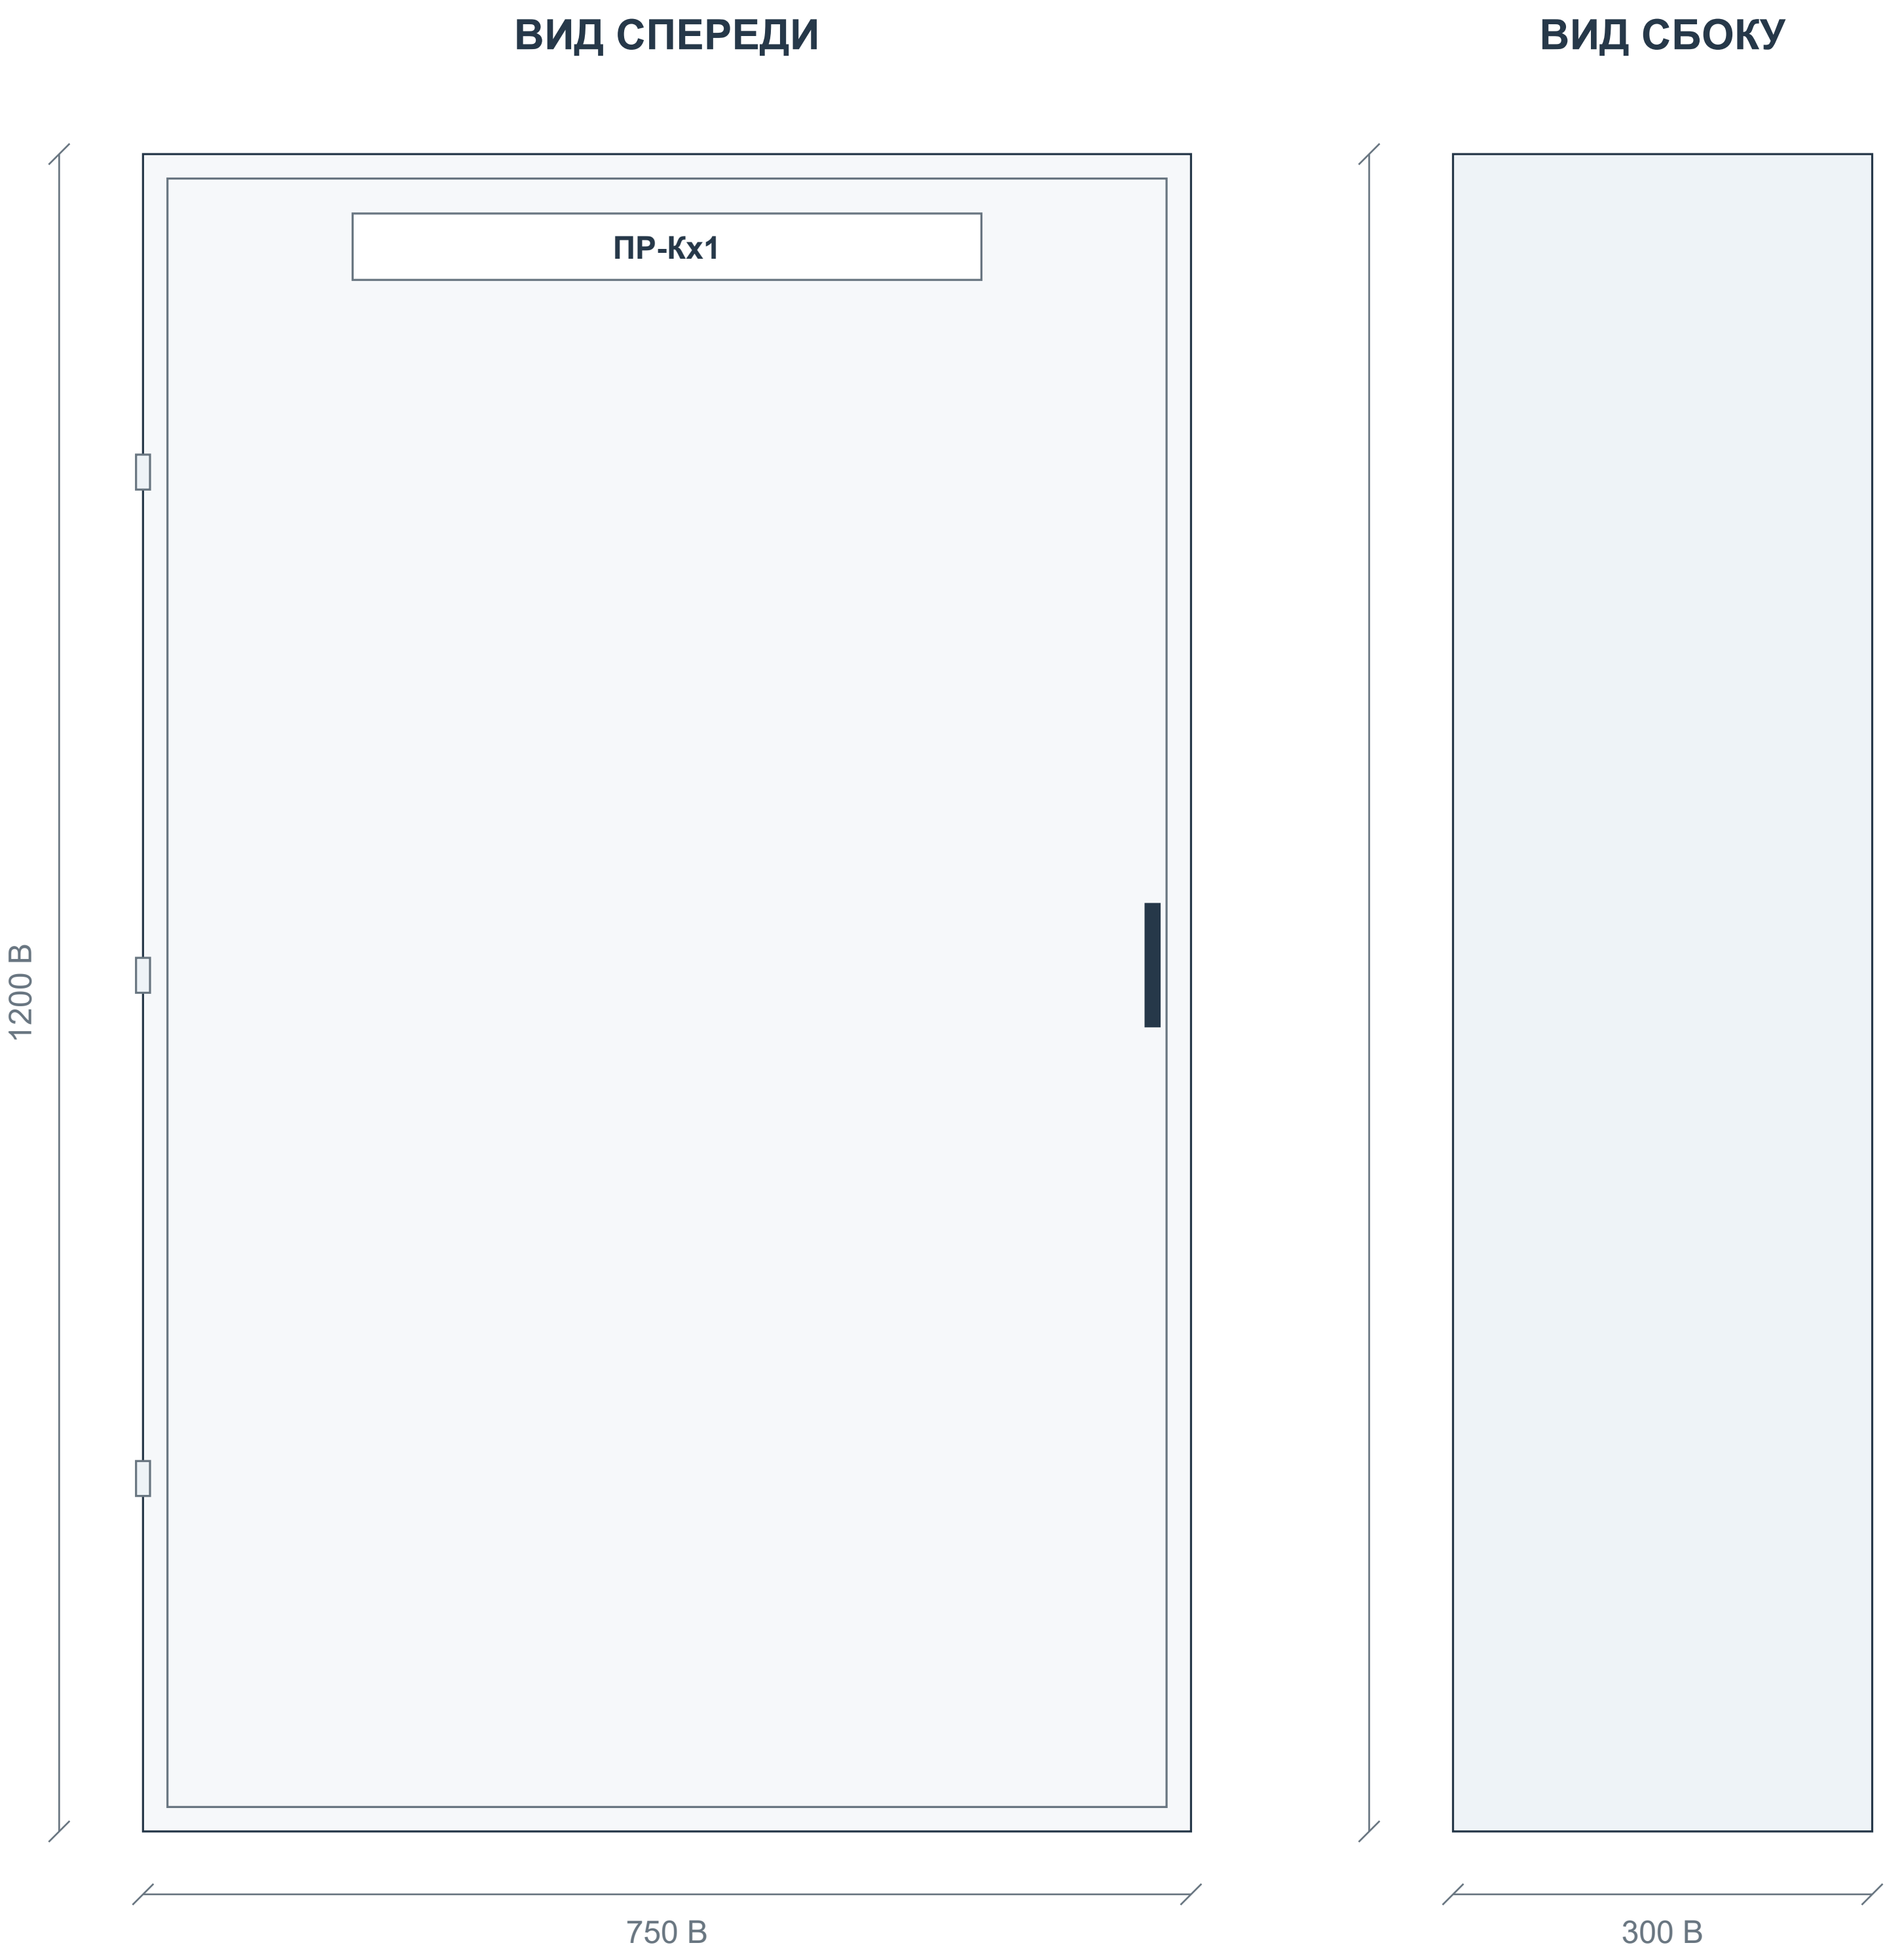

Корпус: Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200х750х300) IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

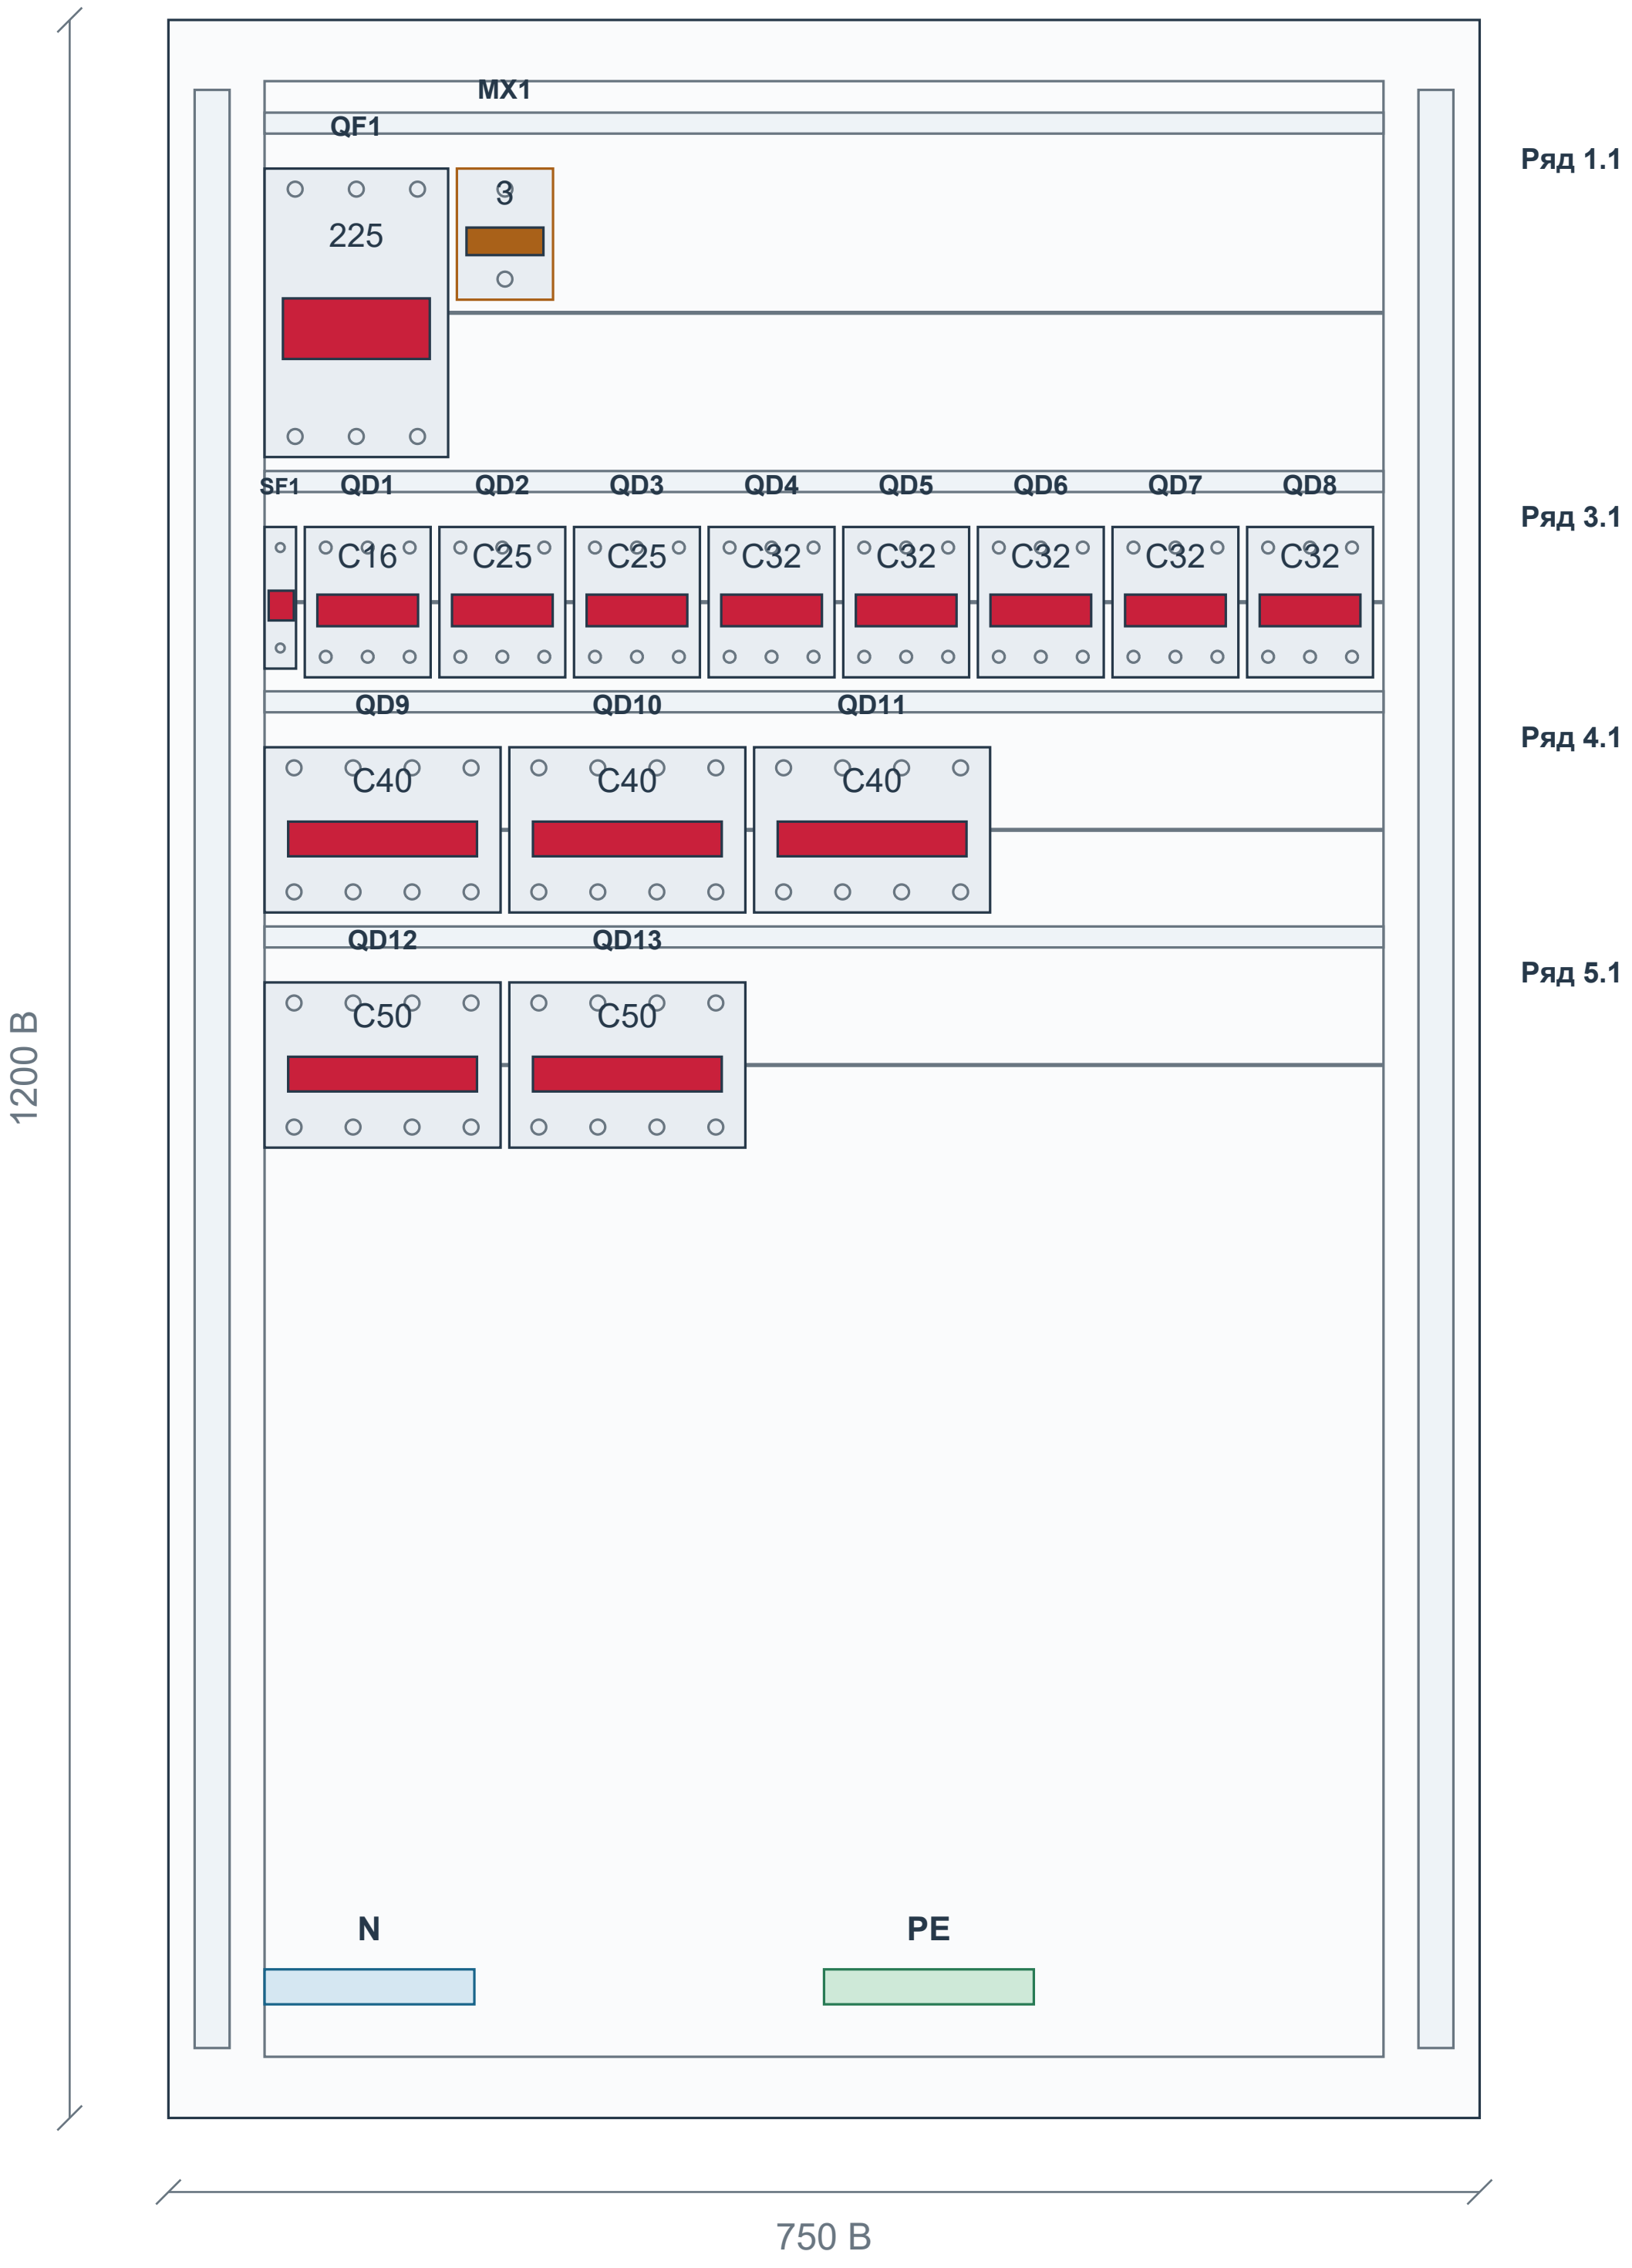
MX1
QF1
225
3
SF1
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
C16
C25
C25
C32
C32
C32
C32
C32
QD9
QD10
QD11
C40
C40
C40
QD12
QD13
C50
C50
N
PE
Ряд 1.1
Ряд 3.1
Ряд 4.1
Ряд 5.1
1200 B
750 B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QF1	NXM-250S/3P	1341	1.1	55	85	105 × 165
MX1	SHT-M3	1342	1.1	165	85	?
SF1	NXB-63S	1343	3.1	55	290	18 × 81
QD1	NXBLE-63YH	1344	3.1	78	290	72 × 86
QD2 - QD3	NXBLE-63YH	1345	3.1	155...232	290	72 × 86
QD4 - QD8	NXBLE-63YH	1346	3.1	309...617	290	72 × 86
QD9 - QD11	NXBLE-63	1347	4.1	55...335	416	135 × 94.5
QD12 - QD13	NXBLE-63	1348	5.1	55...195	550.5	135 × 94.5

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

У 1 аппаратов габариты не заполнены; янтарные контуры условные. Фактический размер и посадку проверить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Актуальная спецификация

ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1377 | ЭОМ, PDF стр. 5

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1378	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000х650х300) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
1379	393261	Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3Р, 125А, стандартная рукоятка управления	шт	1	1	chint	Ввод
1380	816139	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1381	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1382	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	9	9	chint	Отход.
1383	515388	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1384	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1385	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 5

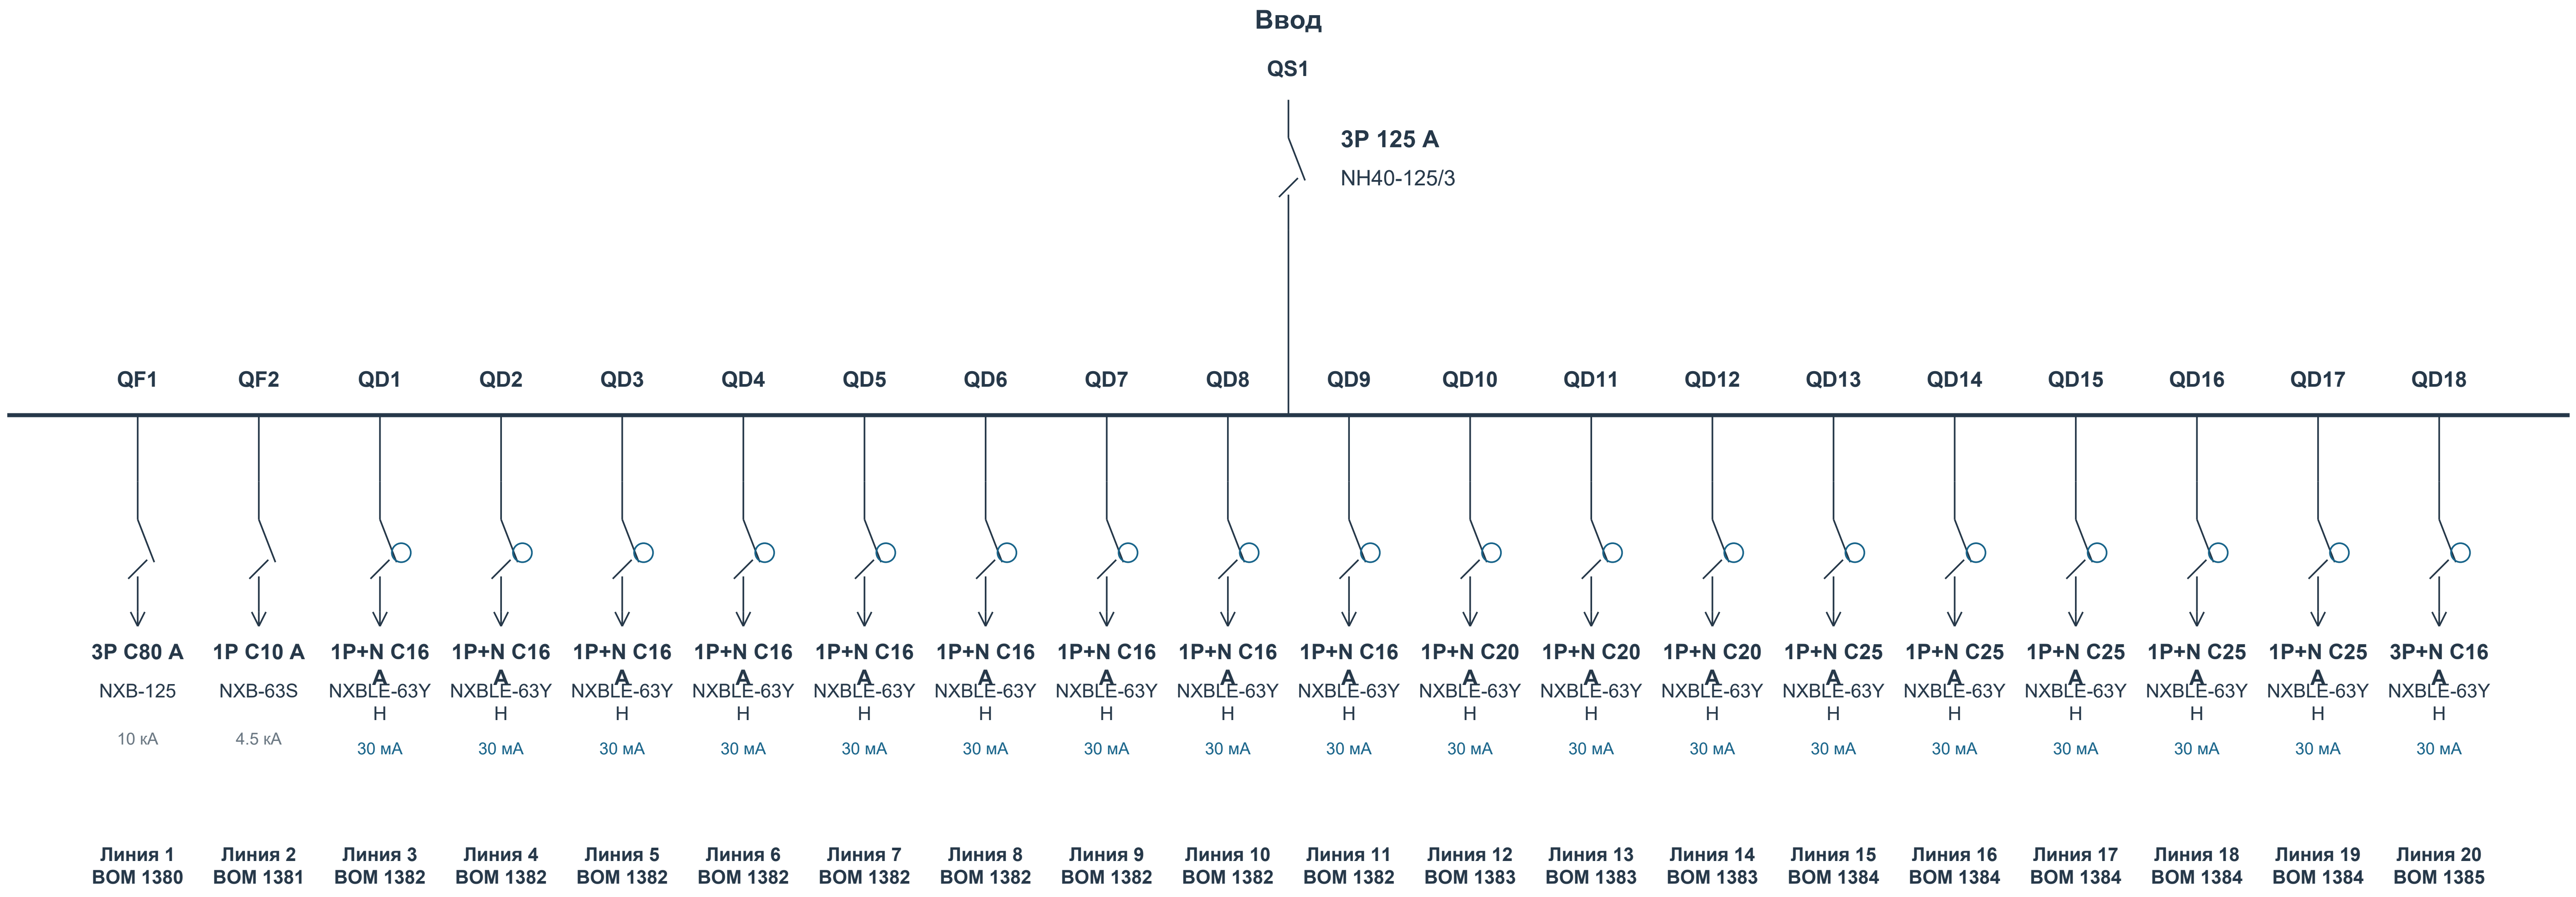

QF1	3P C80 A	NXB-125	10 кА	Линия 1	BOM 1380
QF2	1P C10 A	NXB-63S	4.5 кА	Линия 2	BOM 1381
QD1	1P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 3	BOM 1382
QD2	1P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 4	BOM 1382
QD3	1P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 5	BOM 1382
QD4	1P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 6	BOM 1382
QD5	1P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 7	BOM 1382
QD6	1P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 8	BOM 1382
QD7	1P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 9	BOM 1382
QD8	1P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 10	BOM 1382
QD9	1P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 11	BOM 1382
QD10	1P+N C20 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 12	BOM 1383
QD11	1P+N C20 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 13	BOM 1383
QD12	1P+N C20 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 14	BOM 1383
QD13	1P+N C25 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 15	BOM 1384
QD14	1P+N C25 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 16	BOM 1384
QD15	1P+N C25 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 17	BOM 1384
QD16	1P+N C25 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 18	BOM 1384
QD17	1P+N C25 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 19	BOM 1384
QD18	3P+N C16 A	NXBLE-63Y H	30 мА	Линия 20	BOM 1385

Данные исходного проекта: Ру 102.8 кВт | Рр 68,9 кВт | Ір 111,3 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

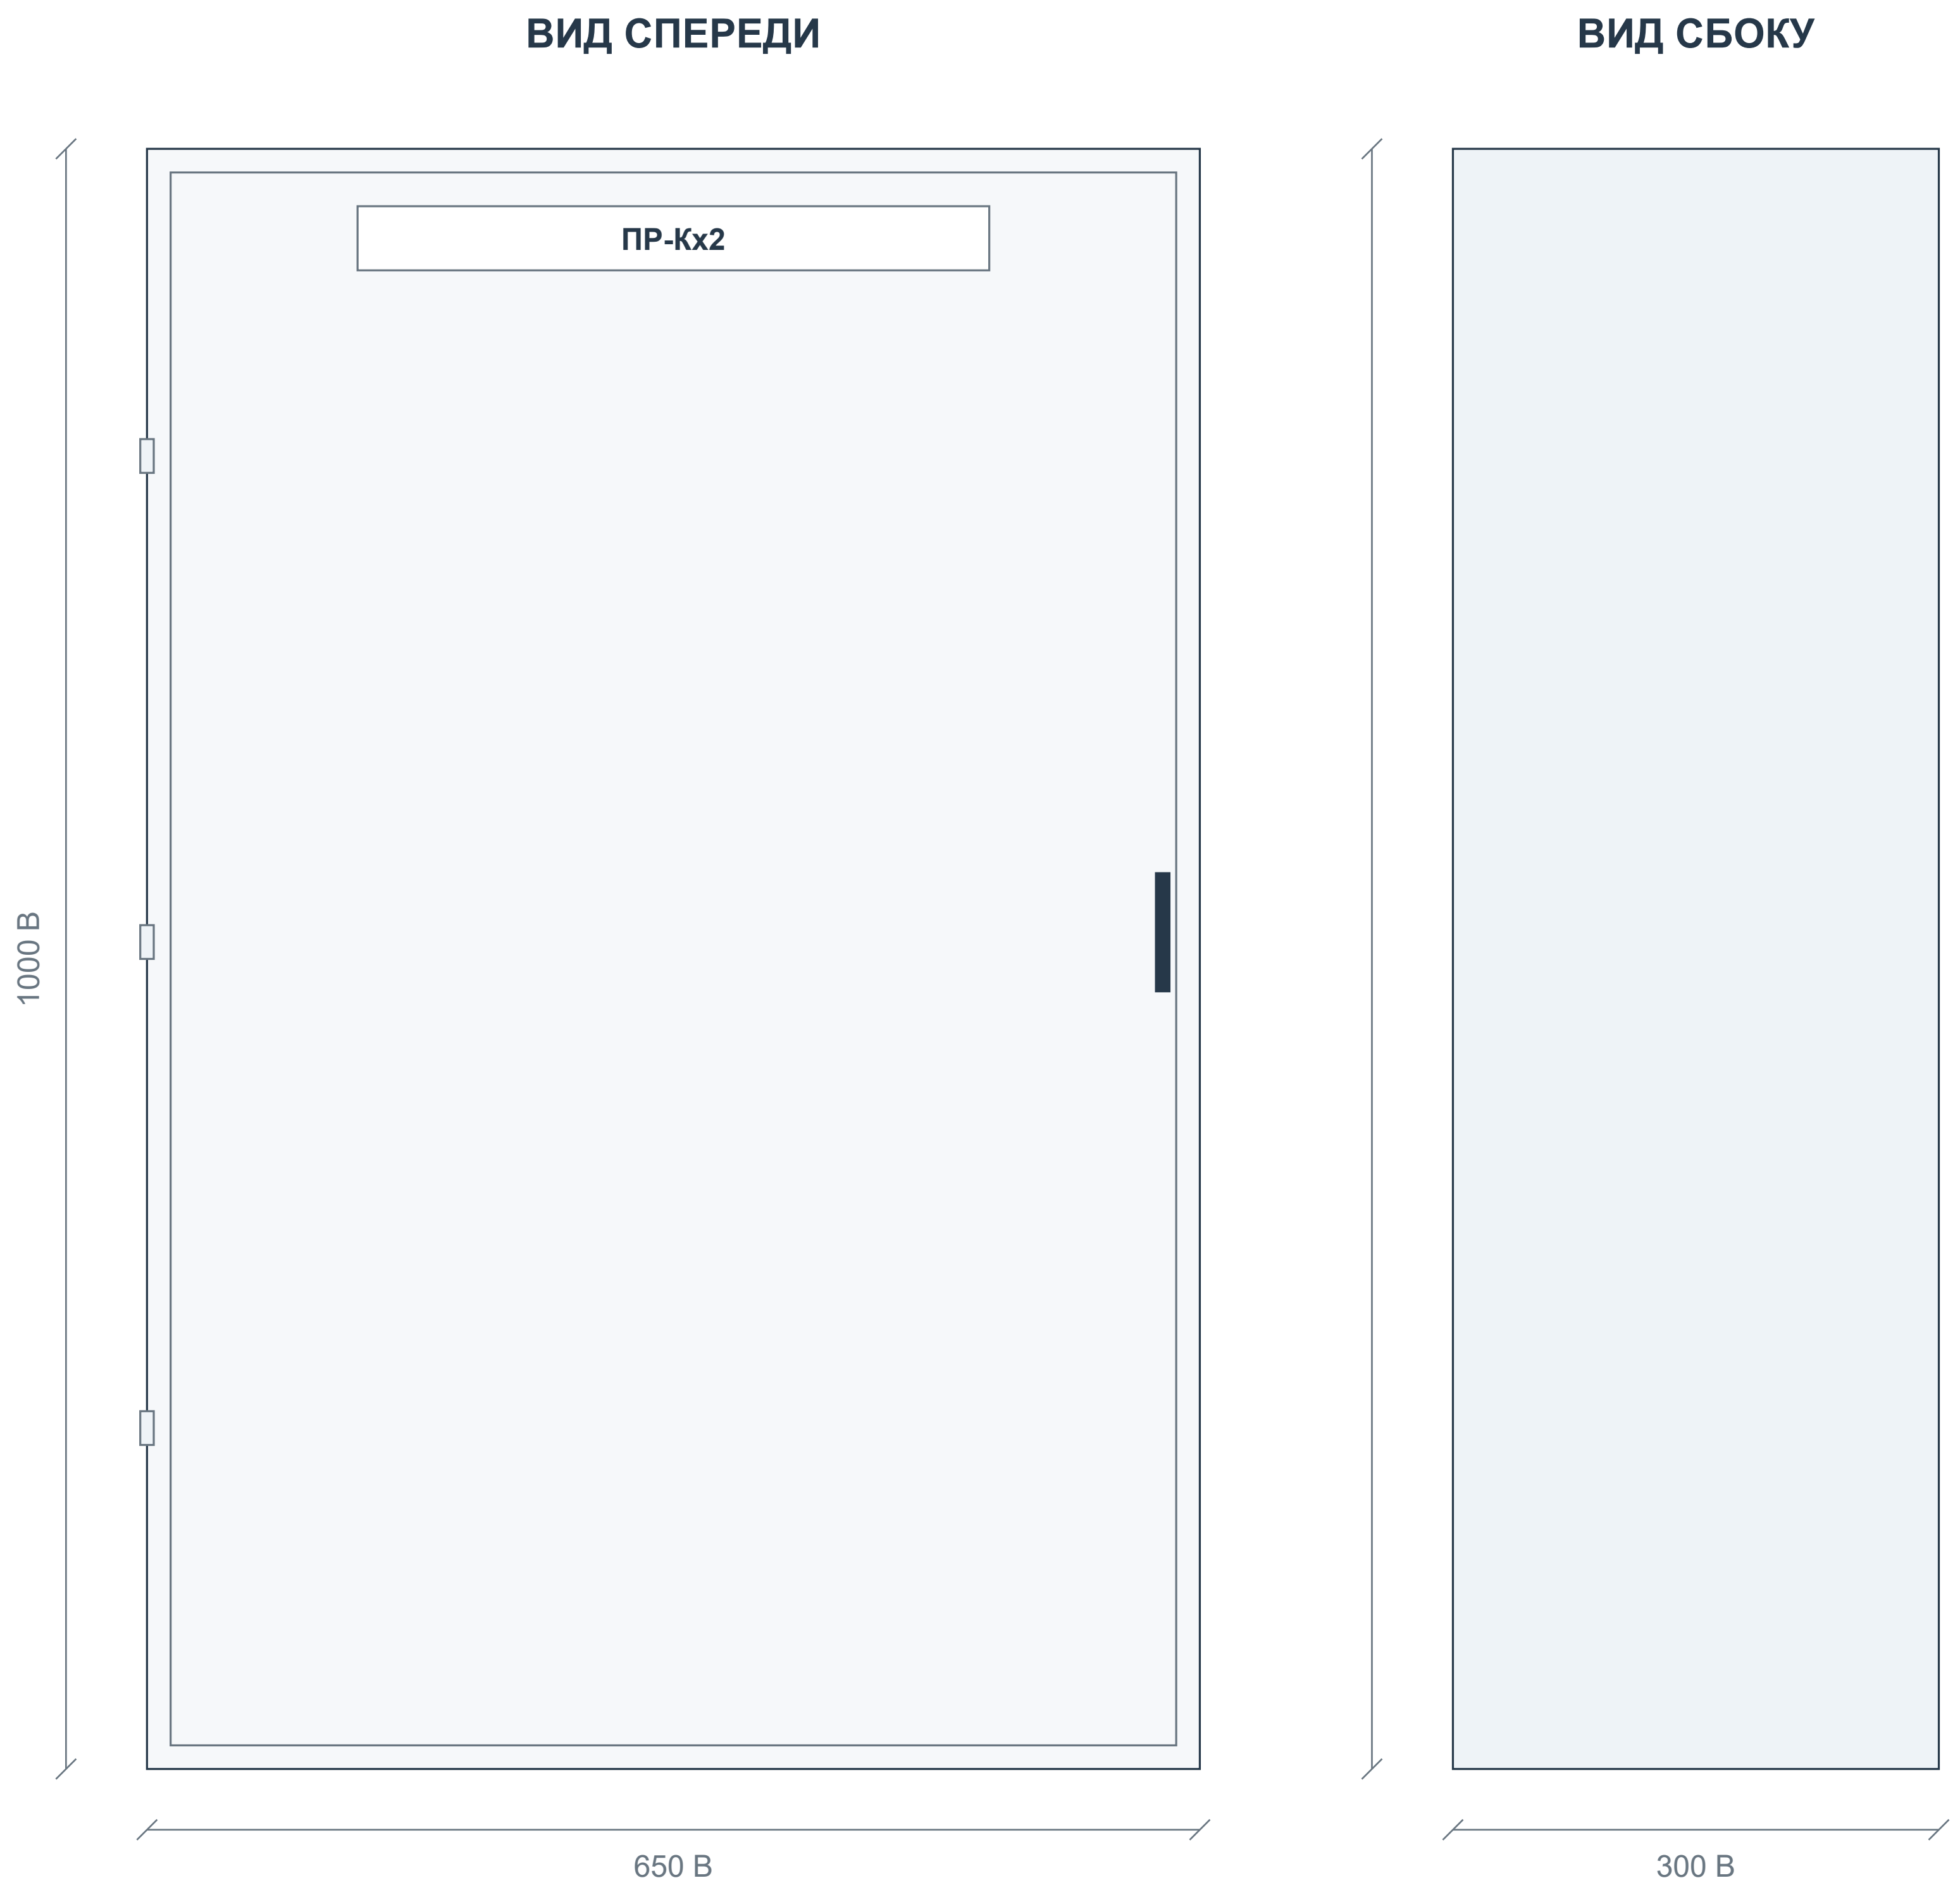

Корпус: Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 0 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

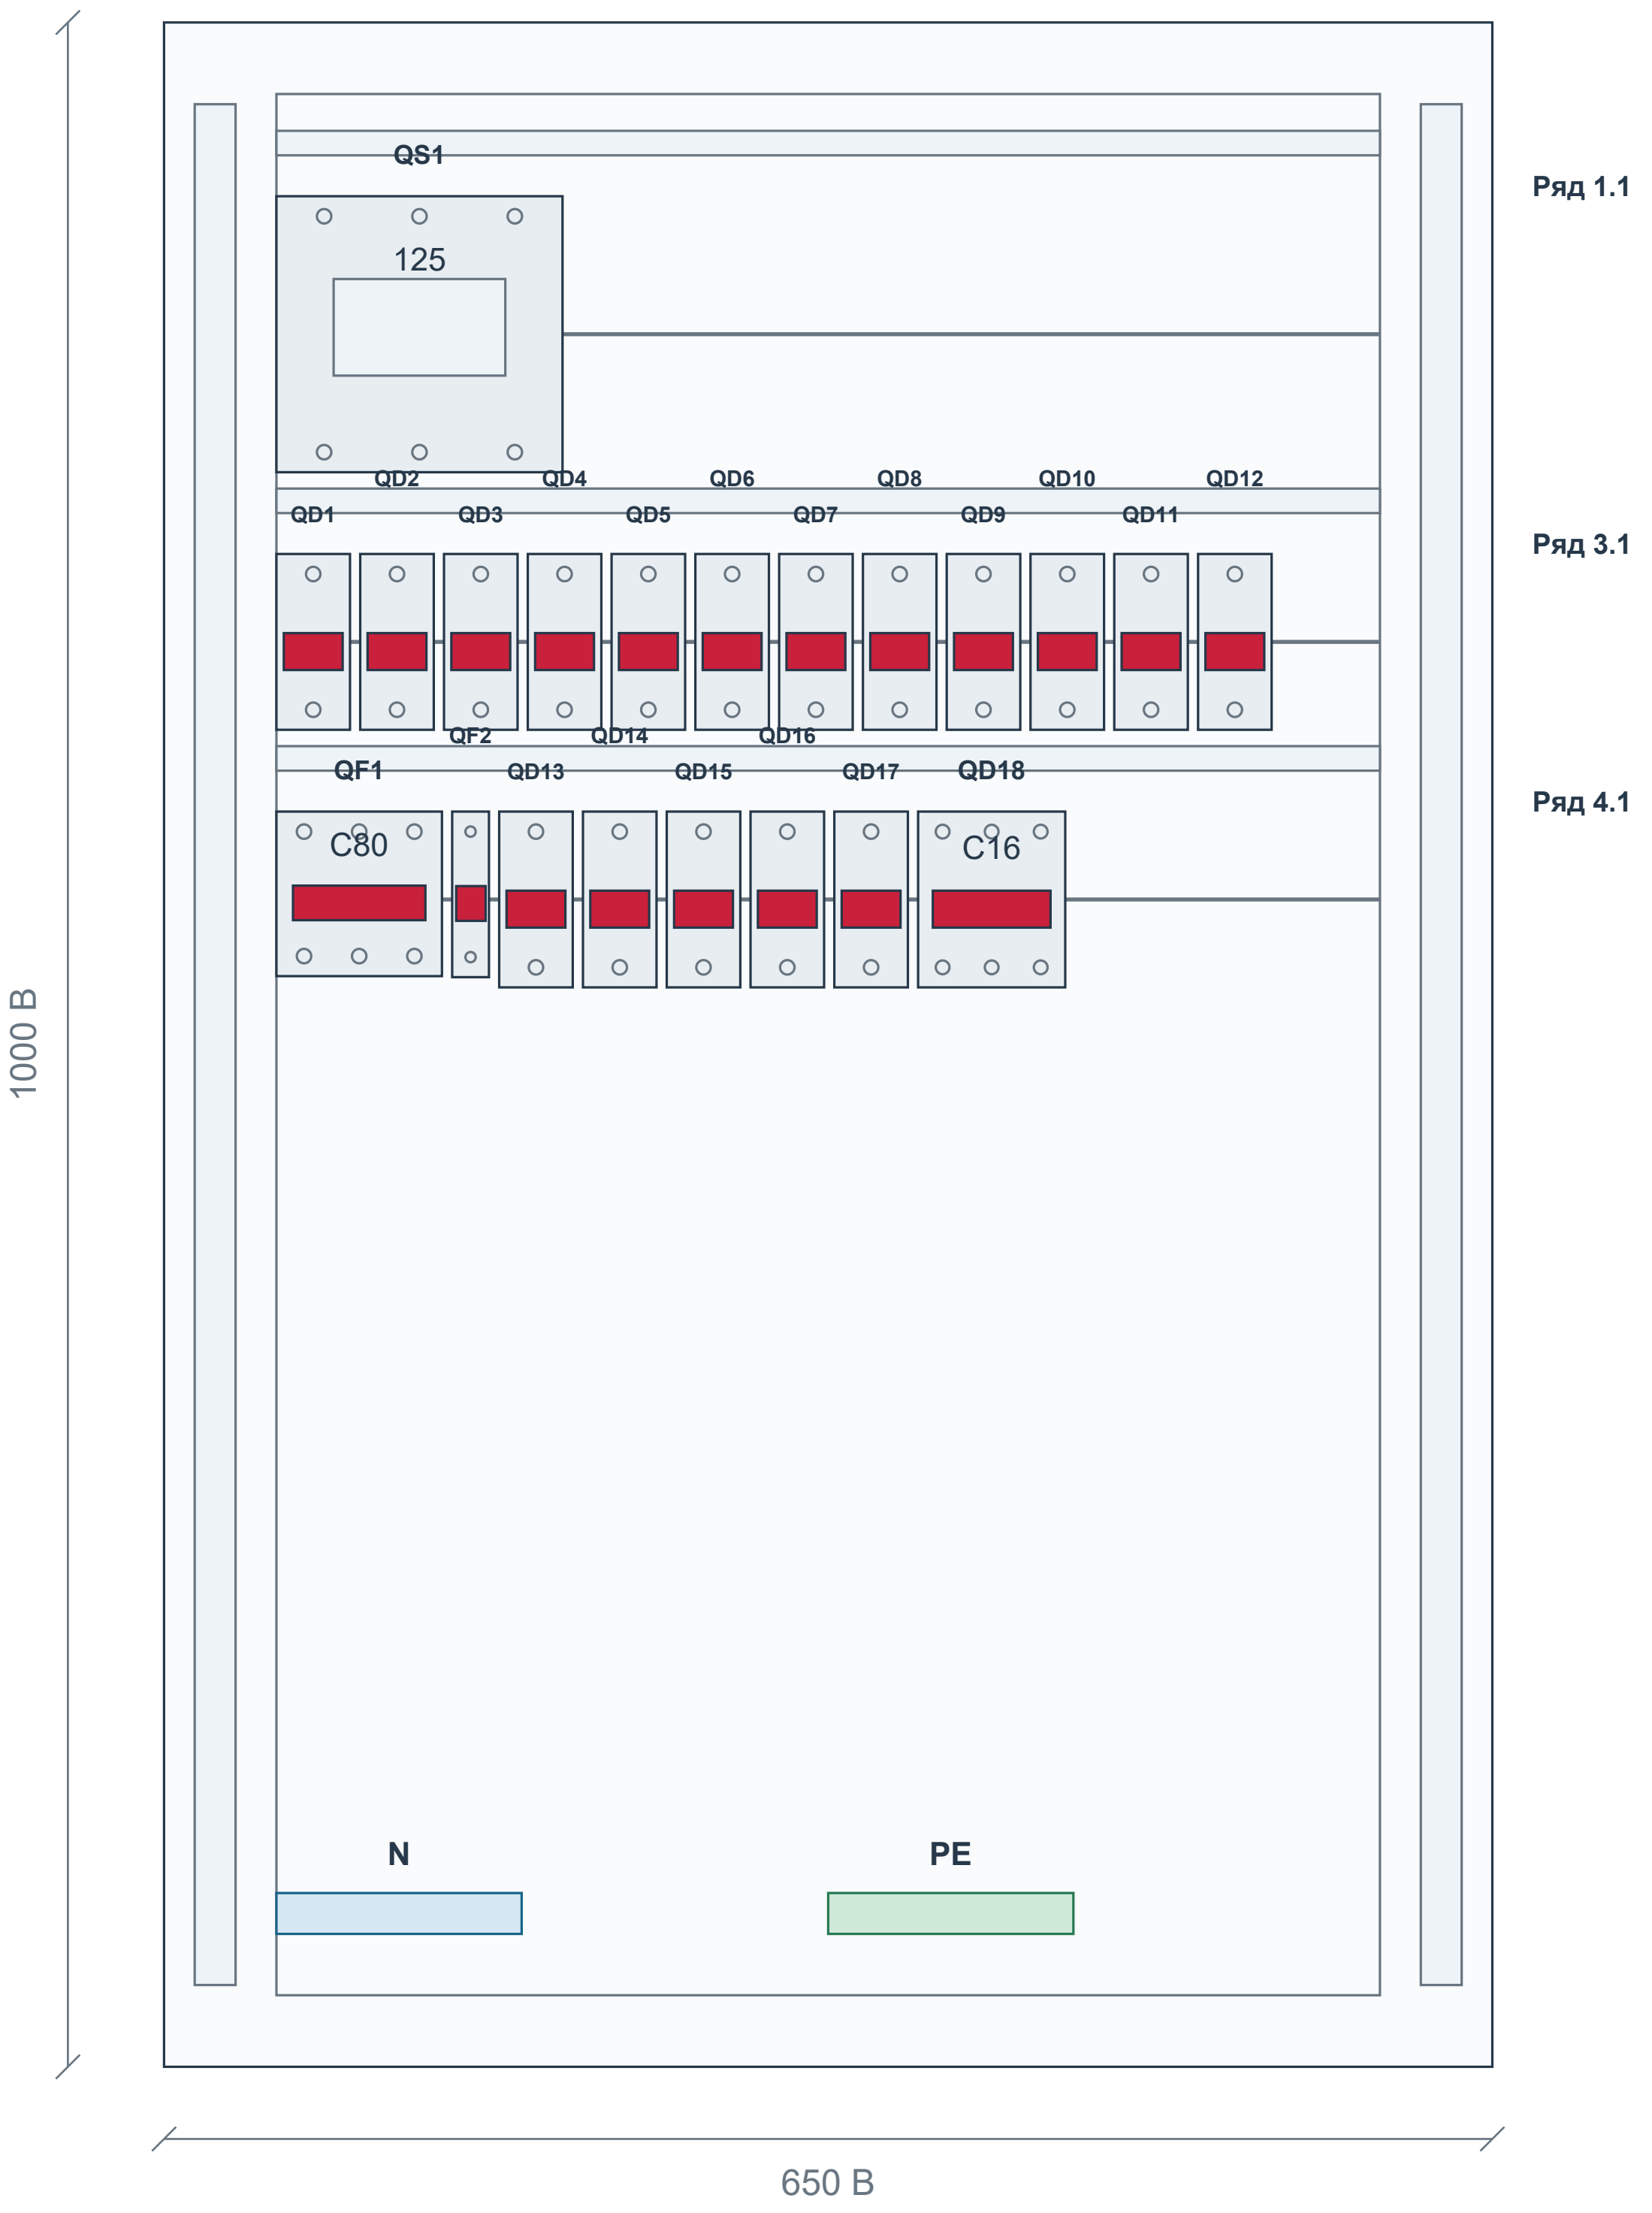
QS1
125
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD8
QD9
QD10
QD11
QD12
QF1
QF2
QD13
QD14
QD15
QD16
QD17
QD18
C80
C16
N
PE
Ряд 1.1
Ряд 3.1
Ряд 4.1
1000 В
650 В

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NH40-125/3	1379	1.1	55	85	140 × 135
QF1	NXB-125	1380	4.1	55	386	81 × 80.5
QF2	NXB-63S	1381	4.1	141	386	18 × 81
QD1 - QD9	NXBLE-63YH	1382	3.1	55...383	260	36 × 86
QD10 - QD12	NXBLE-63YH	1383	3.1	424...506	260	36 × 86
QD13 - QD17	NXBLE-63YH	1384	4.1	164...328	386	36 × 86
QD18	NXBLE-63YH	1385	4.1	369	386	72 × 86

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Актуальная спецификация

ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1407 | ЭОМ, PDF стр. 46

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1408	714-15115	Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200х750х300) IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1409	296786	Авт. выкл. NXB-63S 2P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1410	23301DEK	Реле контроля фаз РК-101 380В тип 02 DEKraft 23301DEK E-PRO	шт	2	2	ekt	Управл.
1411	23883DEK	Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 230В AC ПР-102 Dekraft	шт	2	2	ekt	Управл.
1412	23953DEK	Разъем на DIN для ПР-102 4к. (3-5)А Dekraft	шт	2	2	ekt	Управл.
1414	574847	Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40	шт	2	2	chint	Управл.
1415	PYS-002	Выключатель кнопочный с фиксацией ВК-22 1НО+1НЗ 22мм 220В	шт	6	6	pys	Управл.
1416	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	38	38	chint	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 46

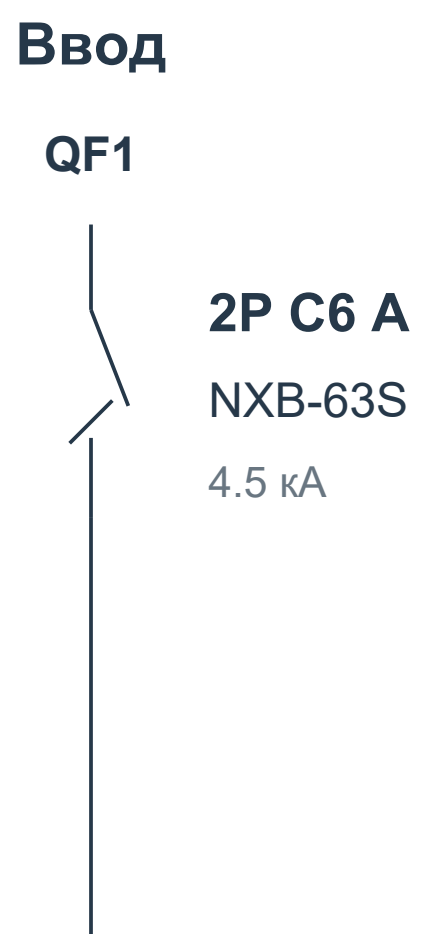

Отходящие силовые аппараты в текущем BOM не назначены.

Управление / учет: KA1 - KA2 PK-101 × 2; KA3 - KA4 ПР-102 × 2; XA1 - XA2 ПР-102 × 2; SA1 - SA2 NP2-BD21 × 2; SB1 - SB6 PYS-002 × 6; HL1 - HL38 ND16-22D/2 × 38

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

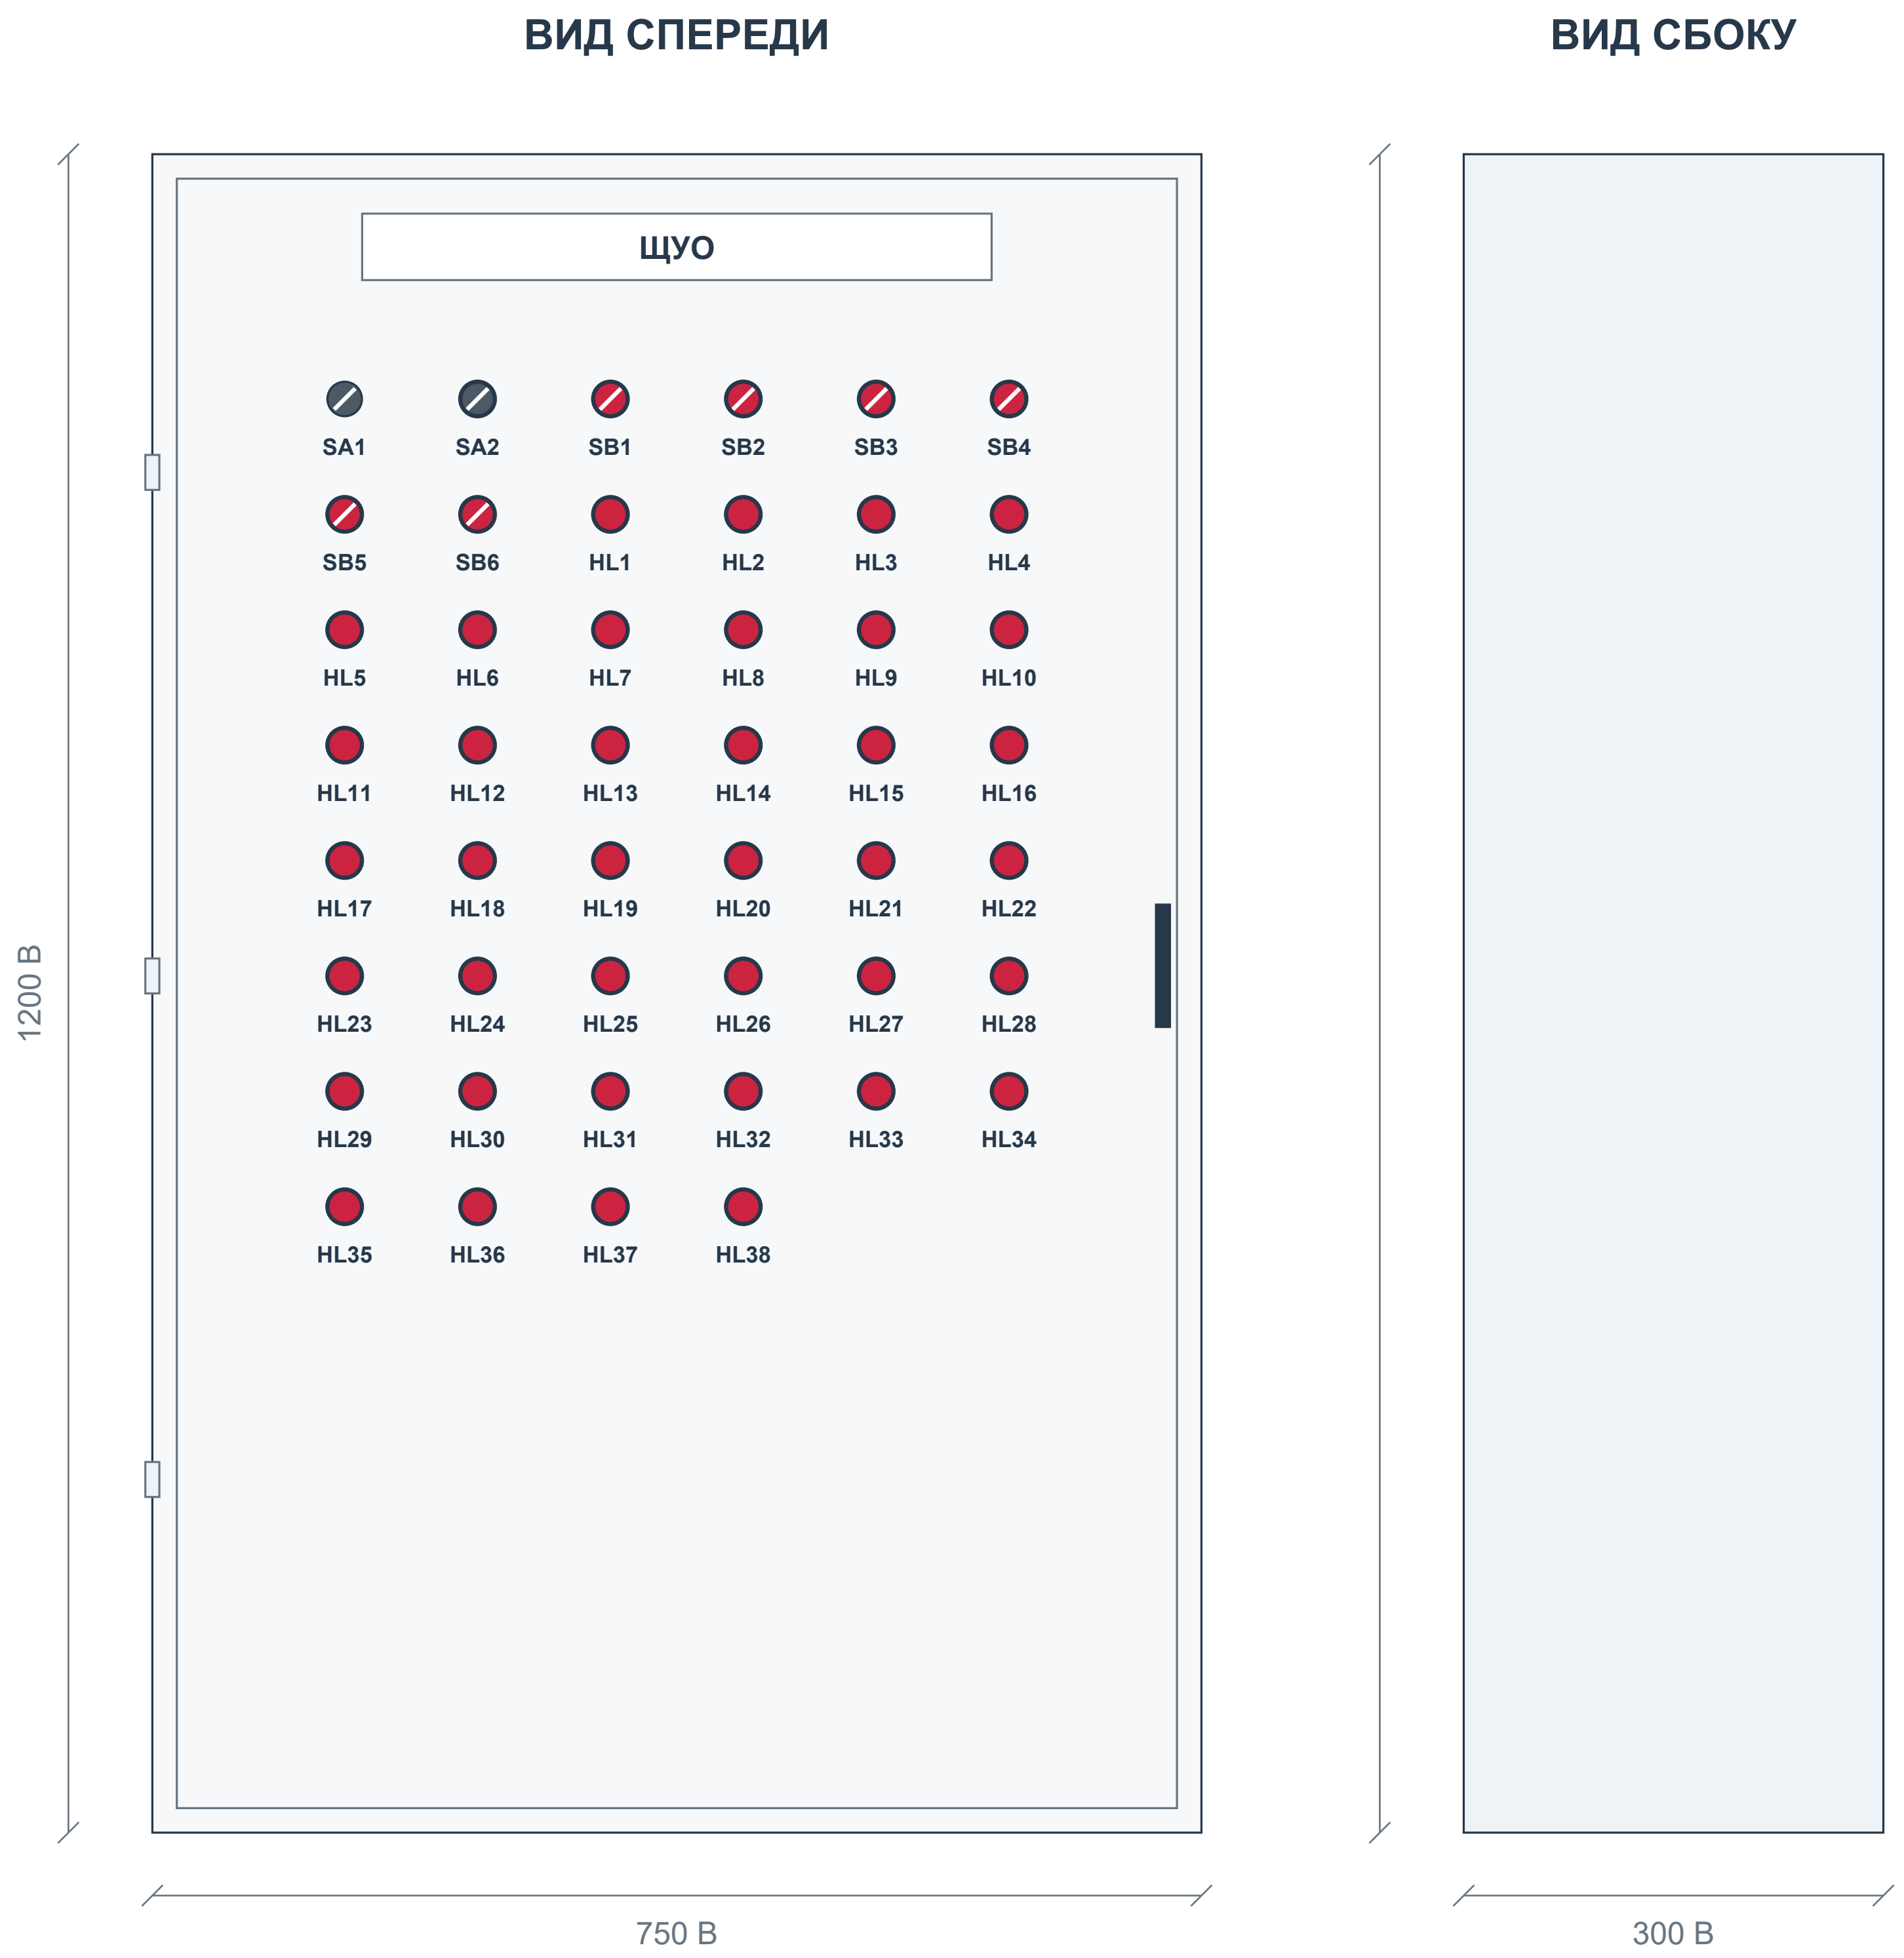
ВИД СПЕРЕДИ
ВИД СБОКУ
ЩУО
SA1
SA2
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL6
HL7
HL8
HL9
HL10
HL11
HL12
HL13
HL14
HL15
HL16
HL17
HL18
HL19
HL20
HL21
HL22
HL23
HL24
HL25
HL26
HL27
HL28
HL29
HL30
HL31
HL32
HL33
HL34
HL35
HL36
HL37
HL38
1200 В
750 В
300 В

Корпус: Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 46 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

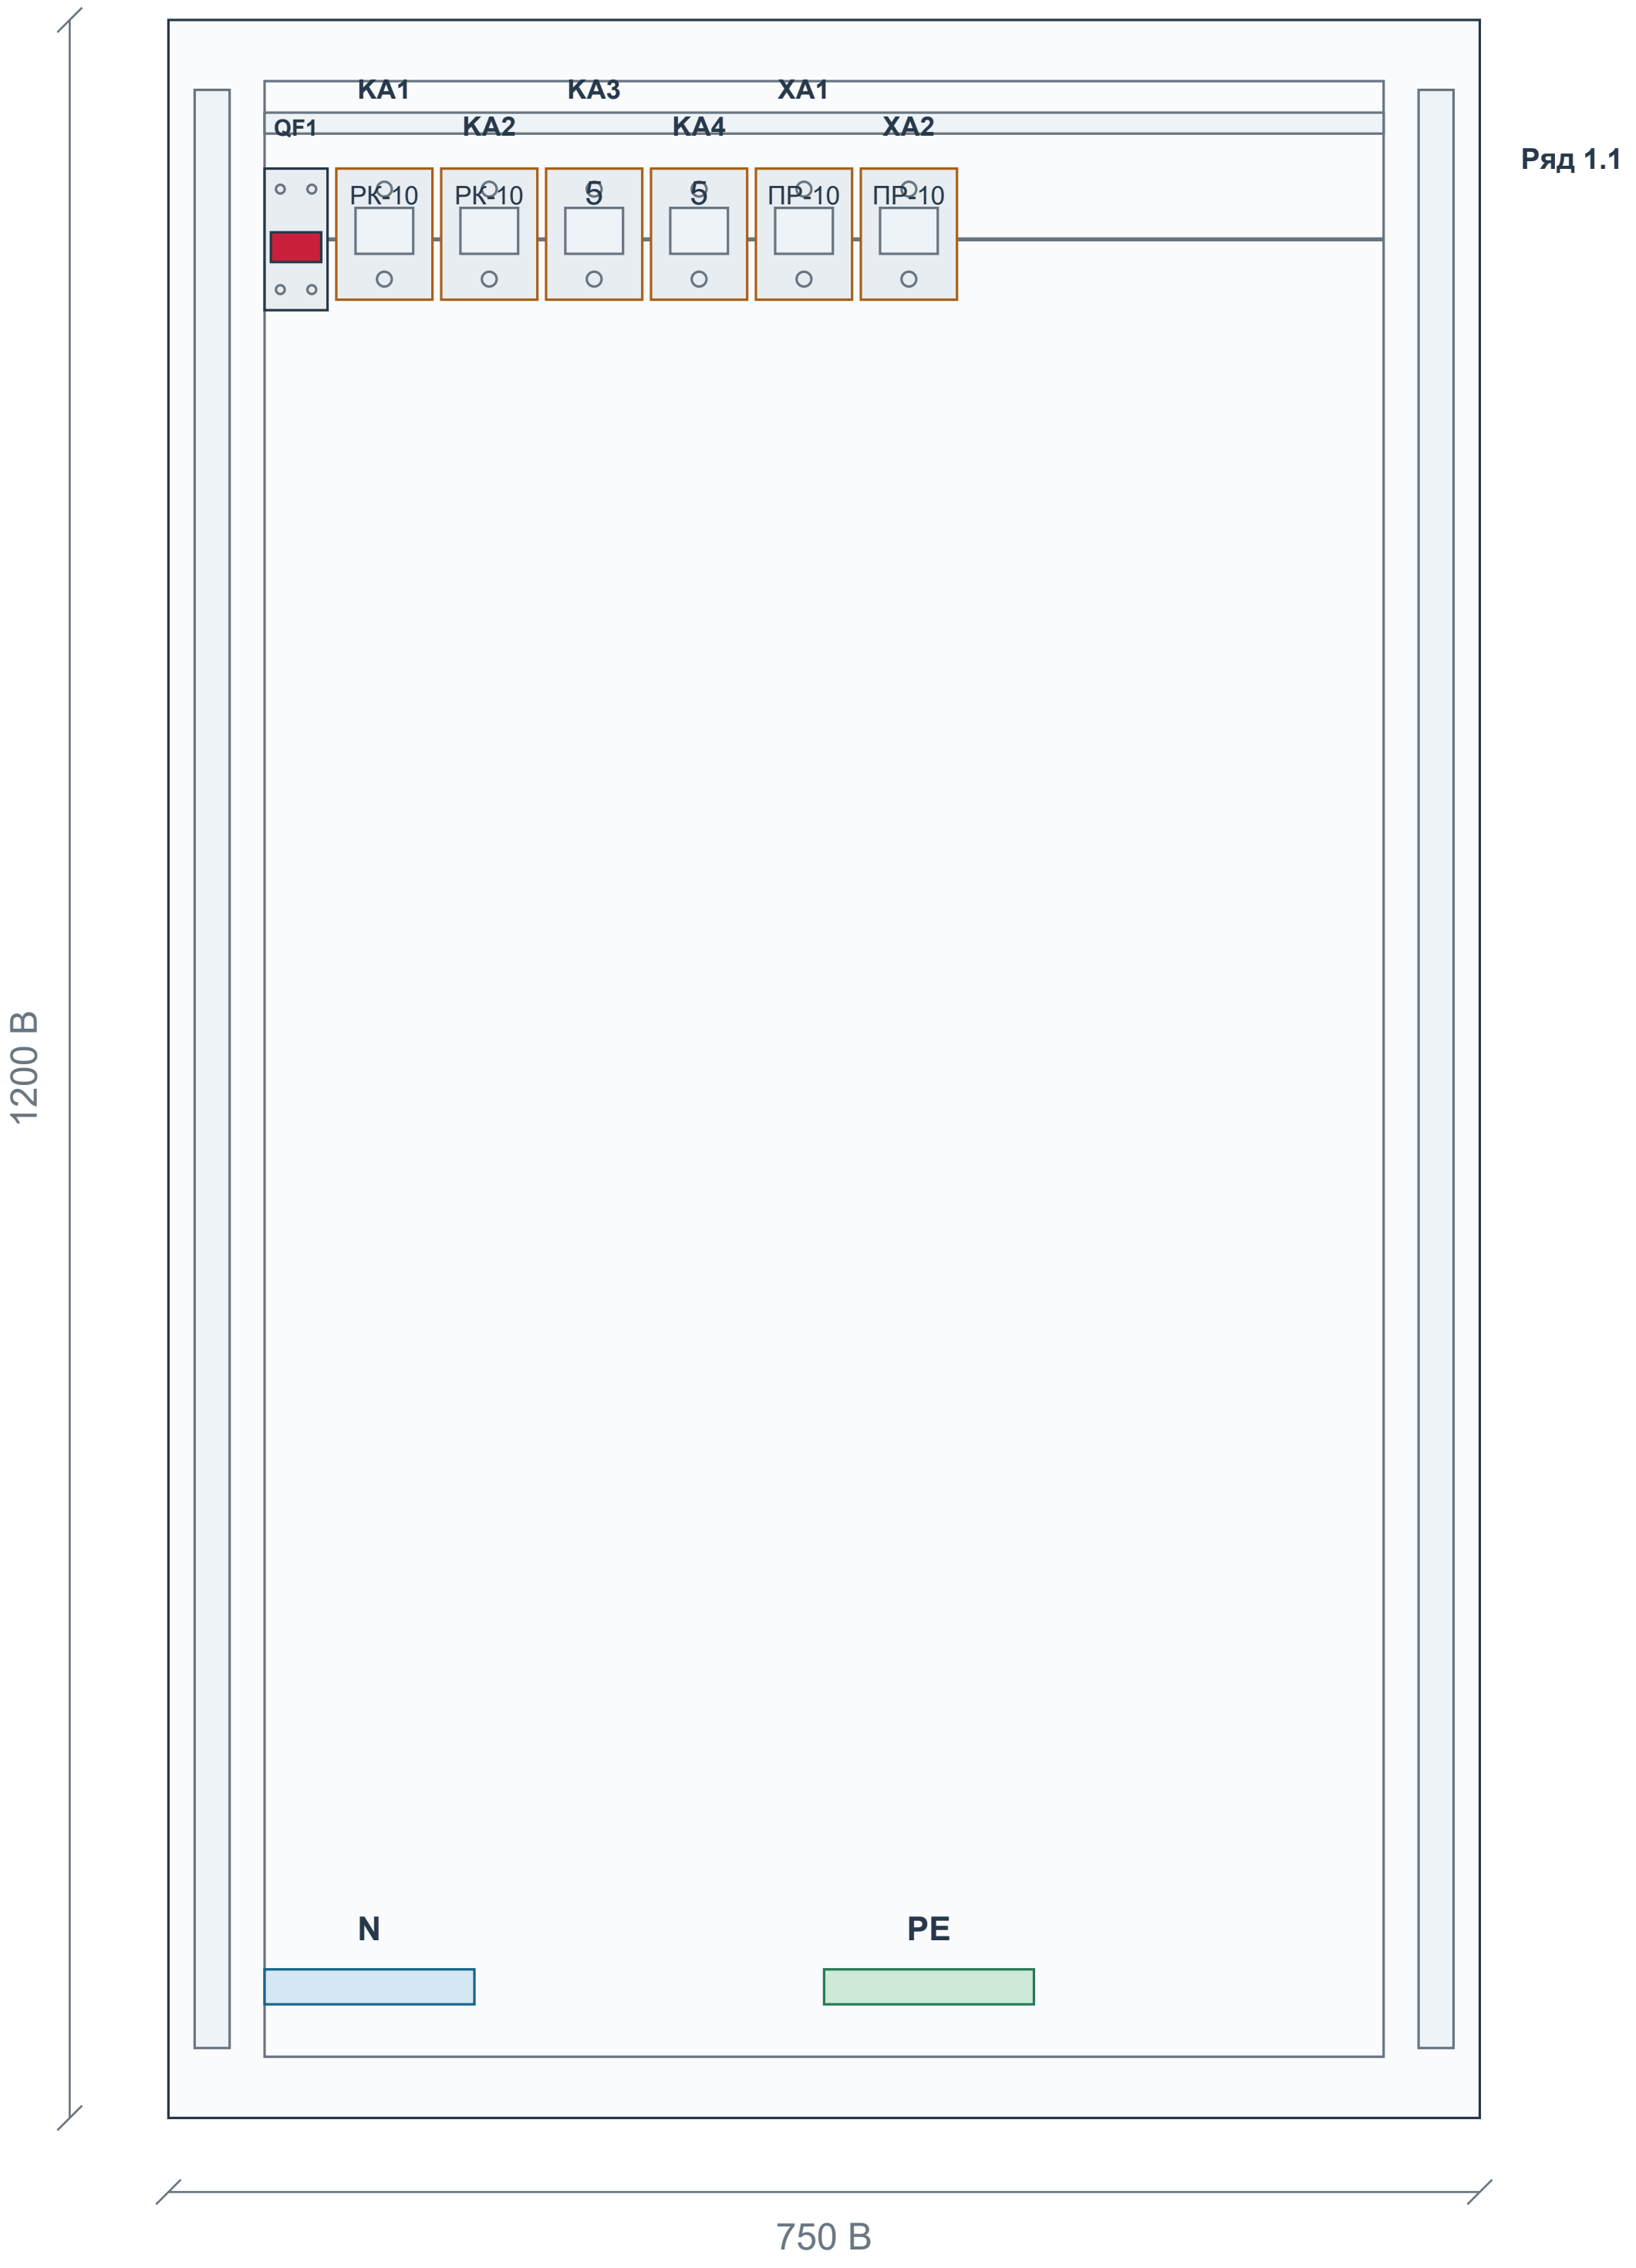

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QF1	NXB-63S	1409	1.1	55	85	36 × 81
KA1 - KA2	PK-101	1410	1.1	96...156	85	?
KA3 - KA4	ПР-102	1411	1.1	216...276	85	?
XA1 - XA2	ПР-102	1412	1.1	336...396	85	?

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

У 6 аппаратов габариты не заполнены; янтарные контуры условные. Фактический размер и посадку проверить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Актуальная спецификация

ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1428 | ЭОМ, PDF стр. 60

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1429	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800х650х250) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
1430	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1431	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	6	6	chint	Отход.
1432	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1433	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	8	8	chint	Управл.
1434	836720	Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	8	8	chint	Отход.
1435	837109	Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R)	шт	4	4	chint	Управл.
1436	837110	Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1437	837112	Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1438	837115	Тепловое реле NXR-25 5.5-8A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1439	425058	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10А, 1Р, "0-1"	шт	8	8	chint	Управл.
1440	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	шт	8	8	chint	Управл.
1441	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	8	8	chint	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 60

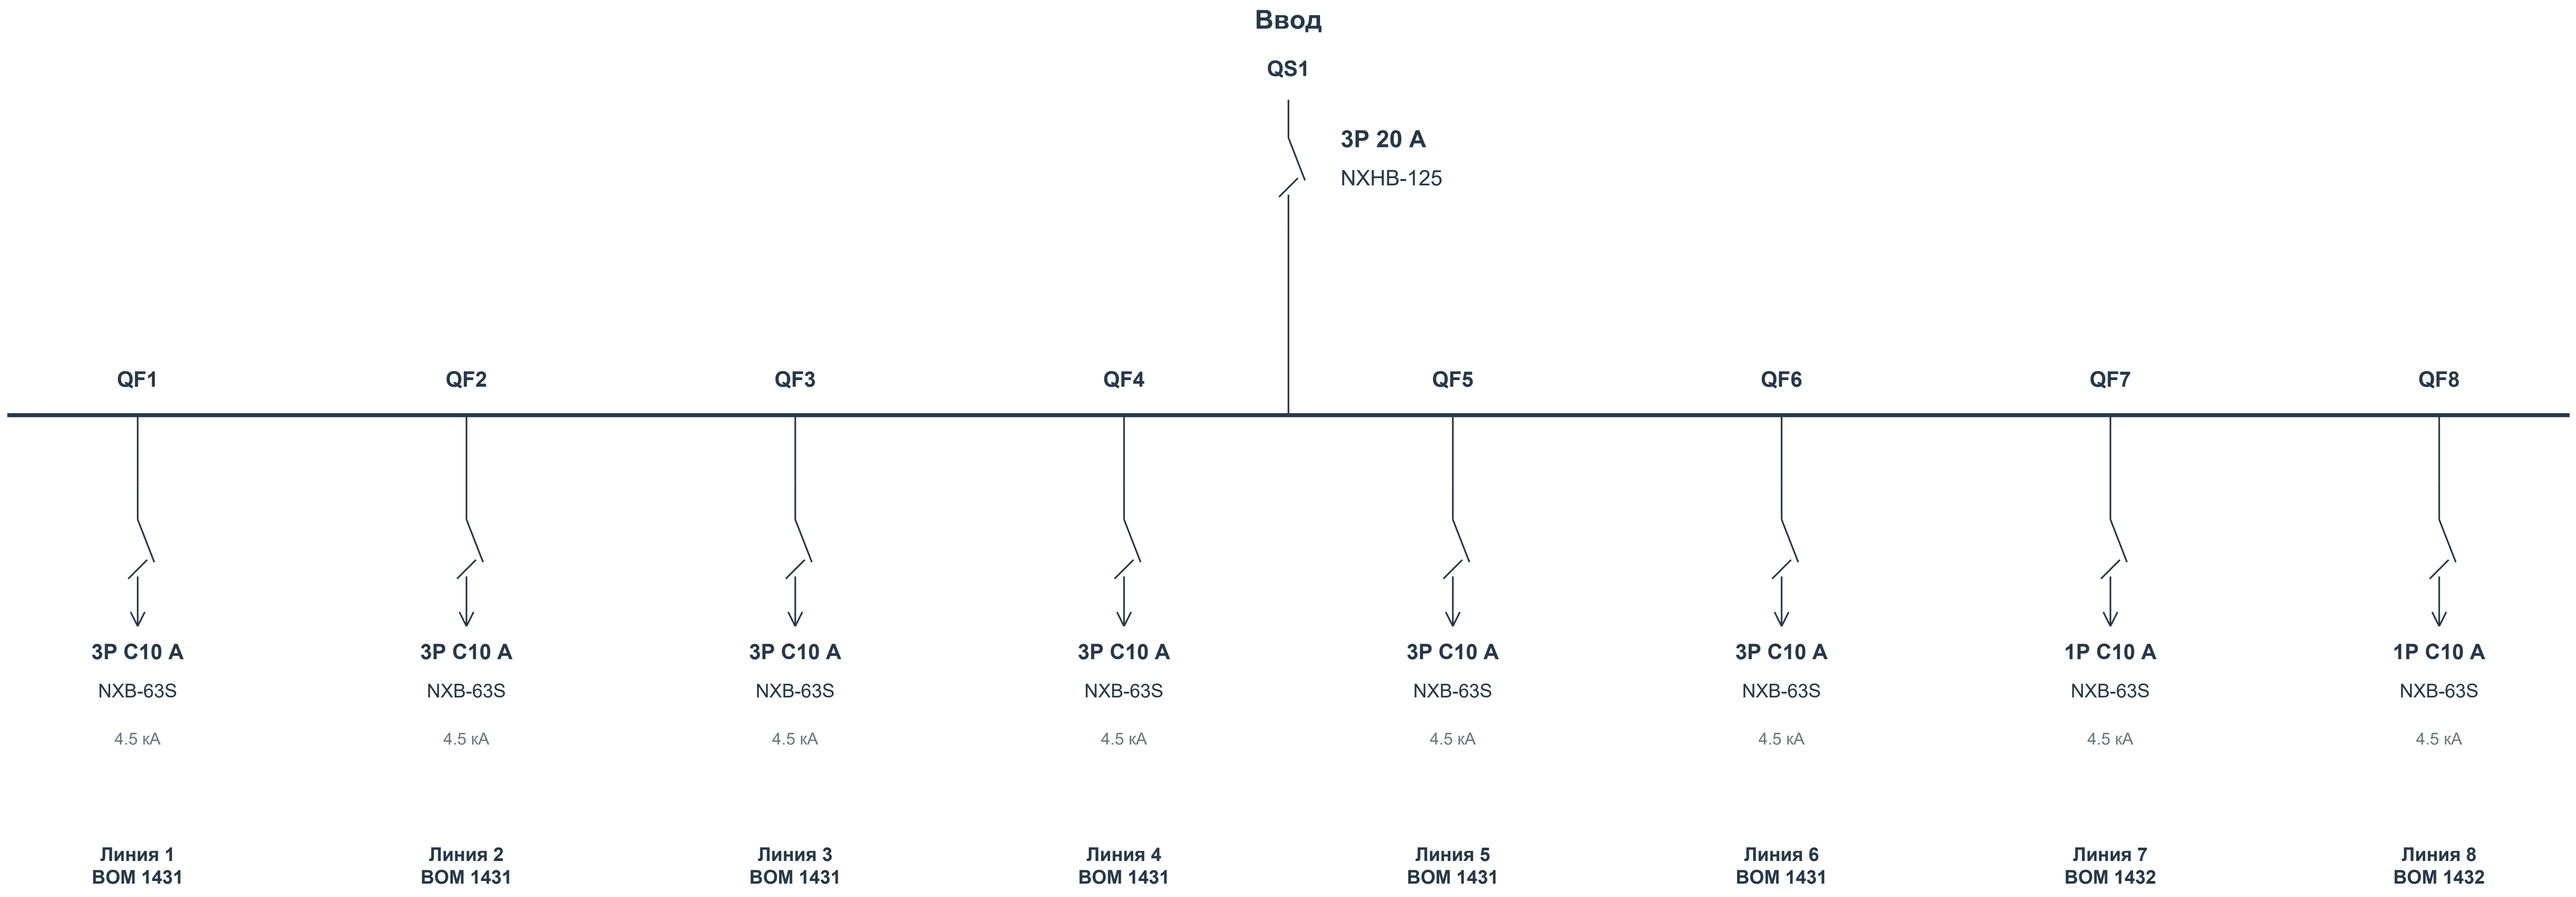
Ввод
QS1
3P 20 A
NXHB-125
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1431
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 1431
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 1431
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 1431
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 1431
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 1431
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 1432
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 8
BOM 1432

Управление / учет: SF1 - SF8 NXB-63S × 8; KM1 - KM8 NXC-16 × 8; KK1 - KK8 NXR-25 × 8; SA1 - SA8 LW32-10/C01/1 × 8; HL1 - HL16 ND16-22D/2 × 16

Данные исходного проекта: Ру 6.35 кВт | Рр 4,8 кВт | Iр 9,0 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

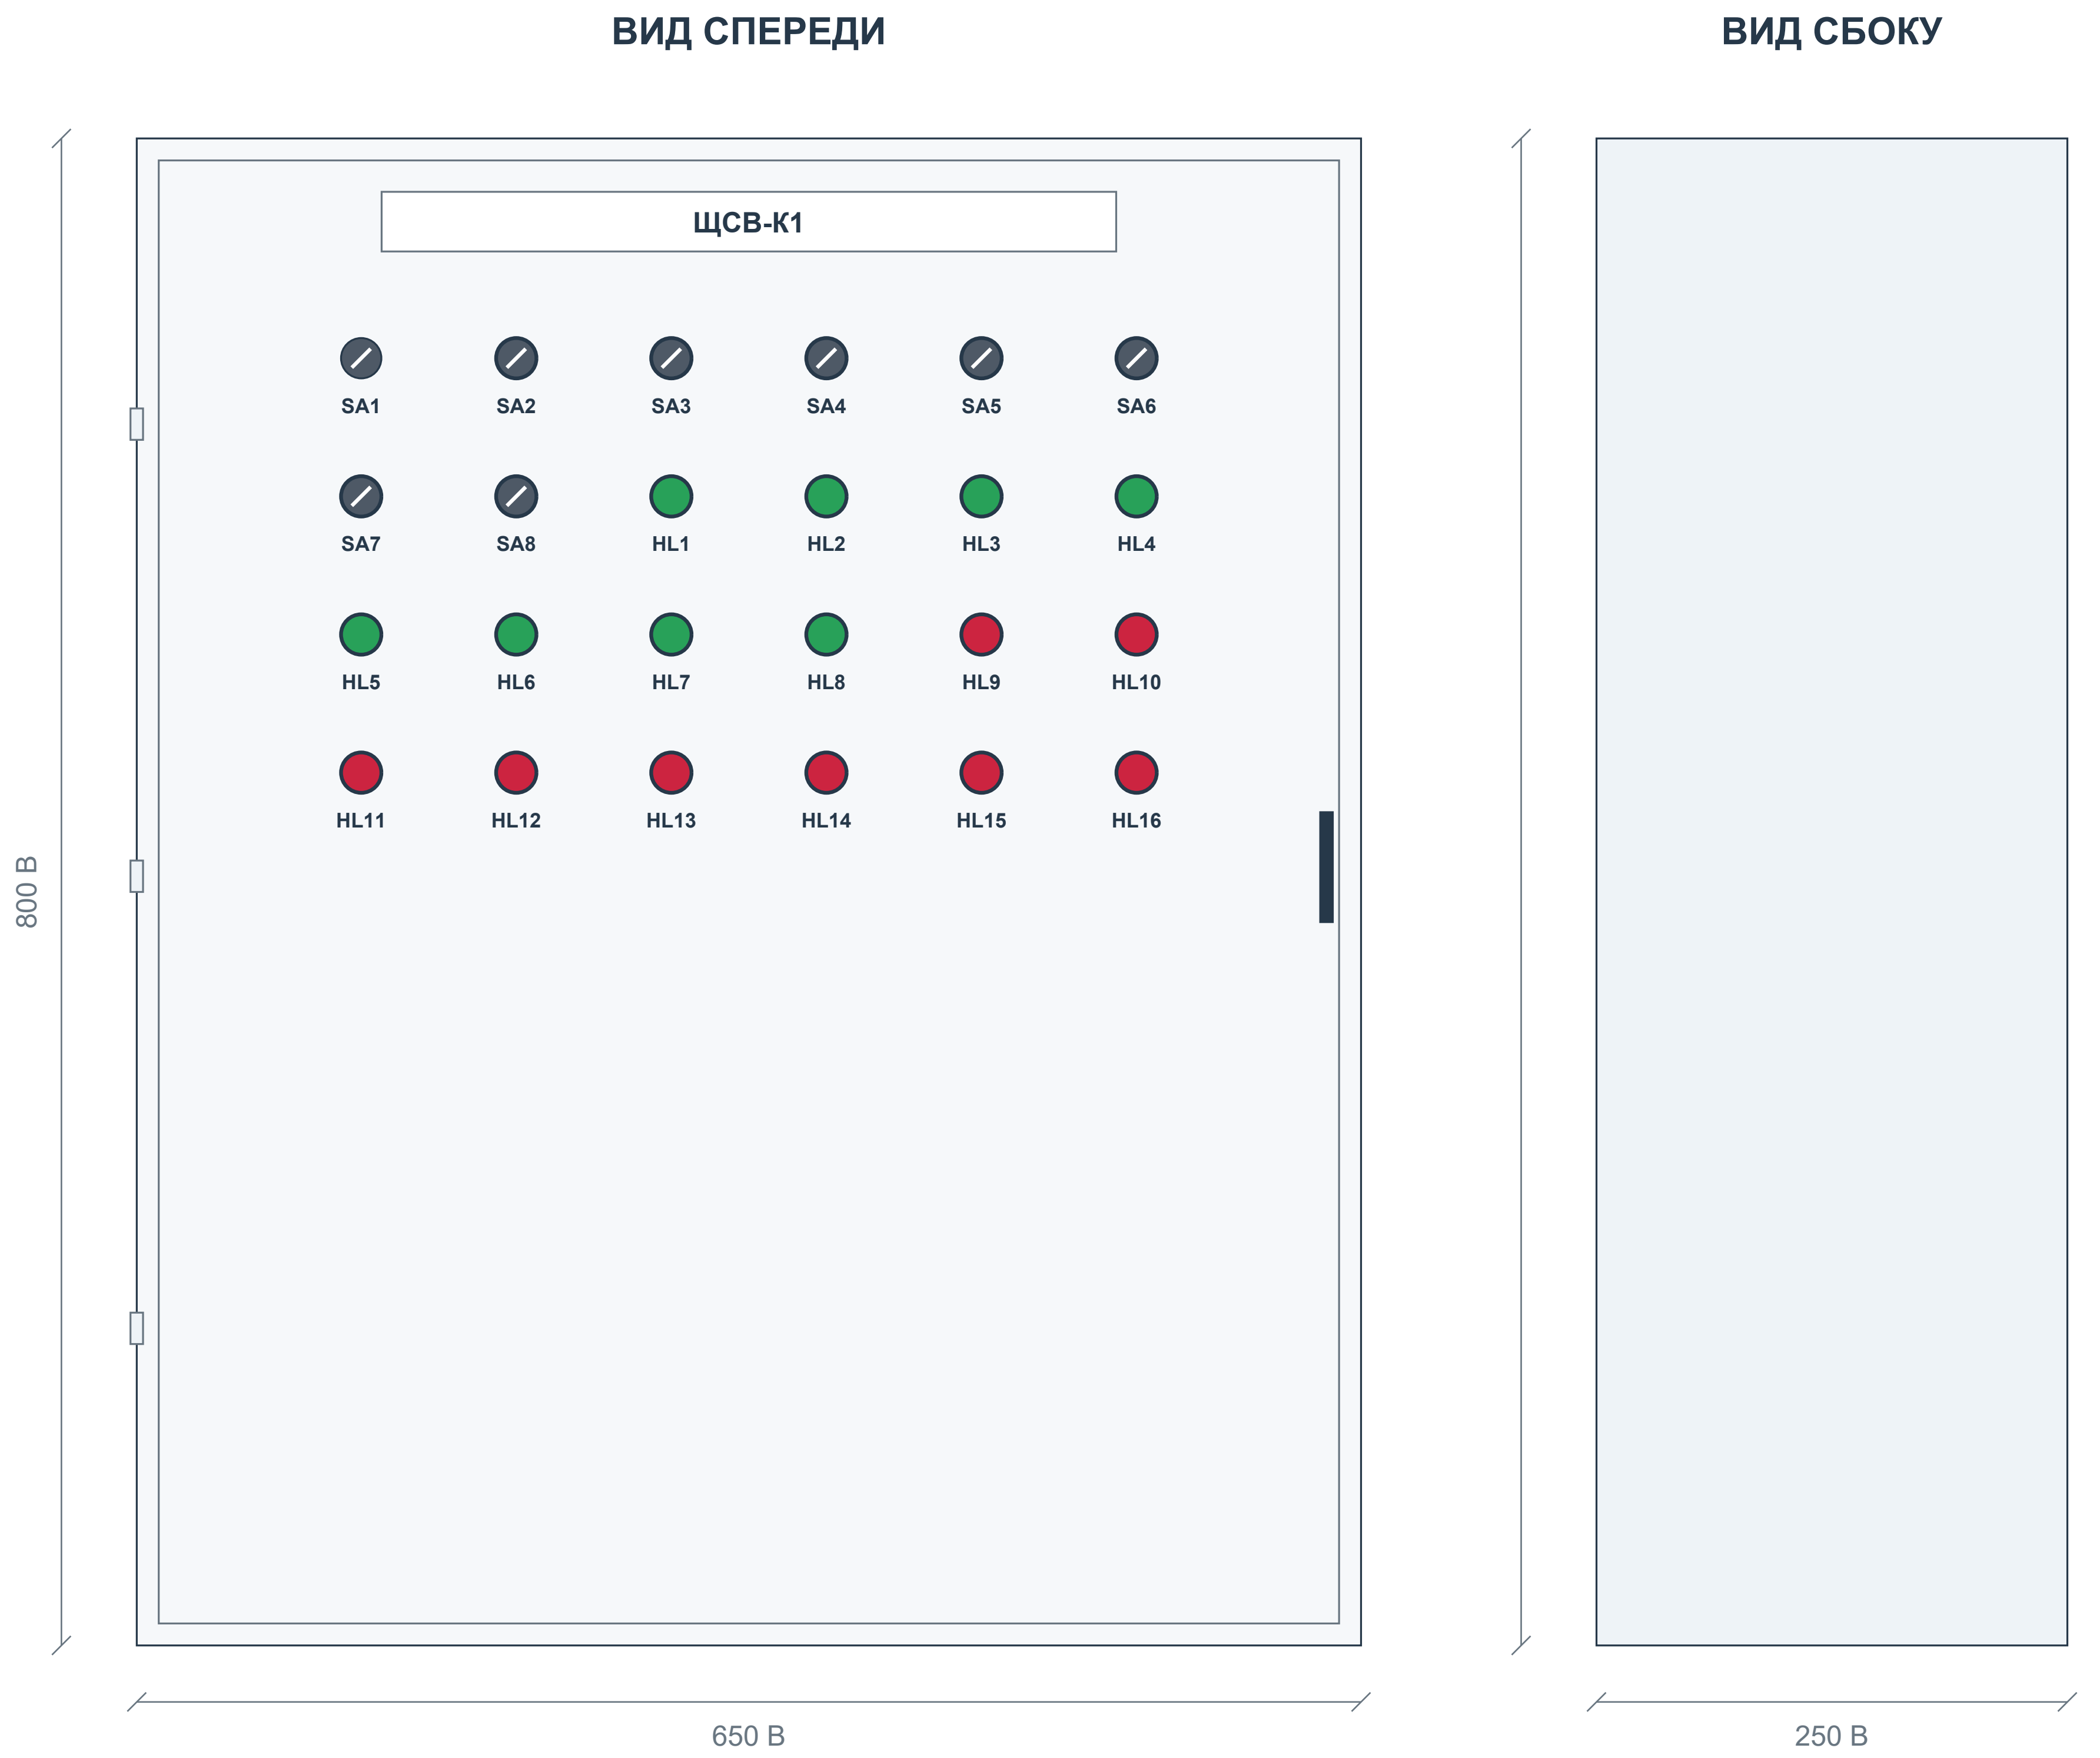
ВИД СПЕРЕДИ
ВИД СБОКУ
ЩСВ-К1
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL6
HL7
HL8
HL9
HL10
HL11
HL12
HL13
HL14
HL15
HL16
800 В
650 В
250 В

Корпус: Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 24 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

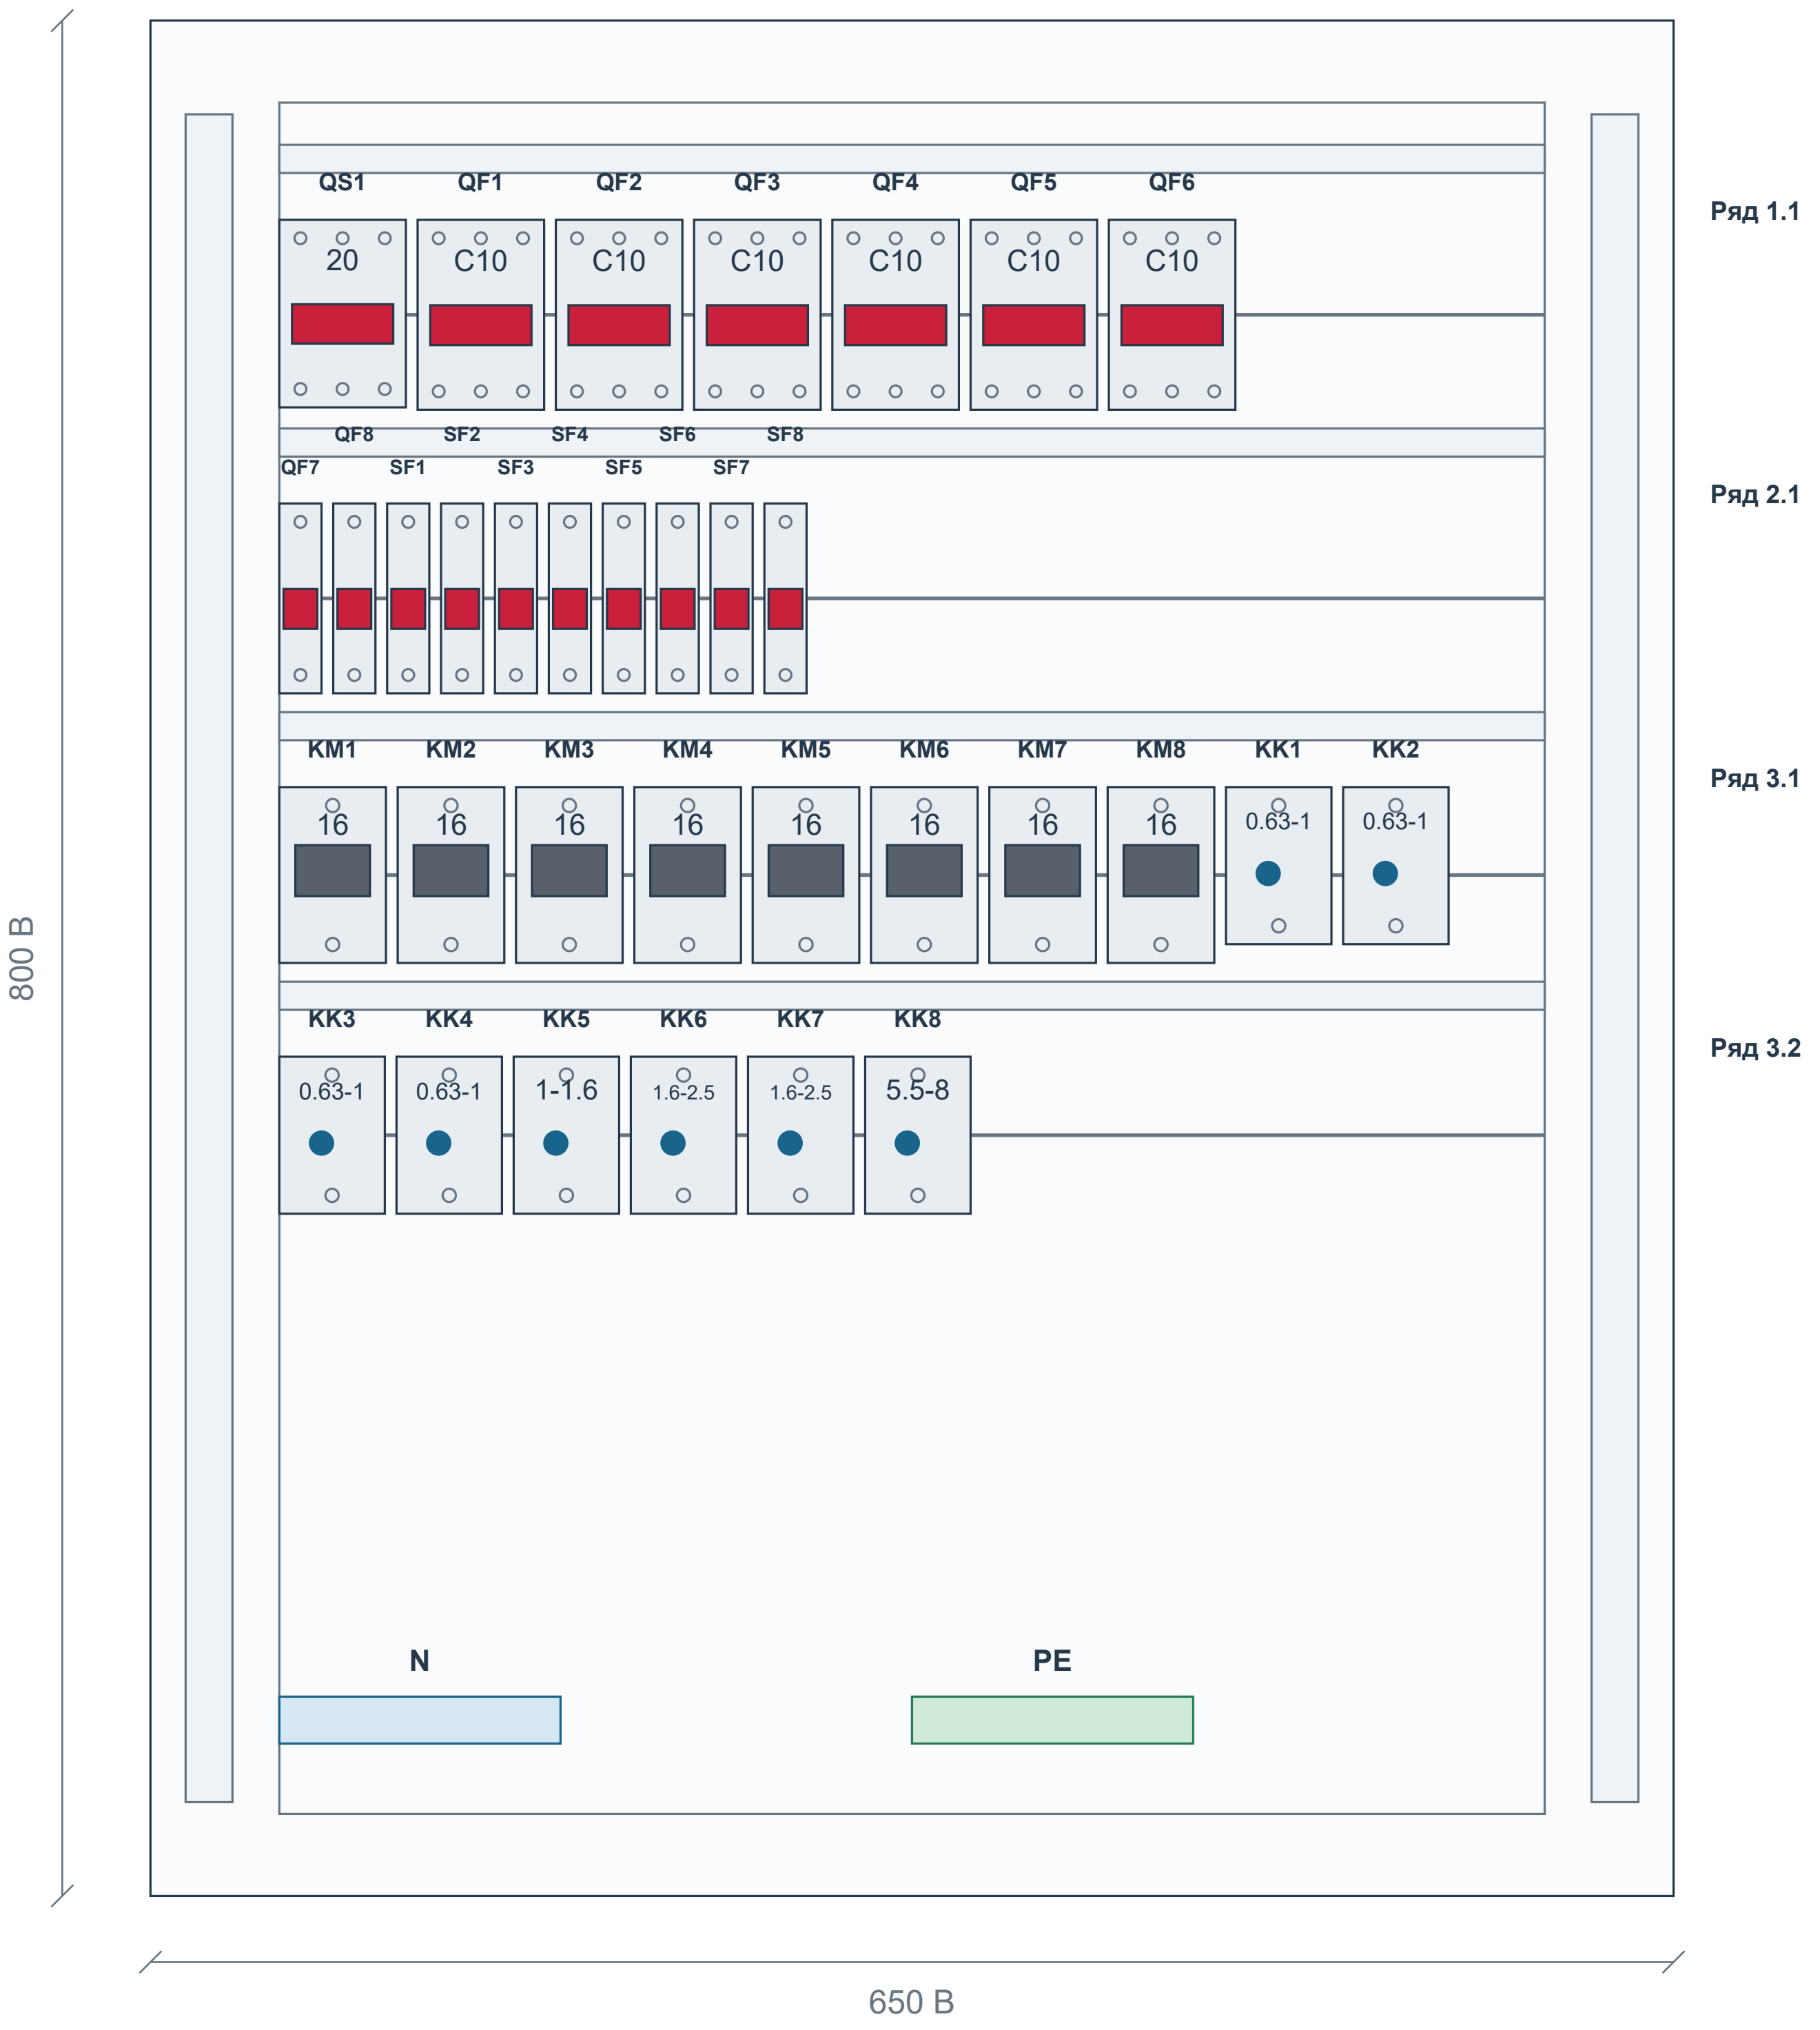
QS1
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
20
C10
C10
C10
C10
C10
C10
Ряд 1.1
QF8
SF2
SF4
SF6
SF8
QF7
SF1
SF3
SF5
SF7
Ряд 2.1
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KK1
KK2
16
16
16
16
16
16
16
16
0.63-1
0.63-1
Ряд 3.1
KK3
KK4
KK5
KK6
KK7
KK8
0.63-1
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
1.6-2.5
5.5-8
Ряд 3.2
N
PE
800 B
650 B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QS1	NXHB-125	1430	1.1	55	85	54 × 80
QF1 - QF6	NXB-63S	1431	1.1	114...409	85	54 × 81
QF7 - QF8	NXB-63S	1432	2.1	55...78	206	18 × 81
SF1 - SF8	NXB-63S	1433	2.1	101...262	206	18 × 81
KM1 - KM8	NXC-16	1434	3.1	55...408.5	327	45.5 × 75
KK1 - KK4	NXR-25	1435	3.1/3.2	459...509 / 55...105	327/442	45 × 67
KK5	NXR-25	1436	3.2	155	442	45 × 67
KK6 - KK7	NXR-25	1437	3.2	205...255	442	45 × 67
KK8	NXR-25	1438	3.2	305	442	45 × 67

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Ряды с недостаточной шириной разделены на подряды. Новые расстояния и способ крепления согласовать.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Актуальная спецификация

ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1462 | ЭОМ, PDF стр. 69

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1463	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
1464	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1465	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1466	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
1467	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1468	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1469	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	10	10	chint	Управл.
1470	836720	Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1471	836720	Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1472	837107	Тепловое реле NXR-25 0.25-0.4A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1473	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1474	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1475	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1476	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1477	837109	Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1478	837109	Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1479	837110	Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1480	837112	Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1481	837112	Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1482	425058	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10А, 1Р, "0-1"	шт	10	10	chint	Управл.
1483	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	шт	10	10	chint	Управл.
1484	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	10	10	chint	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОМ, PDF стр. 69

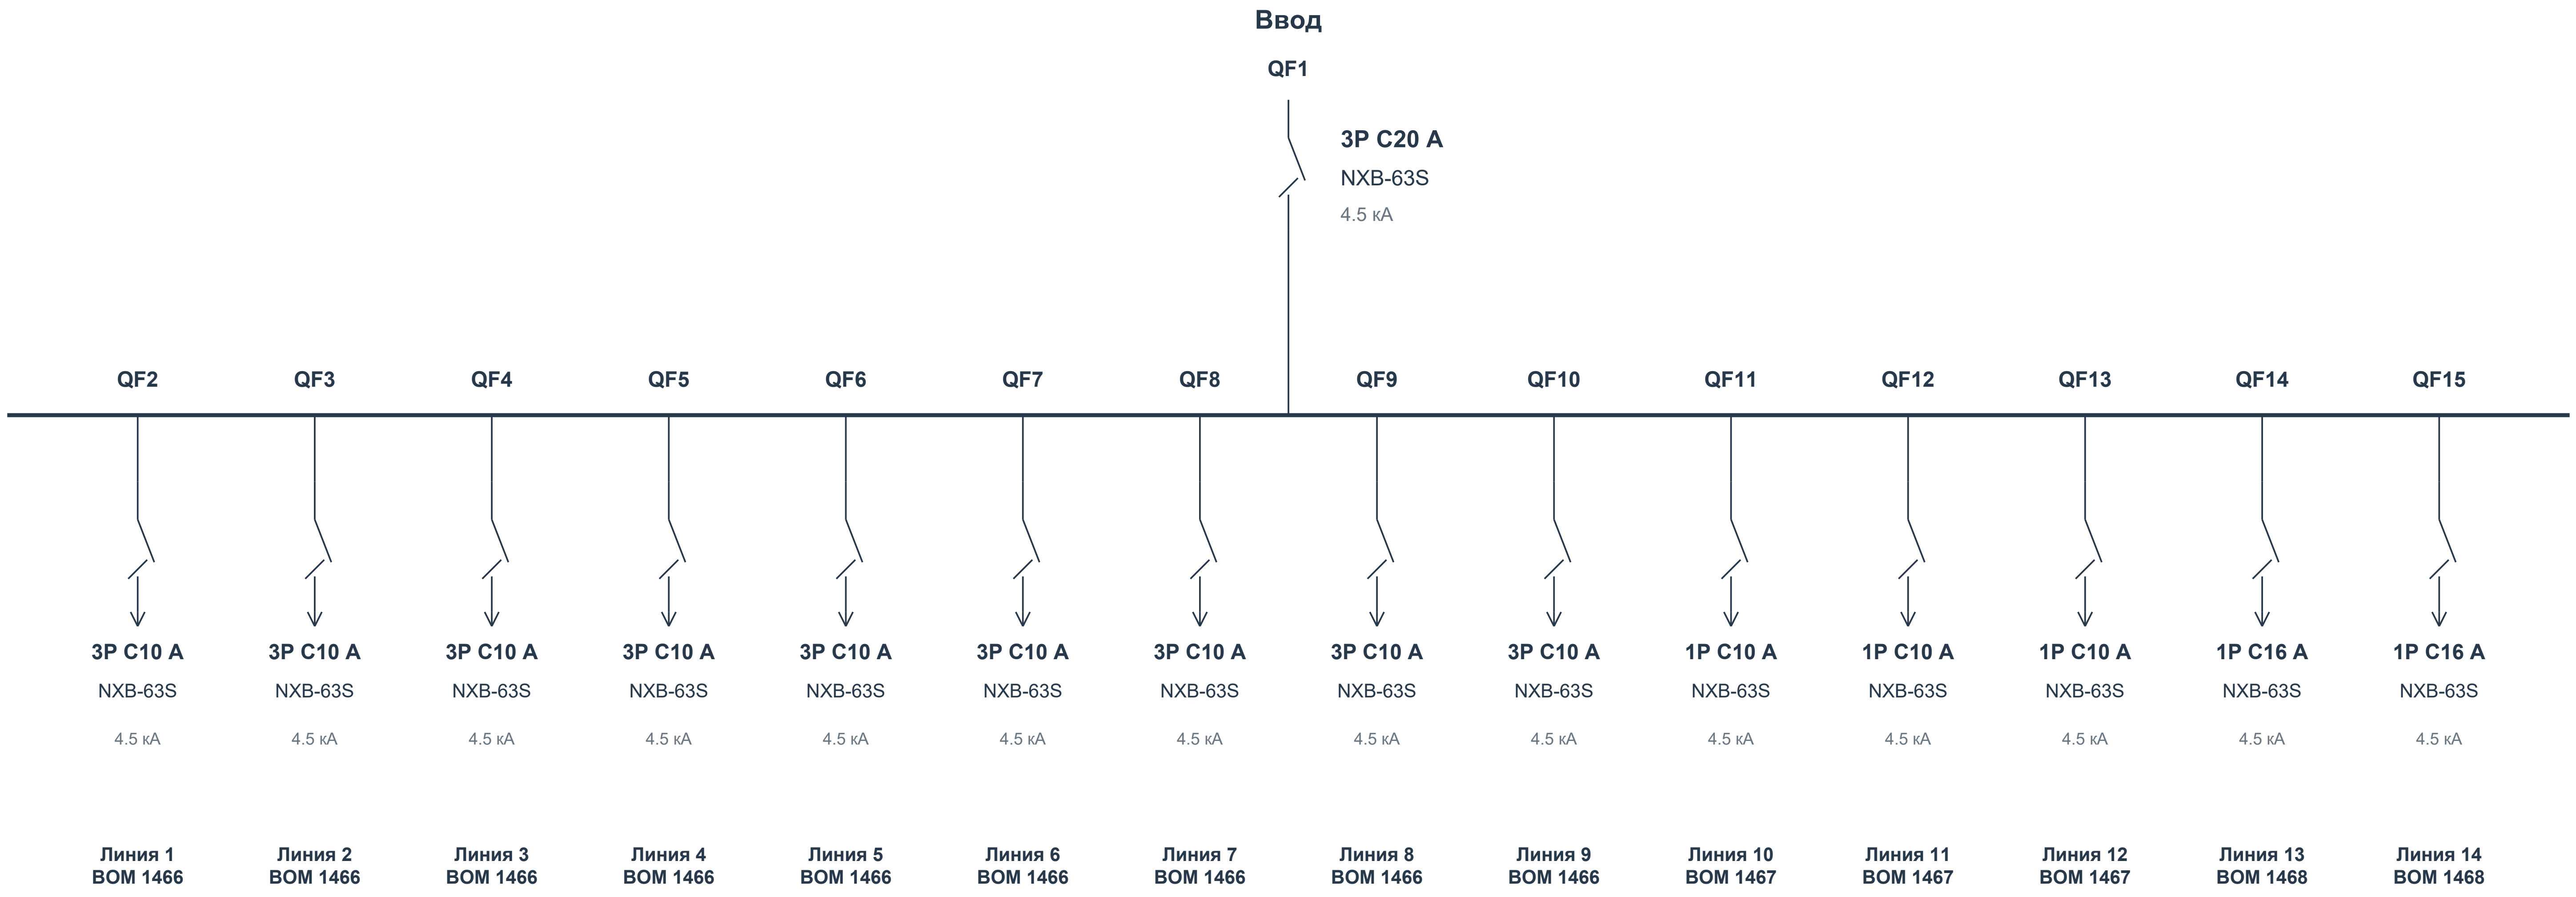
Ввод
QF1
3P C20 A
NXB-63S
4.5 кА
QF2
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 1
BOM 1466
QF3
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 2
BOM 1466
QF4
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 3
BOM 1466
QF5
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 4
BOM 1466
QF6
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 5
BOM 1466
QF7
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 6
BOM 1466
QF8
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 7
BOM 1466
QF9
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 8
BOM 1466
QF10
3P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 9
BOM 1466
QF11
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 10
BOM 1467
QF12
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 11
BOM 1467
QF13
1P C10 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 12
BOM 1467
QF14
1P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 13
BOM 1468
QF15
1P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
Линия 14
BOM 1468

Управление / учет: MX1 SHT-X1 × 1; SF1 - SF10 NXB-63S × 10; KM1 - KM10 NXC-16 × 10; KK1 - KK10 NXR-25 × 10; SA1 - SA10 LW32-10/C01/1 × 10; HL1 - HL20 ND16-22D/2 × 20

Данные исходного проекта: Ру 7.80 кВт | Рр 5,1 кВт | Ip 9,8 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

ВИД СПЕРЕДИ

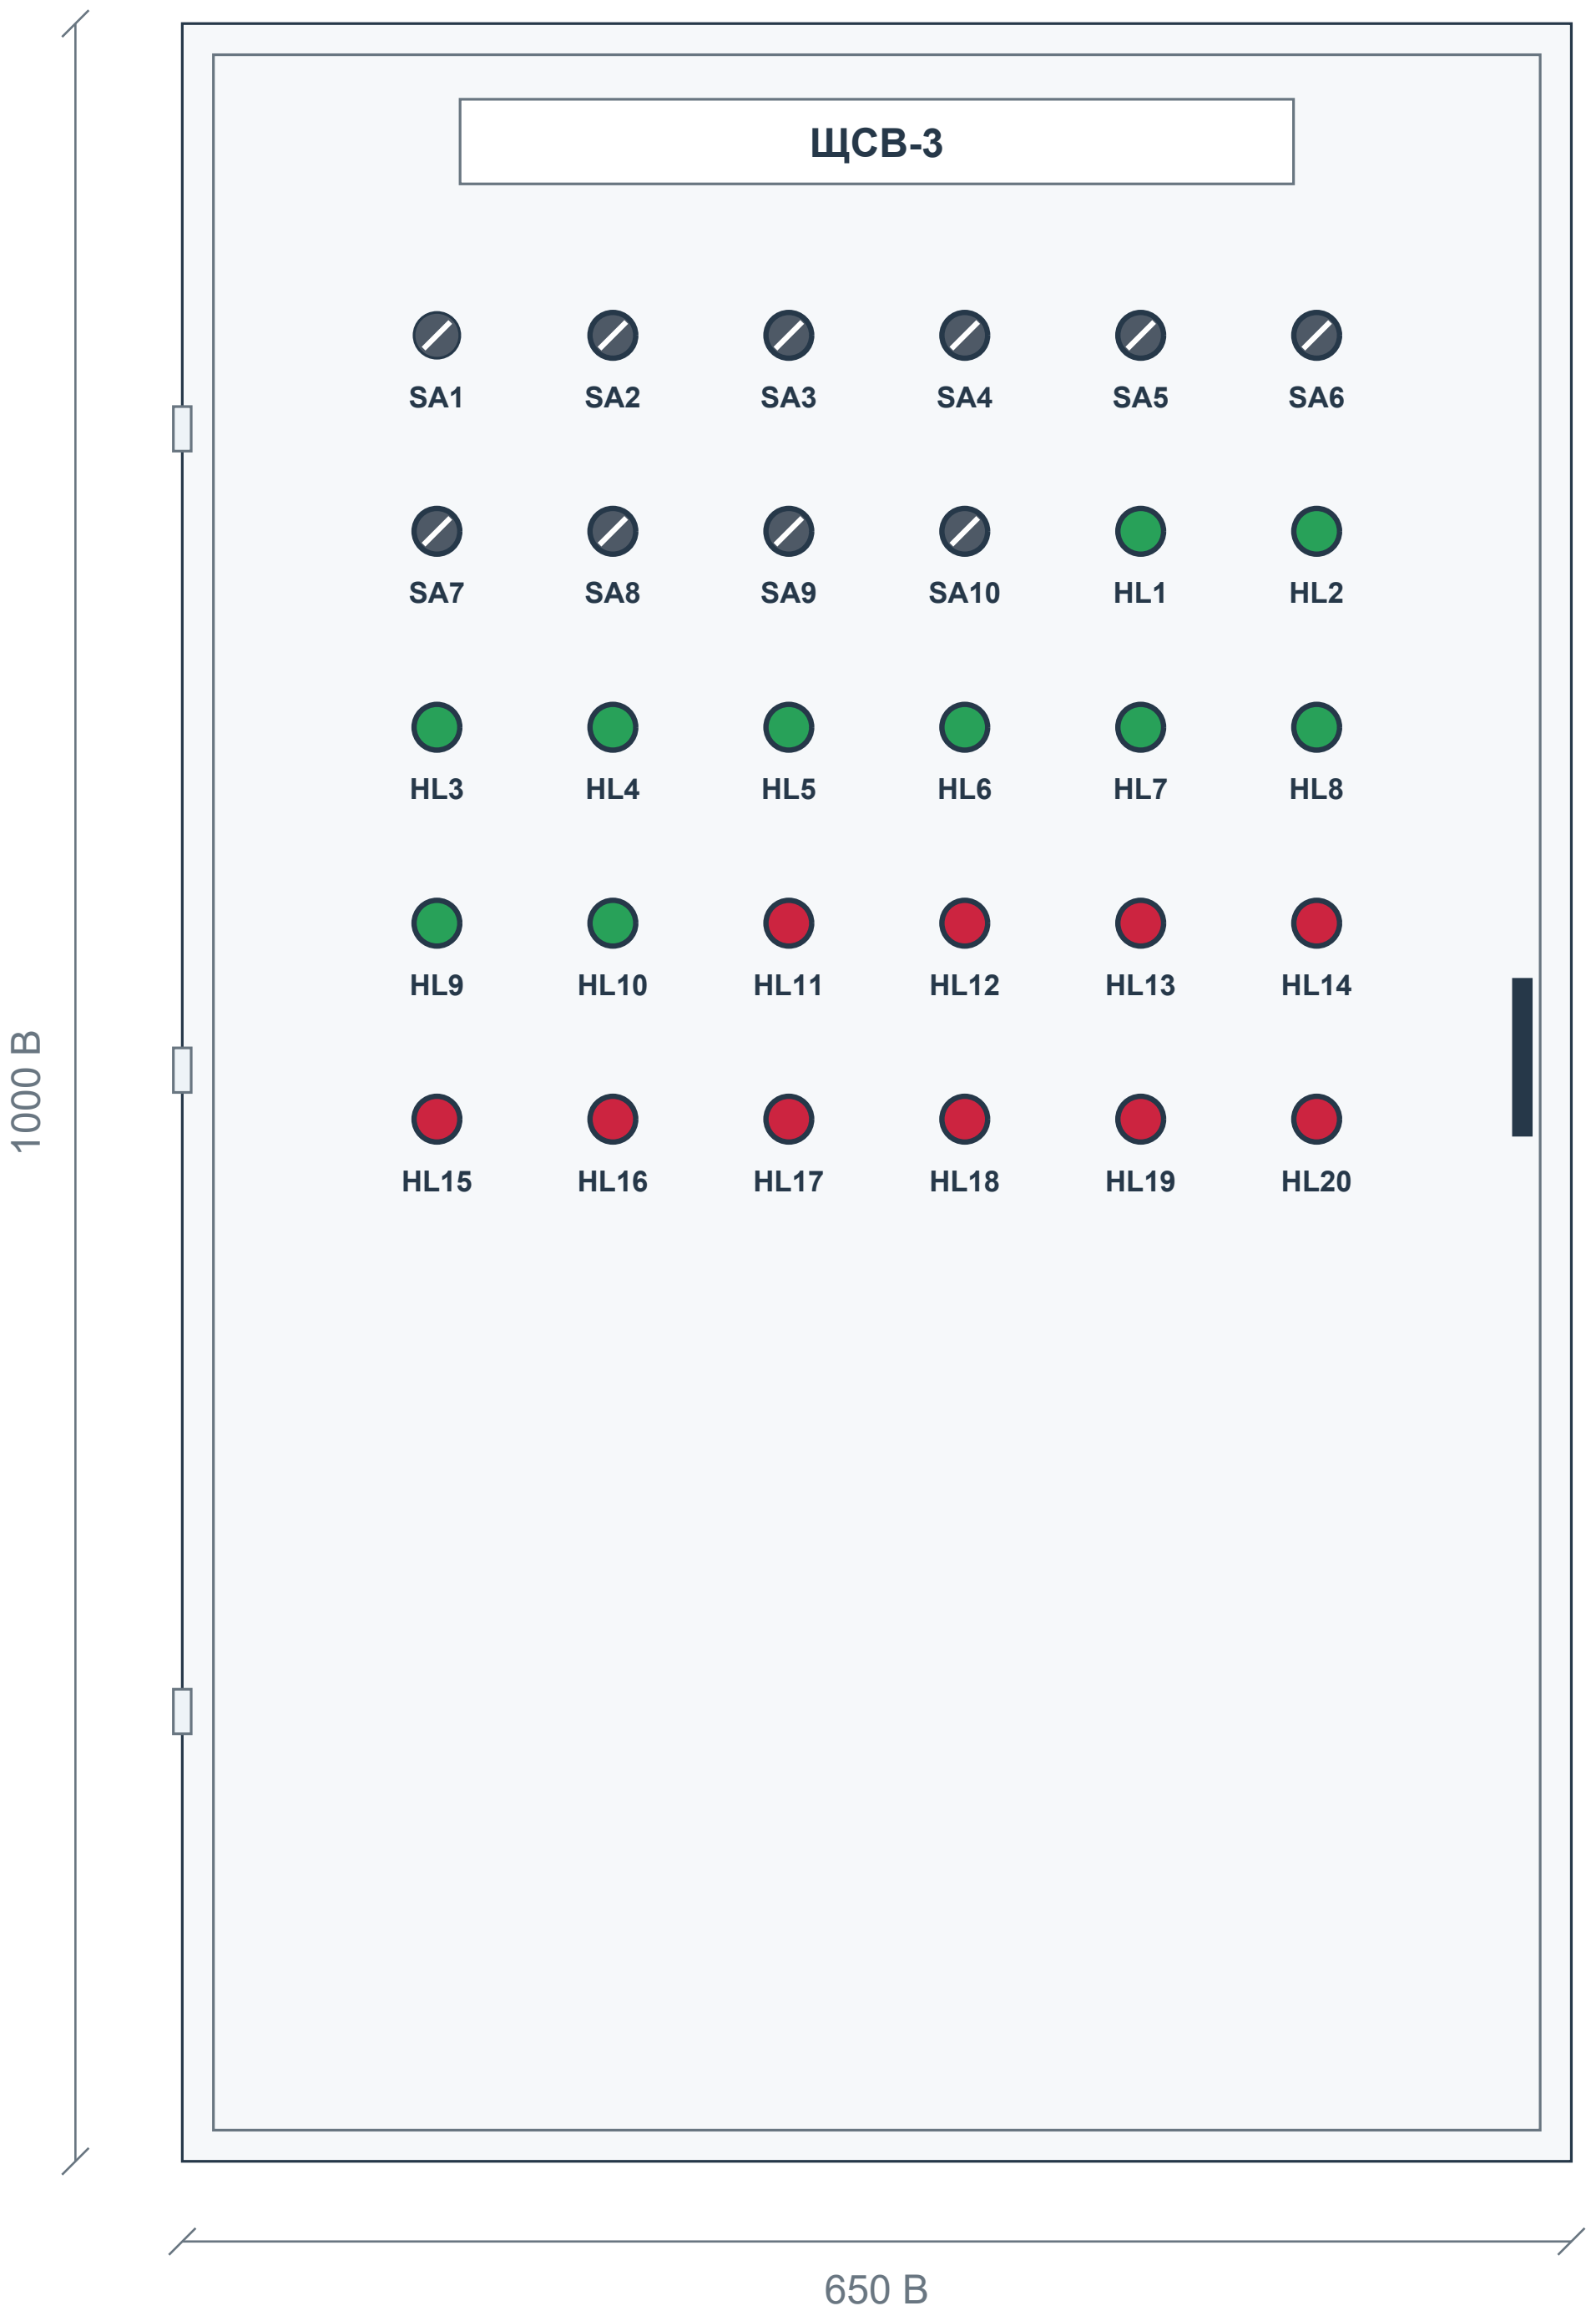
ЩСВ-3
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL6
HL7
HL8
HL9
HL10
HL11
HL12
HL13
HL14
HL15
HL16
HL17
HL18
HL19
HL20
1000 В
650 В

ВИД СБОКУ



Корпус: Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 30 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Внутренний монтаж и координаты

B: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

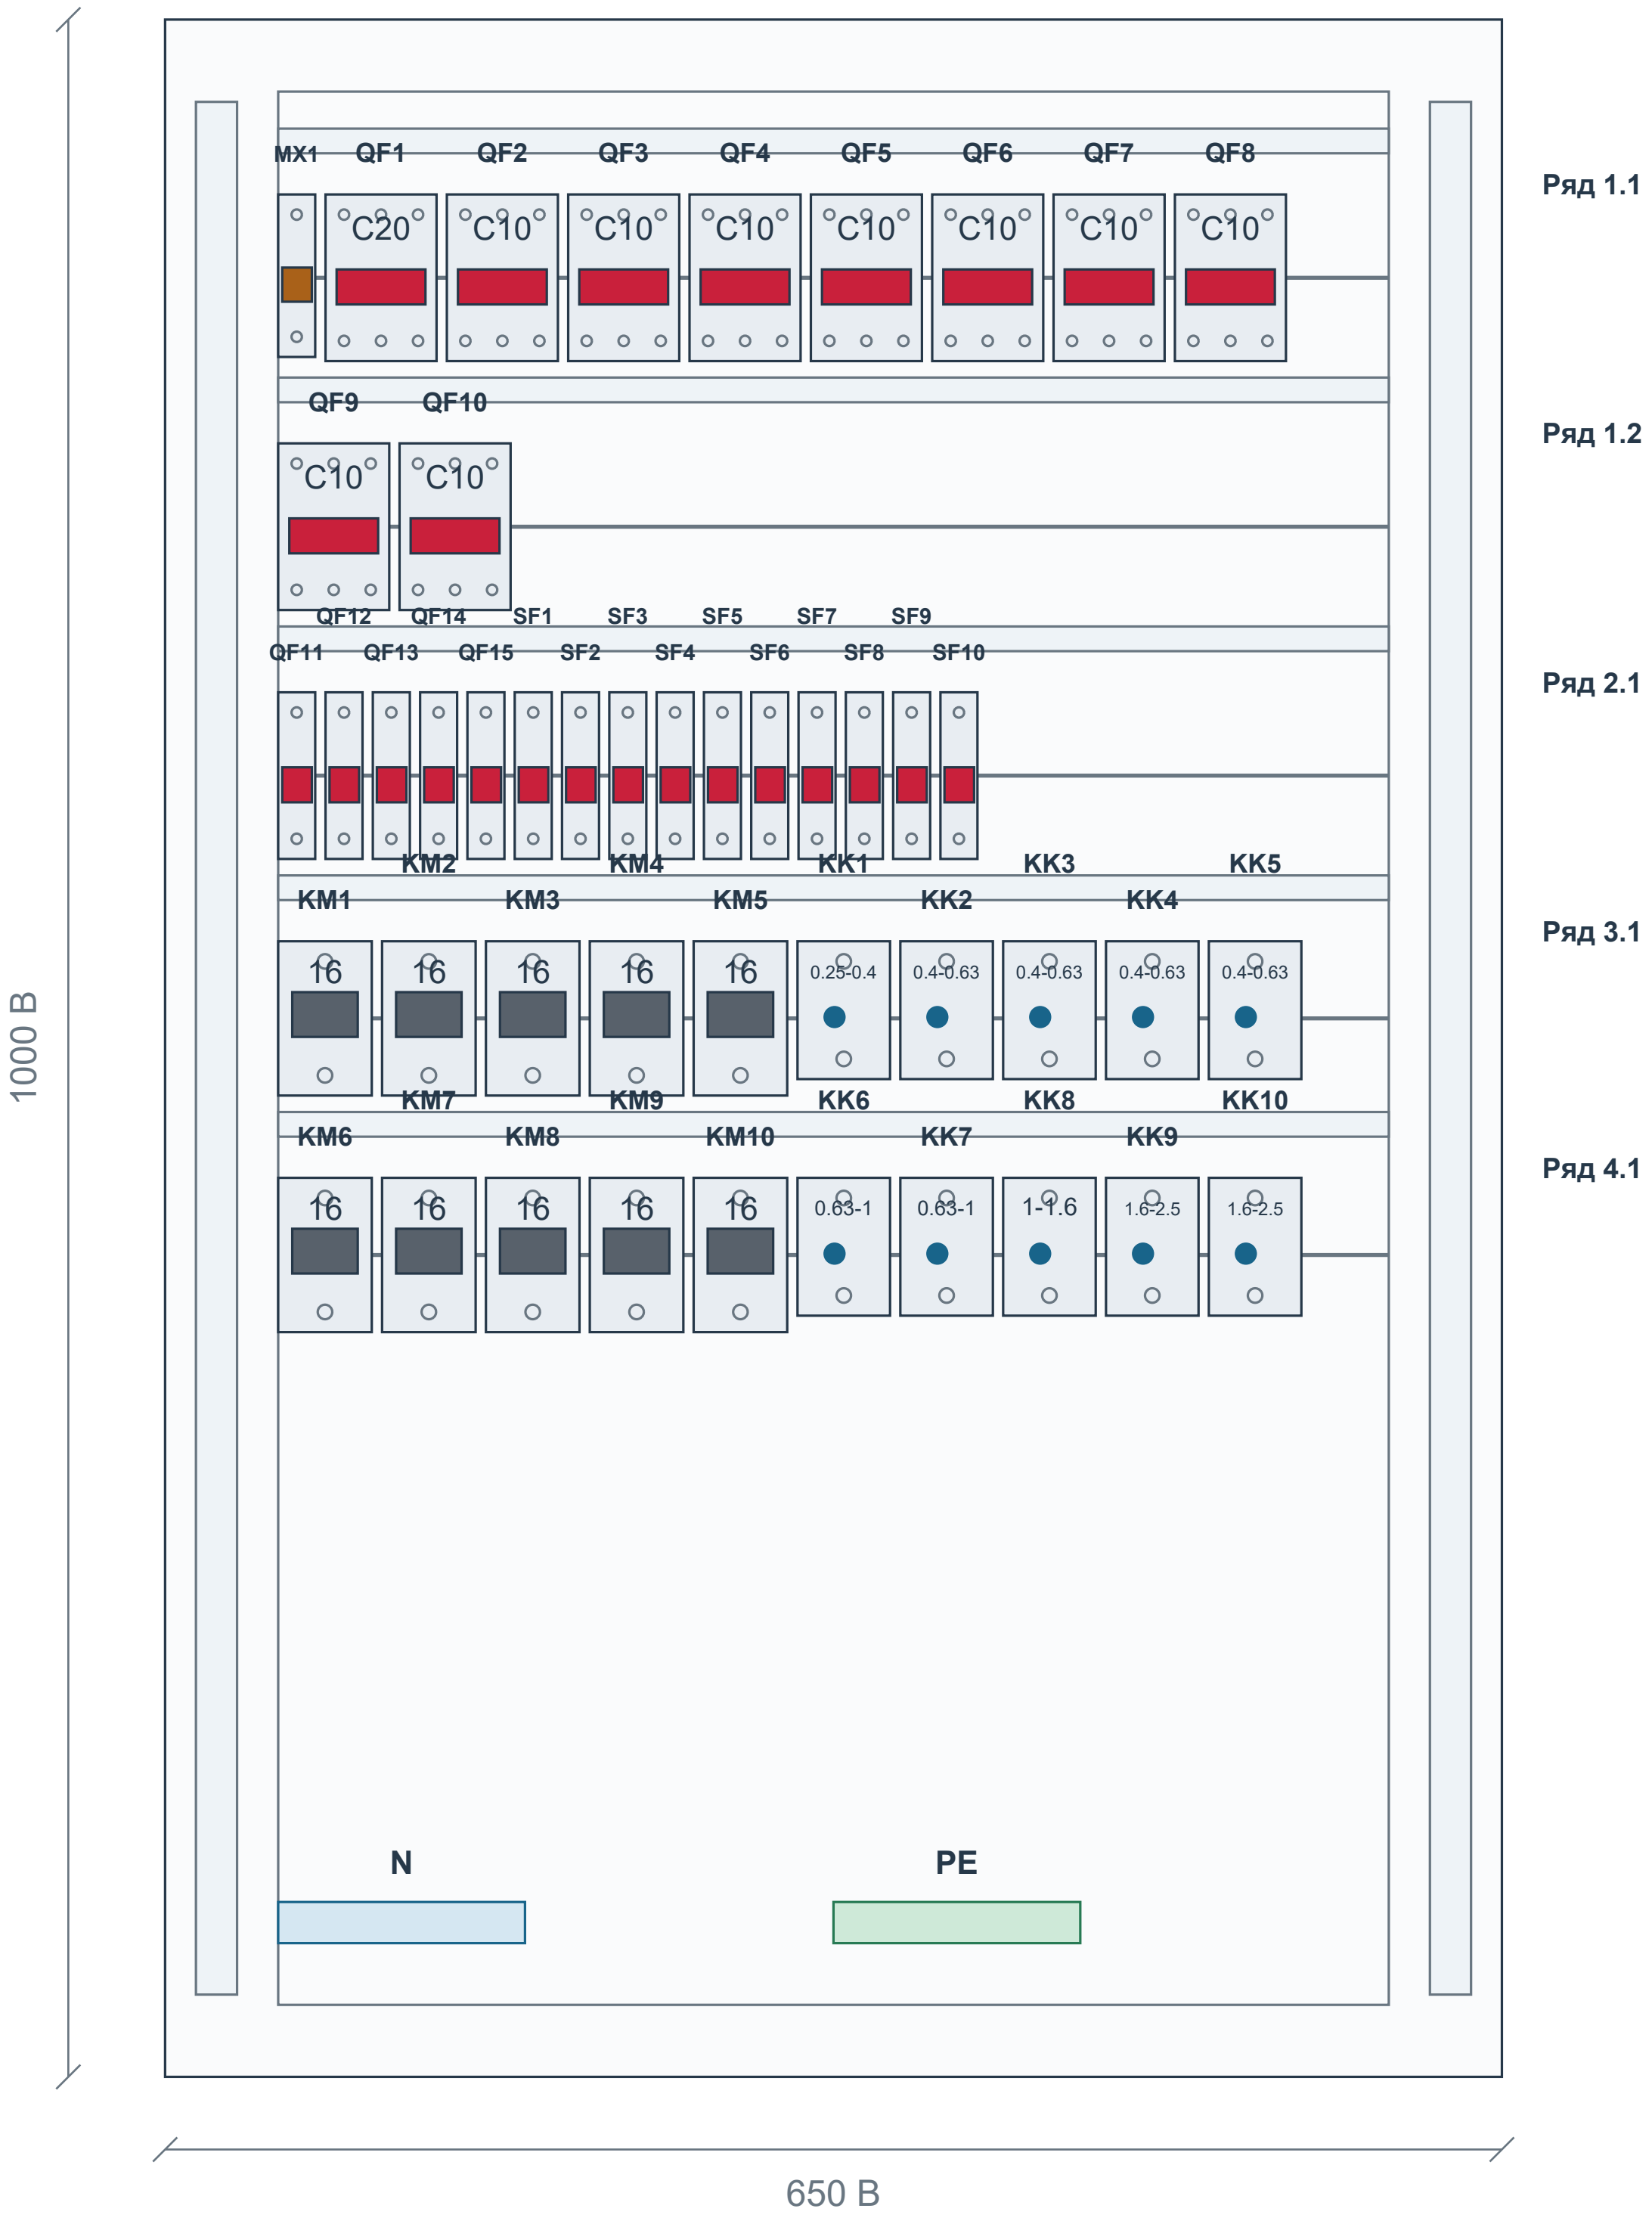
MX1
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
C20
C10
QF9
QF10
QF12
QF14
SF1
SF3
SF5
SF7
SF9
QF11
QF13
QF15
SF2
SF4
SF6
SF8
SF10
KM2
KM4
KK1
KK3
KK5
KM1
KM3
KM5
KK2
KK4
16
0.25-0.4
0.4-0.63
KM7
KM9
KK6
KK8
KK10
KM6
KM8
KM10
KK7
KK9
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
N
PE
Ряд 1.1
Ряд 1.2
Ряд 2.1
Ряд 3.1
Ряд 4.1
1000 B
650 B

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
MX1	SHT-X1	1464	1.1	55	85	18 × 79
QF1	NXB-63S	1465	1.1	78	85	54 × 81
QF2 - QF10	NXB-63S	1466	1.1/1.2	137...491 / 55...114	85/206	54 × 81
QF11 - QF13	NXB-63S	1467	2.1	55...101	327	18 × 81
QF14 - QF15	NXB-63S	1468	2.1	124...147	327	18 × 81
SF1 - SF10	NXB-63S	1469	2.1	170...377	327	18 × 81
KM1 - KM5	NXC-16	1470	3.1	55...257	448	45.5 × 75
KM6 - KM10	NXC-16	1471	4.1	55...257	563	45.5 × 75
KK1	NXR-25	1472	3.1	307.5	448	45 × 67
KK2	NXR-25	1473	3.1	357.5	448	45 × 67
KK3	NXR-25	1474	3.1	407.5	448	45 × 67
KK4	NXR-25	1475	3.1	457.5	448	45 × 67
KK5	NXR-25	1476	3.1	507.5	448	45 × 67
KK6	NXR-25	1477	4.1	307.5	563	45 × 67
KK7	NXR-25	1478	4.1	357.5	563	45 × 67
KK8	NXR-25	1479	4.1	407.5	563	45 × 67
KK9	NXR-25	1480	4.1	457.5	563	45 × 67
KK10	NXR-25	1481	4.1	507.5	563	45 × 67

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Ряды с недостаточной шириной разделены на подряды. Новые расстояния и способ крепления согласовать.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Актуальная спецификация

ЯУО (ЩМП-2 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1505 | ЭОФ, PDF стр. 3

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1506	719-15901	Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
1507	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1508	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1509	732-32150	PHOTOCELL SWITCH MH-602, 25A (100sht) (MASTE)	шт	1	1	tekled	Управл.
1510	515374	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R)	шт	7	7	chint	Отход.
1511	836904	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1512	837119	Тепловое реле NXR-25 17-25A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1514	574843	Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	шт	1	1	chint	Управл.
1515	574842	Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	шт	1	1	chint	Управл.
1516	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1517	574849	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	шт	1	1	chint	Управл.

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Однолинейная схема CHINT

Аппараты и количество: BOM. Обозначения на новых чертежах D - предложения. Источник: ЭОФ, PDF стр. 3

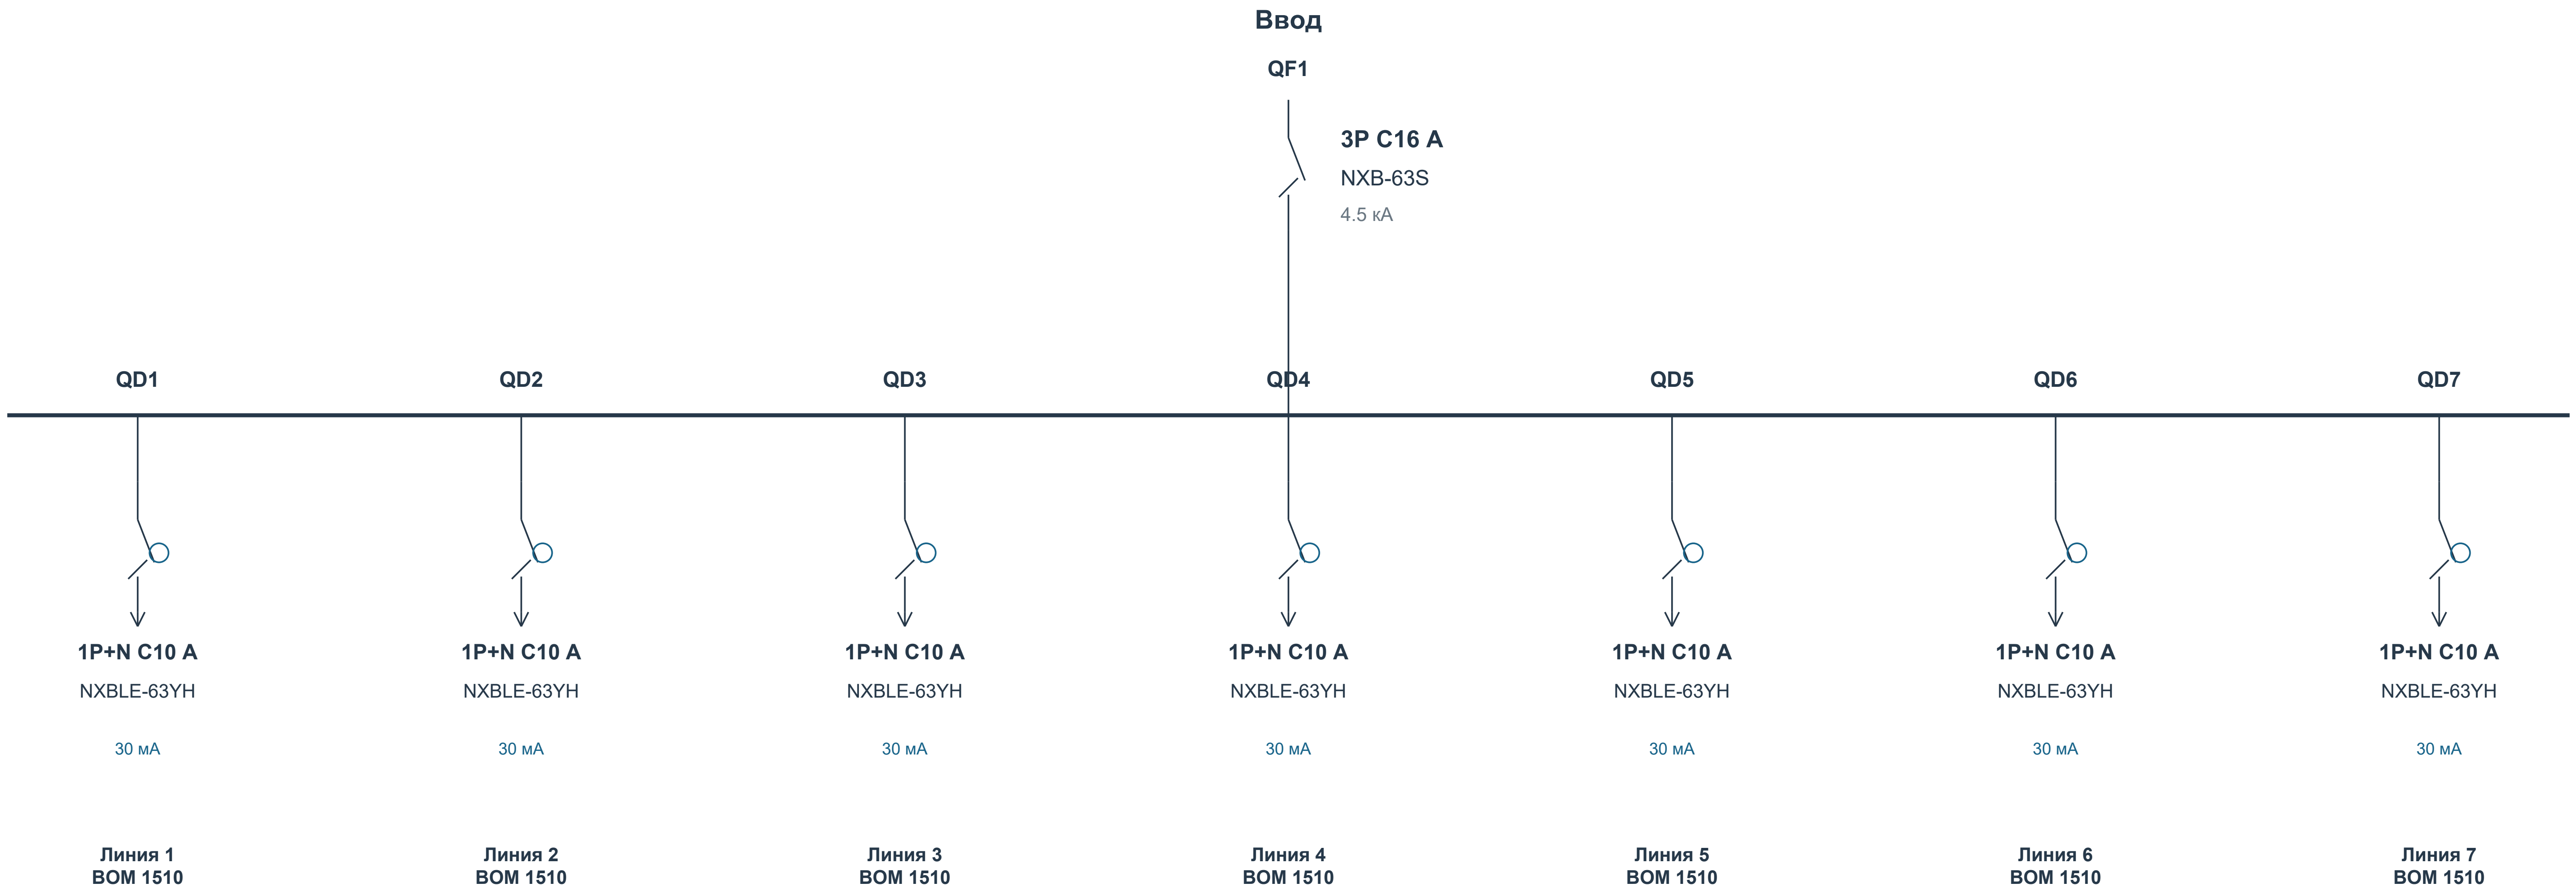
Ввод
QF1
3P C16 A
NXB-63S
4.5 кА
QD1
QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
1P+N C10 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 1
BOM 1510
1P+N C10 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 2
BOM 1510
1P+N C10 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 3
BOM 1510
1P+N C10 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 4
BOM 1510
1P+N C10 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 5
BOM 1510
1P+N C10 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 6
BOM 1510
1P+N C10 A
NXBLE-63YH
30 мА
Линия 7
BOM 1510

Управление / учет: SF1 NXB-63S × 1; FR1 MH-602 × 1; KM1 NXC-18 × 1; KK1 NXR-25 × 1; SB1 NP2-BA42 × 1; SB2 NP2-BA31 × 1; HL1 ND16-22D/2 × 1; SA1 NP2-BD33 × 1

Данные исходного проекта: Ру 1.64 кВт | Рр 1,64 кВт | Iр 2,63 А

Назначение, фазировка и внешние соединения - по исходному проекту. Марки и номиналы аппаратов - текущий BOM.

Связи контакторов, тепловых реле, сигналов и учета согласовать по рабочей схеме. Данный лист не является монтажной схемой.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Вид спереди и сбоку

Габариты: BOM. Расположение приборов D - предложение; монтажные отверстия и сверление не заданы.

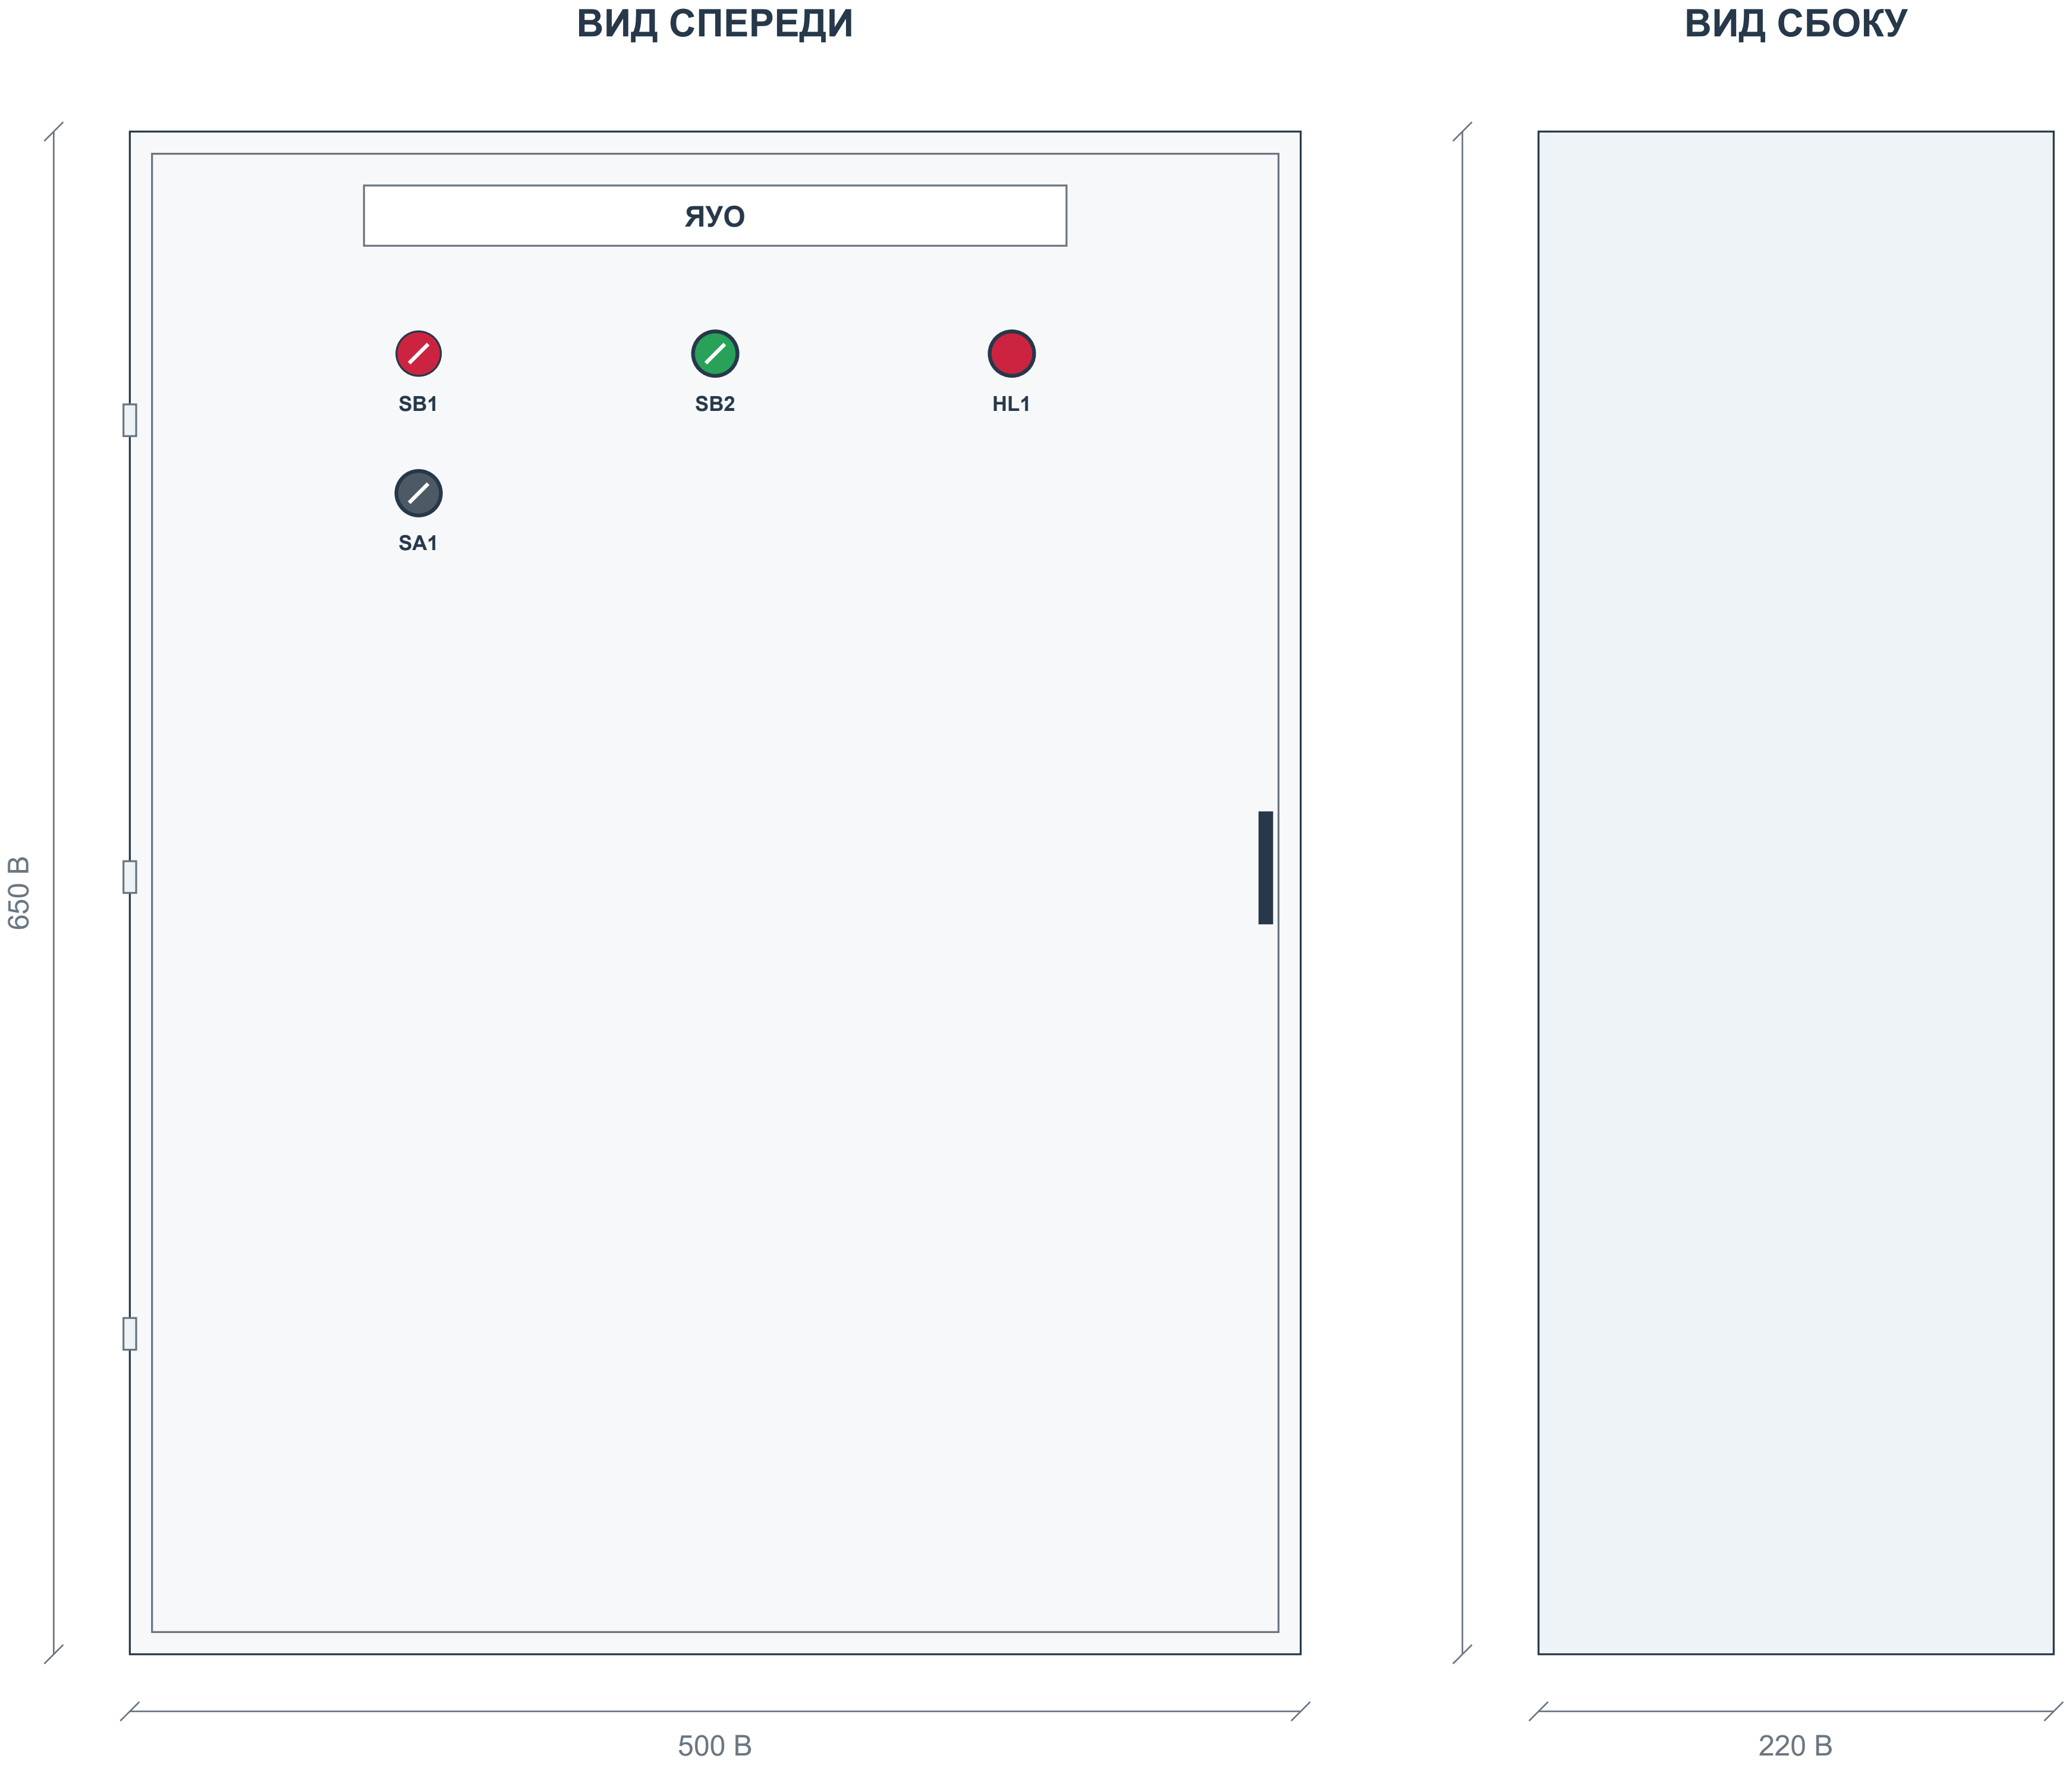

Корпус: Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31

Габаритное описание и количество секций - BOM. Вид двери, петли и замок показаны условно.

Приборы двери: 4 шт. по BOM. Цвет и обозначения показаны по описанию.

Порядок высоты / ширины в описании корпуса, штатную плату и глубину аппаратов подтвердить до изготовления.

Координаты приборов D - компоновочное предложение. Отверстия и заднюю глубину согласовать до сверления.

На дверь не добавлены приборы, отсутствующие в текущем BOM.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Внутренний монтаж и координаты

В: данные BOM. D: предлагаемое размещение. ? - размер отсутствует. Не является подтверждением физической вместимости.

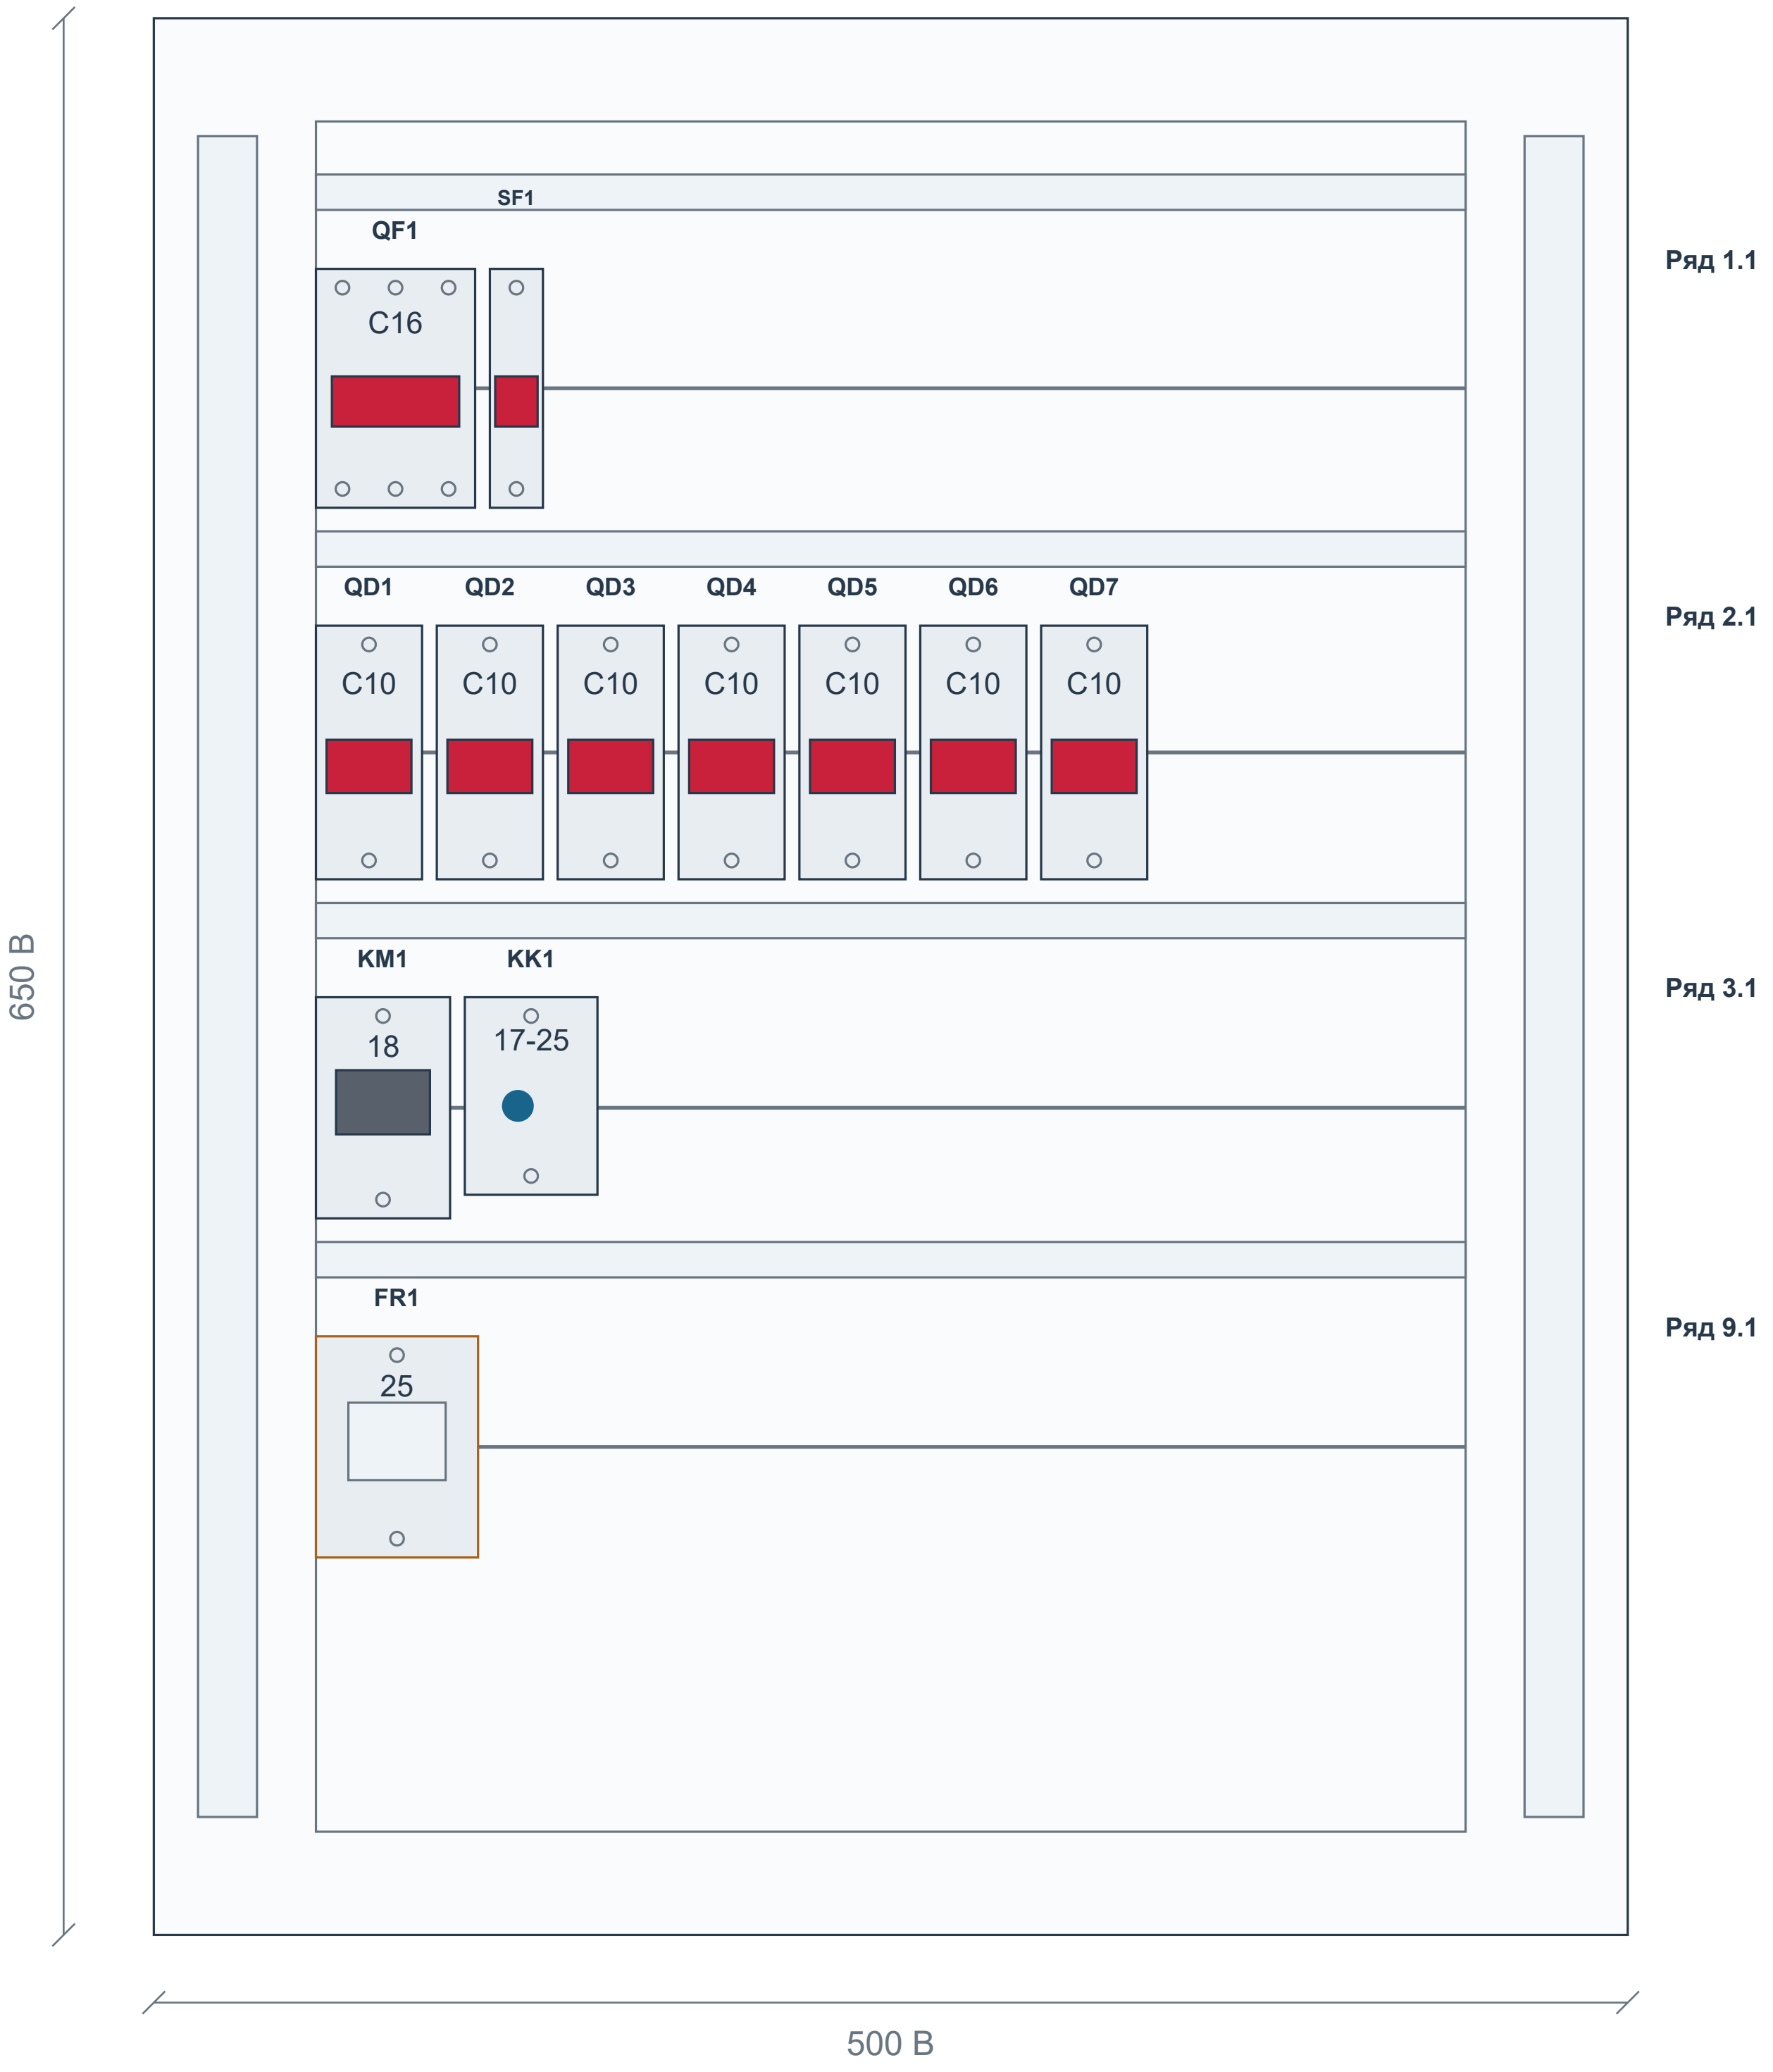

Аппарат	Модель	BOM	Ряд	x D	y D	W × H B / ?
QF1	NXB-63S	1507	1.1	55	85	54 × 81
SF1	NXB-63S	1508	1.1	114	85	18 × 81
FR1	MH-602	1509	9.1	55	447	?
QD1 - QD7	NXBLE-63YH	1510	2.1	55...301	206	36 × 86
KM1	NXC-18	1511	3.1	55	332	45.5 × 75
KK1	NXR-25	1512	3.1	105.5	332	45 × 67

Система координат: x вправо, y вниз; начало - верхний левый угол корпуса. Размеры в мм; координаты D - предложение.

Контур платы, каналы и функциональные зоны N/PE D - предложение; размеры штатных изделий и способ соединения подтвердить.

У 1 аппаратов габариты не заполнены; янтарные контуры условные. Фактический размер и посадку проверить.

Глубину аппаратов, электрические зазоры и доступ для обслуживания проверить. Сверление не задано.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Исходная схема управления

ЭОФ, PDF стр. 2. Сверить с текущим BOM.

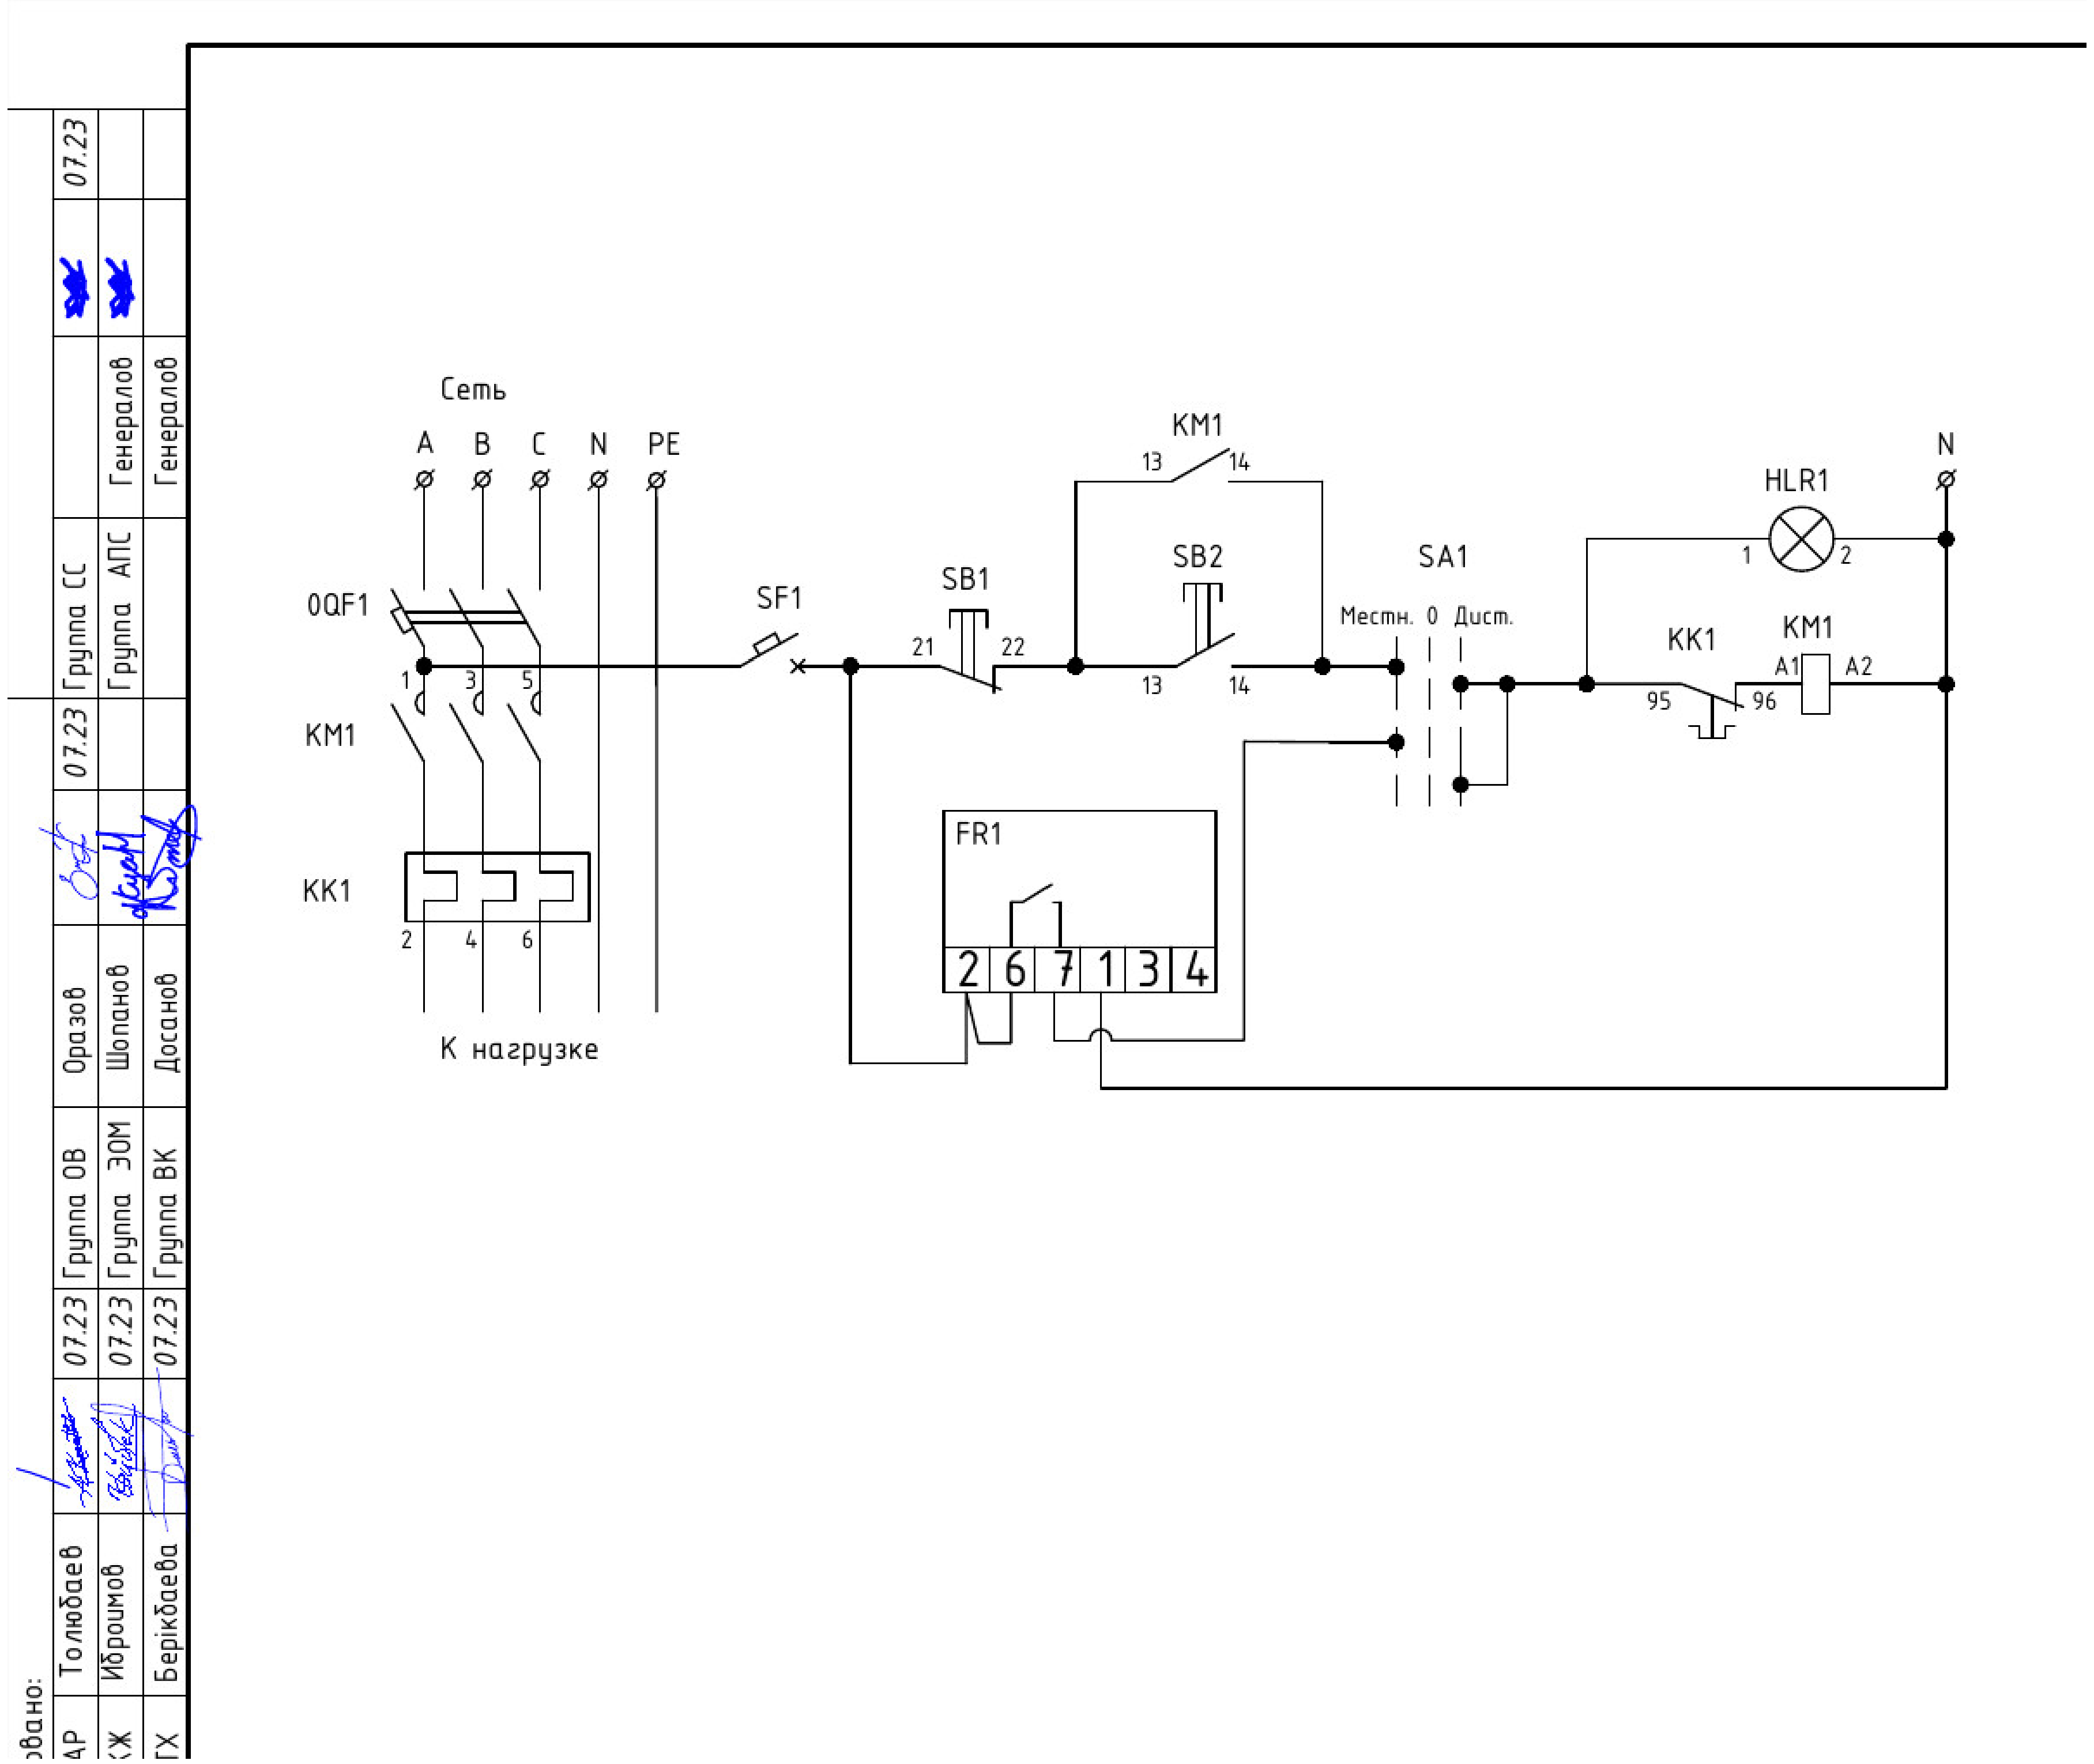
Сеть
A
B
C
N
PE
0QF1
1
3
5
KM1
KK1
2
4
6
К нагрузке
SF1
SB1
21
22
KM1
13
14
SB2
13
14
SA1
Местн.
0
Дист.
FR1
2
6
7
1
3
4
HLR1
1
2
N
KK1
95
96
KM1
A1
A2
…вано:
АР
Толюбаев
07.23
Группа ОВ
Оразов
07.23
Группа СС
07.23
КЖ
Иброимов
07.23
Группа ЗОМ
Шопанов
Группа АПС
Генералов
ГХ
Берікбаева
07.23
Группа ВК
Досанов
Генералов

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

04 | Источники и границы проверки

Приоритет: текущий BOM заказчика; количества из полного BOM; проектные чертежи для сверки.

Источник	Использование
261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM cl - uod icin.xlsx	BOM, 1534 строки, 10 колонок. Основной состав / артикулы / изготовители.
261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM cl.xlsx	BOM, 1534 строки, 45 колонок. H = количество на щит; M = количество щитов. Строки сопоставлены с основным BOM.
ЭОМ Бесшокы-30.03 - Kopya.pdf	87 страниц. Источник проектных схем и нагрузок. Ссылка на соответствующую страницу приведена на листе EL каждого щита.
ЭОФ-Школа Бесшокы 1200 посл - Kopya.pdf	4 страницы. ЯУО: проектная схема управления, показана без таблицы материалов.

Место источников: папка «261012 aktau caspian serviz 2 proje / ЭЛ Бесшокы посл». Оригиналы не изменены. Стоимость и коммерческие условия исключены из согласования.

Проверено: соответствие строк двух BOM; наличие количества по каждой материальной строке; 69 комплектов; сохранение 435 строк основного оборудования; связь каждого щита с проектным листом. Повторы не объединены и не использованы для восстановления количества.

Не подтверждено: корректность всех проектных расчетов; соответствие каталогу каждого артикула; фактическая вместимость; тепловой режим; КЗ; рабочие соединения; сверление двери; согласование замен. Статус OK в исходном BOM не является разрешением на производство.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал Ф.И.О. / подпись / дата	**Проверил** Ф.И.О. / подпись / дата	**Производство** Ф.И.О. / подпись / дата	**ОТК** Ф.И.О. / подпись / дата	**Заказчик** Ф.И.О. / подпись / дата

05 | FAT / Контроль готового изделия

Заполняется по каждому заводскому номеру щита. Результаты в R1 не заполнены.

№	Проверка	Результат / протокол	Ответственный / дата
1	Состав, количество и артикулы по утвержденному BOM	Не выполнено / не представлено	
2	Корпус, габариты, способ монтажа, маркировка и степень защиты	Не выполнено / не представлено	
3	Монтаж, зазоры, клеммы, кабельные вводы и фиксация	Не выполнено / не представлено	
4	Шины, опоры, защита от прикосновения и разделение секций	Не выполнено / не представлено	
5	Цепь PE, соединение корпуса и двери	Не выполнено / не представлено	
6	Изоляция / электрическая прочность по согласованной программе	Не выполнено / не представлено	
7	Соединения и маркировка проводов по рабочей схеме	Не выполнено / не представлено	
8	Момент затяжки по инструкции изготовителя	Не выполнено / не представлено	
9	Настройки защит, уставки реле и RCD / RCBO	Не выполнено / не представлено	
10	Функции управления, пожарное отключение, индикация	Не выполнено / не представлено	
11	АВР: нормальный / резервный ввод, блокировки и возврат	Не выполнено / не представлено	
12	Учет: ТТ, полярность, испытательные клеммы и пломбирование	Не выполнено / не представлено	
13	Фото изделия, протоколы, паспорт и исполнительная схема	Не выполнено / не представлено	

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

06 | Лист допуска в производство

Решение оформляется после закрытия замечаний и утверждения текущих схем и компоновок.

Поле	Заполняется участником согласования
Документ / ревизия	261014-BESSHOKY-PA-R1
Щиты / количество	69 комплектов по реестру
Закрытые замечания / подтверждения	____
Утвержденная рабочая схема / ревизия	____
Утвержденная компоновка / ревизия	____
Решение	[ ] Согласовано [ ] Согласовано с условиями [ ] На доработку
Условия и ограничения	____
Дата разрешения изготовления	____

Согласование состава не заменяет проверку конструкции и испытания сборки. В текущей ревизии разрешение изготовления отсутствует.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	**Проверил**	**Производство**	**ОТК**	**Заказчик**
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата
