ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

CASPIAN SERVIS

Школа на 1200 мест, ж.м. Бесшоки, Мангистауская обл.

г. Актау | проект 261013 | ЭОМ 73/05/23, ЭОФ | марка аппаратов CHINT

69 щитов | 69 комплектов

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ СТОП

Вопросов: 28 (СТОП 2, КОНТРОЛЬ 26). Щиты без вопросов СТОП могут запускаться после подписи листа решения.

Исполнение	Кол.	Щиты
Модульный щит (DIN-рейки)	59	ПР-Х, ПРЛ-1, ПРЛ-2, ПРЛ-3, ПР-Тх1.1, ПРК-1, ПР-К1.1, ПР-К1.2, ПР-Тх1.3, ПР-К1.3, ПРЛ-4, ПРЛ-5, ПР-Тх2.1, ПР-К2.1, ПРК-2, ПРК-3, ПР-А3, ПР-Тх2.2, ПР-К2.2, ПРК-4, ПРК-5, ПР-Тх2.3, ПР-К2.3, ПРЛ-6, ПР-Тх3.1, ПР-К3.1, ПР-Тх3.2, ПРК-6, ПР-К3.2, ПРК-7, ПР-Тх3.3, ПР-К3.3, ЩО-0, ЩАО-0, ЩО-1.1, ЩО-1.2, ЩО-1.3, ЩО-Кх, ЩАО-1, ЩО-2.1, ЩО-2.2, ЩО-2.3, ЩАО-2, ЩО-3.1, ЩО-3.2, ЩО-3.3, ЩАО-3, ЩСН, ЩС-НП, ЩСВ-0, ЩСВ-К, ЩОВ-1, ЩС-СС1, ЩСВ-1, ЩС-ПС1, ЩС-СС2, ЩС-ПС2, ЩОВ-2, ЩС-ПС3
Щит с монтажной панелью	7	ПР-Тх1.2, ПР-Кх1, ПР-Кх2, ЩУО, ЩСВ-К1, ЩСВ-3, ЯУО
ВРУ (напольный)	3	ВРУшк, ВРУ-А, ВРУст

ИСПОЛНЕНИЕ TEKLED (для всех щитов)

ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015; ПУЭ РК. Ue 380/220 В, 50 Гц — по проекту ЭОМ.

Шины: L1 жёлтый, L2 зелёный, L3 красный, N синий, PE жёлто-зелёный (ПУЭ 1.1.30).

Внутренние фазные проводники: L1 коричневый, L2 чёрный, L3 серый (IEC 60445); N синий; PE жёлто-зелёный.

Цепи управления: ~230 В — L чёрный, N синий; =24 В — «+» красный, «−» белый.

Обозначения аппаратов — ГОСТ 2.710; номера групп QF/QFD = номерам групп проекта ЭОМ.

Модульные щиты: отходящие кабели — непосредственно на аппараты, N и PE — на шины ШНИ. Щиты с монтажной панелью и ВРУ — через клеммник XT1.

Табличка щита (обозначение, Ue, In, IP, заводской №, дата) — на двери, по стандарту TEKLED. Размеры — мм.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Титульный лист
2–5	Реестр щитов
6–8	Вопросы для согласования и решение заказчика
9–86	Компоновка и спецификация щитов (по одному листу на щит)

Рев.	Дата	Изменение
R0–R2	14.10.2026	Предыдущий выпуск (285 л.) — заменяется полностью
R3	15.10.2026	Новый формат: компоновка + спецификация на одном листе; клеммы XT1 в щитах с монтажной панелью; вопросы сведены в один раздел

РЕЕСТР ЩИТОВ

Один щит — одна строка. Красное обозначение — по щиту есть вопрос СТОП. «Лист» — лист компоновки и спецификации щита в данном документе.

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
01	ПР-Х	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.6	Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	КОНТРОЛЬ	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	6	Л3 от ВРУст	18/24 мод.	9
02	ПРЛ-1	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.7	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	5	Гр.1 от ПР-Тх1.1	15/24 мод.	10
03	ПРЛ-2	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.8	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5k	3	Гр.2 от ПР-Тх1.1	11/18 мод.	11
04	ПРЛ-3	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.9	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	5	Гр.3 от ПР-Тх1.1	15/24 мод.	12
05	ПР-Тх1.1	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.10	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	540×440×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	13	Н1 от ВРУшк	32/54 мод.	13
06	ПРК-1	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.11	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	9	Гр.1 от ПР-К1.1	23/36 мод.	14
07	ПР-К1.1	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.12	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	275×450×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	4	Н2 от ВРУшк	12/18 мод.	15
08	ПР-Тх1.2	NXW4-48 IP31; ЭОМ л.13	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	800×650×250	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	17	Н15 от ВРУшк	XT1: 51	16
09	ПР-К1.2	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.14	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	3	Н16 от ВРУшк	9/18 мод.	18
10	ПР-Тх1.3	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.15	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	540×440×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	14	Н11 от ВРУшк	31/54 мод.	19
11	ПР-К1.3	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.16	Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	КОНТРОЛЬ	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	7	Н12 от ВРУшк	17/24 мод.	20
12	ПРЛ-4	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.17	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	4	Гр.6 от ПР-Тх2.1	13/18 мод.	21
13	ПРЛ-5	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.18	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	3	Гр.7 от ПР-Тх2.1	11/18 мод.	22
14	ПР-Тх2.1	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.19	Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	КОНТРОЛЬ	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	7	Н1 от ВРУшк	19/24 мод.	23
15	ПР-К2.1	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.20	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	275×450×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	4	Н2 от ВРУшк	11/18 мод.	24
16	ПРК-2	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.21	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	5	Гр.1 от ПР-К2.2	15/24 мод.	25
17	ПРК-3	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.22	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	4	Гр.2 от ПР-К2.2	13/18 мод.	26
18	ПР-АЗ	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.23	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	3	Гр.9 от ПР-Тх2.2	6/18 мод.	27
19	ПР-Тх2.2	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.24	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	11	Н15 от ВРУшк	24/36 мод.	28
20	ПР-К2.2	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.25	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	3	Н16 от ВРУшк	11/18 мод.	29
21	ПРК-4	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.26	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	7	Гр.9 от ПР-К2.3	19/24 мод.	30

РЕЕСТР ЩИТОВ (продолжение 2/4)

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
22	**ПРК-5**	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.27	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	5	Гр.10 от ПР-К2.3	15/24 мод.	31
23	**ПР-Тх2.3**	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.28	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	540×440×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	14	Н11 от ВРУшк	30/54 мод.	32
24	**ПР-К2.3**	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.29	Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	550×320×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	10	Н12 от ВРУшк	25/36 мод.	33
25	**ПРЛ-6**	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.30	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	3	Гр.6 от ПР-Тх3.1	11/18 мод.	34
26	**ПР-Тх3.1**	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.31	Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	550×320×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	9	Н1 от ВРУшк	22/36 мод.	35
27	**ПР-К3.1**	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.32	Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	**КОНТРОЛЬ**	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	3	Н2 от ВРУшк	9/12 мод.	36
28	**ПР-Тх3.2**	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.33	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	8	Н15 от ВРУшк	19/24 мод.	37
29	**ПРК-6**	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.34	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	5	Гр.2 от ПР-К3.2	15/24 мод.	38
30	**ПР-К3.2**	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.35	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	2	Н16 от ВРУшк	8/18 мод.	39
31	**ПРК-7**	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.36	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	3	Гр.8 от ПР-К3.3	11/18 мод.	40
32	**ПР-Тх3.3**	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.37	Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	550×320×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	10	Н11 от ВРУшк	23/36 мод.	41
33	**ПР-К3.3**	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.38	Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	550×320×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	8	Н12 от ВРУшк	20/36 мод.	42
34	**ЩО-0**	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.39	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	Н17 от ВРУшк	9/18 мод.	43
35	**ЩАО-0**	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.40	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	2	С1 от ВРУ-А	5/18 мод.	44
36	**ЩО-1.1**	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.41	Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	550×320×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	11	Н3 от ВРУшк	20/36 мод.	45
37	**ЩО-1.2**	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.42	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	11	Н17 от ВРУшк	17/24 мод.	46
38	**ЩО-1.3**	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.43	Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	550×320×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	13	Н14 от ВРУшк	23/36 мод.	47
39	**ЩО-Кх**	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.44	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	275×450×120	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	7	Л4 от ВРУст	10/18 мод.	48
40	**ЩАО-1**	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.45	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	17	С1 от ВРУ-А	28/36 мод.	49
41	**ЩО-2.1**	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.47	Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	**КОНТРОЛЬ**	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	6	Н3 от ВРУшк	11/24 мод.	50
42	**ЩО-2.2**	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.48	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	8	Н17 от ВРУшк	13/24 мод.	51

РЕЕСТР ЩИТОВ (продолжение 3/4)

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
43	ЩО-2.3	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.49	Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	КОНТРОЛЬ	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	12	Н14 от ВРУшк	18/24 мод.	52
44	ЩАО-2	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.50	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	С1 от ВРУ-А	10/24 мод.	53
45	ЩО-3.1	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.51	Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	КОНТРОЛЬ	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	Н3 от ВРУшк	9/12 мод.	54
46	ЩО-3.2	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.52	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	7	Н17 от ВРУшк	15/24 мод.	55
47	ЩО-3.3	NXW4-18 IP31; ЭОМ л.53	Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	КОНТРОЛЬ	IP31	встраиваемый	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	10	Н14 от ВРУшк	15/24 мод.	56
48	ЩАО-3	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.54	Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	395×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	С1 от ВРУ-А	11/24 мод.	57
49	ЩСН	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.55	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	7	Н19 от ВРУшк	22/36 мод.	58
50	ЩС-НП	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.57	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	3	С7 от ВРУ-А	12/18 мод.	59
51	ЩСВ-0	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.58	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	9	Н6 от ВРУшк	28/36 мод.	60
52	ЩСВ-К	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.59	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	6	Л5 от ВРУст	24/36 мод.	61
53	ЩОВ-1	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.61	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	0QFD1 Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+	7	Н5 от ВРУшк	16,5/36 мод.	62
54	ЩС-СС1	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.62	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	6	С2 от ВРУ-А	10/18 мод.	63
55	ЩСВ-1	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.63	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5k	8	Н7 от ВРУшк	21/36 мод.	64
56	ЩС-ПС1	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.64	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	7	С4 от ВРУ-А	10/18 мод.	65
57	ЩС-СС2	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.65	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	С3 от ВРУ-А	8/18 мод.	66
58	ЩС-ПС2	NXW4-12 IP31; ЭОМ л.66	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	268×448×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	Гр.6 от ЩС-ПС1	6/18 мод.	67
59	ЩОВ-2	NXW4-36 IP31; ЭОМ л.67	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	0QFD1 Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+	4	Н5 от ВРУшк	13,5/36 мод.	68
60	ЩС-ПС3	NXW4-24 IP31; ЭОМ л.68	Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	540×310×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	7	С5 от ВРУ-А	20/36 мод.	69
61	ВРУшк	ВРУ-Б-(250+250; ЭОМ л.2	Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)	3 × (2000×800×600)	IP31	напольный	QS1 Выключатель-разъединитель NH40, QS2 Выключатель-разъединитель NH40	16	—	XT1: 75	70
62	ВРУ-А	ВРУ-Б-125-03-19; ЭОМ л.2	Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)	2 × (2000×800×600)	IP31	напольный	1QF1/1QF2 Устройство автоматического вво, (2-я NXZM) Устройство автоматического вво	7	—	XT1: 35	72

РЕЕСТР ЩИТОВ (продолжение 4/4)

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
63	**ВРУст**	ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00; ЭОМ л.3	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	2 × (1700×800×450)	IP31	напольный	QS1 Перекидной рубильник NH40-400/, FU1 Плавкая вставка предохранителя	5	—	XT1: 10	74
64	**ПР-Кх1**	ЩМП-6-0 IP31; ЭОМ л.4	Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)	1200×750×300	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXM-250S/3P 225A 36	13	Л1 от ВРУст	XT1: 65	76
65	**ПР-Кх2**	ЩМП-5-0 IP31; ЭОМ л.5	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1000×650×300	IP31	навесной	QS1 Выключатель-разъединитель NH40	20	Л2 от ВРУст	XT1: 64	78
66	**ЩУО**	ЩМП-6-0 IP31; ЭОМ л.46	Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)	1200×750×300	IP31	навесной	SF1 Авт. выкл. NXB-63S 2P 6A 4.5kA	—	—	—	80
67	**ЩСВ-К1**	ЩМП-3-0 IP31; ЭОМ л.60	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	800×650×250	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	8	Гр.3 от ЩСВ-К	XT1: 30	81
68	**ЩСВ-3**	ЩМП-3-0 IP31; ЭОМ л.69	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1000×650×300	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5k	14	Н18 от ВРУшк	XT1: 51	83
69	**ЯУО**	ЩМП-2 IP31; ЭОФ л.3	Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31	650×500×220	IP31	навесной	0QF1 Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5k	7	—	XT1: 21	85

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

СТОП — изготовление указанных щитов не начинать до ответа; КОНТРОЛЬ — подтвердить или исправить. Ответ — в правой колонке или письмом со ссылкой на №.

№	Тема	Щиты	Вопрос / что требуется подтвердить	Уровень	Ответ заказчика
1	**Нагрузки и защита**	ЯУО	KK1 NXR-25 17–25 A при Ip щита 2,63 A и вводном 0QF1 16 A: тепловое реле не защищает ни линию, ни KM1 (уставка выше вводного автомата). Для цепей освещения тепловое реле не требуется — исключить KK1 или выбрать по Ib (по ЭОФ).	**СТОП**	
2	**Аппараты**	ВРУ-А	АВР: к поставке 2 шт NXZM-125S/3B, по ЭОМ л.2 — одно АВР (1QF1/1QF2); NXZM — одно устройство с двумя выключателями. Подтвердить схему ввода ВРУ-А: одно АВР (1 шт) или два.	**СТОП**	
3	**Исходные данные**	ВРУшк	Обозначение линии ЩСН: на ЭОМ л.2 — H4 (QF1.4 25 A, 5×6), на ЭОМ л.55 — «H19 от ВРУшк». Подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
4	**Ввод и система сети**	Все щиты	Ожидаемый ток КЗ Ik в точках установки: NXB-63S — Icu 4,5 кА, NXBLE-63YH — 6 кА, NXB-63H/NB1-63H/NXB-125 (ВРУ) — 10 кА. Подтвердить Ik по проекту (на ВРУ — от ТП).	**КОНТРОЛЬ**	
5	**Ввод и система сети**	ПР-А3	Питание однофазное — гр.9 ПР-Тх2.2 (NXB-63 1P 20 A, 3×2,5); вводной NXHB-125 3P 20 A (как в ЭОМ). Подтвердить, либо 2P.	**КОНТРОЛЬ**	
6	**Ввод и система сети**	ЩС-ПС2	Питание однофазное — гр.6 ЩС-ПС1 (NXB-63 1P 20 A, 3×2,5); вводной NXHB-125 3P 20 A (как в ЭОМ). Подтвердить, либо 2P.	**КОНТРОЛЬ**	
7	**Ввод и система сети**	ВРУшк	Вводные кабели от ТП (альбом НЭС не приложен): марка, сечение и число кабелей на ввод — для выбора наконечников и присоединения к QS1/QS2 NH40-630.	**КОНТРОЛЬ**	
8	**Нагрузки и защита**	ЩСВ-3, ЩСВ-К1	Однофазные двигатели с трёхполюсным тепловым реле NXR-25 (ЩСВ-К1 KK6 (B21); ЩСВ-К1 KK7 (B14); ЩСВ-3 KK6 (B17); ЩСВ-3 KK10 (B18)): полюса реле включаются последовательно, иначе срабатывание от «обрыва фазы». Принято в монтажной схеме — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
9	**Нагрузки и защита**	ВРУшк	QF1.1 (H1): кабель АВВГнг(А) 5×35 (алюминий) — присоединение через Cu/Al наконечники; клеммы XT1 для Al не применяются — подключение непосредственно к QF1.1.	**КОНТРОЛЬ**	
10	**Нагрузки и защита**	ВРУст	Л1 (2×АВВГнг 5×95), Л2 (АВВГнг 5×95), Л5 (АВВГнг 5×50): алюминиевые кабели — присоединение к держателям RT36 через Cu/Al наконечники, без клеммника.	**КОНТРОЛЬ**	
11	**Схема управления**	ПРЛ-1, ПРЛ-2, ПРЛ-3, ПРК-1, ПРЛ-4, ПРЛ-5, ПРК-2, ПРК-3, ПРК-4, ПРК-5, ПРЛ-6, ПРК-6, ПРК-7, ЩСВ-0, ЩСВ-К, ЩСВ-1, ПР-Кх1, ЩСВ-3	Независимый расцепитель (РН) — по ЭОМ «РН SB»: кнопка аварийного отключения SB устанавливается по месту и в поставку щита не входит; в щите добавлен автомат цепи РН SF1 (1P 6 A, в проекте нет).	**КОНТРОЛЬ**	
12	**Схема управления**	ЩОВ-1, ЩОВ-2	Датчик TST05 терморегулятора PT330 — по месту, в поставку щита не входит; клеммы подключения датчика — в щите.	**КОНТРОЛЬ**	
13	**Схема управления**	ЩСВ-3	Гр.5 (B29, трёхфазный вентилятор) без пускателя и теплового реле, остальные вентиляторы — через KM+KK (проект ЭОМ). Подтвердить: защита двигателя от перегрузки (ПУЭ 5.3).	**КОНТРОЛЬ**	
14	**Аппараты**	ВРУшк, ВРУ-А, ВРУст	Добавлена испытательная клеммная коробка для счётчика трансформаторного включения — в проекте нет; подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
15	**Аппараты**	ПР-Кх1	QFD8–QFD13 (по ЭОМ 3P+N, 100 мА): к поставке NXBLE-63 4P C40/C50 100 мА тип AC. Для плит/котлов с электроникой рекомендуется тип A — подтвердить тип УЗО.	**КОНТРОЛЬ**	
16	**Аппараты**	ЯУО	SF1: по ЭОФ (спецификация оборудования) — NXB-63 1P 1 A, к поставке — 2 A.	**КОНТРОЛЬ**	

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (продолжение)

№	Тема	Щиты	Вопрос / что требуется подтвердить	Уровень	Ответ заказчика
17	**Аппараты**	ЯУО	FR1: по ЭОФ — фотореле МН-600 16 А IP44, к поставке — МН-602 25 А. Датчик устанавливается на фасаде (вне щита); в щите — только клеммы подключения.	**КОНТРОЛЬ**	
18	**Элементы на двери**	ВРУшк	Добавлены сигнальные лампы наличия фаз на вводах (HL1–HL12, ПУЭ-цвета L1/L2/L3) с защитой SF1–SF4 — в проекте нет; подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
19	**Элементы на двери**	ВРУ-А	Добавлены сигнальные лампы наличия фаз на вводах (HL1–HL6) с защитой SF1–SF2 — в проекте нет; подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
20	**Элементы на двери**	ВРУст	HL1/HL2 «Ввод 1/2» — красные (как в проекте). По IEC 60073 для «напряжение есть» допустим белый; подтвердить цвет.	**КОНТРОЛЬ**	
21	**Элементы на двери**	ЩУО	HLR1–HLR38 — красные (как в ЭОМ). По IEC 60073 для «включено» рекомендуется зелёный/белый; подтвердить. Раскладка 46 элементов на двери — предварительная, надписи по ЭОМ л.46.	**КОНТРОЛЬ**	
22	**Элементы на двери**	ЯУО	HLR1 «Работа» — красная (как в ЭОФ). По IEC 60073 красный = авария/опасность; для «Работа» рекомендуется зелёный.	**КОНТРОЛЬ**	
23	**Клеммы и подключения**	ПР-Тх1.2, ВРУшк, ВРУ-А, ВРУст, ПР-Кх1, ПР-Кх2, ЩУО, ЩСВ-К1, ЩСВ-3, ЯУО	Щиты с монтажной панелью: отходящие линии выведены на клеммник XT1 (L/N/PE, сечение по кабелю проекта; кабели > 35 мм² и Al — на аппарат). Модульные щиты: кабели подключаются непосредственно к аппаратам, N и PE — к шинам ШНИ.	**КОНТРОЛЬ**	
24	**Корпус**	Все щиты	Корпуса заменены против проекта (CHINT NXW4 → TEKSAN/IEK ЩР / ЩМП) для резерва ≥ 20 % и унификации; способ установки (навесной/встраиваемый) и IP31 сохранены: NXW4-18 → ЩРв-24 (IEK): ПР-Х, ПР-К1.3, ЩО-3.3 NXW4-18 → ЩРн-24 (IEK): ПРЛ-1, ПРЛ-3, ПРК-2, ПРК-4, ПРК-5, ПРК-6, ЩО-1.2, ЩО-2.2, ЩО-3.2 NXW4-12 → ЩРн-18 448×268×120 (TS): ПРЛ-2, ПР-К1.2, ПРЛ-4, ПРЛ-5, ПРК-3, ПР-А3, ПР-К2.2, ПРЛ-6, ПР-К3.2, ПРК-7, ЩО-0, ЩАО-0, ЩС-НП, ЩС-СС1, ЩС-ПС1, ЩС-СС2, ЩС-ПС2 NXW4-36 → ЩРв-54-3 540×440×120: ПР-Тх1.1, ПР-Тх1.3, ПР-Тх2.3 NXW4-24 → ЩРн-36 (IEK): ПРК-1, ЩСВ-К, ЩСВ-1, ЩС-ПС3 NXW4-12 → ЩРв-18 275×450×120 (IEK): ПР-К1.1, ПР-К2.1, ЩО-Кх NXW4-48 → ЩМП-4 800×650×250: ПР-Тх1.2 NXW4-24 → ЩРв-24 (IEK): ПР-Тх2.1, ЩО-2.3 NXW4-36 → ЩРн-36 (IEK): ПР-Тх2.2, ЩАО-1, ЩСН, ЩСВ-0, ЩОВ-1, ЩОВ-2 NXW4-36 → ЩРв-36 550×320×120 (IEK): ПР-К2.3 NXW4-24 → ЩРв-36 550×320×120 (IEK): ПР-Тх3.1, ПР-Тх3.3, ПР-К3.3, ЩО-1.1, ЩО-1.3 NXW4-12 → ЩРв-12 (IEK): ПР-К3.1, ЩО-3.1 NXW4-24 → ЩРн-24 (IEK): ПР-Тх3.2 NXW4-12 → ЩРв-24 (IEK): ЩО-2.1 NXW4-12 → ЩРн-24 (IEK): ЩАО-2, ЩАО-3	**КОНТРОЛЬ**	
25	**Корпус**	ПР-Х, ПР-К1.3, ПР-Тх2.1, ПР-К3.1, ЩО-2.1, ЩО-2.3, ЩО-3.1, ЩО-3.3	Корпуса ЩРв-24 / ЩРв-12 (IEK): габариты поставщиком не указаны — подтвердить по паспорту поставщика (для встраиваемого исполнения — размер ниши).	**КОНТРОЛЬ**	
26	**Корпус**	ВРУ-А	Габарит: по ЭОМ 2100×1800×600, к поставке — 2 секции 2000×800×600 + цоколь 100 (ширина 1600).	**КОНТРОЛЬ**	
27	**Корпус**	ЯУО	Корпус: по ЭОФ ЩМП-2 500×400×220, к поставке — ЩМП-3 650×500×220 (КМ1+КК1 и 9 модульных аппаратов).	**КОНТРОЛЬ**	
28	**Исполнение**	ВРУ-А	ВРУ-А питает противопожарные системы (ЩС-ПС, ЩС-НП, ЩАО, лифт): отличительная окраска/маркировка щита ППУ — по требованиям пожарных норм; подтвердить исполнение.	**КОНТРОЛЬ**	

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (продолжение)

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ **СОГЛАСОВАНО** ☐ **СОГЛАСОВАНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ (см. колонку «Ответ»)** ☐ **НА ДОРАБОТКУ**

Ф.И.О. / должность _____ Подпись _____ Дата _____ М.П.


Согласование охватывает состав аппаратов, корпуса, подключение линий и предварительную компоновку щитов. Изменения после согласования — новой ревизией документа.

ПР-Х — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.6) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), габариты — КОНТРОЛЬ, IP31, встраиваемый | **Питание:** Л3 от ВРУст | **Ру/Рр:** 10,4/6 кВт, **Iр** 12,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

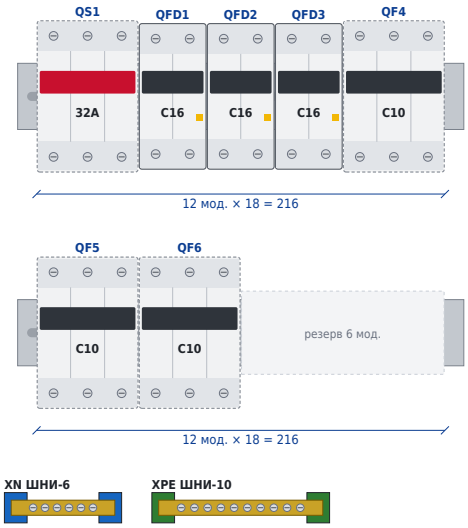

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	Л3 от ВРУст			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№1.118,1.145 Холодильное оборудование [21, 22, 24]	1,4	9,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№1.125,1.142,1.144 Холодильное оборудование [7, 22]	1,5	10,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№1.126,1.127 Холодильное оборудование [21, 22, 24]	1,5	10,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.4	Пом.№1.128 Холодильная камера [6]	2	4,1	ВВГнг(A)-LS 5×1,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.5	Пом.№1.128 Холодильная камера [5]	2	4,1	ВВГнг(A)-LS 5×1,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.6	Пом.№1.128 Холодильная камера [5]	2	4,1	ВВГнг(A)-LS 5×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	713-09052	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 18 из 24 (резерв 6). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24, 25 (лист вопросов).

ПРЛ-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.7) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.1 от ПР-Тх1.1 | **Ру/Рр:** 4,2/1,1 кВт, **Iр** 5,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

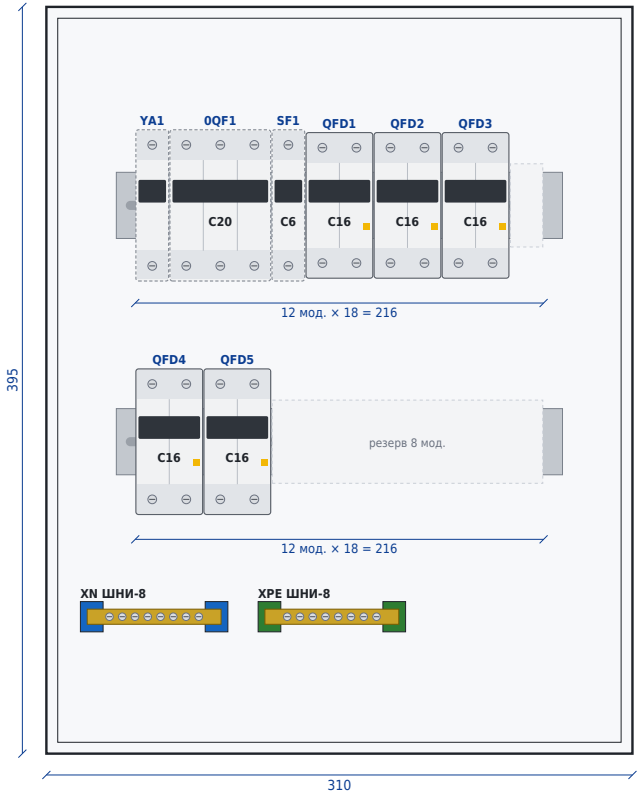

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	Гр.1 от ПР-Тх1.1			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№1.15 Машинка швейная [44]	0,54	2,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№1.15 Машинка швейная [44, 44]	0,41	2,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№1.15 Машинка швейная Оверлок швейный [44, 44, 48]	0,6	3,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№1.15 Машинка швейная [44]	0,41	2,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№1.15 Гладильная доска с утюгом [49]	2,2	11,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 15 из 24 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).

ПРЛ-2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.8) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.2 от ПР-Тх1.1 | **Ру/Рр:** 11,6/8,3 кВт, **Iр** 39,7 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

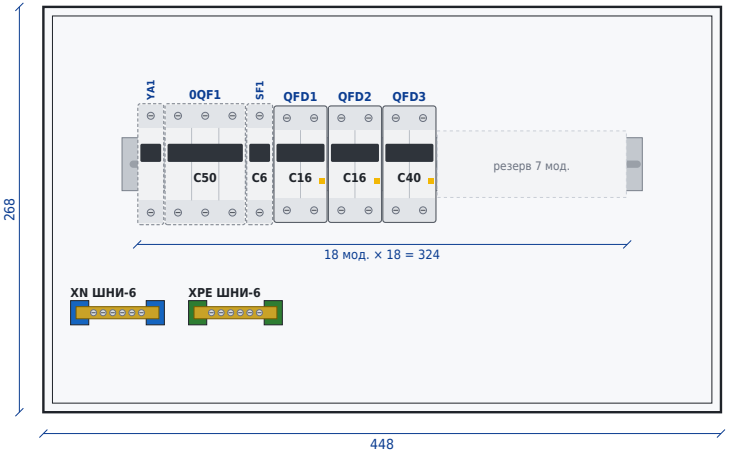

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C	296832	Ввод	Гр.2 от ПР-Тх1.1			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№1.14 Холодильник бытовой, Вытяжка над плитой, Микроволновая печь [110, 111, 12.1]	1,11	7,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№1.14 Чайник электрический [117]	2,2	10,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA	515409	гр.3	Пом.№1.14 Варочная поверхность [109]	8,3	39,7	ВВГнг(A)-LS 3×6
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 11 из 18 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).

ПРЛ-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.9) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.3 от ПР-Тх1.1 | **Ру/Рр:** 4,2/2 кВт, **Iр** 15,2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

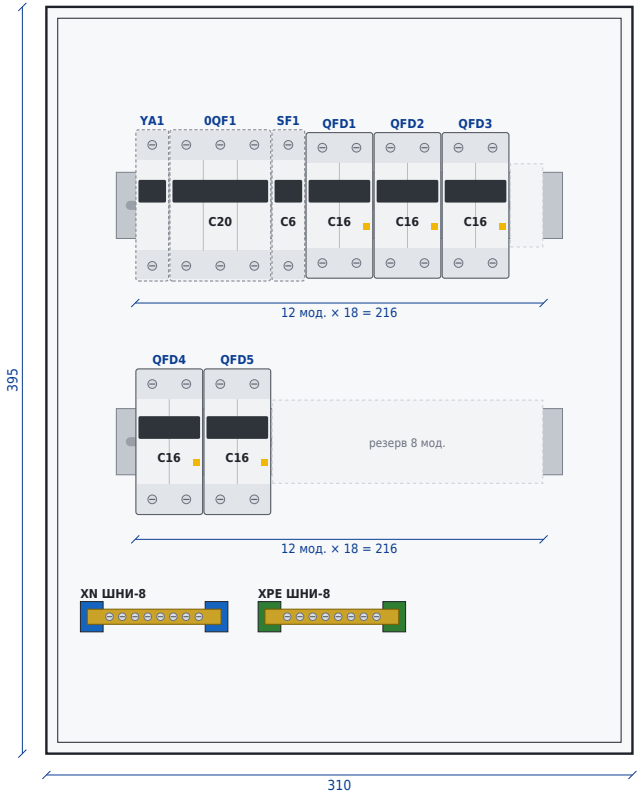

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	Ввод	Гр.3 от ПР-Тх1.1			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№1.13 Пылеулавливающий агрегат [36.7]	0,9	6,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№1.13 Станок токарный по металлу [48.1]	0,4	3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№1.13 Станок деревообрабатывающий [48.1]	2	15,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№1.13 Станок модульный для 3D [38.5]	0,32	2,4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№1.13 Сверлильный станок [38.2]	0,6	4,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 15 из 24 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).

ПР-Тх1.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.10) | **Корпус:** Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм, 540×440×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** H1 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 41,7/14,3 кВт, **Iр** 24,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

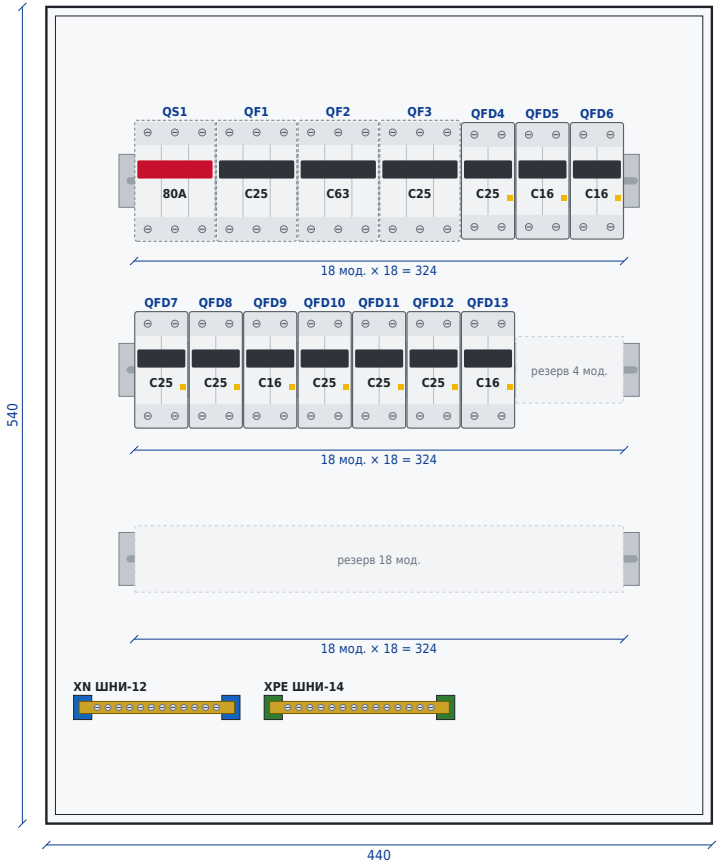

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 80A	193184	Ввод	H1 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	гр.1	Пом.№1.15 Щит ПРЛ-1	1,1	5,9	ВВГнг(A)-LS 5×4
QF2	NXB-63S 3P 63A 4.5kA x-ка C	296833	гр.2	Пом.№1.14 Щит ПРЛ-2	8,3	39,7	ВВГнг(A)-LS 5×16
QF3	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	гр.3	Пом.№1.13 Щит ПРЛ-3	2	15,2	ВВГнг(A)-LS 5×4
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.4	Пом.№1.7 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№1.5,1.14,1.15 Розеточная сеть Интерактивная доска [6.3, Р]	0,72	3,4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№1.10,1.11,1.13 Розеточная сеть Интерактивная доска [6.3, Р]	0,8	3,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.7	Пом.№1.2,1.4 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.8	Пом.№1.164,1.173 Фен Электросушитель [103, 104.1]	4,4	21,1	ВВГнг(A)-LS 3×6
QFD9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Пом.№1.168 Фен [104.1]	2,4	11,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD10	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.10	Пом.№1.163,1.170 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD11	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.11	Пом.№1.166 Уборочный механизм, электронное табло [Ум, 16.1]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD12	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.12	Пом.№1.166 Уборочный механизм, электронное табло [Ум, 16.1]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD13	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.13	Пом.№1.158 Электроконвектор [Эк2]	2	9,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм (TEKSAN F)	713-15060	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 32 из 54 (резерв 22). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	05 | =ПР-Тх1.1 ПР-Тх1.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261013	13 / 86	R3	15.10.2026

ПРК-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.11) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.1 от ПР-К1.1 | **Ру/Рр:** 11,3/9 кВт, **Iр** 14,4 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

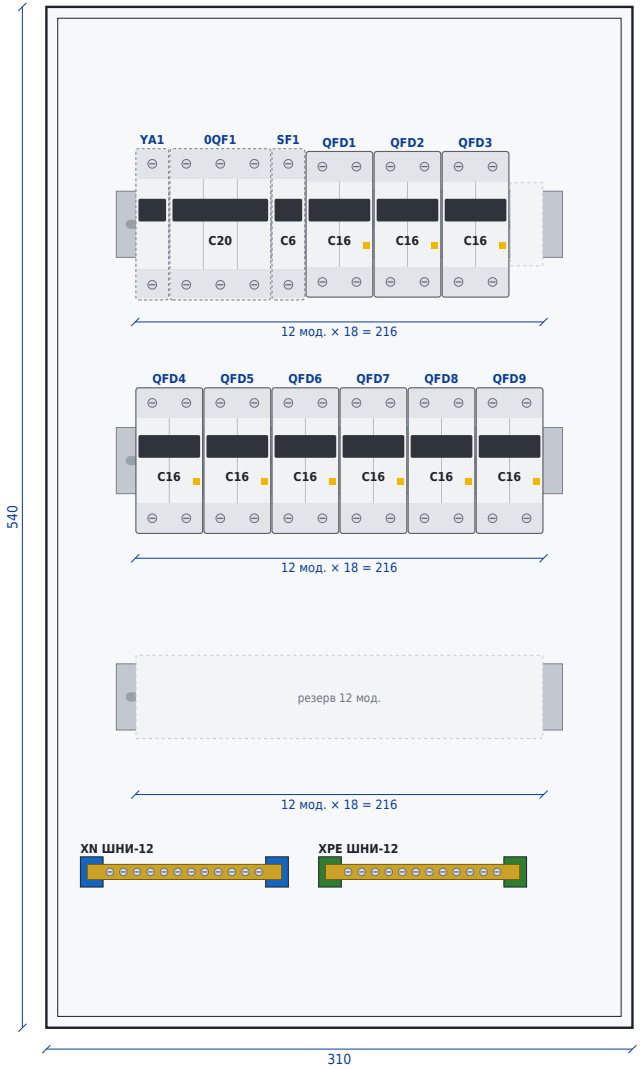

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	Ввод	Гр.1 от ПР-К1.1			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№1.5 Компьютер [19]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№1.5 Компьютер [19]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№1.5 Компьютер [19]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№1.5 Компьютер [19]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№1.5 Компьютер [19]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№1.5 Компьютер [19]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Пом.№1.5 Компьютер [19]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Пом.№1.5 Компьютер [19]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Пом.№1.5 Компьютер [19]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 23 из 36 (резерв 13). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	06 | =ПРК-1	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ПРК-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	14 / 86	R3	15.10.2026

ПР-К1.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.12) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK), 275×450×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** Н2 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 11,7/10,3 кВт, **Iр** 16,4 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

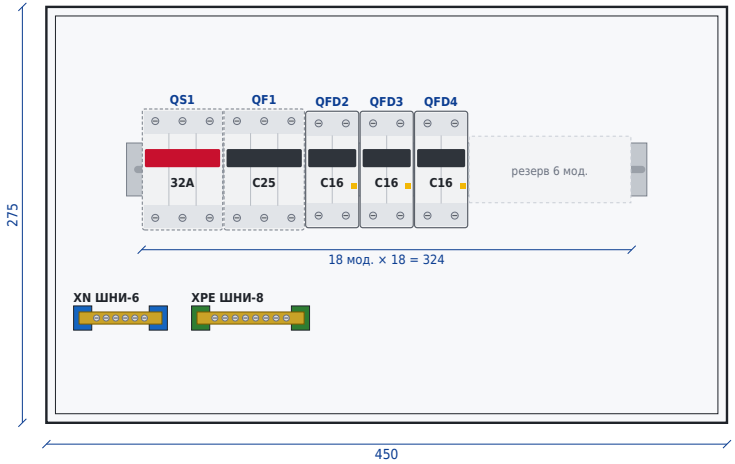

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	Н2 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	гр.1	Пом.№1.5 Щит ПРК-1	9	14,4	ВВГнг(A)-LS 5×4
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№1.10,1.13 Компьютер, МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№1.5,1.14,1.15 Компьютер, МФУ [36.1, 36.2]	1,33	6,4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№1.171 Компьютер, МФУ Музыкальный центр [36.1, 36.2, 121.5]	0,5	2,4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK) (TEKSAN F)	713-09054	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 12 из 18 (резерв 6). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	07 | =ПР-К1.1	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ПР-К1.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	15 / 86	R3	15.10.2026

ПР-Тх1.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-48 IP31 (ЭОМ л.13) | **Корпус:** Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31, 800×650×250 мм, IP31, навесной | **Питание:** H15 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 63,3/10,1 кВт, **Iр** 16,2 А

ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:15

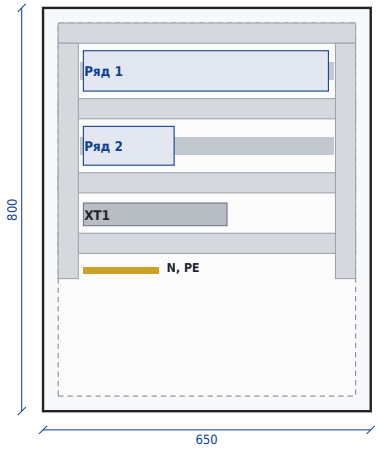

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:5

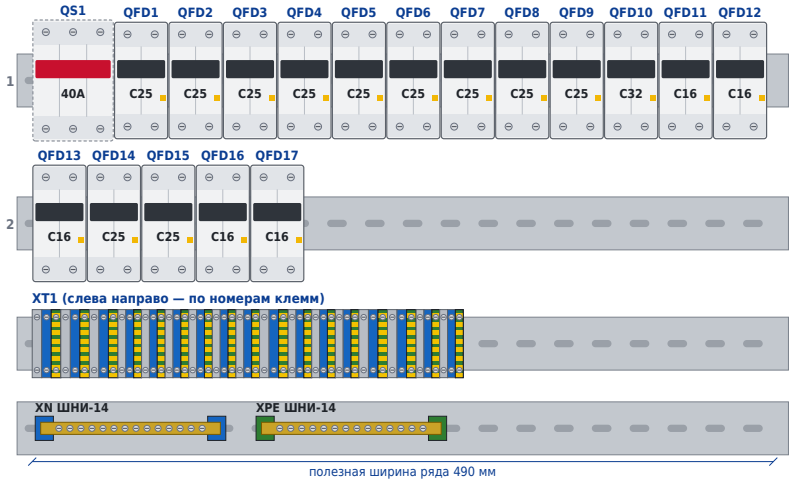

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QS1	NXHB-125 3P 40A	193182	Ввод	H15 от ВРУшк				
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.1	Пом.№1.155,1.156 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4	XT1:1–3
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.2	Пом.№1.153,1.154 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4	XT1:4–6
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.3	Пом.№1.150,1.152 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4	XT1:7–9
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.4	Пом.№1.103,1.148 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:10–12
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.5	Пом.№1.110 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:13–15
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.6	Пом.№1.110 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:16–18
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.7	Пом.№1.110 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:19–21
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.8	Пом.№1.107 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:22–24
QFD9	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.9	Пом.№1.106 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:25–27
QFD10	NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA	515402	гр.10	Пом.№1.105 Электросушитель [103]	6	28,7	ВВГнг(A)-LS 3×4	XT1:28–30
QFD11	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.11	Пом.№1.23,1.25 Электросушитель Фен [103, 104.1]	3,2	15,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:31–33
QFD12	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.12	Пом.№1.42,1.43 Электросушитель Фен [103, 104.1]	3,2	15,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:34–36
QFD13	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.13	Пом.№1.26,1.28 Электросушитель Фен [103, 104.1]	3,2	15,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:37–39
QFD14	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.14	Пом.№1.37-1.39 Электросушитель Фен [103, 104.1]	5,2	24,9	ВВГнг(A)-LS 3×4	XT1:40–42
QFD15	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.15	Пом.№1.31,1.32 Уборочный механизм, электронное табло Привод сетки разделения спортзала [Ум, 16.1]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×4	XT1:43–45
QFD16	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.16	Пом.№1.111 Электроконвектор [Эк1]	2	9,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:46–48

ПР-Tx1.2 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QFD17	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.17	Пом.№1.19,1.20,1.44,1.46 Розеточная сеть Бактерицидный облучатель [P, 64]	0,54	2,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:49–51

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 (TEKSAN F)	719-15440	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

XT1 по кабелям проекта (L, N, PE на каждую линию): ЗНИ 4 — 6 шт; ЗНИ син. 4 — 6 шт; ЗНИ-PE 4 — 6 шт; ЗНИ 2,5 — 11 шт; ЗНИ син. 2,5 — 11 шт; ЗНИ-PE 2,5 — 11 шт. В BOM клемм нет — добавляются.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 23, 24 (лист вопросов).

ПР-К1.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.14) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** H16 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 3,4/1,4 кВт, **Iр** 2,2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

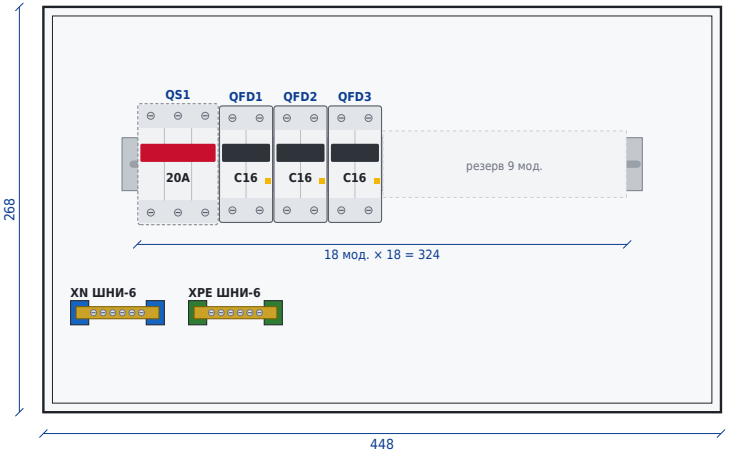

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	H16 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№1.19,1.20 Компьютер, МФУ Музыкальный центр [36.1, 36.2, 121.5]	0,92	4,4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№1.44,1.46 Компьютер, МФУ Музыкальный центр	1,9	9,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№1.21,1.34 Компьютер, МФУ Музыкальный центр [36.1, 36.2, 121.5]	0,58	2,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 9 из 18 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	09 | =ПР-К1.2 ПР-К1.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**18 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ПР-Тх1.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.15) | **Корпус:** Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм, 540×440×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** H11 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 39,7/5,2 кВт, **Iр** 8,3 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

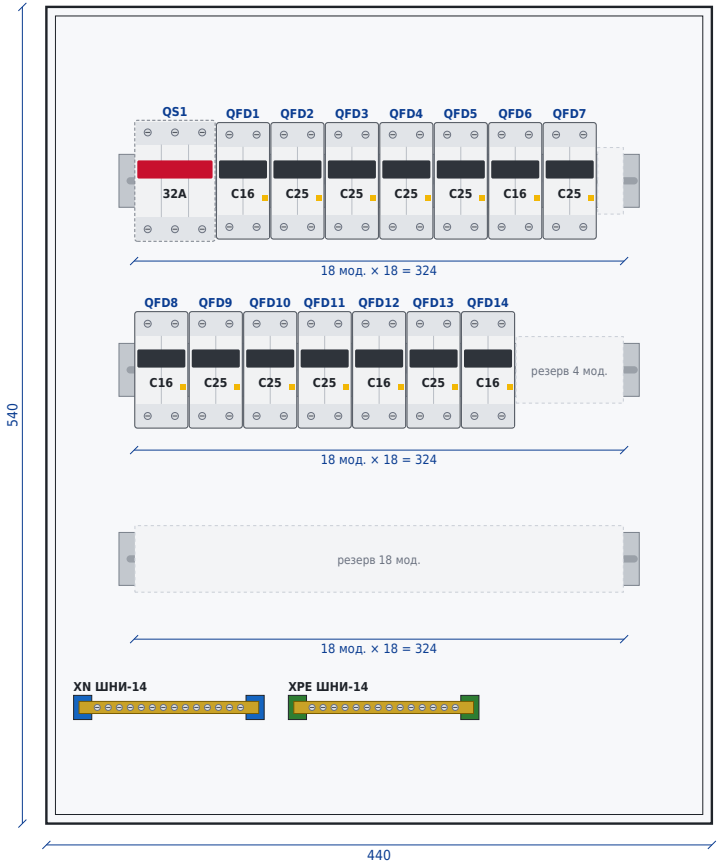

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	H11 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№1.49,1.50,1.52 Розеточная сеть Бактерицидный облучатель [64, 126.1]	0,5	2,4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.2	Пом.№1.48,1.54 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.3	Пом.№1.64,1.103 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.4	Пом.№1.73,1.74 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.5	Пом.№1.71,1.72 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№1.63,1.69 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.7	Пом.№1.66,1.67 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Пом.№1.61,1.62 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD9	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.9	Пом.№1.75,1.82 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD10	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.10	Пом.№1.78,1.79 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD11	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.11	Пом.№1.80,1.81 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD12	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.12	Пом.№1.83,1.84 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD13	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.13	Пом.№1.93,1.94 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD14	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.14	Пом.№1.85,1.87 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм (TEKSAN F)	713-15060	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 31 из 54 (резерв 23). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	10 | =ПР-Тх1.3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ПР-Тх1.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	19 / 86	R3	15.10.2026

ПР-К1.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.16) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), габариты — КОНТРОЛЬ, IP31, встраиваемый | **Питание:** Н12 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 7,9/3,2 кВт, **Iр** 5,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

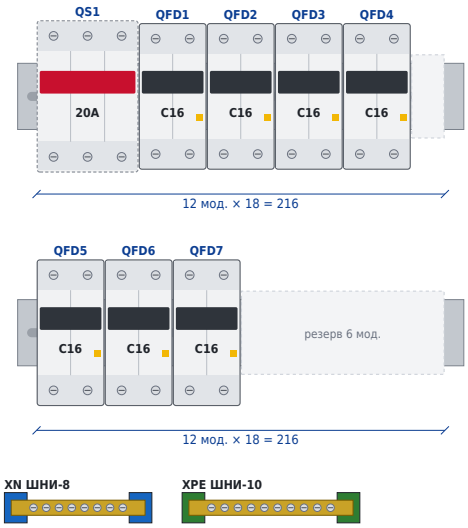

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	Н12 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№1.50,1.101,1.102 МФУ Компьютер [36, 36.1, 36.2]	2,14	10,2	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№1.17,1.18 МФУ Компьютер [36, 36.1, 36.2]	1,32	6,3	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№1.77 Компьютер, МФУ [36.1, 36.2]	0,78	3,7	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№1.63,1.69 Компьютер, МФУ Музыкальный центр [36.1, 36.2, 121.5]	1	4,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№1.61,1.62 Компьютер, МФУ Музыкальный центр [36.1, 36.2, 121.5]	1	4,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№1.83,1.84 Компьютер, МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Пом.№1.85,1.87 Компьютер, МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	713-09052	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ


Модули: занято 17 из 24 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24, 25 (лист вопросов).

ПРЛ-4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.17) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.6 от ПР-Тх2.1 | **Ру/Рр:** 5,3/0,8 кВт, **Iр** 1,3 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

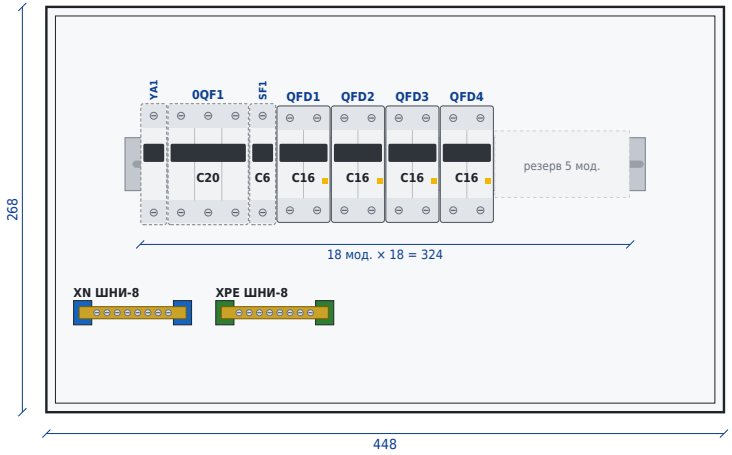

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	Гр.6 от ПР-Тх2.1			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.5 Стол лабораторный Демонстрационный шкаф [98, 55]	0,88	4,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№2.5 Стол лабораторный [55]	0,64	3,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.5 Стол лабораторный Демонстрационный стол [55, 75]	0,8	3,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№2.5 Тележка для зарядки ноутбуков [10.7]	3	14,4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 13 из 18 (резерв 5). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	12 | =ПРЛ-4 ПРЛ-4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**21 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ПРЛ-5 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.18) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.7 от ПР-Тх2.1 | **Ру/Рр:** 2,2/0,3 кВт, **Iр** 0,5 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

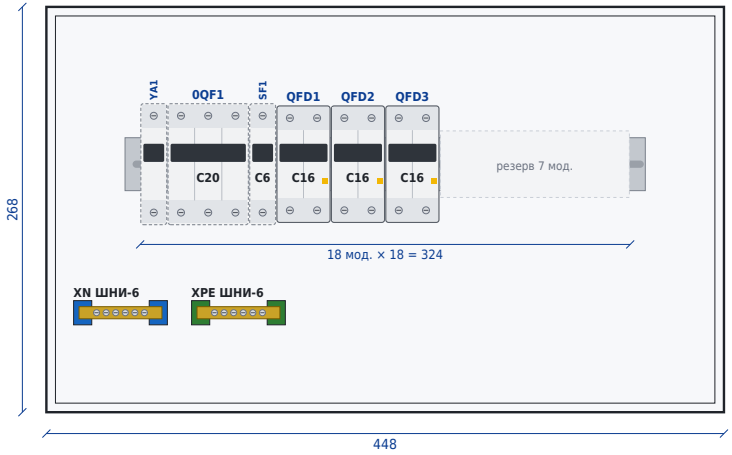

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	Гр.7 от ПР-Тх2.1			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.6 Стол лабораторный [55]	0,8	3,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№2.6 Стол лабораторный [55]	0,64	3,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.6 Стол лабораторный Демонстрационный стол [55, 75]	0,8	3,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 11 из 18 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).

ПР-Tx2.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.19) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), габариты — КОНТРОЛЬ, IP31, встраиваемый | **Питание:** Н1 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 12,1/4 кВт, **Iр** 19,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

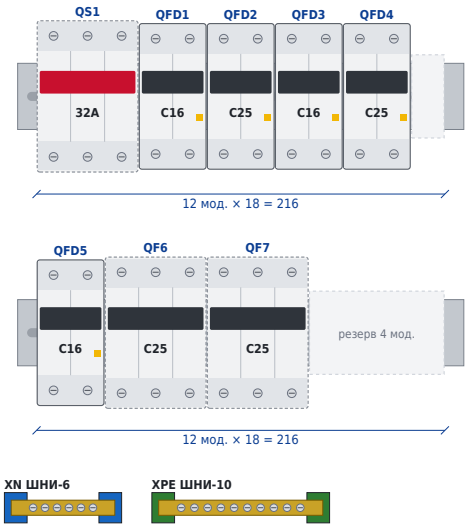

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Iр, А	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	Н1 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.2,2.7,2.8 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,97	4,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.2	Пом.№2.9 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.4-2.6 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	1,05	5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.4	Пом.№2.9,2.10 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№2.86-2.88 Розеточная сеть,ТВ Интерактивная доска [P, 6.3, 6.3]	0,97	4,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	гр.6	Пом.№2.5 Щит ПРЛ-4	0,8	1,3	ВВГнг(A)-LS 5×4
QF7	NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	гр.7	Пом.№2.6 Щит ПРЛ-5	0,3	0,5	ВВГнг(A)-LS 5×4

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	713-09052	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 19 из 24 (резерв 5). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24, 25 (лист вопросов).

ПР-К2.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.20) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK), 275×450×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** Н2 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 3,18/1,3 кВт, **Iр** 2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

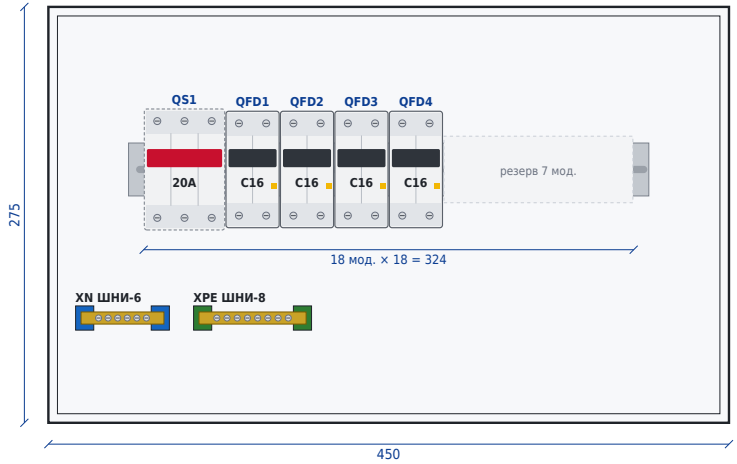

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	Н2 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.2,2.8 Комьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№2.5,2.6 Комьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.87,2.88 Комьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№2.86,2.86.1,2.86.2 Комьютер МФУ [36.1]	0,66	3,2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK) (TEKSAN F)	713-09054	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 11 из 18 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	15 | =ПР-К2.1 ПР-К2.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**24 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ПРК-2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.21) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.1 от ПР-К2.2 | **Ру/Рр:** 5,9/5 кВт, **Ip** 8 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

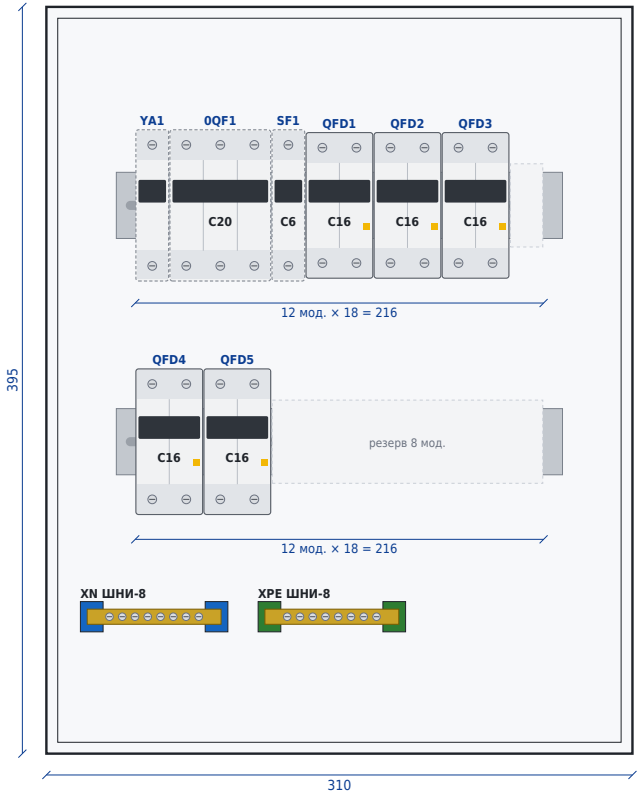

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	Ввод	Гр.1 от ПР-К2.2			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.73 Ноутбук [36.1]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№2.73 Ноутбук [36.1]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.73 Ноутбук [36.1]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№2.73 Ноутбук [36.1]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№2.73 Ноутбук [36.1]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 15 из 24 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).

ПРК-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.22) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.2 от ПР-К2.2 | **Ру/Рр:** 2,3/2 кВт, **Iр** 3,3 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

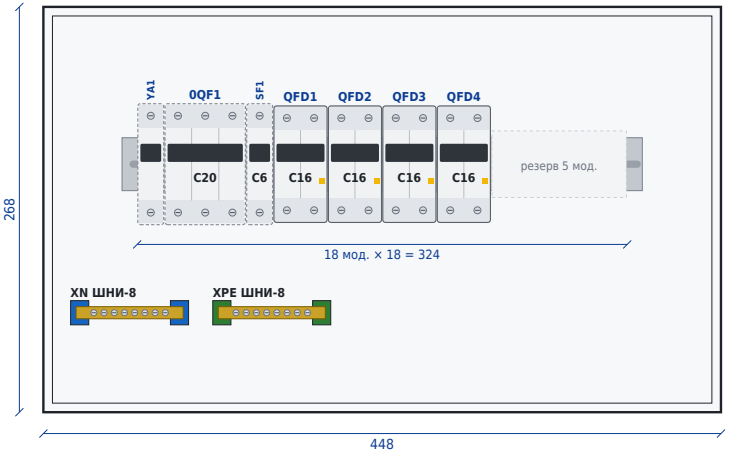

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	Гр.2 от ПР-К2.2			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.11 Компьютер [19]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№2.11 Потолочный сетевой фильтр [P]	0,32	1,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.11 Компьютер [19]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№2.11 Станок ЧПУ [15.2]	0,15	0,7	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 13 из 18 (резерв 5). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	17 | =ПРК-3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ПРК-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	26 / 86	R3	15.10.2026

ПР-А3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.23) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.9 от ПР-Тх2.2 | **Ру/Рр:** 1,7/0,8 кВт, **Iр** 4 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

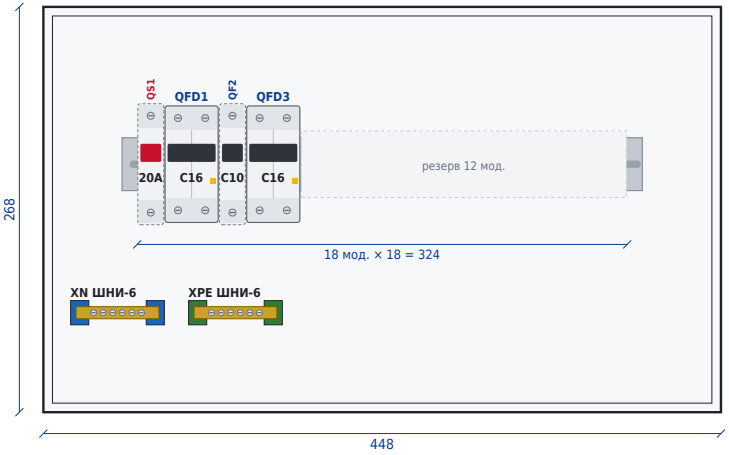

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 1P 20A	193166	Ввод	Гр.9 от ПР-Тх2.2			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.67,2.69 Розеточная сеть	0,48	2,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2	Пом.№2.67 Электрический карниз [Эк]	0,4	1,9	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.67 LED-экраны [ТВ]	0,8	3,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 6 из 18 (резерв 12). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 5, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	18 | =ПР-А3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ПР-А3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	27 / 86	R3	15.10.2026

ПР-Tx2.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.24) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** H15 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 38/9,9 кВт, **Iр** 15,8 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

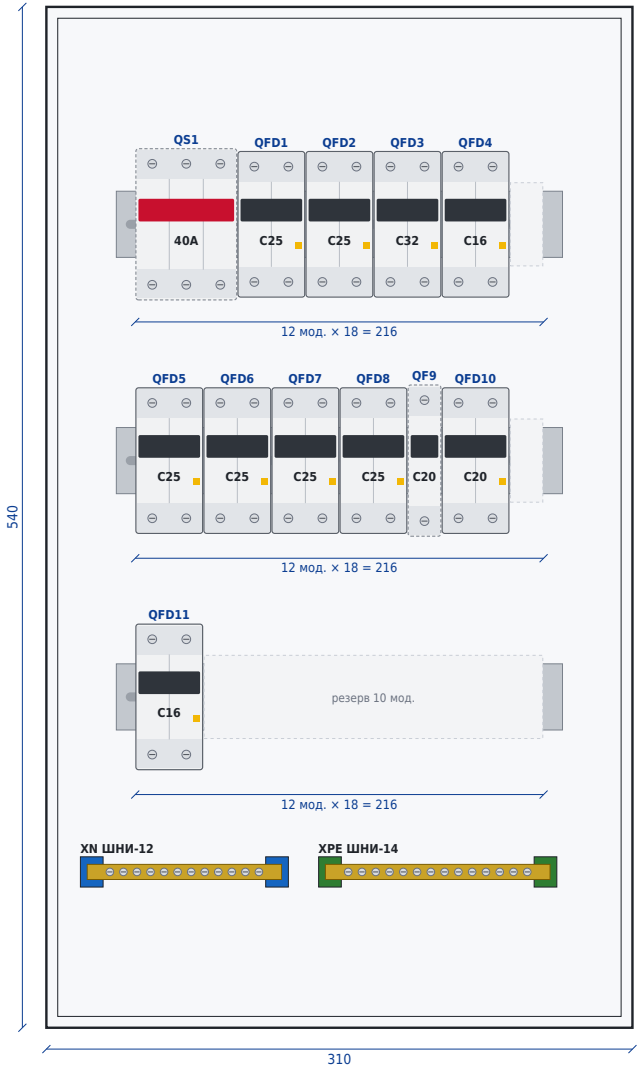

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 40A	193182	Ввод	H15 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.1	Пом.№2.80,2.81 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.2	Пом.№2.78 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA	515402	гр.3	Пом.№2.75,2.79 Электросушитель [103]	6	28,7	ВВГнг(A)-LS 3×6
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№2.11,2.73 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.5	Пом.№2.9,2.69 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.6	Пом.№2.13 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.7	Пом.№2.16 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.8	Пом.№2.63,2.64 Фен [104.1]	4,8	23	ВВГнг(A)-LS 3×4
QF9	NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C	296711	гр.9	Пом.№2.67 Щит ПР-А3	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD10	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA	515388	гр.10	Пом.№2.70,2.71 Электроконвектор [Эк3, Эк4]	3,5	16,7	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD11	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.11	Пом.№2.84 Электроконвектор [Эк5]	2	9,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 24 из 36 (резерв 12). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	19 | =ПР-Tx2.2 ПР-Tx2.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**28 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ПР-К2.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.25) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Н16 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 7,9/7,4 кВт, **Iр** 11,8 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

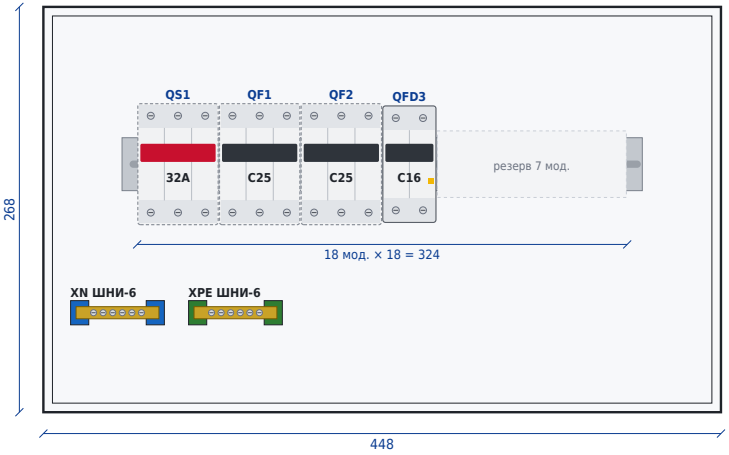

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	Н16 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	гр.1	Пом.№2.73 Щит ПРК-2	5	8	ВВГнг(A)-LS 5×4
QF2	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	гр.2	Пом.№2.11 Щит ПРК-3	2	3,2	ВВГнг(A)-LS 5×4
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.11,2.19,2.73 Компьютер, МФУ Музыкальный центр [36.1, 36.2, 121.5]	0,92	4,4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 11 из 18 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ПРК-4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.26) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.9 от ПР-К2.3 | **Ру/Рр:** 1,7/1,4 кВт, **Ip** 2,3 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

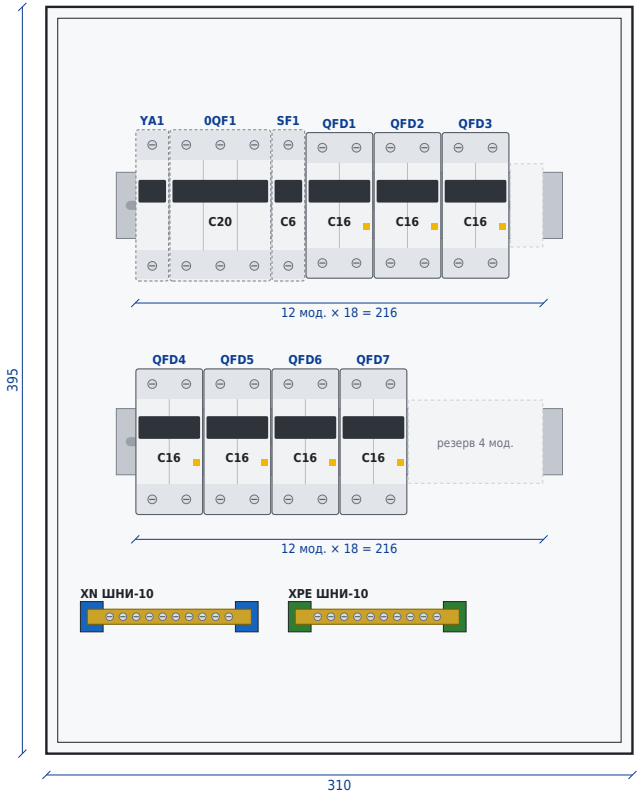

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	Гр.9 от ПР-К2.3			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.23 Компьютер [36.1]	0,24	1,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№2.23 Компьютер [36.1]	0,24	1,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.23 Компьютер [36.1]	0,24	1,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№2.23 Компьютер [36.1]	0,24	1,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№2.23 Компьютер [36.1]	0,24	1,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№2.23 Компьютер [36.1]	0,24	1,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Пом.№2.23 Компьютер [36.1]	0,24	1,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 19 из 24 (резерв 5). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	21 | =ПРК-4	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ПРК-4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	30 / 86	R3	15.10.2026

ПРК-5 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.27) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.10 от ПР-К2.3 | **Ру/Рр:** 5,9/5 кВт, **Iр** 8 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

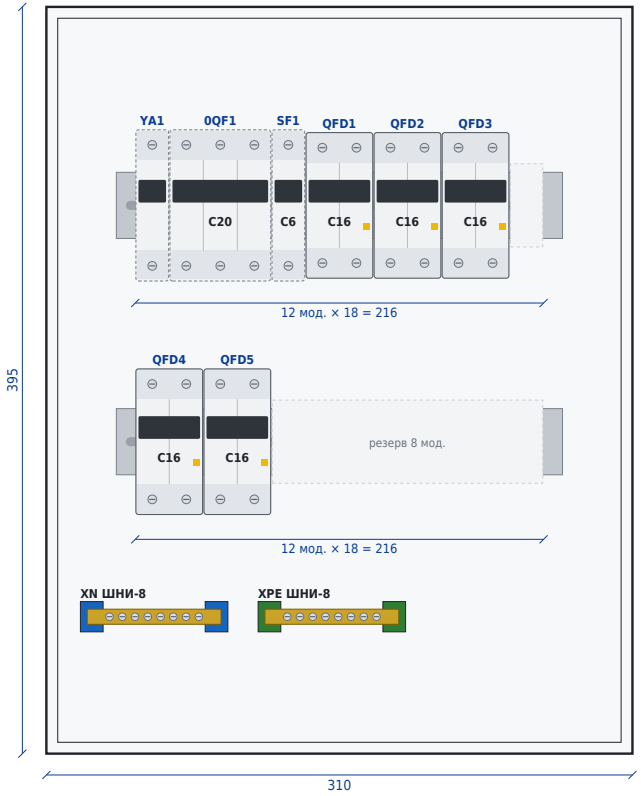

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	Гр.10 от ПР-К2.3			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.45 Компьютер [36.1]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№2.45 Компьютер [36.1]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.45 Компьютер [36.1]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№2.45 Компьютер [36.1]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№2.45 Компьютер [36.1]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 15 из 24 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).

ПР-Tx2.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.28) | **Корпус:** Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм, 540×440×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** H11 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 32,6/5,5 кВт, **Iр** 8,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

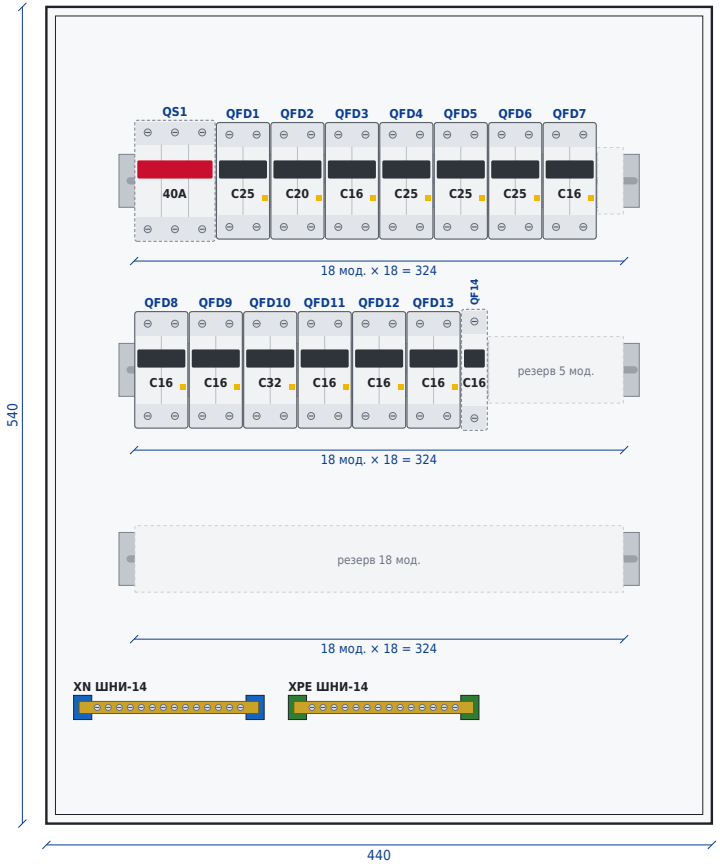

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 40A	193182	Ввод	H11 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.1	Пом.№2.22,2.43 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA	515388	гр.2	Пом.№2.23,2.58 Чайник, Микроволновая печь Холодильник, Интерактивная доска	3,56	17	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.37,2.38 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.4	Пом.№2.26,2.27 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.5	Пом.№2.28,2.31 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.6	Пом.№2.25,2.43 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Пом.№2.33,2.36 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Пом.№2.34,2.35 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Пом.№2.39,2.40 Розеточная сеть, синтезатор Интерактивная доска, музыкальный центр [P, 6.1,6.3, 121.5]	0,97	4,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD10	NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA	515402	гр.10	Пом.№2.48,2.50,2.52 Электросушитель [103]	6	28,7	ВВГнг(A)-LS 3×6
QFD11	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.11	Пом.№2.41,2.45 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD12	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.12	Пом.№2.42,2.44 Розеточная сеть Интерактивная доска [P, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD13	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.13	Пом.№2.53 Электроконвектор [Эк6]	2	9,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF14	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	гр.14	Пом.№2.23 Электропривод окна [W1, W2]	0,04	0,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм (TEKSAN F)	713-15060	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ


Модули: занято 30 из 54 (резерв 24). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ПР-К2.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.29) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK), 550×320×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** H12 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 14,3/9,6 кВт, **Iр** 15,4 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

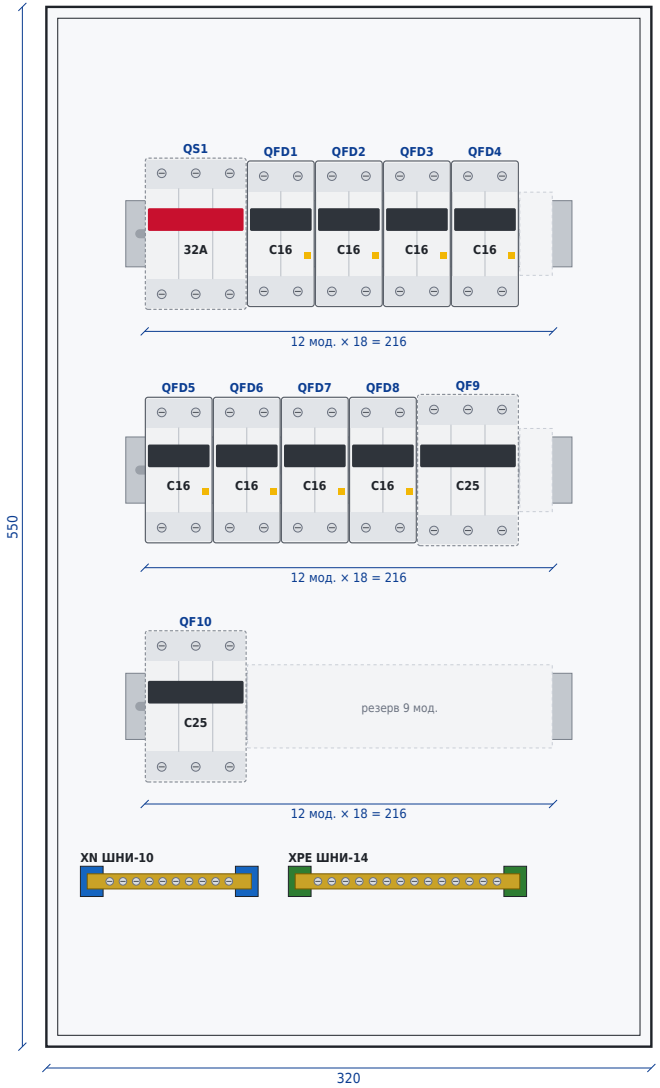

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	H12 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№2.57,2.59,2.60 МФУ Компьютер [36, 36.2]	1,58	7,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№2.23 МФУ Компьютер [36.1, 36.2, 36.3]	1,32	6,3	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№2.37,2.38 МФУ Компьютер [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№2.33,2.36 МФУ Компьютер [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№2.34,2.35 МФУ Компьютер [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№2.39,2.40 МФУ Компьютер [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Пом.№2.41,2.45 МФУ Компьютер [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Пом.№2.42,2.44 МФУ Компьютер [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF9	NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	гр.9	Пом.№2.23 Щит ПРК-4	1,4	2,2	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF10	NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	гр.10	Пом.№2.45 Щит ПРК-5	5	8	ВВГнг(А)-LS 5×4

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) (TEKSAN F)	713-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 25 из 36 (резерв 11). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	24 | =ПР-К2.3 ПР-К2.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**33 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ПРЛ-6 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.30) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.6 от ПР-Тх3.1 | **Ру/Рр:** 2,2/0,3 кВт, **Iр** 0,5 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

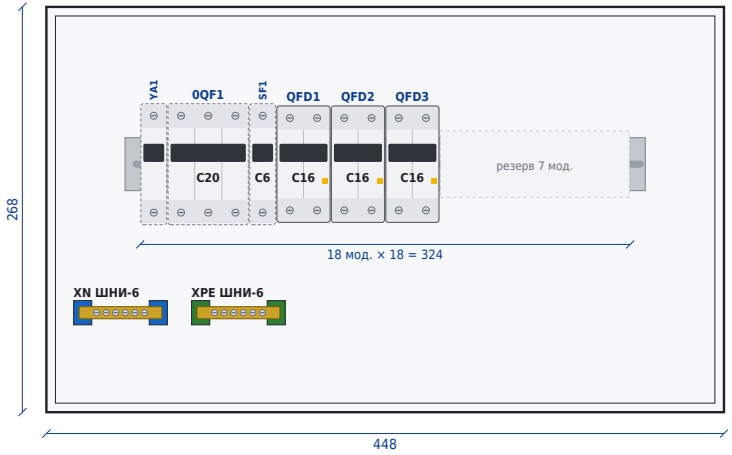

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	Гр.6 от ПР-Тх3.1			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№3.6 Стол лабораторный [52]	0,8	3,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№3.6 Стол лабораторный Демонстрационный стол [52, 75]	0,8	3,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№3.6 Стол лабораторный [52]	0,64	3,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 11 из 18 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).

ПР-Тх3.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.31) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK), 550×320×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** Н1 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 20,3/4,1 кВт, **Iр** 6,5 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

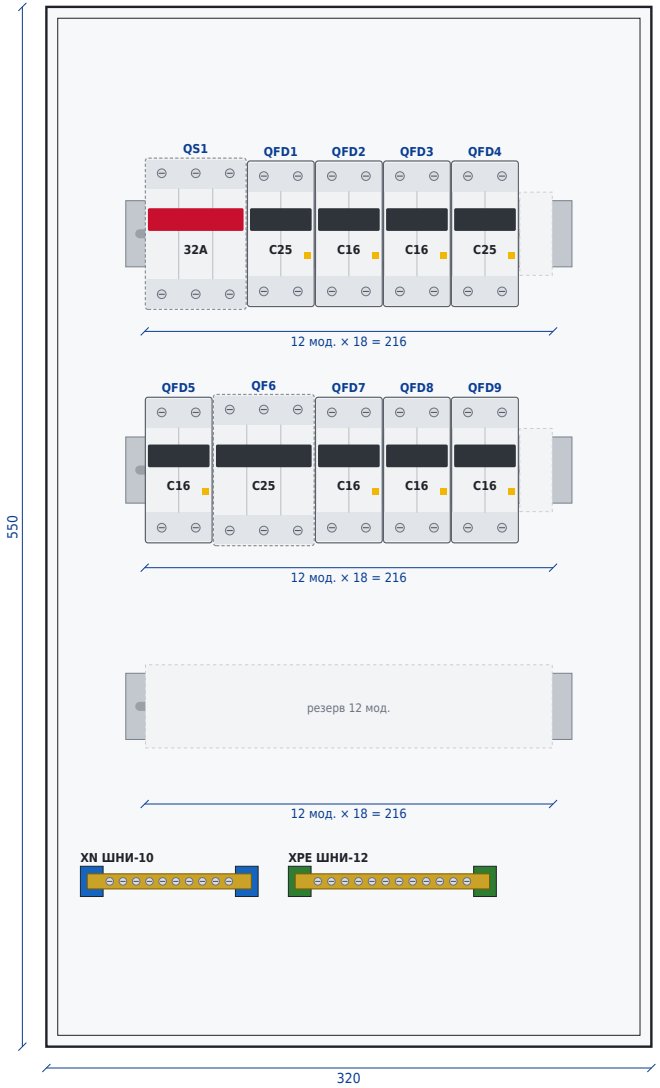

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	Н1 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.1	Пом.№3.4 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№3.2,3.8,3.9 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	1,21	5,8	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№3.5-3.7 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	0,97	4,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.4	Пом.№3.4,3.67 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№3.68,3.69 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	гр.6	Пом.№3.6 Щит ПРЛ-6	0,3	0,5	ВВГнг(A)-LS 5×4
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Пом.№3.2 Тележка для хранения и зарядки ноутбуков Acer Charging Car [10.7]	3	14,4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Пом.№3.8 Тележка для хранения и зарядки ноутбуков Acer Charging Car [10.7]	3	14,4	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Пом.№3.7 Тележка для хранения и зарядки ноутбуков Acer Charging Car [10.7]	3	14,4	ВВГнг(A)-LS 3×4

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) (TEKSAN F)	713-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 22 из 36 (резерв 14). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ПР-К3.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.32) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK), габариты — КОНТРОЛЬ, IP31, встраиваемый | **Питание:** Н2 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 2,9/2,6 кВт, **Iр** 4,2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

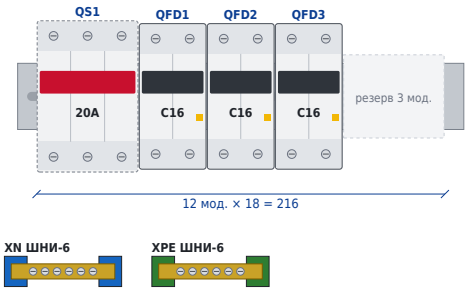

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	Н2 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№3.2,3.9 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№3.2,3.8,3.9 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	1,26	6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№3.68,3.69 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	713-09050	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 9 из 12 (резерв 3). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24, 25 (лист вопросов).

ПР-Тх3.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.33) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Н15 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 30,9/5,2 кВт, **Iр** 8,4 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

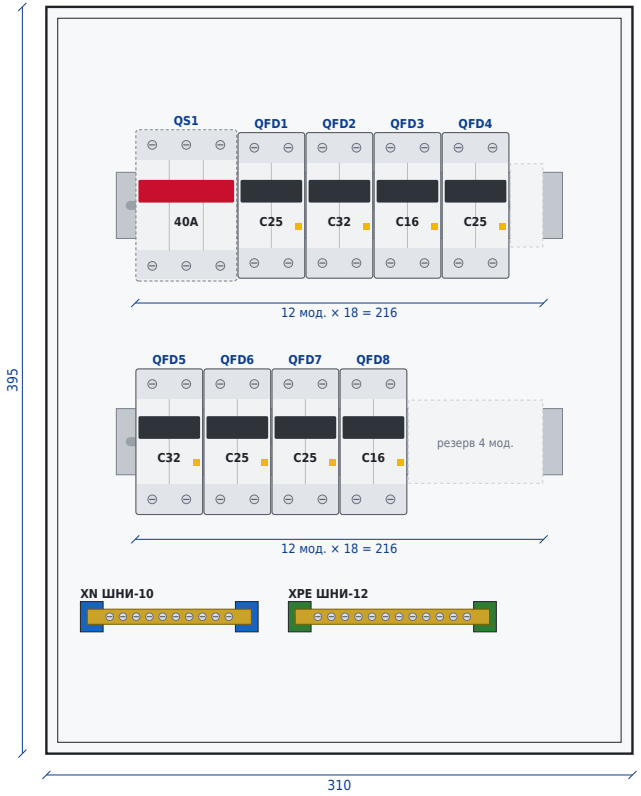

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 40A	193182	Ввод	Н15 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.1	Пом.№3.64 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA	515402	гр.2	Пом.№3.62,3.63 Электросушитель [103]	6	28,7	ВВГнг(A)-LS 3×6
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№3.11,3.12,3.57,3.60 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	1,37	6,6	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.4	Пом.№3.4,3.20 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA	515402	гр.5	Пом.№3.53-3.55 Электросушитель [103]	6	28,7	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.6	Пом.№3.14 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.7	Пом.№3.18 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Пом.№3.58 Электроконвектор [Эк7]	1,5	7,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 19 из 24 (резерв 5). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ПРК-6 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.34) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.2 от ПР-К3.2 | **Ру/Рр:** 5,9/5 кВт, **Ip** 8 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

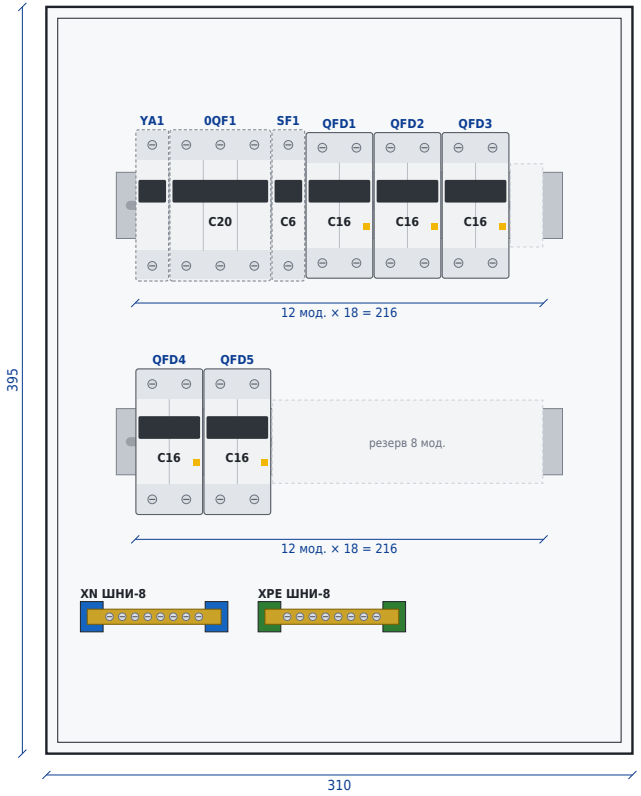

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	Гр.2 от ПР-К3.2			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№3.60 Ноутбук [36.1]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№3.60 Ноутбук [36.1]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№3.60 Ноутбук [36.1]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№3.60 Ноутбук [36.1]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№3.60 Ноутбук [36.1]	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 15 из 24 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).

ПР-К3.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.35) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Н16 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 6,3/5,5 кВт, **Iр** 8,8 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

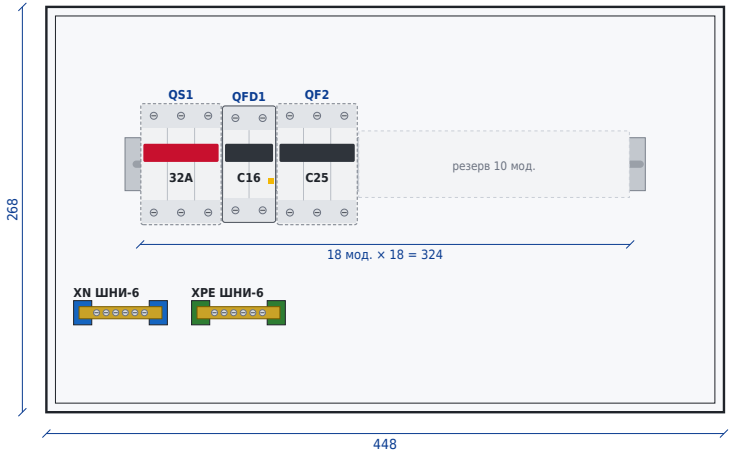

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Iр, А	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	Н16 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№3.11,3.12,3.60 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	1,26	6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	гр.2	Пом.№3.60 Щит ПРК-6	5	8	ВВГнг(A)-LS 5×4

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 8 из 18 (резерв 10). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ПРК-7 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.36) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.8 от ПР-К3.3 | **Ру/Рр:** 2,9/2,3 кВт, **Iр** 3,7 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

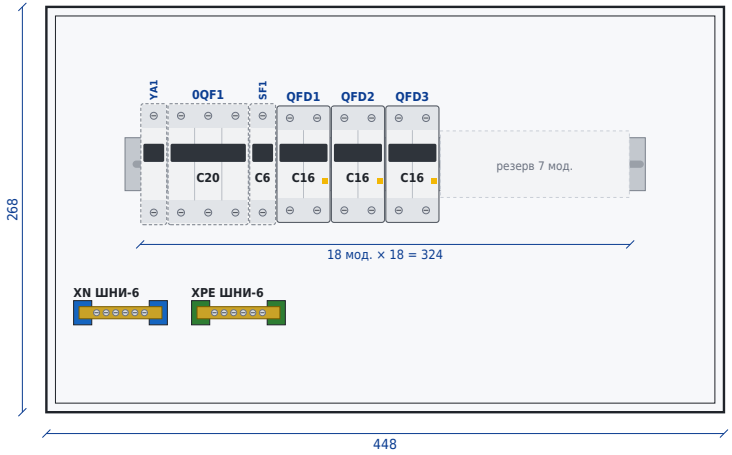

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	Гр.8 от ПР-К3.3			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№3.49 Компьютер [19]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№3.49 Компьютер [19]	1,35	6,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№3.49 Потолочный сетевой фильтр [P]	0,16	0,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 11 из 18 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).

ПР-Тх3.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.37) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK), 550×320×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** H11 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 20,5/4 кВт, **Iр** 19,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

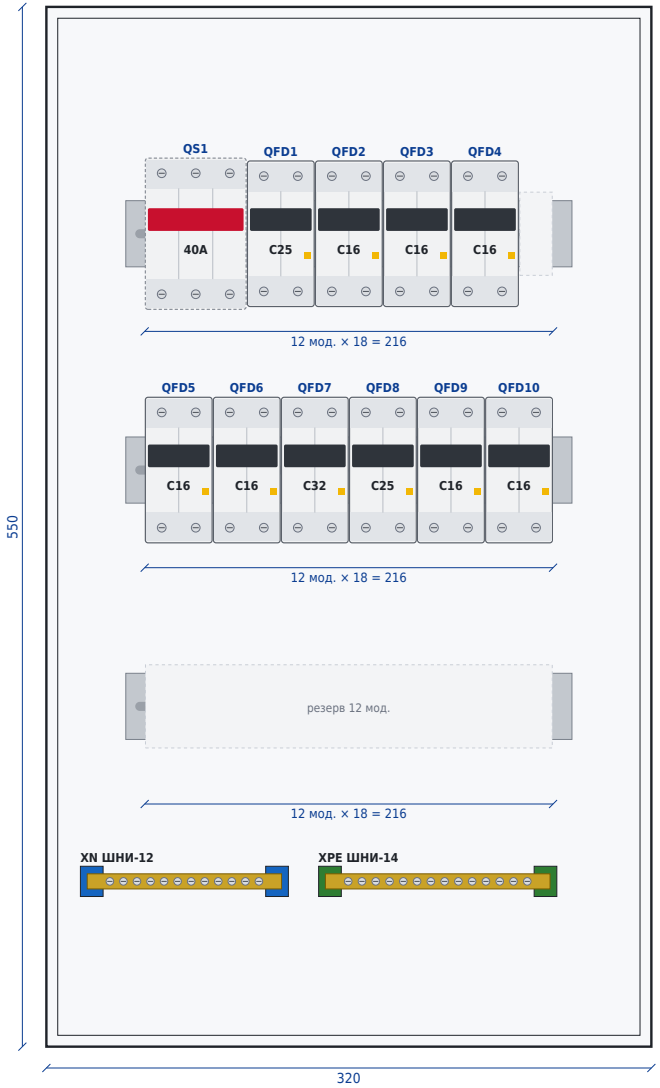

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 40A	193182	Ввод	H11 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.1	Пом.№3.24,3.40 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№3.21,3.22,3.49 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	1,21	5,8	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№3.32,3.33 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№3.25,3.31 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№3.27,3.30 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№3.28,3.29 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA	515402	гр.7	Пом.№3.41,3.46 Электросушитель [103]	6	28,7	ВВГнг(A)-LS 3×6
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.8	Пом.№3.43 Электросушитель [103]	4	19,1	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Пом.№3.34,3.35,3.38 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	1,21	5,8	ВВГнг(A)-LS 3×4
QFD10	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.10	Пом.№3.36,3.37 Розеточная сеть Интерактивная доска [Р, 6.3]	0,81	3,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) (TEKSAN F)	713-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 23 из 36 (резерв 13). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	32 | =ПР-Тх3.3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ПР-Тх3.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	41 / 86	R3	15.10.2026

ПР-К3.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.38) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK), 550×320×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** H12 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 9/5,5 кВт, **Iр** 8,8 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

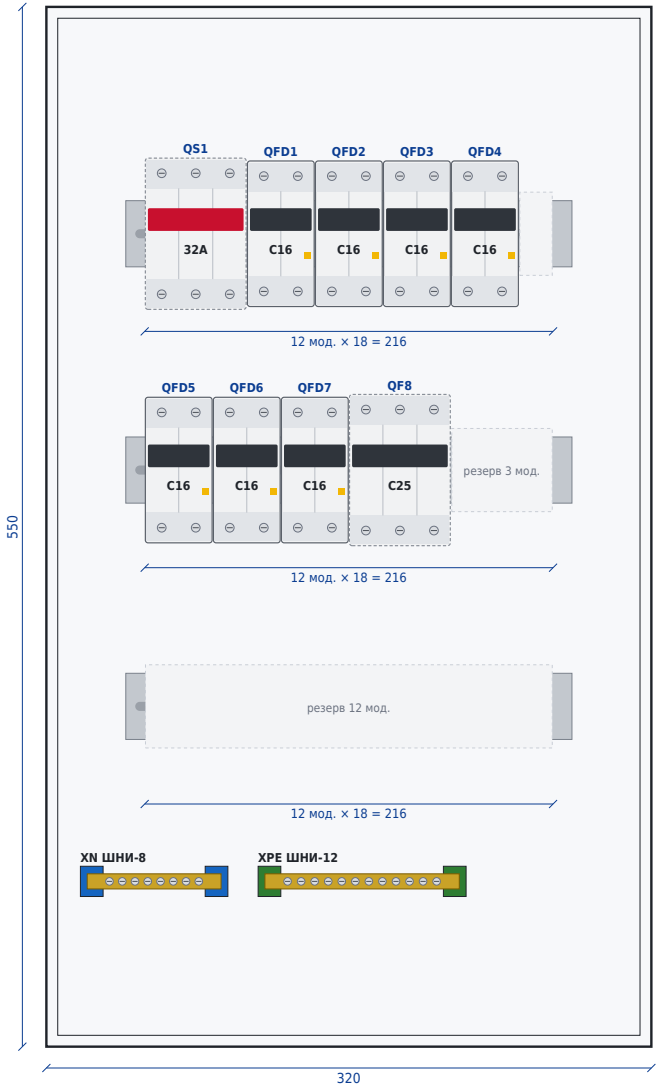

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	H12 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№3.21,3.22,3.49 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	1,26	6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№3.32,3.33 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.3	Пом.№3.25,3.31 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№3.27,3.30 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№3.28,3.29 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№3.34,3.35 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	0,84	4	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Пом.№3.36,3.37,3.38 Компьютер МФУ [36.1, 36.2]	1,26	6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF8	NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	гр.8	Пом.№3.49 Щит ПРК-7	2,3	3,7	ВВГнг(A)-LS 5×4

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) (TEKSAN F)	713-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 20 из 36 (резерв 16). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	33 | =ПР-К3.3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ПР-К3.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	42 / 86	R3	15.10.2026

ЩО-0 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.39) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** H17 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 2,4/2,4 кВт, **Ip** 3,84 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

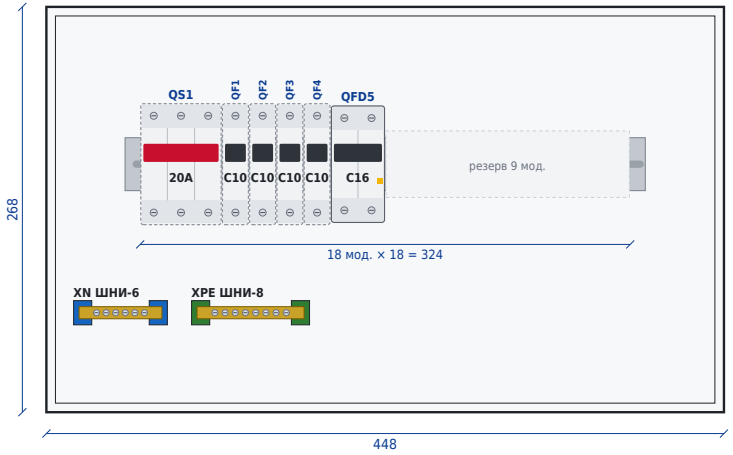

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	H17 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№0.17, 0.18,0.19,0.20, 0.23. Рабочее освещение	0,41		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№0.1,0.5, 0.6,0.8,0.21, 0.22. Рабочее освещение	0,25		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3 (L2)	Пом.№0.7, 0.9,0.10. Рабочее освещение	0,4		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№0.2,0.3, 0.4,0.11-0.16. Рабочее освещение	0,38		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5 (L3)	Пом.№0.1,0.4, 0.6,0.8,0.13, 0.18. Розеточная сеть	0,96		ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 9 из 18 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ЩАО-0 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.40) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** C1 от ВРУ-А | **Ру/Рр:** 0,2/0,2 кВт, **Iр** 0,32 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

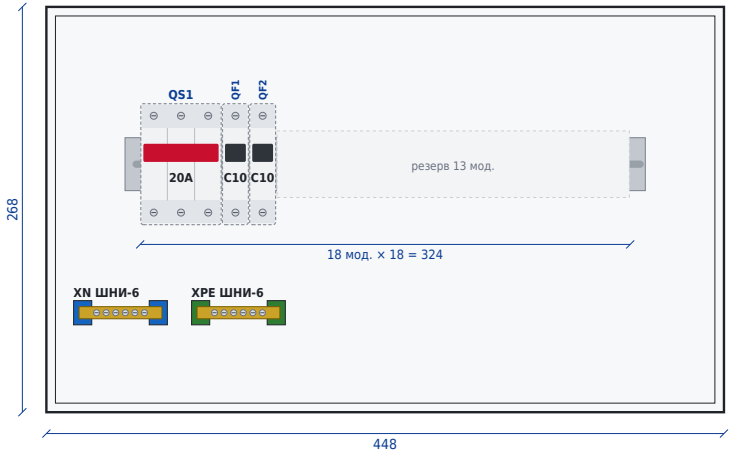

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	C1 от ВРУ-А			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№0.1, 0.6,0.8. Аварийное освещение	0,1		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№0.4, 0.13,0.18. Аварийное освещение	0,1		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 5 из 18 (резерв 13). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	35 | =ЩАО-0 ЩАО-0 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**44 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ЩО-1.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.41) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK), 550×320×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** НЗ от ВРУшк | **Ру/Рр:** 5,99/5,99 кВт, **Iр** 9,59 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

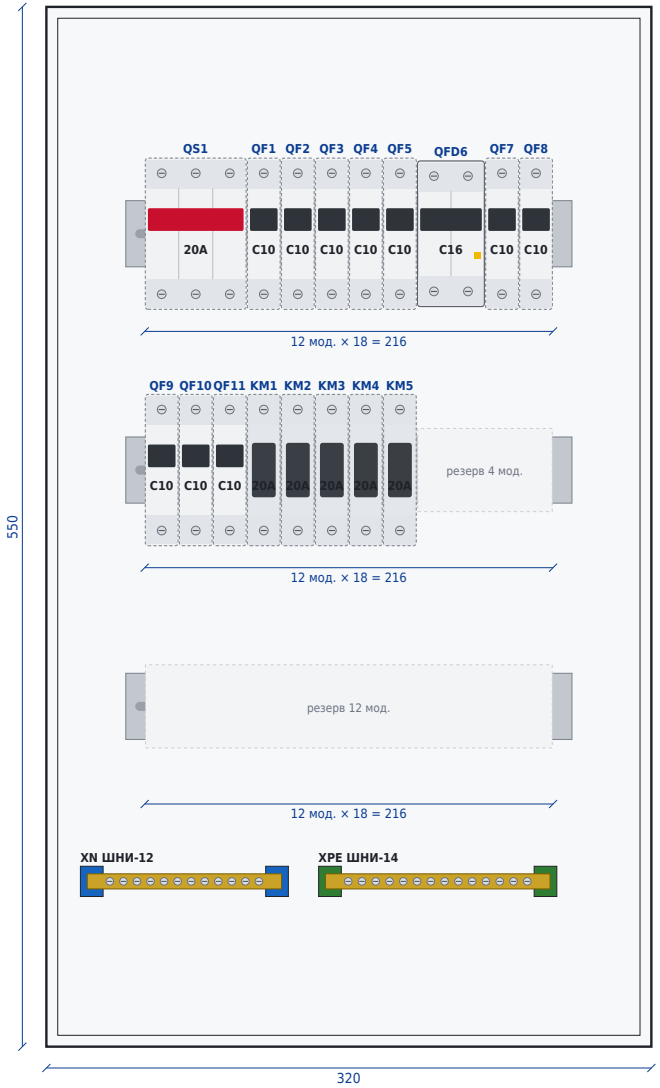

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	НЗ от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№1.5,1.14, 1.15. Рабочее освещение	1,09		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№ 1.9-1.13. Рабочее освещение	1,14		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№1.158- 1.165, 1.167-1.173. Рабочее освещение	0,67		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№1.166. Рабочее освещение	0,8		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№1.166. Рабочее освещение	0,7		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6 (L3)	Пом.№1.158. Розеточная сеть	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF7 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.7 (L1)	Пом.№1.6,2.3, 3.3. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF8 + KM2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.8 (L2)	Пом.№1.3,2.1, 3.1. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF9 + KM3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.9 (L3)	Пом.№1.7. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,32		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF10 + KM4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.10 (L1)	Пом.№1.4. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,41		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF11 + KM5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.11 (L2)	Пом.№1.1,1.2. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,38		ВВГнг(A)-LS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) (TEKSAN F)	713-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 20 из 36 (резерв 16). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	36 | =ЩО-1.1 ЩО-1.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261013	45 / 86	R3	15.10.2026

ЩО-1.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.42) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** H17 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 4,56/4,56 кВт, **Ip** 7,3 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

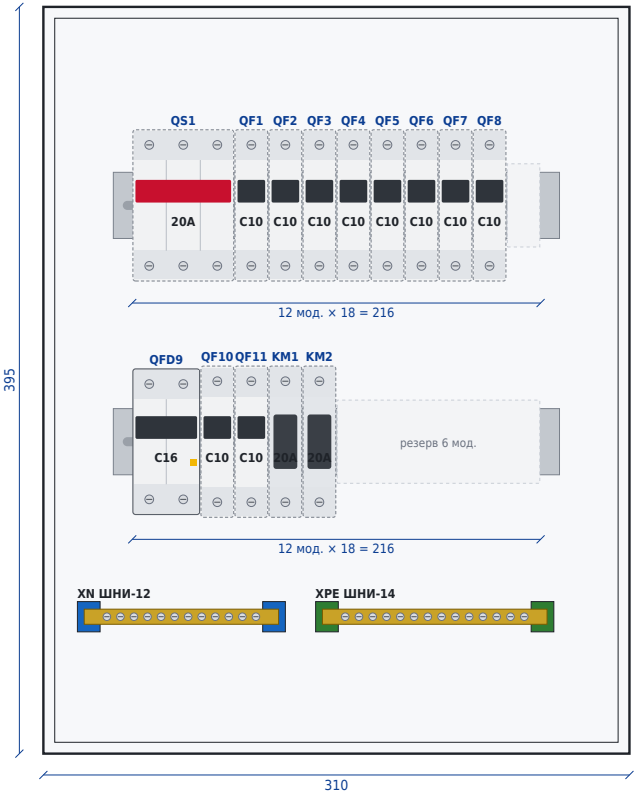

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	H17 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№1.149- 1.157. Рабочее освещение	0,17		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№ 1.16,1.19-1.21, 1.44,1.46. Рабочее освещение	0,86		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№1.106- 1.109,1.111. Рабочее освещение	0,21		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№1.23- 1.28,1.38-1.43. Рабочее освещение	0,62		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№1.22, 1.29,1.30, 1.33-1.37. Рабочее освещение	0,42		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.6 (L3)	Пом.№1.32. Рабочее освещение	0,6		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.7 (L1)	Пом.№1.31. Рабочее освещение	0,6		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.8 (L2)	Лифтовая шахта. Рабочее освещение	0,18		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QFD9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9 (L3)	Пом.№1.111. Розеточная сеть	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF10 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.10 (L1)	Пом.№1.112, 2.72,3.59. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF11 + KM2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.11 (L2)	Освещение (помещения — по ЭОМ); управление — ЩУО	0,58		ВВГнг(A)-LS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 17 из 24 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	37 | =ЩО-1.2 ЩО-1.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**46 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ЩО-1.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.43) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK), 550×320×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** H14 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 7,17/7,17 кВт, **Ip** 11,48 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

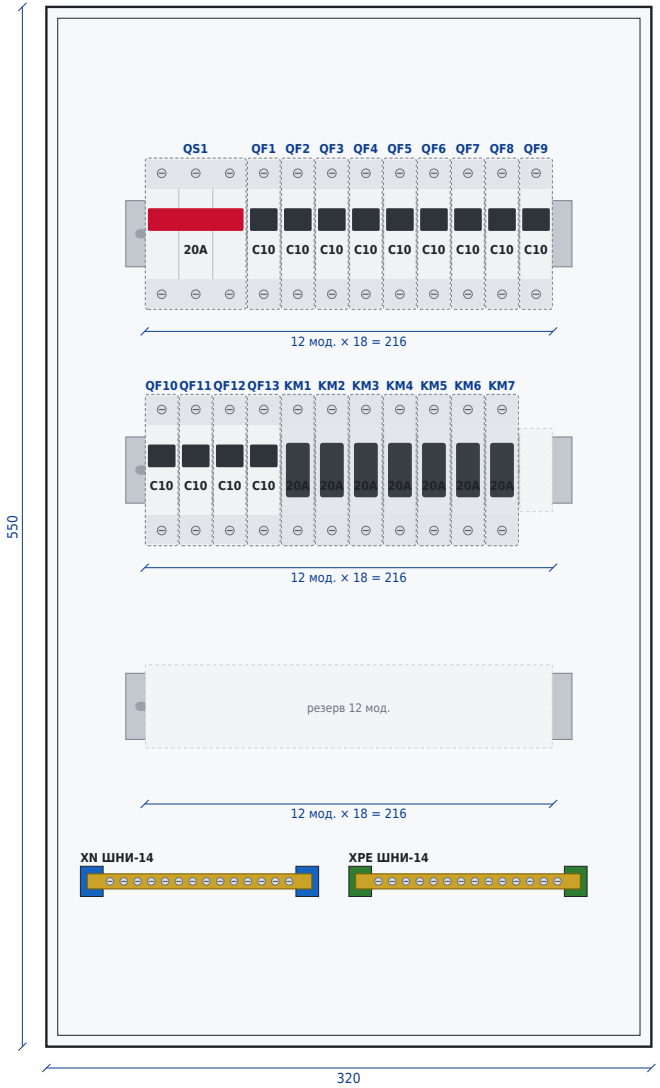

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	H14 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№1.97, 1.101,1.102. Рабочее освещение	0,53		
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№ 1.17,1.18,1.45, 1.47-1.54. Рабочее освещение	0,79		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№1.63, 1.69,1.71-1.74. Рабочее освещение	0,87		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№1.61, 1.62,1.65- 1.68. Рабочее освещение	0,84		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№1.77- 1.81,1.83,1.84. Рабочее освещение	0,91		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.6 (L3)	Пом.№1.85, 1.87,1.91-1.95. Рабочее освещение	0,92		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF7 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.7 (L1)	Пом.№1.98, 2.55,3.48. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF8 + KM2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.8 (L2)	Пом.№1.59, 2.32,3.26. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF9 + KM3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.9 (L3)	Пом.№1.89, 2.46,3.39. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF10 + KM4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.10 (L1)	Пом.№1.55, 1.100,1.103. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,38		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF11 + KM5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.11 (L2)	Пом.№1.56, 1.64,1.70. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,56		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF12 + KM6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.12 (L3)	Пом.№1.75, 1.76. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,25		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF13 + KM7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.13 (L1)	Пом.№1.82, 1.86,1.88,1.96. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,64		ВВГнг(A)-LS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) (TEKSAN F)	713-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ


Модули: занято 23 из 36 (резерв 13). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ЩО-Кх — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.44) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK), 275×450×120 мм, IP31, встраиваемый | **Питание:** Л4 от ВРУст | **Ру/Рр:** 2,1/2,1 кВт, **Iр** 3,36 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

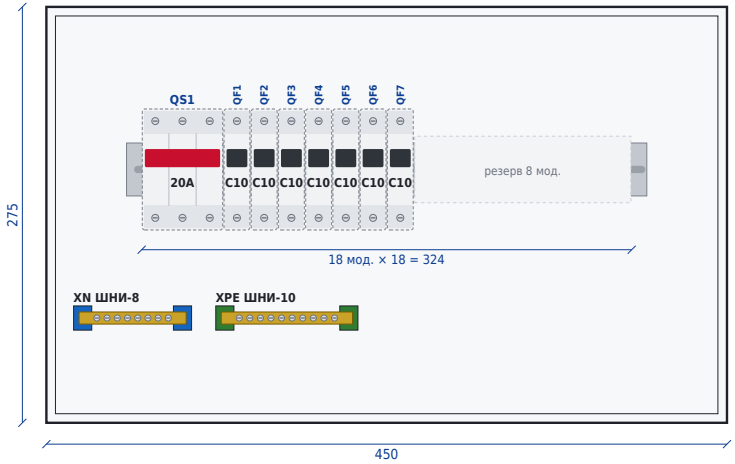

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	Л4 от ВРУст			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№1.114, 1.115. Рабочее освещение	0,63		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№1.113, 1.116. Рабочее освещение	0,34		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№1.117, 1.118,1.146. Рабочее освещение	0,31		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№1.119, 1.140,1.143- 1.145. Рабочее освещение	0,18		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№1.120- 1.125. Рабочее освещение	0,13		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.6 (L3)	Пом.№1.126- 1.130. Рабочее освещение	0,22		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.7 (L1)	Пом.№1.131- 1.137,1.139, 1.141,1.142. Рабочее освещение	0,29		ВВГнг(A)-LS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK) (TEKSAN F)	713-09054	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 10 из 18 (резерв 8). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ЩАО-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.45) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** C1 от ВРУ-А | **Ру/Рр:** 4,08/4,08 кВт, **Ip** 6,53 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	C1 от ВРУ-А			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№1.6-1.8, 1.12. Аварийное освещение	0,09		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF2 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№1.6,2.3, 3.3. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,11		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF3 + KM2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3 (L3)	Освещение (помещения — по ЭОМ); управление — ЩУО	0,58		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4 (L1)	Аварийное освещение (помещения — по ЭОМ)	0,11		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№1.158, 1.160,1.161, 1.166. Аварийное освещение	0,58		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF6 + KM3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.6 (L3)	Пом.№1.3,2.1, 3.1. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,11		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF7 + KM4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.7 (L1)	Пом.№1.112, 2.72,3.59. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,11		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.8 (L2)	Пом.№1.22, 1.31,1.32. Аварийное освещение	0,52		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF9	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.9 (L3)	Аварийное освещение (помещения — по ЭОМ)	0,55		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF10 + KM5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.10 (L1)	Освещение (помещения — по ЭОМ); управление — ЩУО	0,57		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF11 + KM6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.11 (L2)	Пом.№1.98, 2.55,3.48. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,11		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF12	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.12 (L3)	Аварийное освещение (помещения — по ЭОМ)	0,19		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF13	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.13 (L1)	Пом.№1.57- 1.59,1.64,1.70. Аварийное освещение	0,11		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF14 + KM7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.14 (L2)	Пом.№1.59, 2.32,3.26. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,11		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF15	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.15 (L3)	Пом.№1.82, 1.86,1.89-1.91. Аварийное освещение	0,11		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF16 + KM8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.16 (L1)	Пом.№1.89, 2.46,3.39. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,11		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF17	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.17 (L2)	Пом.№1.77. питания; управление — ЩУО	0,01		ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ


Модули: занято 28 из 36 (резерв 8). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ЩО-2.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.47) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), габариты — КОНТРОЛЬ, IP31, встраиваемый | **Питание:** НЗ от ВРУшк | **Ру/Рр:** 4,77/4,77 кВт, **Iр** 7,64 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

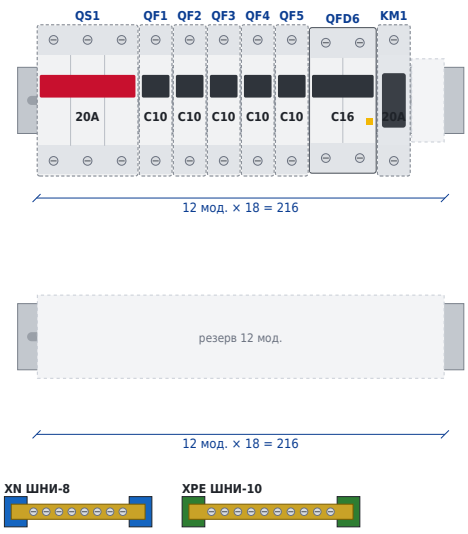

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	НЗ от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№2.2,2.7, 2.8. Рабочее освещение	0,95		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№ 2.4-2.6. Рабочее освещение	1,2		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF3 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№2.9, 2.10,2.83,2.85. Рабочее освещение; управление — ЩУО	1,01		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№2.87, 2.88. Рабочее освещение	0,69		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№2.74- 2.82,2.84, 2.86,2.86.1, 2.86.2 Рабочее освещение	0,76		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6 (L3)	Пом.№1.158. Розеточная сеть	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	713-09052	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 11 из 24 (резерв 13). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24, 25 (лист вопросов).

ЩО-2.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.48) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Н17 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 4,46/4,46 кВт, **Iр** 7,14 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

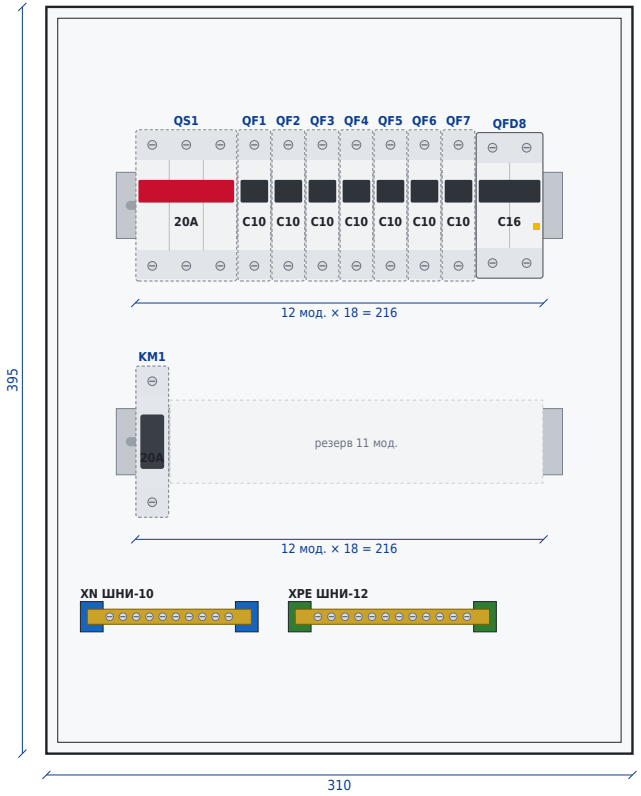

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	Н17 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№2.11, 2.73. Рабочее освещение	0,88		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№2.12, 2.22,2.61,2.62,. 2.65. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,72		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№2.63, 2.64,2.66, 2.70. Рабочее освещение	0,18		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№2.13- 2.21. Рабочее освещение	1,1		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№2.69. Рабочее освещение	0,56		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.6 (L3)	Пом.№2.68, 2.69. Рабочее освещение	0,53		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.7 (L1)	Пом.№2.67. Рабочее освещение	0,17		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8 (L2)	Пом.№2.70, 2.71. Розеточная сеть	0,32		ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 13 из 24 (резерв 11). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	42 | =ЩО-2.2 ЩО-2.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**51 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ЩО-2.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.49) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), габариты — КОНТРОЛЬ, IP31, встраиваемый | **Питание:** H14 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 7,48/7,48 кВт, **Iр** 11,98 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

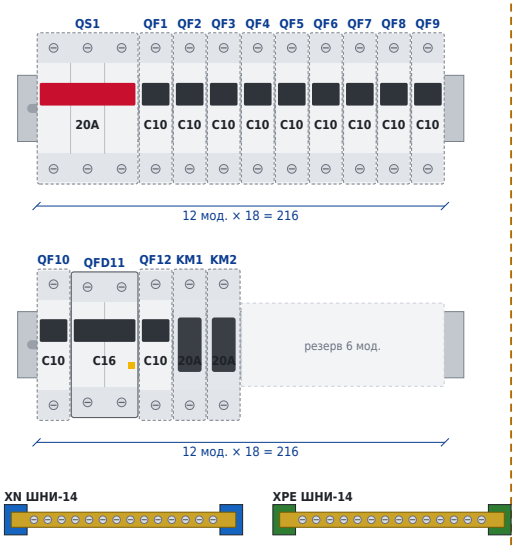

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	H14 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№2.56- 2.60. Рабочее освещение	0,46		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№2.23. Рабочее освещение	0,45		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF3 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№2.22, 2.54. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,46		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF4 + KM2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№2.25, 2.43. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,79		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№2.38, 2.39. Рабочее освещение	0,69		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.6 (L3)	Пом.№2.45, 2.47-2.53. Рабочее освещение	0,41		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.7 (L1)	Пом.№2.40, 2.41. Рабочее освещение	0,82		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.8 (L2)	Пом.№2.42, 2.44. Рабочее освещение	0,82		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF9	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.9 (L3)	Пом.№2.26- 2.31,2.36,2.37. Рабочее освещение	0,94		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF10	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.10 (L1)	Пом.№2.33- 2.35. Рабочее освещение	1,1		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QFD11	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.11 (L2)	Пом.№2.53. Розеточная сеть	0,16		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF12	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.12 (L3)	Пом.№2.24, 2.24.1. Рабочее освещение	0,38		ВВГнг(A)-LS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	713-09052	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ


Модули: занято 18 из 24 (резерв 6). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24, 25 (лист вопросов).

ЩАО-2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.50) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** C1 от ВРУ-А | **Ру/Рр:** 1,42/1,42 кВт, **Iр** 2,27 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

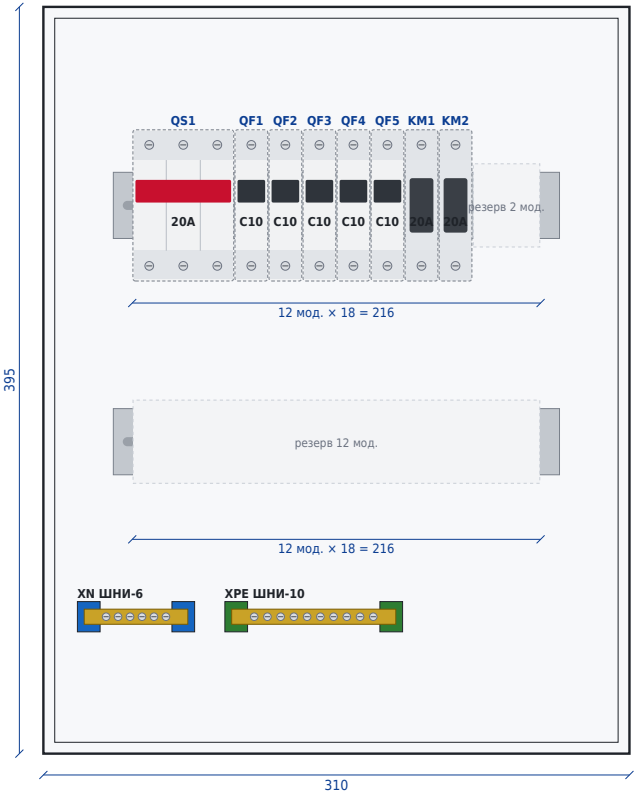

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	C1 от ВРУ-А			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№2.9, 2.10,2.22,2.70, 2.71,2.84,2.86. Аварийное освещение	0,09		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№1.174, 2.67-2.69. Аварийное освещение	0,4		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF3 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№2.9, 2.22,2.61. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,35		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№2.22, 2.23,2.25,2.43 2.53,2.56. Аварийное освещение	0,16		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF5 + KM2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№2.22, 2.25,2.43. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,42		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 10 из 24 (резерв 14). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ЩО-3.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.51) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK), габариты — КОНТРОЛЬ, IP31, встраиваемый | **Питание:** НЗ от ВРУшк | **Ру/Рр:** 4,15/4,15 кВт, **Iр** 6,64 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

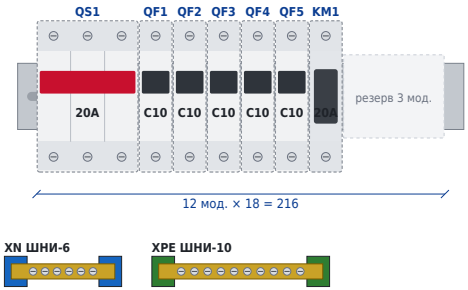

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	НЗ от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№3.2,3.8, 3.9. Рабочее освещение	1,1		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№ 3.5-3.7. Рабочее освещение	1,07		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF3 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№3.4, 3.10. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,7		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№3.68, 3.69. Рабочее освещение	0,69		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№3.57, 3.61-3.67. Рабочее освещение	0,59		ВВГнг(A)-LS 4×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	713-09050	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ


Модули: занято 9 из 12 (резерв 3). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24, 25 (лист вопросов).

ЩО-3.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.52) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** H17 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 2,49/2,49 кВт, **Ip** 3,99 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

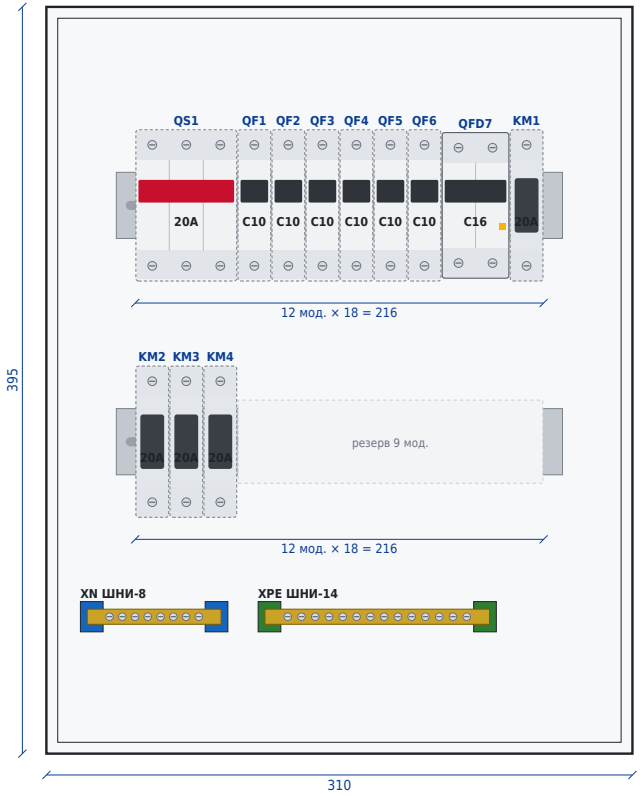

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	H17 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№3.11, 3.12,3.60. Рабочее освещение	0,95		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№3.14- 3.18,3.52- 3.55,3.57. Рабочее освещение	0,26		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF3 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№3.20, 3.50,3.56. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,25		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF4 + KM2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№3.51. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,29		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5 + KM3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№3.13. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,29		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF6 + KM4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.6 (L3)	Пом.№3.19. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,29		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7 (L1)	Пом.№3.58. Розеточная сеть	0,16		ВВГнг(A)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 15 из 24 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	46 | =ЩО-3.2 ЩО-3.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**55 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ЩО-3.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-18 IP31 (ЭОМ л.53) | **Корпус:** Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), габариты — КОНТРОЛЬ, IP31, встраиваемый | **Питание:** H14 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 7,38/7,38 кВт, **Ip** 11,82 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

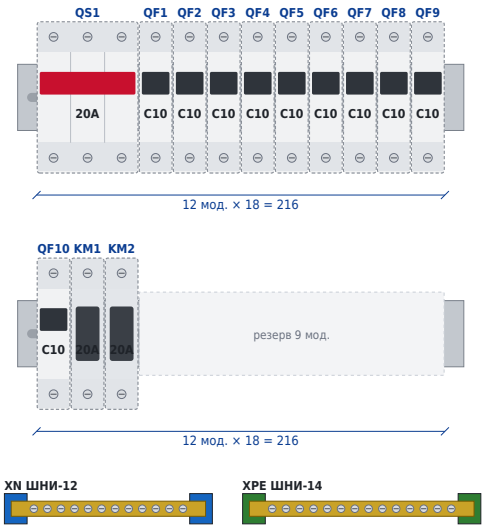

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	H14 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№3.21, 3.22,3.49. Рабочее освещение	1,23		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№3.23, 3.24. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,67		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF3 + KM2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№3.40, 3.47. Рабочее освещение; управление — ЩУО	0,54		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№3.32, 3.33. Рабочее освещение	0,69		ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№3.25, 3.31. Рабочее освещение	0,69		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.6 (L3)	Пом.№3.27, 3.30. Рабочее освещение	0,69		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.7 (L1)	Пом.№3.28, 3.29. Рабочее освещение	0,82		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.8 (L2)	Пом.№3.34, 3.35. Рабочее освещение	0,82		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF9	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.9 (L3)	Пом.№3.38, 3.41-3.46. Рабочее освещение	0,41		ВВГнг(A)-LS 4×1,5
QF10	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.10 (L1)	Пом.№3.36, 3.37. Рабочее освещение	0,82		ВВГнг(A)-LS 4×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	713-09052	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 15 из 24 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24, 25 (лист вопросов).

ЩАО-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.54) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 395×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** C1 от ВРУ-А | **Ру/Рр:** 0,88/0,88 кВт, **Iр** 1,41 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

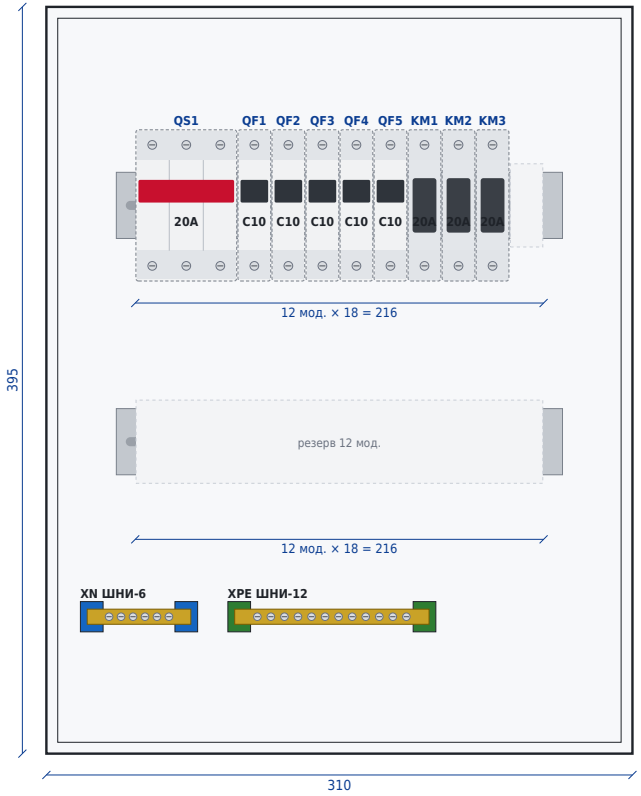

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	C1 от ВРУ-А			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1 (L1)	Пом.№3.4, 3.10,3.20,3.57, 3.58,3.67. Аварийное освещение	0,05		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2 (L2)	Пом.№3.24, 3.40. Аварийное освещение	0,02		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF3 + KM1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3 (L3)	Пом.№3.4. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,25		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF4 + KM2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4 (L1)	Пом.№3.20, 3.50,3.56. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,14		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF5 + KM3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5 (L2)	Пом.№3.24, 3.40. Аварийное освещение; управление — ЩУО	0,42		ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09053	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 11 из 24 (резерв 13). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	48 | =ЩАО-3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ЩАО-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	57 / 86	R3	15.10.2026

ЩСН — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.55) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** H19 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 14,5/9,6 кВт, **Iр** 18,2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

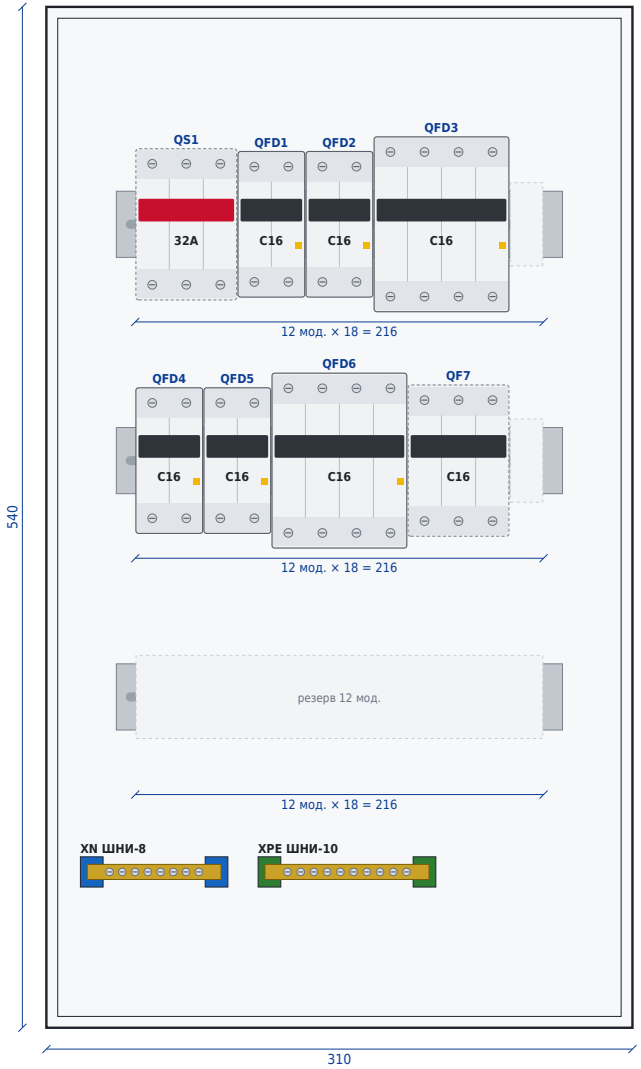

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	H19 от ВРУшк			
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.1	Пом.№0.6 Дренажный насос ВК [Дн1]	1,75	10,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.2	Пом.№0.18 Дренажный насос ВК [Дн3]	0,72	5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD3	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.3	Пом.№0.8 Дренажный насос ВК [Дн4]	1,9	3,8	ВВГнг(A)-LS 5×1,5
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№0.4 Дренажный насос ВК [Дн2]	0,72	5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Пом.№0.13 Дренажный насос ВК [Дн5]	0,9	6,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QFD6	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.6	Пом.№0.1 Дренажный насос ВК [Дн6]	1,9	3,8	ВВГнг(A)-LS 5×1,5
QF7	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	гр.7	Пом.№0.1 Насос ВК хоз.-пит. (рабочий) [H1]	2,2	4,5	ВВГнг(A)-LS 5×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 22 из 36 (резерв 14). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	49 | =ЩСН ЩСН — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**58 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ЩС-НП — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.57) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** С7 от ВРУ-А | **Ру/Рр:** 11,2/5,7 кВт, **Iр** 10,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

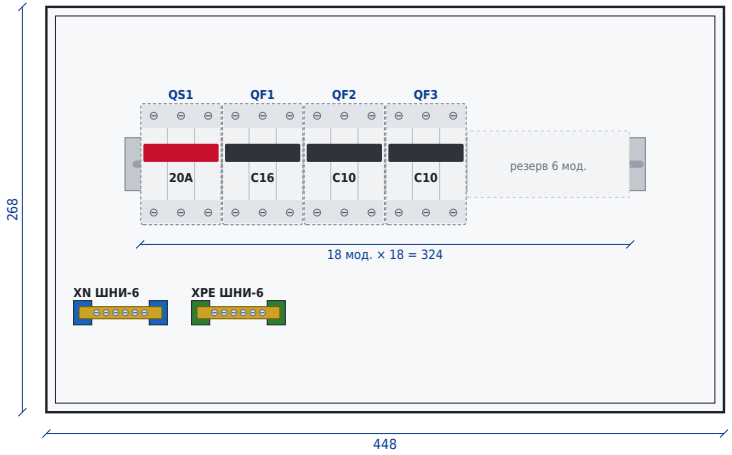

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Iр, А	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	С7 от ВРУ-А			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	гр.1	Пом.№0.1 Насос ВК противопожарный (рабочий) Пом.№0.1 [Нп1, Нп2]	11	9,8	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.2	Насос ВК противопожарный (резервный) Пом.№0.1 Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3	0,1	0,2	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.3	Пом.№0.1 Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3 [ШУЗ-2]	0,1	0,2	ВВГнг(A)-LS 5×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 12 из 18 (резерв 6). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ЩСВ-0 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.58) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Н6 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 38,2/28,7 кВт, **Iр** 51,3 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

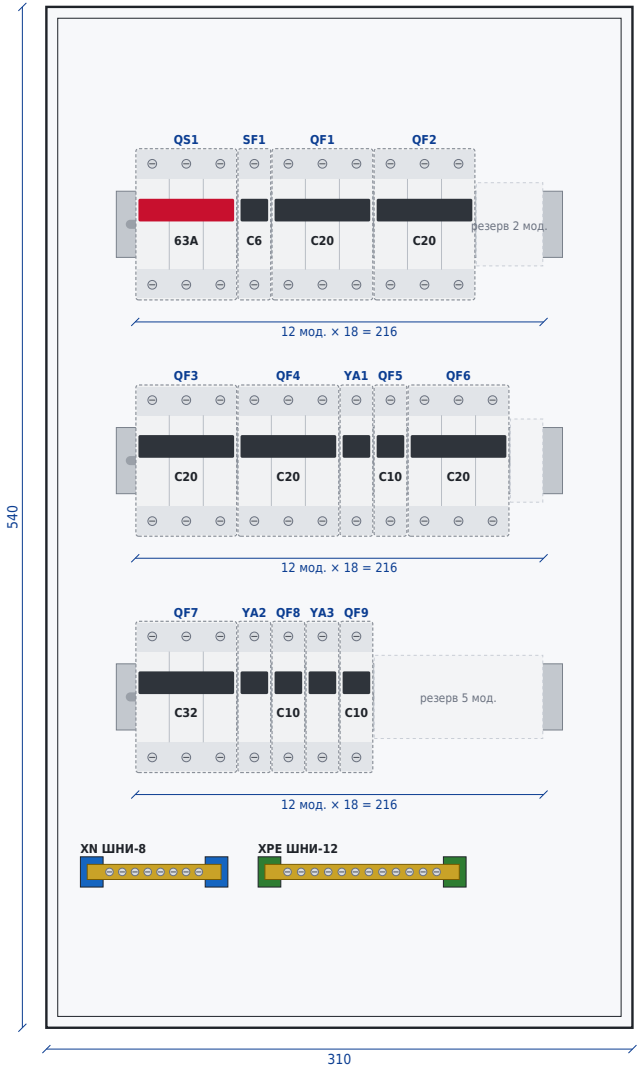

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 63A	193183	Ввод	Н6 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.1	Пом.№0.6 Приточная установка П1 Пом.№0.6 [П1, В1]	6	6,1	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.2	Вытяжная установка В1 Пом.№0.6 Приточная установка П3	3	6,1	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.3	Пом.№0.8 Приточная установка П2	5,5	9,8	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.4	Пом.№0.18 Приточная установка П6	7,5	13,4	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF5 + YA1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5	Пом.№0.5 Вытяжной вентилятор В30	0,21	1,5	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF6	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.6	Пом.№0.8 Приточная установка П8	3	6,1	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF7	NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830	гр.7	Кровля ККБ ПВ1 [ККБ, ПВ1]	12,77	22,8	ВВГнг(A)-LS 5×4
QF8 + YA2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.8	Пом.№0.15 Вытяжной вентилятор В32	0,06	0,4	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF9 + YA3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.9	Пом.№0.4 Вытяжной вентилятор В15	0,21	1,5	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 28 из 36 (резерв 8). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	51 | =ЩСВ-0 ЩСВ-0 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261013	60 / 86	R3	15.10.2026

ЩСВ-К — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.59) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Л5 от ВРУст | **Ру/Рр:** 47,4/37 кВт, **Iр** 66,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

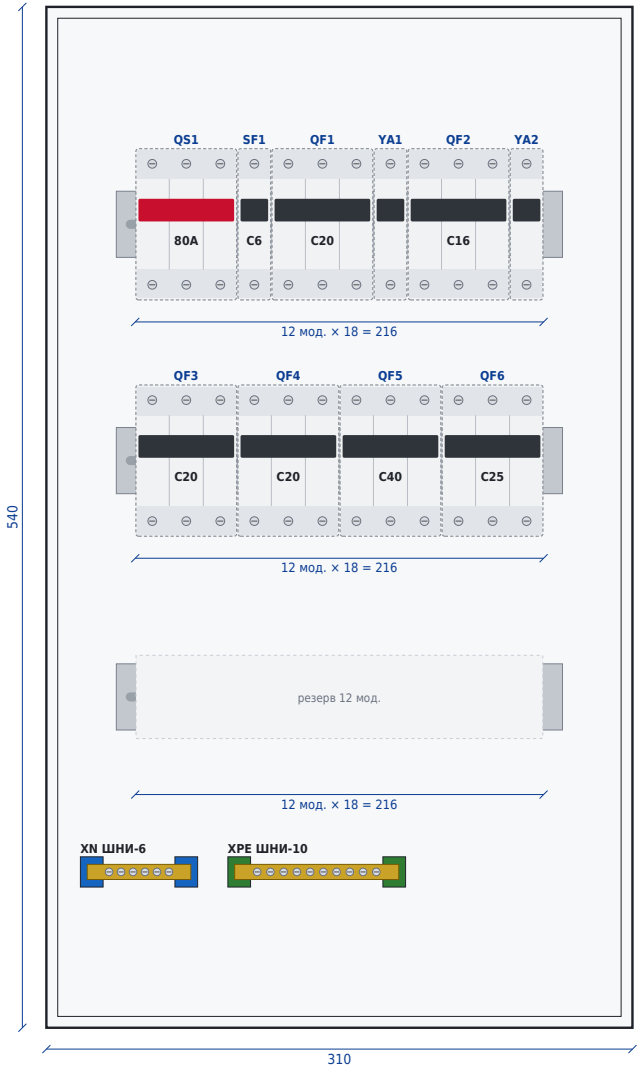

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	Р, кВт	Iр, А	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 80A	193184	Ввод	Л5 от ВРУст			
QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.1	Пом.№0.13 Приточная установка П7	2,2	4,5	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2 + YA1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	гр.2	Пом.№1.130 Тепловая завеса [У5]	6	9,3	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3 + YA2	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.3	Пом.№1.140 Щит ЩСВ-К1	4,8	9,1	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.4	Пом.№0.13 Приточная установка П4	5,5	9,8	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C	296831	гр.5	Кровля ККБ П4 [ККБ, П4]	18,03	32,2	ВВГнг(А)-LS 5×6
QF6	NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829	гр.6	Кровля ККБ П7 [ККБ, П7]	10,91	19,5	ВВГнг(А)-LS 5×4
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 24 из 36 (резерв 12). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	52 | =ЩСВ-К ЩСВ-К — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261013	61 / 86	R3	15.10.2026

ЩОВ-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.61) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** H5 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 3,2/3,2 кВт, **Iр** 5,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

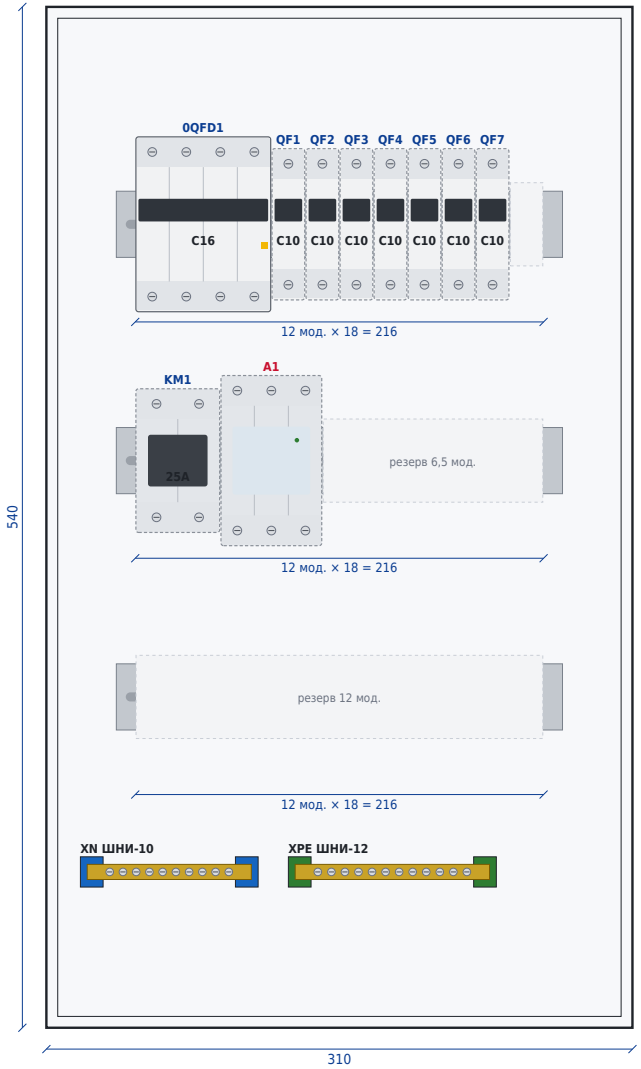

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QFD1	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	Ввод	H5 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1	Пом.№1.7,1.148 Обогрев труб К2 (18 метров) [XT19, XT20]	0,29	1,4	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2	Пом.№1.57,1.90,1.103 Обогрев труб К2 (27 метров) [XT21, XT22, XT23]	0,43	2,1	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3	Пом.№1.115,1.121,1.141 Обогрев труб К2 (18 метров) Обогрев воронок Вр-1,Вр-2 (14 метров)	0,51	2,4	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4	Пом.№1.166 Обогрев воронок Вр-19,Вр-20,Вр-21,Вр-22 (28 метров) Обогрев труб К2 (18 метров)	0,74	3,5	ВВГнг(A)-LS 3×4
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5	Пом.№1.31,1.32 Обогрев воронок Вр-27,Вр-28,Вр-29,Вр-30 (28 метров) Обогрев труб К2 (18 метров)	0,74	3,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.6	Пом.№2.67,2.69 Обогрев воронок Вр-23,Вр-24,Вр-25,Вр-26 (28 метров)	0,45	2,1	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.7	Цепи питания терморегулятора РТ330 [-]			
KM1	NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц	836851	Управл.				
A1	Терморегулятор РТ330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту)	PYS-004	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Управление: Ввод → 0QFD1 (3P+N 16 A 30 мА) → KM1 NXC-25 → шины → QF1–QF7; KM1 управляется терморегулятором A1 РТ330 (датчик TST05 — по месту, в поставку щита не входит).

Модули: занято 16,5 из 36 (резерв 19,5). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 12, 24 (лист вопросов).

ЩС-СС1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.62) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** C2 от ВРУ-А | **Ру/Рр:** 9,63/9,63 кВт, **Iр** 15,4 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

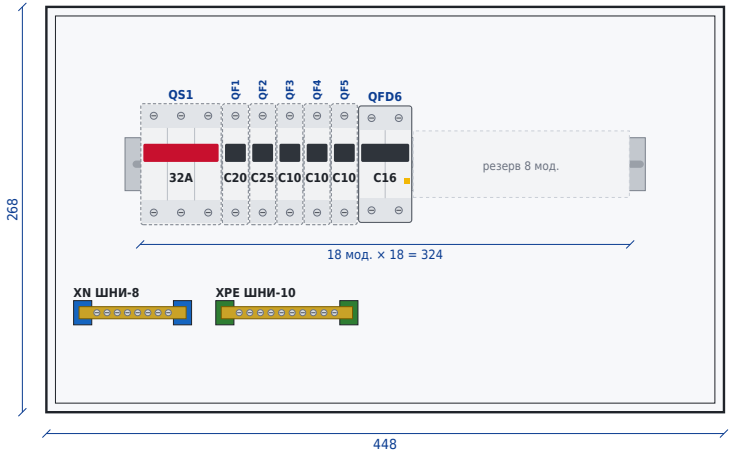

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	C2 от ВРУ-А			
QF1	NXB-63S 1P 20A 4.5kA x-ка C	296711	гр.1	Пом.№1.158 Шкаф СС2 [ШСС2]	3	14,4	ВВГнг(А)-LS 3×4
QF2	NXB-63S 1P 25A 4.5kA x-ка C	296712	гр.2	Пом.№1.158 Шкаф СС1 [ШСС1]	4,5	21,5	ВВГнг(А)-LS 3×6
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3	Пом.№1.158 Резервный источник питания СКУД [СКУД1]	0,85	4,1	ВВГнг(А)-LS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4	Пом.№1.77 Часовая станция [ЧС]	0,24	1,1	ВВГнг(А)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.5	Пом.№1.77 Резервный источник питания СКУД [СКУД2]	0,24	1,1	ВВГнг(А)-LS 3×1,5
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№1.77 Мониторы видеонаблюдения [ВН]	0,8	3,8	ВВГнг(А)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 10 из 18 (резерв 8). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ЩСВ-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.63) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** H7 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 30,8/21,5 кВт, **Ip** 33,4 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

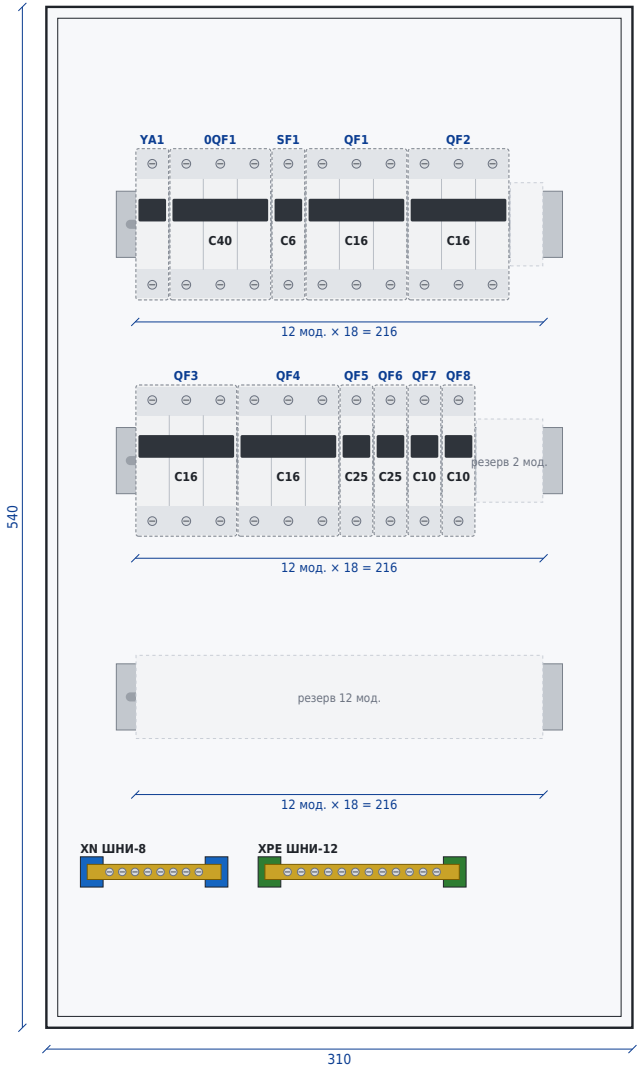

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QF1	NXB-63S 3P 40A 4.5kA x-ка C	296831	Ввод	H7 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	гр.1	Пом.№1.1 Тепловая завеса [У2]	6	9,3	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	гр.2	Пом.№1.1 Тепловая завеса [У1]	6	9,3	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	гр.3	Пом.№1.76 Тепловая завеса [У4]	6	9,3	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	гр.4	Пом.№1.76 Тепловая завеса [У3]	6	9,3	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 1P 25A 4.5kA x-ка C	296712	гр.5	Фасад Кондиционер K1 (наружный блок рабочий) Пом.№1.158 Кондиционер K1.1 (внутренний блок) [K1, K1.1]	3,32	19,9	ВВГнг(A)-LS 3×6
QF6	NXB-63S 1P 25A 4.5kA x-ка C	296712	гр.6	Фасад Кондиционер K2 (наружный блок резервный) Пом.№1.158 Кондиционер K2.1 (внутренний блок) [K2, K2.1]	3,32	19,9	ВВГнг(A)-LS 3×6
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.7	Пом.№1.25 Вытяжной вентилятор B31	0,06	0,4	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.8	Пом.№1.54 Вытяжной вентилятор B6	0,06	0,4	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.				
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C	296708	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 21 из 36 (резерв 15). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 11, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	55 | =ЩСВ-1 ЩСВ-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261013	64 / 86	R3	15.10.2026

ЩС-ПС1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.64) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** С4 от ВРУ-А | **Ру/Рр:** 3,22/3,22 кВт, **Iр** 7,5 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

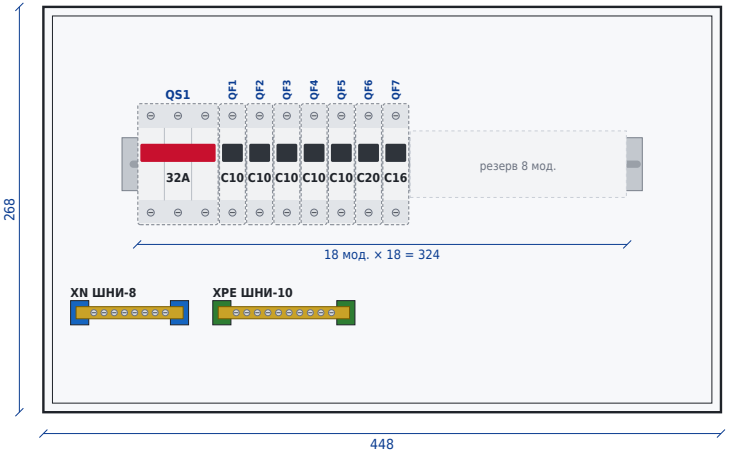

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	С4 от ВРУ-А			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.1	Пом.№1.7,1.157-1.160,1.166 Огнезадерживающий клапан [ОЗК]	0,04	0,3	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2	Пом.№1.16,1.25,1.31,1.32,1.111 Огнезадерживающий клапан [ОЗК]	0,03	0,2	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.3	Пом.№1.70,1.82,1.103 Огнезадерживающий клапан [ОЗК]	0,02	0,2	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4	Пом.№1.77 Резервный источник питания АПС	0,66	4,6	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.5	Пом.№1.158 Резервный источник питания АГПТ [АГПТ1]	0,12	0,8	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF6	NXB-63S 1P 20A 4.5kA x-ка C	296711	гр.6	Пом.№2.71 Щит ЩС-ПС2	0,34	2,4	ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5
QF7	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.7	Пом.№1.158 Резервный источник питания СОУЭ	2	14	ВВГнг(А)-FRLS 3×4

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 10 из 18 (резерв 8). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).

ЩС-СС2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.65) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** С3 от ВРУ-А | **Ру/Рр:** 11,8/11,8 кВт, **Iр** 18,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

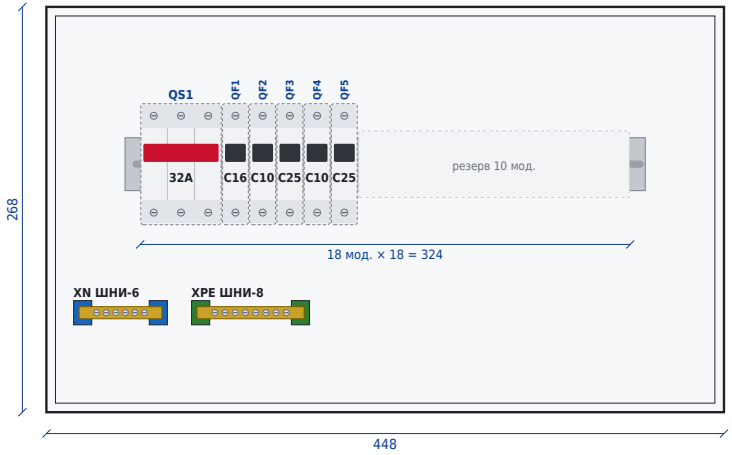

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	С3 от ВРУ-А			
QF1	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.1	Пом.№2.70 Шкаф СС5 [ШСС5]	2,5	12	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2	Пом.№2.84 Резервный источник питания СКУД [СКУД3]	0,65	3,1	ВВГнг(А)-LS 3×1,5
QF3	NXB-63S 1P 25A 4.5kA x-ка C	296712	гр.3	Пом.№2.84 Шкаф СС3 [ШСС3]	4	19,1	ВВГнг(А)-LS 3×6
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.4	Пом.№2.53 Резервный источник питания СКУД [СКУД4]	0,65	3,1	ВВГнг(А)-LS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 25A 4.5kA x-ка C	296712	гр.5	Пом.№2.53 Шкаф СС4 [ШСС4]	4	19,1	ВВГнг(А)-LS 3×10

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 8 из 18 (резерв 10). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	57 | =ЩС-СС2 ЩС-СС2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261013**	**66 / 86**	**R3**	**15.10.2026**

ЩС-ПС2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-12 IP31 (ЭОМ л.66) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-18 б/о (448×268×120)S/U 36 IP31 (TS), 268×448×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.6 от ЩС-ПС1 | **Ру/Рр:** 0,34/0,34 кВт, **Iр** 2,4 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5

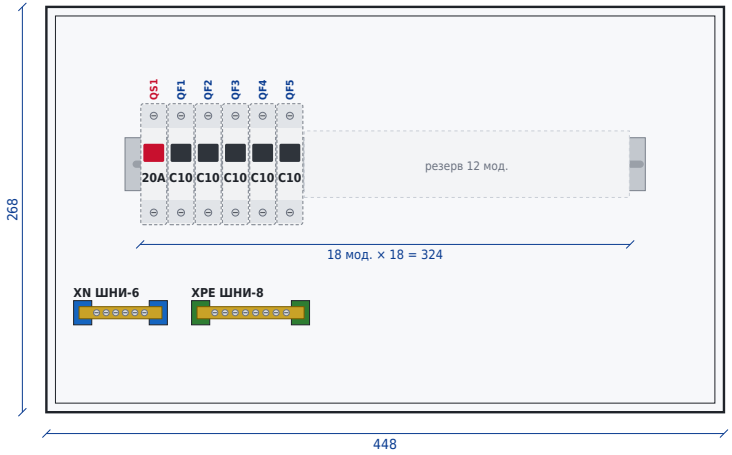

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 1P 20A	193166	Ввод	Гр.6 от ЩС-ПС1			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1	Пом.№2.9,2.76,2.79,2.84,2.85 Огнезадерживающий клапан [ОЗК]	0,03	0,2	ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2	Пом.№2.13,2.19,2.61,2.67,2.69,2.70,2.71 Огнезадерживающий клапан [ОЗК]	0,04	0,3	ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3	Пом.№2.23-2.25,2.43,2.52 Огнезадерживающий клапан [ОЗК]	0,03	0,2	ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4	Пом.№2.84 Резервный источник питания АГПТ [АГПТ3]	0,12	0,8	ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5	Пом.№2.53 Резервный источник питания АГПТ [АГПТ4]	0,12	0,8	ВВГнг(A)-FRLS 3×1,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15007	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ


Модули: занято 6 из 18 (резерв 12). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).
Вопросы по щиту: № 4, 6, 24 (лист вопросов).

ЩОВ-2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: NXW4-36 IP31 (ЭОМ л.67) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** H5 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 2,2/2,2 кВт, **Ip** 3,6 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

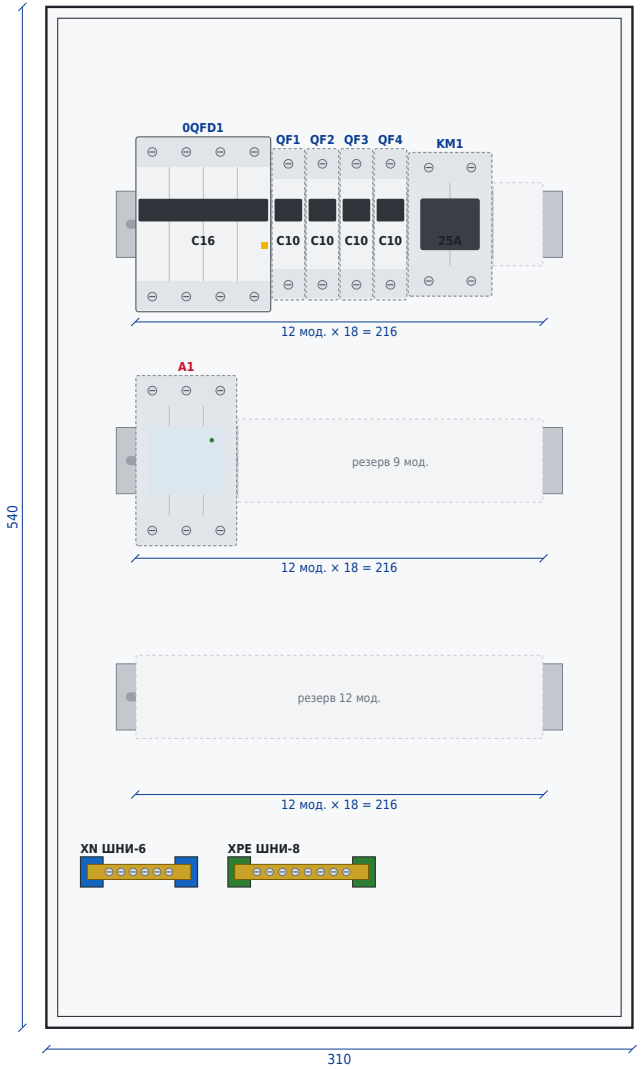

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
0QFD1	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	Ввод	H5 от ВРУшк			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1	Пом №3. . 4 Обогрев воронок Вр -5, Вр-6, Вр-7, Вр-8, Вр-15, Вр-16, Вр-31, ВР-32 56 (метров)	0,9	4,3	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2	Пом №3. . 20, 3. 24 Обогрев воронок Вр -9, Вр-10, Вр-11, Вр-12, Вр-33, Вр-34 42 (метра)	0,67	3,2	ВВГнг(A)-LS 3×1,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3	Пом.№3.24,3.40 Обогрев воронок Вр-3,Вр-4,Вр-13,Вр-14,Вр-17,Вр-18 (42 метра)	0,67	3,2	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4	Цепи питания терморегулятора РТ330 [-]			
KM1	NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц	836851	Управл.				
A1	Терморегулятор РТ330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту)	PYS-004	Управл.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Управление: Ввод → 0QFD1 (3P+N 16 A 30 мА) → KM1 NXC-25 → шины → QF1–QF4; KM1 управляется терморегулятором A1 РТ330 (датчик TST05 — по месту, в поставку щита не входит).

Модули: занято 13,5 из 36 (резерв 22,5). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 12, 24 (лист вопросов).

ЩС-ПС3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: NXW4-24 IP31 (ЭОМ л.68) | **Корпус:** Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK), 540×310×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** С5 от ВРУ-А | **Ру/Рр:** 29,1/29,1 кВт, **Iр** 50,2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4

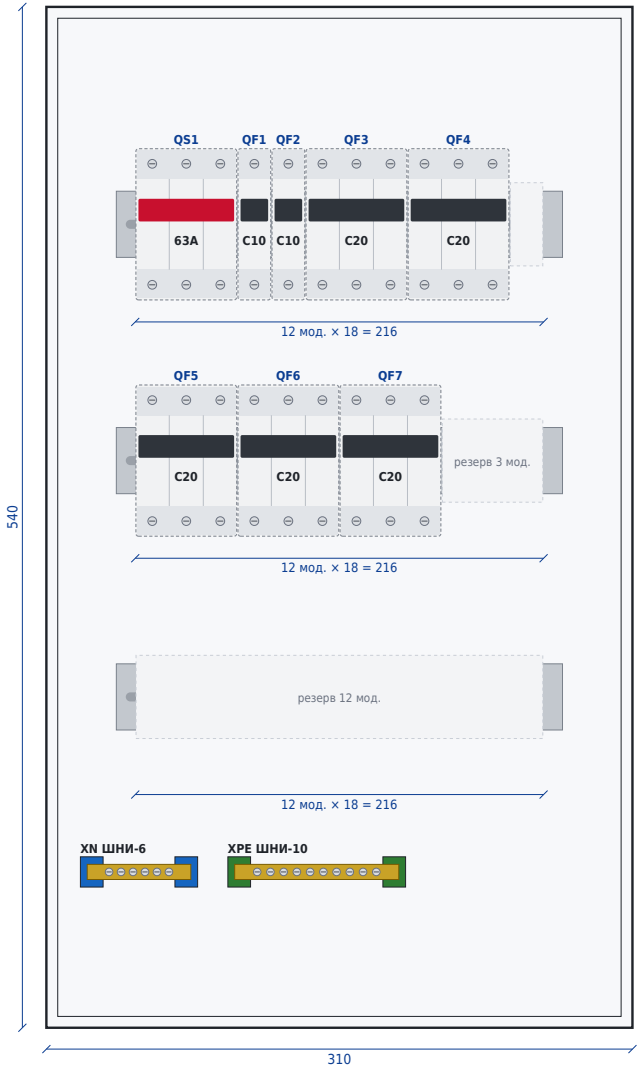

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 63A	193183	Ввод	С5 от ВРУ-А			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.1	Пом.№3.4,3.14,3.58,3.63,3.66 Огнезадерживающий клапан [ОЗК]	0,02	0,2	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.2	Пом.№3.24,3.40,3.41,3.47,3.50 Огнезадерживающий клапан [ОЗК]	0,02	0,2	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5
QF3	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.3	Кровля Вентилятор подпора воздуха ДП1 Кровля Электрокалорифер для системы ДП1 [ДП1, ДП1.1]	6	6,1	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.4	Кровля Вентилятор для системы ДП1 Кровля Вентилятор подпора воздуха ДП2 Кровля Электрокалорифер для системы ДП2 [ДП1.2, ДП2, ДП2.1]	5,31	4,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.5	Кровля Вентилятор для системы ДП2 Кровля Вентилятор дымоудаления ДВ1 [ДП2.2, ДВ1]	7,61	13,4	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.6	Кровля Вентилятор дымоудаления ДВ2	4	8,1	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF7	NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828	гр.7	Кровля Вентилятор подпора воздуха ДП3	3	6,1	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) (TEKSAN F)	714-09056	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 20 из 36 (резерв 16). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	60 | =ЩС-ПС3 ЩС-ПС3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261013	69 / 86	R3	15.10.2026

ВРУшк — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: ВРУ-Б-(250+250 (ЭОМ л.2) | **Корпус:** Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS), 3 секции × 2000×800×600 мм, IP31, напольный


СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:40

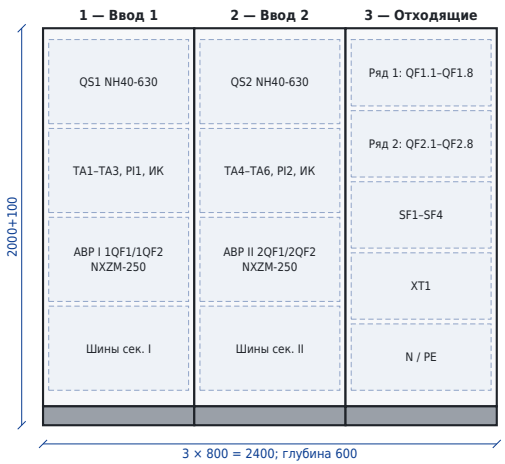

ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:40

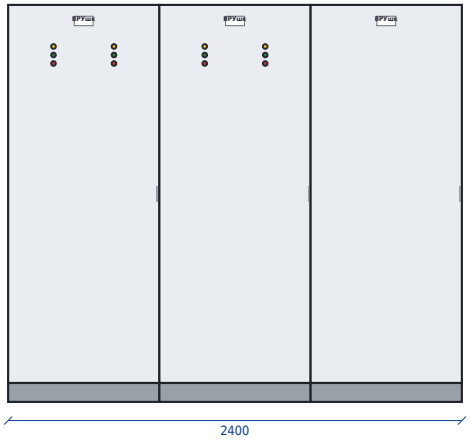

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:5

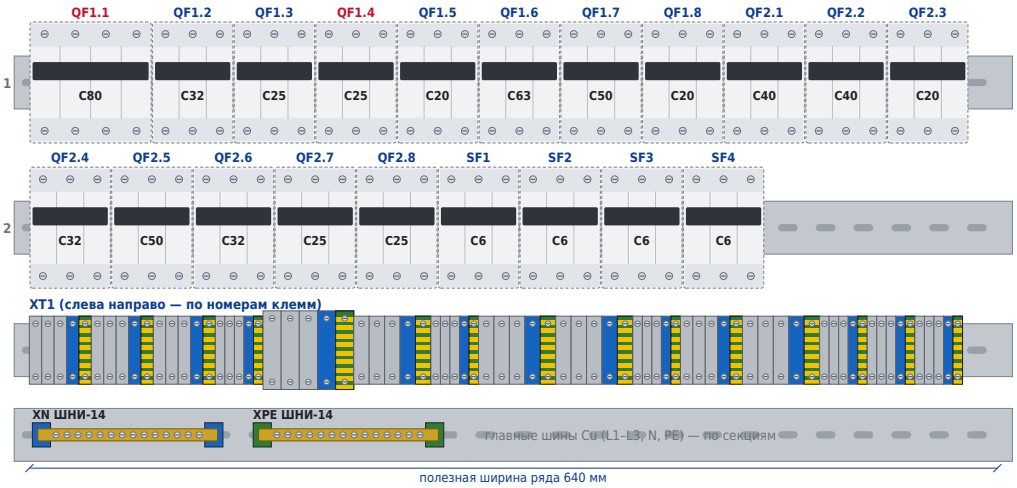

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QS1, QS2	Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления — 2 шт	393267	Ввод					
1QF1/1QF2, 2QF1/2QF2	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A — 2 шт	256796	Ввод					
PI1, PI2	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-23 0-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.) — 2 шт	PYS-001	Учёт					
TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK — 6 шт	270300101	Учёт					
QF1.1	NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C	816139	H1	ПР-Тх1.1, ПР-Тх2.1, ПР-Тх3.1 (технологическое оборудование)	22,4	35,8	АВВГнг(А)-LS 5×35	к аппарату
QF1.2	NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C	813874	H2	ПР-К1.1, ПР-К2.1, ПР-К3.1 (компьютерное оборудование)	14,2	22,7	ВВГнг(А)-LS 5×6	XT1:1–5
QF1.3	NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C	813873	H3	ЩО-1.1, ЩО-2.1, ЩО-3.1 (рабочее освещение)	13,4	21,5	ВВГнг(А)-LS 5×6	XT1:6–10
QF1.4	NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C	813873	H4	ЩСН (сантехническое оборудование)	9,6	18,2	ВВГнг(А)-LS 5×6	XT1:11–15
QF1.5	NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C	179870	H5	ЩОВ-1, ЩОВ-2 (обогрев труб и воронок)	5,4	8,6	ВВГнг(А)-LS 5×4	XT1:16–20
QF1.6	NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C	813877	H6	ЩСВ-0 (вентиляционное оборудование)	28,7	51,3	ВВГнг(А)-LS 5×16	XT1:21–25

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	61 | =ВРУшк	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ВРУшк — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	70 / 86	R3	15.10.2026

ВРУшк — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QF1.7	NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C	813876	H7	ЩСВ-1 (вентиляционное оборудование)	21,5	33,3	ВВГнг(A)-LS 5×10	XT1:26–30
QF1.8	NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C	179870	H8	ШУ-ИТП (тепловой пункт, см. ОВ)	1,76	3,3	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:31–35
QF2.1	NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C	813875	H11	ПР-Тх1.3, ПР-Тх2.3, ПР-Тх3.3 (технологическое оборудование)	14,7	23,5	ВВГнг(A)-LS 5×10	XT1:36–40
QF2.2	NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C	813875	H12	ПР-К1.3, ПР-К2.3, ПР-К3.3 (компьютерное оборудование)	18,3	29,3	ВВГнг(A)-LS 5×10	XT1:41–45
QF2.3	NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C	179870	H13	ЯУО (фасадное освещение, см. ЭОФ)	1,64	2,6	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:46–50
QF2.4	NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C	813874	H14	ЩО-1.3, ЩО-2.3, ЩО-3.3 (рабочее освещение)	19,2	30,7	ВВГнг(A)-LS 5×6	XT1:51–55
QF2.5	NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C	813876	H15	ПР-Тх1.2, ПР-Тх2.2, ПР-Тх3.2 (технологическое оборудование)	25,2	40,3	ВВГнг(A)-LS 5×10	XT1:56–60
QF2.6	NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C	813874	H16	ПР-К1.2, ПР-К2.2, ПР-К3.2 (компьютерное оборудование)	14,3	22,9	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:61–65
QF2.7	NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C	813873	H17	ЩО-1.2, ЩО-2.2, ЩО-3.2, ЩО-0 (рабочее освещение)	12,7		ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:66–70
QF2.8	NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C	813873	H18	ЩСВ-3 (вентиляционное оборудование)	5,1		ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:71–75
SF1–SF4	NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C — 4 шт	296825	Управл.					
HL1, HL4, HL7, HL10	ND16-22D/2 желтый AC/DC230B — 4 шт	593076	Дверь	L1 ввод 1; L1 ввод 2; L1 ввод 3; L1 ввод 4				
HL2, HL5, HL8, HL11	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B — 4 шт	593077	Дверь	L2 ввод 1; L2 ввод 2; L2 ввод 3; L2 ввод 4				
HL3, HL6, HL9, HL12	ND16-22D/2 красный AC/DC230B — 4 шт	593075	Дверь	L3 ввод 1; L3 ввод 2; L3 ввод 3; L3 ввод 4				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) (TEKSAN F)	719-15923	3 шт
Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman	200100060	2 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

XT1 по кабелям проекта (L, N, PE на каждую линию): ЗНИ 6 — 12 шт; ЗНИ син. 6 — 4 шт; ЗНИ-РЕ 6 — 4 шт; ЗНИ 4 — 18 шт; ЗНИ син. 4 — 6 шт; ЗНИ-РЕ 4 — 6 шт; ЗНИ 16 — 3 шт; ЗНИ син. 16 — 1 шт; ЗНИ-РЕ 16 — 1 шт; ЗНИ 10 — 12 шт; ЗНИ син. 10 — 4 шт; ЗНИ-РЕ 10 — 4 шт. В BOM клемм нет — добавляются.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 3, 4, 7, 9, 14, 18, 23, 24 (лист вопросов).

ВРУ-А — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Проект: ВРУ-Б-125-03-19 (ЭОМ л.2) | **Корпус:** Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS), 2 секции × 2000×800×600 мм, IP31, напольный


СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:40

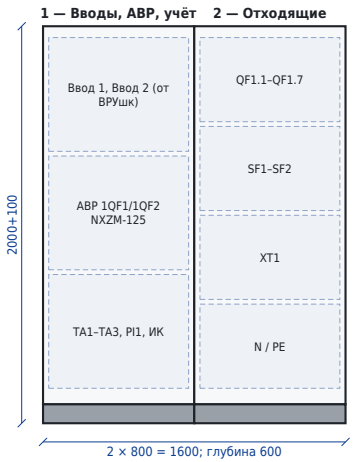

ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:40

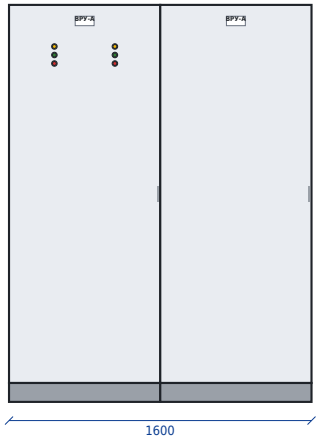

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4

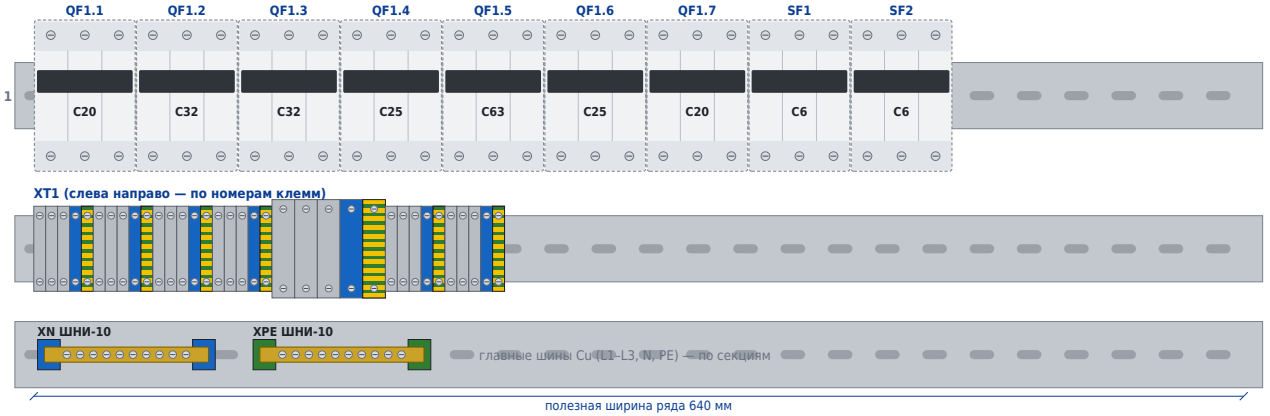

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
1QF1/1QF2, (2-я NXZM)	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A — 2 шт	256780	Ввод					
PI1	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-23 0-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	PYS-001	Учёт					
TA1, TA2, TA3	Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!! — 3 шт	ст-9951729	Учёт					
QF1.1	NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C	179870	C1	ЩАО-0, ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3 (аварийное освещение)	6,6	10,5	ВВГнг(А)-FRLS 5×4	XT1:1–5
QF1.2	NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C	813874	C2	ЩС-СС1 (слаботочные системы)	9,63	15,4	ВВГнг(А)-FRLS 5×4	XT1:6–10
QF1.3	NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C	813874	C3	ЩС-СС2 (слаботочные системы)	11,8	18,9	ВВГнг(А)-FRLS 5×4	XT1:11–15
QF1.4	NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C	813873	C4	ЩС-ПС1 (противопожарное оборудование)	3,22	7,5	ВВГнг(А)-FRLS 5×4	XT1:16–20
QF1.5	NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C	813877	C5	ЩС-ПС3 (противопожарное оборудование)	29,1	52	ВВГнг(А)-FRLS 5×16	XT1:21–25
QF1.6	NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C	813873	C6	ШУ-Л (лифт, см. АР)	7	16,4	ВВГнг(А)-FRLS 5×4	XT1:26–30
QF1.7	NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C	179870	C7	ЩС-НП (противопожарные насосы, см. ВК)	5,7	10,2	ВВГнг(А)-FRLS 5×4	XT1:31–35
SF1, SF2	NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C — 2 шт	296825	Управл.					
HL1, HL4	ND16-22D/2 желтый AC/DC230В — 2 шт	593076	Дверь	L1 ввод 1; L1 ввод 2				

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	62 | =ВРУ-А ВРУ-А — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261013	72 / 86	R3	15.10.2026

ВРУ-А — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R3 | 15.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
HL2, HL5	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B — 2 шт	593077	Дверь	L2 ввод 1; L2 ввод 2				
HL3, HL6	ND16-22D/2 красный AC/DC230B — 2 шт	593075	Дверь	L3 ввод 1; L3 ввод 2				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) (TEKSAN F)	719-15923	2 шт
Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman	200100060	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

XT1 по кабелям проекта (L, N, PE на каждую линию): ЗНИ 4 — 18 шт; ЗНИ син. 4 — 6 шт; ЗНИ-PE 4 — 6 шт; ЗНИ 16 — 3 шт; ЗНИ син. 16 — 1 шт; ЗНИ-PE 16 — 1 шт. В BOM клемм нет — добавляются.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 2, 4, 14, 19, 23, 24, 26, 28 (лист вопросов).

ВРУст — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00 (ЭОМ л.3) | **Корпус:** Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База, 2 секции × 1700×800×450 мм, IP31, напольный


СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:25

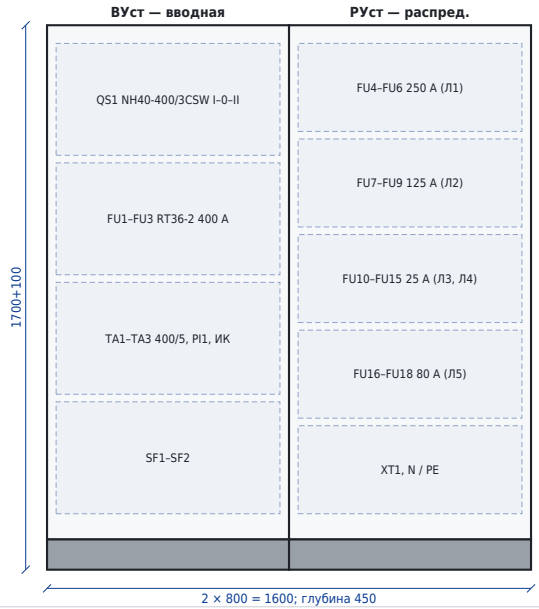

ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:25

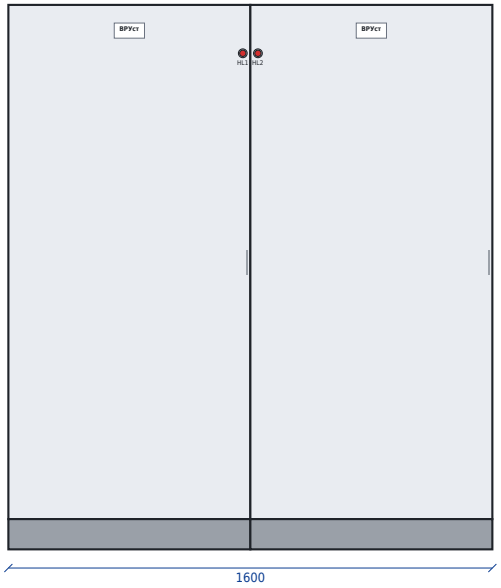

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:5

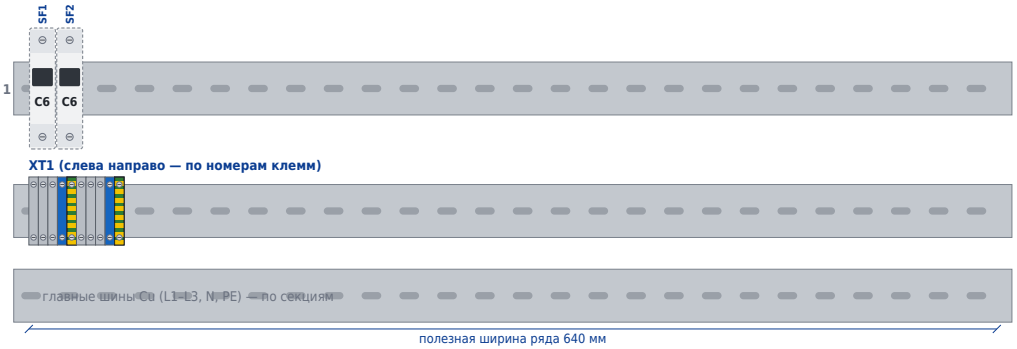

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QS1	Перекидной рубильник NH40-400/3CSW, 3P, 400A, 3 положения I-0-II , выносная рукоятка управления	393393	Ввод					
PI1	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-23 0-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	PYS-001	Учёт					
TA1–TA3	Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK — 3 шт	270300025	Учёт					
FU1–FU3	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400A — 3 шт	521218	Ввод					
FU4–FU6	Предохр. RT36 250 A ×3 (держатель RT36)		Л1	ПР-Кх1 (технологическое оборудование)	127,8	198,1	2×АВВГнг(A)-LS 5×95	к аппарату
FU7–FU9	Предохр. RT36 125 A ×3 (держатель RT36)		Л2	ПР-Кх2 (холодильное оборудование)	68,9	111,4	АВВГнг(A)-LS 5×95	к аппарату
FU10–FU12	Предохр. RT36 25 A ×3 (держатель RT36)		Л3	ПР-Х (холодильное оборудование)	6	12,8	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:1–5
FU13–FU15	Предохр. RT36 25 A ×3 (держатель RT36)		Л4	ЩО-Кх (рабочее освещение)	2,1	3,4	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:6–10
FU16–FU18	Предохр. RT36 80 A ×3 (держатель RT36)		Л5	ЩСВ-К (вентиляционное оборудование)	37	66,1	АВВГнг(A)-LS 5×50	к аппарату
SF1, SF2	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C — 2 шт	296708	Управл.					
HL1, HL2	ND16-22D/2 красный AC/DC230B — 2 шт	593075	Дверь	Ввод 1; Ввод 2				

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	63 | =ВРУст	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ВРУст — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	74 / 86	R3	15.10.2026

ВРУст — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База (TEKSAN F)	719-15043	2 шт
Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	521368	3 шт
Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman	200100060	1 шт
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	521367	3 шт
Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A	521366	3 шт
Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	521260	9 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

XT1 по кабелям проекта (L, N, PE на каждую линию): ЗНИ 4 — 6 шт; ЗНИ син. 4 — 2 шт; ЗНИ-PE 4 — 2 шт. В BOM клемм нет — добавляются.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 10, 14, 20, 23, 24 (лист вопросов).

ПР-Kx1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: ЩМП-6-0 IP31 (ЭОМ л.4) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS), 1200×750×300 мм, IP31, навесной | **Питание:** Л1 от ВРУст | **Ру/Рр:** 236,6/127,8 кВт, **Ip** 198,1 А

ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:15

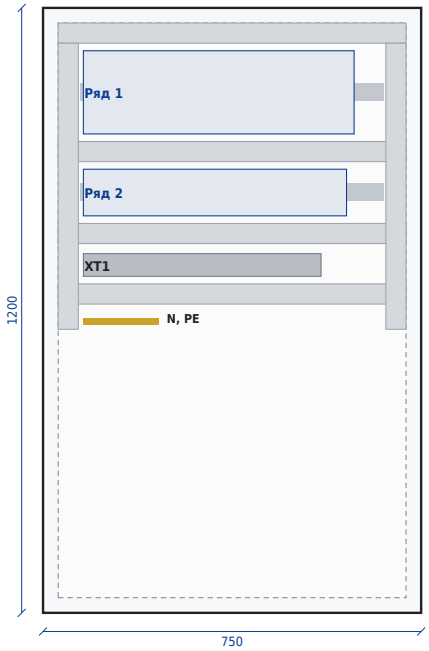

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:5

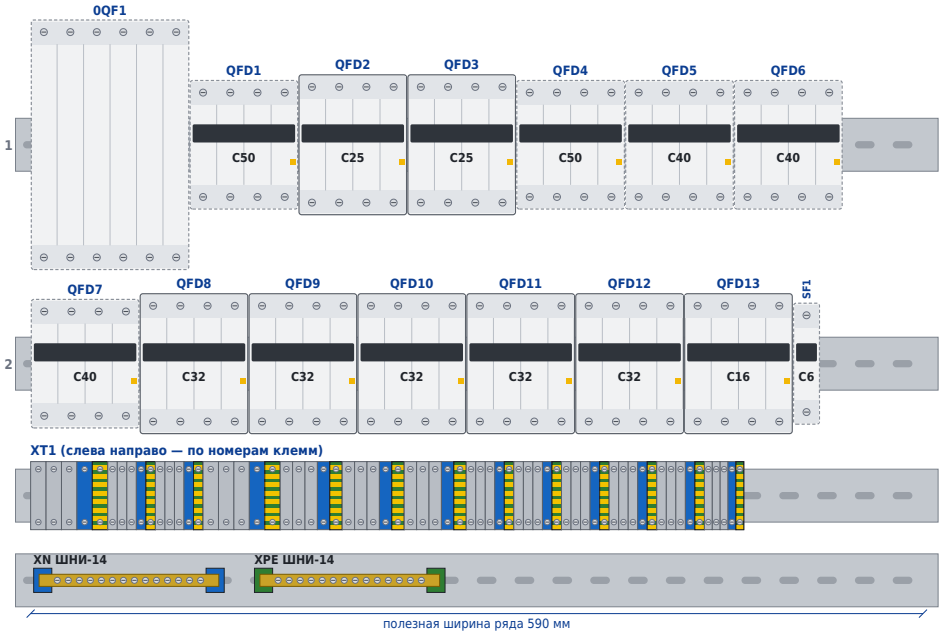

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
0QF1	NXM-250S/3P 225A 36кА	131368	Ввод	Л1 от ВРУст				
QFD1	NXBLE-63 4P C50 100mA тип AC 6kA	982189	гр.1	Пом.№1.118 Плита электрическая 6 конфорочная EHB199H [10]	28,8	44,7	ВВГнг(A)-LS 5×10	XT1:1–5
QFD2	NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA	539860	гр.2	Пом.№1.118 Сковорода электрическая ZH-TS80 [9]	12	18,6	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:6–10
QFD3	NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA	539860	гр.3	Пом.№1.118 Сковорода электрическая ZH-TS80 [9]	12	18,6	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:11–15
QFD4	NXBLE-63 4P C50 100mA тип AC 6kA	982189	гр.4	Пом.№1.118 Плита электрическая 6 конфорочная EHB199H [10]	28,8	44,7	ВВГнг(A)-LS 5×10	XT1:16–20
QFD5	NXBLE-63 4P C40 100mA тип AC 6kA	982188	гр.5	Пом.№1.118 Пищеварочный котел GKB899HI150	24	37,2	ВВГнг(A)-LS 5×6	XT1:21–25
QFD6	NXBLE-63 4P C40 100mA тип AC 6kA	982188	гр.6	Пом.№1.118 Пищеварочный котел GKB899HI150	24	37,2	ВВГнг(A)-LS 5×6	XT1:26–30
QFD7	NXBLE-63 4P C40 100mA тип AC 6kA	982188	гр.7	Пом.№1.118 Пищеварочный котел GKB899HI150	24	37,2	ВВГнг(A)-LS 5×6	XT1:31–35
QFD8	NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA	539866	гр.8	Пом.№1.118 Печь пароконвекционная MKF 1111 BM/0/85 [26]	15,4	23,9	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:36–40
QFD9	NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA	539866	гр.9	Пом.№1.118 Печь пароконвекционная MKF 1111 BM/0/85 [26]	15,4	23,9	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:41–45
QFD10	NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA	539866	гр.10	Пом.№1.118 Печь пароконвекционная MKF 1111 BM/0/85 [26]	15,4	23,9	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:46–50
QFD11	NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA	539866	гр.11	Пом.№1.126 Печь конвекционная MKF 1064 BM/0/85 [25]	15,4	23,9	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:51–55

ПР-Kx1 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QFD12	NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA	539866	гр.12	Пом.№1.126 Печь конвекционная MKF 1064 BM/0/85 [25]	15,4	23,9	ВВГнг(A)-LS 5×4	XT1:56–60
QFD13	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.13	Пом.№1.118 Кипятильник проточный HWB-60L [20]	6	9,3	ВВГнг(A)-LS 5×2,5	XT1:61–65
YA1	Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый)	946972	Управл.					
SF1	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708	Управл.					

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15115	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

XT1 по кабелям проекта (L, N, PE на каждую линию): ЗНИ 10 — 6 шт; ЗНИ син. 10 — 2 шт; ЗНИ-PE 10 — 2 шт; ЗНИ 4 — 21 шт; ЗНИ син. 4 — 7 шт; ЗНИ-PE 4 — 7 шт; ЗНИ 6 — 9 шт; ЗНИ син. 6 — 3 шт; ЗНИ-PE 6 — 3 шт; ЗНИ 2,5 — 3 шт; ЗНИ син. 2,5 — 1 шт; ЗНИ-PE 2,5 — 1 шт. В BOM клемм нет — добавляются.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 11, 15, 23, 24 (лист вопросов).

ПР-Kx2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: ЩМП-5-0 IP31 (ЭОМ л.5) | **Корпус:** Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31, 1000×650×300 мм, IP31, навесной | **Питание:** Л2 от ВРУст | **Ру/Рр:** 102,8/68,9 кВт, **Iр** 111,3 А

ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:15

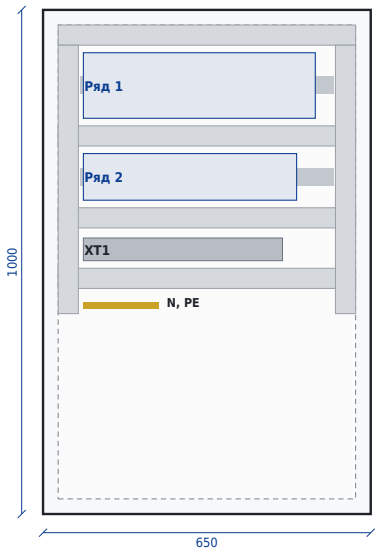

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:5

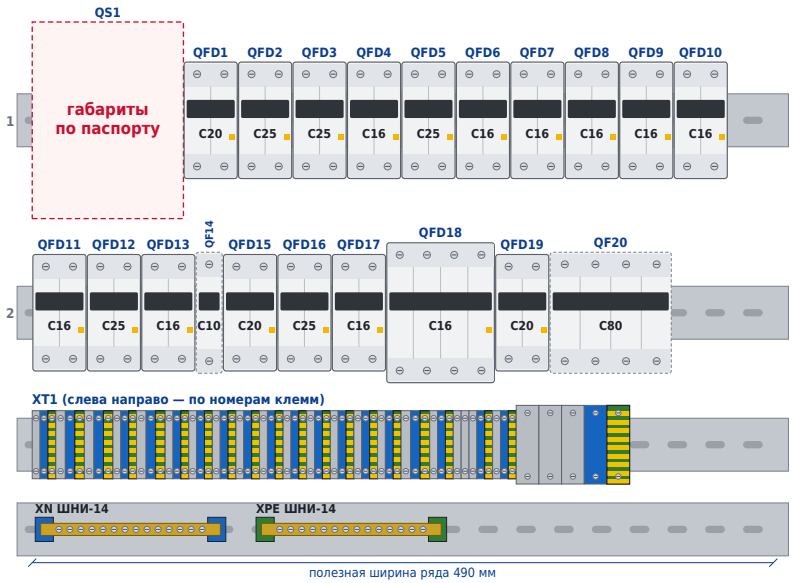

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QS1	Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3P, 125A, стандартная рукоятка управления	393261	Ввод	Л2 от ВРУст				
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA	515388	гр.1	Пом.№1.116 Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ [50]	3,25	15,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	XT1:1–3
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.2	Пом.№1.116 Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ [52]	4	19,1	ВВГнг(А)-LS 3×4	XT1:4–6
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.3	Пом.№1.116 Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 [86]	5	23,9	ВВГнг(А)-LS 3×4	XT1:7–9
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.4	Пом.№1.116 Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-03 [51]	0,32	1,5	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	XT1:10–12
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.5	Пом.№1.116 Тепловая тележка электрическая HW-11-21 [19]	5	23,9	ВВГнг(А)-LS 3×4	XT1:13–15
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A [33]	3	14,4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	XT1:16–18
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A [33]	3	14,4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	XT1:19–21
QFD8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A [33]	3	14,4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	XT1:22–24
QFD9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A [33]	3	14,4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	XT1:25–27
QFD10	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.10	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A [33]	3	14,4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	XT1:28–30
QFD11	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.11	Пом.№1.116 Микроволновая печь HKN-WP900	2,8	13,4	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	XT1:31–33
QFD12	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.12	Пом.№1.114,1.115 Уборочный механизм [Ум]	4	24,2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	XT1:34–36

ПР-Kx2 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QFD13	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.13	Пом.№1.118 Стерилизатор для ножей CTH-18, Миксер ручной Robot Coupe MP 350 Combi Ultra, Весы SW-10 [14, 29, 30]	1,15	8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:37–39
QF14	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.14	Пом.№1.118,1.120,1.125-1.127,1.144,1.145 Облучатель бактерицидный ОБН-150 [49]	0,7	3,3	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:40–42
QFD15	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA	515388	гр.15	Пом.№1.127 Стерилизатор для ножей CTH-18, Пила для мяса HLS-1650A, Весы SW-10, Мясорубка TC-32 [14, 18, 30,31]	2,75	17,9	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:43–45
QFD16	NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA	515395	гр.16	Пом.№1.127 Шкаф расстоечный MKL 1064 S [28]	4,8	23	ВВГнг(A)-LS 3×4	XT1:46–48
QFD17	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.17	Пом.№1.120,1.126,1.130,1.131 Весы напольные DL-200, Весы SW-10, Хлеборезка TR31A, Компьютер [8, 30, 32,47]	1,52	10,6	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:49–51
QFD18	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.18	Пом.№1.126 Тестомес спиральный XR50-2s [34]	1,98	4	ВВГнг(A)-LS 5×2,5	XT1:52–56
QFD19	NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA	515388	гр.19	Пом.№1.144,1.145 Овощерезка HLC-300, Стерилизатор CTH-18, Слайсер HBS-250A, Весы SW-10, Картофелечисткая HLP-20 [4, 14,15, 17,30]	2,5	17,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:57–59
QF20	NXB-125 3P 80A 10кA х-ка C	816139	гр.20	Пом.№1.146 Посудомоечная машина EMP.3000 [13]	48	74,4	ВВГнг(A)-LS 5×25	XT1:60–64

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 (TEKSAN F)	719-15445	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

XT1 по кабелям проекта (L, N, PE на каждую линию): ЗНИ 2,5 — 17 шт; ЗНИ син. 2,5 — 15 шт; ЗНИ-PE 2,5 — 15 шт; ЗНИ 4 — 4 шт; ЗНИ син. 4 — 4 шт; ЗНИ-PE 4 — 4 шт; ЗНИ 35 — 3 шт; ЗНИ син. 35 — 1 шт; ЗНИ-PE 35 — 1 шт. В BOM клемм нет — добавляются.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 23, 24 (лист вопросов).

ЩУО — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: ЩМП-6-0 IP31 (ЭОМ л.46) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS), 1200×750×300 мм, IP31, навесной


ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:20

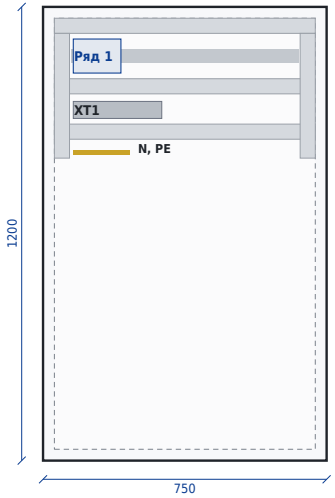

ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:20

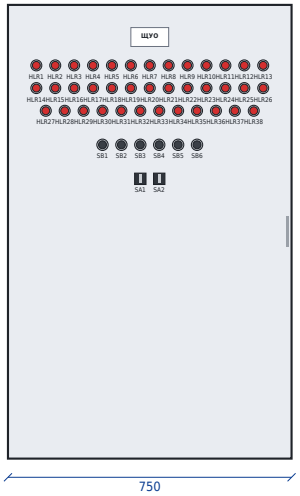

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4

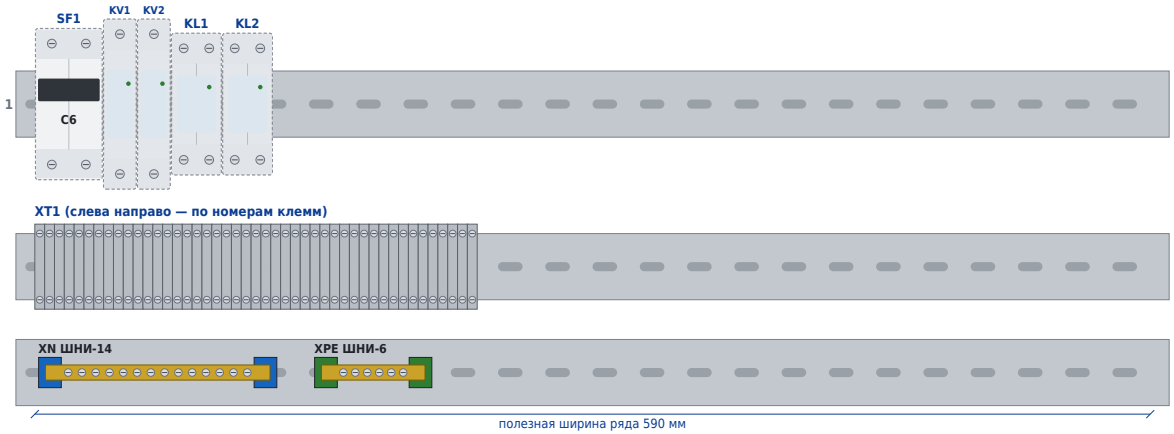

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
SF1	NXB-63S 2P 6A 4.5kA х-ка C	296786	Ввод					
KV1, KV2	Реле контроля фаз РК-101 380В тип 02 DEKraft 23301DEK E-PRO — 2 шт	23301DEK	Управл.					
KL1, KL2	Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 230В АС ПР-102 Dekraft — 2 шт	23883DEK	Управл.					
SA1, SA2	Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40 — 2 шт	574847	Дверь					
SB1–SB6	Выключатель кнопочный с фиксацией ВК-22 1НО+1НЗ 22мм 220В — 6 шт	PYS-002	Дверь					
HLR1–HLR38	ND16-22D/2 красный AC/DC230В — 38 шт	593075	Дверь					

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) (TEKSAN F)	714-15115	1 шт
Разъем на DIN для ПР-102 4к. (3-5)А Dekraft	23953DEK	2 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Управление: Щит управления освещением: SF1 → KV1/KV2 (контроль фаз вводов), KL1/KL2, SA1–SA2, SB1–SB6 → катушки КМ в ЩО-1.x/2.x/3.x и ЩАО-1…3; HLR1–HLR38 — сигнализация включения групп. Клеммник XT1:1–45 (ЗНИ 2,5) — внешние цепи управления по ЭОМ л.46.

Клеммник XT1 (ВОМ): ЗНИ 2,5 серый — 45 шт — цепи управления по ЭОМ.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 4, 21, 23, 24 (лист вопросов).


Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	66 | =ЩУО ЩУО — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261013	80 / 86	R3	15.10.2026

ЩСВ-К1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: ЩМП-3-0 IP31 (ЭОМ л.60) | **Корпус:** Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31, 800×650×250 мм, IP31, навесной | **Питание:** Гр.3 от ЩСВ-К | **Ру/Рр:** 6,35/4,8 кВт, **Ip** 9 А


ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:10

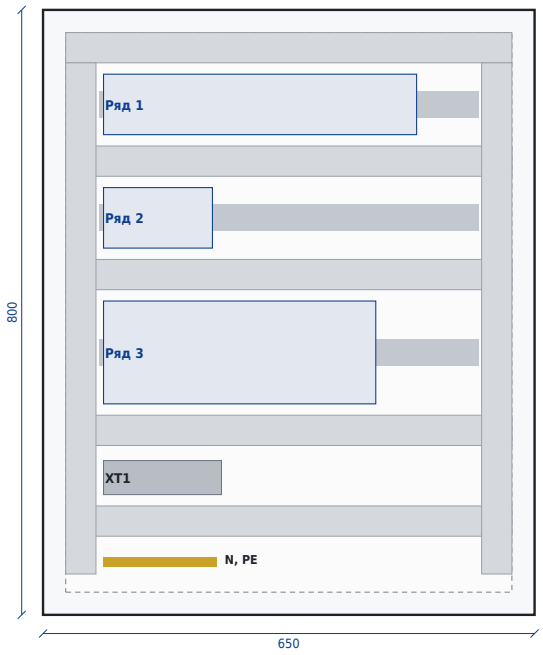

ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:15

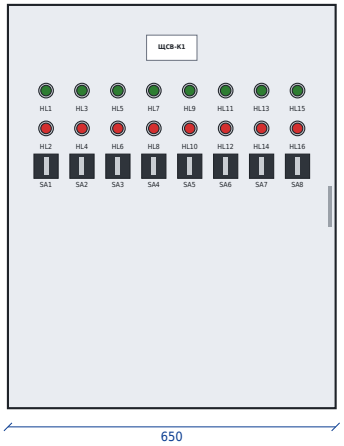

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:5

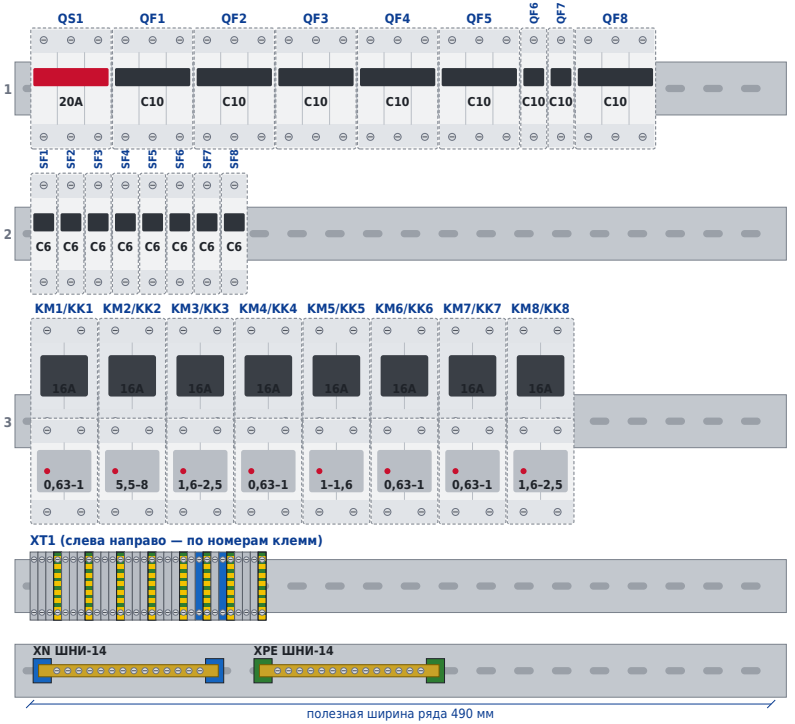

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	Гр.3 от ЩСВ-К				
QF1 + KM1, KK1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.1	Кровля Вентилятор B12	0,37	0,9	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:1–4
QF2 + KM2, KK2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.2	Кровля Вентилятор B10	3	6,1	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:5–8
QF3 + KM3, KK3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.3	Кровля Вентилятор B28	0,75	1,8	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:9–12
QF4 + KM4, KK4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.4	Кровля Вентилятор B27	0,37	0,9	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:13–16
QF5 + KM5, KK5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.5	Кровля Вентилятор B11	0,55	1,3	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:17–20

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	67 | =ЩСВ-К1	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ЩСВ-К1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	81 / 86	R3	15.10.2026

ЩСВ-К1 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QF6 + KM6, KK6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.6	Пом.№1.142 Вентилятор B21	0,11	0,7	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:21–23
QF7 + KM7, KK7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.7	Пом.№1.137 Вентилятор B14	0,11	0,7	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:24–26
QF8 + KM8, KK8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.8	Кровля Вентилятор B4	1,1	2,2	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:27–30
SF1–SF8	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C — 8 шт	296708	Управл.					
SA1–SA8	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1" — 8 шт	425058	Дверь	B12 0–1; B10 0–1; B28 0–1; B27 0–1; B11 0–1; B21 0–1; B14 0–1; B4 0–1				
HL1, HL3, HL5, HL7, HL9, HL11, HL13, HL15	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B — 8 шт	593077	Дверь	B12 работа; B10 работа; B28 работа; B27 работа; B11 работа; B21 работа; B14 работа; B4 работа				
HL2, HL4, HL6, HL8, HL10, HL12, HL14, HL16	ND16-22D/2 красный AC/DC230B — 8 шт	593075	Дверь	B12 авария; B10 авария; B28 авария; B27 авария; B11 авария; B21 авария; B14 авария; B4 авария				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 (TEKSAN F)	719-15440	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

XT1 по кабелям проекта (L, N, PE на каждую линию): ЗНИ 2,5 — 20 шт; ЗНИ-PE 2,5 — 8 шт; ЗНИ син. 2,5 — 2 шт. В BOM: ЗНИ 2,5 серый — 66 шт; ЗНИ-4PEN (PE) — 18 шт; остальные — цепи управления/резерв.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 8, 23, 24 (лист вопросов).

ЩСВ-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: ЩМП-3-0 IP31 (ЭОМ л.69) | **Корпус:** Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31, 1000×650×300 мм, IP31, навесной | **Питание:** H18 от ВРУшк | **Ру/Рр:** 7,8/5,1 кВт, **Iр** 9,8 А


ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:15

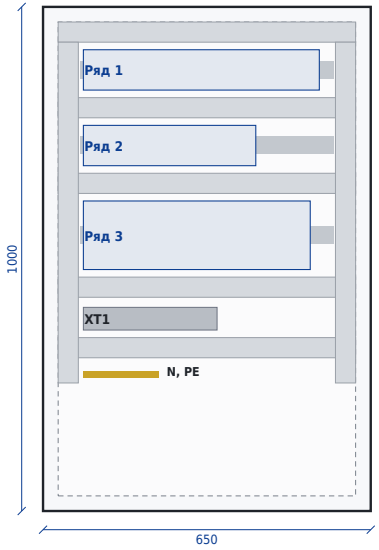

ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:15

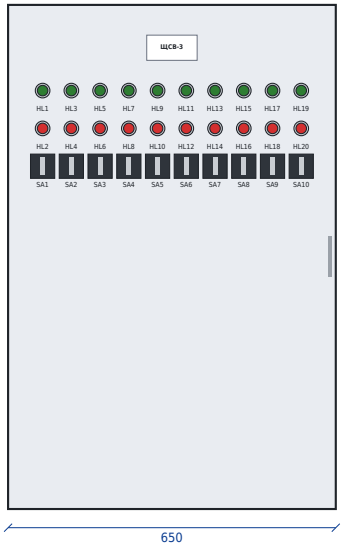

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:5

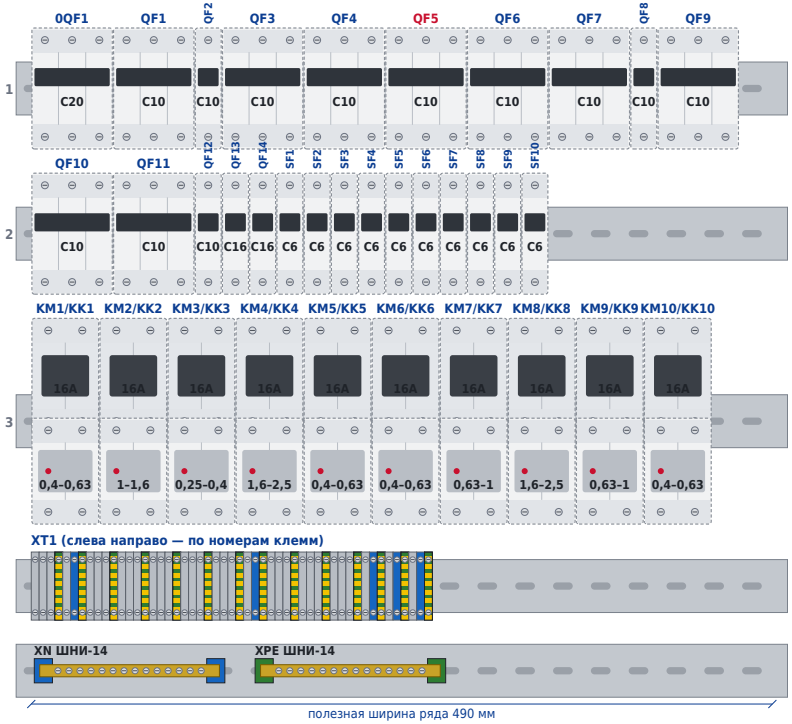

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
0QF1	NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C	296828	Ввод	H18 от ВРУшк				
QF1 + KM1, KK1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка C	296826	гр.1	Кровля Вентилятор B20	0,18	0,4	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:1–4
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C	296709	гр.2	Пом.№3.57 Вентилятор B3	0,08	0,5	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:5–7
QF3 + KM2, KK2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка C	296826	гр.3	Кровля Вентилятор B2	0,55	1,3	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:8–11
QF4 + KM3, KK3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка C	296826	гр.4	Кровля Вентилятор B19	0,12	0,3	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:12–15
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка C	296826	гр.5	Кровля Вентилятор B29	0,18	0,4	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:16–19
QF6 + KM4, KK4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка C	296826	гр.6	Кровля Вентилятор B5	0,75	1,8	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:20–23

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	68 | =ЩСВ-3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ЩСВ-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	261013	83 / 86	R3	15.10.2026

ЩСВ-3 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R3 | 15.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QF7 + KM5, KK5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.7	Кровля Вентилятор B16	0,18	0,4	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:24–27
QF8 + KM6, KK6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.8	Пом.№2.64 Вентилятор B17	0,08	0,5	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:28–30
QF9 + KM7, KK7	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.9	Кровля Вентилятор B7	0,37	0,9	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:31–34
QF10 + KM8, KK8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.10	Кровля Вентилятор B9	0,75	1,8	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:35–38
QF11 + KM9, KK9	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826	гр.11	Кровля Вентилятор B8	0,37	0,9	ВВГнг(A)-LS 4×1,5	XT1:39–42
QF12 + KM10, KK10	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.12	Пом.№2.21 Вентилятор B18	0,06	0,4	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:43–45
QF13	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	гр.13	Пом.№3.60 Кондиционер K3	2,07	12,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:46–48
QF14	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	гр.14	Пом.№2.73 Кондиционер K4	2,07	12,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5	XT1:49–51
YA1	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	814989	Управл.					
SF1–SF10	NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C — 10 шт	296708	Управл.					
SA1–SA10	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1" — 10 шт	425058	Дверь	B20 0–1; B2 0–1; B19 0–1; B5 0–1; B16 0–1; B17 0–1; B7 0–1; B9 0–1; B8 0–1; B18 0–1				
HL1, HL3, HL5, HL7, HL9, HL11, HL13, HL15, HL17, HL19	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B — 10 шт	593077	Дверь	B20 работа; B2 работа; B19 работа; B5 работа; B16 работа; B17 работа; B7 работа; B9 работа; B8 работа; B18 работа				
HL2, HL4, HL6, HL8, HL10, HL12, HL14, HL16, HL18, HL20	ND16-22D/2 красный AC/DC230B — 10 шт	593075	Дверь	B20 авария; B2 авария; B19 авария; B5 авария; B16 авария; B17 авария; B7 авария; B9 авария; B8 авария; B18 авария				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 (TEKSAN F)	719-15445	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

XT1 по кабелям проекта (L, N, PE на каждую линию): ЗНИ 2,5 — 32 шт; ЗНИ-PE 2,5 — 14 шт; ЗНИ син. 2,5 — 5 шт. В BOM: ЗНИ 2,5 серый — 95 шт; ЗНИ-4PEN (PE) — 27 шт; остальные — цепи управления/резерв.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).


Вопросы по щиту: № 4, 8, 11, 13, 23, 24 (лист вопросов).

ЯУО — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ


R3 | 15.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Проект: ЩМП-2 IP31 (ЭОФ л.3) | **Корпус:** Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31, 650×500×220 мм, IP31, навесной


ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:10

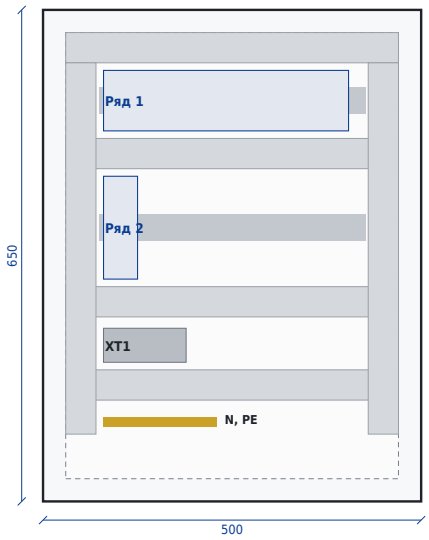

ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:10

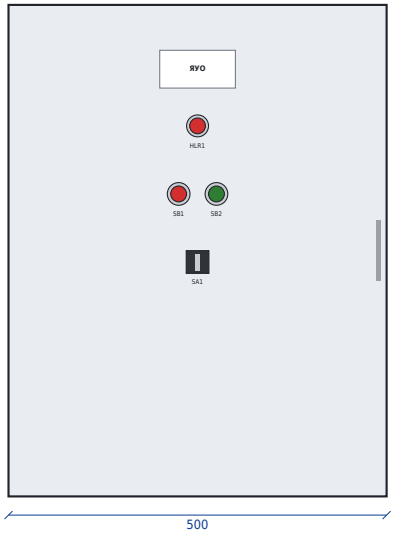

РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:5

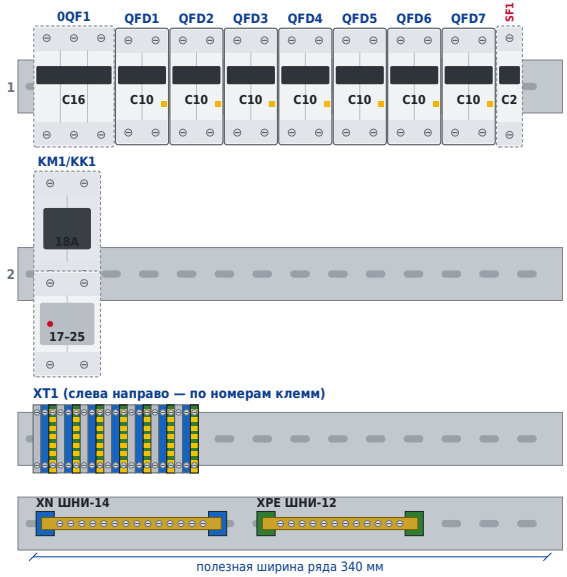

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
0QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	Ввод					
QFD1	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA	515374	гр.1 (L1)	Фасадное освещение 7/Ж-1/А, K1	0,24	1,15	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:1–3
QFD2	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA	515374	гр.2 (L2)	Фасадное освещение 7/Ж-1/А, K2	0,28	1,34	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:4–6
QFD3	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA	515374	гр.3 (L3)	Фасадное освещение 7/Ж-1/А, K3	0,24	1,15	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:7–9
QFD4	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA	515374	гр.4 (L1)	Фасадное освещение 3/А-10/Г, K4	0,22	1,05	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:10–12
QFD5	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA	515374	гр.5 (L2)	Фасадное освещение 3/А-10/Г, K5	0,22	1,05	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:13–15
QFD6	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA	515374	гр.6 (L3)	Фасадное освещение 3/А-10/Г, K6	0,22	1,05	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:16–18
QFD7	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA	515374	гр.7 (L2)	Фасадное освещение 3/А-10/Г, K7	0,22	1,05	ВВГнг(A)-LS 3×1,5	XT1:19–21
SF1	NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C	296705	Управл.					
FR1	PHOTOCELL SWITCH MH-602, 25A (100sht) (MASTE)	732-32150	Управл.					
KM1	NXC-18 18A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц	836904	Управл.					
KK1	NXR-25 17-25A	837119	Управл.					
SB1	Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	574843	Дверь	Стоп				

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	69 | =ЯУО ЯУО — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM_cl - u…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261013	85 / 86	R3	15.10.2026

ЯУО — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R3 | 15.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
SB2	Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	574842	Дверь	Пуск				
HLR1	ND16-22D/2 красный AC/DC230B	593075	Дверь	Работа				
SA1	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	574849	Дверь	Местн.–0–Дист.				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31 (TEKSAN F)	719-15901	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Управление: Сеть → 0QF1 → KM1 (KK1) → шины → QFD1–QFD7; управление: SF1 → SA1 «Местн.–0–Дист.» → SB1/SB2 (местн.) или FR1 (дист.) → KM1; HLR1 — работа.

XT1 по кабелям проекта (L, N, PE на каждую линию): ЗНИ 2,5 — 7 шт; ЗНИ син. 2,5 — 7 шт; ЗНИ-PE 2,5 — 7 шт. В BOM: ЗНИ 2,5 серый — 1 шт; остальные — цепи управления/резерв.

Габариты аппаратов — по каталогу; пунктирный контур — не сверено с паспортом (NXBLE-63Y(H) — по паспорту CHINT).

Вопросы по щиту: № 1, 4, 16, 17, 22, 23, 24, 27 (лист вопросов).
