ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ГОСТИНИЦА

Щиты номеров ЩН-1 (1 гость) и ЩН-2 (2 гостя), 24 мод., SE Easy9

Заказчик / город — КОНТРОЛЬ | проект 261019 | схемы 22.09.2026

2 щитов | 236 комплектов

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ СТОП

Вопросов: 12 (СТОП 5, КОНТРОЛЬ 7). Щиты без вопросов СТОП могут запускаться после подписи листа решения.

Исполнение	Кол.	Щиты
Модульный щит (DIN-рейки)	2	ЩН-1, ЩН-2

ИСПОЛНЕНИЕ TEKLED (для всех щитов)

ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-3; ПУЭ РК. Ue 230 В, 50 Гц, 1P+N+PE (по аппаратам ВОМ).
Ввод: кабель L, N — непосредственно на УЗО QD1 (клемм ввода нет), далее QF1 25 А и гребёнчатая шина PIN 1ф на группы.
Внутренние проводники: L коричневый, N синий, PE жёлто-зелёный (IEC 60445); цепь KL1 ~230 В — L чёрный, N синий.
Фазные проводники отходящих линий — через клеммник XT1 (ЗНИ 2,5) по маркировке схемы; N, PE — на шины ШНИ.
Обозначения аппаратов — ГОСТ 2.710; группы Г.1–Г.3 / Гр.1–Гр.n / Рез.1–2 — как в схеме.
Табличка щита (обозначение, Ue, In, IP, заводской №, дата) — на двери, по стандарту TEKLED. Размеры — мм.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Титульный лист
2 Реестр щитов
3 Вопросы для согласования и решение заказчика
4–5 Компоновка и спецификация щитов (по одному листу на щит)

Рев.	Дата	Изменение
R0	19.10.2026	Первый выпуск

РЕЕСТР ЩИТОВ

Один щит — одна строка. Красное обозначение — по щиту есть вопрос СТОП. «Лист» — лист компоновки и спецификации щита в данном документе.

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
01	**ЩН-1**	номер на 1 гостя; схема «tek kişilik oda» 22.09.2026	Щит модульный NEXUS DX10-A24SWB V10, 24 модуля, встраиваемый	**КОНТРОЛЬ**	КОНТРОЛЬ	встраиваемый	QD1 УЗО SE Easy9 2P 25 A 30 мА, QF1 Авт. выкл. SE Easy9 EZ9F34125	10	кабель L, N на QD1	20,5/24 мод.	4
02	**ЩН-2**	номер на 2 гостей; схема «iki kişilik oda» 22.09.2026	Щит модульный NEXUS DX10-A24SWB V10, 24 модуля, встраиваемый	**КОНТРОЛЬ**	КОНТРОЛЬ	встраиваемый	QD1 УЗО SE Easy9 2P 25 A 30 мА, QF1 Авт. выкл. SE Easy9 EZ9F34125	11	кабель L, N на QD1	21,8/24 мод.	5

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

СТОП — изготовление указанных щитов не начинать до ответа; КОНТРОЛЬ — подтвердить или исправить. Ответ — в правой колонке или письмом со ссылкой на №.

№	Тема	Щиты	Вопрос / что требуется подтвердить	Уровень	Ответ заказчика
1	**Ввод и система сети**	Все щиты	Система заземления (TN-S / TN-C-S) — в схеме и BOM не указана.	**СТОП**	
2	**Клеммы и подключения**	ЩН-1	BOM: ЗНИ-4PEN (PE) 9 шт; на схеме клемм PE нет — PE кабелей на шину PE (TOPRAK). С PE-клеммами ряд 2 = 227.5 мм > 216 мм (12 мод.). Исключить ЗНИ-4PEN из BOM или изменить компоновку.	**СТОП**	
3	**Клеммы и подключения**	ЩН-1	Схема: XT1 = 19 клемм; BOM: ЗНИ 2,5 = 18 шт (не хватает 1). Привести BOM к схеме.	**СТОП**	
4	**Клеммы и подключения**	ЩН-2	BOM: ЗНИ-4PEN (PE) 10 шт; на схеме клемм PE нет — PE кабелей на шину PE (TOPRAK). С PE-клеммами ряд 2 = 239.0 мм > 216 мм (12 мод.). Исключить ЗНИ-4PEN из BOM или изменить компоновку.	**СТОП**	
5	**Корпус**	Все щиты	Корпус NEXUS DX10-A24SWB V10 (711-03012): габариты В×Ш×Г, IP, цвет RAL и кабельные вводы не заданы. Компоновка показана по модулям (2 ряда × 12), контур корпуса условный.	**СТОП**	
6	**Исходные данные**	Все щиты	Заказчик и город (адрес объекта) — указать для титульного листа.	**КОНТРОЛЬ**	
7	**Ввод и система сети**	Все щиты	Ожидаемый ток КЗ Ik в точке установки — для проверки Icu 4,5 кА (Easy9).	**КОНТРОЛЬ**	
8	**Нагрузки и защита**	Все щиты	Назначение групп Г.1–Г.3 (B10), Гр.1–Гр.n (C16), Рез.1/2 (Y1/Y2), мощность и сечения отходящих кабелей в схеме не указаны (кроме 3×2,5 ВВГнг-LS к выключателю/кнопкам) — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
9	**Аппараты**	Все щиты	QD1 УЗО Easy9 2P 25 A 30 мА: тип (AC / A) в BOM не указан.	**КОНТРОЛЬ**	
10	**Клеммы и подключения**	Все щиты	Клемма возврата кнопок Г.2а → KL1:A1 на схеме без маркировки — подтвердить маркировку.	**КОНТРОЛЬ**	
11	**Компоновка**	Все щиты	Резерв модулей: ЩН-2 ≈ 2 мод. (9 %), ЩН-1 ≈ 3,5 мод. (15 %) < 20 % — с учётом XT1 на ряду 2.	**КОНТРОЛЬ**	
12	**Исполнение**	Все щиты	Климатическое исполнение / место установки (встраиваемый в стену номера) — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ СОГЛАСОВАНО **☐ СОГЛАСОВАНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ (см. колонку «Ответ»)** **☐ НА ДОРАБОТКУ**

Ф.И.О. / должность _____ Подпись _____ Дата _____ М.П.


Согласование охватывает состав аппаратов, корпуса, подключение линий и предварительную компоновку щитов. Изменения после согласования — новой ревизией документа.

ЩН-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Проект: номер на 1 гостя (схема «tek kişilik oda» 22.09.2026) | **Корпус:** Щит модульный NEXUS DX10-A24SWB V10, 24 модуля, встраиваемый, габариты — КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ, встраиваемый | **Питание:** кабель L, N на QD1

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:2,5

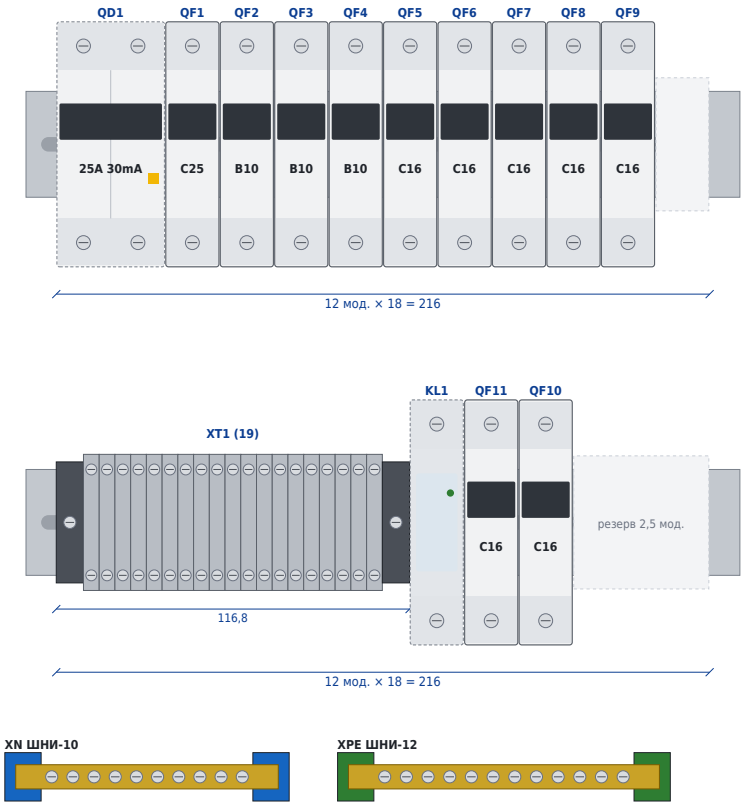

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QD1	УЗО SE Easy9 2P 25 A 30 мА	67399	Ввод	кабель L, N на QD1				
QF1	SE Easy9 EZ9F34125 1P C25 4,5 кА	41956	Ввод	кабель L, N на QD1				
QF2	SE Easy9 EZ9F14110 1P B10 4,5 кА	EZ9F14110	B10	Г.1 (выкл. Г.1а)				Г.1а, Г.1.1, Г.1.2
QF3 + KL1	SE Easy9 EZ9F14110 1P B10 4,5 кА	EZ9F14110	B10	Г.2 через KL1 (кнопки Г.2а…)				Г.2.3, Г.2.4, Г.2а4, imp. / Г.2а3, Г.2а1 / Г.2а2, Г.2.2
QF4	SE Easy9 EZ9F14110 1P B10 4,5 кА	EZ9F14110	B10	Г.3				Г.3
QF5	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.1				Гр.1-1 / Гр.1-2, Гр.1-3
QF6	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.2				Гр.2-1 / Гр.2-2
QF7	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.3				Гр.3-1 / Гр.3-2
QF8	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.4				Гр.4-1
QF9	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.5				Гр.5-1
QF10	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Рез.1 (вывод на Y1)				Y1
QF11	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Рез.2 (вывод на Y2)				Y2

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит модульный NEXUS DX10-A24SWB V10, 24 модуля, встраиваемый (TEKLED)	711-03012	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ


Модули: занято 20,5 из 24 (резерв 3,5). Фазные проводники отходящих линий — через XT1 (по схеме); N, PE — на шины ШНИ.
XT1 — 19 клемм ЗНИ 2,5 по маркировке схемы (только L / коммутируемые), 2 концевых стопора.
Шины ШНИ: N — ШНИ-10, PE — ШНИ-12 (BOM).
Габариты Easy9 MCB 18×81×66,5 мм (shop220.ru, EZ9F34116); УЗО 2P, реле TL, клеммы — по каталогу, пунктир — сверить с паспортом.
Вопросы по щиту: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (лист вопросов).

ЩН-2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Проект: номер на 2 гостей (схема «iki kişilik oda» 22.09.2026) | **Корпус:** Щит модульный NEXUS DX10-A24SWB V10, 24 модуля, встраиваемый, габариты — КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ, встраиваемый | **Питание:** кабель L, N на QD1

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:2,5

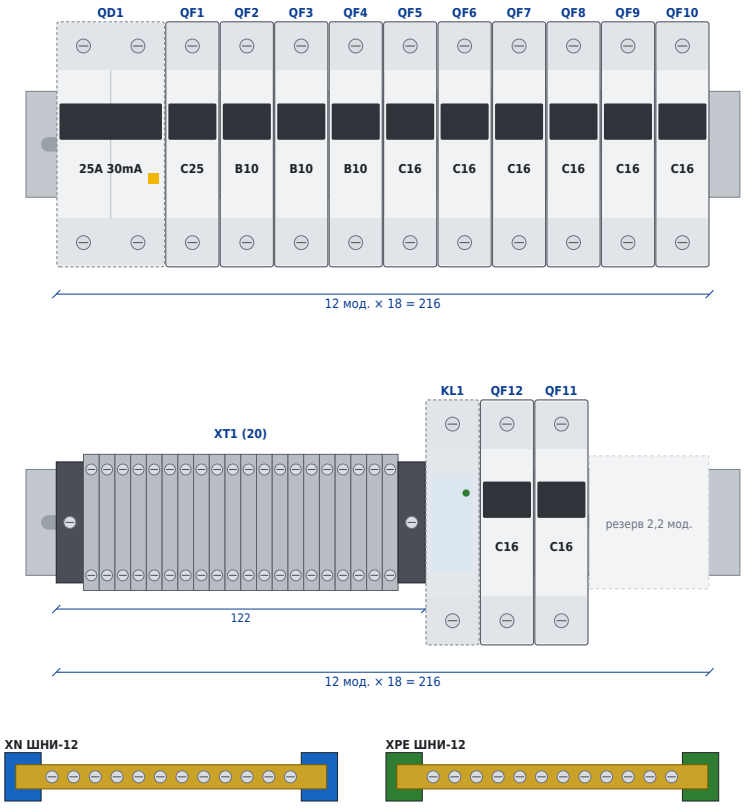

Габариты корпуса — КОНТРОЛЬ (контур условный)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QD1	УЗО SE Easy9 2P 25 A 30 мА	67399	Ввод	кабель L, N на QD1				
QF1	SE Easy9 EZ9F34125 1P C25 4,5 кА	41956	Ввод	кабель L, N на QD1				
QF2	SE Easy9 EZ9F14110 1P B10 4,5 кА	EZ9F14110	B10	Г.1 (выкл. Г.1а)				Г.1а, Г.1.1, Г.1.2
QF3 + KL1	SE Easy9 EZ9F14110 1P B10 4,5 кА	EZ9F14110	B10	Г.2 через KL1 (кнопки Г.2а…)				Г.2.3, imp. / Г.2а3, Г.2а1 / Г.2а2, Г.2.1 / Г.2.2
QF4	SE Easy9 EZ9F14110 1P B10 4,5 кА	EZ9F14110	B10	Г.3				Г.3
QF5	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.1				Гр.1-1 / Гр.1-2, Гр.1-3
QF6	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.2				Гр.2-1 / Гр.2-2, Гр.2-3
QF7	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.3				Гр.3-1 / Гр.3-2
QF8	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.4				Гр.4-1 / Гр.4-2, Гр.4-3 / Гр.4-4
QF9	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.5				Гр.5-1 / Гр.5-2
QF10	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Гр.6				Гр.6-1
QF11	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Рез.1 (вывод на Y1)				Y1
QF12	SE Easy9 EZ9F34116 1P C16 4,5 кА	41954	C16	Рез.2 (вывод на Y2)				Y2

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит модульный NEXUS DX10-A24SWB V10, 24 модуля, встраиваемый (TEKLED)	711-03012	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 21,8 из 24 (резерв 2,2). Фазные проводники отходящих линий — через XT1 (по схеме); N, PE — на шины ШНИ.
XT1 — 20 клемм ЗНИ 2,5 по маркировке схемы (только L / коммутируемые), 2 концевых стопора.
Шины ШНИ: N — ШНИ-12, PE — ШНИ-12 (BOM).
Габариты Easy9 MCB 18×81×66,5 мм (shop220.ru, EZ9F34116); УЗО 2P, реле TL, клеммы — по каталогу, пунктир — сверить с паспортом.
Вопросы по щиту: № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (лист вопросов).
