ЩК (отл) | 1 комплект | R03 | 23.10.2026

# Корпус и комплектация



| Корпус | Исполнение |
|---|---|
| Ёмкость | 12 модулей |
| Монтаж | Скрытый |
| Цвет | Тёмный по фото |
| Крышка | Вверх; рамка неподвижна |

## СОСТАВ НА ОДИН ЩИТ


| Обозн. | Артикул | Аппарат / корпус TEKLED | Кол. |
|---|---|---|---|
| Корпус | 711-03034* | 12M, пластик, IP40 по BOM; выбран корпус на фото. | 1 |
| QF0 | 611-03012 | Автомат 1P, 25 A, 4,5 kA | 1 |
| FI1-FI3 | 616-03030 | Дифф. аппарат 2P, 16 A / 30 mA.<br>Точный тип: D02. | 3 |
| QF1-QF3 | 611-03008 | Автомат 1P, 10 A, 4,5 kA | 3 |

* Соответствие артикула выбранному корпусу уточнить (D01).

ЩК (отл) | 1 комплект | R03 | 23.10.2026

# Однолинейная схема

Предложение для варианта RCCB. Тип FI и схему согласовать (D02-D04).

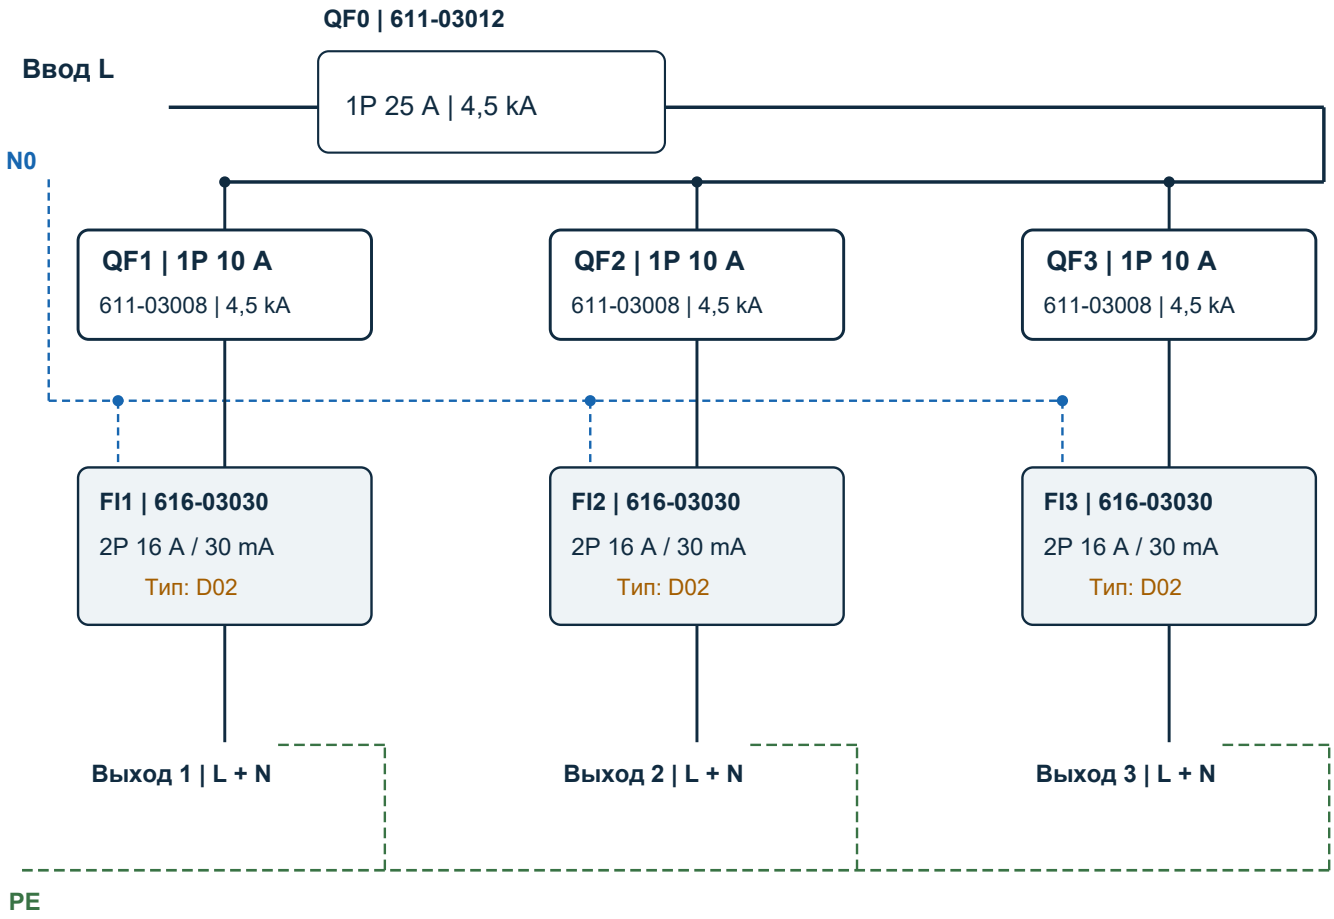


До FI чёрная линия обозначает L; после FI — связь L+N. Синяя пунктирная — N0 на вход FI. Зелёная — PE к нагрузкам.

| Цепь | Функция в предложенной схеме |
|---|---|
| L | QF0 → QF1/QF2/QF3 → соответствующий FI → нагрузка. |
| N | N0 на входы FI. После FI нейтрали трёх групп не объединяются. |
| PE | К нагрузкам непрерывно, минуя аппараты защиты. |


QF0 — однополюсный. Полное отключение питания, реальные клеммы и сечения — D03/D04.

ЩК (отл) | 1 комплект | R03 | 23.10.2026

# Внутреннее размещение

Предложение без масштаба. Контур корпуса и зоны условные.

**SHK-01 | 12M | СКРЫТЫЙ МОНТАЖ**

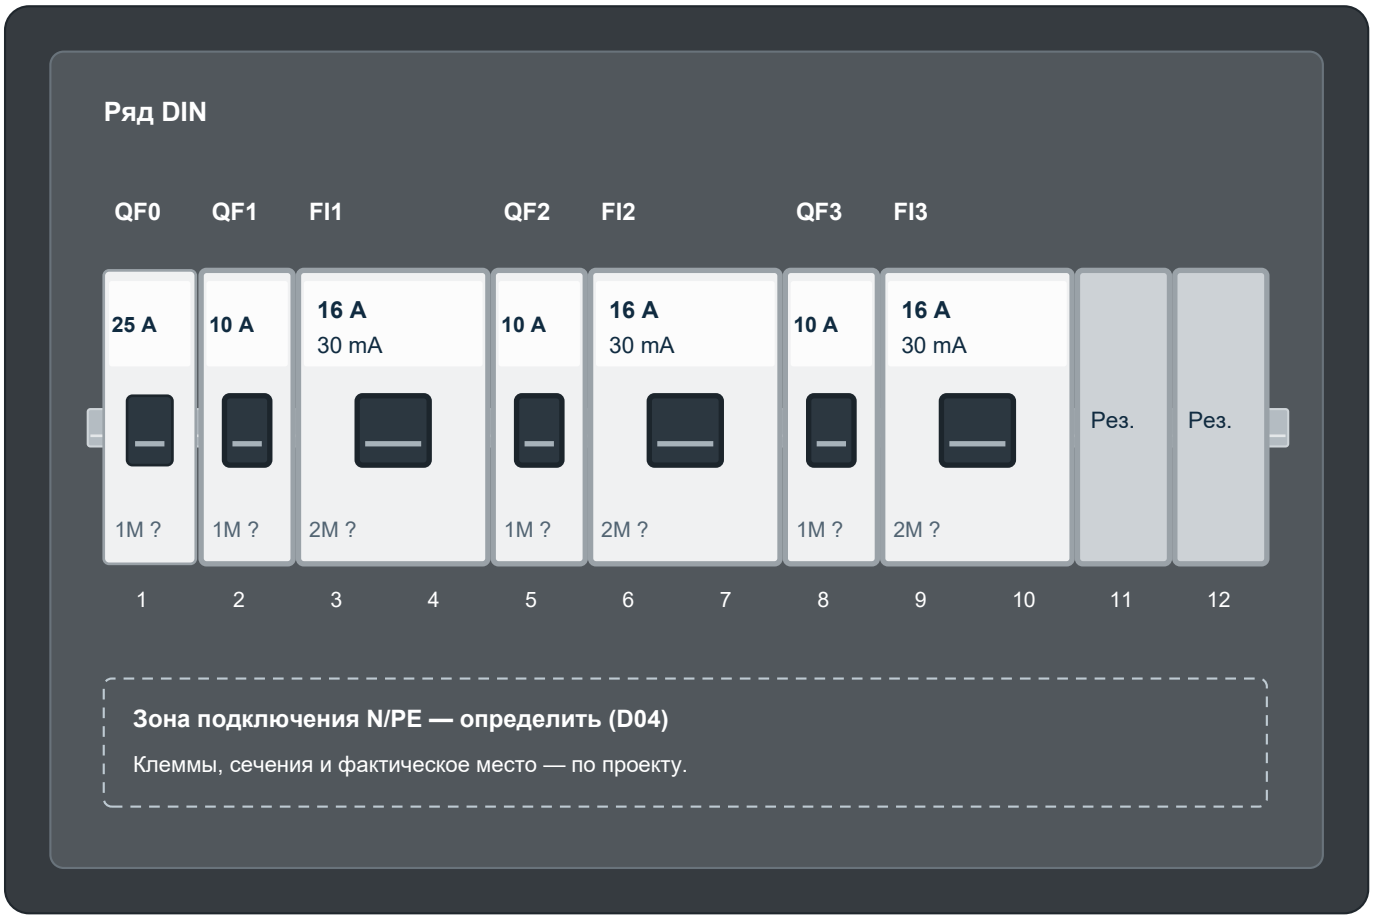


1M / 2M — принятые ширины аппаратов. Два правых места — условный резерв.

Фактические размеры корпуса, аппаратов и места подключения: D01/D02/D04/D05.

# Согласование

## РЕШЕНИЯ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

| ID | Необходимые данные / решение | Ответственный |
|---|---|---|
| D01 | Артикул и размеры выбранного корпуса, ниша, полезный объём, рейка и место N/PE. | Изготовитель / заказчик |
| D02 | Паспорт 616-03030: RCCB/RCBO, тип, U/f, клеммы, размеры; совместимость с автоматом 10 A. | Поставщик / инженер |
| D03 | Питание, нагрузки, кабели, Ik, вышестоящая защита, полное отключение и селективность. | Проектировщик |
| D04 | Система N/PE, отдельные нейтрали групп, клеммы, сечения и уравнивание потенциалов. | Инженер / изготовитель |
| D05 | Фактическая компоновка, нагрев/IP, нормы страны, проектные и послесборочные проверки. | Изготовитель / инженер |

Согласование комплектации и схемы — после закрытия D01-D05.

**Заказчик**

ФИО / подпись / дата

**Ответственный инженер / изготовитель**

ФИО / подпись / дата

Основание: BOM Sayfa1!C3:D6, H2:H6; фото корпуса и решения заказчика. Полные ссылки — в технической записи R03.
