ЩЭ


İKİ BAĞIMSIZ GİRİŞLİ KAT PANOSU

CHINT şalt / KAZTEK korpus / ATS ve kuplaj yok

PROJE / BELGE	
PROJE	Otel AQ miniSUITES
ADRES	Almatı, Nazarbayeva 51
İLETİŞİM	Nariman Bey
PANO	ЩЭ
DOKÜMAN	260825-NARIMAN-ЩЭ-UA-R1
REVİZYON	R1 - korpus ve sade içerik


TEKNİK ÖZET	
KORPUS	1700x800x450 mm +100 mm baza
KOD / SINIF	719-15043 / IP31
GİRİŞ-1	QF1 UPS - 1P C32A
GİRİŞ-2	QF2 ШУ - 3P 200A
ÇIKIŞ	117 devre / 119 cihaz
KAPASİTE	197/252 modül; 55 yedek (%27,9)

GÜÇ YAPISI



ÜRETİM ESASI

- Tek kapı; kol solda, menteşe sağda.
- Alt kablo girişi; sökülebilir gland plakası.
- UPS N ve ШУ N ayrı; PE barası ortak.
- Kapakta ilave buton, lamba veya ölçü cihazı yok.

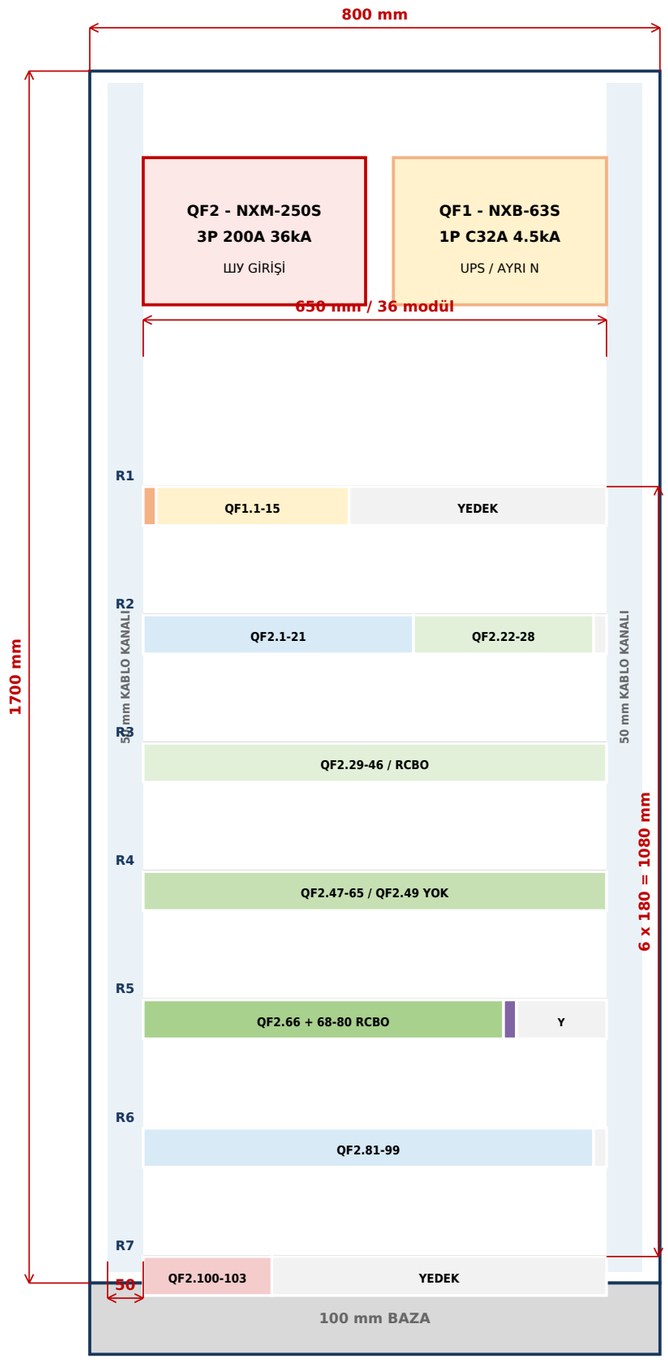

RAY YERLEŞİM CETVELİ

RAY	ÜSTTEN	DEVRE / CİHAZ	DOLU MOD.	YEDEK
R1	420	QF1 + QF1.1-QF1.15	16	20
R2	600	QF2.1-QF2.28	35	1
R3	780	QF2.29-QF2.46 / RCBO	36	0
R4	960	QF2.47-QF2.65 / QF2.49 yok	36	0
R5	1140	QF2.66 ve QF2.68-QF2.80	29	7
R6	1320	QF2.81-QF2.99	35	1
R7	1500	QF2.100-QF2.103	10	26

KAPASİTE


7 x 36 = 252 modül | Kullanılan: 197 modül | Yedek: 55 modül (%27,9). DIN ray net uzunluğu 650 mm; sol ve sağ kablo kanalı 50 mm.


YERLEŞİM NOTLARI


R3 ve R4 tam doludur; kanal kapağı ve cihaz sökme mesafesi korunacaktır. QF1/UPS bölümü ayrı N barasıyla ayrılır. QF2.49 tek hatta bulunmadığı için eklenmez.

DIŞ GÖRÜNÜŞ, KABLO GİRİŞİ VE GÜÇ YAPISI

Tek kapı | Alt kablo girişi | İki bağımsız besleme

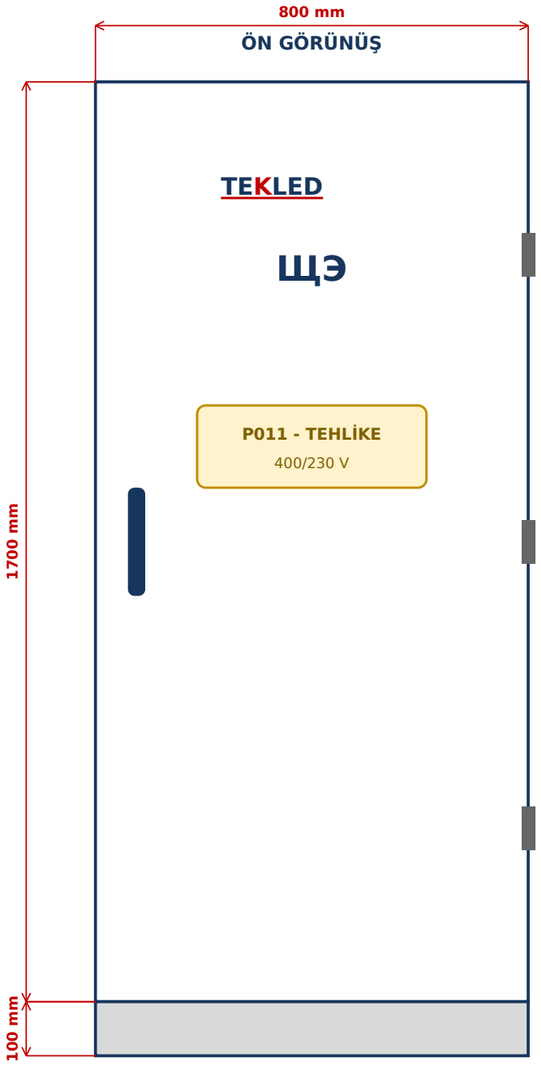


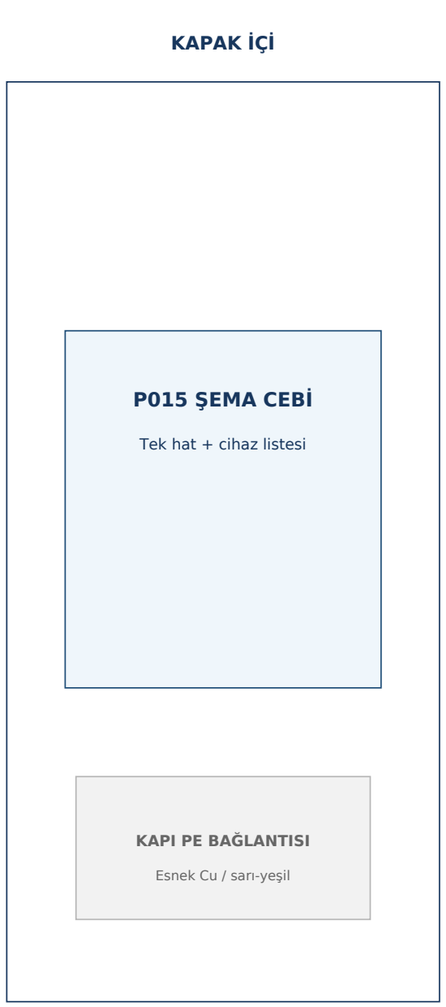

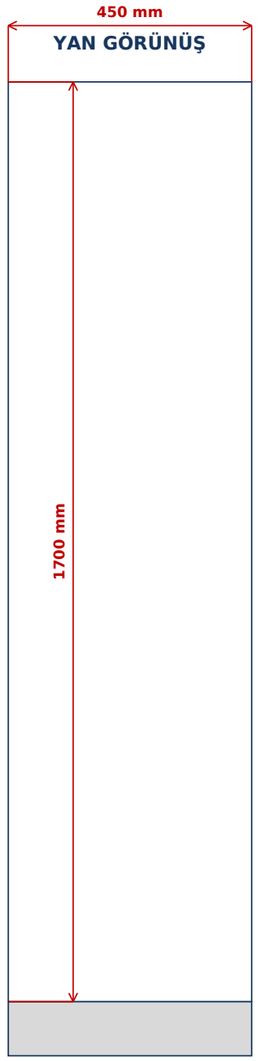



BASİT GÜÇ TOPOLOJİSİ



№	KOD	ÜRÜN	MARKA	ADET
1	719-15043	Korpus 1700x800x450 +100 mm baza, IP31	KAZTEK	1
2	131367	NXM-250S 3P 200A 36kA	CHINT	1
3	296713	NXB-63S 1P C32A 4.5kA	CHINT	1
4	296710	NXB-63S 1P C16A 4.5kA	CHINT	44
5	515394	NXBLE-63YH 1P+N C25A 30mA AC 6kA	CHINT	49
6	515401	NXBLE-63YH 1P+N C32A 30mA AC 6kA	CHINT	8
7	296712	NXB-63S 1P C25A 4.5kA	CHINT	4
8	296714	NXB-63S 1P C40A 4.5kA	CHINT	1
9	296833	NXB-63S 3P C63A 4.5kA	CHINT	2
10	296831	NXB-63S 3P C40A 4.5kA	CHINT	1
11	296828	NXB-63S 3P C20A 4.5kA	CHINT	2
12	296827	NXB-63S 3P C16A 4.5kA	CHINT	2
13	296830	NXB-63S 3P C32A 4.5kA	CHINT	2
14	296829	NXB-63S 3P C25A 4.5kA	CHINT	2

ÜRETİM NOTLARI

- Alt giriş plakası sökülebilir olacak; giriş ve çıkışlar ayrı bölgelenir.
- QF1/UPS N ile QF2/ШУ N birleştirilmez; PE barası ortaktır.
- P008 cihaz etiketleri, P011 400/230 V uyarısı ve P015 şema cebi uygulanır.
- Tork, PE sürekliliği, izolasyon ve fonksiyon testleri kayıt altına alınır; QF2.49 eklenmez.

ONAY KARARI

☐ ONAYLANDI ☐ KOŞULLU ONAY ☐ REVİZYON GEREKLİ

MÜŞTERİ NOTU: _____

GÖREV	YETKİLİ	İMZA / KAŞE	TARİH
Müşteri teknik onayı	_____	_____	_____
TEKLED tasarım / kontrol	_____	_____	25.08.2026
TEKLED üretim	_____	_____	_____
TEKLED kalite	_____	_____	_____

ÜRETİM SERBEST BIRAKMA

Müşteri teknik onayı ve TEKLED tasarım kontrolü tamamlanmadan gövde üretimine başlanmaz.
