ЩЭ-6 - этажный щит на 6 квартир

ПРИНЯТЫЙ КОРПУС: 1000 x 700 x 150 мм

Количество: 9 комплектов

Монтаж: встраиваемый (скрытый)

РЕШЕНИЕ R2

Правый отсек слаботочных систем полностью исключен. Корпус уменьшен по ширине с 950 до 700 мм. Глубина принята 150 мм. Щит выполняется встраиваемым, с глухой задней стенкой и одним силовым корпусом без боковой перегородки.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Корпус	1000 x 700 x 150 мм
Тип	встраиваемый / скрытый монтаж
Задняя стенка	глухая
Фасад	2 двери: верхняя + счетчиковая
Двери	ручка слева, петли справа
Слаботочный отсек	НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ


КОНТРОЛЬ ГАБАРИТА

- Счетчик SAIMAN ДАЛА СА4-Э720: 243 x 175 x 67 мм.
- 3 счетчика по ширине = 525 мм.
- Принятый чистый монтажный размер по ширине = 610 мм.
- Свободно по ширине = 85 мм для технологических зазоров и крепления.
- Вывод: 700 мм наружной ширины корпуса достаточно; 950 мм больше не требуется.


R2: без слаботочного отсека | встраиваемый | глубина 150 мм | ширина 700 мм

Разработал	Проверил	Согласовал заказчик
ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата

ПЕРЕДНИЙ ВИД

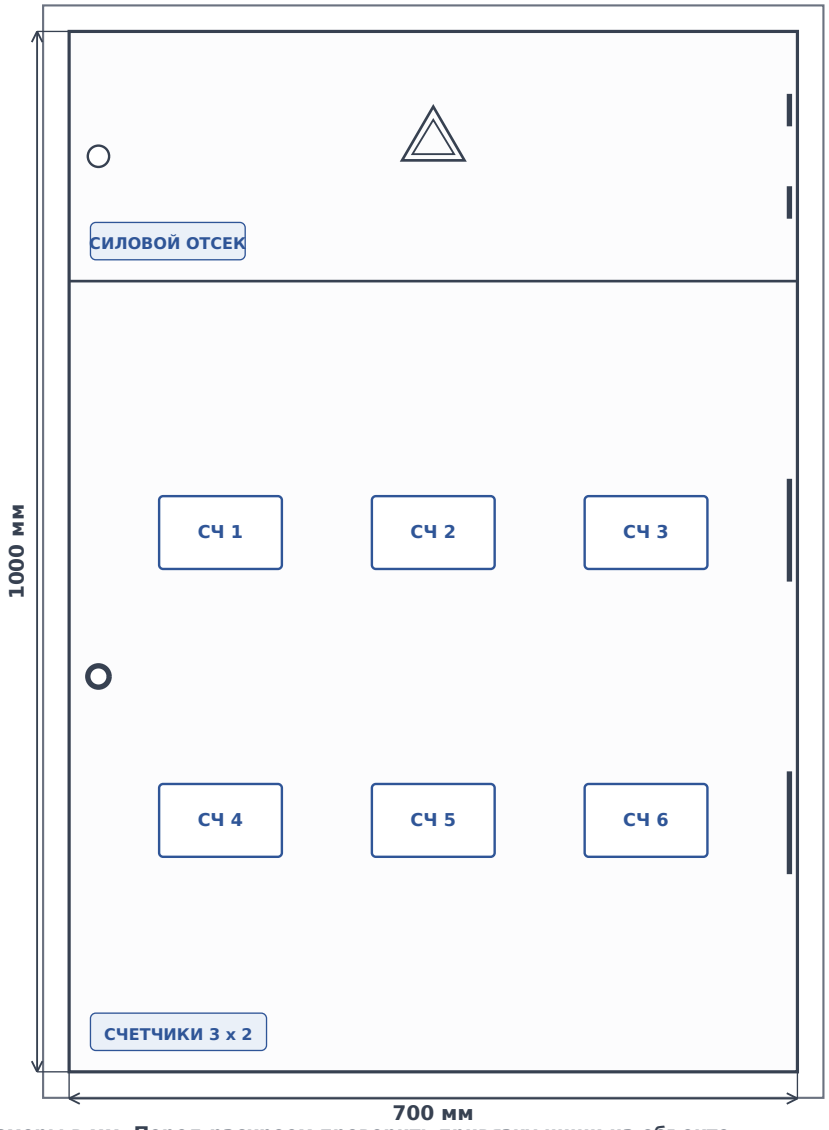

БОКОВОЙ РАЗРЕЗ

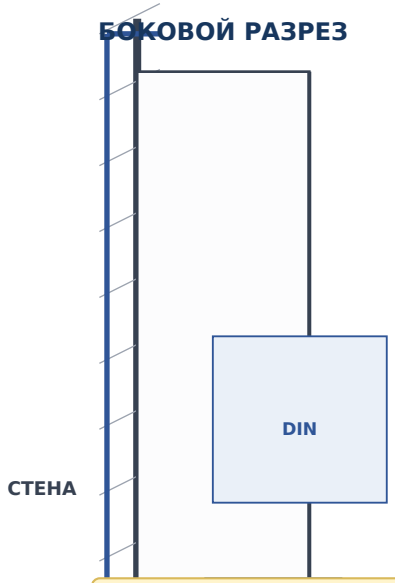

Скрытый монтаж

Корпус утапливается в стену. Передняя рамка перекрывает кромку ниши. Задняя стенка корпуса - глухая.

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

- Корпус: H1000 x W700 x D150 мм.
- Передняя монтажная рамка: 25 мм по периметру.
- Ориентировочный наружный размер рамки: 1050 x 750 мм.
- Монтажная ниша: по фактическому корпусу + монтажный допуск объекта.
- Правой боковой двери/отсека НЕ ДЕЛАТЬ.
- Козырек / навес НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ.

Все размеры в мм. Перед раскроем проверить привязку ниши на объекте.



ПРОВЕРКА РАЗМЕЩЕНИЯ

- 3 счетчика: 3 x 175 = 525 мм.
- Чистая ширина: 610 мм -> запас 85 мм.
- 6 пар QF + FI размещаются на 2 DIN-рейках по 3 группы.
- Глубина 150 мм принята по заданию заказчика.
- Кабель-каналы - только внутри силового корпуса; отдельного стояка нет.

СОСТАВ НА 1 ЩИТ

PI1...PI6	**6 шт.**	SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1, 10(100)A
QF1...QF6	**6 шт.**	CHINT NXB-63S, 4P, C40
FI1...FI6	**6 шт.**	CHINT NXL-63, 4P, 40A, 300mA
N / PE	**1 компл.**	Шины, клеммы, маркировка
Монтаж	**1 компл.**	DIN-рейки, кабель-канал, крепеж

УКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

Электрические соединения выполнить строго по проектной однолинейной схеме. Настоящий лист фиксирует корпус, фасад и компоновку. Правый слаботочный отсек не изготавливать.
