ЩЭ-6 - этажный щит на 6 квартир

КОРПУС: 1000 x 950 x 220 мм

Количество: 9 комплектов | Исполнение: ЛЕВОЕ

Монтаж: НАРУЖНЫЙ (накладной)

РЕШЕНИЕ R5

Корпус выполнен для НАРУЖНОЙ установки с глухой задней стенкой. Силовой отсек расположен слева, слаботочный - справа. Чистая внутренняя ширина 870 мм перераспределена: 700 мм силовой отсек + 170 мм пустой слаботочный отсек. Внутри силового отсека предусмотрен отдельный вертикальный коридор стояка 70 мм; после него остается 630 мм чистой монтажной ширины. Через слаботочный отсек силовые проводники не проходят. Глубина увеличена до 220 мм для нормальной укладки и радиусов изгиба проводников.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Корпус	1000 x 950 x 220 мм
Монтаж	наружный / накладной
Исполнение	левое; силовой отсек слева
Внутр. ширина	870 мм = 700 + 170 мм
Силовой отсек	700 мм, с коридором стояка 70 мм
Слаботочный	170 мм, корпус + дверь, ПУСТОЙ
Задняя стенка	глухая / сплошная

ПРОВЕРКА ГАБАРИТОВ


- Счетчик SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1: 243 x 175 x 67 мм.
- После стояка: 700 - 70 = 630 мм. Три счетчика = 525 мм; резерв по ширине 105 мм.
- DIN: рейка 600 мм; 3 группы x 8 модулей = 24 из ~33 модулей, резерв ~27%.
- Высота: 2 ряда счетчиков по 243 мм + 2 DIN ряда + N/PE шины размещаются в H1000.
- Глубина: D220 принята для кабельных изгибов, ответвлений стояка и обслуживания.

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ


1) Смотровые окна счетчиков резать после сверки фактического счетчика. 2) Коридор стояка 70 мм - минимальный. Сечение стояка и габарит ответвительного зажима сверить до изготовления. 3) Слаботочный отсек не комплектовать.

Разработал	Проверил	Согласовал заказчик
ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата

ПЕРЕДНИЙ ВИД - ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

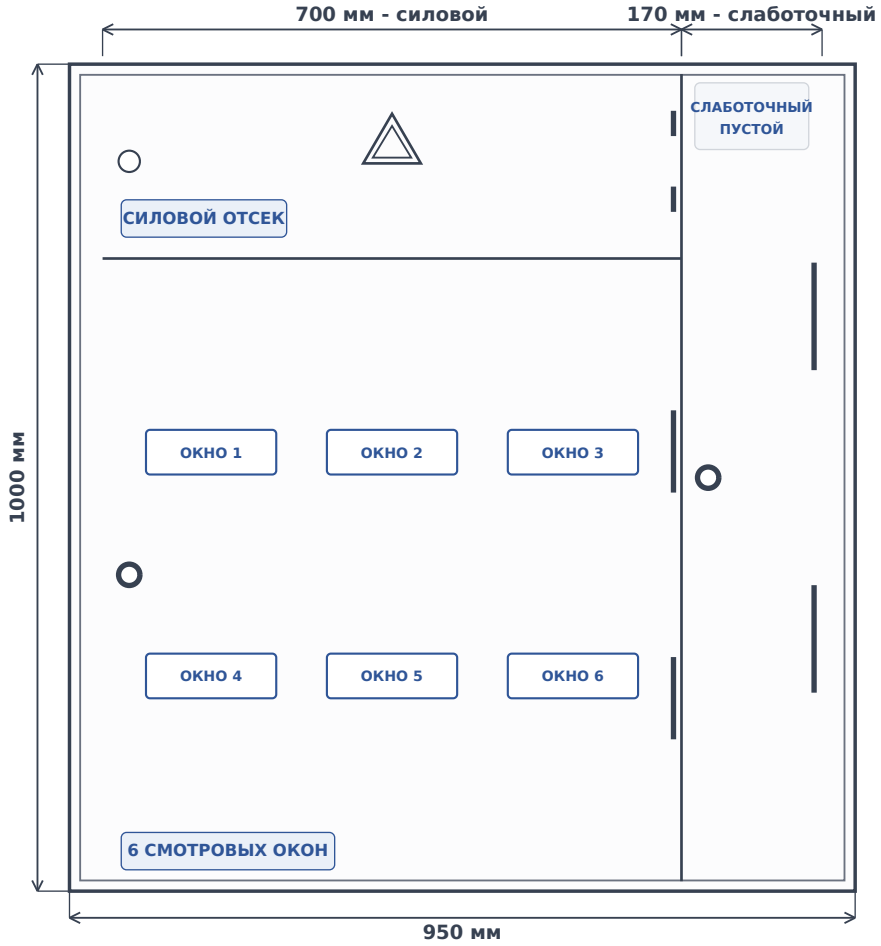

БОКОВОЙ ВИД - НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ

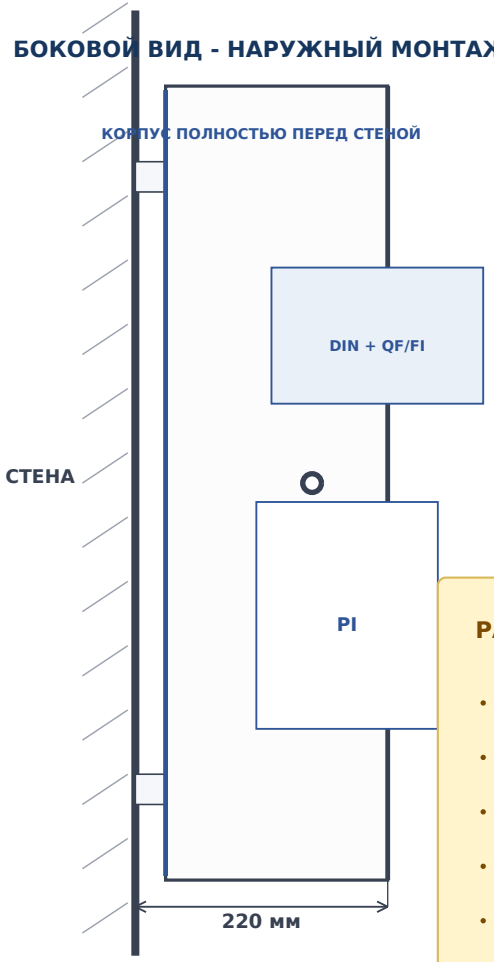


Наружная установка

Корпус устанавливается НА поверхность стены. В стену не утапливается. Задняя стенка корпуса глухая и находится перед плоскостью стены. Полная глубина от стены до фасада: 220 мм.

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус: H1000 x W950 x D220 мм; наружный монтаж.
- Внутренняя ширина: 870 мм = 700 мм силовой + 170 мм слаботочный.
- Фасад: 3 двери - верхняя силовая, нижняя счетчиковая, правая слаботочная.
- Слаботочный отсек: изготовить, но оставить без оборудования.
- Задняя стенка: глухая. Козырек / навес не предусматривать.
- Смотровые окна счетчиков: положение/размер окончательно по фактическому прибору.

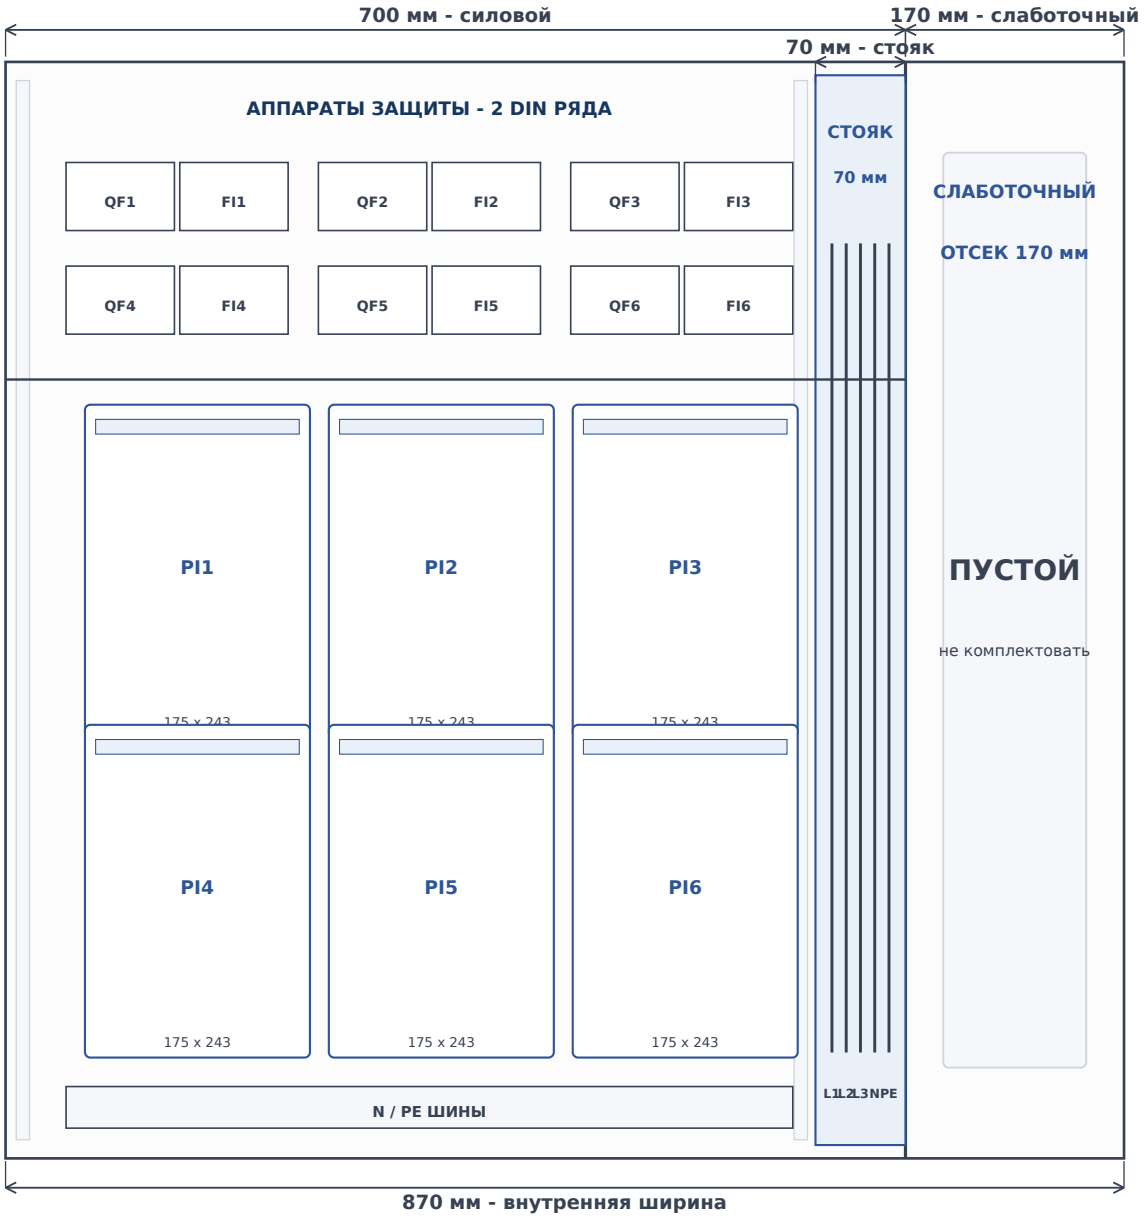

ПРОВЕРКА РАЗМЕЩЕНИЯ

- Ширина: 700 - 70 = 630 мм под аппараты/счетчики.
- 3 счетчика: 525 мм; остаётся 105 мм суммарного технологического запаса.
- DIN: 3 пары QF+FI на ряд; 2 ряда. При длине рейки 600 мм: 24 модуля из ~33, резерв ~27%.
- Стояк проходит только в силовом отсеке; слаботочный отсек не используется.
- Глубина 220 мм достаточна при компоновке без оборудования в правом отсеке.

СОСТАВ НА 1 ЩИТ


PI1...PI6	**6 шт.**	SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1, 3x220/380 В, 10(100)А
QF1...QF6	**6 шт.**	CHINT NXB-63S, 4P, C40
FI1...FI6	**6 шт.**	CHINT NXL-63, 4P, 40A, 300mA
N / PE	**1 компл.**	Шины, клеммы, маркировка
Стояк	**1 канал**	Коридор 70 мм MIN; сечение/зажимы - по проекту
Слаботочный	**1 отсек**	Пустой; оборудование не устанавливать

УКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

Силовой стояк не вести через слаботочный отсек. Коридор стояка 70 мм считать минимальным; до запуска проверить фактический кабель и ответвительный зажим. Установочные отверстия и окна счетчиков

ЩЭ-6 | 6 квартир | стояк 3P+N+PE | 400/230 В, 50 Гц

Наружное исполнение | R5

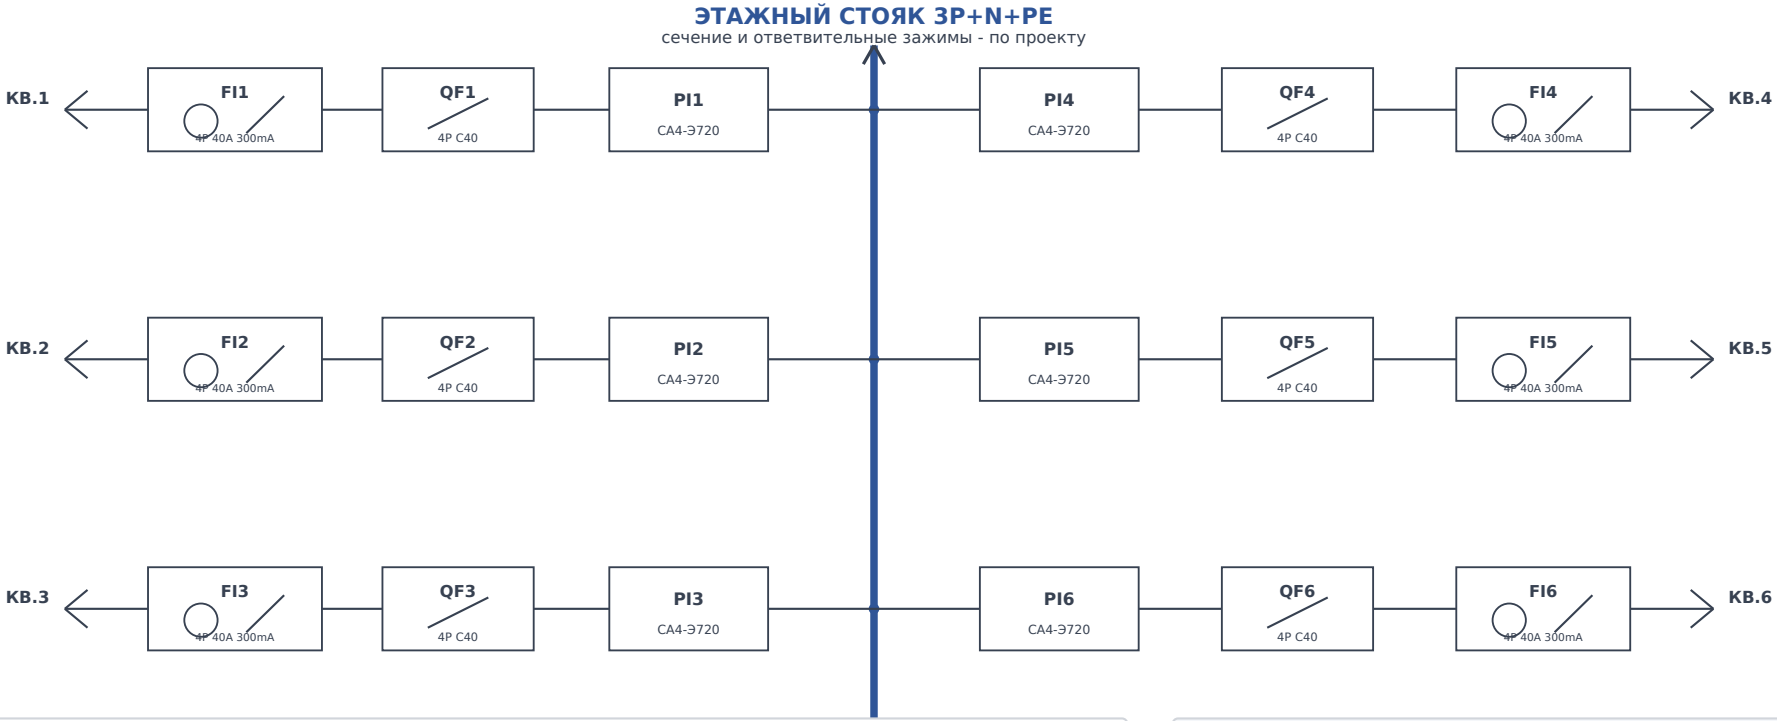

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОСТАВ

PI1...PI6	Счетчик SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1, 3x220/380 В, 10(100) А	**6 шт.**
QF1...QF6	CHINT NXB-63S, 4P, C40	**6 шт.**
FI1...FI6	CHINT NXL-63, 4P, 40 A, 300 mA	**6 шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Последовательность каждой линии: стояк -> счетчик -> QF -> FI -> квартира.

2. PE-проводник подключать напрямую к PE-шине; через защитные аппараты не проводить.

3. Отдельный вводной автомат щита в исходных данных не указан - не добавлен.

4. Стояк и ответвительные зажимы: тип/сечение по рабочему проекту.
