FREEDOM LOUNGE

Almatı Uluslararası Havalimanı · Terminal T2

ANA TEKNİK BİLGİLER


Pano	Ölçüler Y×G×D	Tip	Giriş / sistem	Durum
EMDP1	1900×1200×500 mm	zemin tipi, 2 kapılı, IP31	3F+N+PE · 250 A	şartlı onaya uygun
UMDP1	1000×650×300 mm	duvar tipi, tek kapılı, IP31	1F+N+PE · 40 A	şartlı onaya uygun

Dayanak: 05.08.2026 tarihli TAV-FR-E-EAP-009-R000 tek hat şeması; 260813_Freedom_Lounge_BOM_R2 cld.xlsx BOM dosyası.

Amaç: Korpus ve montaj üretimine başlamadan önce ölçülerin, pano tipinin, malzeme kapsamının ve prensip yerleşimin onaylanması.

EMDP1 PANOSU — ÖLÇÜLER VE TİP

Zemin tipi dağıtım panosu

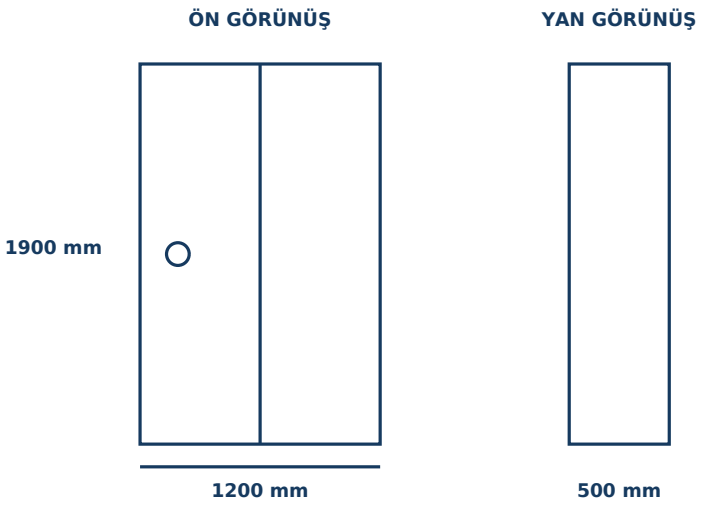


zemin tipi · IP31 · metal · RAL 7035 · kol solda, menteşeler sağda

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Nominal giriş: 250 A, 400/231 V, 50 Hz
- Sistem: 3F+N+PE, TN-S
- Ana baralar: Cu 30×5 mm, L1/L2/L3/N/PE
- Bölümlendirme: giriş / ölçüm / dağıtım / KNX / klemens
- Sayaç mühürlenebilir ayrı bölmede
- Kablo girişi: projeye göre, rakor plakalı
- Yerleşim rezervi: en az %20
- Kapı: iki adet; kollar solda, menteşeler sağda

EMDP1 PANOSU — PRENSİP İÇ YERLEŞİM


Kesin yerleşim TEKLED imalat çizimlerinde netleştirilecektir

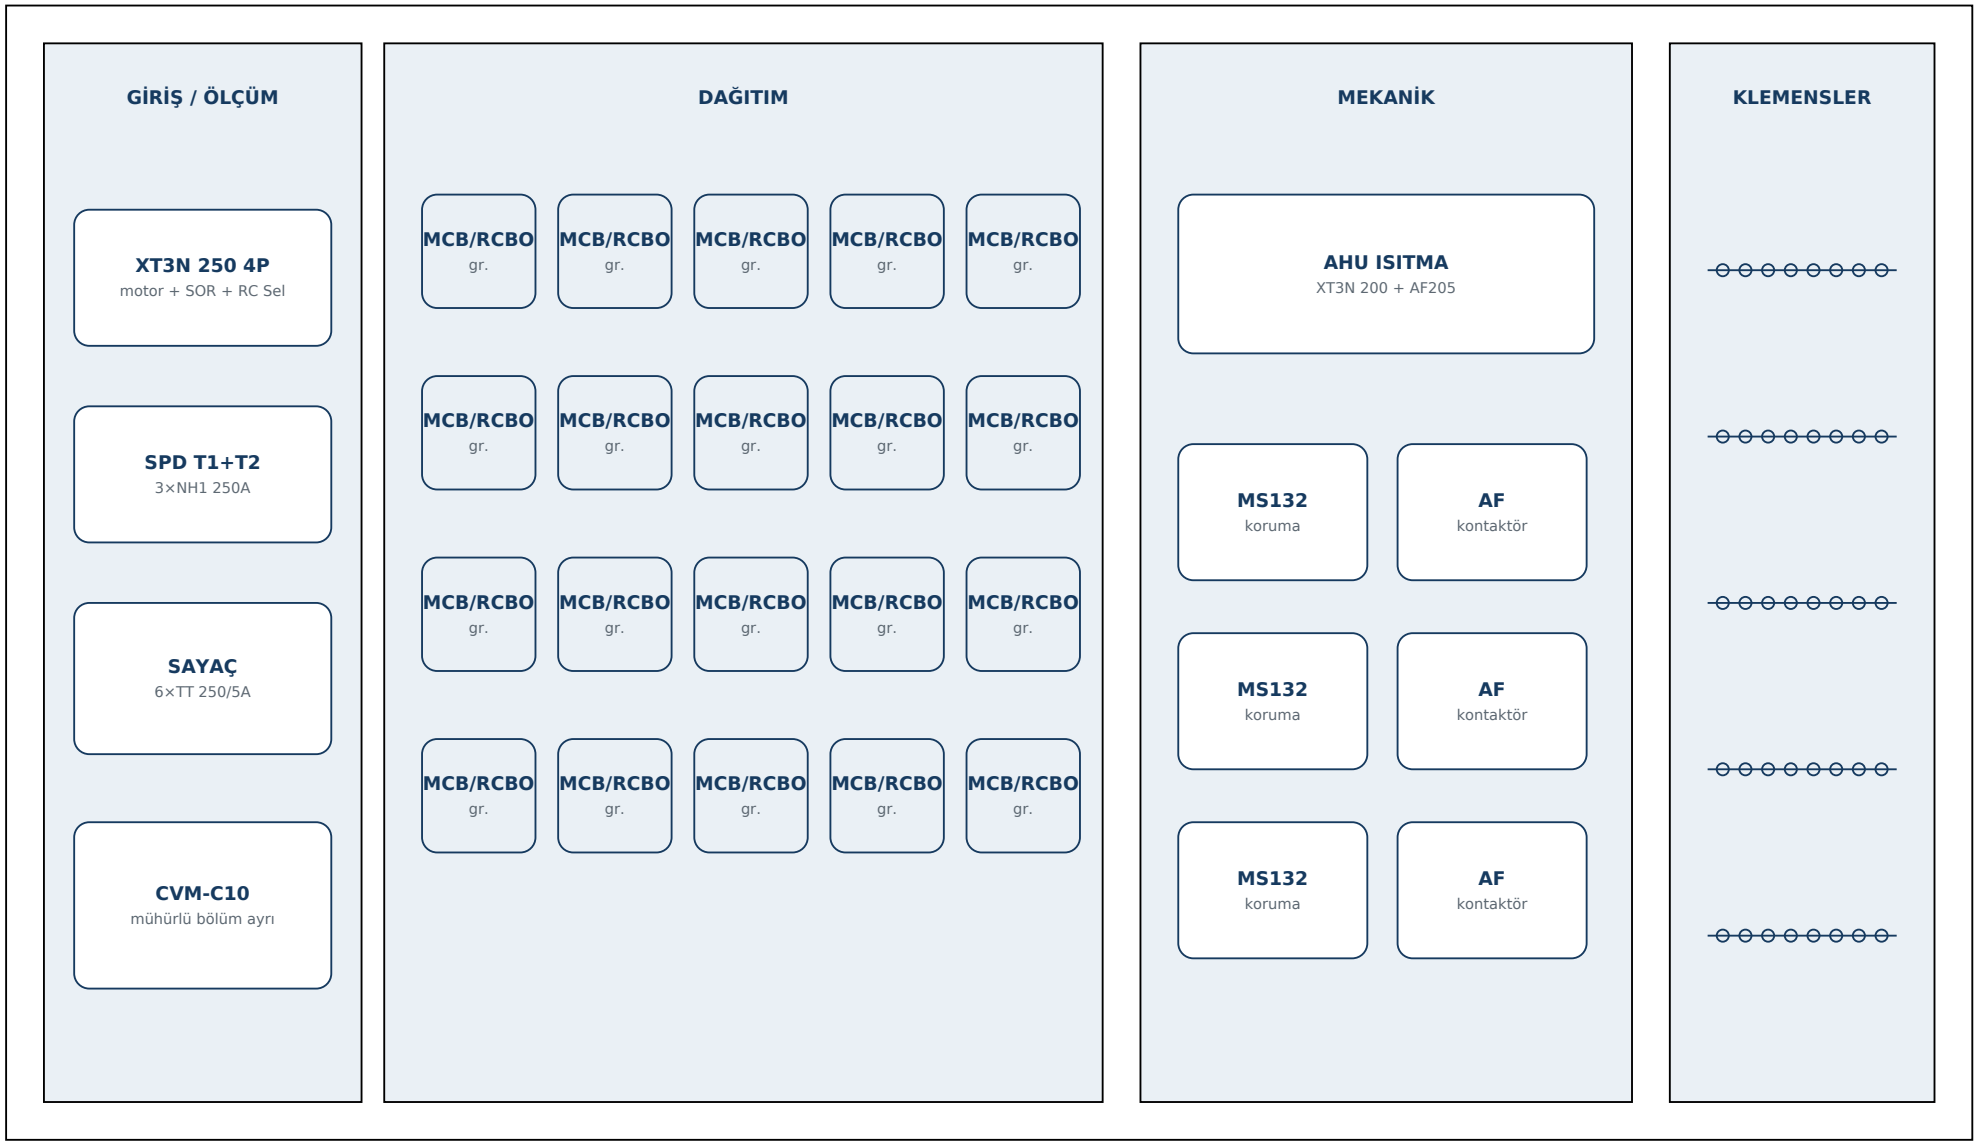

Klemens grupları ayrı bir dikey bölgede yerleştirilecek; güç ve zayıf akım devreleri ayrılacaktır.

EMDP1 PANOSU — SADELEŞTİRİLMİŞ TEK HAT ŞEMASI

Malzeme kapsamı onayı içindir; devre etiketleri kaynak şemaya göre uygulanacaktır

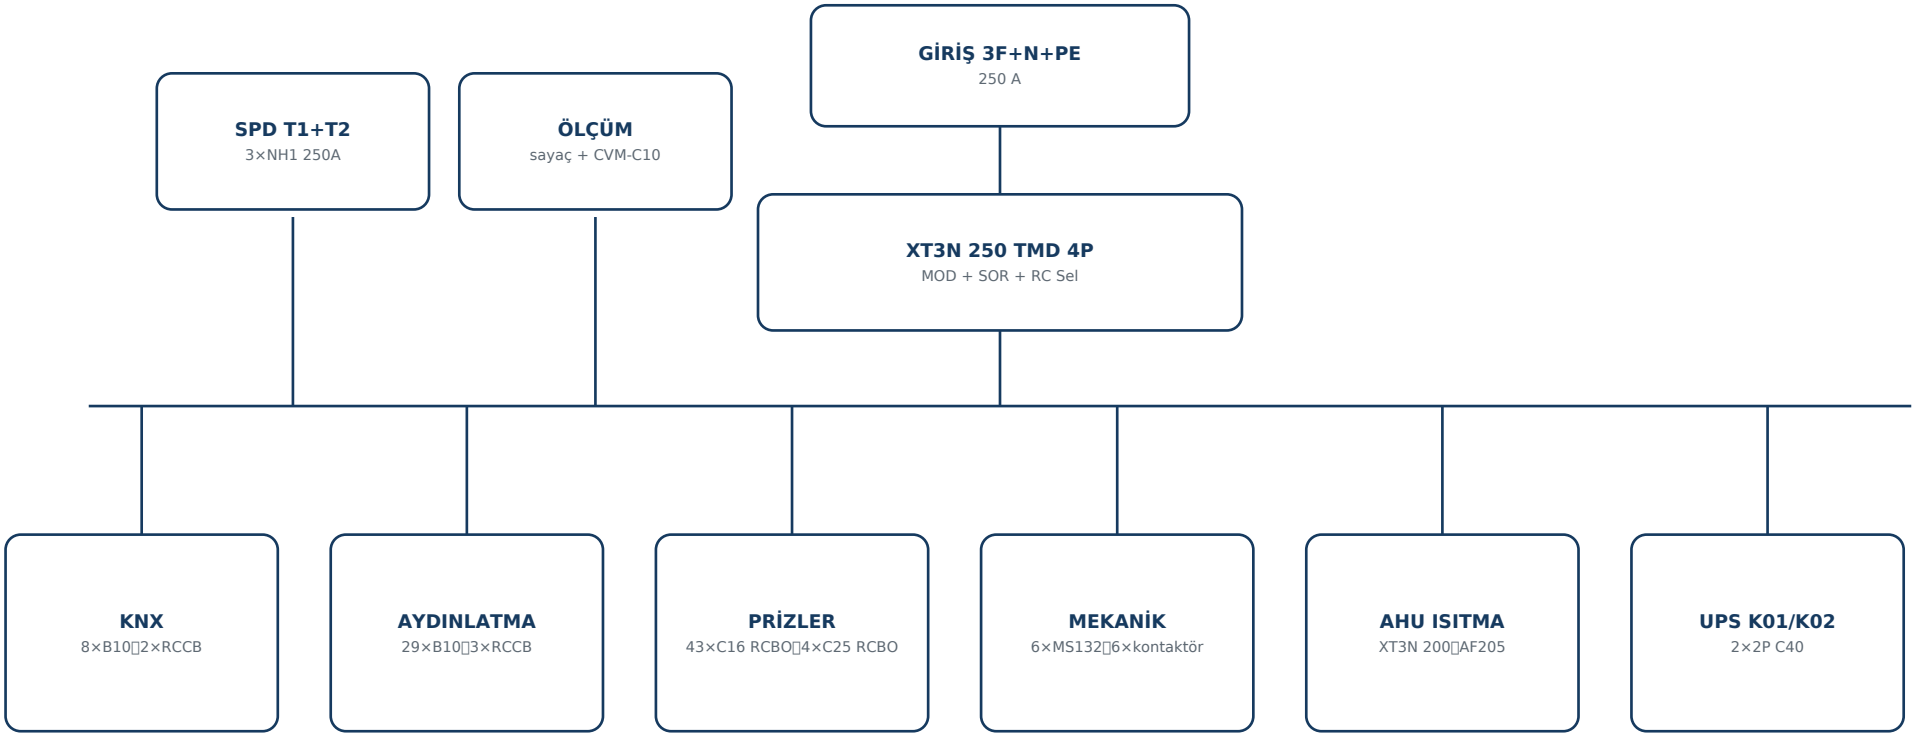


NOT

KNX cihazları (1×20 kanallı modül, 3×DALI geçidi, aktüatörler, TXA112, TYFS130, TYFS121) müşteri tarafından temin edilecektir; pano içinde yer ve montaj kapsam dahilindedir.

UMDP1 PANOSU — ÖLÇÜLER VE YERLEŞİM

6 kVA kesintisiz güç kaynağı panosu, 1F+N+PE

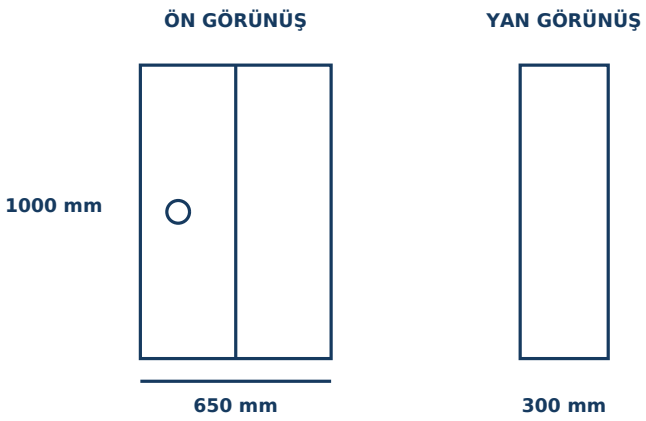

duvar tipi · IP31 · metal · RAL 7035 · kol solda, menteşeler sağda

İÇ YERLEŞİM

GİRİŞ S202-C40 2P	**OTOMATİK BYPASS** S202M-C40 2P	**MANUEL BYPASS** OT40F4C 1-0-2	
SPD T2 1P+N	**ÖLÇÜM** TT 50/5 + analizör		
RCCB+MCB gr. 1…	**RCCB+MCB** gr. 4…	**RCCB+MCB** gr. 7…	**RCCB+MCB** gr. 10…
RCCB+MCB gr. 4…	**RCCB+MCB** gr. 7…	**RCCB+MCB** gr. 10…	**RCCB+MCB** gr. 13…

11 çıkış: 1P C16 + 2P RCCB 25A/30mA Tip A

ONAY SAYFASI

Üretim başlamadan önce kesinleştirilmesi gereken kararlar

No	Müşteri / proje müellifi tarafından onaylanacak konu	BOM'da kabul edilen çözüm
1	Şemada XT4N 250 TMD yazılmıştır; ABB ürün gamında böyle bir kombinasyon bulunmamaktadır.	XT3N 250 TMD 250, 4P seçilmiştir.
2	Ana kaçak akım koruması: şemada F tipi 0,03–30 A / 0–5 s istenmektedir.	ABB RC Sel Tip A, 0,03–10 A / 0,1–3 s seçilmiştir.
3	"AHU ısıtma" kolunda MPCB 140–200 A 100 kA ile XT3N 200 aynı anda gösterilmiştir.	Tek XT3N 250 TMD In=200 A, Icu 36 kA kabul edilmiştir; kısa devre hesabı gereklidir.
4	Gr.32'de 3P C16 ve 4P RCCB 25 A/30 mA birlikte gösterilmiştir.	Her iki cihaz BOM'a alınmıştır; üç fazlı yük olduğu onaylanmalıdır.
5	Priz RCBO'larının tipi şemada belirtilmemiştir; BOM'da DS201 AC bulunmaktadır.	AC tipi onaylanmalı veya Tip A ürünle değiştirilmelidir.
6	UMDP1 tek fazlı olmasına rağmen analizör 400/231 V, akım trafosu 40/5 A gösterilmiştir.	Analizör modeli netleştirilmelidir; BOM'da 50/5 A akım trafosu seçilmiştir.
7	UMDP1 manuel bypass şemada 2P'dir; ABB 1-0-2 şalter 4P seçilmiştir.	OT40F4C, 40 A, 4P seçimi onaylanmalıdır.
8	Tedarik kapsamı: 6 kVA UPS, acil kesme butonu ve KNX cihazları.	UPS ve KNX müşteri teminidir; butonun montaj yeri ve kutusu netleştirilmelidir.

KARAR: ☐ **ŞARTSIZ ONAYLANDI** ☐ **NOTLARLA ONAYLANDI** ☐ **ONAYLANMADI**

Müşteri / proje müellifi: _____ İmza: _____ Tarih: _____
