КОМПЛЕКТ ЩИТОВ

Проект 261007 | Алматы | CARLSBERG — перечень щитов, габариты, количество

R2 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ


№	Щит	Тип / обозначение	Корпус, В × Ш × Г, мм	Кол.
1	021.1-ГРЩ	021.1-MDB, насосная пожарного водопровода	540×400×220	3 компл.

Документ сформирован автоматически из Excel BOM (инструмент TEKLED uretim_onay v1.2). Размеры аппаратов — из библиотеки CHINT / ABB / IEK; позиции без подтверждённых размеров помечены KONTROL.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

P-01 | 021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg)

R2 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

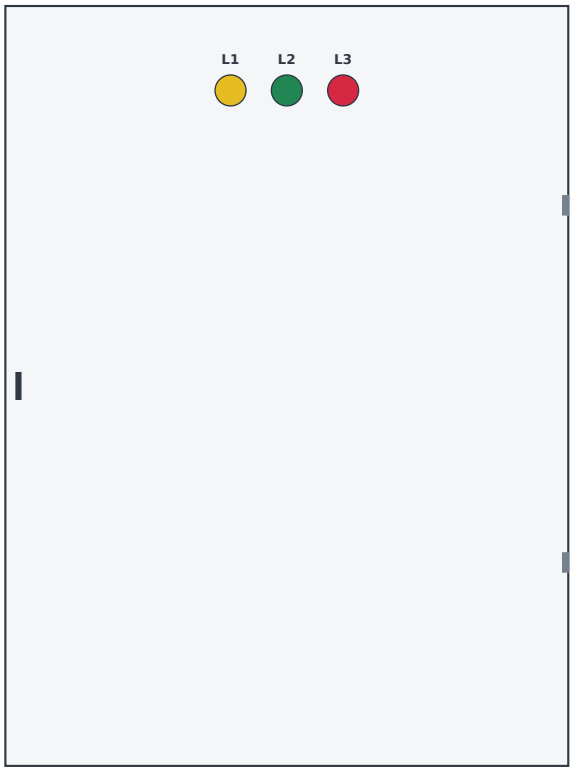

ФАСАД (масштабно)

Параметр	Исходные данные / проектное решение
Наименование	021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg)
Количество	3 компл.
Корпус / монтаж	Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP54 (TS)
Габариты (В × Ш × Г)	540 × 400 × 220
Защита	IP54
Ввод / сеть	S 203-C 100 ×1
Учёт	—
Аппаратура	ABB FH200 RCCB, ABB S200, ABB SH200
Дверь	Лампа сигнальная LED 230V AC CL2-523Y жёлтая ×1; Лампа сигнальная LED 230V AC CL2-523G зелёная ×1; Лампа сигнальная LED 230V AC CL2-523R красная ×1
Клеммы / шины N, PE	23 клемм ЗНИ; ШНИ 10 (N), ШНИ 8 (PE)
Резерв DIN	целевой 20%; расчёт — лист внутренней компоновки
Источник	Excel BOM; размеры — библиотека TEKLED (CHINT, ABB, IEK)

ЗАМЕЧАНИЯ / KONTROL

1. Клеммный ряд 288 / 300 мм — заполнен; ширина стопоров (условно 9 мм) — KONTROL
2. В схеме повторяются поз. обозначения: QF1 ×2; QF3 ×2; QF2 ×2 — маркировка аппаратов по наименованию линии (MDB-…); обозначения — KONTROL

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


P-01 | 021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg)

R2 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

ФАСАД / ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

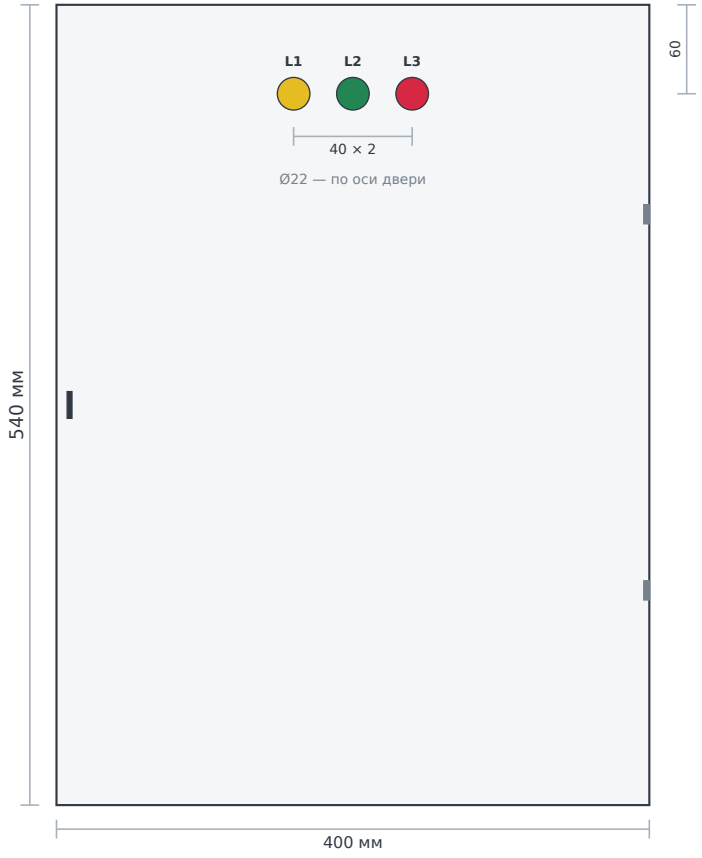


СБОКУ



СВЕРХУ



СНИЗУ / ВВОД



Зона ввода — привязка по рабочей схеме

Масштаб видов фасада/сбоку ≈ 1:5 при печати 100%. Размеры в мм.
Дверные приборы — по оси двери, отверстия Ø22; петли справа, ручка слева.


Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА И ДВЕРНЫЕ ОРГАНЫ

P-01 | 021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg)

R2 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ — РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ ПО БИБЛИОТЕКЕ (масштабно)

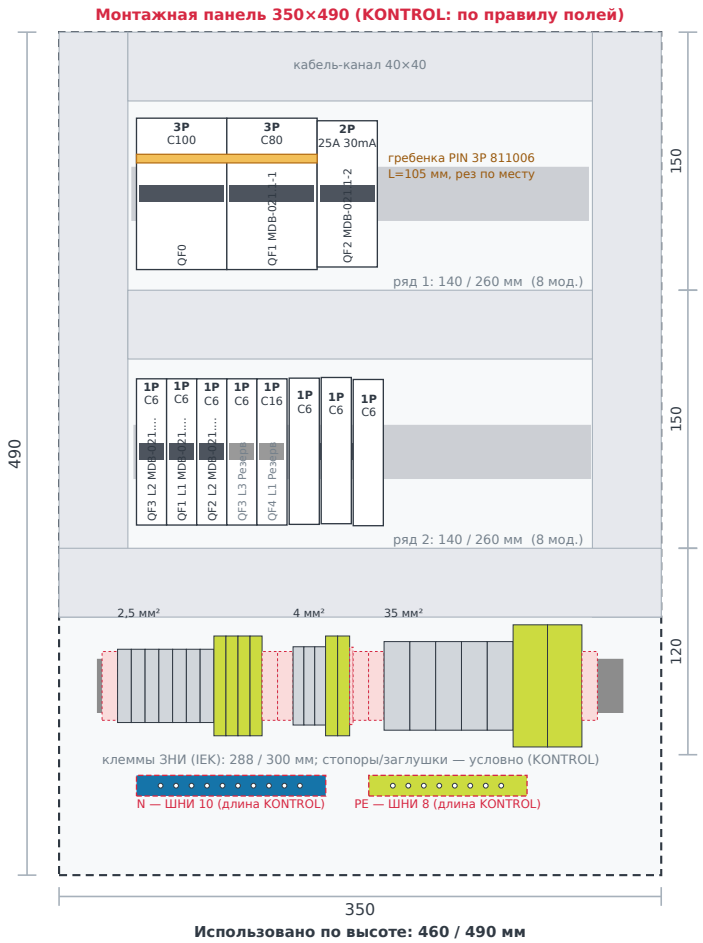

Использовано по высоте: 460 / 490 мм

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов.

КОМПОНОВКА / ПРОВЕРКИ

1. Аппараты (ABB): ширина по паспорту изготовителя — ABB S200/SH200 17,5 мм/полюс, FH202 35 мм; CHINT по каталогу.
2. Ряды: модульный 150 мм (канал 40 + аппарат), клеммный 120 мм, полоса N/PE 40 мм.
3. Порядок: ряд 1 — вводной и многополюсные аппараты, ряд 2 — однополюсные, резерв, цепи управления.
4. Вертикальные каналы заканчиваются над клеммным рядом; клеммная рейка на всю ширину панели.
5. Дверь заземляется проводом ПВ3 6 мм² с наконечниками JG-6 на шпильку корпуса.
6. Сигнальные лампы на двери — над верхним кабель-каналом; глубина лампы за дверью — KONTROL по паспорту.
7. Красные / пунктирные контуры — размер не подтверждён (KONTROL), показан условно.
8. Клеммный ряд 288 / 300 мм — заполнен; ширина стопоров (условно 9 мм) — KONTROL
9. В схеме повторяются поз. обозначения: QF1 ×2; QF3 ×2; QF2 ×2 — маркировка аппаратов по наименованию линии (MDB-…); обозначения — KONTROL

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

P-01 | 021.1-ГРЩ (021.1-MDB, насосная пожарного водопровода) (261007 carlsberg)

R2 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Количество — по Excel BOM на 1 щит; провода, наконечники, хомуты не включены. Часть 1/1.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.	Размер (Ш×В) / статус
1	Щит мет. ЩРн-2-2 PR (540x400x220) IP54 (TS)	714-15122	TEKSAN F	1	шт	400×540 [AD]
2	S 203-C 100	2CDS253001R0824	ABB	1	шт	52.5×88 [OK]
3	S 203-C 80	2CDS253001R0804	ABB	1	шт	52.5×88 [OK]
4	SH 201-C 6	2CDS211001R0064	ABB	3	шт	17.5×85 [OK]
5	SH 201-C 6	2CDS211001R0064	ABB	1	шт	17.5×85 [OK]
6	SH 201-C 16	2CDS211001R0164	ABB	1	шт	17.5×85 [OK]
7	SH 201-C 6	2CDS213001R0064	ABB	3	шт	52.5×85 [OK]
8	FH202 A-25/0.03	2CSF202102R1250	ABB	1	шт	35×85 [OK]
9	Лампа сигнальная LED 230V AC CL2-523Y жёлтая	1SFA619403R5233	ABB	1	шт	22×22 [OK]
10	Лампа сигнальная LED 230V AC CL2-523G зелёная	1SFA619403R5232	ABB	1	шт	22×22 [OK]
11	Лампа сигнальная LED 230V AC CL2-523R красная	1SFA619403R5231	ABB	1	шт	22×22 [OK]
12	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	130200361	EKT	1	шт	— [KONTROL]
13	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	130200365	EKT	1	шт	— [KONTROL]
14	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	811006	CHINT	0.2	шт	— [AD]
15	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	280100020	EKT	2.3	м	40×40 [AD]
16	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50)	130300223	EKT	7	шт	8×42.6 [OK]
17	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	5130300225	EKT	4	шт	7×58 [OK]
18	ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK(60)	130300041	EKT	3	шт	6.3×45.5 [OK]
19	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	5130300225	EKT	2	шт	7×58 [OK]
20	Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50A) серый IEK!!!	130300142	EKT	1	шт	— [KONTROL]
21	ЗНИ 35мм ² (125) серый IEK (30)	130300040	EKT	5	шт	15×51.5 [OK]
22	Зажим наборный ЗНИ-70PEN 70мм2 (JXB-земля) IEK	130300365	EKT	2	шт	20×71 [OK]
23	Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO	YZN11DF-003-K03	EKT	6	шт	— [KONTROL]

• Перед выпуском сверить артикулы и номиналы с утверждённой однолинейной/принципиальной схемой.
• Статус: OK — каталог/паспорт изготовителя (CHINT, ABB, IEK); AD — из наименования; CIZIM — чтение чертежа; KONTROL — нет подтверждённого размера.
• Провода, наконечники, хомуты, маркировка — по производственному BOM. DIN-рейки входят в комплект корпуса.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ KONTROL

Позиции без подтверждённых размеров / замечания компоновки

R2 | 07.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

P-01 021.1-ГРЩ

- Клеммный ряд 288 / 300 мм — заполнен; ширина стопоров (условно 9 мм) — KONTROL
- В схеме повторяются поз. обозначения: QF1 ×2; QF3 ×2; QF2 ×2 — маркировка аппаратов по наименованию линии (MDB-...); обозначения — KONTROL
- Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300) — ШНИ 8×12, 10 отв. — нет длины (на чертеже условно)
- Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300) — ШНИ 8×12, 8 отв. — нет длины (на чертеже условно)
- Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50A) серый IEK!!! — нет толщины заглушки (на чертеже условно 2 мм)
- Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO — нет ширины стопора (на чертеже условно 9 мм)

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____
