TEKLED

FAMILY PARK - BLOCK P, F04-29

ELEKTRİK PANOLARI ÜRETİM ONAY DOSYASI

Schneider Electric şalt malzemeleri | IP54 | TEKLED R1

Proje dokümanı	ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 - Status B
Reçete	260805_ADPAS_FamilyPark_Schneider_BOM_v1
Pano adedi	12 adet / 6 tip
Dosya revizyonu	00 - 06.08.2026
Durum	ÜRETİM ÖNCESİ MÜŞTERİ ONAYINA SUNULUR

ÖNEMLİ: IP sınıfı, korpus ölçüsü ve yangın sinyali kumanda gerilimi onay maddelerine bağlanmıştır.

PANO LİSTESİ

No	Pano	Adet	Ana giriş	Reçetedeki korpus	Onay ölçüsü	IP	Durum
1	**ЩС-ФК1**	2	iC60N 3P C63A	540x440x120 / 54M / IP54	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
2	**ЩС-ФК2**	2	iC60N 3P C63A	660x310x120 / 48M / IP31	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
3	**ЩС-ФК3**	2	C120N 3P C100A	540x600x120 / 72M / IP31	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
4	**ЩС-ФК4**	2	C120N 3P C125A	540x600x120 / 72M / IP31	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
5	**ЩС-КМ**	2	iC60N 3P C40A	540x440x120 / 54M / IP54	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
6	**ЩО-ФК**	2	iC60N 3P C20A	540x440x120 / 54M / IP54	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**

ZORUNLU ÜRETİM ŞARTLARI

1. Tüm korpuslar duvar tipi, metal, IP54, RAL 7035 elektrostatik toz boyalı ve kilitli kapaklı olacaktır.

2. Reçetedeki IP31 korpuslar proje genel notuna aykırıdır; üretimde kullanılmayacaktır. Bu dosyada 700x800x200 mm IP54 TEKLED korpus esas alınmıştır.

3. 54 modüllük seçimler %20 yedek alan ve klemens bölgesi sağlamadığından büyütülmüştür. Her panoda en az %20 elektriksel/mekanik yedek alan korunacaktır.

4. Çıkış klemensleri reçetede 0 adet görünmektedir. Üretimde tüm giriş/çıkış iletkenleri numaralı klemens üzerinden bağlanacak; N ve PE baraları ayrı olacaktır.

5. Yangın alarmı ile durdurulacak ekipman kontaktörleri için kumanda gerilimi, proje yorumuna uygun 24 VDC arayüz/besleme çözümü netleşmeden devreye alma yapılmayacaktır.


6. Faz dağılımı montaj sırasında dengelenecek; cihaz, kablo ve klemens etiketleri tek hat devre numaralarıyla birebir eşleştirilecektir.


7. Kapakta yalnız pano etiketi ve gerekli uyarı işaretleri bulunur. Kumanda elemanları ayrıca onaylanmadıkça kapak üzerine açılmaz.

8. IEC 61439 rutin doğrulamaları: süreklilik, izolasyon, dielektrik, mekanik çalışma, tork ve fonksiyon testi kayıt altına alınacaktır.


TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035

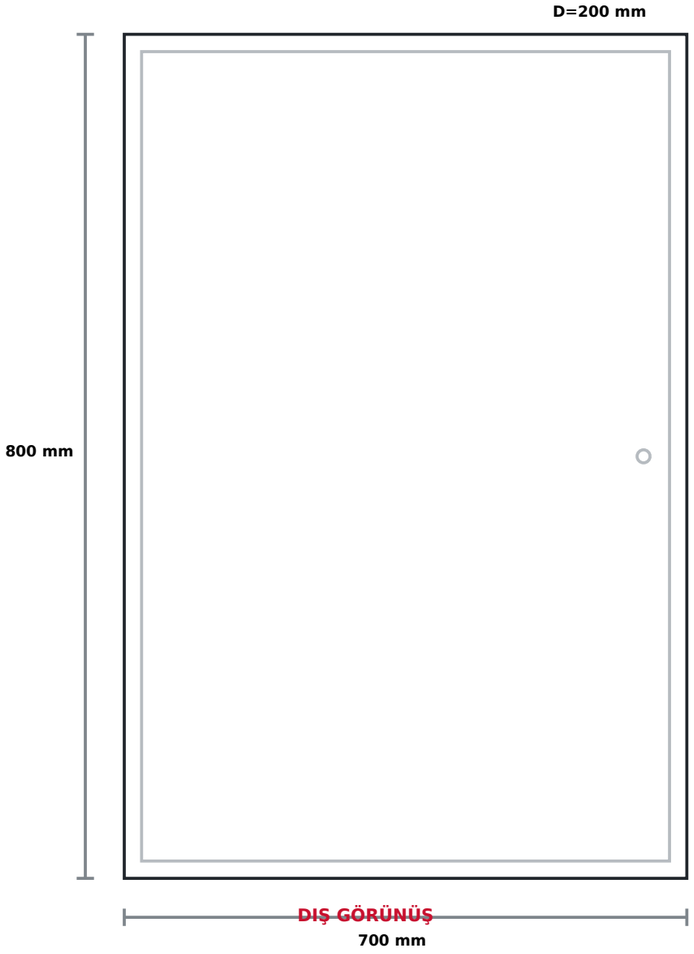

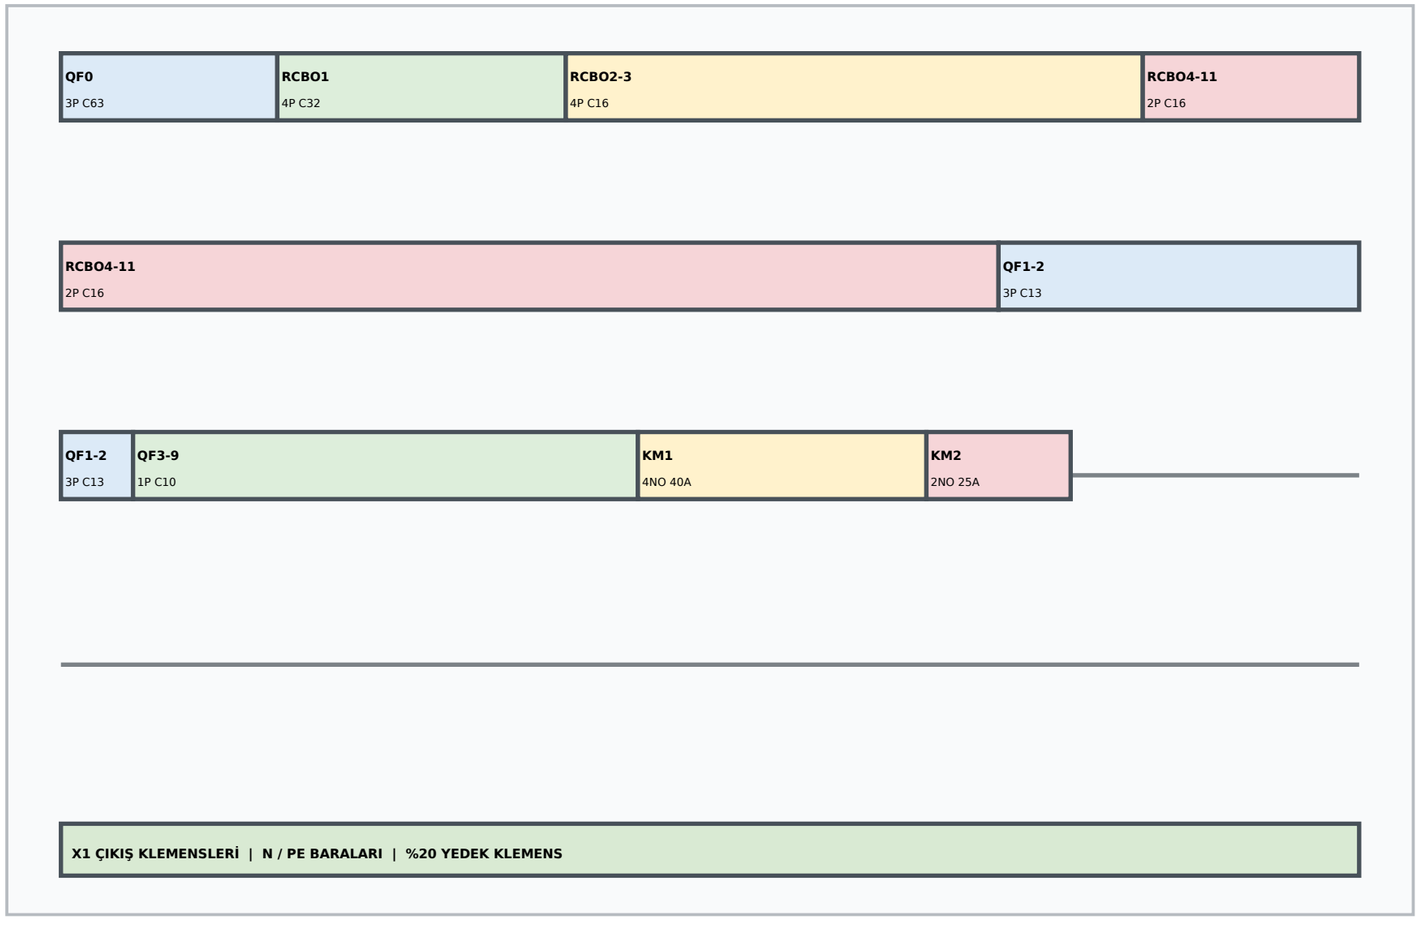

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU




CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C63 (3M) RCBO1: 4P C32 (4M) RCBO2-3: 4P C16 (8M) RCBO4-11: 2P C16 (16M) QF1-2: 3P C13 (6M) QF3-9: 1P C10 (7M) KM1: 4NO 40A (4M) KM2: 2NO 25A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩС-ФК1 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B

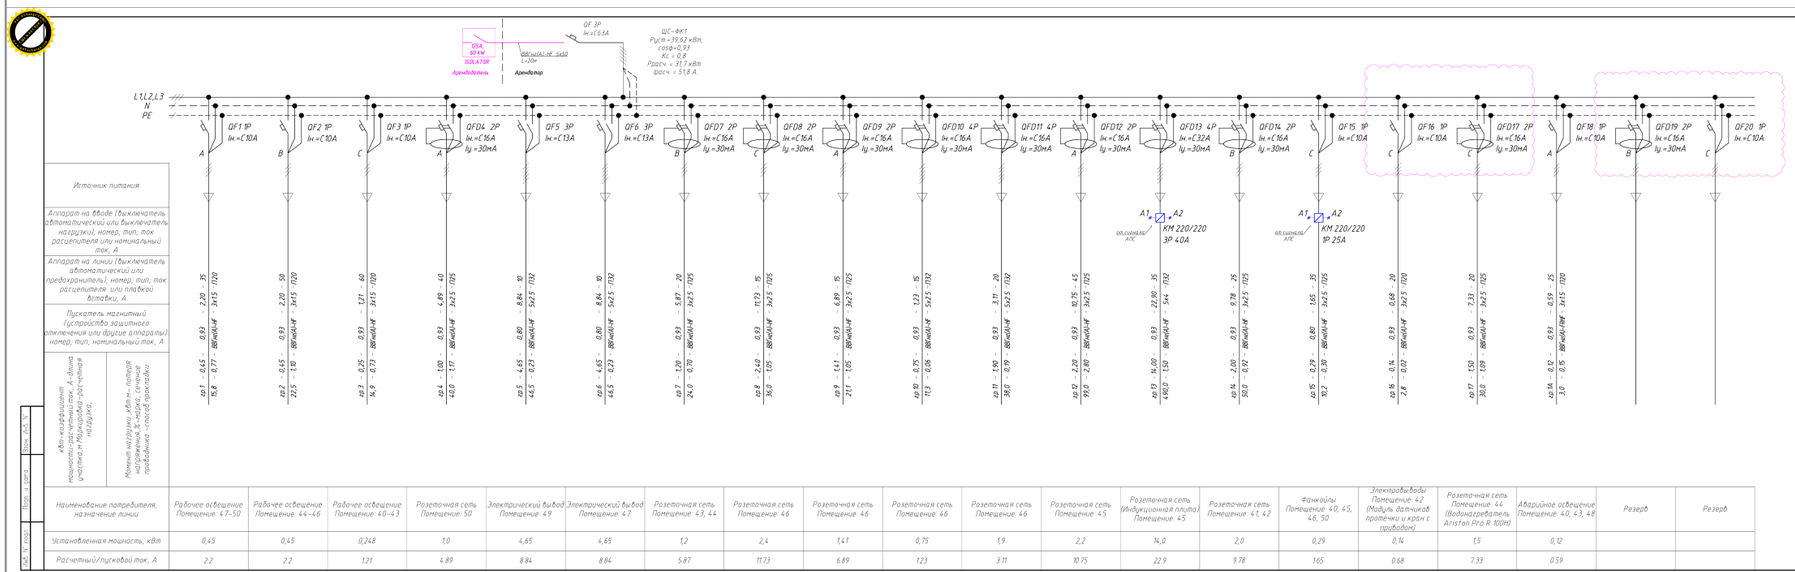

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил, напряжение	Марка	
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-FRHF
5х50, 0,66	20м	
5х4, 0,66	35м	
5х2,5, 0,66	55м	
3х2,5, 0,66	235м	
3х1,5, 0,66	145м	25м

Потребность труб

Обозначение	Диаметр, мм	Длина, м
П32	32	63
П25	25	175
П20	20	119

– Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220
Напряжение управления
Напряжение коммутации

P_{A}= 5.18кВт
P_{B}= 4.65кВт
P_{C}= 4.578кВВт


Pcp= $(P_A + P_B + P_C)/3 = (5,18 + 4,65 + 4,578)/3 = 4,8$


dP=((Pмакс – Pcp)/Pcp) *100% = ((5,18 – 4,8)/4,8) * 100%= 7,8%

									ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001
rev02	2								«Family Park Abu Dhabi Plaza»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
ГИП		Наименование			07.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Наименование			07.26		РД	2	
Проверил		Наименование			07.26				
						Однолинейная схема щита ЩС-ФК1	ТОО «NED GROUP»		


Формат А4х3

Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035

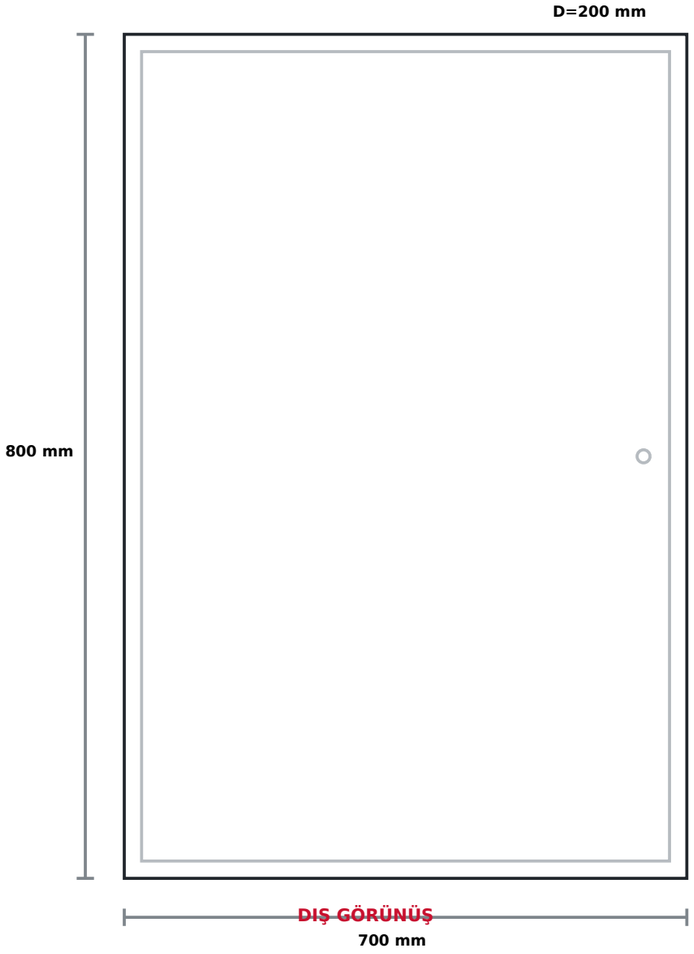

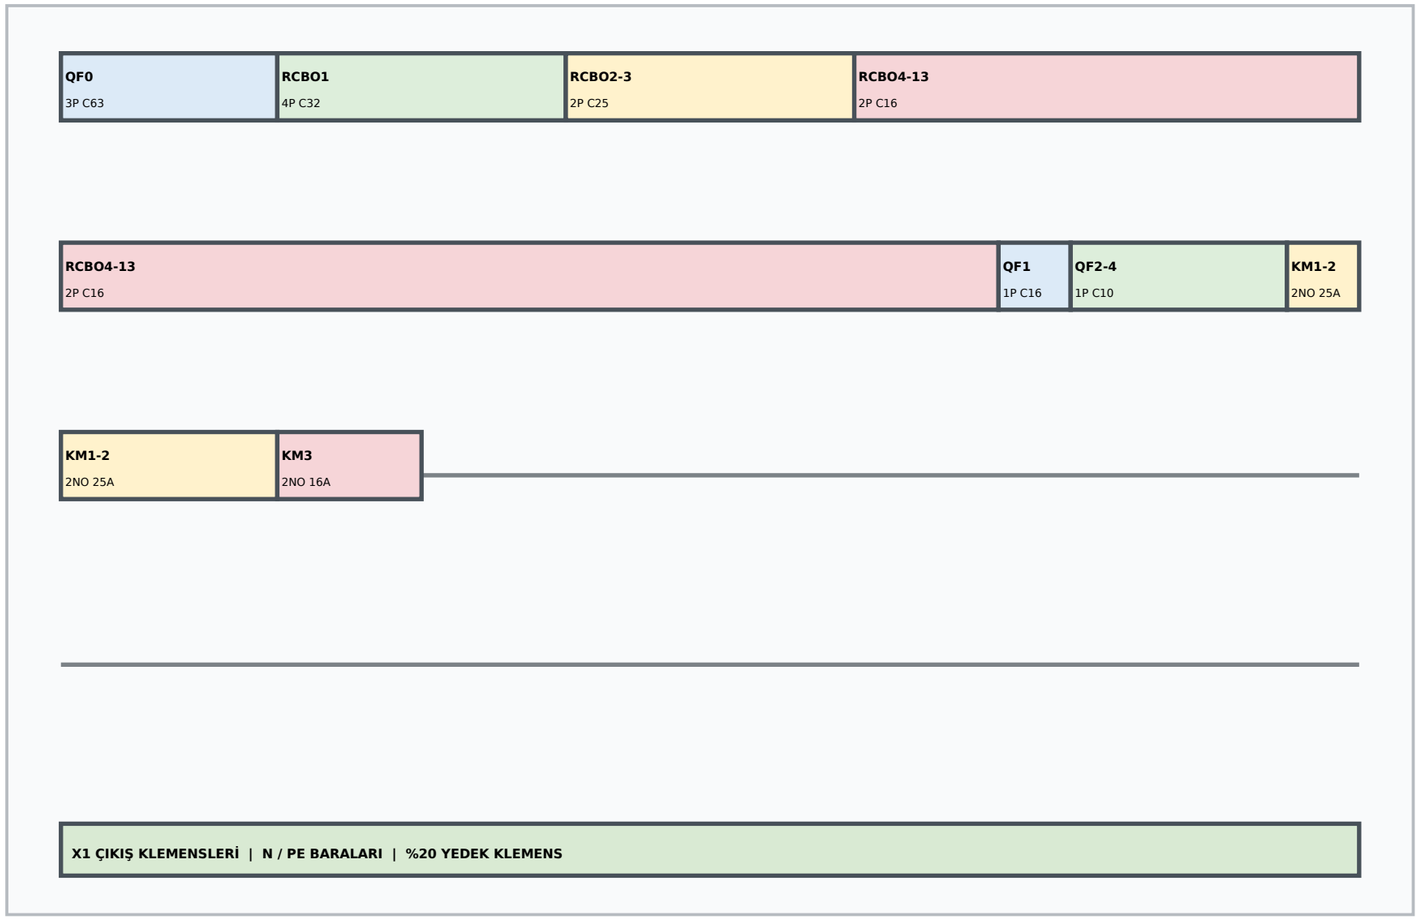

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm

CİHAZ / MODÜL ÖZETİ


QF0: 3P C63 (3M) RCBO1: 4P C32 (4M) RCBO2-3: 2P C25 (4M) RCBO4-13: 2P C16 (20M) QF1: 1P C16 (1M) QF2-4: 1P C10 (3M) KM1-2: 2NO 25A (4M)

KM3: 2NO 16A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩС-ФК2 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B

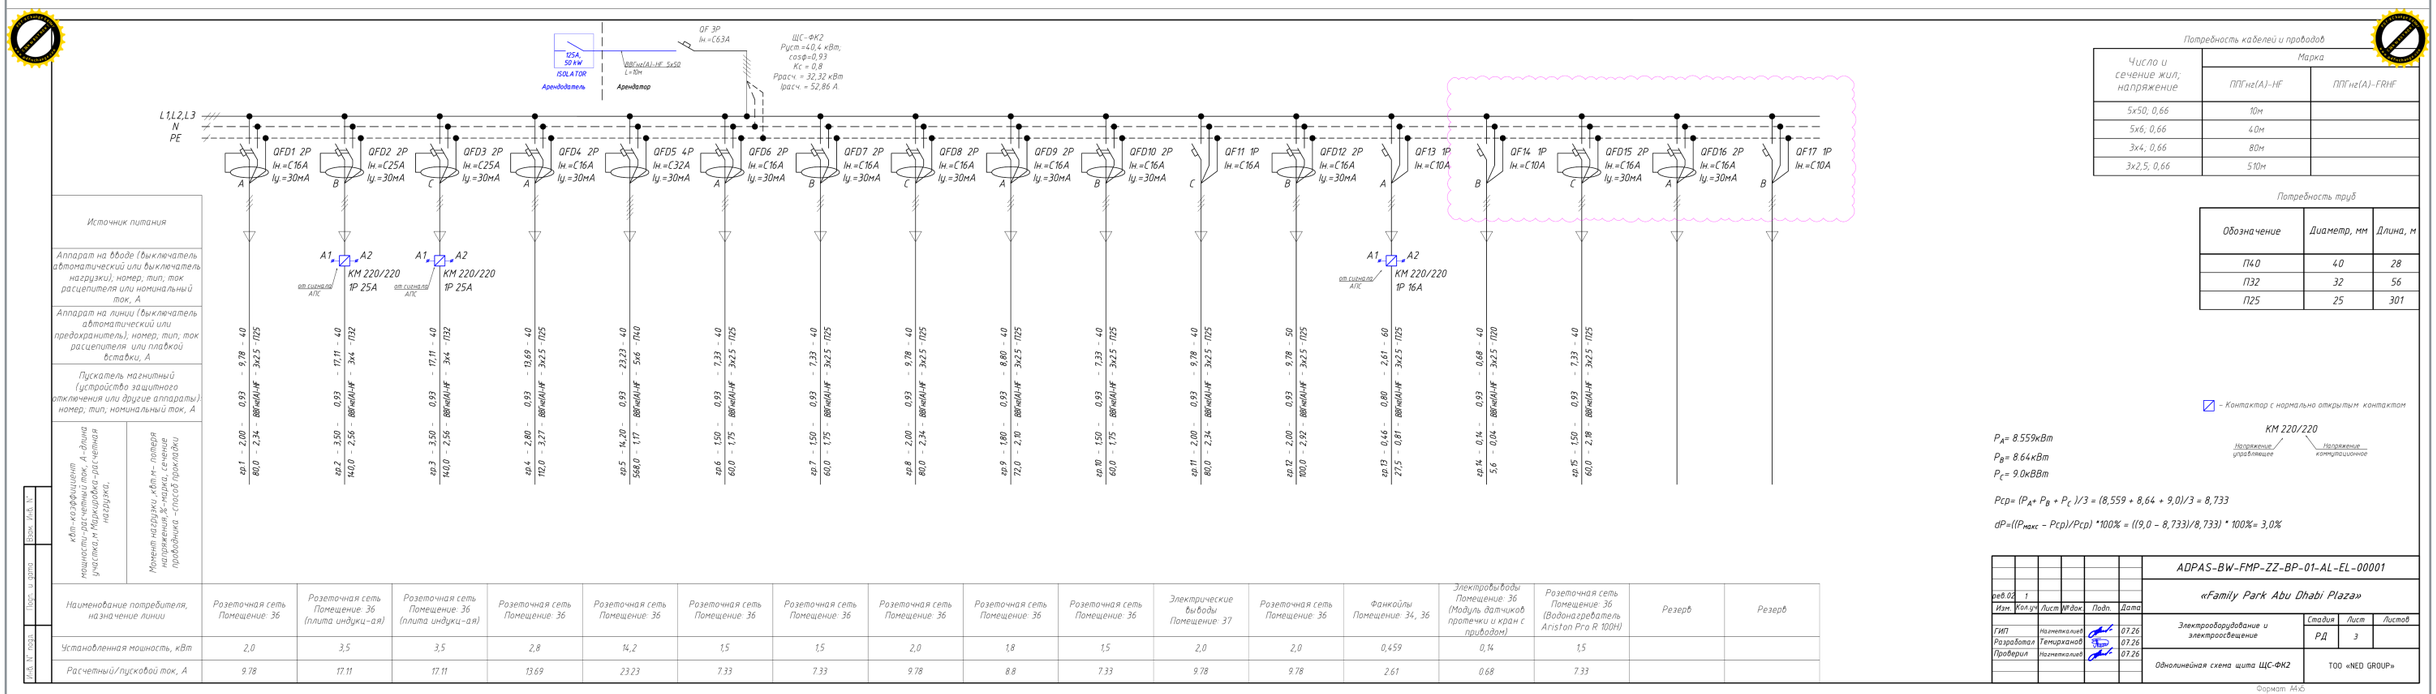

Источник питания																	
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки), номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А																	
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель), номер, тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А																	
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты), номер, тип, номинальный ток, А																	
Кол-во однофазных машин, подключенных к линии; А-длина участка, м; Марка ВВГнг(А)-LS-расчетная нагрузка.	кр.1 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 40 80,0 – 2,34 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.2 – 3,50 – 0,93 – 17,11 – 40 140,0 – 2,56 – ВВГнг(А)-HF – 3х4 – П32	кр.3 – 3,50 – 0,93 – 17,11 – 40 140,0 – 2,56 – ВВГнг(А)-HF – 3х4 – П32	кр.4 – 2,80 – 0,93 – 13,69 – 40 112,0 – 3,27 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.5 – 14,20 – 0,93 – 23,23 – 40 568,0 – 1,17 – ВВГнг(А)-HF – 5х6 – П40	кр.6 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40 60,0 – 1,75 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.7 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40 60,0 – 1,75 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.8 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 40 80,0 – 2,34 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.9 – 1,80 – 0,93 – 8,80 – 40 72,0 – 2,10 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.10 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40 60,0 – 1,75 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.11 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 40 80,0 – 2,34 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.12 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 50 100,0 – 2,92 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.13 – 0,46 – 0,80 – 2,61 – 60 27,5 – 0,81 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	кр.14 – 0,14 – 0,93 – 0,68 – 40 5,6 – 0,04 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П20	кр.15 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40 60,0 – 2,18 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25		
Момент нагрузки кВт·м – потеря напряжения %; марка, сечение проводника - способ прокладки																	
Наименование потребителя, назначение линии	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36 (плита индукц-ая)	Розеточная сеть Помещение: 36 (плита индукц-ая)	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Электрические выводы Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 36	Фанкойлы Помещение: 34, 36	Электроприводы Помещение: 36 (Модуль датчиков протечки и кран с приводом)	Розеточная сеть Помещение: 36 (Водонагреватель Ariston Pro R 100H)	Резерв	Резерв
Установленная мощность, кВт	2,0	3,5	3,5	2,8	14,2	1,5	1,5	2,0	1,8	1,5	2,0	2,0	0,459	0,14	1,5		
Расчетный/пусковой ток, А	9.78	17.11	17.11	13.69	23.23	7.33	7.33	9.78	8.8	7.33	9.78	9.78	2.61	0.68	7.33		

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил; напряжение	Марка	
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-FRHF
5х50; 0,66	10м	
5х6; 0,66	40м	
3х4; 0,66	80м	
3х2,5; 0,66	510м	

Потребность труб

Обозначение	Диаметр, мм	Длина, м
П40	40	28
П32	32	56
П25	25	301

– Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220
Напряжение управляющее / Напряжение коммутационное

P_A= 8.559кВт
P_B= 8.64кВт
P_C= 9.0кВВт

$Pcp = (P_A + P_B + P_C)/3 = (8,559 + 8,64 + 9,0)/3 = 8,733$


$dP = ((P_{макс} - Pcp)/Pcp) * 100\% = ((9,0 - 8,733)/8,733) * 100\% = 3,0\%$


						ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001	
						«Family Park Abu Dhabi Plaza»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РД; Лист: 3; Листов:
ГИП		Нагметкалиев			07.26		
Разработал		Темирханов			07.26		
Проверил		Нагметкалиев			07.26	Однолинейная схема щита ЩС-ФК2	ТОО «NED GROUP»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№


Формат А4.

Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035

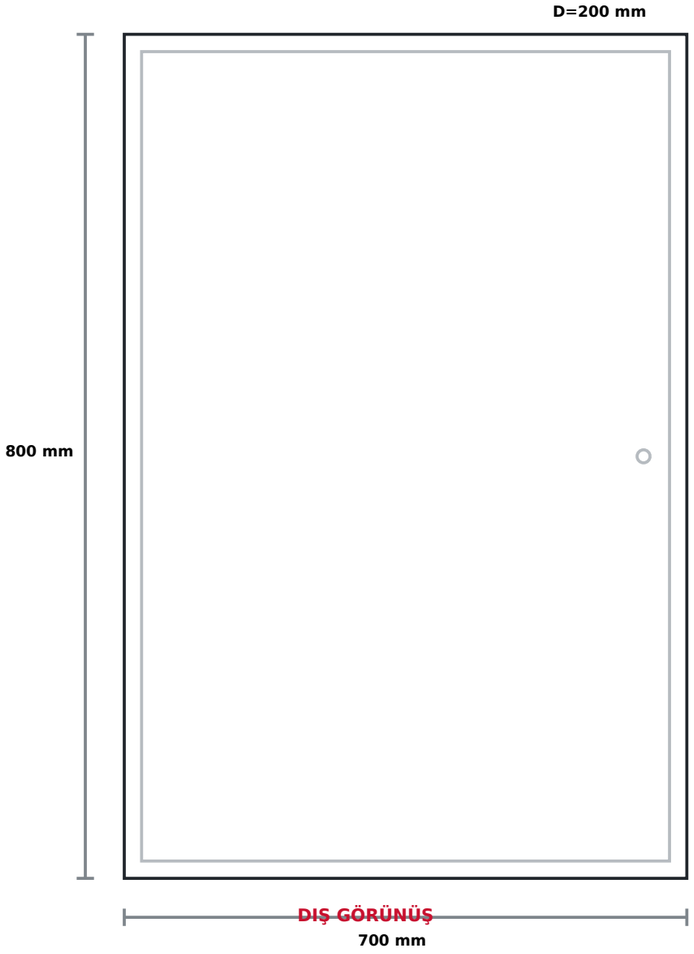

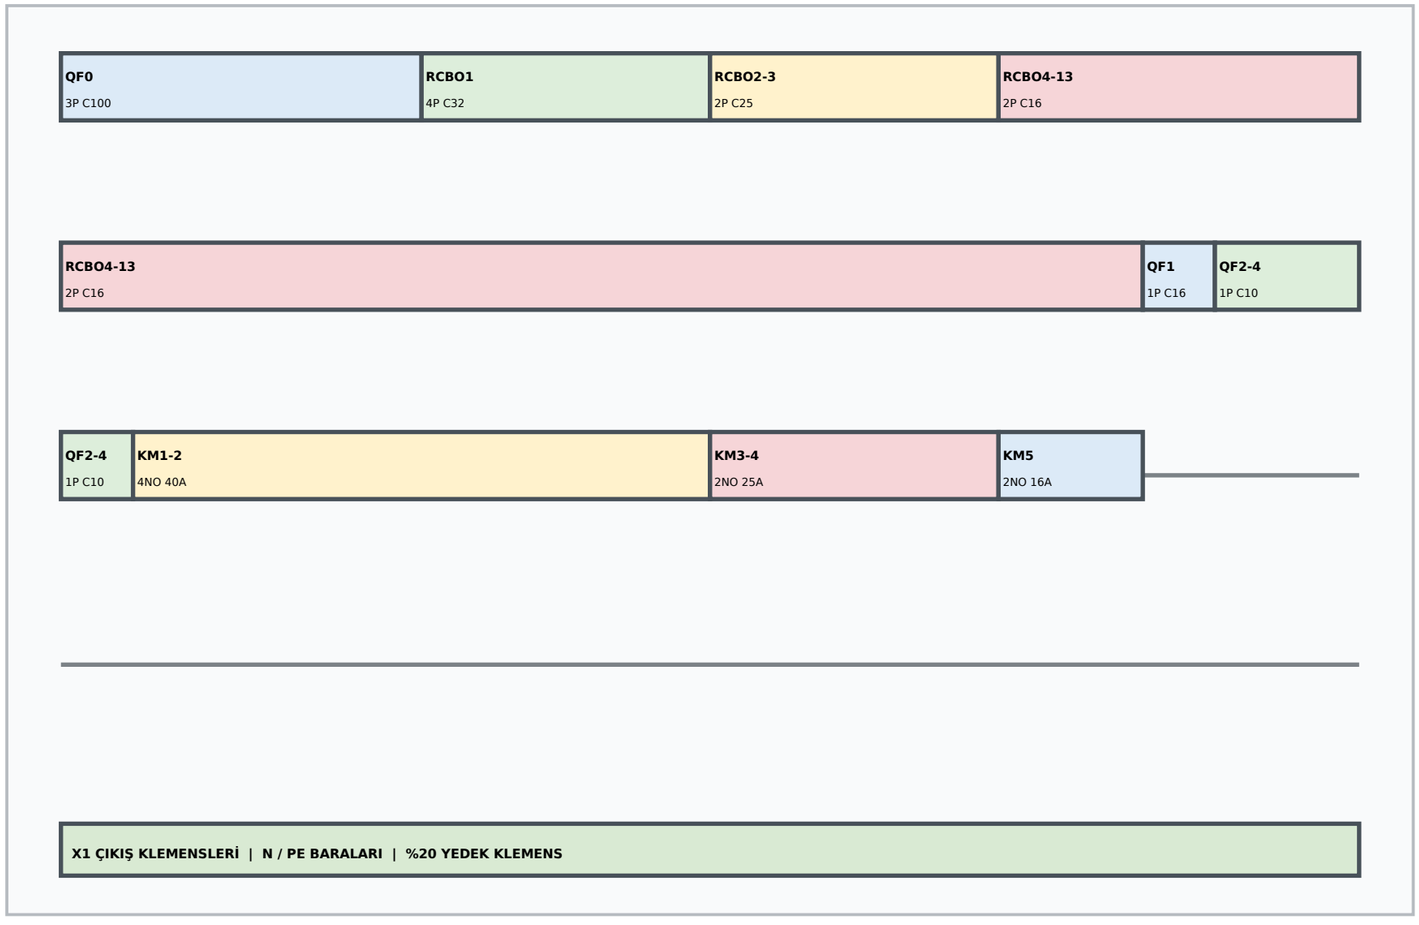

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU




CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C100 (5M) | RCBO1: 4P C32 (4M) | RCBO2-3: 2P C25 (4M) | RCBO4-13: 2P C16 (20M) | QF1: 1P C16 (1M) | QF2-4: 1P C10 (3M) | KM1-2: 4NO 40A (8M) | KM3-4: 2NO 25A (4M) | KM5: 2NO 16A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩС-ФК3 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B

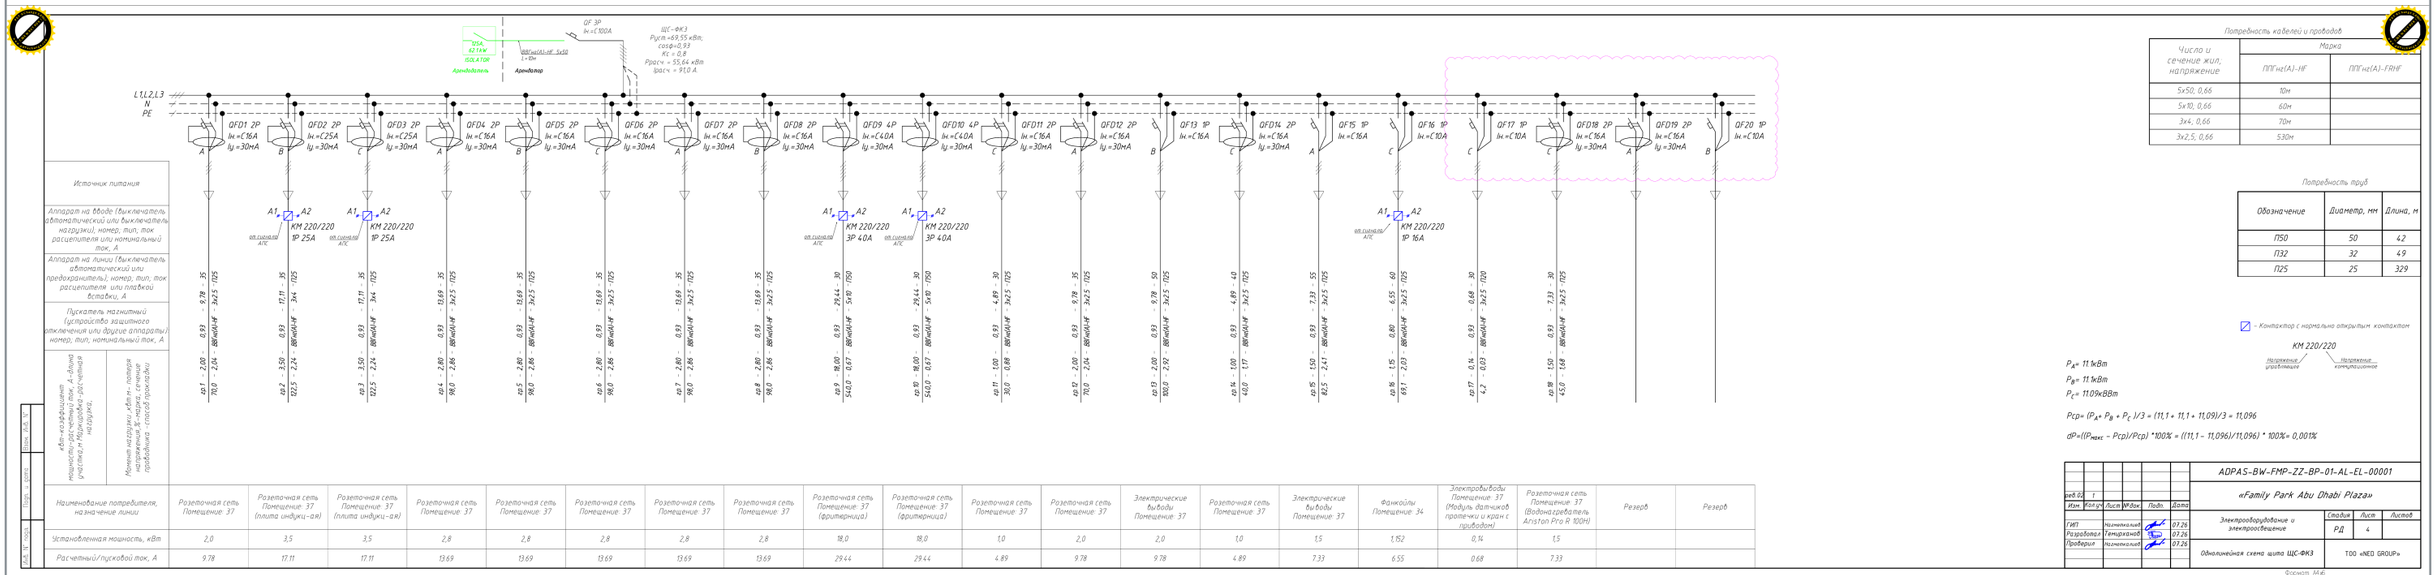

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил, напряжение	Марка	
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-FRHF
5х50, 0,66	10м	
5х10, 0,66	60м	
3х4; 0,66	70м	
3х2,5; 0,66	530м	

Потребность труб

Обозначение	Диаметр, мм	Длина, м
П50	50	42
П32	32	49
П25	25	329

– Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220 (Напряжение управления / Напряжение коммутации)

P_{A}= 11,1кВт

P_{B}= 11,1кВт

P_{C}= 11,09кВВт


Pср= $(P_A + P_B + P_C)/3$ = (11,1 + 11,1 + 11,09)/3 = 11,096

dP=((Pмакс – Pср)/Pср) *100% = ((11,1 – 11,096)/11,096) * 100%= 0,001%


							ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001
rev02	1						«Family Park Abu Dhabi Plaza»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
ГИП		Начальник			07.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РД; Лист: 4; Листов:
Разработал		Гендиректор			07.26		
Проверил		Начальник			07.26	Однолинейная схема щита ЩС-ФК3	ТОО «NEO GROUP»

Формат А4х3


Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035

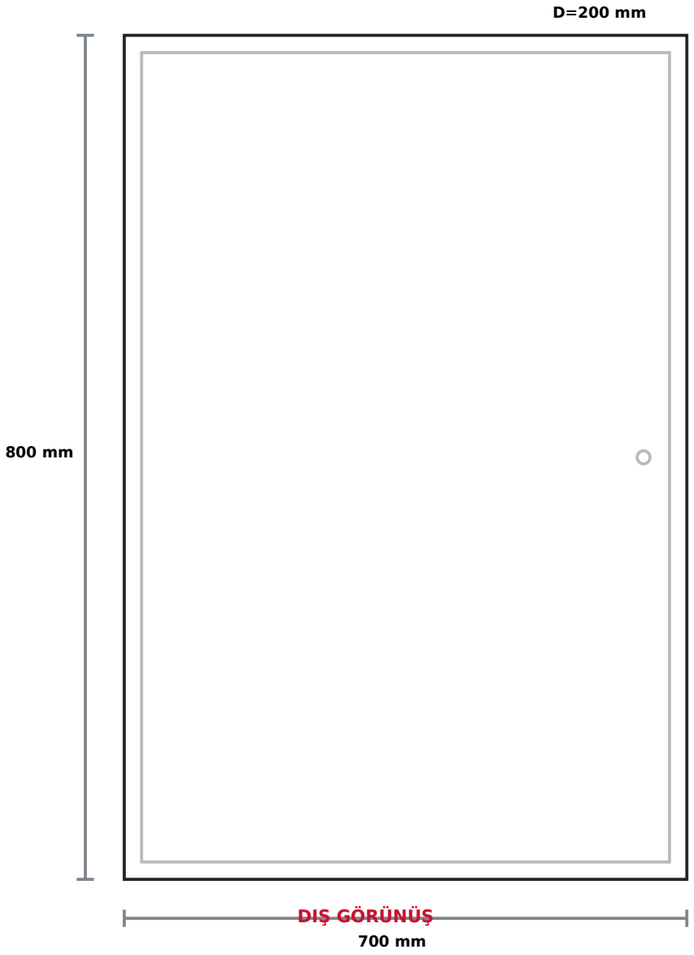

DIŞ GÖRÜNÜŞ

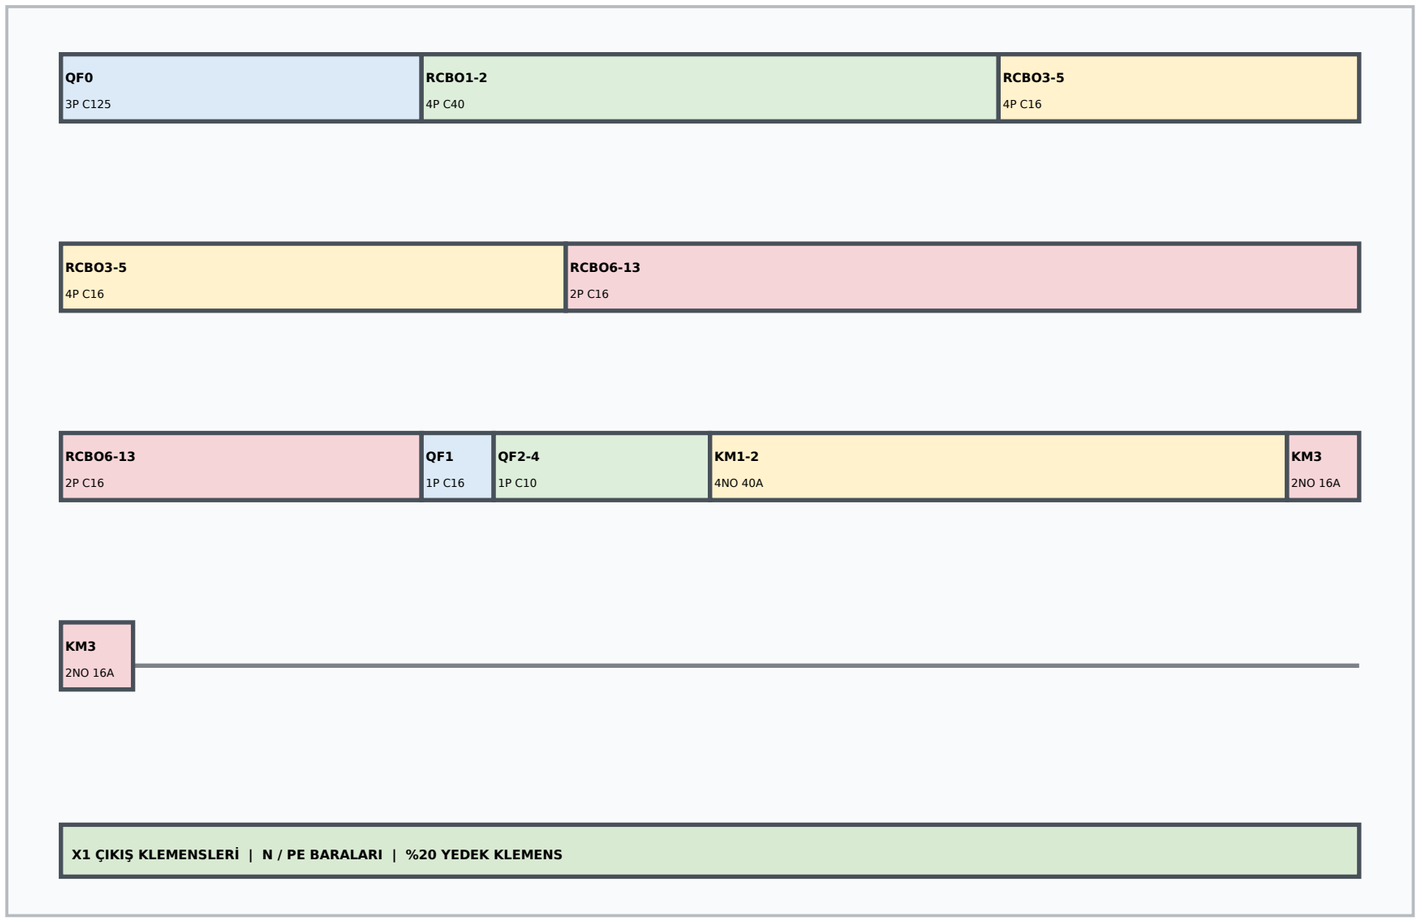

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm


CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C125 (5M) | RCBO1-2: 4P C40 (8M) | RCBO3-5: 4P C16 (12M) | RCBO6-13: 2P C16 (16M) | QF1: 1P C16 (1M) | QF2-4: 1P C10 (3M) | KM1-2: 4NO 40A (8M) | KM3: 2NO 16A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩС-ФК4 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B

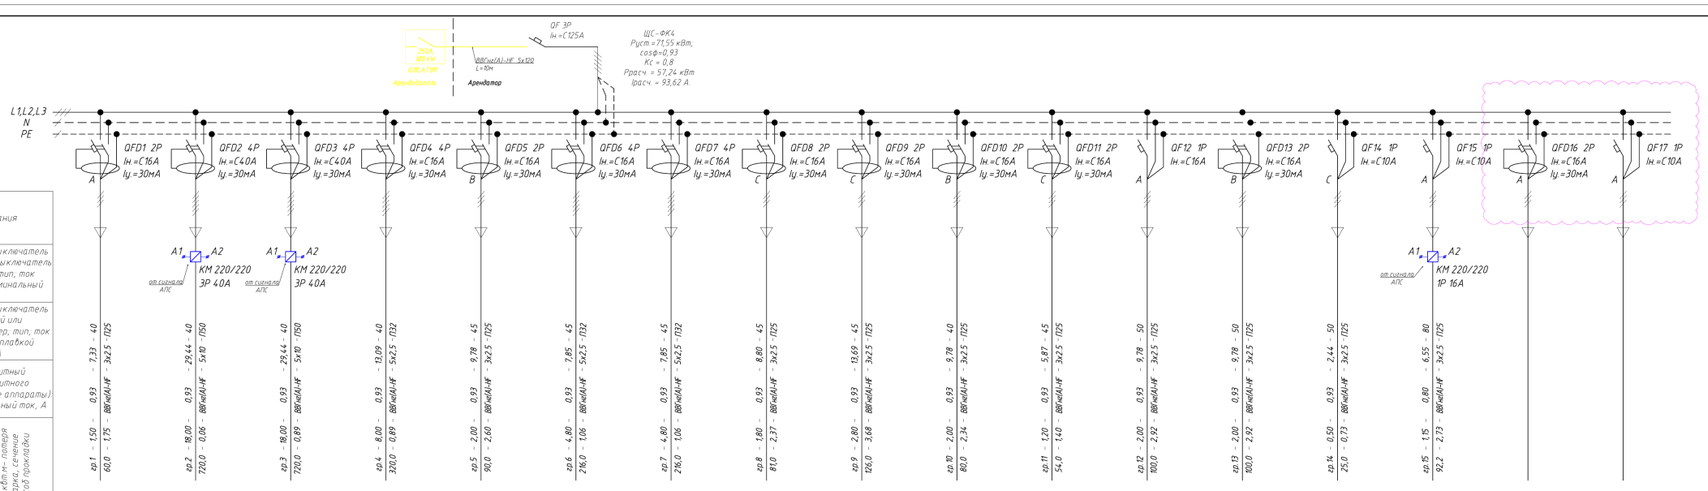

Наименование потребителя, назначение линии	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35 (фритюрница)	Розеточная сеть Помещение: 35 (фритюрница)	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Электрические выводы Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Электрические выводы Помещение: 35	Фанкойлы Помещение: 34, 35	Резерв	Резерв
Установленная мощность, кВт	1,5	18,0	18,0	8,0	2,0	4,8	4,8	1,8	2,8	2,0	1,2	2,0	2,0	0,5	1,152		
Расчетный/пусковой ток, А	7.33	29.44	29.44	13.09	9.78	7.85	7.85	8.8	13.69	9.78	5.87	9.78	9.78	2.44	6.55		
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А	ЭР 40А	КМ 220/220 ЭР 40А	КМ 220/220 ЭР 40А	1Р 16А													
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер, тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А	1,50 / 60,0	18,00 / 720,0	18,00 / 720,0	8,00 / 320,0	2,00 / 90,0	4,80 / 216,0	4,80 / 216,0	1,80 / 81,0	2,80 / 126,0	2,00 / 80,0	1,20 / 54,0	2,00 / 100,0	2,00 / 100,0	0,50 / 25,0	1,15 / 92,2		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер, тип, номинальный ток, А	0,93 / 1,75	0,93 / 0,86	0,93 / 0,89	0,93 / 0,89	0,93 / 2,60	0,93 / 1,08	0,93 / 1,08	0,93 / 2,37	0,93 / 3,68	0,93 / 2,34	0,93 / 1,40	0,93 / 2,92	0,93 / 2,92	0,93 / 0,73	0,80 / 2,73		
Кабель-конфигурация: количество жил, сечение жил, А-алюм. проводник, М-медь, материал изоляции, оболочки	ВВГнг(А)-HF 3х2,5	ВВГнг(А)-HF 5х10	ВВГнг(А)-HF 5х10	ВВГнг(А)-HF 5х2,5	ВВГнг(А)-HF 3х2,5	ВВГнг(А)-HF 5х2,5	ВВГнг(А)-HF 5х2,5	ВВГнг(А)-HF 3х2,5	ВВГнг(А)-HF 3х2,5	ВВГнг(А)-HF 3х2,5	ВВГнг(А)-HF 3х2,5	ВВГнг(А)-HF 3х2,5	ВВГнг(А)-HF 3х2,5	ВВГнг(А)-HF 3х2,5	ВВГнг(А)-HF 3х2,5		
Момент нагрузки, кВт·м - потеря напряжения %- марка, сечение проводника -способ прокладки	ср.1 - 1,50 - 60,0	ср.2 - 18,00 - 720,0	ср.3 - 18,00 - 720,0	ср.4 - 8,00 - 320,0	ср.5 - 2,00 - 90,0	ср.6 - 4,80 - 216,0	ср.7 - 4,80 - 216,0	ср.8 - 1,80 - 81,0	ср.9 - 2,80 - 126,0	ср.10 - 2,00 - 80,0	ср.11 - 1,20 - 54,0	ср.12 - 2,00 - 100,0	ср.13 - 2,00 - 100,0	ср.14 - 0,50 - 25,0	ср.15 - 1,15 - 92,2		

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил; напряжение	Марка	
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-FRHF
5х120; 0,66	10м	
5х10; 0,66	80м	
5х2,5; 0,66	130м	
3х2,5; 0,66	560м	

Потребность труб

Обозначение	Диаметр, мм	Длина, м
П50	50	63
П32	32	175
П25	25	175
П20	20	119

- Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220 (Напряжение управляющее / Напряжение коммутационное)


P_A= 4.653кВт
P_B= 6.0кВт
P_C= 6.3кВВт

$Pcp = (P_A + P_B + P_C)/3 = (4,653 + 6,0 + 6,3)/3 = 5,651$


$dP=((P_{макс} - Pcp)/Pcp) * 100\% = ((6,3 - 5,651)/5,651) * 100\% = 11,48\%$

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№					


Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035

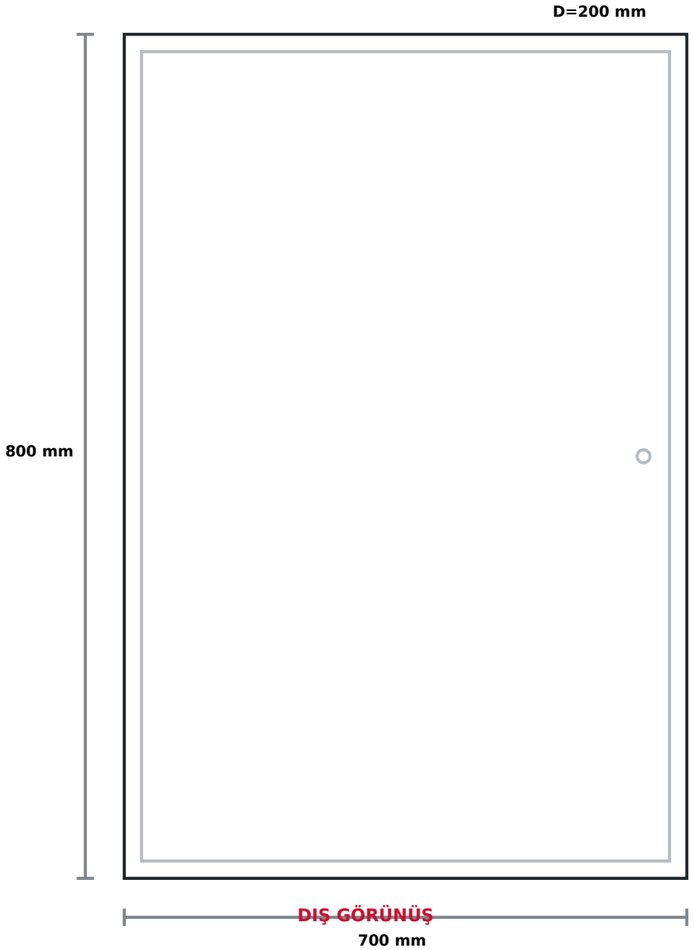

DIŞ GÖRÜNÜŞ

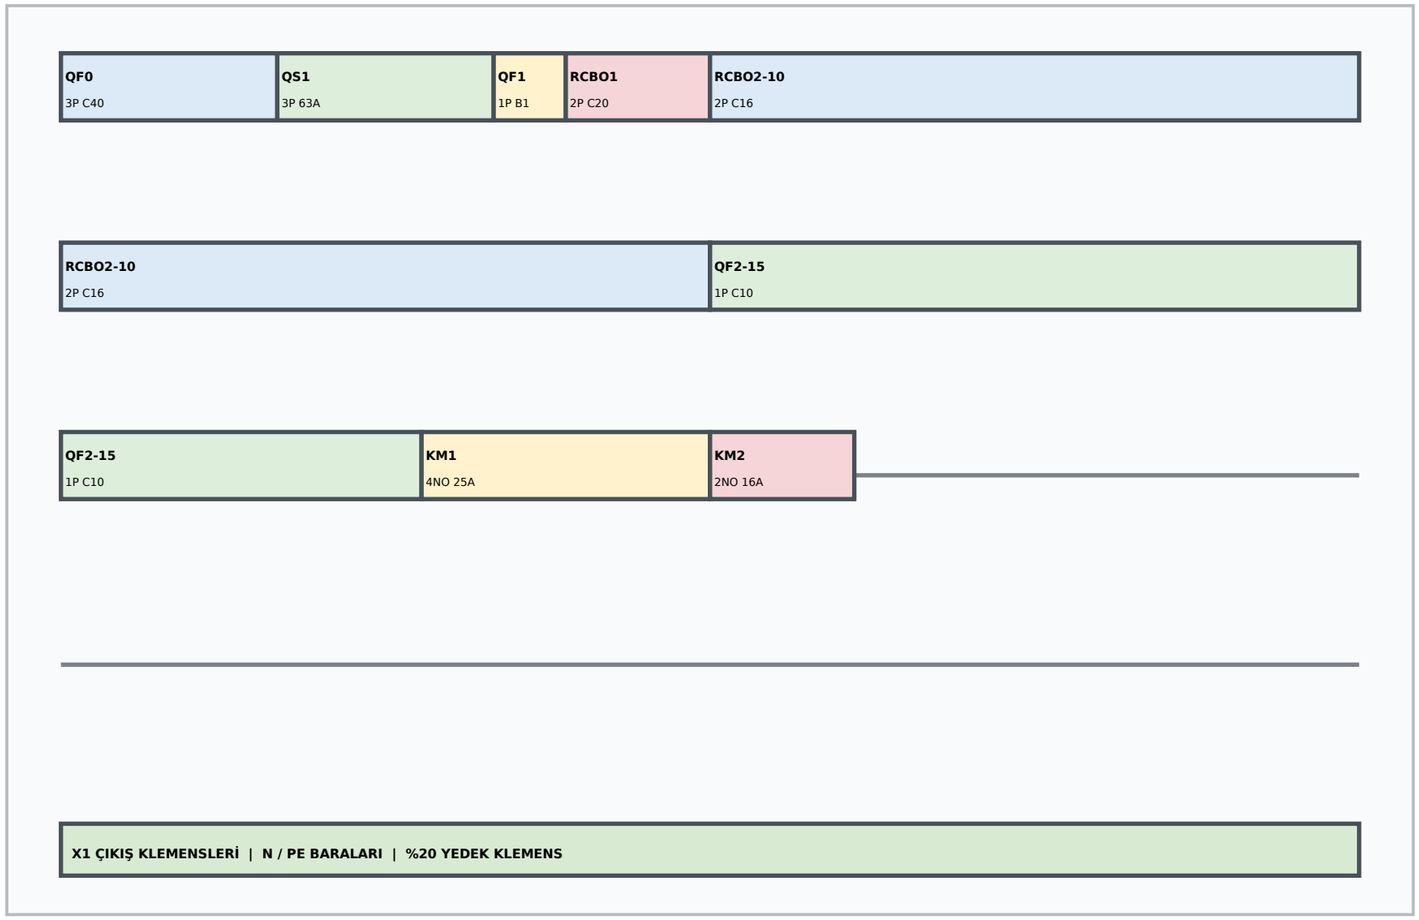

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm


CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C40 (3M) QS1: 3P 63A (3M) QF1: 1P B1 (1M) RCBO1: 2P C20 (2M) RCBO2-10: 2P C16 (18M) QF2-15: 1P C10 (14M) KM1: 4NO 25A (4M) KM2: 2NO 16A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩС-КМ | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B

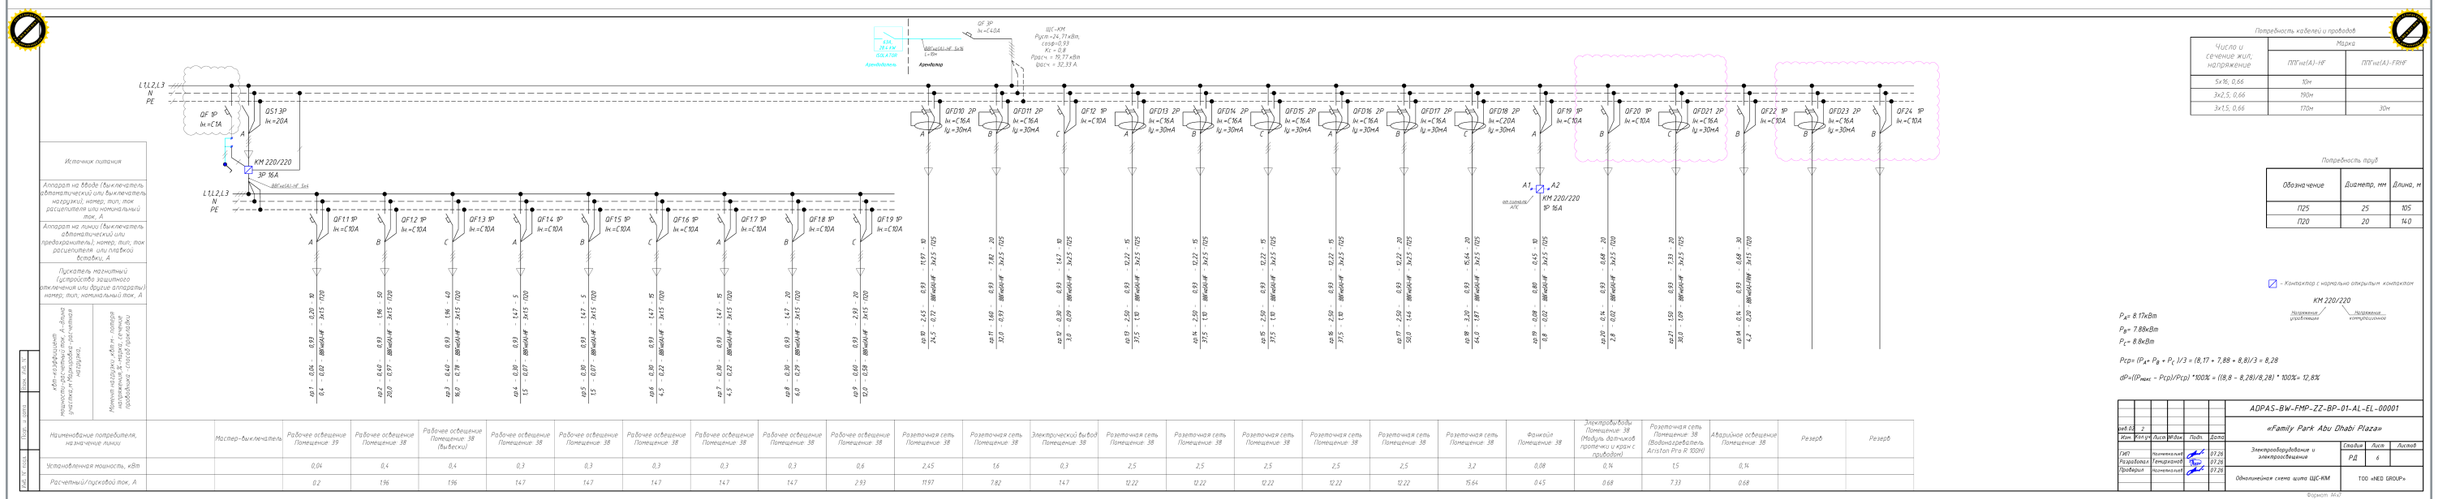

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил, напряжение	Марка	
	ППГнг(А)-НГ	ППГнг(А)-FRHF
5х16, 0,66	10м	
3х2,5, 0,66	150м	
3х1,5, 0,66	170м	30м

Потребность труб

Обозначение	Диаметр, мм	Длина, м
П25	25	105
П20	20	140

- Контактор с нормально открытым контактом


КМ 220/220
Напряжение управления
Напряжение контролируемое


P_{A}= 8.17кВт
P_{B}= 7.88кВт
P_{C}= 8.8кВт

$P_{СР}= (P_A+P_B+P_C)/3 = (8,17+7,88+8,8)/3 = 8,28$


$dP=(P_{макс}-P_{СР})/P_{СР})*100\% = (8,8-8,28)/8,28)*100\% = 12,6\%$

Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035

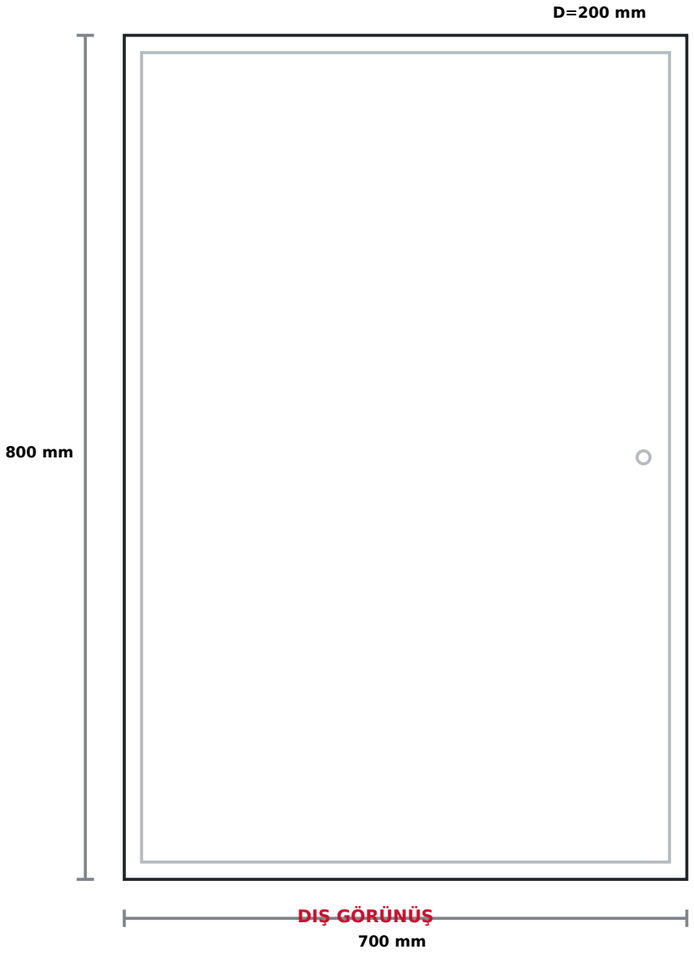

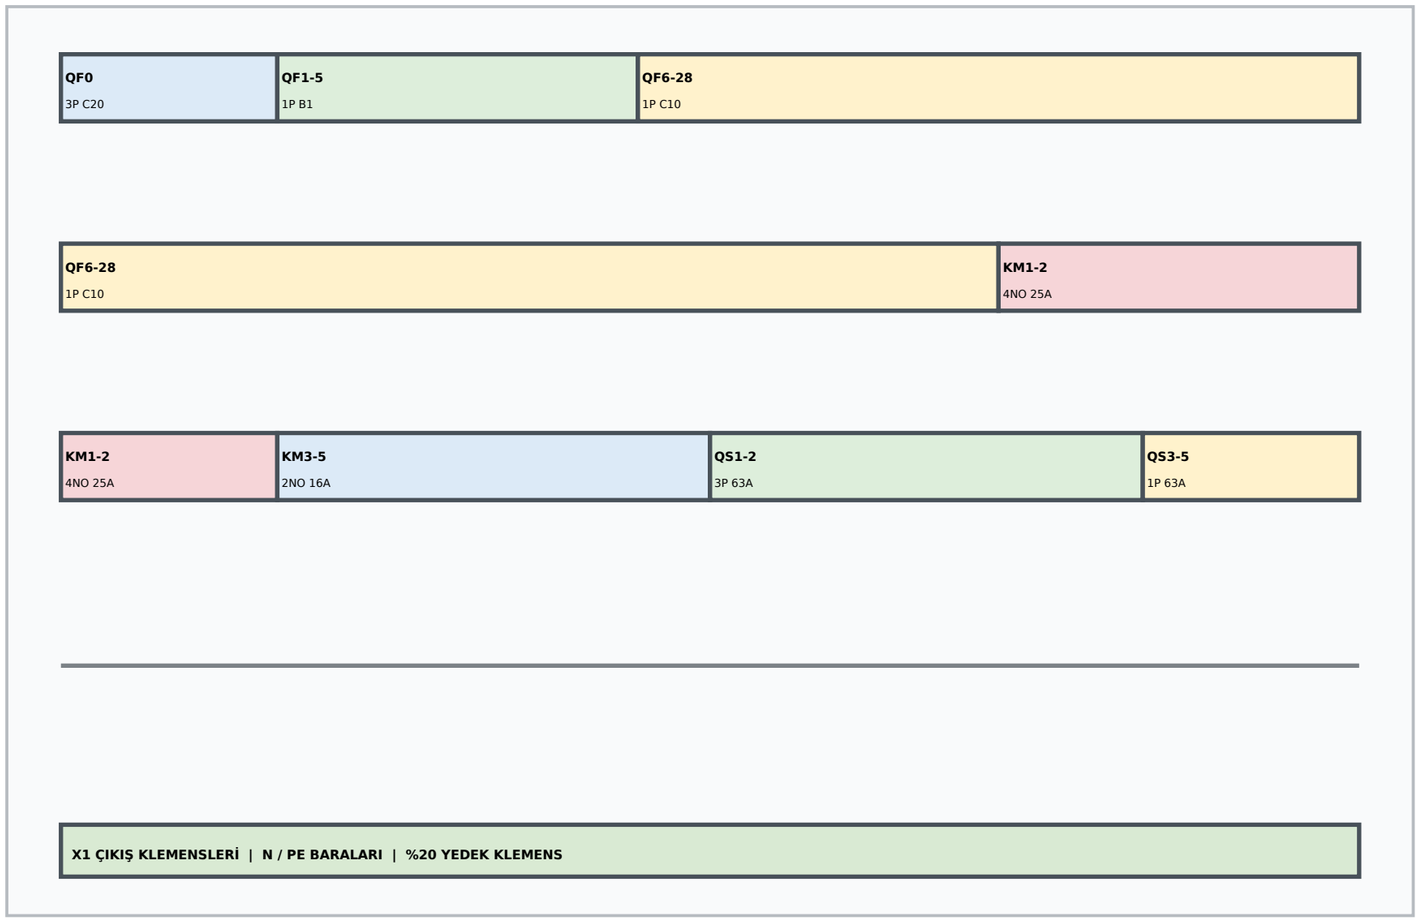

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm


CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C20 (3M) | QF1-5: 1P B1 (5M) | QF6-28: 1P C10 (23M) | KM1-2: 4NO 25A (8M) | KM3-5: 2NO 16A (6M) | QS1-2: 3P 63A (6M) | QS3-5: 1P 63A (3M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩО-ФК | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B

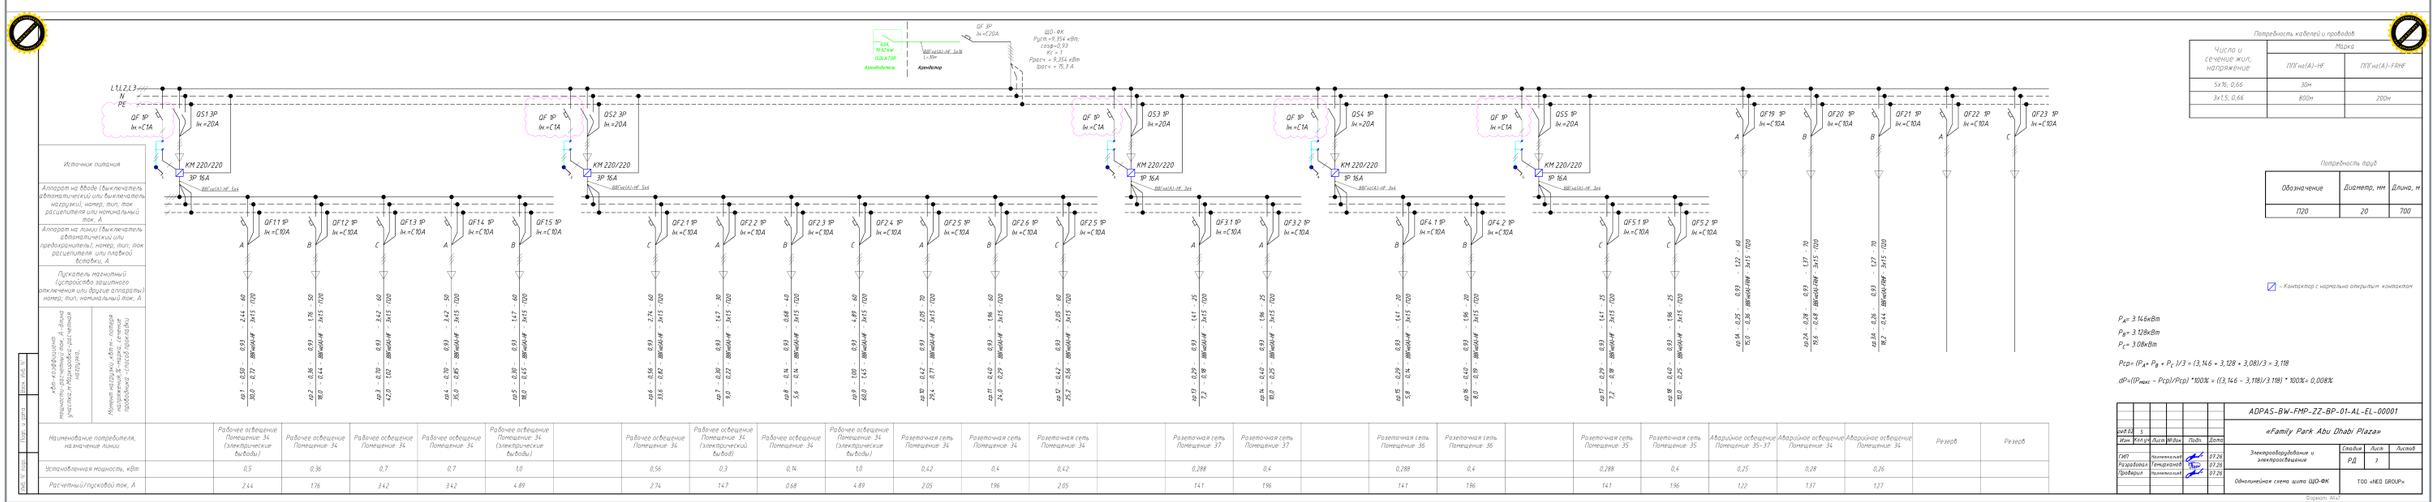

ÜRETİM, TEST VE SEVK KONTROL FORMU

ÜRETİM ONAY DOSYASI / ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

MEKANİK

- [ ] Korpus ölçüsü ve IP54 conta kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Kapak, kilit, menteşe ve boya kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] DIN rayı / kanal sabitleme ve keskin kenar kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Kablo giriş plakası ve rakor alanı kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

ELEKTRİK

- [ ] Cihaz tip, akım, kutup ve adet kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] İletken kesit ve renk standardı kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] N ve PE baralarının ayrılığı / PE sürekliliği — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Klemens, devre ve cihaz etiketlerinin eşleşmesi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Bağlantı torklarının üretici değerlerine göre kaydı — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

RUTİN TEST

- [ ] Koruma devresi sürekliliği — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] İzolasyon direnci / dielektrik doğrulama — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Mekanik ve elektriksel fonksiyon testi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Yangın sinyali ile kontaktör bırakma senaryosu — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Faz sırası ve faz dengeleme kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

SEVK

- [ ] Pano adı ve proje kodu etiketi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Güncel tek hat / test formu / cihaz dokümanları — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Kapak ve cihazların nakliye emniyeti — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Aksesuar ve yedek malzeme paketi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

AÇIK KALAN ONAY MADDELERİ

[ ] 700x800x200 mm IP54 korpus ölçüsü müşteri tarafından onaylandı.

[ ] Yangın alarmı 24 VDC arayüzü ve kontaktör kumanda yöntemi onaylandı.

[ ] Çıkış klemens adetleri saha kablo listesine göre kesinleştirildi.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza
