TEKLED

FAMILY PARK - BLOCK P, F04-29

ELEKTRİK PANOLARI ÜRETİM ONAY DOSYASI

Schneider Electric şalt malzemeleri | IP54 | TEKLED R1

Proje dokümanı	ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 - Status B
Reçete	260805_ADPAS_FamilyPark_Schneider_BOM_v1
Pano adedi	12 adet / 6 tip
Dosya revizyonu	00 - 06.08.2026
Durum	ÜRETİM ÖNCESİ MÜŞTERİ ONAYINA SUNULUR

ÖNEMLİ: IP sınıfı, korpus ölçüsü ve yangın sinyali kumanda gerilimi onay maddelerine bağlanmıştır.

PANO LİSTESİ

No	Pano	Adet	Ana giriş	Reçetedeki korpus	Onay ölçüsü	IP	Durum
1	**ЩС-ФК1**	2	iC60N 3P C63A	540x440x120 / 54M / IP54	700x800x250	IP54	**ŞARTLI ONAY**
2	**ЩС-ФК2**	2	iC60N 3P C63A	660x310x120 / 48M / IP31	700x800x250	IP54	**ŞARTLI ONAY**
3	**ЩС-ФК3**	2	C120N 3P C100A	540x600x120 / 72M / IP31	700x800x250	IP54	**ŞARTLI ONAY**
4	**ЩС-ФК4**	2	C120N 3P C125A	540x600x120 / 72M / IP31	700x800x250	IP54	**ŞARTLI ONAY**
5	**ЩС-КМ**	2	iC60N 3P C40A	540x440x120 / 54M / IP54	700x800x250	IP54	**ŞARTLI ONAY**
6	**ЩО-ФК**	2	iC60N 3P C20A	540x440x120 / 54M / IP54	700x800x250	IP54	**ŞARTLI ONAY**

ZORUNLU ÜRETİM ŞARTLARI

1. Tüm korpuslar duvar tipi, metal, IP54, RAL 7035 elektrostatik toz boyalı ve kilitli kapaklı olacaktır.

2. Reçetedeki IP31 korpuslar proje genel notuna aykırıdır; üretimde kullanılmayacaktır. Bu dosyada 700x800x250 mm IP54 TEKLED korpus esas alınmıştır.

3. 54 modüllük seçimler %20 yedek alan ve klemens bölgesi sağlamadığından büyütülmüştür. Her panoda en az %20 elektriksel/mekanik yedek alan korunacaktır.

4. Çıkış klemensleri reçetede 0 adet görünmektedir. Üretimde tüm giriş/çıkış iletkenleri numaralı klemens üzerinden bağlanacak; N ve PE baraları ayrı olacaktır.

5. Yangın alarmı ile durdurulacak ekipman kontaktörleri için kumanda gerilimi, proje yorumuna uygun 24 VDC arayüz/besleme çözümü netleşmeden devreye alma yapılmayacaktır.


6. Faz dağılımı montaj sırasında dengelenecek; cihaz, kablo ve klemens etiketleri tek hat devre numaralarıyla birebir eşleştirilecektir.

7. Kapakta yalnız pano etiketi ve gerekli uyarı işaretleri bulunur. Kumanda elemanları ayrıca onaylanmadıkça kapak üzerine açılmaz.


8. IEC 61439 rutin doğrulamaları: süreklilik, izolasyon, dielektrik, mekanik çalışma, tork ve fonksiyon testi kayıt altına alınacaktır.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza


Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x250 mm | IP54 | RAL 7035

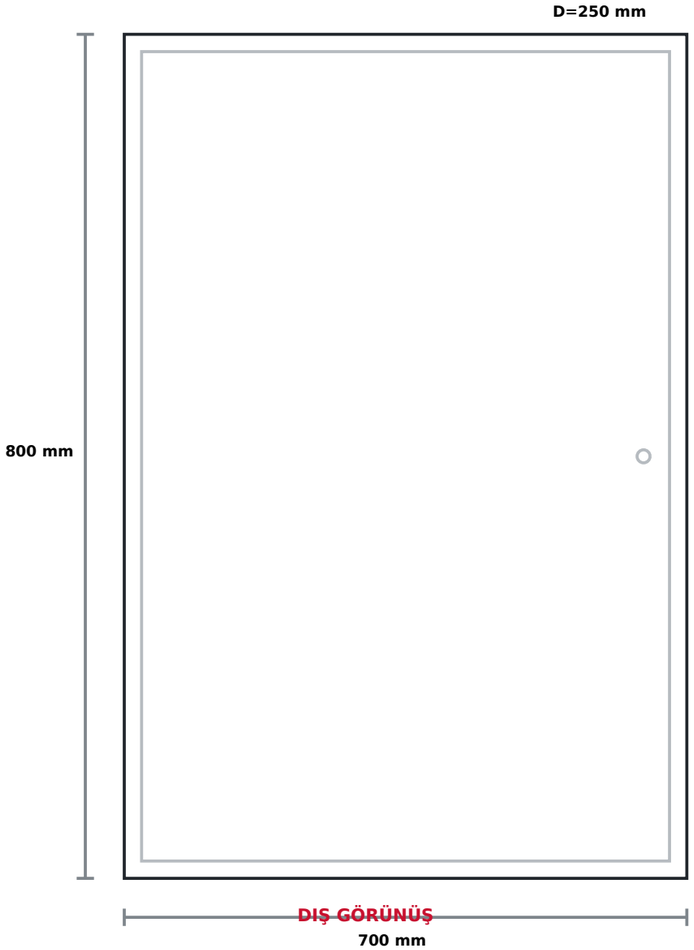

DIŞ GÖRÜNÜŞ

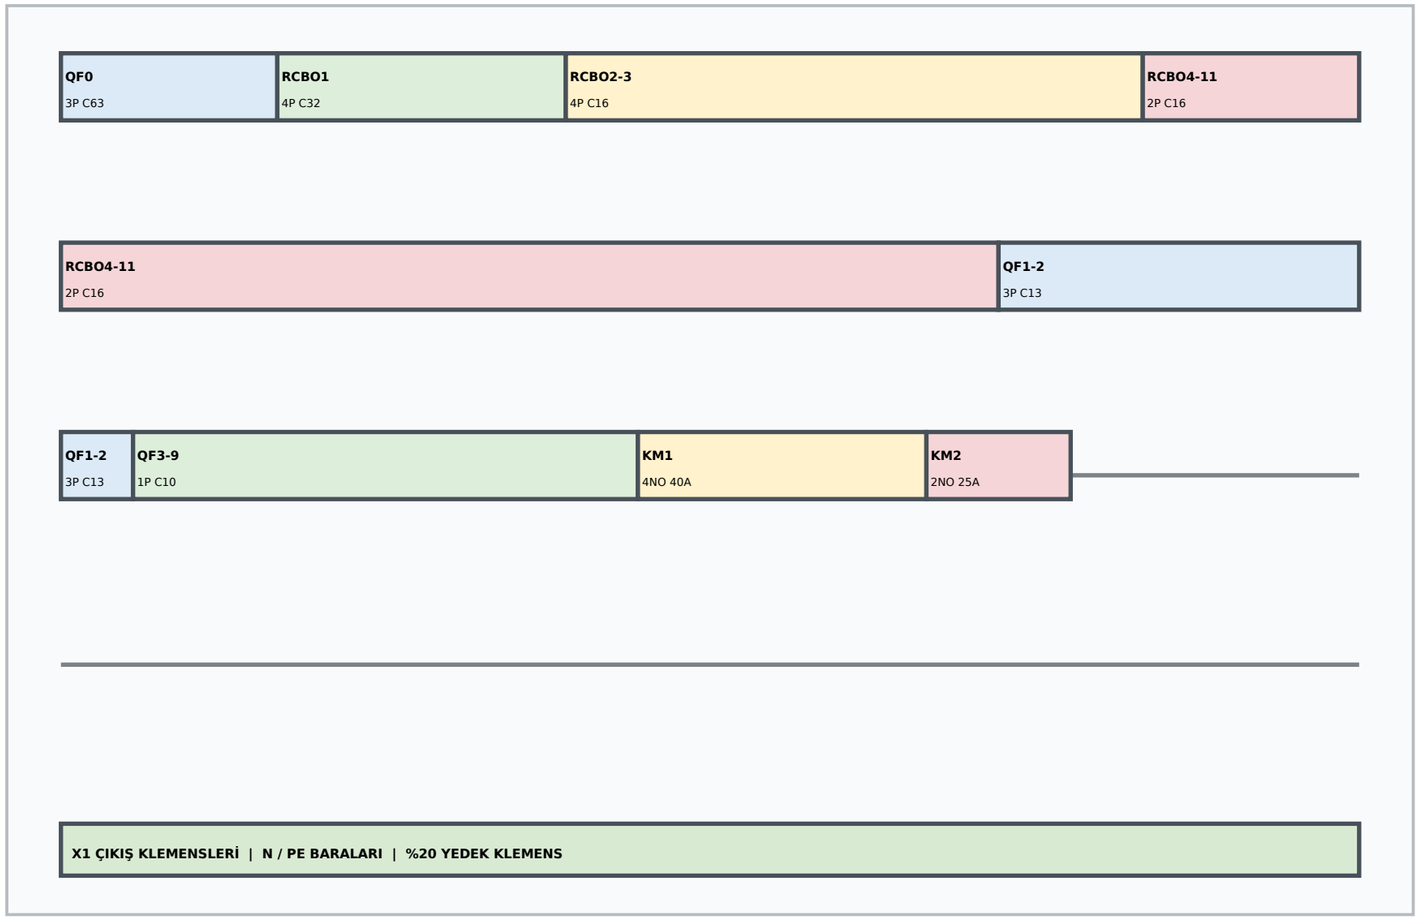

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=250 mm

CİHAZ / MODÜL ÖZETİ


QF0: 3P C63 (3M) RCBO1: 4P C32 (4M) RCBO2-3: 4P C16 (8M) RCBO4-11: 2P C16 (16M) QF1-2: 3P C13 (6M) QF3-9: 1P C10 (7M) KM1: 4NO 40A (4M)

KM2: 2NO 25A (2M)


MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza


Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x250 mm | IP54 | RAL 7035

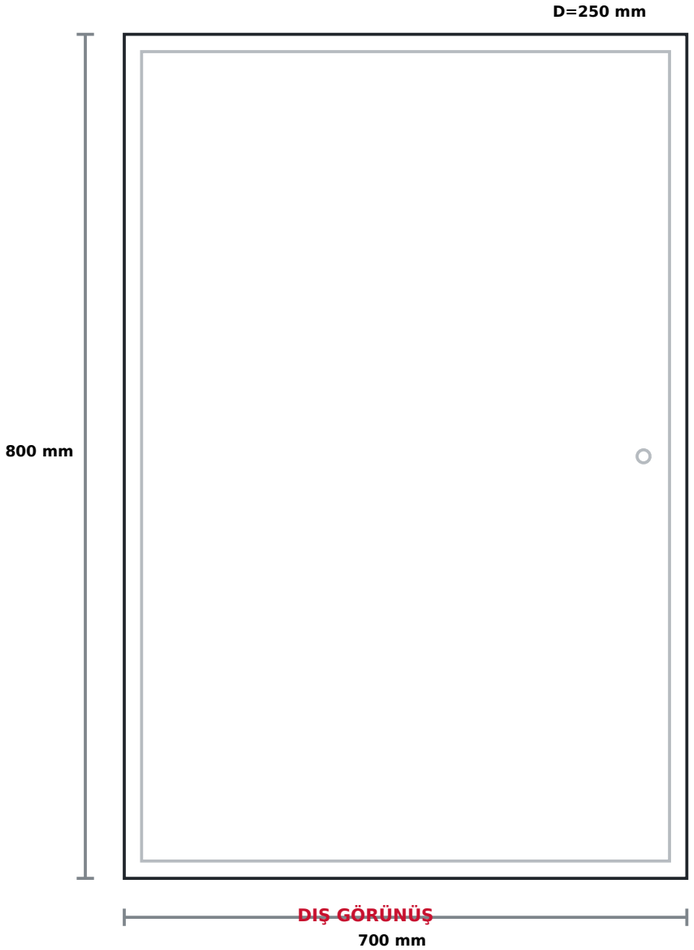

DIŞ GÖRÜNÜŞ

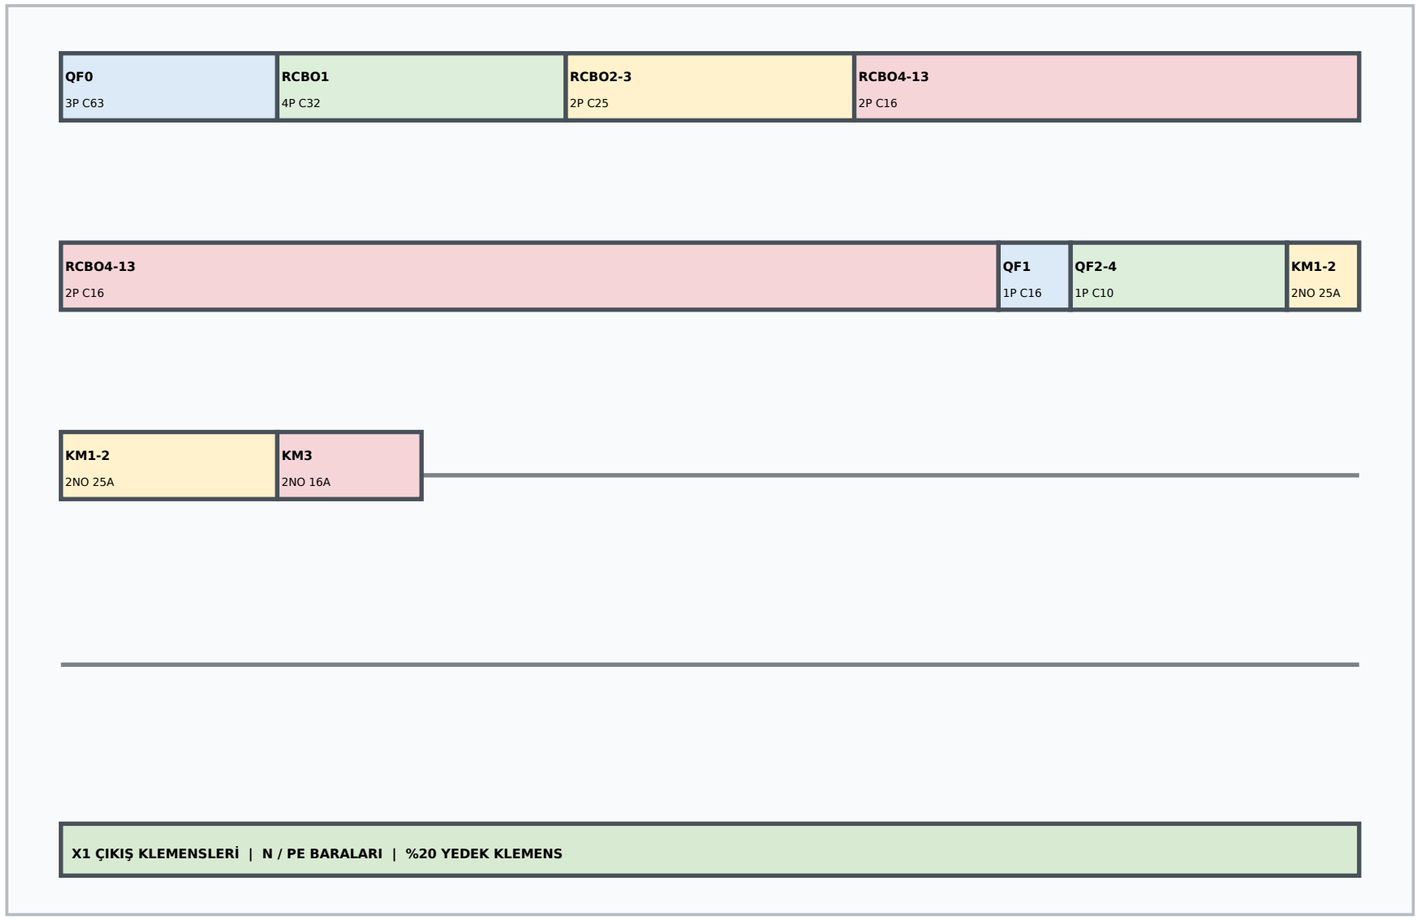

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=250 mm

CİHAZ / MODÜL ÖZETİ


QF0: 3P C63 (3M) RCBO1: 4P C32 (4M) RCBO2-3: 2P C25 (4M) RCBO4-13: 2P C16 (20M) QF1: 1P C16 (1M) QF2-4: 1P C10 (3M) KM1-2: 2NO 25A (4M)

KM3: 2NO 16A (2M)


MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza


Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x250 mm | IP54 | RAL 7035

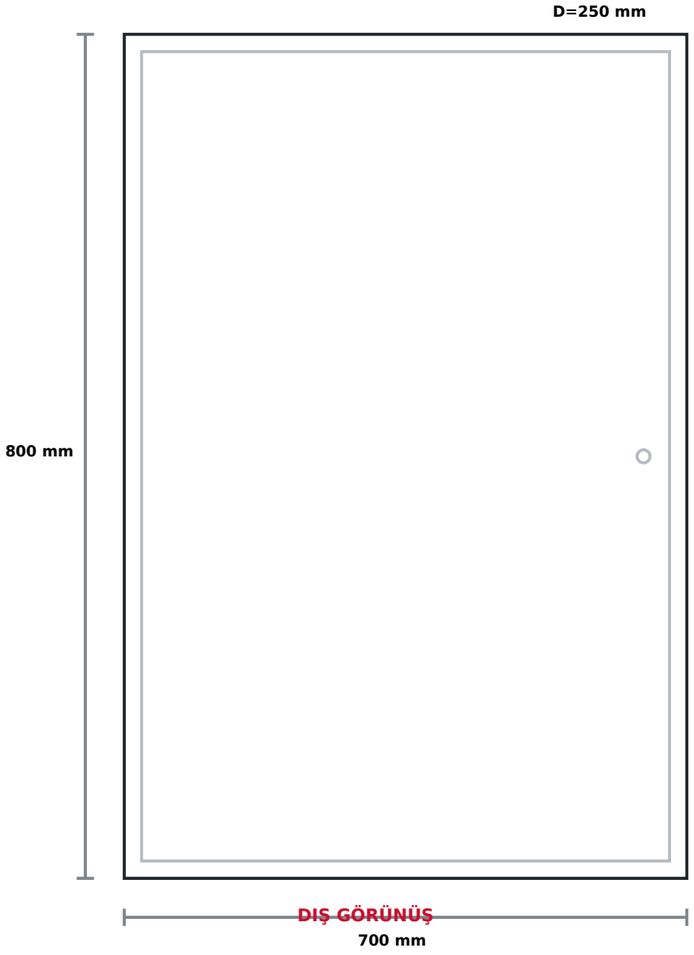

DIŞ GÖRÜNÜŞ

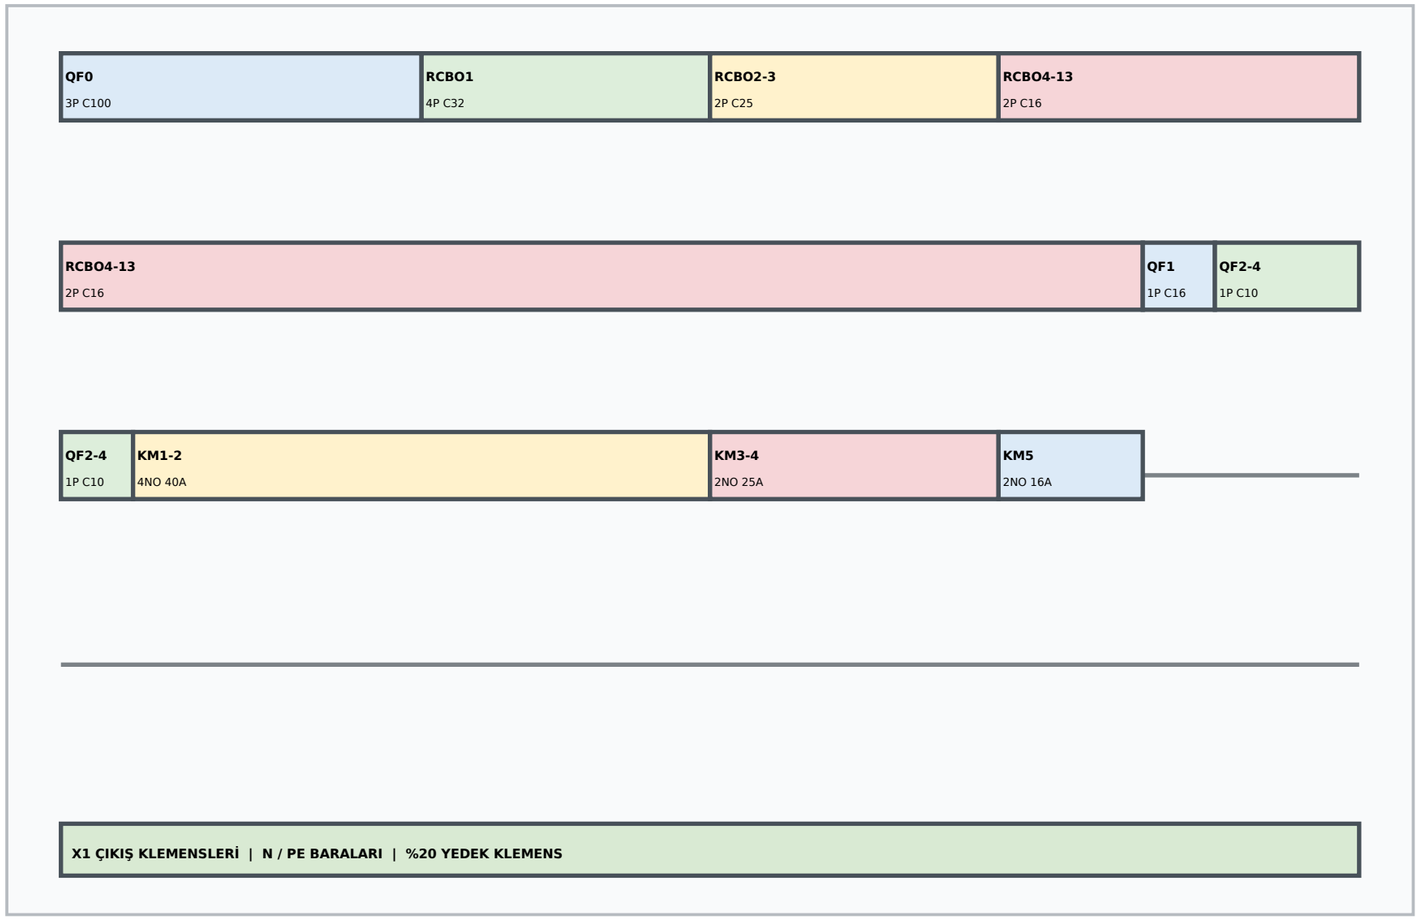

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=250 mm


CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C100 (5M) | RCBO1: 4P C32 (4M) | RCBO2-3: 2P C25 (4M) | RCBO4-13: 2P C16 (20M) | QF1: 1P C16 (1M) | QF2-4: 1P C10 (3M) | KM1-2: 4NO 40A (8M) | KM3-4: 2NO 25A (4M) | KM5: 2NO 16A (2M)


MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza


Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x250 mm | IP54 | RAL 7035

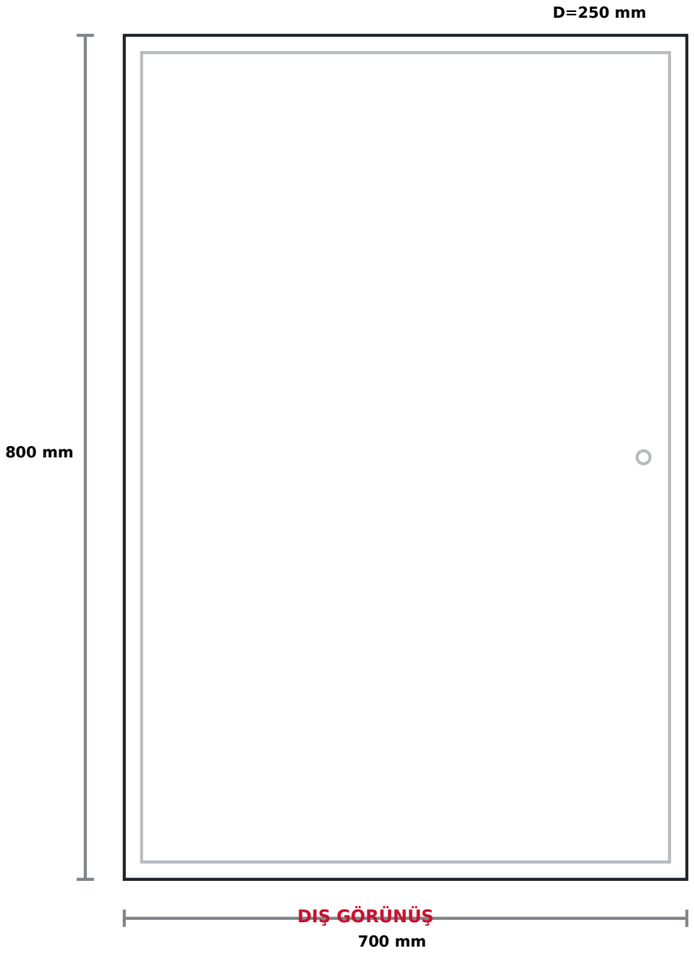

DIŞ GÖRÜNÜŞ

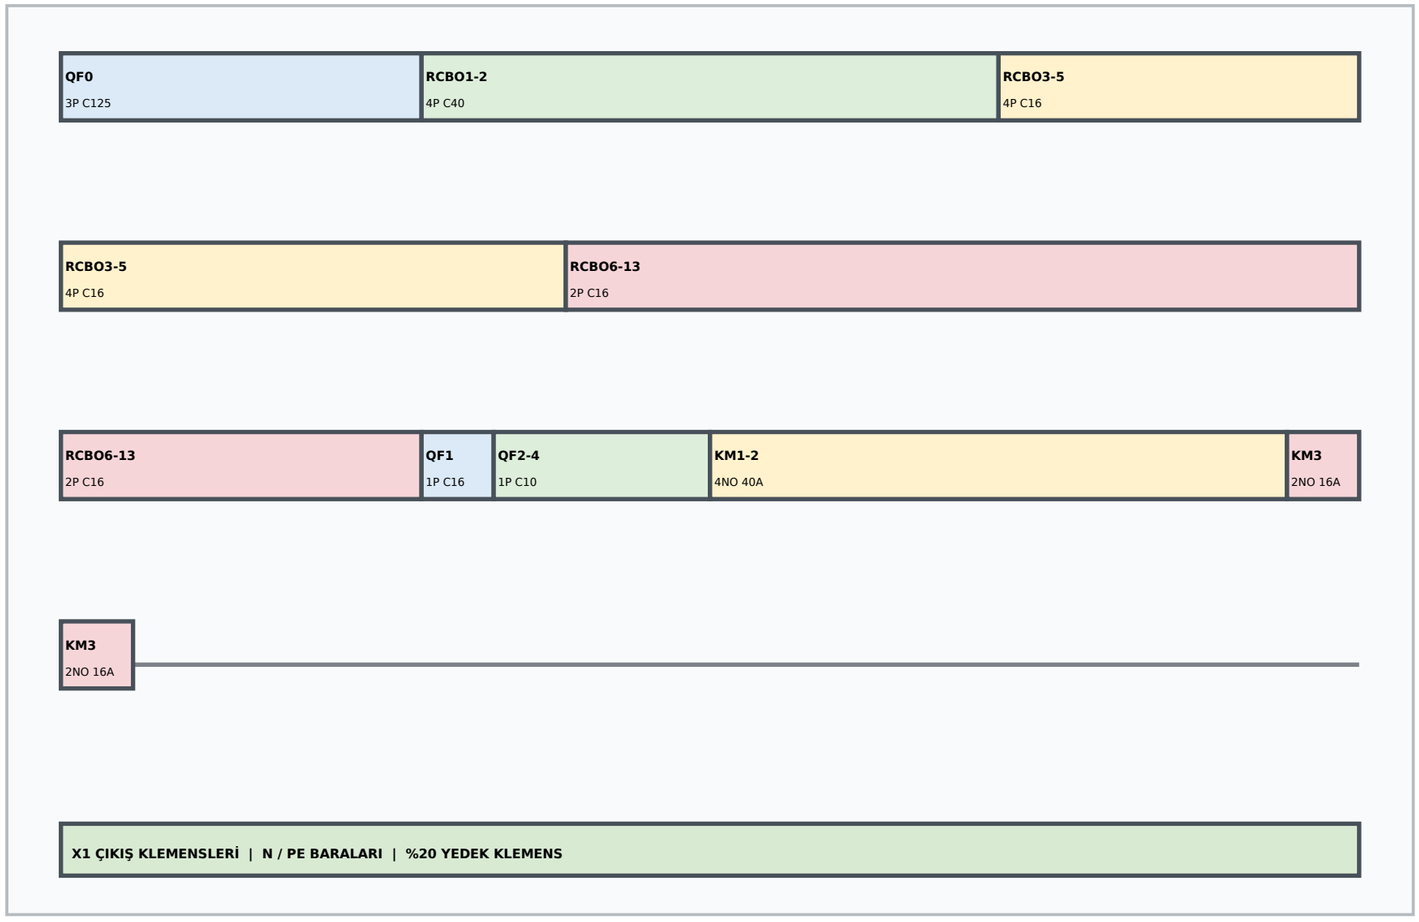

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=250 mm


CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C125 (5M) RCBO1-2: 4P C40 (8M) RCBO3-5: 4P C16 (12M) RCBO6-13: 2P C16 (16M) QF1: 1P C16 (1M) QF2-4: 1P C10 (3M) KM1-2: 4NO 40A (8M) KM3: 2NO 16A (2M)


MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza


Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x250 mm | IP54 | RAL 7035

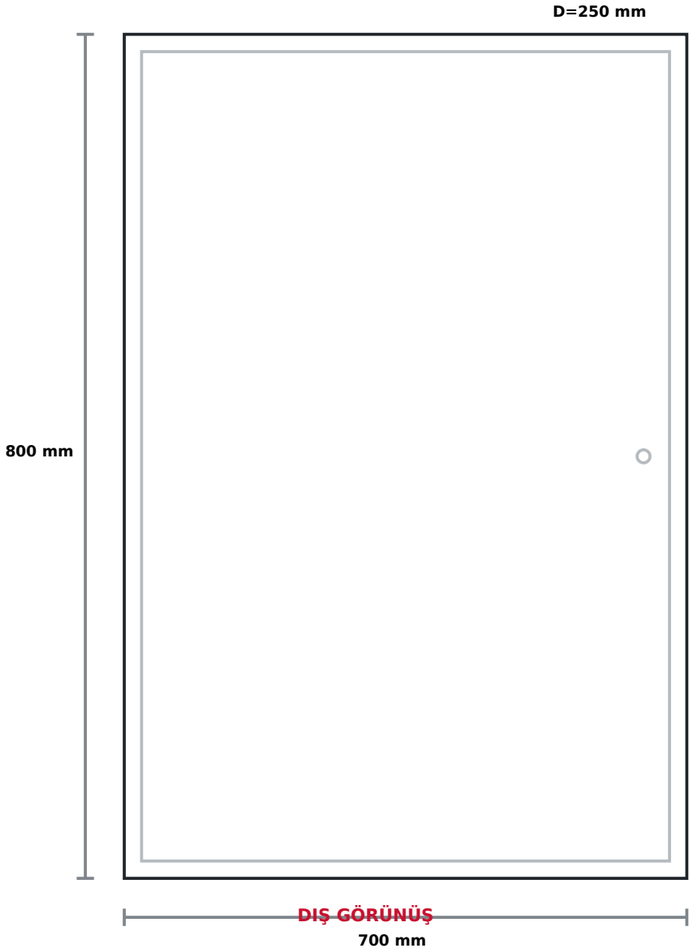

DIŞ GÖRÜNÜŞ

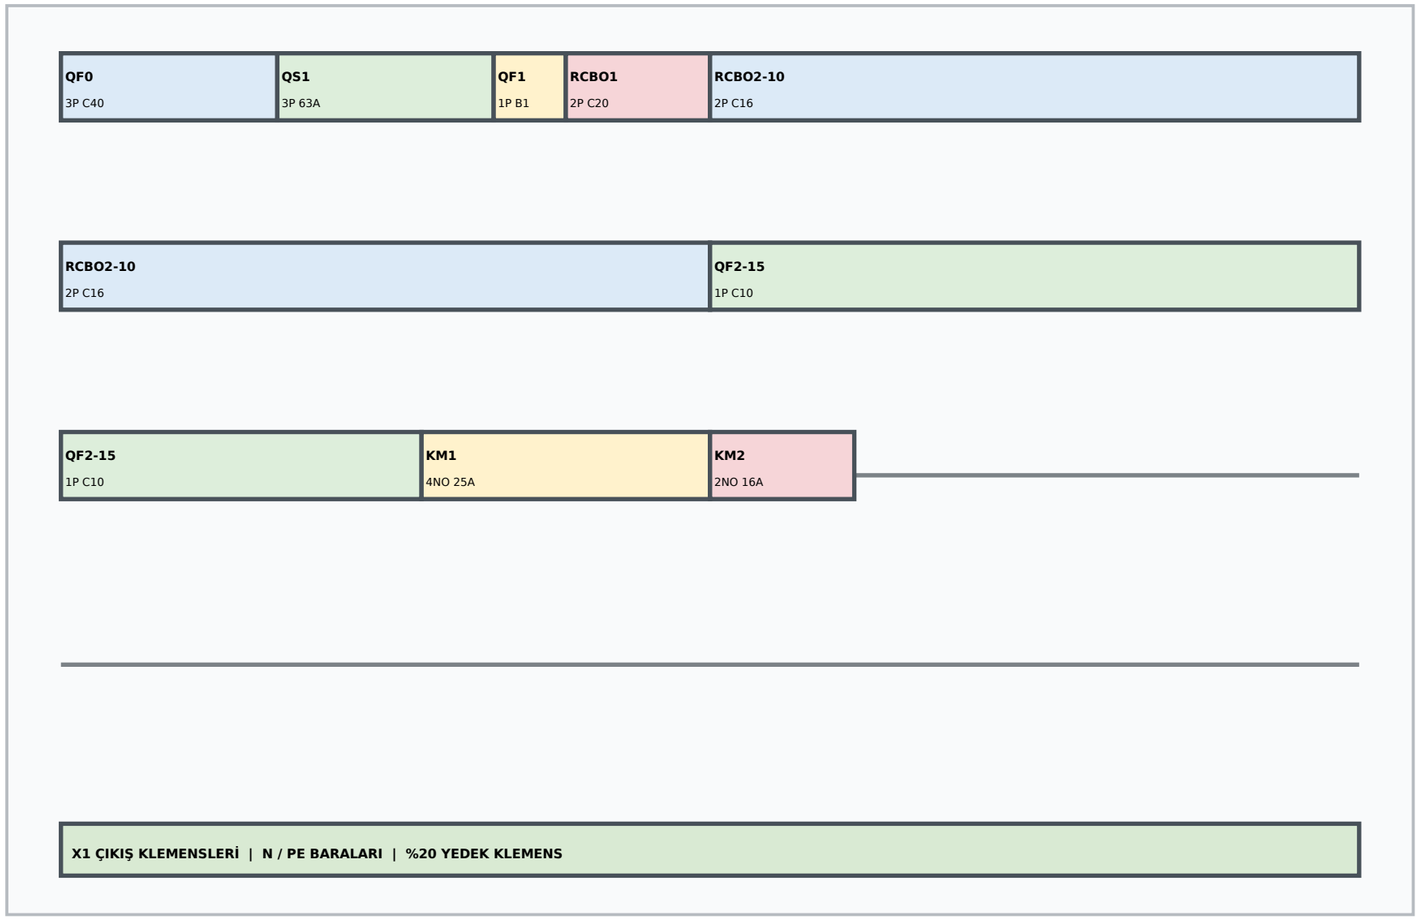

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=250 mm


CİHAZ / MODÜL ÖZETİ


QF0: 3P C40 (3M) QS1: 3P 63A (3M) QF1: 1P B1 (1M) RCBO1: 2P C20 (2M) RCBO2-10: 2P C16 (18M) QF2-15: 1P C10 (14M) KM1: 4NO 25A (4M) KM2: 2NO 16A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.


TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x250 mm | IP54 | RAL 7035

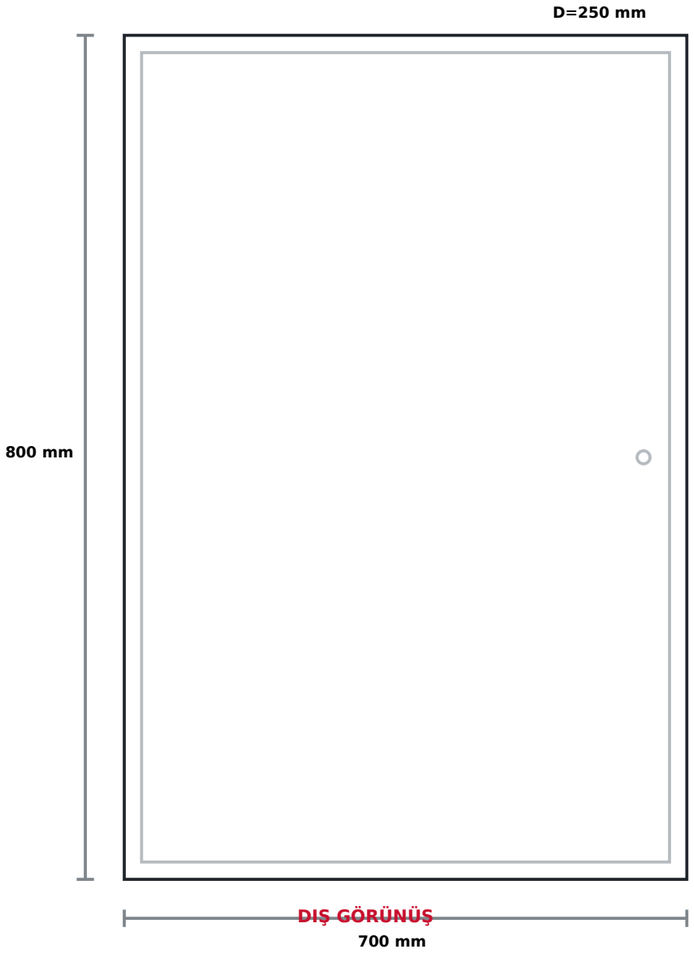

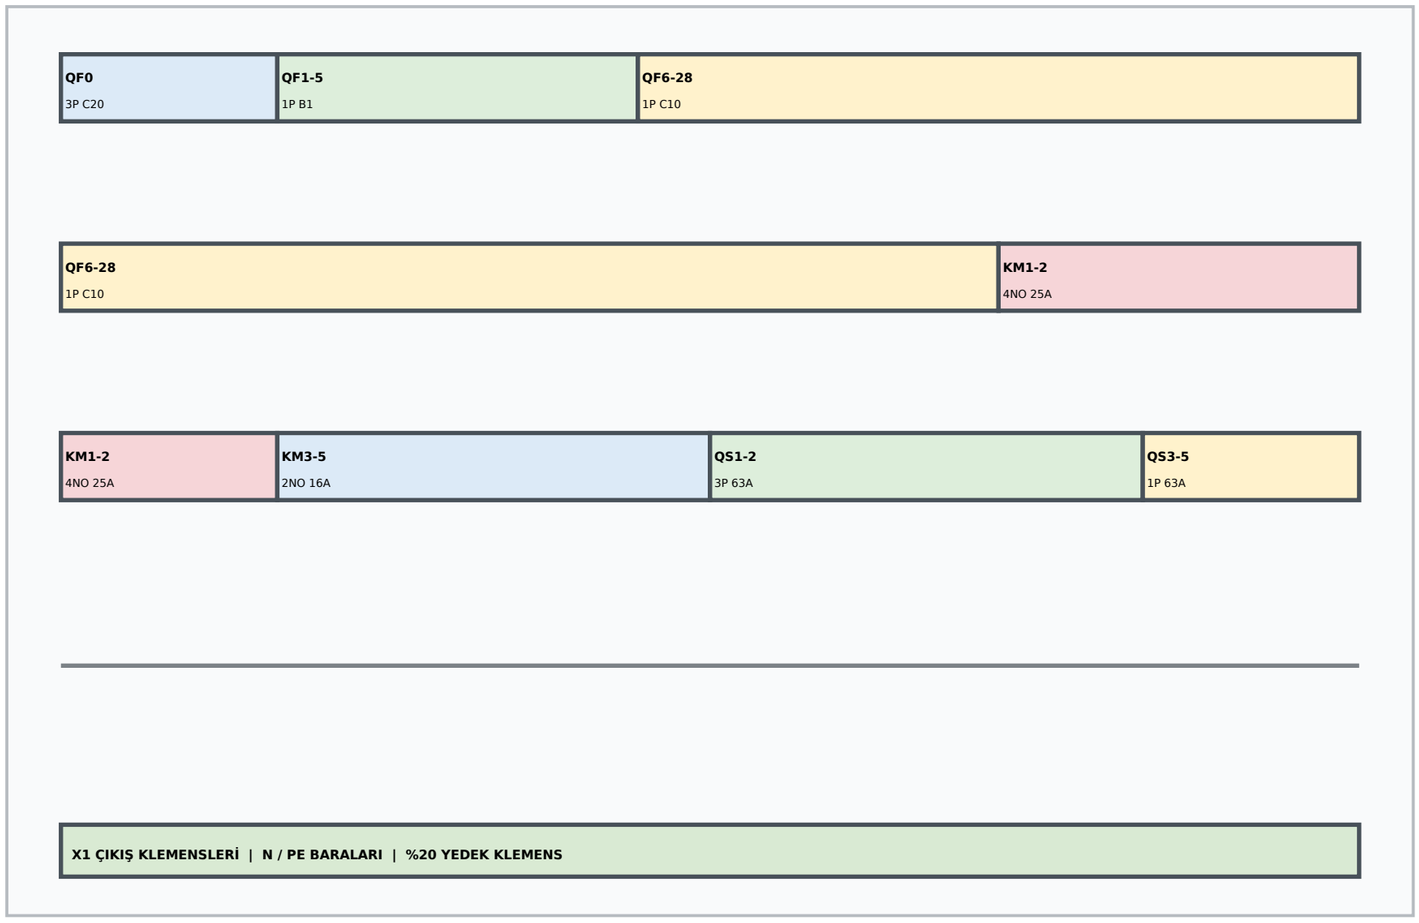

İÇ YERLEŞİM - ŞEMATİK / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=250 mm

CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C20 (3M) | QF1-5: 1P B1 (5M) | QF6-28: 1P C10 (23M) | KM1-2: 4NO 25A (8M) | KM3-5: 2NO 16A (6M) | QS1-2: 3P 63A (6M) | QS3-5: 1P 63A (3M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

MEKANİK

- ☐ Korpus ölçüsü ve IP54 conta kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Kapak, kilit, menteşe ve boya kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ DIN rayı / kanal sabitleme ve keskin kenar kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Kablo giriş plakası ve rakor alanı kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

ELEKTRİK

- ☐ Cihaz tip, akım, kutup ve adet kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ İletken kesit ve renk standardı kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ N ve PE baralarının ayrılığı / PE sürekliliği — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Klemens, devre ve cihaz etiketlerinin eşleşmesi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Bağlantı torklarının üretici değerlerine göre kaydı — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

RUTİN TEST

- ☐ Koruma devresi sürekliliği — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ İzolasyon direnci / dielektrik doğrulama — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Mekanik ve elektriksel fonksiyon testi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Yangın sinyali ile kontaktör bırakma senaryosu — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Faz sırası ve faz dengeleme kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

SEVK

- ☐ Pano adı ve proje kodu etiketi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Güncel tek hat / test formu / cihaz dokümanları — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Kapak ve cihazların nakliye emniyeti — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- ☐ Aksesuar ve yedek malzeme paketi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

AÇIK KALAN ONAY MADDELERİ

[ ] 700x800x250 mm IP54 korpus ölçüsü müşteri tarafından onaylandı.

[ ] Yangın alarmı 24 VDC arayüzü ve kontaktör kumanda yöntemi onaylandı.

[ ] Çıkış klemens adetleri saha kablo listesine göre kesinleştirildi.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza
