CELALABAD KIZ YURDU

ELEKTRİK DAĞITIM PANOLARI

7 PANO - CHINT ŞALT - TEKLED KORPUS

PROJE	**Celalabad Kız Yurdu - C.Doğan**
DOSYA	**Üretim Onay Dosyası**
REVİZYON	**R0**
TARİH	**04.08.2026**
KAYNAK	**Tek hat şemaları + 260804 CHINT BOM**


ÜRETİM ÖNCESİ MÜŞTERİ / PROJE ONAYINA SUNULUR

PANO ÜRETİM ONAYI - MAIN PANEL


ÖLÇÜ: 2000 x 700 x 500 mm

Мет. Щит 2000x700x500 + 10 см база, IP54, dikili, dış ortam


1. KAPAK / ÖN GÖRÜNÜŞ

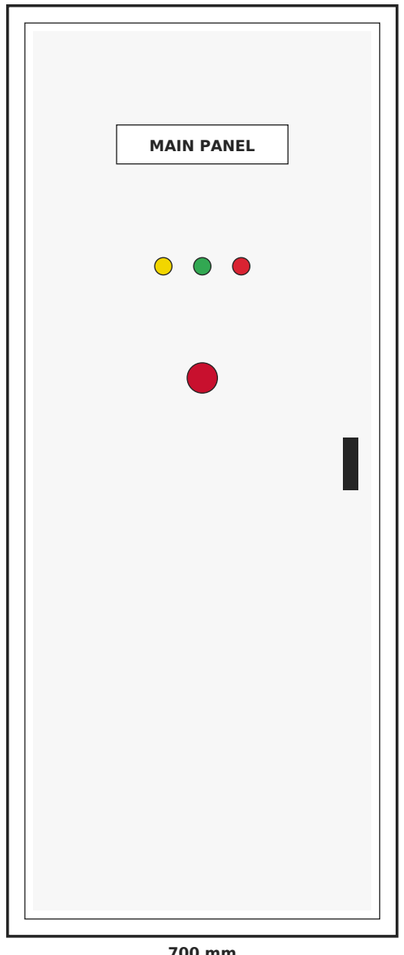

2. İÇ YERLEŞİM / PERDE KALDIRILMIŞ

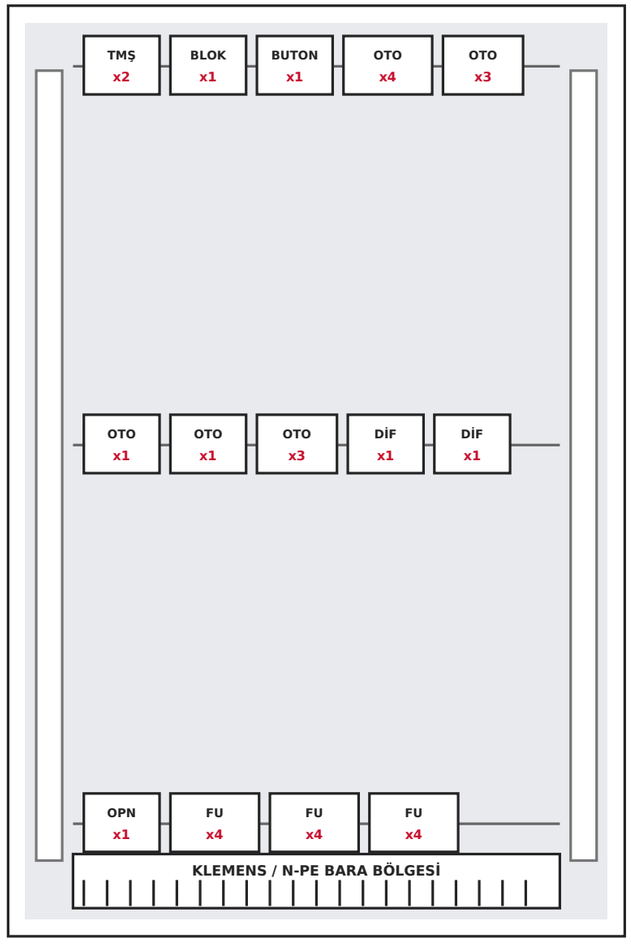

3. YAN GÖRÜNÜŞ



4. PANO ÖZET MALZEME LİSTESİ

№	ARTİKUL	AÇIKLAMA	ADET
1	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R)	**2**
2	946996	Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125 AC230V (левый) (R)	**1**
3	574862	Кнопка управления «Грибок» Ф40 с фиксацией NP2-BS542, красная 1НЗ IP40	**1**
4	813875	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кA х-ка C (R)	**4**
5	813874	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кA х-ка C (R)	**3**
6	813873	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кA х-ка C (R)	**1**
7	814171	Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кA х-ка C (R) [шема: 10 кA]	**1**
8	296695	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка B (R)	**3**
9	280934	УЗО NXL-63 10kA 3P+N 63A 300mA AC (R)	**1**
10	280931	УЗО NXL-63 10kA 3P+N 25A 300mA AC (R)	**1**
11	308602	Ограничитель имп. перенапр. NXU-I+II 4P In=25kA Uc=385B Iimp=12.5kA (R)	**1**
12	521366	Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A	**4**
13	521234	Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125A	**4**
14	520441	Держатель плавких вставок с индикацией RT28N-32X 10x38 1П (R)	**4**
15	520258	Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 20A 10x38	**4**
16	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) [L1]	**1**
17	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) [L2]	**1**
18	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) [L3]	**1**
19	718-42016	Шина медная нулевая 8x12 мм, 1 м	**4**
20	718-42040	Клеммник на DIN-рейку 35 мм²	**5**
21	718-42033	Клеммник на DIN-рейку 16 мм²	**30**
22	718-42030	Клеммник на DIN-рейку 6 мм²	**25**
23	718-84009	Шина «N» нулевая 4x11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK	**2**


PROJE	PANO	REVİZYON	TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAY	SAYFA
CELALABAD KIZ YURDU	**MAIN PANEL**	**R0 - 04.08.2026**	**TEKLED**	_____	İMZA / KAŞE: _____	**2**

PANO ÜRETİM ONAYI - ПОДВАЛ-ELP


ÖLÇÜ: 800 x 500 x 180 mm

Özel imalat sıva altı 500x800x180, üstten girişli, klemens bölmesi 30 cm


1. KAPAK / ÖN GÖRÜNÜŞ

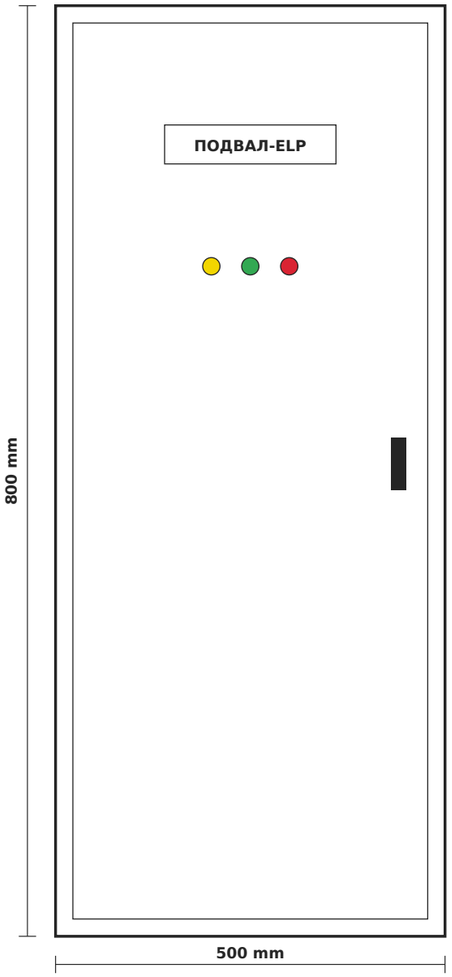

2. İÇ YERLEŞİM / PERDE KALDIRILMIŞ

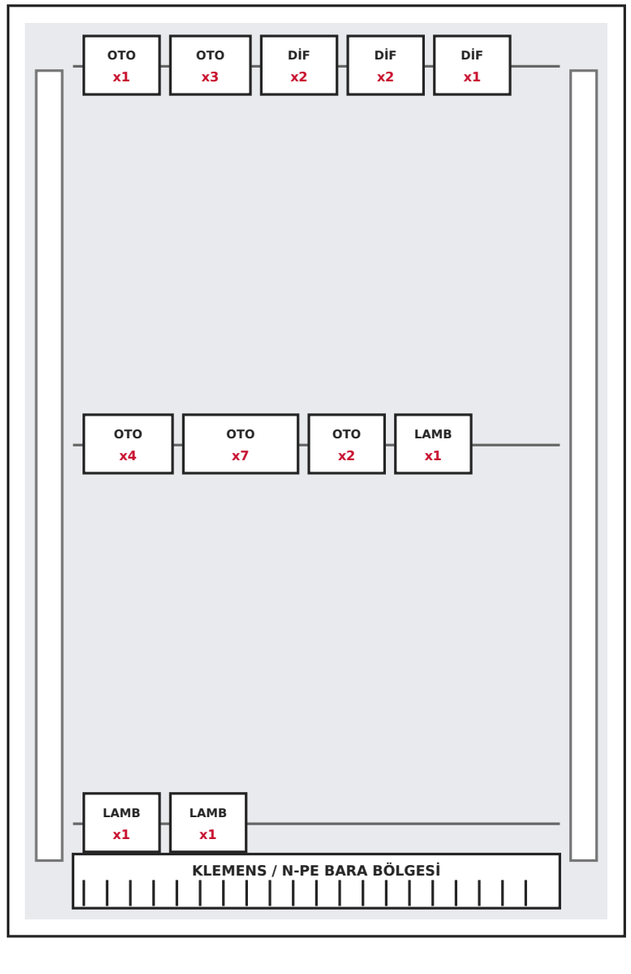

3. YAN GÖRÜNÜŞ



4. PANO ÖZET MALZEME LİSTESİ

№	ARTİKUL	AÇIKLAMA	ADET
1	814172	Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кA х-ка C (R) [giriş]	1
2	296695	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка B (R)	3
3	280721	УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R)	2
4	280789	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R)	2
5	280791	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R)	1
6	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R)	4
7	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	7
8	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	2
9	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) [L1]	1
10	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) [L2]	1
11	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) [L3]	1
12	811000	Шина соединительная типа PIN 1P, 63A, L=1000 мм (R)	1
13	718-42025	Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм²	45
14	718-42030	Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x4 мм²]	5
15	718-84018	Шина «N» нулевая 4x7 групп на DIN-рейку в корпусе IEK	2


PROJE	PANO	REVİZYON	TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAY	SAYFA
CELALABAD KIZ YURDU	ПОДВАЛ-ELP	R0 - 04.08.2026	TEKLED	_____	İMZA / KAŞE: _____	3

PANO ÜRETİM ONAYI - АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP


ÖLÇÜ: 900 x 500 x 180 mm

Özel imalat sıva altı 500x900x180, üstten girişli, klemens bölmesi 30 cm


1. KAPAK / ÖN GÖRÜNÜŞ

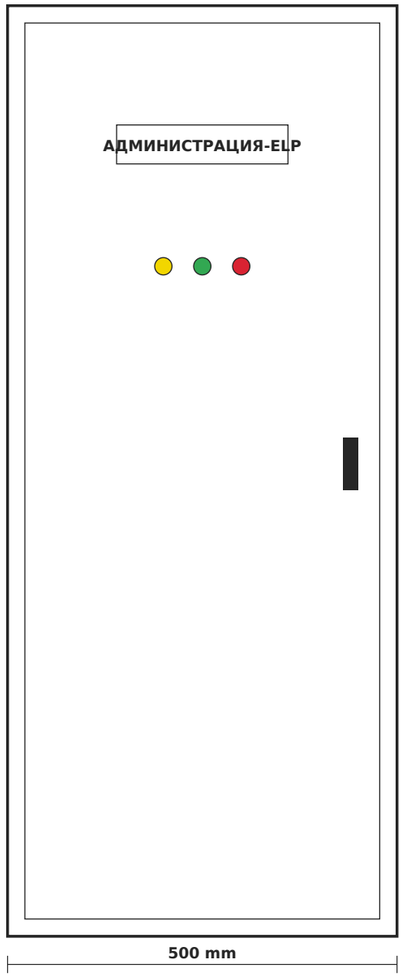

2. İÇ YERLEŞİM / PERDE KALDIRILMIŞ

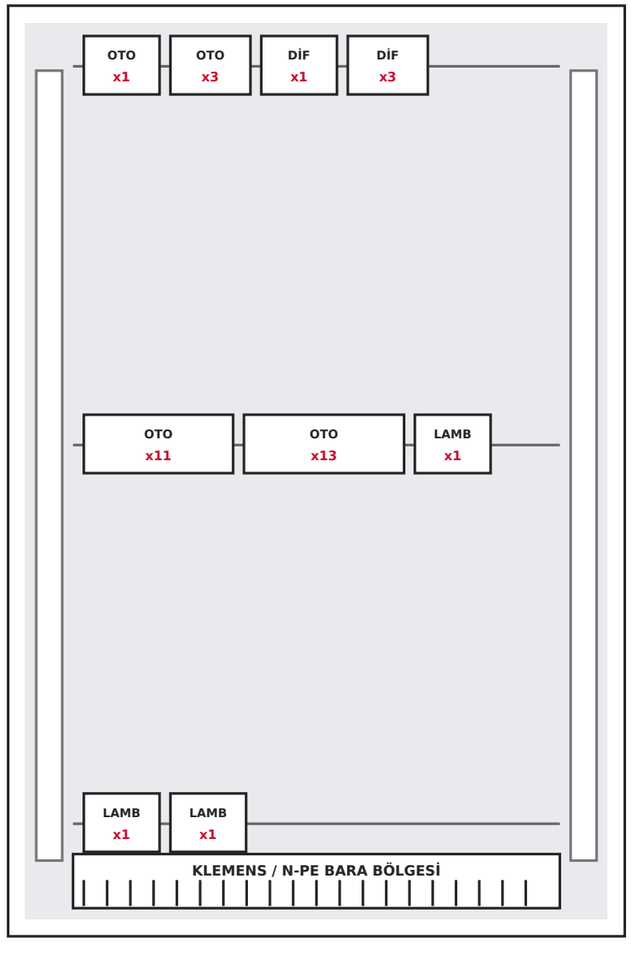

3. YAN GÖRÜNÜŞ



4. PANO ÖZET MALZEME LİSTESİ

№	ARTİKUL	AÇIKLAMA	ADET
1	814172	Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C (R) [giriş]	1
2	296695	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка B (R)	3
3	280789	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R)	1
4	280791	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R)	3
5	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R)	11
6	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	13
7	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) [L1]	1
8	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) [L2]	1
9	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) [L3]	1
10	811000	Шина соединительная типа PIN 1P, 63A, L=1000 мм (R)	2
11	718-42025	Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм²	75
12	718-42030	Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x4 мм²]	5
13	718-84009	Шина «N» нулевая 4x11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK	2


PROJE	PANO	REVİZYON	TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAY	SAYFA
CELALABAD KIZ YURDU	АДМИНИСТРАЦИЯ-ELP	R0 - 04.08.2026	TEKLED	_____	İMZA / KAŞE: _____	4

PANO ÜRETİM ONAYI - ZK-ELP


ÖLÇÜ: 1300 x 500 x 180 mm

Özel imalat sıva altı 500x1300x180 + 500 mm şaft müdahale, alttan girişli


1. KAPAK / ÖN GÖRÜNÜŞ

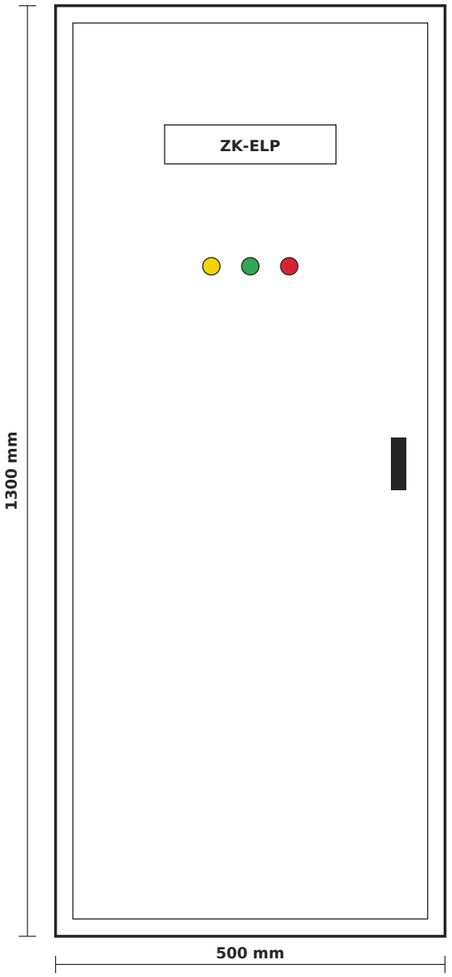

2. İÇ YERLEŞİM / PERDE KALDIRILMIŞ

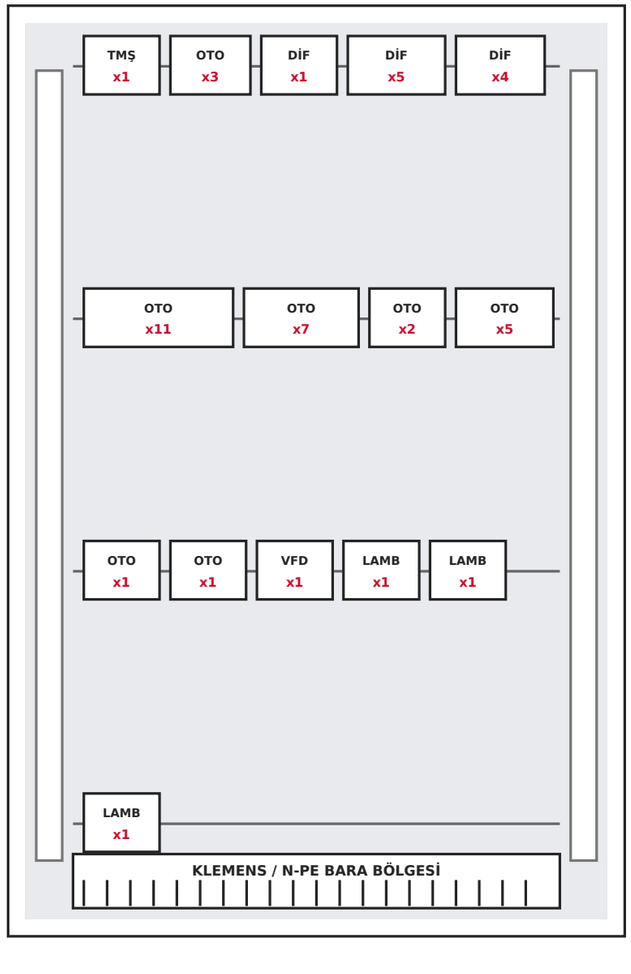

3. YAN GÖRÜNÜŞ



4. PANO ÖZET MALZEME LİSTESİ

№	ARTİKUL	AÇIKLAMA	ADET
1	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R) [giriş — şemada MCB 3x80A 6кA]	1
2	296695	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка B (R)	3
3	280721	УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R)	1
4	280789	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R)	5
5	280791	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R)	4
6	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R)	11
7	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	7
8	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2
9	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	5
10	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1
11	296831	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	1
12	431225	Преобразователь частоты NVF2G-S-1.5/PS4, 1.5 кВт, 380В 3Ф [MEF-01 davl...	1
13	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) [L1]	1
14	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) [L2]	1
15	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) [L3]	1
16	811000	Шина соединительная типа PIN 1P, 63A, L=1000 мм (R)	2
17	718-42025	Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм²	60
18	718-42030	Клеммник на DIN-рейку 6 мм²	20
19	718-42040	Клеммник на DIN-рейку 35 мм² [giriş 5x35 мм²]	5
20	718-84009	Шина «N» нулевая 4x11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK	3


PROJE	PANO	REVİZYON	TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAY	SAYFA
CELALABAD KIZ YURDU	ZK-ELP	R0 - 04.08.2026	TEKLED	_____	İMZA / KAŞE: _____	5

PANO ÜRETİM ONAYI - 2K-ELP


ÖLÇÜ: 1400 x 500 x 180 mm

Özel imalat sıva altı 500x1400x180 + 500 mm şaft müdahale, alttan girişli


1. KAPAK / ÖN GÖRÜNÜŞ

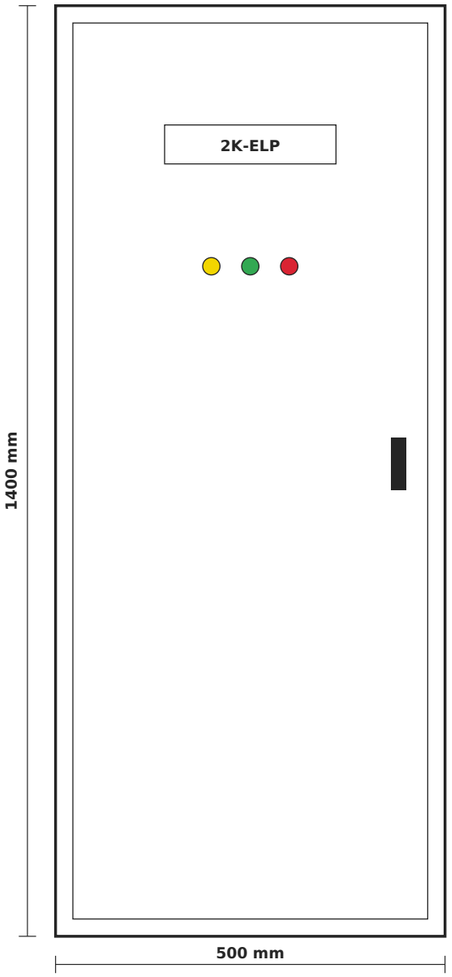

2. İÇ YERLEŞİM / PERDE KALDIRILMIŞ

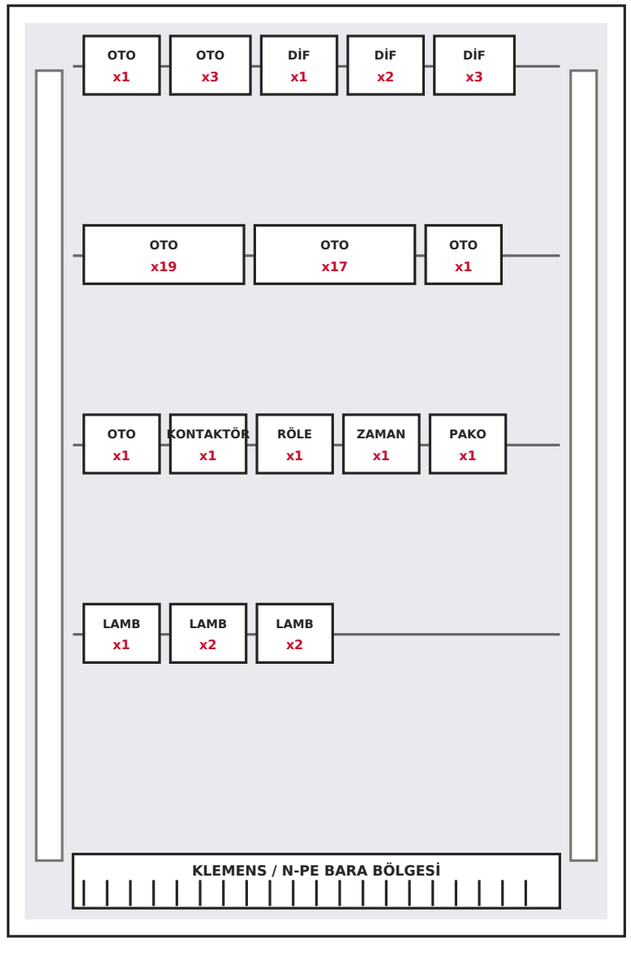

3. YAN GÖRÜNÜŞ



4. PANO ÖZET MALZEME LİSTESİ

№	ARTİKUL	AÇIKLAMA	ADET
1	814173	Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кA х-ка C (R) [giriş]	1
2	296695	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка B (R)	3
3	280721	УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R)	1
4	280789	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R)	2
5	280791	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R)	3
6	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R)	19
7	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	17
8	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) [zaman saati devresi]	1
9	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) [fan devresi]	1
10	836704	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	1
11	837097	Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R)	1
12	310024	Таймер электронный NKG3 AC230B (R) [şemada NKG4]	1
13	425192	Кулачковый переключатель LW32-10/1, 10A, 1P, «1-0-2»	1
14	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) [L1]	1
15	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) [L2 + ÇALIŞIR]	2
16	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) [L3 + ARIZA]	2
17	811000	Шина соединительная типа PIN 1P, 63A, L=1000 мм (R)	3
18	718-42025	Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм²	115
19	718-42030	Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x6 мм²]	5
20	718-84009	Шина «N» нулевая 4x11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK	3


PROJE	PANO	REVİZYON	TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAY	SAYFA
CELALABAD KIZ YURDU	2K-ELP	R0 - 04.08.2026	TEKLED	_____	İMZA / KAŞE: _____	6

PANO ÜRETİM ONAYI - КРЫША-ELP


ÖLÇÜ: 1300 x 500 x 180 mm

Özel imalat sıva altı 500x1300x180 + 500 mm şaft müdahale, alttan girişli


1. KAPAK / ÖN GÖRÜNÜŞ

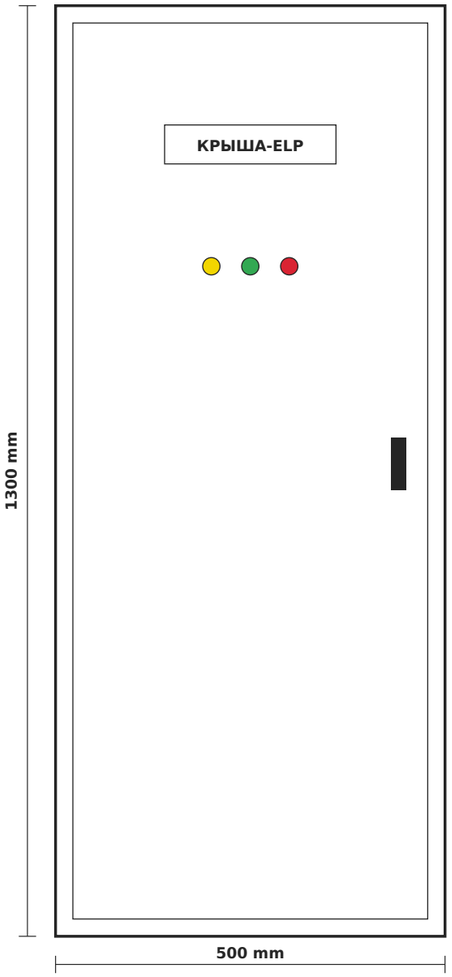

2. İÇ YERLEŞİM / PERDE KALDIRILMIŞ

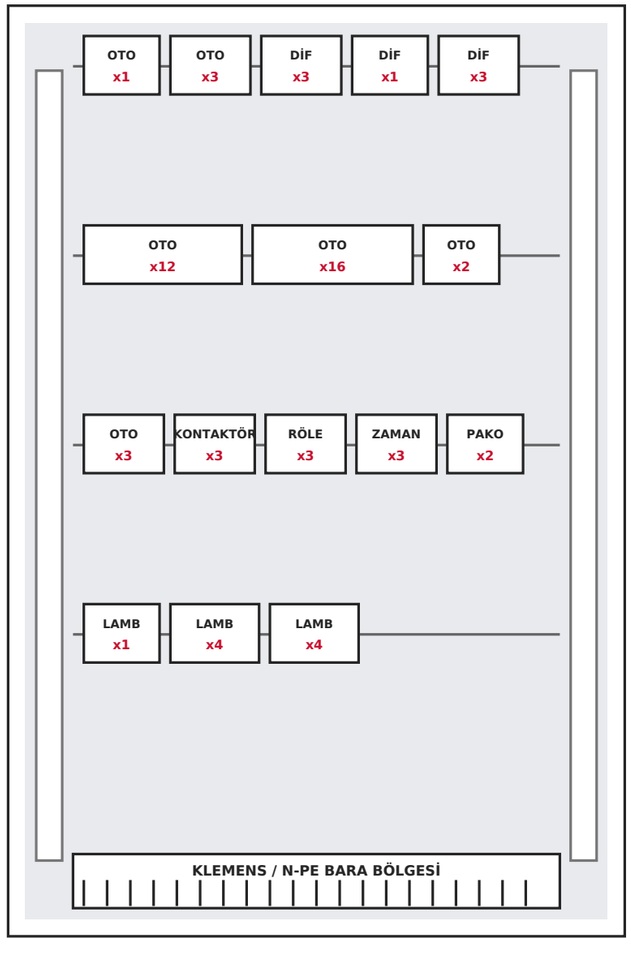

3. YAN GÖRÜNÜŞ



4. PANO ÖZET MALZEME LİSTESİ

№	ARTİKUL	AÇIKLAMA	ADET
1	814173	Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кA х-ка C (R) [giriş]	1
2	296695	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка B (R)	3
3	280721	УЗО NXL-63 6kA 1P+N 25A 30mA AC (R)	3
4	280789	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R)	1
5	280791	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R)	3
6	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R)	12
7	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	16
8	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) [zaman saati devreleri]	2
9	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) [fan devreleri]	3
10	836704	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	3
11	837100	Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R)	3
12	310024	Таймер электронный NKG3 AC230B (R) [şemada 2x NKG4 + 1x LEGRAND 412790]	3
13	425192	Кулачковый переключатель LW32-10/1, 10A, 1P, «1-0-2»	2
14	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) [L1]	1
15	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) [L2 + 3x ÇALIŞIR]	4
16	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) [L3 + 3x ARIZA]	4
17	811000	Шина соединительная типа PIN 1P, 63A, L=1000 мм (R)	3
18	718-42025	Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм²	95
19	718-42030	Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x6 мм²]	5
20	718-84009	Шина «N» нулевая 4x11 групп на DIN-рейку в корпусе IEK	3


PROJE	PANO	REVİZYON	TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAY	SAYFA
CELALABAD KIZ YURDU	КРЫША-ELP	R0 - 04.08.2026	TEKLED	_____	İMZA / KAŞE: _____	7

PANO ÜRETİM ONAYI - КОТЕЛЬНАЯ-ELP


ÖLÇÜ: 1000 x 500 x 250 mm

Özel imalat sıva üstü şapkalı dış ortam 500x1000x250 IP54


1. KAPAK / ÖN GÖRÜNÜŞ

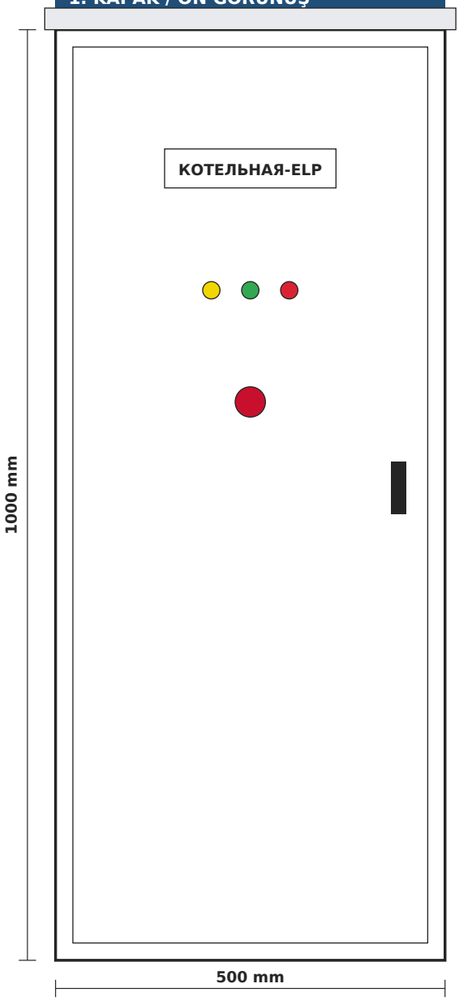

2. İÇ YERLEŞİM / PERDE KALDIRILMIŞ

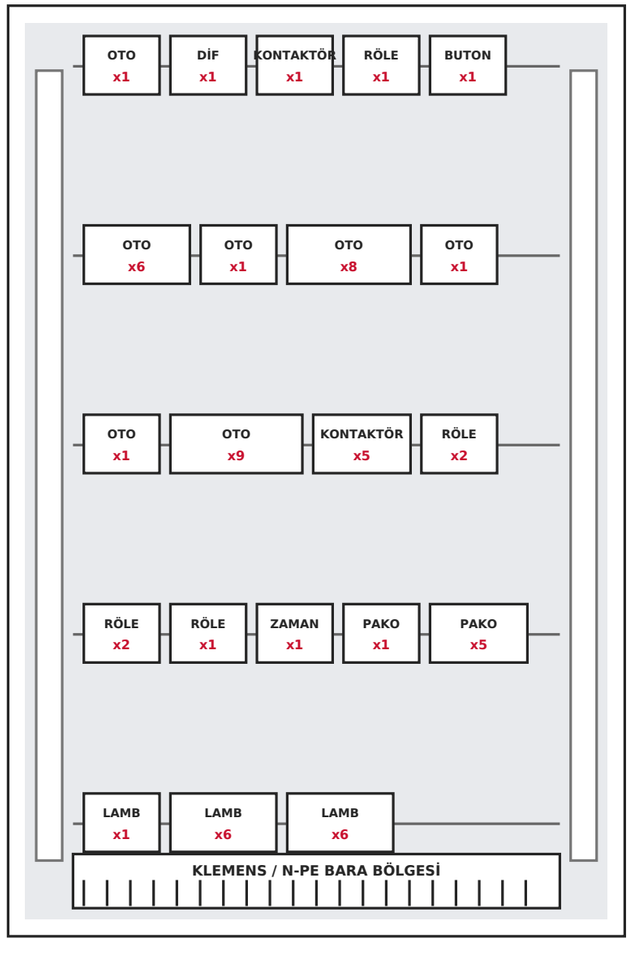

3. YAN GÖRÜNÜŞ



4. PANO ÖZET MALZEME LİSTESİ

№	ARTİKUL	AÇIKLAMA	ADET
1	814173	Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кA х-ка C (R) [giriş]	1
2	280789	УЗО NXL-63 6kA 3P+N 25A 30mA AC (R)	1
3	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R) [ana kontaktör]	1
4	697027	Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380V (R) [FGKR / GKRC-02FA]	1
5	574862	Кнопка управления «Грибок» Ф40 с фиксацией NP2-BS542, красная 1НЗ IP40	1
6	296695	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка B (R) [2 x 3(1x6A) sinyal + FGKR]	6
7	814172	Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кA х-ка C (R) [KZN-02 boiler rezistans]	1
8	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	8
9	296696	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B (R) [aç-kapa pako devresi]	1
10	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) [resirkülasyon zaman saati]	1
11	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	9
12	836704	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R) [pompalar]	5
13	837100	Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R)	2
14	837097	Тепловое реле NXR-12 1-1.6A (R)	2
15	837096	Тепловое реле NXR-12 0.63-1A (R)	1
16	310024	Таймер электронный NKG3 AC230В (R) [şemada LEGRAND 412790]	1
17	425058	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, «0-1» [AÇ-KAPA]	1
18	425192	Кулачковый переключатель LW32-10/1, 10A, 1P, «1-0-2» [MANUEL-OTOMATİK ...	5
19	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R) [L1]	1
20	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R) [L2 + 5x ÇALIŞIR]	6
21	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R) [L3 + 5x ARIZA]	6
22	811000	Шина соединительная типа PIN 1P, 63A, L=1000 мм (R)	1
23	718-42025	Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм² [güç + kumanda]	75
24	718-42030	Клеммник на DIN-рейку 6 мм² [giriş 5x6 мм²]	5
25	718-84018	Шина «N» нулевая 4x7 групп на DIN-рейку в корпусе IEK	2

PROJE	PANO	REVİZYON	TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAY	SAYFA
CELALABAD KIZ YURDU	КОТЕЛЬНАЯ-ELP	R0 - 04.08.2026	TEKLED	_____	İMZA / KAŞE: _____	8

ÜRETİM NOTLARI VE ONAY

GENEL ÜRETİM ESASLARI

01	Sac: dış gövde 1,5 mm; iç perde / montaj taşıyıcıları 1,2 mm. Aksi proje onayında belirtilmedikçe.
02	MAIN PANEL: dikili, 100 mm baza, IP54, dış ortam. Alt/üst kablo giriş plakaları uygulamadan önce teyit edilecek.
03	ПОДВАЛ ve АДМИНИСТРАЦИЯ: sıva altı, üstten girişli, 300 mm klemens bölmeli.
04	ZK, 2K ve КРЫША: sıva altı, alttan girişli, 500 mm şaft müdahale bölmeli.
05	КОТЕЛЬНАЯ: sıva üstü, şapkalı, IP54, dış ortam. Kapak üstü kumanda elemanları BOM adedine göre.
06	Kapak sinyal lambaları: L1 sarı, L2 yeşil, L3 kırmızı. Kumanda elemanları kapak birleşim hattına yerleştirilmeyecek.
07	Tüm cihazlar etiketlenecek; kablo uçları numaralandırılacak; N ve PE devreleri ayrılacak.
08	Klemens sırası pano çıkış sırasına göre düzenlenecek. %20 yedek modül alanı korunacak.
09	BOM ile şema arasında uyuşmazlık görülürse imalata başlamadan proje sorumlusundan yazılı onay alınacak.
10	Pano ölçüleri, kapak açılış yönü, kablo giriş yönü ve duvar boşluğu üretim öncesi teyit edilecektir.

ONAY DURUMU

☐ **ONAYLANDI** ☐ **REVİZYONLA ONAYLANDI** ☐ **ONAYLANMADI**

AÇIKLAMA:

MÜŞTERİ / PROJE YETKİLİSİ _____

İMZA / KAŞE _____

TARİH _____
