ELEKTRİKLİ ISITICI KUMANDA PANOLARI

ЩУ-1 · ЩУ-2 · ЩУ-3

GENEL BİLGİLER

Pano	Adet	Yük	Ana giriş	Korpus	Durum
ЩУ-1	4	Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW	3P C40	650×500×220	OK
ЩУ-2	10	Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW	3P C63	650×500×220	OK*
ЩУ-3	1	Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW	3P C50	650×500×220	OK*

ORTAK UYGULAMA


- Duvar üstü metal korpus, tek kapı
- IP54 · montaj plakalı · RAL 7035
- Kablo girişleri alttan · 5 kablo rakoru
- Kapak: 6 kırmızı Ø22 lamba + 1 adet 1-0-2 seçici

DAYANAK VE SINIRLAR

Dayanak: Schneider R5 BOM ve 5 adet numune pano fotoğrafı. Onaylı tek hat şeması verilmemiştir. Bu dosyadaki fonksiyon şemaları cihaz içeriğini ve sırasını gösterir; uygulama elektrik şemasının yerine geçmez.

MÜŞTERİ KARARI	Ad soyad / görev	İmza	Tarih
☐ ONAYLANDI ☐ NOTLU ONAY ☐ ONAYLANMADI			


DIŞ GÖRÜNÜŞ · 650×500×220 mm

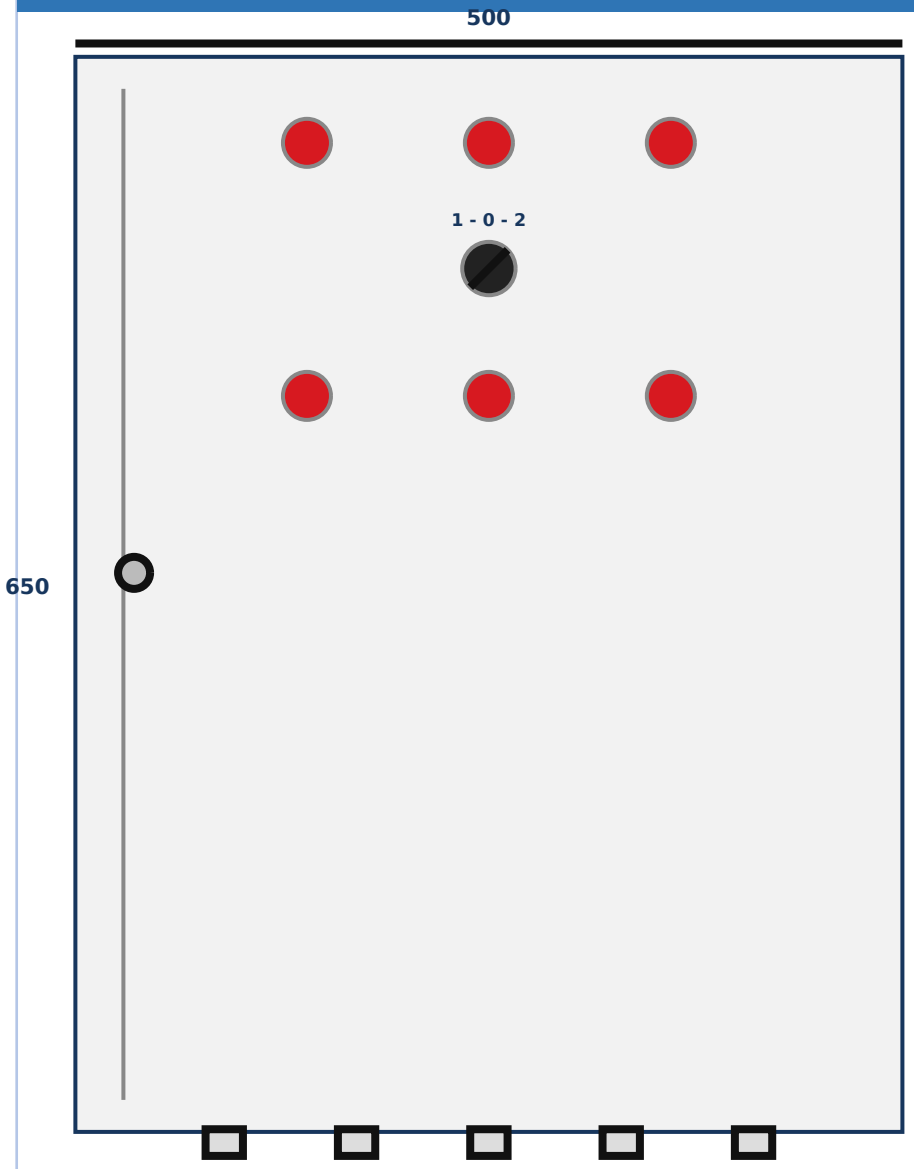

5 × kablo rakoru · kapakta 6 lamba + 1 seçici

Menteşe sağda · kilit/kol solda · duvar üstü montaj

İÇ YERLEŞİM

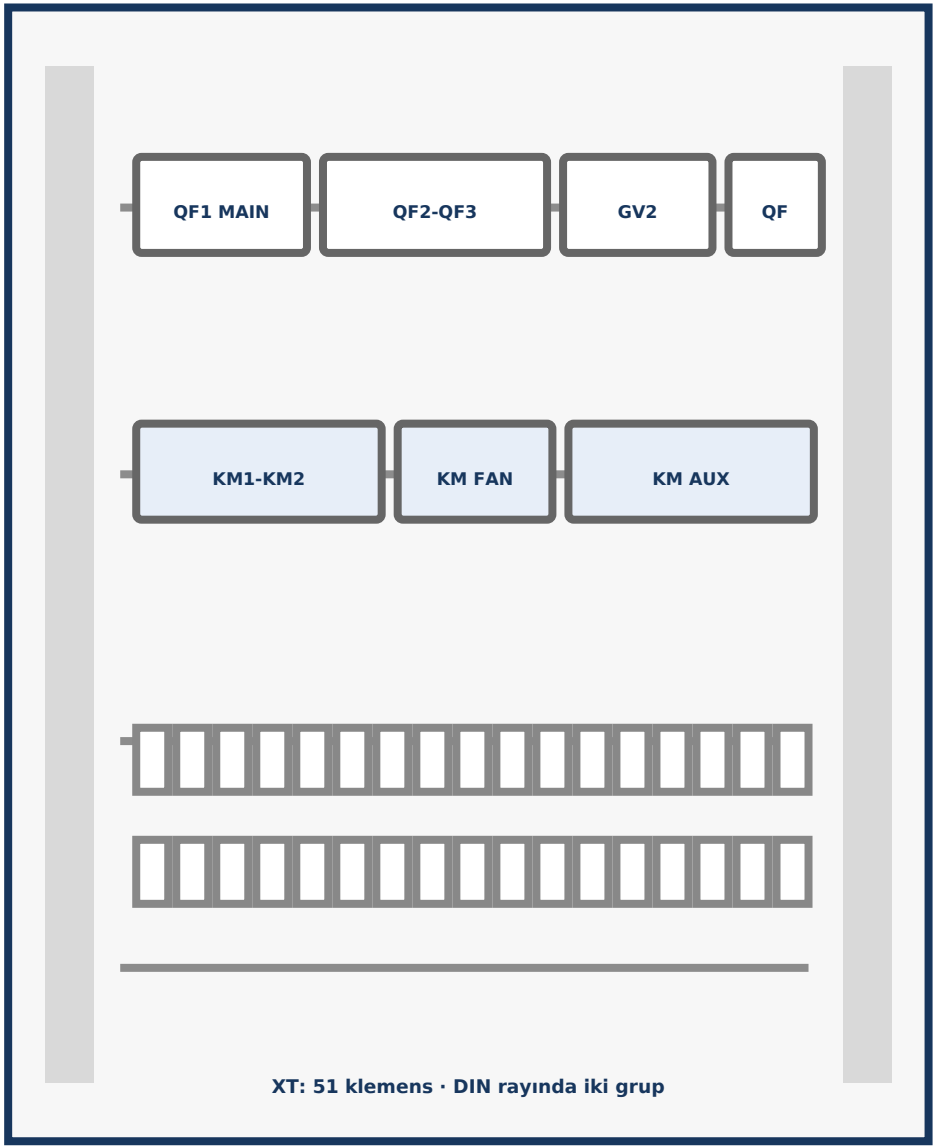

XT: 51 klemens · DIN rayında iki grup



ÜRETİMDE ZORUNLU

- Güç ve kumanda devreleri ayrılacaktır.
- Tüm cihazlar, klemensler ve çıkış kabloları etiketlenecektir.
- Kapak PE bağlantısı esnek sarı-yeşil iletkenle yapılacaktır.
- Çok telli iletkenlerde yüksük kullanılacak; bağlantılar üretici torkunda sıkılacaktır.
- Bakım için en az %20 boş alan bırakılacaktır.
- Montaj sonrası PE sürekliliği, izolasyon, faz sırası ve fonksiyon testi yapılacaktır.

NUMUNEYE AİT NOT

Fotoğraf yerleşim referansıdır: üst sıra koruma cihazları, orta sıra kontaktörler, alt bölge klemensler. Yeni uygulamada R5 BOM, ayrı ana giriş otomatiği, GV2 motor koruma şalteri, 6 kırmızı sinyal lambası ve 1 adet 1-0-2 seçici esas alınacaktır.

Poz.	Artikül / cihaz	Görev
QF1	A9F79340 · 3P C40	Ana giriş otomatiği
QF2-QF3	2 × A9F79320 · 3P C20	İki ısıtıcı kademesi
KM1-KM2	2 × LC1E1810M5	İki kademenin kumandası
QFM	GV2ME14 · 6...10 A	Fan motor koruması
KMF	LC1E0910M5	Fan kontaktörü
QF4	A9F79110 · 1P C10	Aydınlatma
QF5-QF6	2 × A9F79106 · 1P C6	Çekvalf + termostat/kumanda
KM3-KM4	2 × LC1E0610M5	Aydınlatma + çekvalf
HL1-HL6	6 × CHINT 593012 · kırmızı 230 V	Kapak sinyali
SA1	Schneider XB7ND33 · 1-0-2	Mandallı çalışma modu seçimi
XT	51 EKT klemens	Giriş, PE/N, ısıtıcı, fan ve kumanda

BASİTLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYON ŞEMASI



GV2ME14 ayarı devreye almada motor etiket akımına göre yapılacaktır.

Poz.	Artikül / cihaz	Görev
QF1	A9F79363 · 3P C63	Ana giriş otomatiği
QF2-QF3	2 × A9F79325 · 3P C25	İki ısıtıcı kademesi
KM1-KM2	2 × LC1E2510M5	İki kademenin kumandası
QFM	GV2ME20 · 13…18 A*	Fan motor koruması
KMF	LC1E2510M5	Fan kontaktörü
QF4	A9F79110 · 1P C10	Aydınlatma
QF5-QF6	2 × A9F79106 · 1P C6	Çekvalf + termostat/kumanda
KM3-KM4	2 × LC1E0610M5	Aydınlatma + çekvalf
HL1-HL6	6 × CHINT 593012 · kırmızı 230 V	Kapak sinyali
SA1	Schneider XB7ND33 · 1-0-2	Mandallı çalışma modu seçimi
XT	51 EKT klemens	Giriş, PE/N, ısıtıcı, fan ve kumanda

BASİTLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYON ŞEMASI



*** SERİ ÜRETİMDEN ÖNCE: 8 kW motor etiket akımı doğrulanacaktır. In > 18 A ise GV2ME20 yerine GV2ME21 (17…23 A) kullanılacaktır.**

Poz.	Artikül / cihaz	Görev
QF1	A9F79350 · 3P C50	Ana giriş otomatiği
QF2-QF3	2 × A9F79320 · 3P C20	İki ısıtıcı kademesi
KM1-KM2	2 × LC1E1810M5	İki kademenin kumandası
QFM	GV2ME20 · 13…18 A*	Fan motor koruması
KMF	LC1E2510M5	Fan kontaktörü
QF4	A9F79110 · 1P C10	Aydınlatma
QF5-QF6	2 × A9F79106 · 1P C6	Çekvalf + termostat/kumanda
KM3-KM4	2 × LC1E0610M5	Aydınlatma + çekvalf
HL1-HL6	6 × CHINT 593012 · kırmızı 230 V	Kapak sinyali
SA1	Schneider XB7ND33 · 1-0-2	Mandallı çalışma modu seçimi
XT	51 EKT klemens	Giriş, PE/N, ısıtıcı, fan ve kumanda

BASİTLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYON ŞEMASI



*** SERİ ÜRETİMDEN ÖNCE: 8 kW motor etiket akımı doğrulanacaktır. In > 18 A ise GV2ME20 yerine GV2ME21 (17…23 A) kullanılacaktır.**
