ELEKTRİKLİ ISITICI KUMANDA PANOLARI | ЩУ-1 / ЩУ-2 / ЩУ-3

GENEL BİLGİLER

Pano	Adet	Yük	Korpus
ЩУ-1	4	Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54
ЩУ-2	10	Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54
ЩУ-3	1	Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54

PANO ÖZELLİKLERİ

Duvar üstü metal gövde, tek kapı ve montaj plakası. Koruma sınıfı IP54; gövde rengi RAL 7035. Her panonun kapağında 3 kırmızı sinyal lambası ve 1 adet 1-0 konumlu, 16 A pako şalter bulunur. Toplam pano adedi: 15 takım.

DOSYA İÇERİĞİ


- Genel görünüş ve konstrüksiyon
- Numune yerleşim fotoğrafı
- Her pano tipi için ana cihaz listesi
- Her pano tipi için tek hat şeması
- Müşteri onay formu

ONAY KAPSAMI

Dosya; pano görünüşü, ana cihaz seçimi ve fonksiyonel tek hat şemalarının müşteri değerlendirmesine sunulması içindir. Fonksiyonel şemalardaki bağlantı atamaları nihai elektrik projesinde kesinleştirilecektir.

650 × 500 × 220 mm | IP54 | Duvar üstü metal pano

ÖN GÖRÜNÜŞ

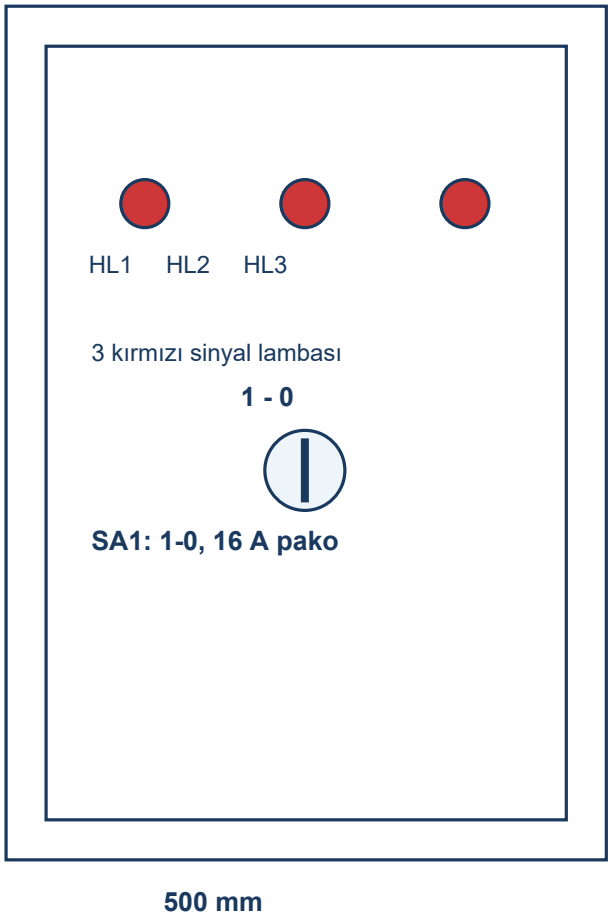

UYGULAMA ESASLARI

- Duvar üstü metal korpus; tek kapı; montaj plakalı.
- Kapakta 3 kırmızı lamba ve 1 adet 1-0, 16 A pako.
- Koruma sınıfı IP54; boyutlar 650 × 500 × 220 mm.
- Gövde rengi RAL 7035; alttan kablo girişi; 5 kablo rakoru.
- Menteşe sağda, kilit solda.
- Üst bölüm koruma; orta bölüm kontaktör ve röle; alt bölüm klemensler.
- Yerleşim ölçülü imalat resmi değildir; cihaz boyutları ile montaj alanı doğrulanacaktır.

MONTAJ VE KONTROL

- Güç ve kumanda kablolarını ayırın; cihaz ve çıkışları etiketleyin.
- Kapak PE bağlantısını esnek sarı-yeşil iletkenle yapın.
- Çok telli iletkenlerde yüksük kullanın; bağlantıları ilgili üretici torkuna göre sıkın.
- Bakım ve montaj için en az %20 boş alan bırakın.
- PE sürekliliği, izolasyon, faz sırası ve fonksiyon testlerini kaydedin.
- Kablo kesitlerini nihai devre koşullarına göre doğrulayın.

İç yerleşim referansı



YERLEŞİM ESASLARI

- Üst bölüm: koruma cihazları.
- Orta bölüm: kontaktörler ve ara röle.
- Alt bölüm: bağlantı klemensleri.
- Güç ve kumanda kabloları ayrı yönlendirilecektir.
- Cihazlar, klemensler ve çıkışlar etiketlenecektir.
- Kapak koruma iletkeni ile gövdeye bağlanacaktır.

Fotoğraf iç yerleşim referansıdır. Cihaz kapsamı ilgili pano tipinin ana cihaz listesinde tanımlanmıştır.

ANA CİHAZLAR VE KORPUS | 4 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

No	Grup / artikül	Malzeme tanımı	Birim	1 pano	Toplam
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	4
2	oto / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кА	шт	2	8
3	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	2	8
4	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	4
5	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	4
6	contactor / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	8
7	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	2	8
8	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	4
9	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	4
10	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	12
SA1	Pako şalter	1-0 konumlu pako şalter, 16 A	adet	1	4

ANA CİHAZLAR VE KORPUS | 10 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

No	Grup / artikül	Malzeme tanımı	Birim	1 pano	Toplam
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	10
2	oto / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	20
3	oto / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кA	шт	1	10
4	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	10
5	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	10
6	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	10
7	contactor / 41999	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	20
8	contactor / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	10
9	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	10
10	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	10
11	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	10
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	30
SA1	Pako şalter	1-0 konumlu pako şalter, 16 A	adet	1	10

ANA CİHAZLAR VE KORPUS | 1 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

No	Grup / artikül	Malzeme tanımı	Birim	1 pano	Toplam
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	1
2	oto / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кA	шт	2	2
3	oto / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кA	шт	1	1
4	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	1
5	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	1
6	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	1
7	contactor / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	2
8	contactor / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	1
9	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	1
10	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	1
11	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	1
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	3
SA1	Pako şalter	1-0 konumlu pako şalter, 16 A	adet	1	1

Çizim: HICH-SLD-01 / R4 | Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW | ONAYA SUNULAN FONKSİYON ŞEMASI

Besleme: 400/230 V, 3~ + N + PE

SA1: 1-0, 16 A pako / 1 adet
Kutup sayısı ve bağlantı görevi: nihai projeye göre.

Giriş sınırı: ayrı ana giriş cihazı kapsam dışı

L1-L2-L3

QH1* A9F79340 3P C40	QH2* A9F79340 3P C40	QF* R9F12310 / C10 3P	QA* R9F12310 3P C10	QL* A9F79110 1P C10	QC* A9F79106 1P C6
KH1* LC1E50M5	KH2* LC1E50M5	KF* LC1E1810M5	KA* LC1E1810M5		
EH1* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 20 kW	EH2* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 20 kW	M1* Fan 3 kW Motor aşırı yük koruması: teyit	Yardımcı yük* Görev / faz sayısı teyit bekliyor	Aydınlatma / yardımcı devre* Görev teyit	Kumanda* JZX-22F(D) CZY14A soket 220 V AC

N — N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE — PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Fonksiyon eşleştirmeleri ve kesik çizgili bağlantılar nihai elektrik projesinde kesinleştirilecektir. SA1 pako şalterin bağlantı görevi ve kutup sayısı nihai projede tanımlanacaktır. Bu çizim fonksiyonel tek hat şemasıdır.

Çizim: HICH-SLD-02 / R4 | Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW | ONAYA SUNULAN FONKSİYON ŞEMASI

Besleme: 400/230 V, 3~ + N + PE

SA1: 1-0, 16 A pako / 1 adet
Kutup sayısı ve bağlantı görevi: nihai projeye göre.

Giriş sınırı: ayrı ana giriş cihazı kapsam dışı

2 × LC1E50M5 / Bağlantı görevi: nihai projeye göre

L1-L2-L3

Isıtıcı kolu*
Otomatik şalter
Kapsam dışı

Isıtıcı kolu*
Otomatik şalter
Kapsam dışı

QF*
A9F79320 / C20
3P

QA*
R9F12310
3P C10

QL*
A9F79110
1P C10

QC*
A9F79106
1P C6

KH1*
LC1E65M5

KH2*
LC1E65M5

KF*
LC1E2510M5

KA*
LC1E1810M5

EH1* Isıtıcı
Kademe gücü teyit
Toplam 26 kW

EH2* Isıtıcı
Kademe gücü teyit
Toplam 26 kW

M1* Fan 8 kW
Motor aşırı yük
koruması: teyit

Yardımcı yük*
Görev / faz sayısı
teyit bekliyor

Aydınlatma /
yardımcı devre*
Görev teyit

Kumanda*
JZX-22F(D)
CZY14A soket
220 V AC

N — N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE — PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Fonksiyon eşleştirmeleri ve kesik çizgili bağlantılar nihai elektrik projesinde kesinleştirilecektir. SA1 pako şalterin bağlantı görevi ve kutup sayısı nihai projede tanımlanacaktır. Bu çizim fonksiyonel tek hat şemasıdır.

Çizim: HICH-SLD-03 / R4 | Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW | ONAYA SUNULAN FONKSİYON ŞEMASI

Besleme: 400/230 V, 3~ + N + PE

SA1: 1-0, 16 A pako / 1 adet
Kutup sayısı ve bağlantı görevi: nihai projeye göre.

Giriş sınırı: ayrı ana giriş cihazı kapsam dışı

L1-L2-L3

QH1* A9F79340 3P C40	QH2* A9F79340 3P C40	QF* A9F79320 / C20 3P	QA* R9F12310 3P C10	QL* A9F79110 1P C10	QC* A9F79106 1P C6
KH1* LC1E50M5	KH2* LC1E50M5	KF* LC1E2510M5	KA* LC1E1810M5		
EH1* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 22 kW	EH2* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 22 kW	M1* Fan 8 kW Motor aşırı yük koruması: teyit	Yardımcı yük* Görev / faz sayısı teyit bekliyor	Aydınlatma / yardımcı devre* Görev teyit	Kumanda* JZX-22F(D) CZY14A soket 220 V AC

N — N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE — PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Fonksiyon eşleştirmeleri ve kesik çizgili bağlantılar nihai elektrik projesinde kesinleştirilecektir. SA1 pako şalterin bağlantı görevi ve kutup sayısı nihai projede tanımlanacaktır. Bu çizim fonksiyonel tek hat şemasıdır.

Proje: 260814 YSF HICH | Isıtıcı Kumanda Panoları

ONAYA SUNULAN PANOLAR

Pano	Adet	Yük
ЩУ-1	4	Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW
ЩУ-2	10	Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW
ЩУ-3	1	Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW

MÜŞTERİ KARARI

□ **ONAYLANDI** □ **NOTLU ONAY** □ **ONAYLANMADI**

Firma	
Ad soyad / görev	
Tarih	
İmza / kaşe	

MÜŞTERİ NOTLARI

Onay kapsamı: pano görünüşü, ana cihaz listeleri ve fonksiyonel tek hat şemaları. İmalat bağlantıları nihai elektrik projesine göre uygulanacaktır.
