ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ | ЩУ-1 / ЩУ-2 / ЩУ-3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Щит	Кол-во	Нагрузка	Корпус
ЩУ-1	4	Нагреватель 20 кВт + вентилятор 3 кВт	650 × 500 × 220 мм / IP54
ЩУ-2	10	Нагреватель 26 кВт + вентилятор 8 кВт	650 × 500 × 220 мм / IP54
ЩУ-3	1	Нагреватель 22 кВт + вентилятор 8 кВт	650 × 500 × 220 мм / IP54

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩИТОВ

Настенный металлический корпус с одной дверью и монтажной панелью. Степень защиты IP54; цвет корпуса RAL 7035. На двери каждого щита установлены 3 красные сигнальные лампы и 1 пакетный переключатель 1-0, 16 А. Всего щитов: 15 комплектов.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Общий вид и конструкция
- Фотография образца внутренней компоновки
- Перечень основного оборудования для каждого типа щита
- Однолинейная схема для каждого типа щита
- Форма согласования заказчиком

ОБЪЕМ СОГЛАСОВАНИЯ

Документация предназначена для согласования заказчиком внешнего вида щитов, выбора основного оборудования и функциональных однолинейных схем. Назначение соединений на функциональных схемах будет уточнено в окончательном электрическом проекте.

650 × 500 × 220 мм | IP54 | Настенный металлический щит

ВИД СПЕРЕДИ



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Настенный металлический корпус; одна дверь; монтажная панель.
- На двери: 3 красные лампы и 1 пакетный переключатель 1-0, 16 A.
- Степень защиты IP54; размеры 650 × 500 × 220 мм.
- Цвет корпуса RAL 7035; ввод кабелей снизу; 5 кабельных вводов.
- Петли справа, замок слева.
- Сверху: аппараты защиты; в середине: контакторы и реле; снизу: клеммы.
- Компоновка не является размерным рабочим чертежом; габариты аппаратов и монтажная зона подлежат проверке.

МОНТАЖ И КОНТРОЛЬ

- Разделяйте силовые кабели и кабели управления; маркируйте аппараты и выходы.
- Соедините дверь с PE гибким желто-зеленым проводником.
- Для многопроволочных жил применяйте наконечники; затягивайте соединения с моментом, указанным изготовителем.
- Оставьте не менее 20% свободного места для монтажа и обслуживания.
- Зафиксируйте результаты проверки непрерывности PE, изоляции, чередования фаз и функциональных испытаний.
- Проверьте сечения кабелей по окончательным условиям работы цепей.

Образец внутренней компоновки



ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ

- Верхняя зона: аппараты защиты.
- Средняя зона: контакторы и промежуточное реле.
- Нижняя зона: соединительные клеммы.
- Силовые кабели и кабели управления прокладываются раздельно.
- Аппараты, клеммы и выходы подлежат маркировке.
- Дверь соединяется с корпусом защитным проводником.


Фотография служит образцом внутренней компоновки. Состав оборудования указан в перечне для соответствующего типа щита.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОРПУС | 4 компл. | Количество на один щит; всего = на 1 щит × количество щитов

№	Группа / артикул	Наименование	Ед.	На 1 щит	Всего
1	Корпус / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	4
2	Автомат / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кА	шт	2	8
3	Автомат / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	2	8
4	Автомат / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	4
5	Контактор / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	8
6	Контактор / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	2	8
7	Реле / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	4
8	Колодка / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	4
9	Индикатор / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	12
SA1	Пакетный перекл.	Пакетный переключатель 1-0, 16 А	шт	1	4

Чертеж: HICH-SLD-01 / R7 | Нагреватель 20 кВт + вентилятор 3 кВт | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА НА СОГЛАСОВАНИЕ

Питание: 400/230 В, 3~ + N + PE

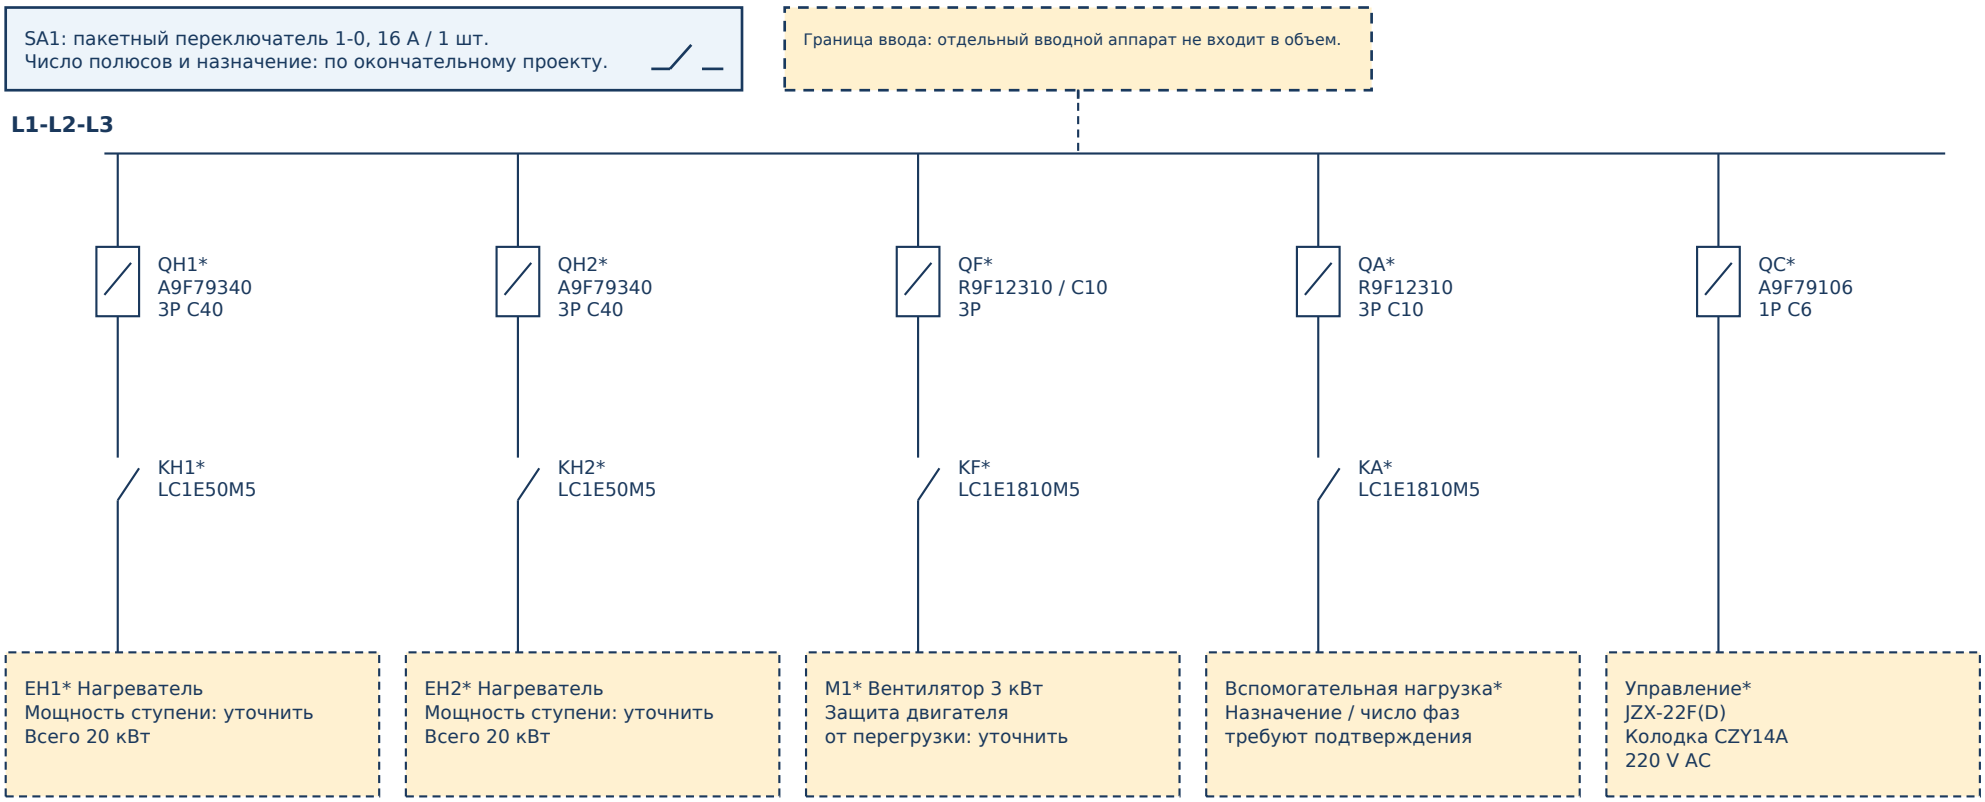

N	Шина N → цепи 1P, катушки реле / контакторов, 3 × HL (230 В); распределение подлежит уточнению.
PE	Распределение PE → металлический корпус, дверь и защитные проводники нагрузок; назначение клемм уточняется.


* Назначение аппаратов и соединения, показанные пунктиром, будут уточнены в окончательном электрическом проекте. Назначение соединений и число полюсов пакетного переключателя SA1 определяются окончательным проектом. Чертеж является функциональной однолинейной схемой.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОРПУС | 10 компл. | Количество на один щит; всего = на 1 щит × количество щитов

№	Группа / артикул	Наименование	Ед.	На 1 щит	Всего
1	Корпус / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	10
2	Автомат / 41950	Автоматический выключатель SE R9F12350 (AB) 3P C 50A 6 kA	шт	2	20
3	Автомат / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кА	шт	1	10
4	Автомат / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	10
5	Автомат / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	10
6	Контактор / 41999	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	20
7	Контактор / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	10
8	Контактор / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	10
9	Реле / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	10
10	Колодка / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	10
11	Индикатор / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	30
SA1	Пакетный перекл.	Пакетный переключатель 1-0, 16 А	шт	1	10

Чертеж: HICH-SLD-02 / R7 | Нагреватель 26 кВт + вентилятор 8 кВт | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА НА СОГЛАСОВАНИЕ

Питание: 400/230 В, 3~ + N + PE

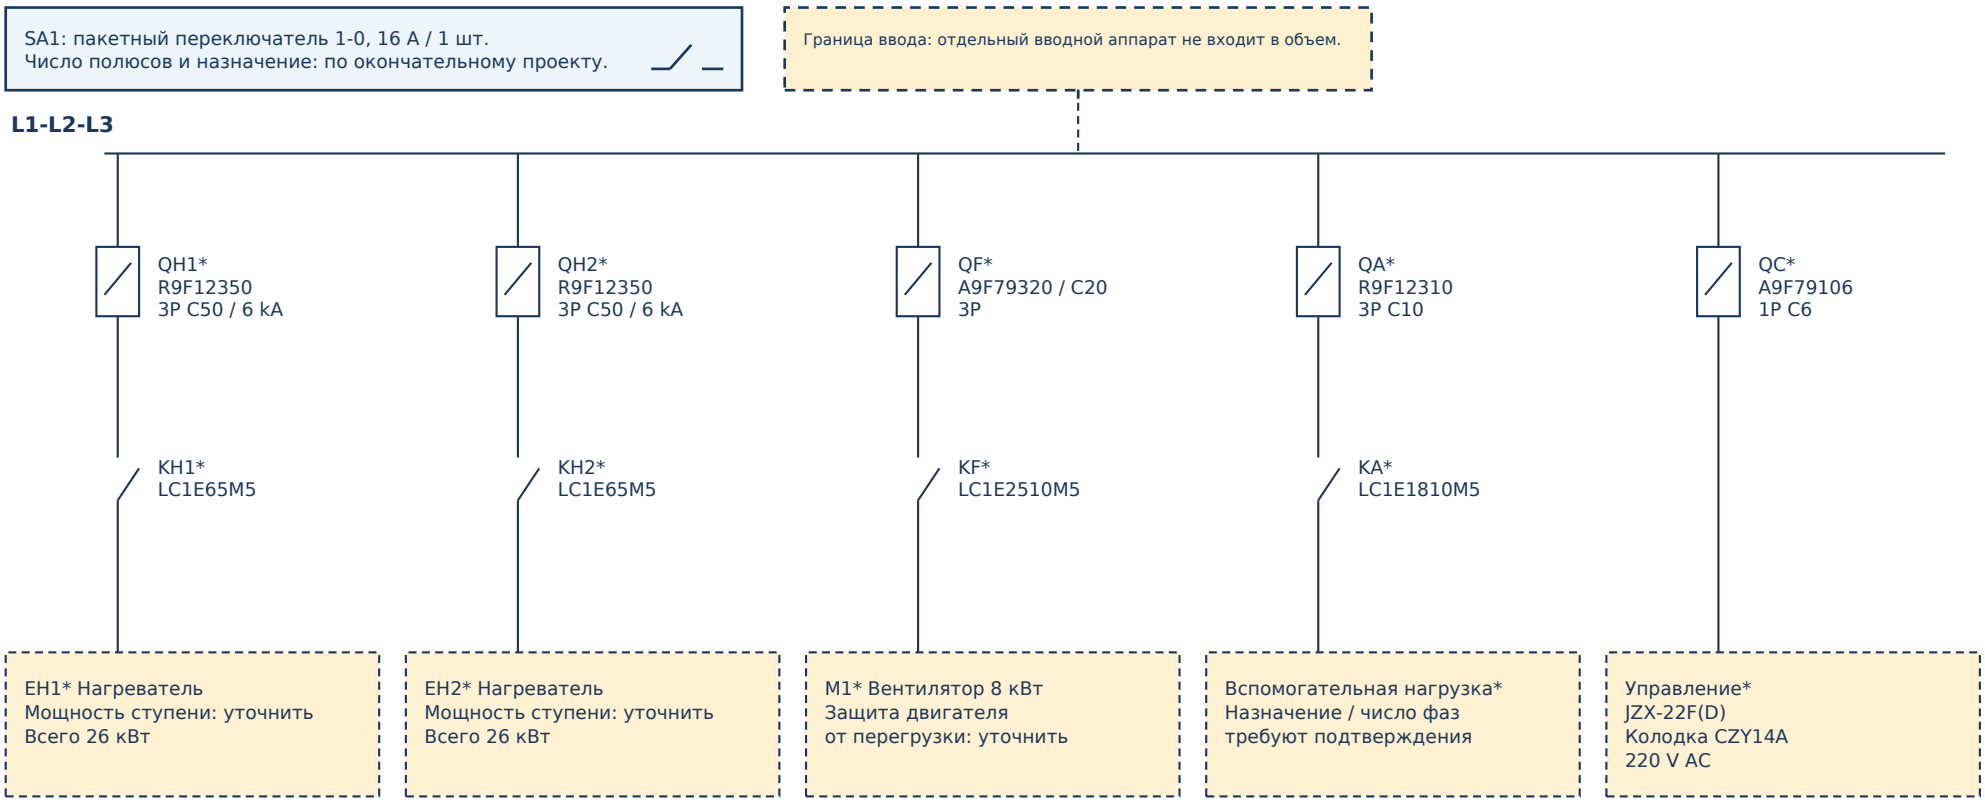

N	Шина N → цепи 1P, катушки реле / контакторов, 3 × HL (230 В); распределение подлежит уточнению.
PE	Распределение PE → металлический корпус, дверь и защитные проводники нагрузок; назначение клемм уточняется.


* Назначение аппаратов и соединения, показанные пунктиром, будут уточнены в окончательном электрическом проекте. Назначение соединений и число полюсов пакетного переключателя SA1 определяются окончательным проектом. Чертеж является функциональной однолинейной схемой.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОРПУС | 1 компл. | Количество на один щит; всего = на 1 щит × количество щитов

№	Группа / артикул	Наименование	Ед.	На 1 щит	Всего
1	Корпус / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	1
2	Автомат / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кА	шт	2	2
3	Автомат / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кА	шт	1	1
4	Автомат / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	1
5	Автомат / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	1
6	Контактор / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	2
7	Контактор / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	1
8	Контактор / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	1
9	Реле / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	1
10	Колодка / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	1
11	Индикатор / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	3
SA1	Пакетный перекл.	Пакетный переключатель 1-0, 16 А	шт	1	1

Чертеж: HICH-SLD-03 / R7 | Нагреватель 22 кВт + вентилятор 8 кВт | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА НА СОГЛАСОВАНИЕ

Питание: 400/230 В, 3~ + N + PE

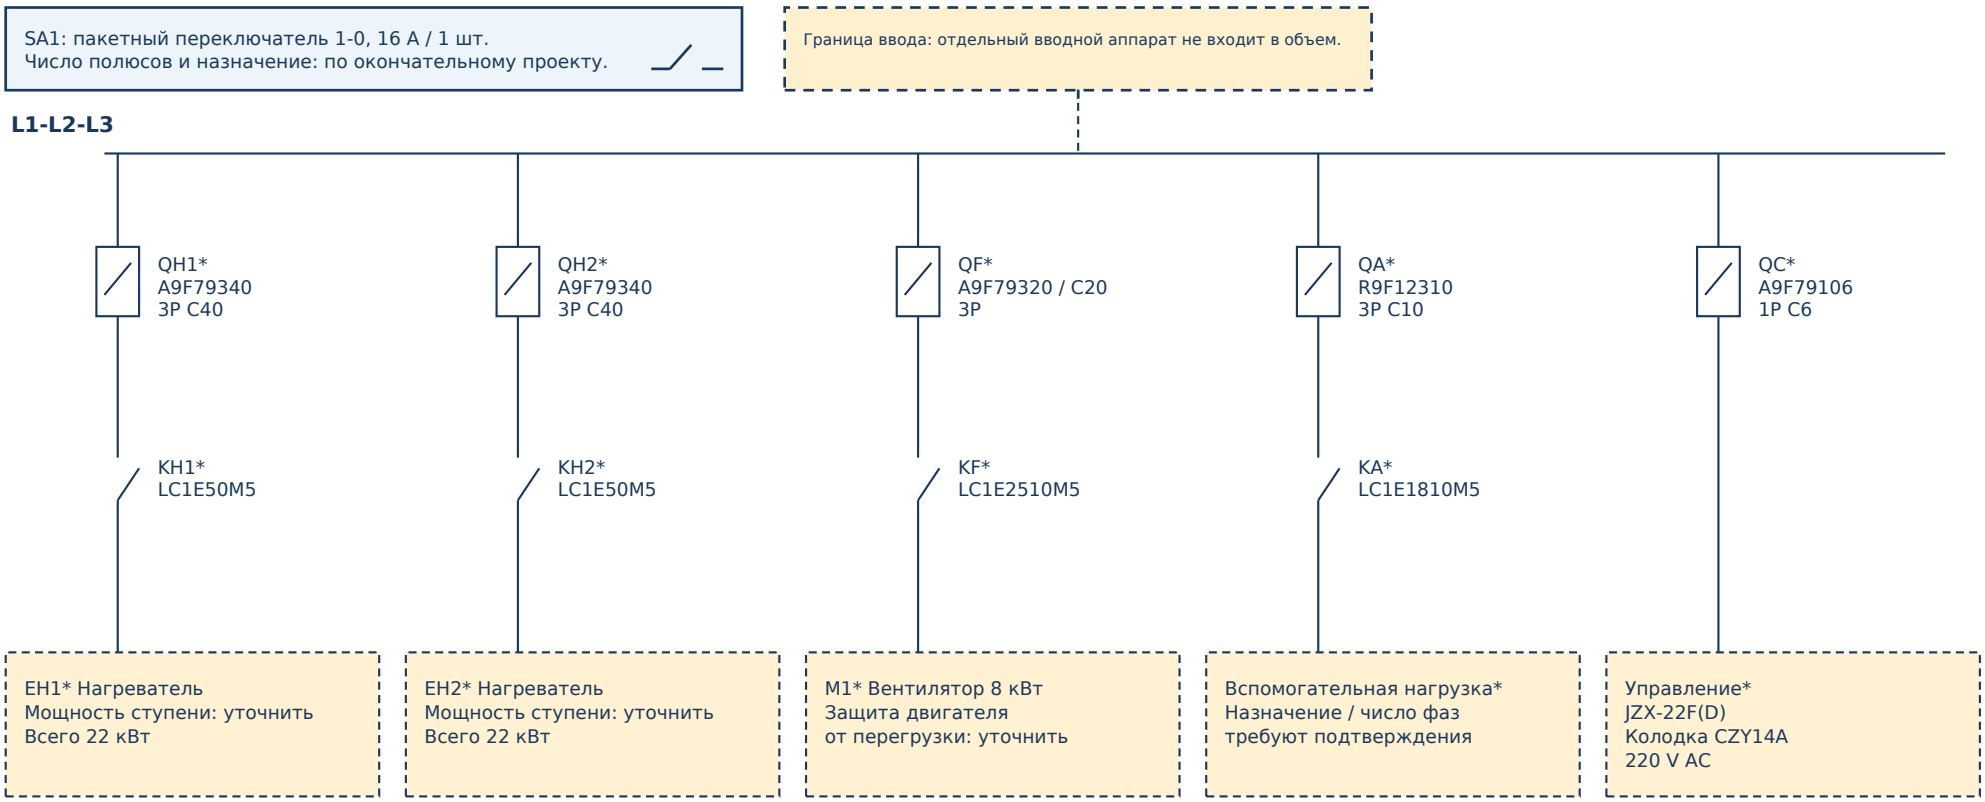

N	Шина N → цепи 1P, катушки реле / контакторов, 3 × HL (230 В); распределение подлежит уточнению.
PE	Распределение PE → металлический корпус, дверь и защитные проводники нагрузок; назначение клемм уточняется.

* Назначение аппаратов и соединения, показанные пунктиром, будут уточнены в окончательном электрическом проекте. Назначение соединений и число полюсов пакетного переключателя SA1 определяются окончательным проектом. Чертеж является функциональной однолинейной схемой.

Проект: 260814 YSF HICH | Щиты управления нагревателями

ЩИТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СОГЛАСОВАНИЕ

Щит	Кол-во	Нагрузка
ЩУ-1	4	Нагреватель 20 кВт + вентилятор 3 кВт
ЩУ-2	10	Нагреватель 26 кВт + вентилятор 8 кВт
ЩУ-3	1	Нагреватель 22 кВт + вентилятор 8 кВт

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ **СОГЛАСОВАНО** ☐ **СОГЛАСОВАНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ** ☐ **НЕ СОГЛАСОВАНО**

Компания	
Ф.И.О. / должность	
Дата	
Подпись / печать	

ЗАМЕЧАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Объем согласования: внешний вид щитов, перечни основного оборудования и функциональные однолинейные схемы. Монтаж соединений выполняется по окончательному электрическому проекту.
