NOVA MEP / YAKUP BEY

Sensör İmitasyon Cihazı - SUZ RODNIK


Pano adı	KUMANDA PANOSU
Adet	3 komple
Korpus	Metal, sıva üstü
Dış ölçü	395 × 310 × 150 mm
Koruma sınıfı	IP54, УХЛ3
Röle	RT424024 - 24 VDC, DPDT, 8 A/250 VAC
Üretim durumu	24 V SEVİYESİ UYUMLU; AÇIK TEKNİK MADDELER SAYFA 5

ÖN GÖRÜNÜŞ



TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAYI	ÜRETİM	KALİTE
Tarih / İmza	Tarih / İmza	Tarih / İmza	Tarih / İmza	Tarih / İmza

KORPUS İÇ YERLEŞİMİ - ŞEMATİK

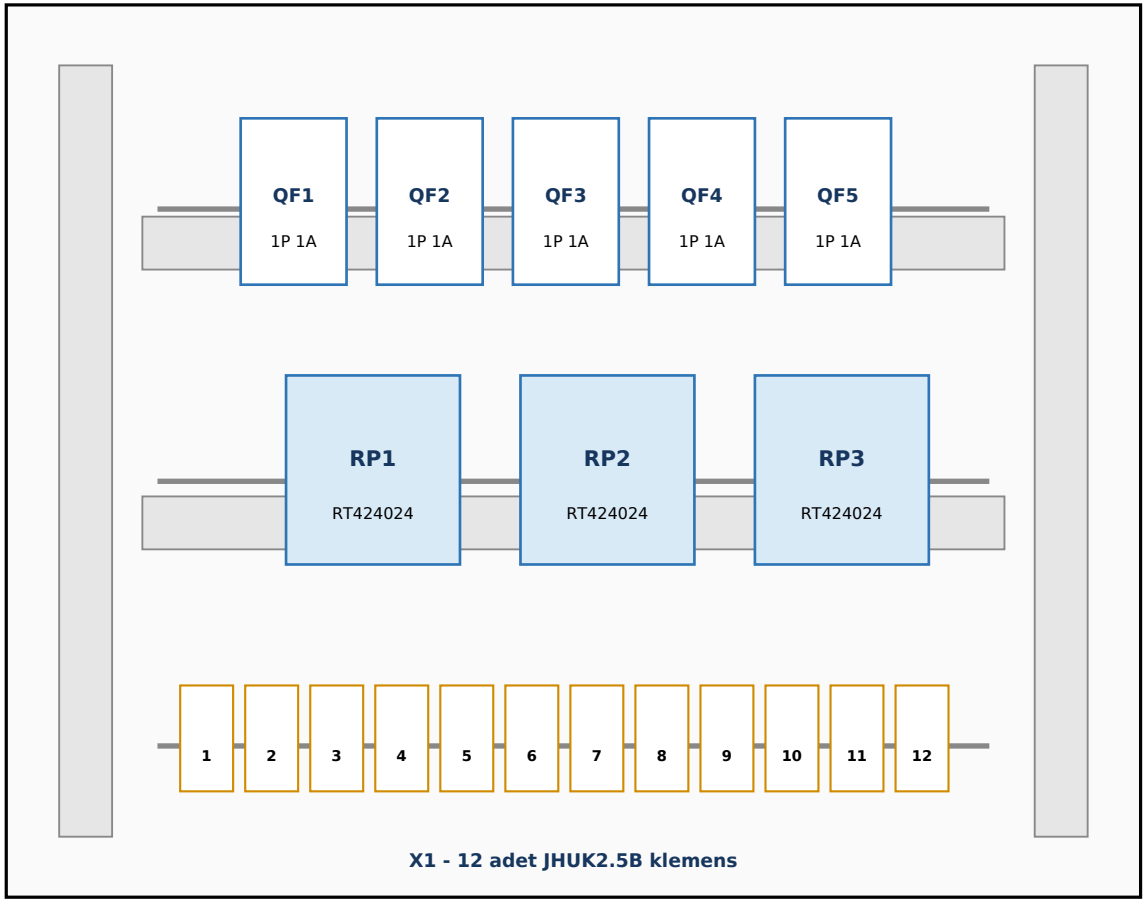

X1 - 12 adet JHUK2.5B klemens

Montaj plakası	Korpus standart montaj plakası
DIN ray	En az 3 yatay sıra
Kablo kanalı	25×25 mm, yaklaşık 0,9 m/pano
İç kablo	1 mm², yaklaşık 20 m/pano
Kablo yüksüğü	1 mm², yaklaşık 65 adet/pano
Kablo girişi	DWG ve saha yönüne göre
Rezerv alan	Mevcut korpus içinde kalan alan

KRİTİK ÜRETİM NOTU

Klemens numaraları, röle kontakları ve saha bağlantıları **teslim edilen DWG şemasına göre birebir uygulanacaktır.**

TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAYI	ÜRETİM	KALİTE
Tarih / İmza	Tarih / İmza	Tarih / İmza	Tarih / İmza	Tarih / İmza

No	Kod	Malzeme	Marka	1 Pano	Toplam	Birim
1	719-15410	Metal korpus ЩМП-1, 395×310×150, IP54	KAZTEK	1	3	adet
2	814008	MCB NXB-63, 1P, 1A, C eğrisi, 6 kA	CHINT	5	15	adet
3	6-1393243-8	RT424024 röle, 24 VDC, DPDT, 8 A/250 VAC	PYS	3	9	adet
4	14F08	8 pin röle soketi	PYS	3	9	adet
5	701-03250-1	Geçiş klemensi JHUK2.5B	TEKLED	12	36	adet
6	-	1 mm² iç bağlantı kablosu	Montaj	20	60	m
7	-	1 mm² kablo yüksüğü	Montaj	65	195	adet
8	-	25×25 mm kablo kanalı	Montaj	0,9	2,7	m

BOM KONTROL SONUCU

- Excel reçetesindeki pano adedi 3 kompledir. İç malzeme miktarları pano başına verilmiştir.
- Toplamlar 3 pano için hesaplanmıştır. Fiyat bilgileri müşteri onay sayfasına dahil edilmemiştir.
- Korpus ve cihaz ölçü uyumu üretim öncesi fiziksel numune üzerinden son kez kontrol edilmelidir.

1. MEKANİK

- Korpus: 395×310×150 mm, metal, sıva üstü, IP54.
- Kapak dış yüzeyinde BOM/DWG ile tanımlanmayan buton veya lamba açılmayacaktır.
- Kapı kolu/mandal ve menteşe yönü standart korpus yapısında korunacaktır.
- Ray ve kanallar cihaz sökme-takma mesafesini engellemeyecek şekilde monte edilecektir.

2. ELEKTRİKSEL

- Tüm devre tanımları ve bağlantılar teslim edilen DWG dosyasına göre yapılacaktır.
- MCB: CHINT NXB-63 1P 1A C 6 kA - 5 adet/pano.
- Röle: RT424024, 24 VDC ve 14F08 soket - 3 takım/pano.
- Klemensler X1:1...X1:12 olarak, DWG sırasına uygun etiketlenecektir.
- Kablo uçları yüksüklenecek; her iki uçta cihaz/klemens numarası bulunacaktır.

3. TEST VE TESLİM

- PE süreklilik, izolasyon ve bağlantı kontrolü tamamlanacaktır.
- MCB açma-kapama ve 3 rölenin bobin/kontak fonksiyon testi yapılacaktır.
- Klemens-DWG nokta kontrolü %100 uygulanacaktır.
- Pano içinde yabancı parça bırakılmayacak; kapak ve iç görünüş fotoğrafı arşivlenecektir.

MÜŞTERİ ONAYI

Bu onay; korpus ölçüsü, cihaz listesi ve yerleşimi kapsar. Bağlantı şeması için teslim edilen **DWG dosyası bağlayıcı üretim dokümanıdır.**

TASARIM	KONTROL	MÜŞTERİ ONAYI	ÜRETİM	KALİTE
Tarih / İmza	Tarih / İmza	Tarih / İmza	Tarih / İmza	Tarih / İmza

TEK HAT ŞEMASINDAN DOĞRULANANLAR

Koruma	Projede toplam 5 adet 1 A koruma gösteriliyor.	**BOM ile uyumlu**
Röle adedi	Projede RP1, RP2, RP3 olmak üzere 3 röle bulunuyor.	**BOM ile uyumlu**
Sinyal seviyesi	Teknik su ve yangın suyu devreleri 24 VDC / 1-0-24 V.	**Doğrulandı**
Sensör uçları	СУЗ РОДНИК bağlantıları: ДВУ, ДНУ, ДСУ.	**Doğrulandı**
Dirençler	Projede R1=100 Ω ve R2=100 Ω bulunuyor.	**BOM'da yok**
Güç kaynağı	Projede +24 VDC güç kaynağı bulunuyor.	**BOM'da yok**
Röle gerilimi	BOM RT424024 = 24 VDC; proje metninde 24 V AC yazılı.	**24 V UYUMLU / AC-DC TEYİT**
Topraklama	Projede topraklama barası gösteriliyor.	**PE malzemeleri eksik**

24 V RÖLE DÜZELTİLDİ - ÜRETİM ÖNCESİ KALAN TEKNİK MADDELER


1. Proje metnindeki AC ifadesi ile 24 VDC devre uyumu 2. Güç kaynağının pano içinde mi harici mi olduğu 3. R1/R2 direnç güç değeri

Onaylı BOM rölesi: 6-1393243-8 / RT424024, 24 VDC, DPDT, 8 A/250 VAC - pano başına 3 adet.

Kaynak: ИММИТАЦИЯ ДАТЧИКОВ / УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУЗ РОДНИК - Model.pdf

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ПЕРЕВОДА НАСОСОВ В "МОБИЛИЗАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ" ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

PUMP POVER PANTL 21.1 ; 21.2 ; 24.1

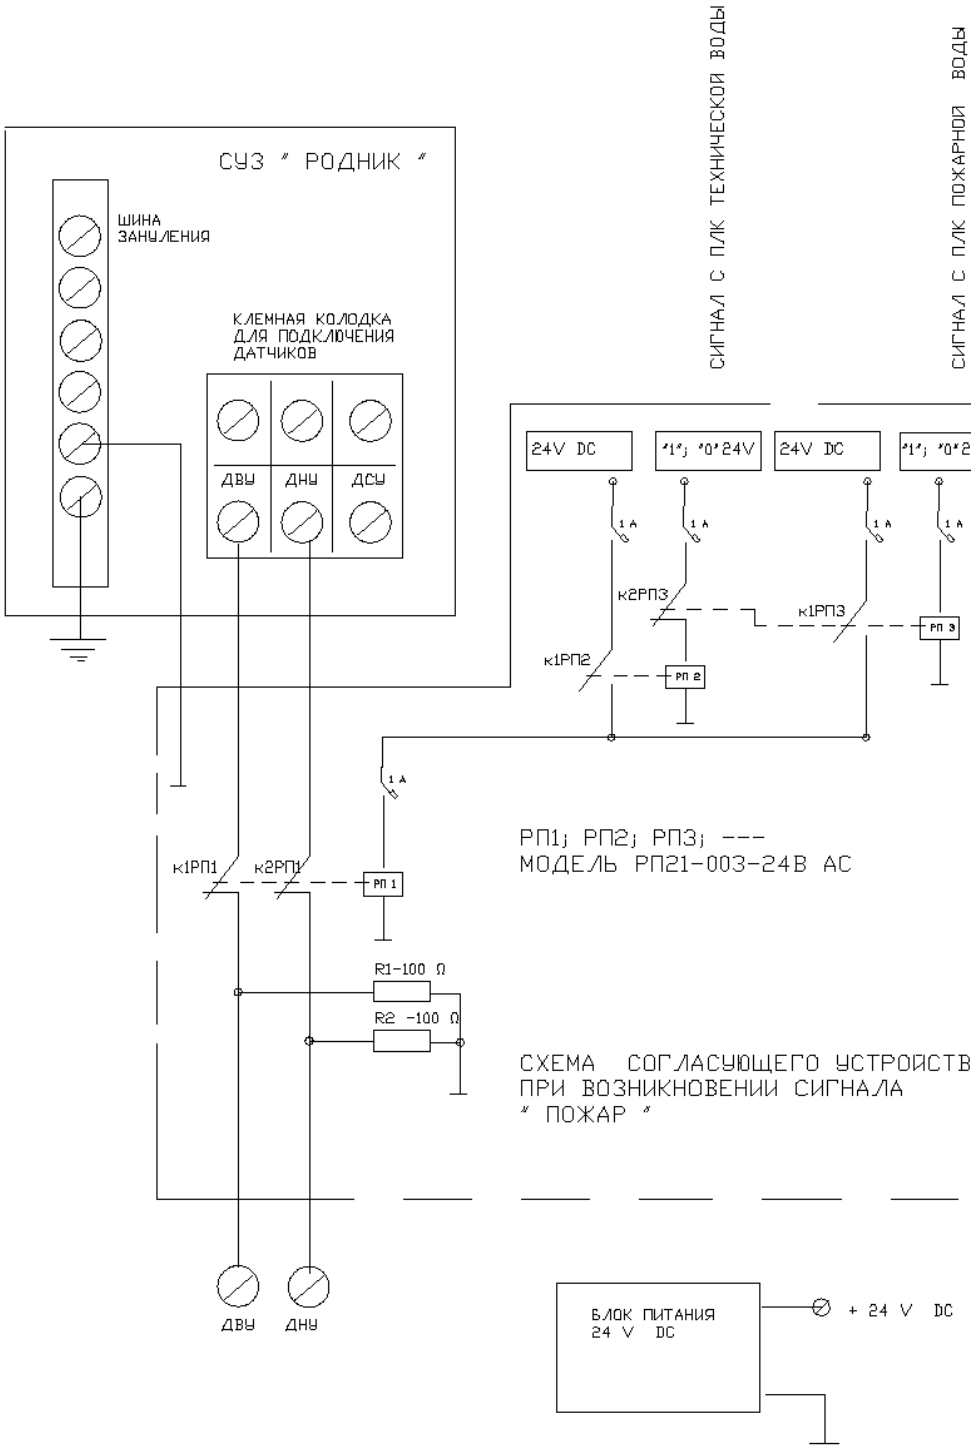

Bağlantılar bu şemaya göre yapılır; sayfa 5'teki teknik kararlar kapatılmadan üretime başlanmaz.
