
1. TEKNİK ÖZET

Pano adı / adedi	ВРЩ / 1 комплект
Korpus	IEK ЩУРв-3-30зо - 550 x 500 x 165 mm
Montaj / koruma	Gömme tip, tek kapak, sayaç pencereli, IP31
Elektriksel değer	3F + N + PE, 400/230 V, 50 Hz, ana akım 25 A
Proje yükü	Py = 8,7 kW | Pp = 6,0 kW | Ip = 9,8 A | cosφ = 0,93
Şalt markası	ABB System pro M compact - 6 kA
Sayaç	Меркурий 230, direkt bağlantı, RS-485 - kesin alt tip onaya tabi
Kablo çıkışları	12 grup; proje çıkış kablosu NHXH 3x2,5 mm² / P20

2. ANA CİHAZ LİSTESİ

No	Grup	Marka / Model / Kod	Adet
1	**Korpus**	IEK ЩУРв-3-30зо / 250200023_	1
2	**Ana MCB**	ABB S203-C25 / 2CDS253001R0254	1
3	**Grup MCB**	ABB S201-C10 / 2CDS251001R0104	9
4	**RCBO**	ABB DS201 C16 A30 / 2CSR255180R1164	3
5	**Enerji sayacı**	Меркурий 230, 3F, RS-485	1
6	**N / PE baraları**	İzole N barası + PE barası	1 set
7	**Montaj**	İç kablolama, etiketleme ve rutin test	1 set


3. BASİTLEŞTİRİLMİŞ TEK HAT

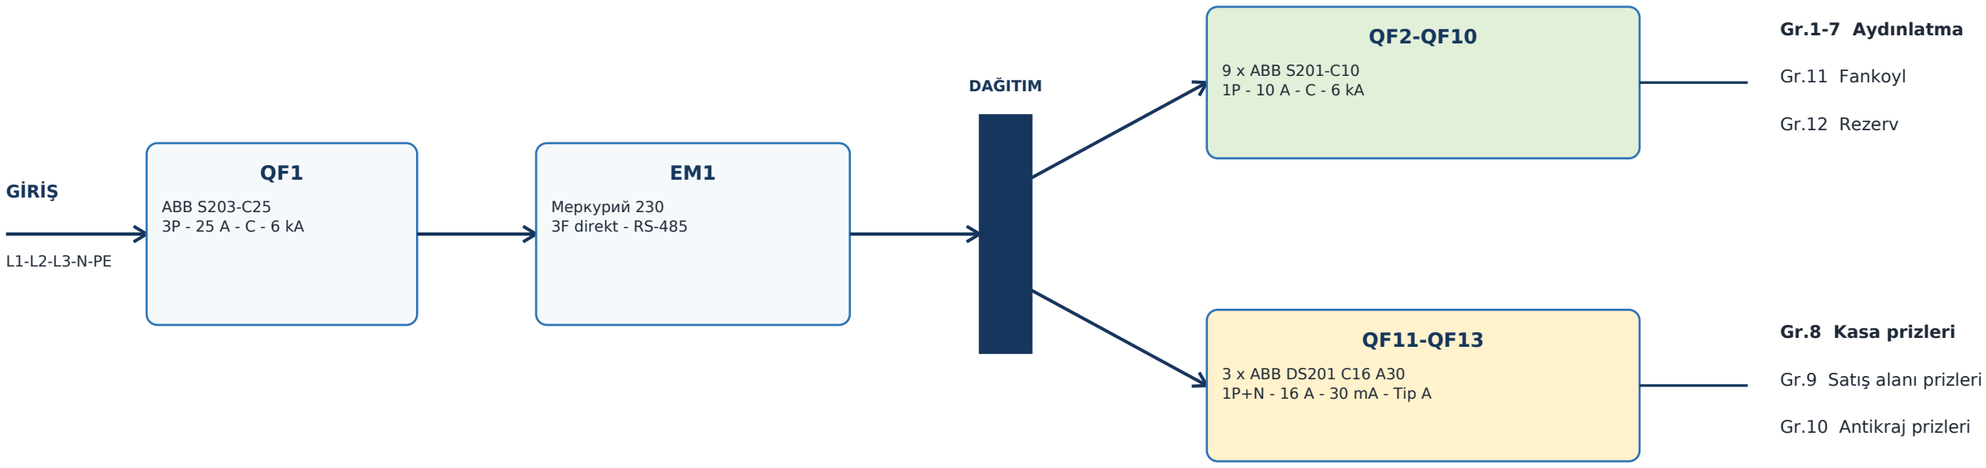

4. ONAY ÖNCESİ ZORUNLU KONTROLLER

- ☐ Korpus modeli ve 550 x 500 x 165 mm dış ölçü onayı
- ☐ Меркурий 230 kesin alt tipi ve RS-485 protokolü onayı
- ☐ Saha kısa devre akımı 6 kA cihaz kapasitesini aşmıyor
- ☐ Kablo giriş yönü ve gömme montaj boşluğu saha ile teyit edildi


1. İÇ GÖRÜNÜŞ - ÖLÇÜLER mm

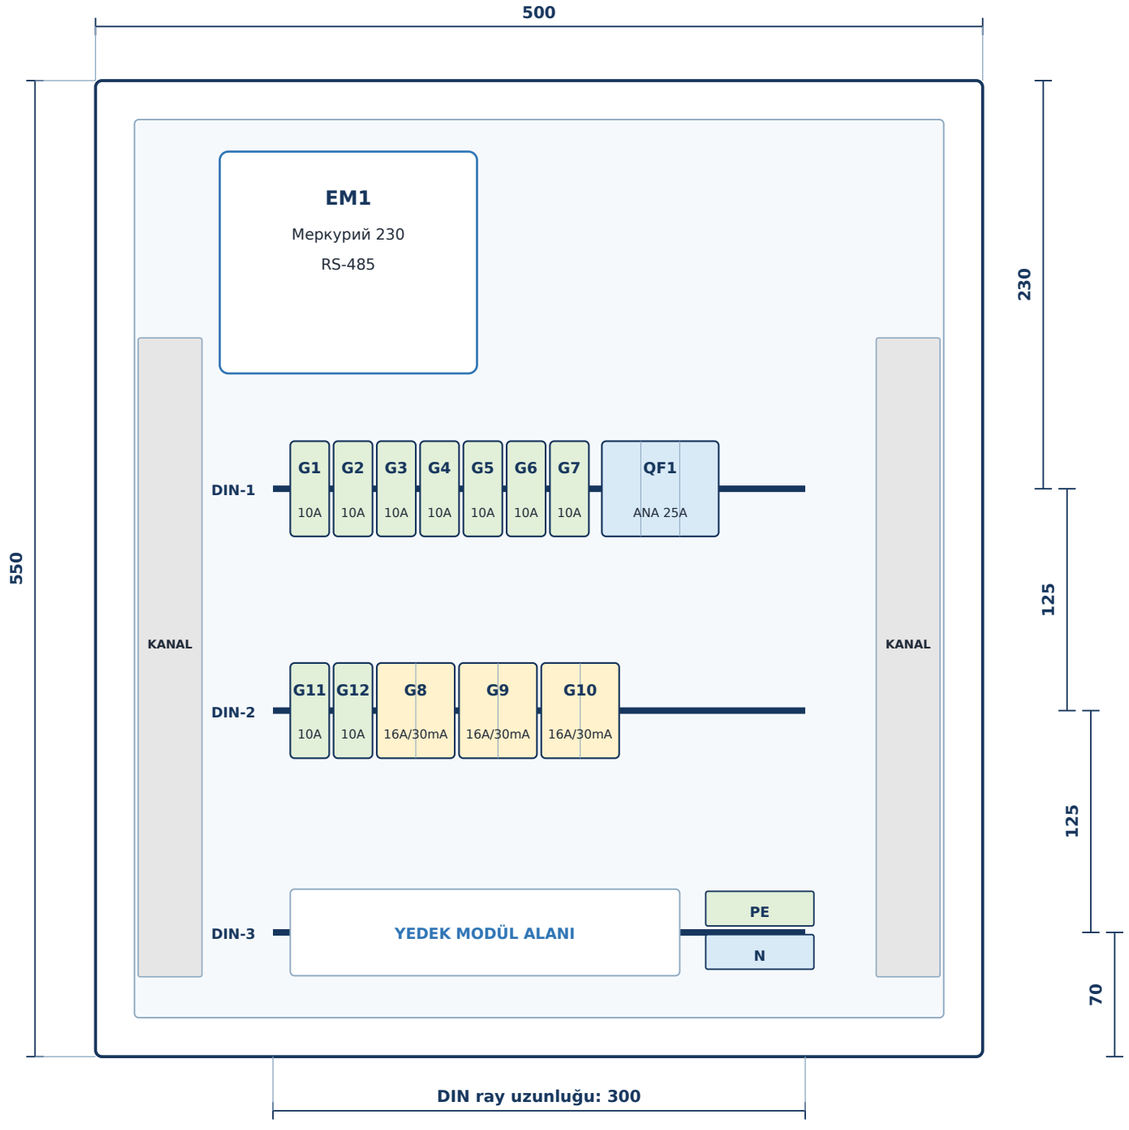

2. YERLEŞİM TABLOSU

Bölüm	Konum	Cihazlar	Kapasite
Üst alan	**Sayaç bölgesi**	EM1	Ayrı sayaç bölgesi
DIN-1	**Üstten 230 mm**	Gr.1-7 + QF1	10 modül
DIN-2	**Üstten 355 mm**	Gr.11-12 + Gr.8-10	8 modül
DIN-3	**Üstten 480 mm**	Yedek + N/PE	10 modül alan

3. YAN GÖRÜNÜŞ

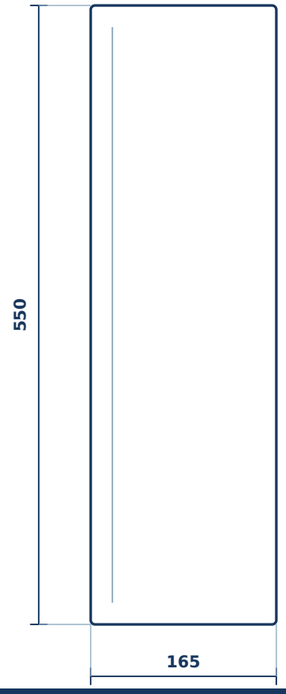


4. MODÜL VE YEDEK

Ana MCB	**3M**
9 x MCB	**9M**
3 x RCBO	**6M**
Toplam kullanılan	**18M**
Nominal alan	**30M**
Yedek	**12M / %40**

5. YERLEŞİM NOTLARI

- DIN ray merkezleri arası 125 mm bırakılmıştır.
- Sayaç ve ana şalter üst bölgede; sayaç penceresiyle hizalıdır.
- N ve PE baraları birbirinden izole ve erişilebilir konumda olacaktır.
- Cihazlar kablo kanalına en az 25 mm çalışma payı ile yerleştirilecektir.
- Nihai delik ve ray konumları satın alınan IEK korpus iç geometrisine göre uygulanacaktır.

1. KAPAK DIŞ GÖRÜNÜŞÜ

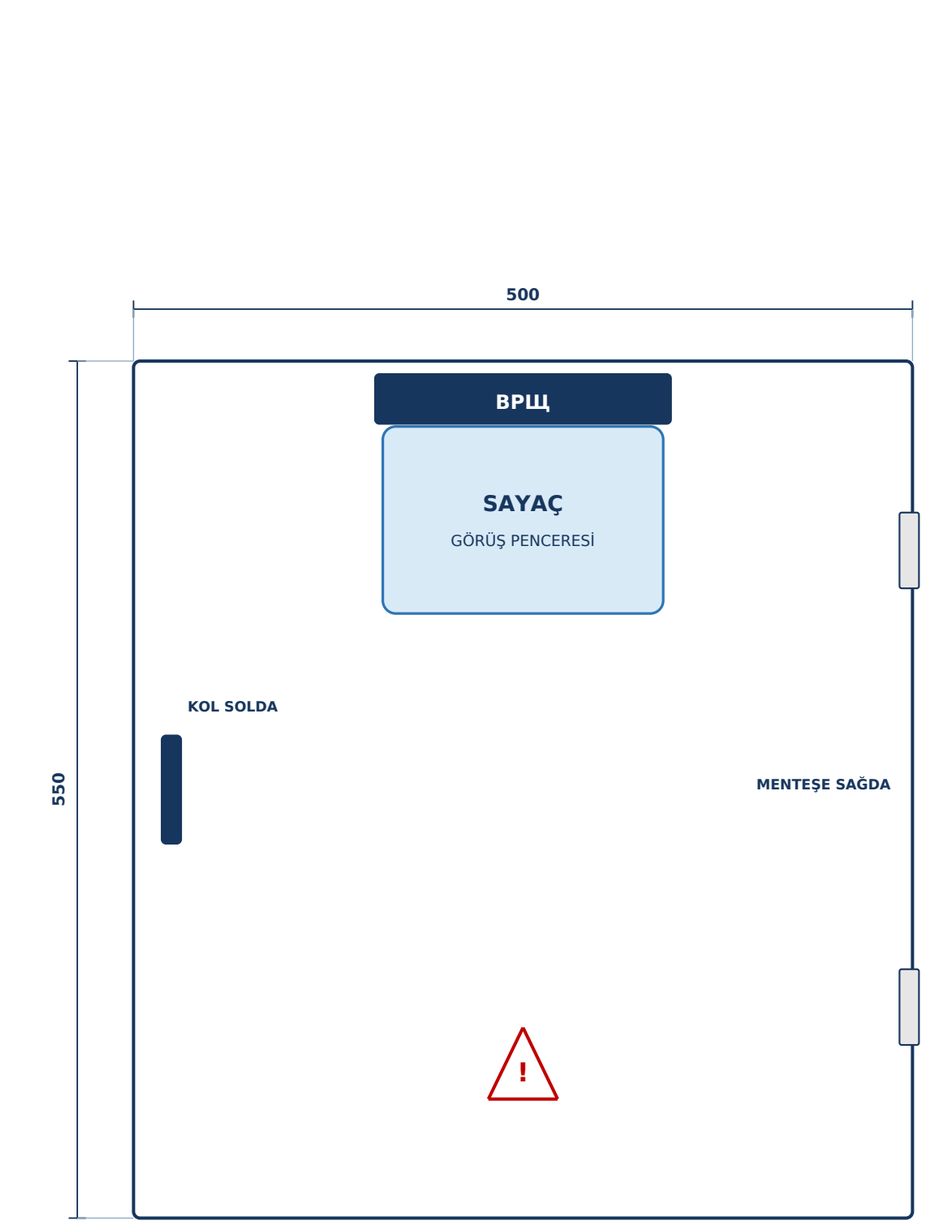

2. KABLAJ VE DEVRE DAĞILIMI

Hat	İşlev	Koruma	Kablaj
Giriş	**L1-L2-L3-N-PE**	QF1 / N / PE	İç bağlantı Cu 6 mm²
Gr.1-7	**Aydınlatma**	9 devrenin 7'si	1P 10 A, 3x2,5 mm²
Gr.8-10	**Prizler**	3 devre	RCBO 16 A / 30 mA
Gr.11	**Fankoyl**	1 devre	1P 10 A, 3x2,5 mm²
Gr.12	**Rezerv**	1 devre	1P 10 A
RS-485	**A / B / SG**	EM1 haberleşme	Ayrı numaralı klemens

3. FAZ DENGESİ ÖNERİSİ

Faz	Devreler
L1	**Gr.1, Gr.4, Gr.7, Gr.8**
L2	**Gr.2, Gr.5, Gr.9, Gr.11**
L3	**Gr.3, Gr.6, Gr.10, Gr.12**

4. ÜRETİM VE TEST NOTLARI

1. Cihaz etiketleri: QF1, QF2-QF13, EM1 ve grup numaraları.
2. Ana devre faz renkleri ve N/PE ayrımı korunacaktır.
3. Tüm sıkma torkları cihaz üretici değerine göre uygulanacaktır.
4. Süreklilik, izolasyon, polarite, RCD fonksiyon ve mekanik test yapılacaktır.
5. Kapak ile gövde arasında esnek PE köprüsü uygulanacaktır.
6. Kablo giriş yönü onaydan sonra açılacaktır.

5. MÜŞTERİ ONAYI

☐ **ONAYLANDI** ☐ **NOTLU ONAY** ☐ **REVİZYON GEREKLİ**

Firma / Yetkili	Tarih	İmza / Kaşe

Onay notu

6. REVİZYON

Rev	Tarih	Açıklama	Hazırlayan
R1	**25.08.2026**	İlk üretim onay yayını	TEKLED
