
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование / количество	ВРЩ / 1 комплект
Корпус	IEK ЩУРв-3-30зо - 550 x 500 x 165 мм
Монтаж / степень защиты	Встраиваемый, одна дверь, окно счетчика, IP31
Электрические параметры	3Ф + N + PE, 400/230 V, 50 Гц, вводной ток 25 А
Расчетные данные	Ру = 8,7 kW | Рр = 6,0 kW | Ip = 9,8 A | cosφ = 0,93
Марка аппаратов	ABB System pro M compact - 6 kA
Счетчик	Меркурий 230, прямое подключение, RS-485 - точная модификация подлежит согласованию
Отходящие линии	12 групп; проектный кабель NHXH 3x2,5 мм² / P20

2. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Группа	Марка / Модель / Код	Кол.
1	**Корпус**	IEK ЩУРв-3-30зо / 250200023_	1
2	**Вводной автомат**	ABB S203-C25 / 2CDS253001R0254	1
3	**Групповые автоматы**	ABB S201-C10 / 2CDS251001R0104	9
4	**RCBO**	ABB DS201 C16 A30 / 2CSR255180R1164	3
5	**Счетчик электроэнергии**	Меркурий 230, 3Ф, RS-485	1
6	**Шины N / PE**	Изолированная шина N + шина PE	1 компл.
7	**Монтаж**	Внутренний монтаж, маркировка и приемосдаточные испытания	1 компл.


3. УПРОЩЕННАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

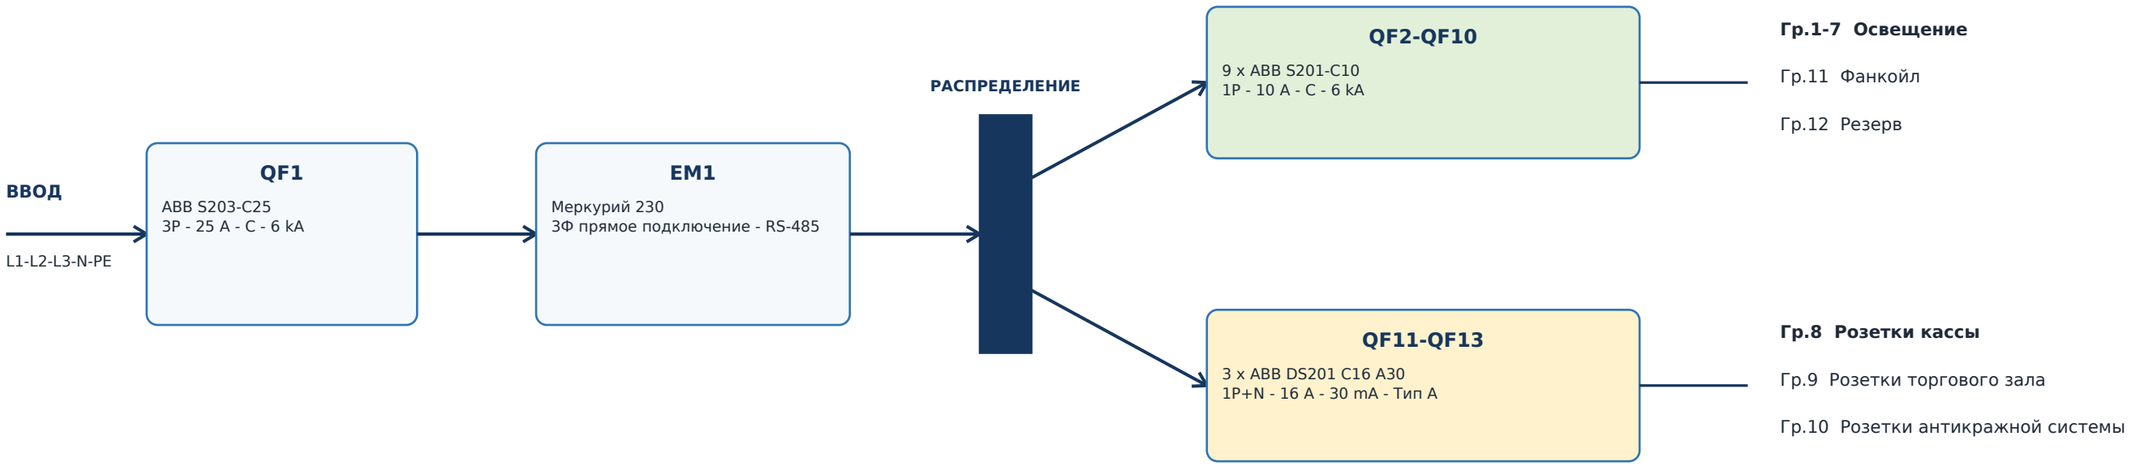

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ДО СОГЛАСОВАНИЯ

- ☐ Согласование модели корпуса и габаритов 550 x 500 x 165 мм
- ☐ Согласование точной модификации Меркурий 230 и протокола RS-485
- ☐ Ток КЗ на объекте не превышает отключающую способность 6 кА
- ☐ Направление ввода кабелей и проем для встраивания подтверждены на объекте

1. ВИД ИЗНУТРИ - РАЗМЕРЫ, мм

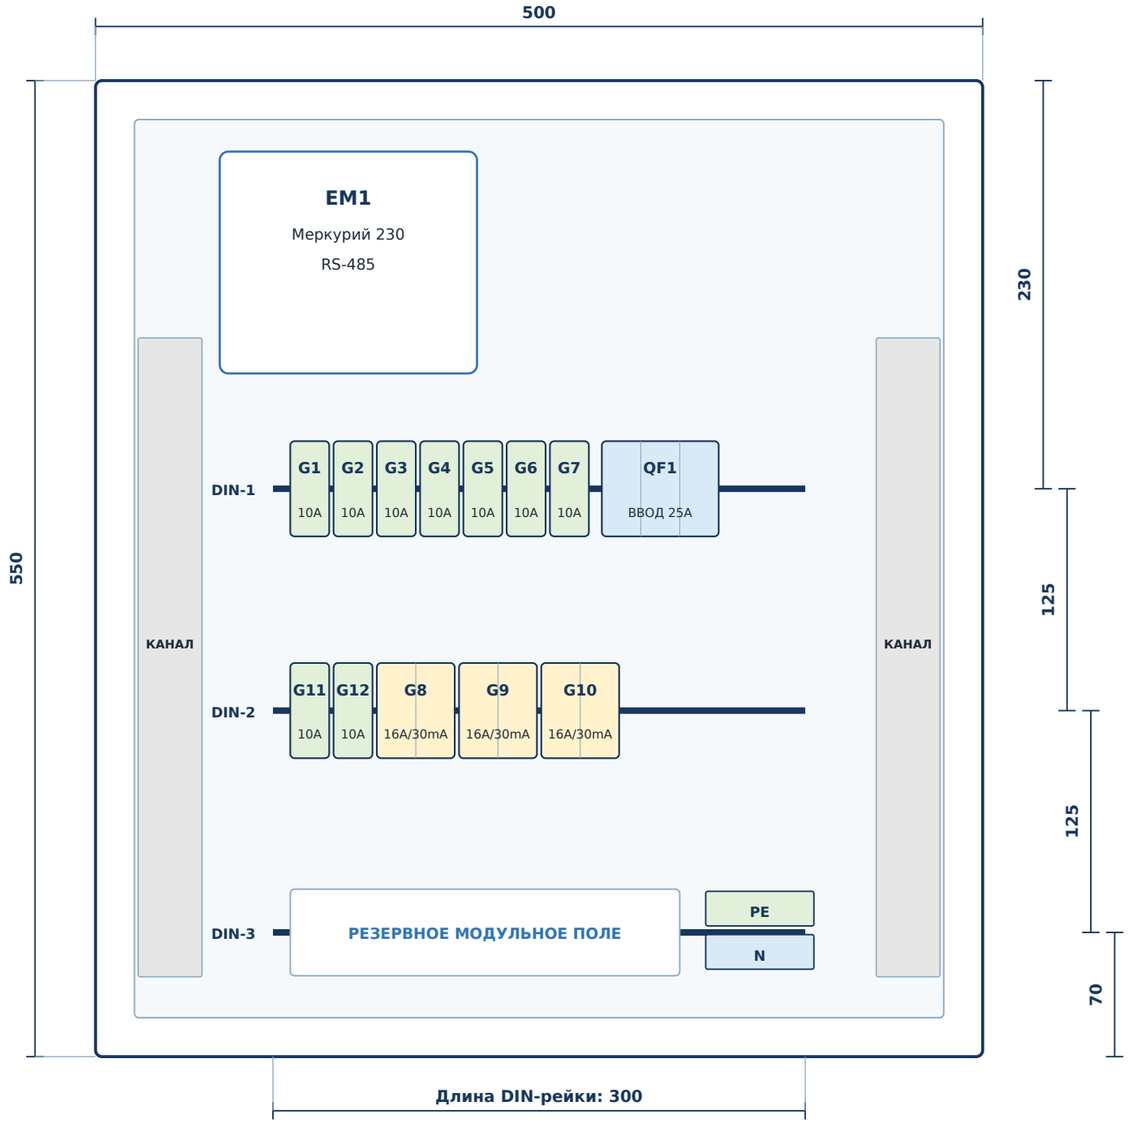

2. ТАБЛИЦА КОМПОНОВКИ

Раздел	Положение	Аппараты	Вместимость
Верхняя зона	**Зона счетчика**	EM1	Отдельная зона счетчи
DIN-1	**От верха 230 мм**	Gr.1-7 + QF1	10 модулей
DIN-2	**От верха 355 мм**	Gr.11-12 + Gr.8-10	8 модулей
DIN-3	**От верха 480 мм**	Резерв + N/PE	10 модулей

3. ВИД СБОКУ


4. МОДУЛИ И РЕЗЕРВ

Вводной автомат	**3M**
9 x MCB	**9M**
3 x RCBO	**6M**
Занято всего	**18M**
Номинальная емкость	**30M**
Резерв	**12M / %40**

5. ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОМПОНОВКЕ

- Расстояние между центрами DIN-реек - 125 мм.
- Счетчик расположен в верхней зоне и совмещен со смотровым окном.
- Шины N и PE должны быть разделены и доступны для обслуживания.
- Между аппаратами и кабельным каналом оставить не менее 25 мм.
- Окончательные отверстия и положение реек выполнить по фактической геометрии корпуса IEK.

1. ВНЕШНИЙ ВИД ДВЕРИ

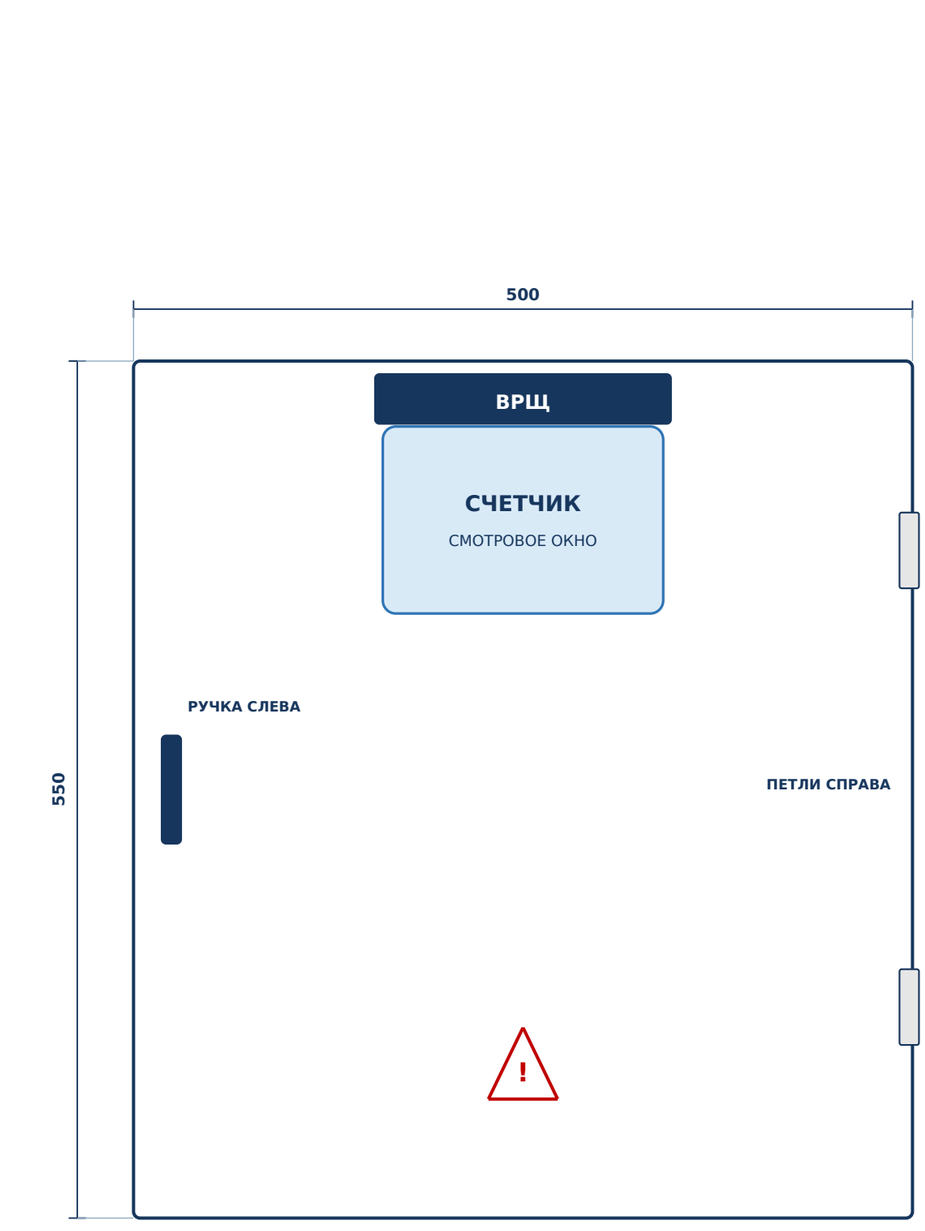

2. МОНТАЖ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ

Линия	Назначение	Защита	Монтаж
Ввод	**L1-L2-L3-N-PE**	QF1 / N / PE	Внутреннее соединение Cu 6 мм²
Gr.1-7	**Освещение**	7 из 9 цепей	1P 10 A, 3x2,5 мм²
Gr.8-10	**Розетки**	3 цепи	RCBO 16 A / 30 mA
Gr.11	**Фанкойл**	1 цепь	1P 10 A, 3x2,5 мм²
Gr.12	**Резерв**	1 цепь	1P 10 A
RS-485	**A / B / SG**	Интерфейс EM1	Отдельные маркированные клеммы

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФАЗАМ

Фаза	Цепи
L1	**Gr.1, Gr.4, Gr.7, Gr.8**
L2	**Gr.2, Gr.5, Gr.9, Gr.11**
L3	**Gr.3, Gr.6, Gr.10, Gr.12**

4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЯ

1. Маркировка аппаратов: QF1, QF2-QF13, EM1 и номера групп.
2. Соблюдать фазовую маркировку и разделение N/PE.
3. Моменты затяжки - согласно данным производителей аппаратов.
4. Выполнить проверку непрерывности, изоляции, полярности, функции RCD и механики.
5. Между дверью и корпусом установить гибкую перемычку PE.
6. Отверстия кабельного ввода выполнить после согласования направления.

5. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ **СОГЛАСОВАНО** ☐ **СОГЛАСОВАНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ** ☐ **ТРЕБУЕТСЯ ДОРАБОТКА**

Организация / Представитель	Дата	Подпись / Печать

Примечание к согласованию

6. РЕВИЗИЯ

Рев.	Дата	Описание	Подготовил
R1	**25.08.2026**	Первый выпуск на согласование производства	TEKLED
