ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

Комплект щитов

Комплект распределительных щитов ГРЩ (ВРУ), ЩР-0.1, ЩЧП-0.1


Параметр	Данные
Заказчик / контакт	TS ENERGY / Евгений, Аида
Проект / дата	261002 / 02.10.2026
Источник	BOM 261001 Yevgeni VRU CHINT; лист BOM, строки 2-110
Состав	3 щита, по 1 комплекту каждого
Габариты В × Ш × Г	ГРЩ: 1500 × 700 × 300 мм ЩР-0.1 и ЩЧП-0.1: 800 × 650 × 250 мм
Аппаратура / корпус	CHINT; отдельные позиции по BOM / TEKSAN F
Содержание	Габаритные виды, комплектация без расходных материалов, лист согласования

Статус: на согласование. Габаритные виды выполнены по BOM. Внутренняя монтажная компоновка, электрическая схема и отверстия под кабельные вводы требуют отдельного рабочего чертежа.


ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ

ГРЩ

Вид спереди

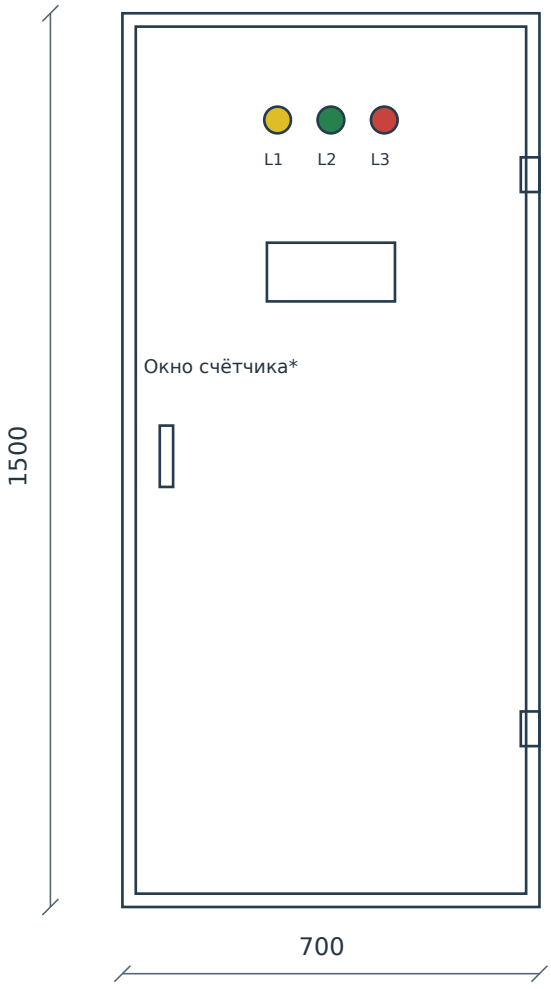

Вид сбоку



Вид снизу



Кабельный ввод сверху; размеры и число отверстий по кабелям.


Размеры: В × Ш × Г, мм. Навесной корпус; 1 корпус / 1 дверь. Петли справа, ручка слева. Открывание слева направо. Геометрия двери предложена для согласования.

* Размер окна - по экрану выбранного счётчика. IP: в строке корпуса IP31, в примечании IP54; требуется уточнение.


ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ

ЩР-0.1

Вид спереди

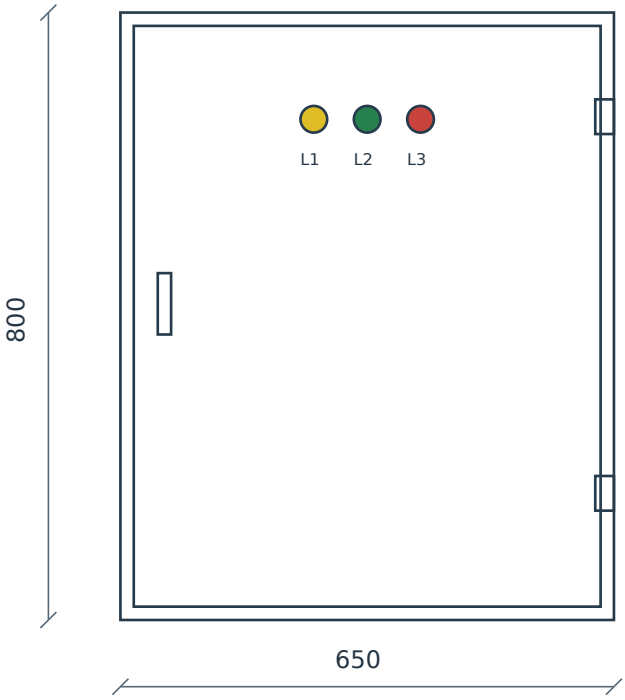

Вид сбоку



Вид снизу




Размеры: В × Ш × Г, мм. Навесной корпус; 1 корпус / 1 дверь. Петли справа, ручка слева. Открывание слева направо. Геометрия двери предложена для согласования.


ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ

ЩЧП-0.1

Вид спереди

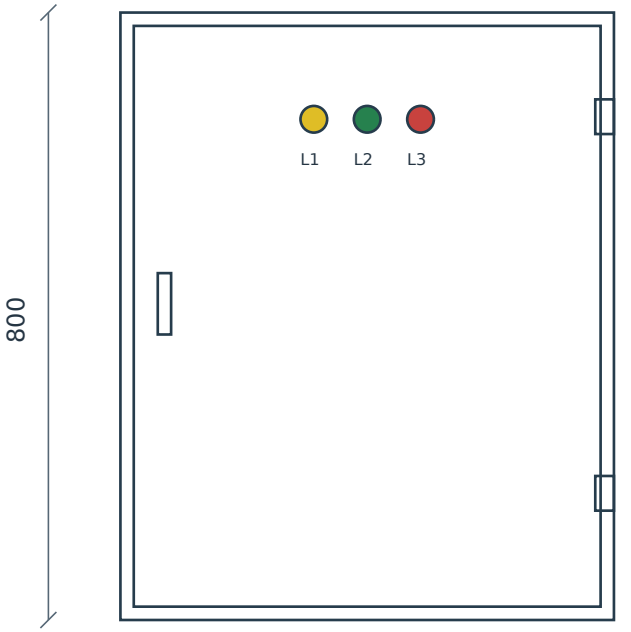

Вид сбоку



Вид снизу



Размеры: В × Ш × Г, мм. Навесной корпус; 1 корпус / 1 дверь. Петли справа, ручка слева. Открывание слева направо. Геометрия двери предложена для согласования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

ГРЩ

№	Артикул	Наименование	Кол.
1	714-15	Корпус ЩРн-pr, 1500×700×300 мм; ввод сверху; IP уточнить	1 шт
2	264748	Авт. выкл. NXMS-160SF/3P 160A 36кА с электронным расцепителем	1 шт
3	IA	ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3х220/380V 5-7,5А)	1 шт
4	270300100_	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3 шт
5	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	3 шт
6	814174	Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C	3 шт
7	814171	Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C	1 шт
8	814176	Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C	1 шт
9	814173	Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C	1 шт
10	816141	Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C	1 шт
11	814174	Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C	1 шт
12	814176	Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C	2 шт
13	200100060	Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman	1 шт
14	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В	1 шт
15	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В	1 шт
16	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В	1 шт

Бара, кабель, наконечники, изоляторы и другие расходные материалы в перечень согласования не включены. Количество устройств сохранено по исходному BOM.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

ЩР-0.1

№	Артикул	Наименование	Кол.
1	714-15118	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	1 шт
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	1 шт
3	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C	1 шт
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	3 шт
5	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	7 шт
6	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	3 шт
7	814172	Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	1 шт
8	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	5 шт
9	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	2 шт
10	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA	8 шт
11	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA	1 шт
12	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В	1 шт
13	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В	1 шт
14	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В	1 шт
15	130300223	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50)	2 шт

Бара, кабель, наконечники, изоляторы и другие расходные материалы в перечень согласования не включены. Количество устройств сохранено по исходному BOM.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

ЩЧП-0.1

№	Артикул	Наименование	Кол.
1	714-15118	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	1 шт
2	619-03104	Переключатель ввода MCBCO 63A 4P Tekled Electric	1 шт
3	816139	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C	1 шт
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	3 шт
5	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C	2 шт
6	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	4 шт
7	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C	1 шт
8	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	2 шт
9	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	3 шт
10	515401	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип AC, 6kA	1 шт
11	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA	3 шт
12	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B	1 шт
13	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B	1 шт
14	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B	1 шт

Бара, кабель, наконечники, изоляторы и другие расходные материалы в перечень согласования не включены. Количество устройств сохранено по исходному BOM.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

Комплект щитов

Проверка	Условие / уточнение
ГРЩ: степень защиты	В строке 3: IP31; в примечании: IP54. Утвердить до заказа корпуса.
ГРЩ: трансформаторы тока	Строка 6: в наименовании IEK, в колонке производителя CHINT. Утвердить марку; 150/5 А, 5 ВА, класс 0,5; 3 шт.
ГРЩ: счётчик / окно	Уточнить паспортный размер счётчика и экрана до вырезки окна.
ЩЧП: переключатель	MCBCO 63 A 4P; ввод 80 А. Проверить ток через переключатель и защиту по рабочей схеме.
Рабочие чертежи	Присоединения, внутреннее размещение, вырезы и кабельные вводы согласовать отдельно. Цвет и толщина стали в BOM не заданы.

Решение: ☐ Согласовано ☐ Согласовано с замечаниями ☐ На доработку
Замечания: _____
_____

Ответственный	Ф.И.О.	Подпись / дата
Разработал		
Проверил		
Производство / изготовление		
Монтаж		
ОТК / качество		
Заказчик / согласование		
Заказ / срок поставки		
