ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

ГРЩ (ВРУ), ЩР-0.1, ЩЧП-0.1

Параметр	Данные
Заказчик / контакт	TS ENERGY / Евгений, Аида
Проект / ревизия	261002 / R1 / 12.10.2026
Состав	3 щита, по 1 комплекту каждого
ГРЩ (ВРУ): корпус	1600 × 600 × 400 мм + база 100 мм; общая высота 1700 мм. Артикул 719-15437.
ГРЩ: MCCB	CHINT NXMS-160SF/3P 160 A, 36 кА; артикул 264748; 2 шт.
ЩР-0.1 / ЩЧП-0.1	800 × 650 × 250 мм; без изменений
Источник BOM	261012_Yevgeni_VRU_CHINT_BOM cl - onay dosyasi icin -rev1.xlsx; BOM, строки 3-4
Изменения R1	ГРЩ: корпус 1500×700×300 заменён на 1600×600×400 + база 100 мм; MCCB 1 → 2 шт.


Статус: на согласование. Подписи и решение заказчика не получены. Габаритные виды и комплектация обновлены по BOM rev1.

Подключение и назначение второго MCCB должны быть подтверждены рабочей электрической схемой. Изображения внутренней компоновки являются предложением для согласования.

ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ

ГРЩ (ВРУ) - корпус 719-15437


Вид спереди

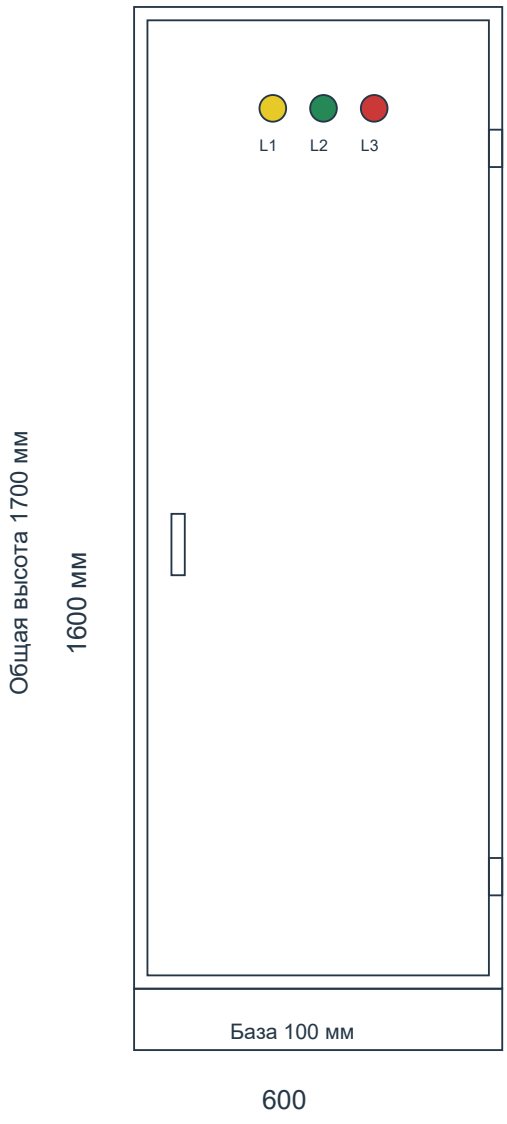

Вид в плане



Вид сбоку




Размеры: В × Ш × Г. Корпус 1600 × 600 × 400 мм; база 100 мм отдельно. Петли справа, замки слева. Геометрия двери предложена для согласования.

Кабельный ввод сверху. Отверстия, исполнение базы, IP и окно счётчика уточнить до изготовления. Визуализация показывает сплошную дверь; окно требует отдельного согласования.


ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ

ЩР-0.1

Вид спереди

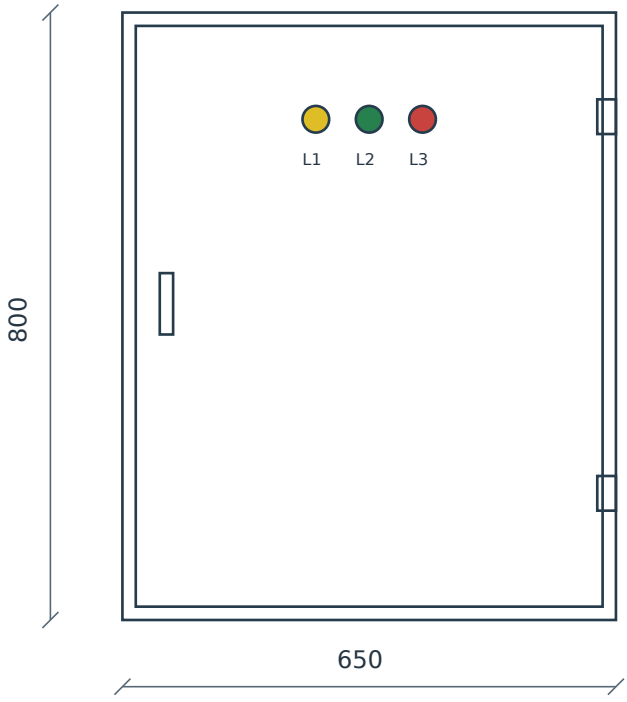

Вид сбоку



Вид снизу




Размеры: В × Ш × Г, мм. Навесной корпус; 1 корпус / 1 дверь. Петли справа, ручка слева. Открывание слева направо. Геометрия двери предложена для согласования.


ГАБАРИТНЫЕ ВИДЫ

ЩЧП-0.1

Вид спереди

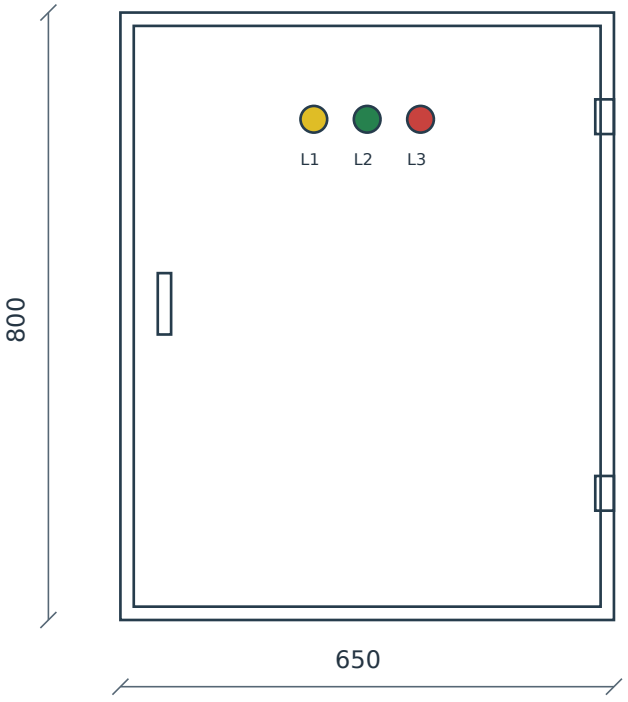

Вид сбоку



Вид снизу



Размеры: В × Ш × Г, мм. Навесной корпус; 1 корпус / 1 дверь. Петли справа, ручка слева. Открывание слева направо. Геометрия двери предложена для согласования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

ГРЩ (ВРУ)

№	Артикул	Наименование	Кол.
1	719-15437	Корпус 1600×600×400 мм + база 100 мм; общая высота 1700 мм	1 шт
2	264748	Авт. выкл. NXMS-160SF/3P 160A 36кА с электронным расцепителем (R)	2 шт
3	IA	ДАЛА СА4У-Э720 R ТХ ОР П RS1 Д W (3х220/380V 5-7,5А)	1 шт
4	270300100_	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3 шт
5	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3 шт
6	814174	Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R)	3 шт
7	814171	Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C (R)	1 шт
8	814176	Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R)	1 шт
9	814173	Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C (R)	1 шт
10	816141	Авт. выкл. NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R)	1 шт
11	814174	Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C (R)	1 шт
12	814176	Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R)	2 шт
13	200100060	Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman	1 шт
14	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R)	1 шт
15	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	1 шт
16	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	1 шт

Количество - по BOM rev1, колонка E «Кол- во». Расходные материалы в перечень согласования не включены. Второй МССВ: назначение и подключения по согласованной рабочей схеме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

ЩР-0.1

№	Артикул	Наименование	Кол.
1	714-15118	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	1 шт
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63	1 шт
3	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C	1 шт
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	3 шт
5	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	7 шт
6	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	3 шт
7	814172	Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	1 шт
8	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	5 шт
9	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	2 шт
10	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA	8 шт
11	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA	1 шт
12	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В	1 шт
13	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В	1 шт
14	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В	1 шт
15	130300223	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50)	2 шт

Бара, кабель, наконечники, изоляторы и другие расходные материалы в перечень согласования не включены. Количество устройств сохранено по исходному BOM.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО BOM

ЩЧП-0.1

№	Артикул	Наименование	Кол.
1	714-15118	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	1 шт
2	619-03104	Переключатель ввода MCBCO 63A 4P Tekled Electric	1 шт
3	816139	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C	1 шт
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	3 шт
5	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C	2 шт
6	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	4 шт
7	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C	1 шт
8	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	2 шт
9	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	3 шт
10	515401	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип AC, 6kA	1 шт
11	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA	3 шт
12	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В	1 шт
13	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В	1 шт
14	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В	1 шт

Бара, кабель, наконечники, изоляторы и другие расходные материалы в перечень согласования не включены. Количество устройств сохранено по исходному BOM.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

Проверка	Условие / уточнение
ГРЩ: второй МССВ	2 × NXMS-160SF/3P 160 А. Подтвердить назначение, позиционное обозначение и схему подключения второго аппарата.
ГРЩ: корпус / база	1600×600×400 + база 100 мм. Подтвердить монтаж, крепление и исполнение базы. IP54 указан в примечании BOM; степень защиты новой позиции не указана.
ГРЩ: трансформаторы тока	В наименовании IEK, в колонке производителя CHINT. Утвердить марку; 150/5 А, 5 ВА, класс 0,5; 3 шт.
ГРЩ: счётчик / дверь	Подтвердить размер счётчика и необходимость окна до вырезки.
ЩЧП: переключатель	МСВСО 63 А 4Р; ввод 80 А. Проверить ток и защиту по рабочей схеме.
Рабочие чертежи	Внутренняя компоновка предложенная. Присоединения, вырезы и кабельные вводы согласовать отдельно. Цвет и толщина стали не заданы.

Решение: □ Согласовано □ Согласовано с замечаниями □ На доработку

Замечания: _____
_____

Ответственный	Ф.И.О.	Подпись / дата
Разработал		
Проверил		
Производство / изготовление		
Монтаж		
ОТК / качество		
Заказчик / согласование		
Заказ / срок поставки		
