YSF ELECTRIC

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАЙЛ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: Казино / Maksad Bey

Основание: BOM CHINT + проект DXF «Распределительные щиты»

Дата: 21.09.2026

Количество щитов: 23

Комплект внешних 2D чертежей YSF: вид спереди / сбоку / снизу

Ведомость щитов и контроль соответствия проекту

Все позиции ниже найдены в BOM; отметка DXF означает наличие соответствующего обозначения в проектном файле.

01	**ЩО.п**	540x310x120 IP54	**DXF: OK**
02	**ЩАО.п**	540x310x120 IP54	**DXF: OK**
03	**ЩО.1**	540x310x120 IP54	**DXF: OK**
04	**ЩАО.1**	440x265x120 IP54	**DXF: OK**
05	**ЩО.2**	540x310x120 IP54	**DXF: OK**
06	**ЩАО.2**	440x265x120 IP54	**DXF: OK**
07	**1ЩР-1**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**
08	**ЩР.п**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**
09	**1ЩР-2 ИБП**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**
10	**1ЩР-3**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**
11	**2ЩР-1**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**
12	**2ЩР-2 (ИБП)**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**
13	**ЩС-Тх.п2**	1700x700x450 IP31	**DXF: OK**
14	**1ЩР-Б**	660x310x120 IP31	**DXF: OK**
15	**2ЩР-Б**	660x310x120 IP31	**DXF: OK**
16	**2ЩС-Тх.1**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**
17	**ЩС.VRF.к**	1300x750x300 IP54	**DXF: OK**
18	**ЩУВ-П**	500x400x220 IP31	**DXF: OK**
19	**ЩС.В3**	1200x750x300 IP54	**DXF: OK**
20	**ЩУВ1**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**
21	**ЩУВ.п**	540x310x120 IP54	**DXF: OK**
22	**ЩУВ.кр**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**
23	**ЩС.ПУ**	800x650x250 IP31	**DXF: OK**


Общие производственные требования

1. На листах щитов показываются только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу. Внутренняя компоновка исключена из согласования.
2. Размеры указаны в порядке: высота x ширина x глубина.
3. Однодверные шкафы: петли справа, открывание вправо. Для широких корпусов применять двухдверное исполнение по габариту корпуса.
4. Состав оборудования принимать по BOM; электрические обозначения и маркировку - по проекту DXF.
5. Кабельные отверстия/сальники снизу выполнять после подтверждения кабельной привязки; неподтвержденные отверстия не вырезать.


01. ЩО.п

Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

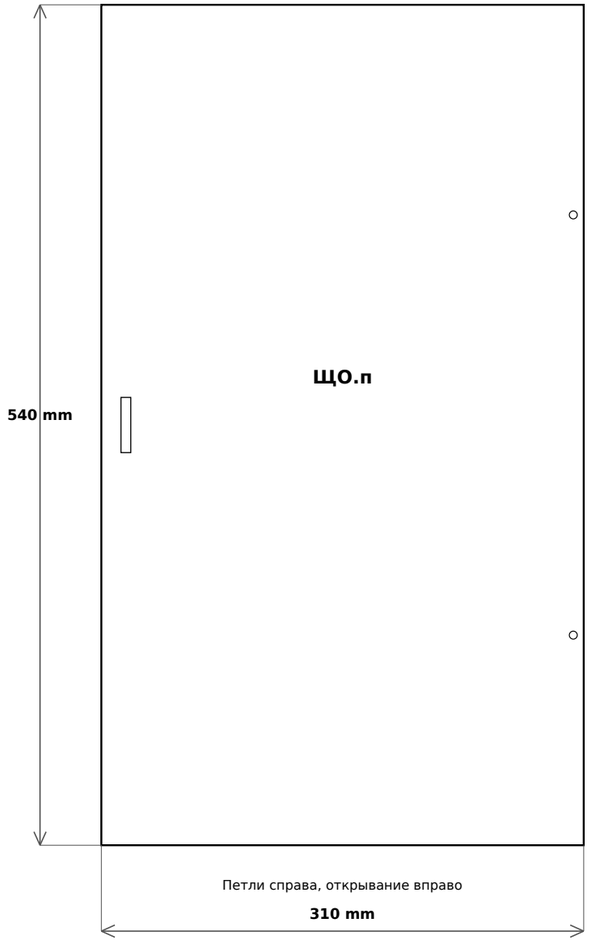

БОКОВОЙ ВИД

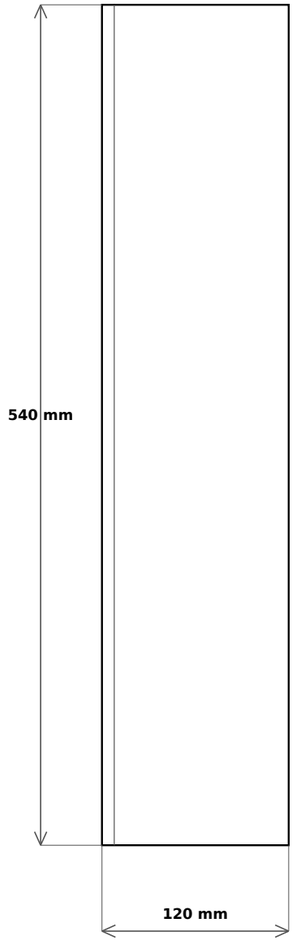

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	714-15070	Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)	1	TEKSAN	КОРПУС
2	179705	АВ NB1-63 3P 32A 6кА х-ка C	1	CHINT	ВВОД
3	814014	АВ NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C	18	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 540 x 310 x 120 мм; IP54.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩО.п**	**540 x 310 x 120 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 3/25**


02. ЩАО.п

Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

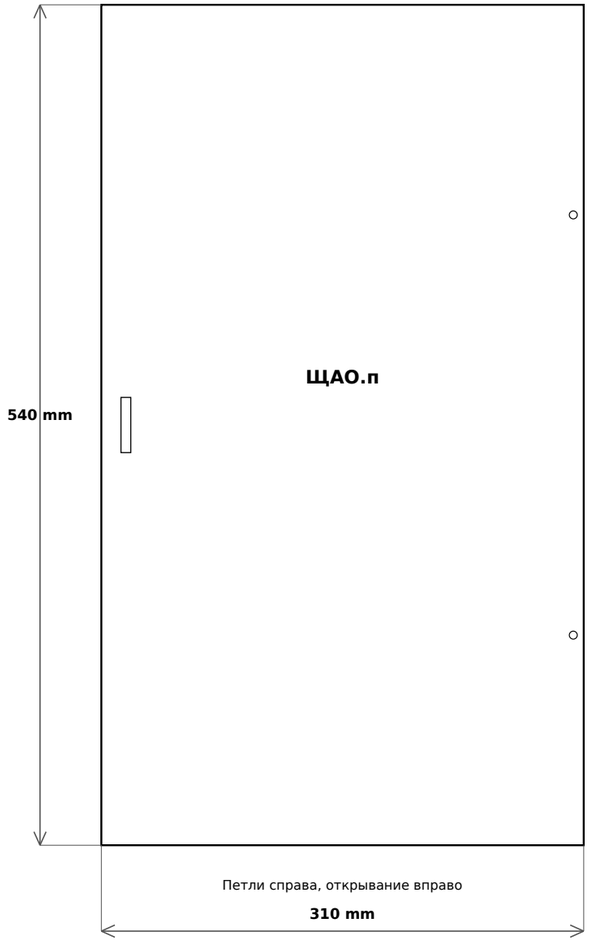

БОКОВОЙ ВИД

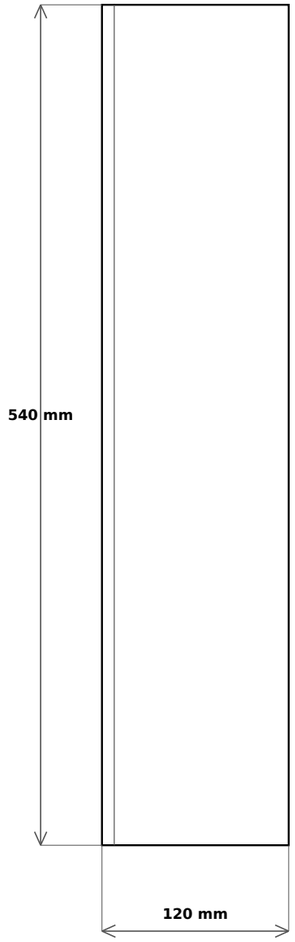

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	714-15070	Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)	1	TEKSAN	КОРПУС
2	179702	АВ NB1-63 3P 20A 6кА х-ка C	1	CHINT	ВВОД
3	814013	АВ NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C	7	CHINT	ОТХ.
4	296708	АВ NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
5	256054	Контактор NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц	7	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 540 x 310 x 120 мм; IP54.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩАО.п**	**540 x 310 x 120 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 4/25**


03. ЩО.1

Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

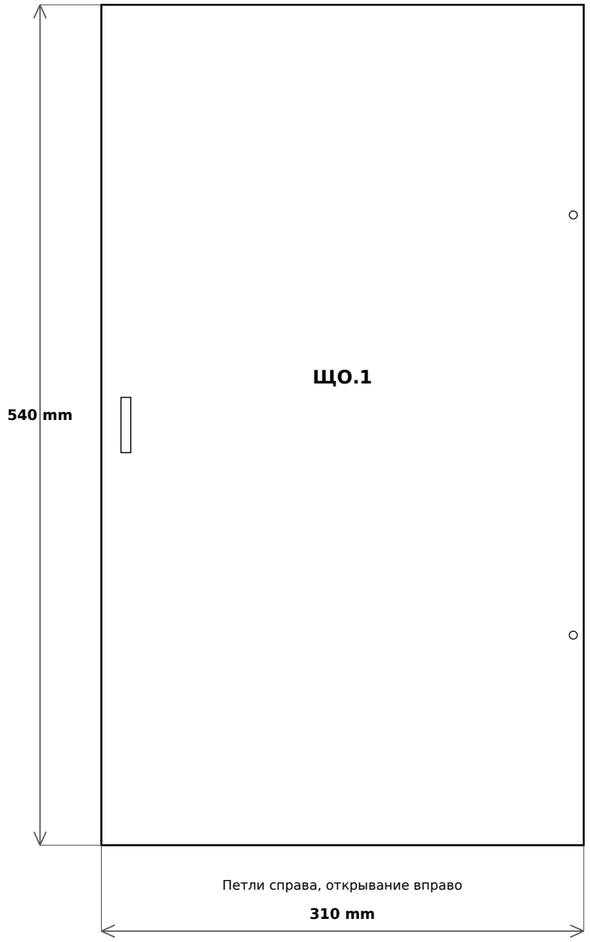

БОКОВОЙ ВИД

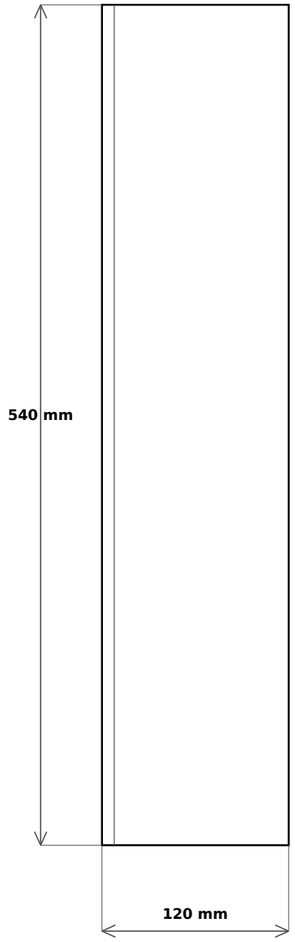

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	714-15070	Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)	1	TEKSAN	КОРПУС
2	179705	АВ NB1-63 3P 32A 6кА х-ка C	1	CHINT	ВВОД
3	814014	АВ NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C	15	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 540 x 310 x 120 мм; IP54.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩО.1**	**540 x 310 x 120 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 5/25**


04. ЩАО.1

Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

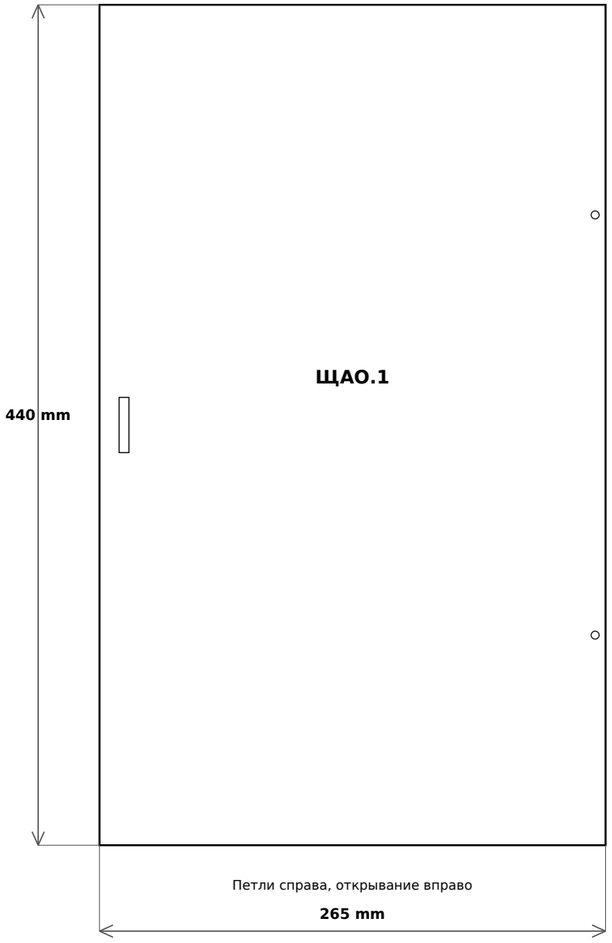

БОКОВОЙ ВИД

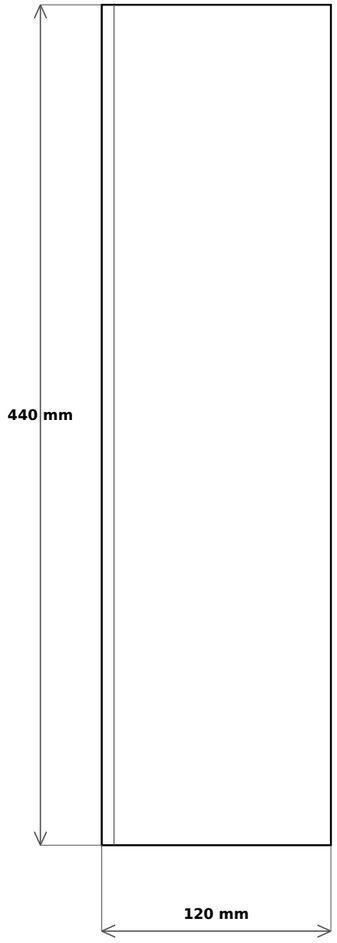

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	714-15050	Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS)	1	TEKSAN	КОРПУС
2	814170	АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C	1	CHINT	ВВОД
3	814013	АВ NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C	5	CHINT	ОТХ.
4	296708	АВ NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
5	256054	Контактор NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц	5	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 440 x 265 x 120 мм; IP54.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩАО.1**	**440 x 265 x 120 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 6/25**


05. ЩО.2

Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

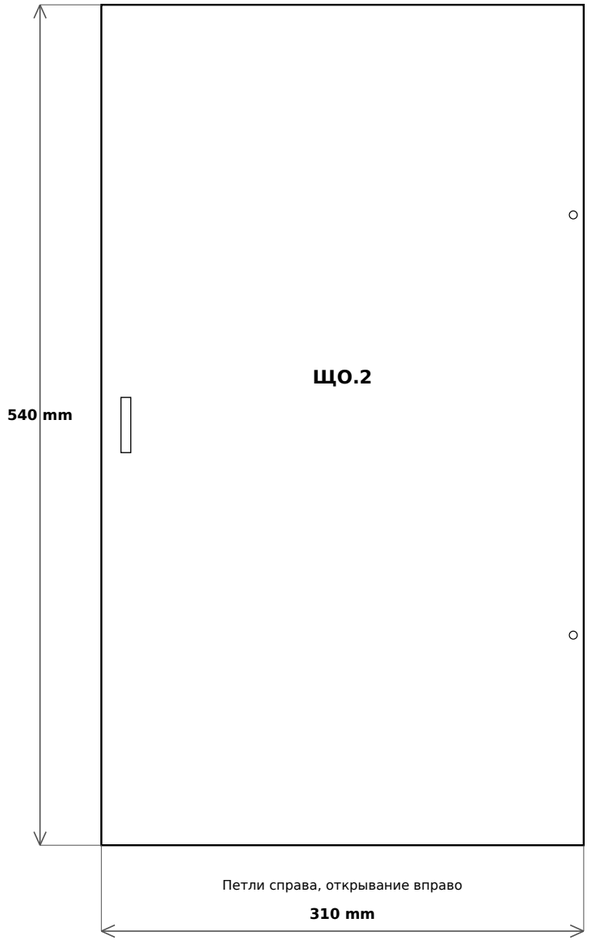

БОКОВОЙ ВИД

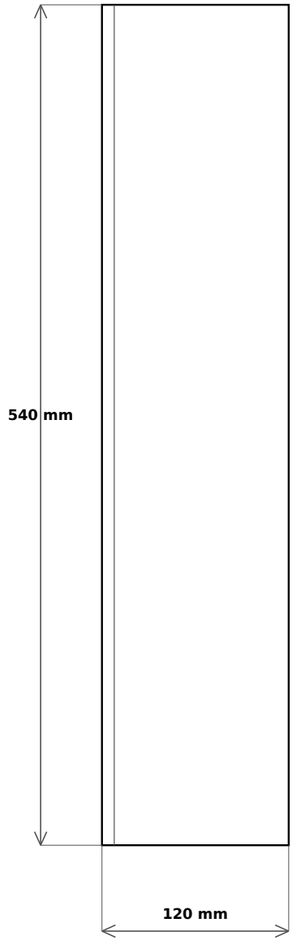

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	714-15070	Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)	1	TEKSAN	КОРПУС
2	179705	АВ NB1-63 3P 32A 6кА х-ка C	1	CHINT	ВВОД
3	814014	АВ NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C	15	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 540 x 310 x 120 мм; IP54.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩО.2**	**540 x 310 x 120 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 7/25**


06. ЩАО.2

Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

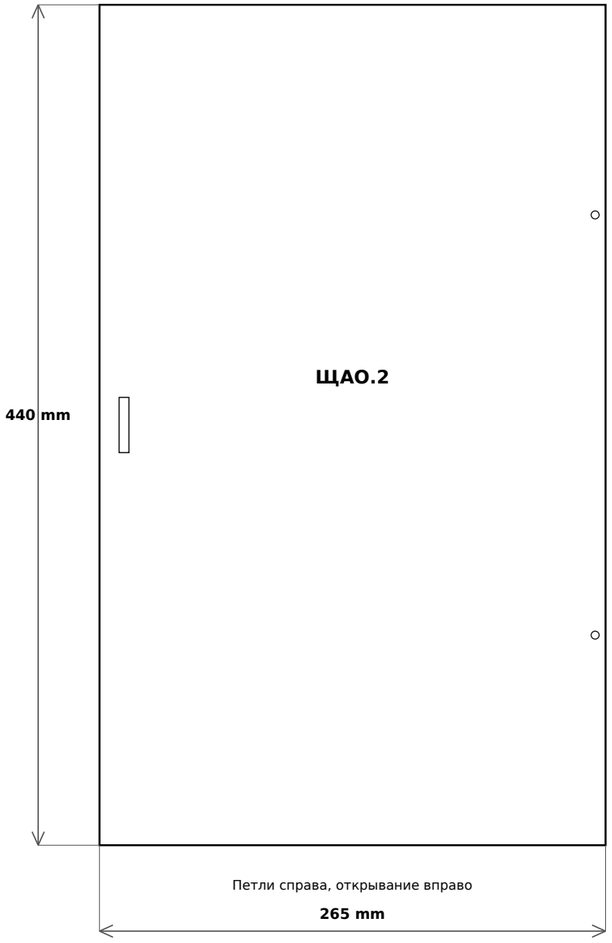

БОКОВОЙ ВИД

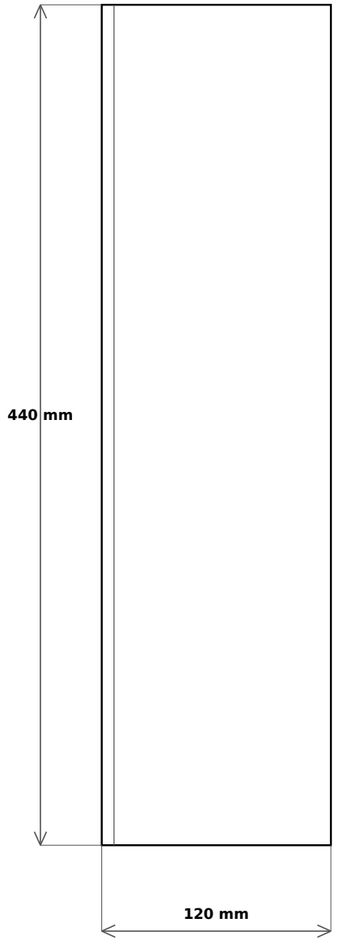

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	714-15050	Мет. Корпус ЩРН-18 (265x440x120) IP54 (TS)	1	TEKSAN	КОРПУС
2	814170	АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C	1	CHINT	ВВОД
3	814013	АВ NXB-63 1P 10A 6кА х-ка C	5	CHINT	ОТХ.
4	296708	АВ NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
5	256054	Контактор NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц	5	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 440 x 265 x 120 мм; IP54.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩАО.2**	**440 x 265 x 120 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 8/25**


07. 1ЩР-1

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

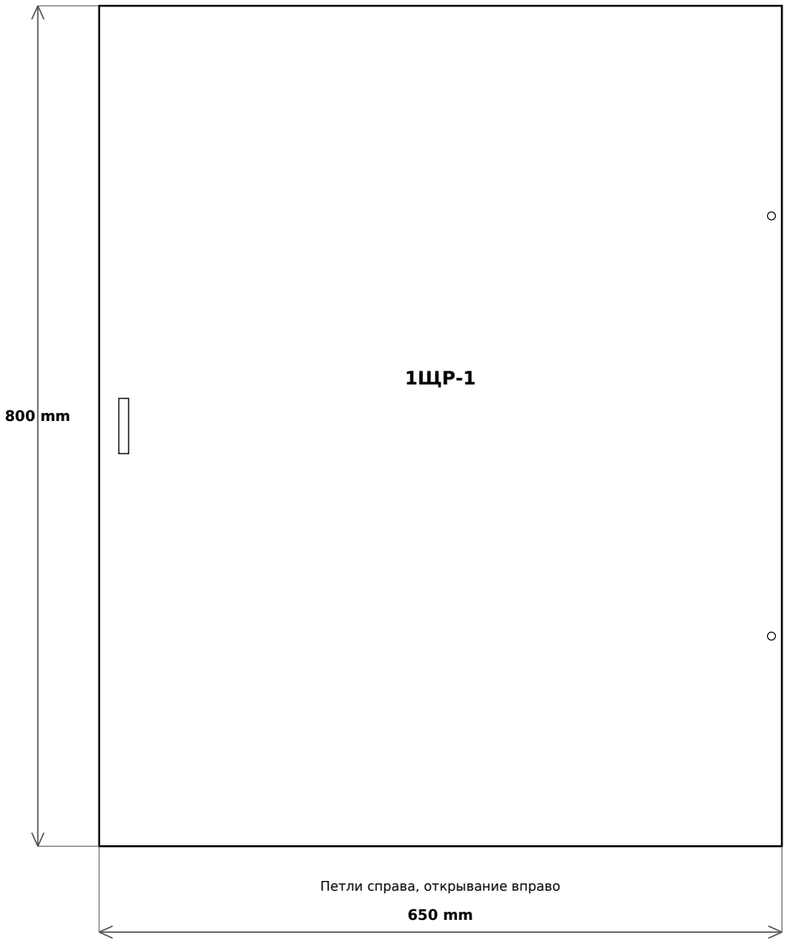

БОКОВОЙ ВИД

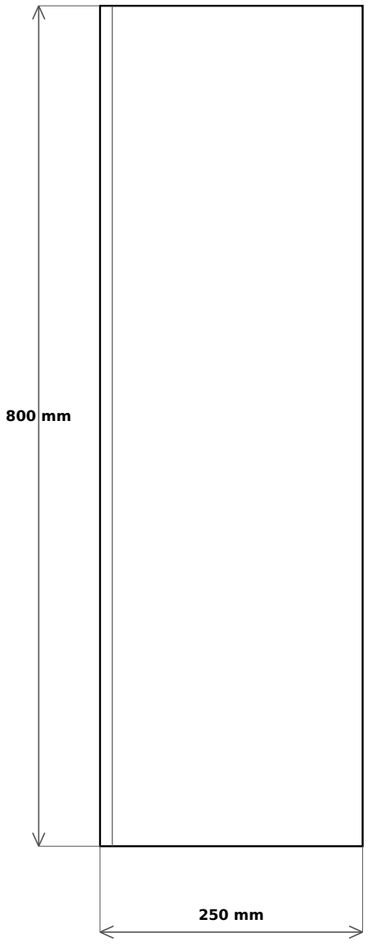

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	179707	АВ NB1-63 3P 40A 6кА х-ка C	1	CHINT	ВВОД
3	814090	АВ NXB-63 2P 6A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.
4	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	12	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	1ЩР-1	800 x 650 x 250 мм	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	Лист 9/25


08. ЩР.п

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

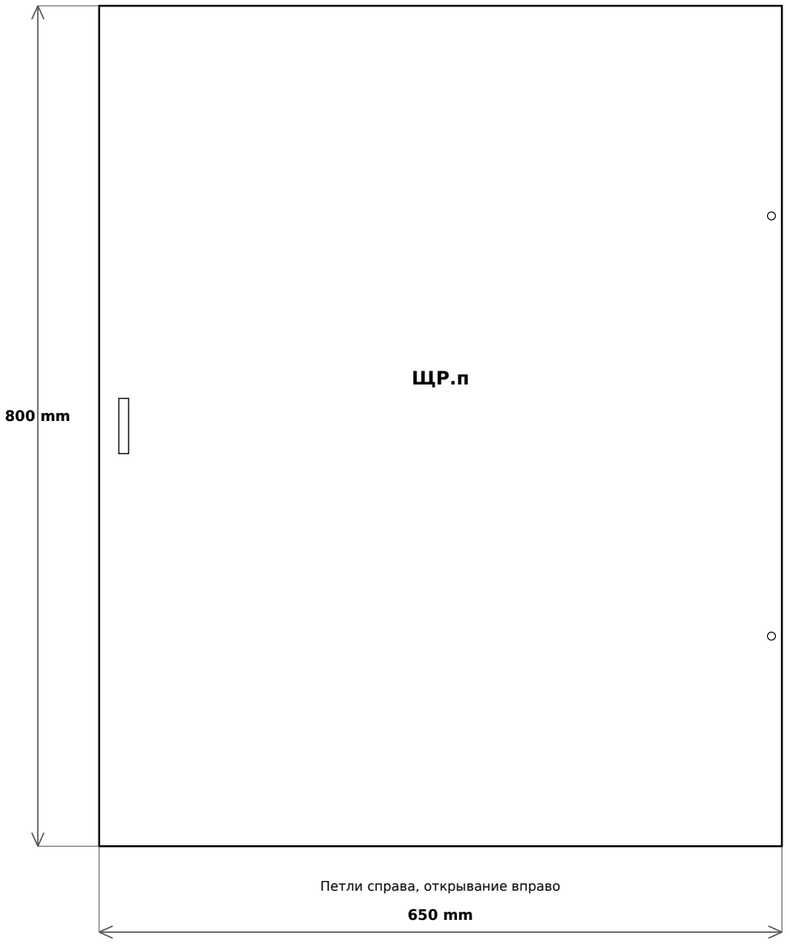

БОКОВОЙ ВИД

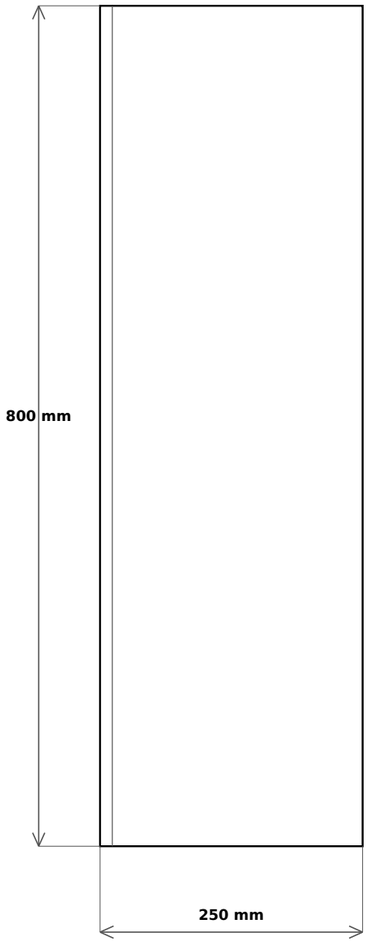

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	179705	АВ NB1-63 3P 32A 6кА х-ка C	1	CHINT	ВВОД
3	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	15	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩР.п**	**800 x 650 x 250 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 10/25**


09. 1ЩР-2 ИБП

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

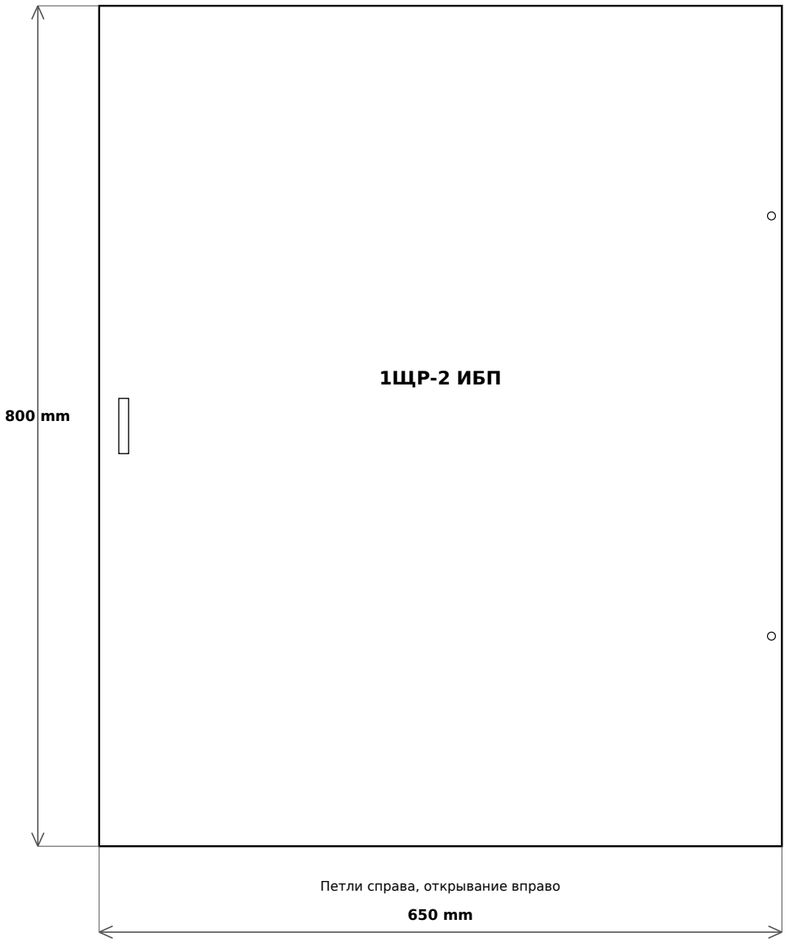

БОКОВОЙ ВИД

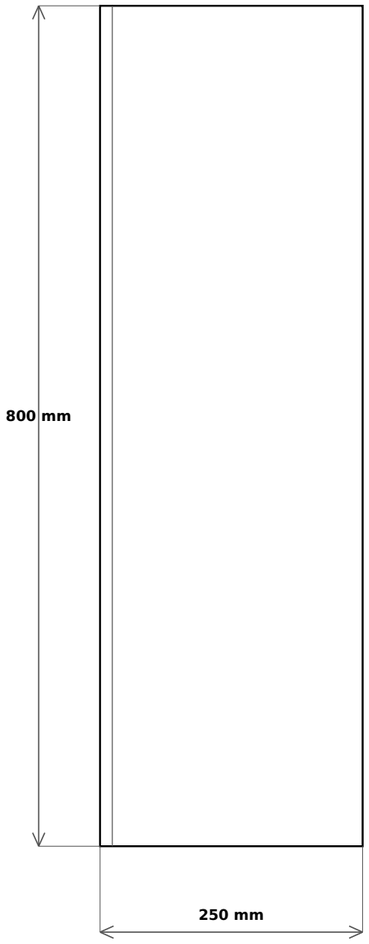

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	131363	АВ NXM-125S/3P 125A 25кА	1	CHINT	ВВОД
3	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	45	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**1ЩР-2 ИБП**	**800 x 650 x 250 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 11/25**


10. 1ЩР-3

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

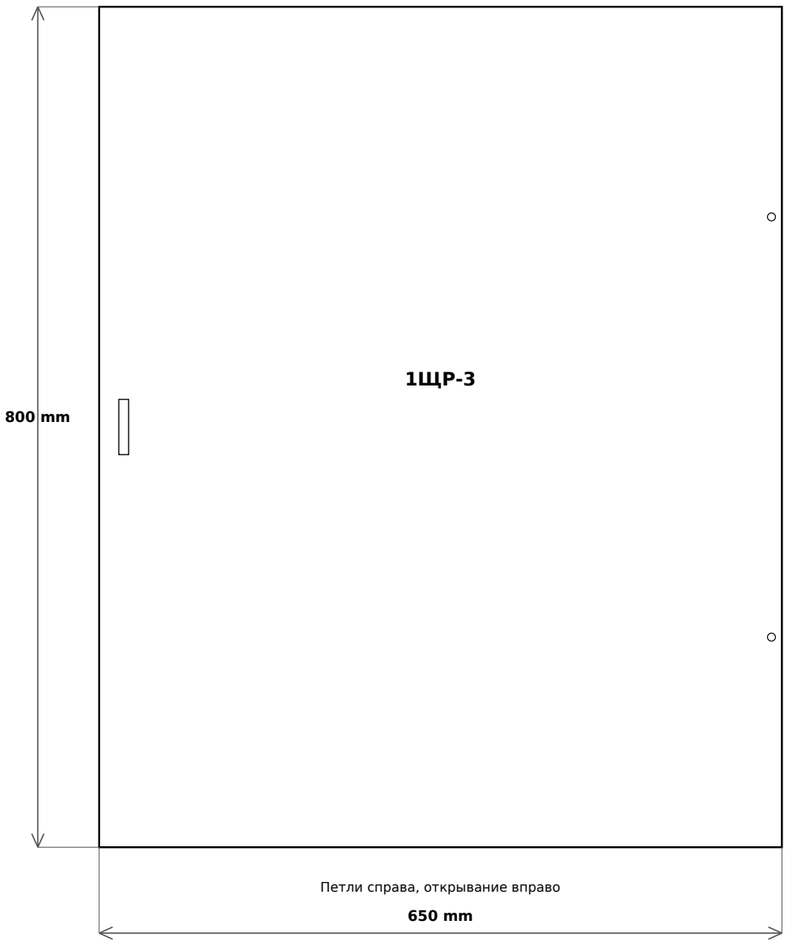

БОКОВОЙ ВИД

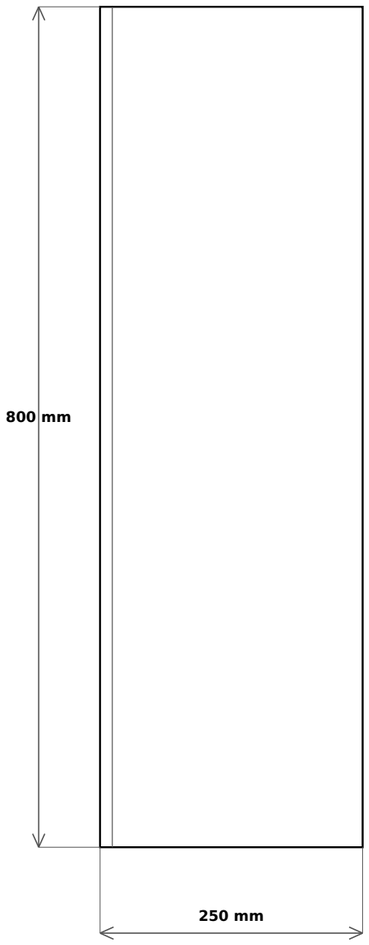

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	131360	АВ NXM-125S/3P 63A 25кА	1	CHINT	ВВОД
3	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	24	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**1ЩР-3**	**800 x 650 x 250 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 12/25**


11. 2ЩР-1

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

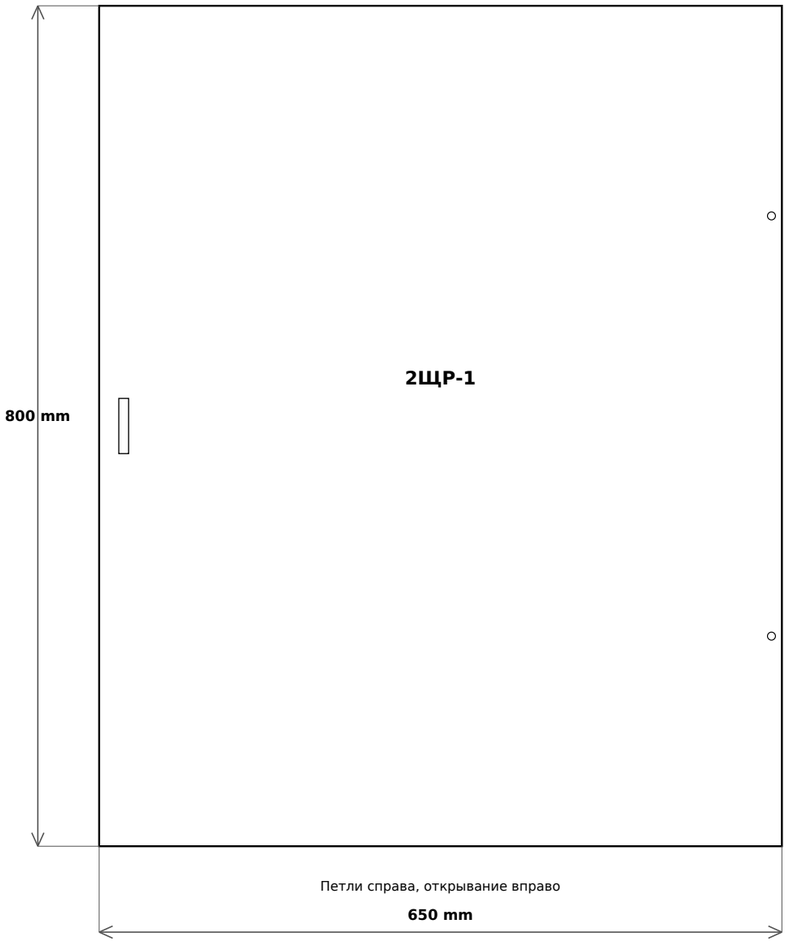

БОКОВОЙ ВИД

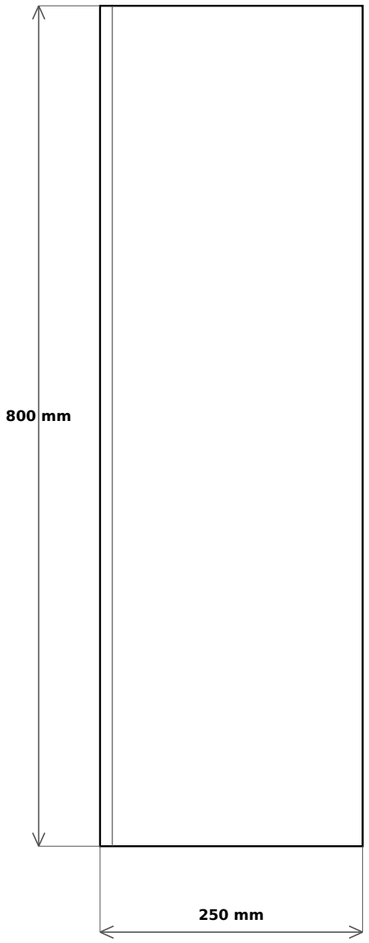

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	844302	АВ NXM-125S/3P 50A 25кА	1	CHINT	ВВОД
3	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	18	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**2ЩР-1**	**800 x 650 x 250 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 13/25**


12. 2ЩР-2 (ИБП)

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

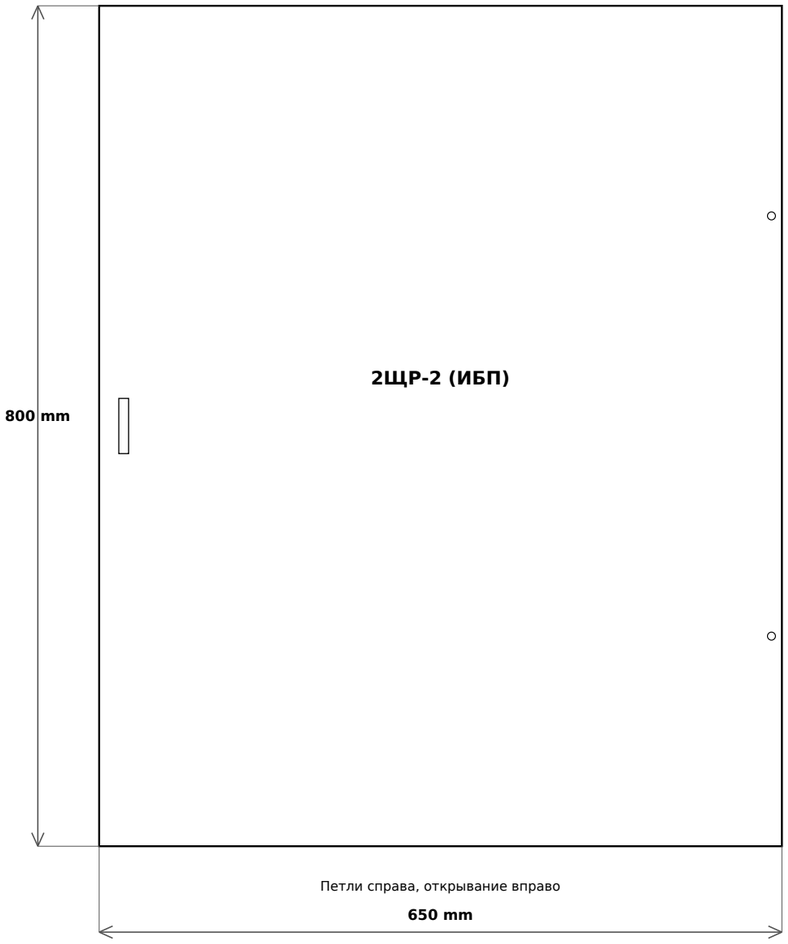

БОКОВОЙ ВИД

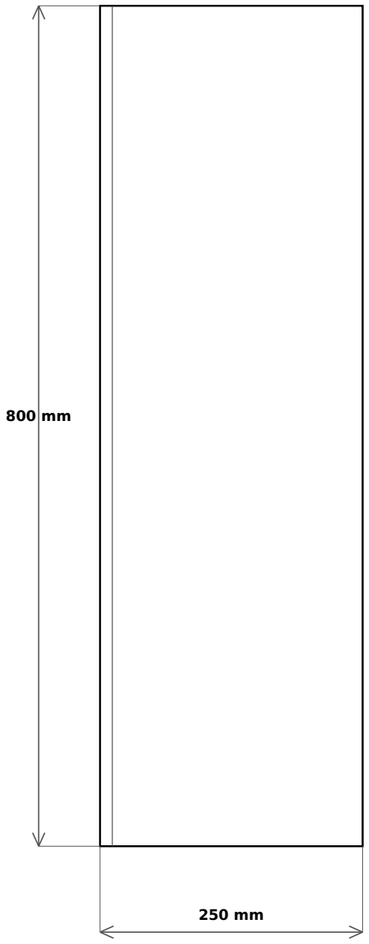

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15420	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	193181	Рубильник NXHB-125 3P 32A	1	CHINT	ВВОД
3	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	17	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**2ЩР-2 (ИБП)**	**800 x 650 x 250 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 14/25**


13. ЩС-Тх.п2

Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31


ВИД СПЕРЕДИ

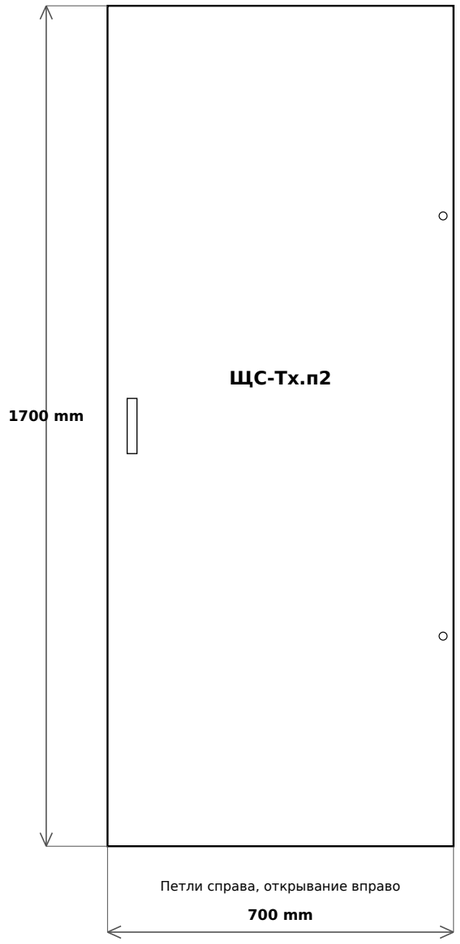

БОКОВОЙ ВИД

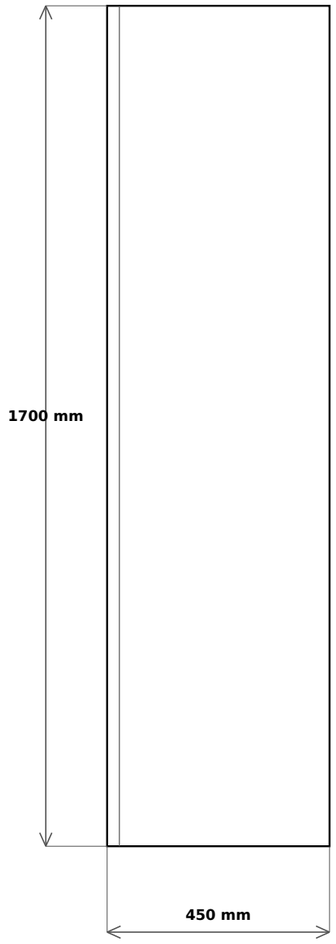

ВИД СНИЗУ

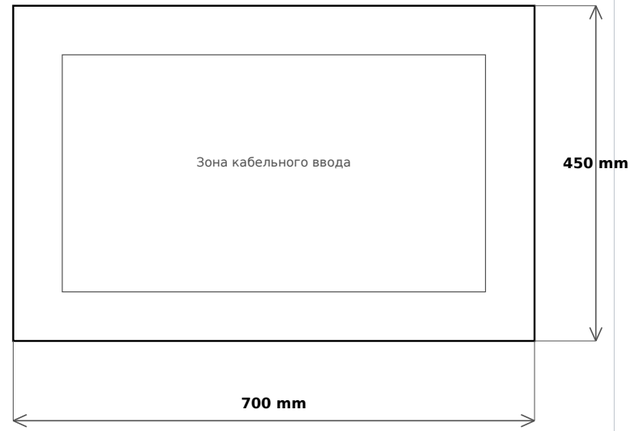

Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15085	Мет.Корпус ВРУ (1700X700X450+10X700 База) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	393266	Рубильник NH40-400/3, 3P, 400A, стандартная рукоятка управления	1	CHINT	ВВОД
3	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	39	CHINT	ОТХ.
4	814094	АВ NXB-63 2P 25A 6кА х-ка C	3	CHINT	ОТХ.
5	814169	АВ NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	2	CHINT	ОТХ.
6	814170	АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C	7	CHINT	ОТХ.
7	814174	АВ NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.
8	814176	АВ NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C	6	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 1700 x 700 x 450 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩС-Тх.п2**	**1700 x 700 x 450 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 15/25**


14. 1ЩР-Б

Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

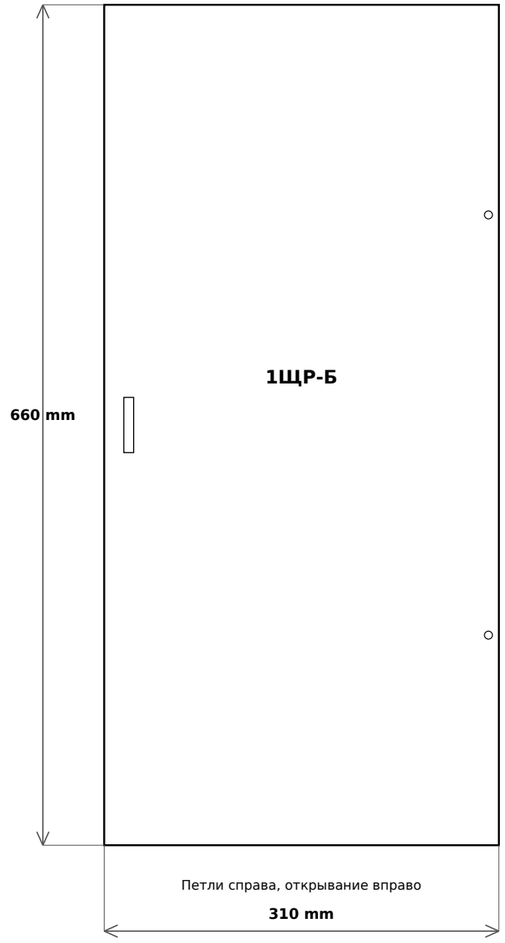

БОКОВОЙ ВИД

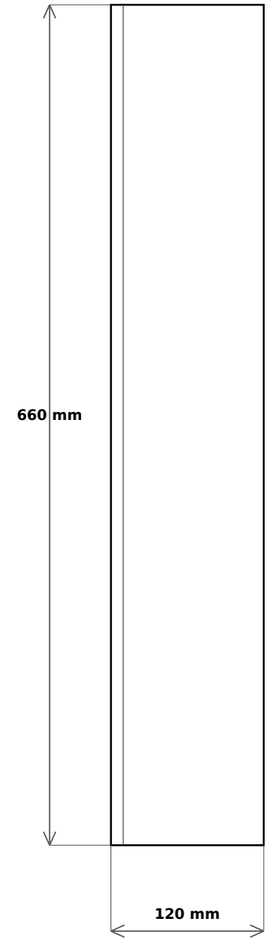

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	714-15040	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS)	1	TEKSAN	КОРПУС
2	193182	Рубильник NXHB-125 3P 40A	1	CHINT	ВВОД
3	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	9	CHINT	ОТХ.
4	814094	АВ NXB-63 2P 25A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.
5	814095	АВ NXB-63 2P 32A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 660 x 310 x 120 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**1ЩР-Б**	**660 x 310 x 120 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 16/25**


15. 2ЩР-Б

Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

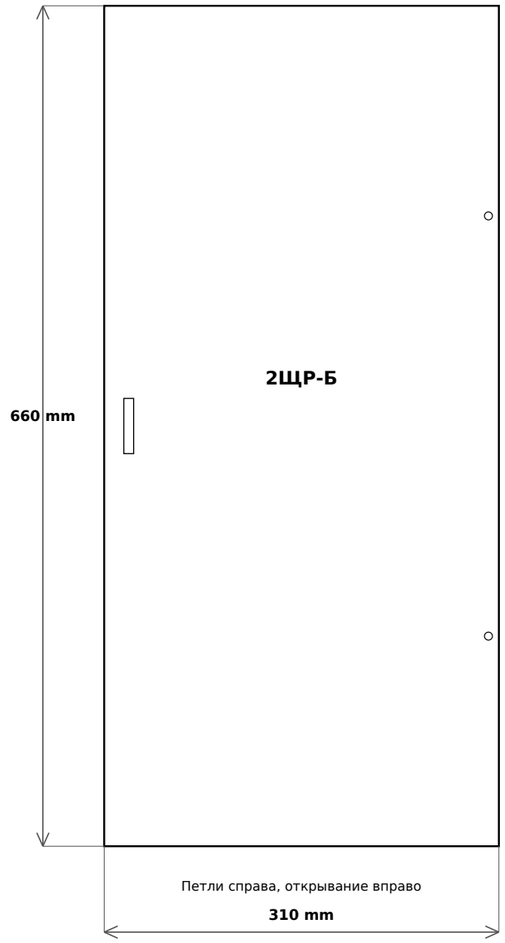

БОКОВОЙ ВИД

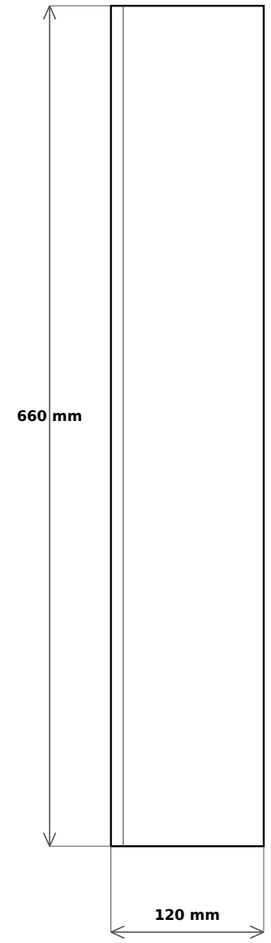

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	714-15040	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP31 (TS)	1	TEKSAN	КОРПУС
2	193182	Рубильник NXHB-125 3P 40A	1	CHINT	ВВОД
3	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	11	CHINT	ОТХ.
4	814096	АВ NXB-63 2P 40A 6кА х-ка C	2	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 660 x 310 x 120 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**2ЩР-Б**	**660 x 310 x 120 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 17/25**


16. 2ЩС-Tx.1

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

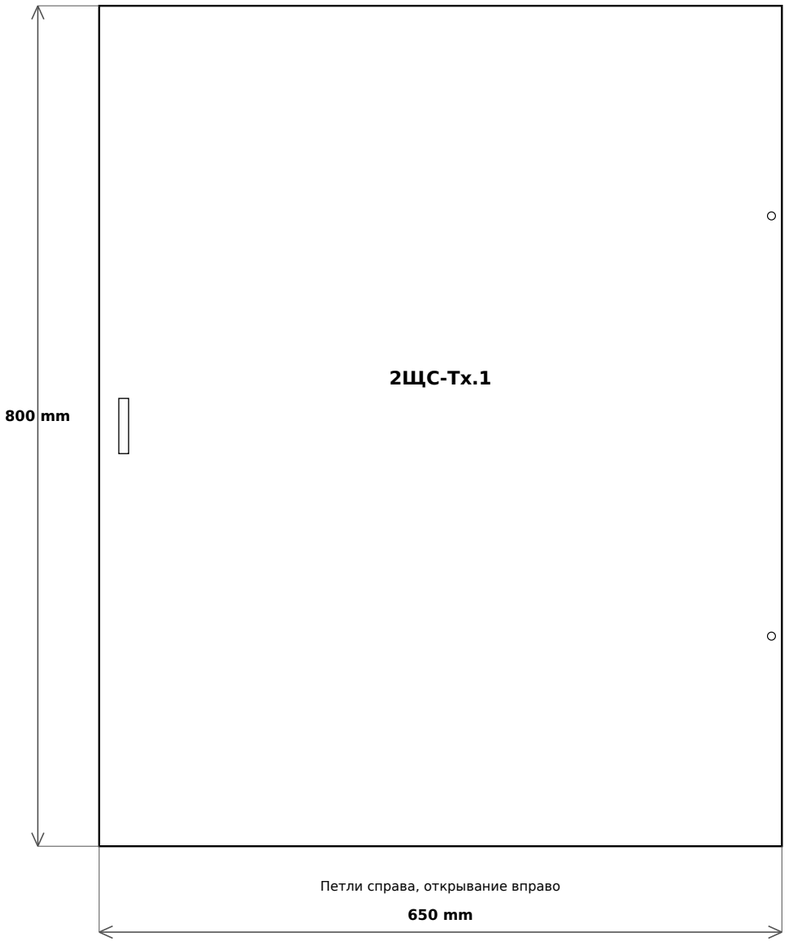

БОКОВОЙ ВИД

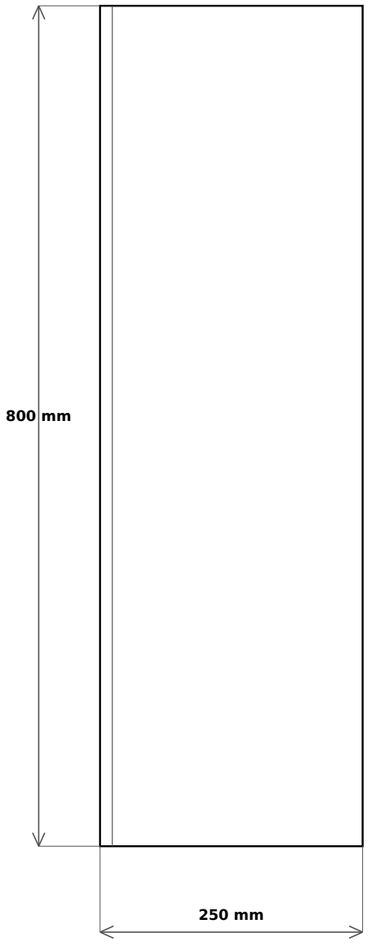

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	131363	АВ NXM-125S/3P 125A 25кА	1	CHINT	ВВОД
3	814014	АВ NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C	20	CHINT	ОТХ.
4	814015	АВ NXB-63 1P 20A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.
5	814017	АВ NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.
6	814170	АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.
7	814172	АВ NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.
8	814173	АВ NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.
9	814175	АВ NXB-63 3P 50A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**2ЩС-Tx.1**	**800 x 650 x 250 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 18/25**


17. ЩС.VRF.к

Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54

ВИД СПЕРЕДИ

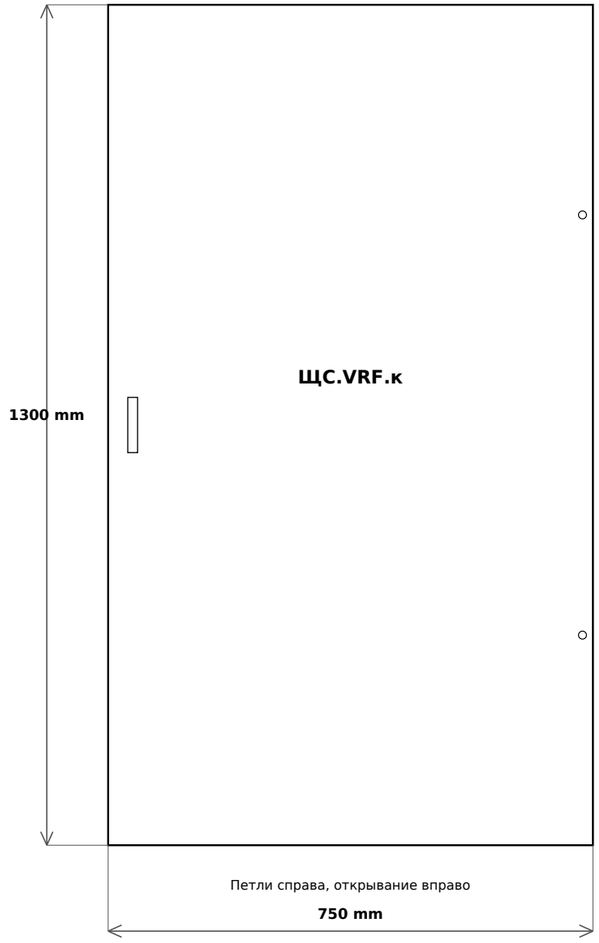

БОКОВОЙ ВИД

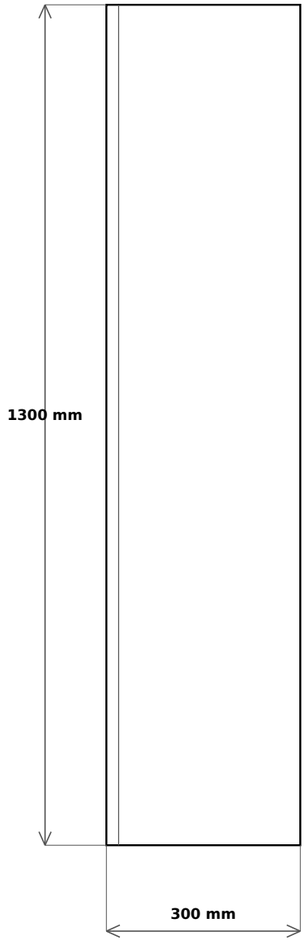

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15090	Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54	1	TEKSAN	КОРПУС
2	131373	АВ NXM-400S/3P 400A 50кА	1	CHINT	ВВОД
3	946966	Нез. расцепитель SHT-M4 A1 R для NXM(LE)-630(400) AC230V (правый)	1	CHINT	УПР.
4	131360	АВ NXM-125S/3P 63A 25кА	1	CHINT	ОТХ.
5	131361	АВ NXM-125S/3P 80A 25кА	2	CHINT	ОТХ.
6	814014	АВ NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C	4	CHINT	ОТХ.
7	814170	АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C	3	CHINT	ОТХ.
8	814173	АВ NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C	3	CHINT	ОТХ.
9	814174	АВ NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C	6	CHINT	ОТХ.
10	296708	АВ NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
11	946941	Доп. контакт AX-M4 L для NXM-630(400) (левый)	1	CHINT	УПР.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 1300 x 750 x 300 мм; IP54.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩС.VRF.к**	**1300 x 750 x 300 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 19/25**


18. ЩУВ-П

Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

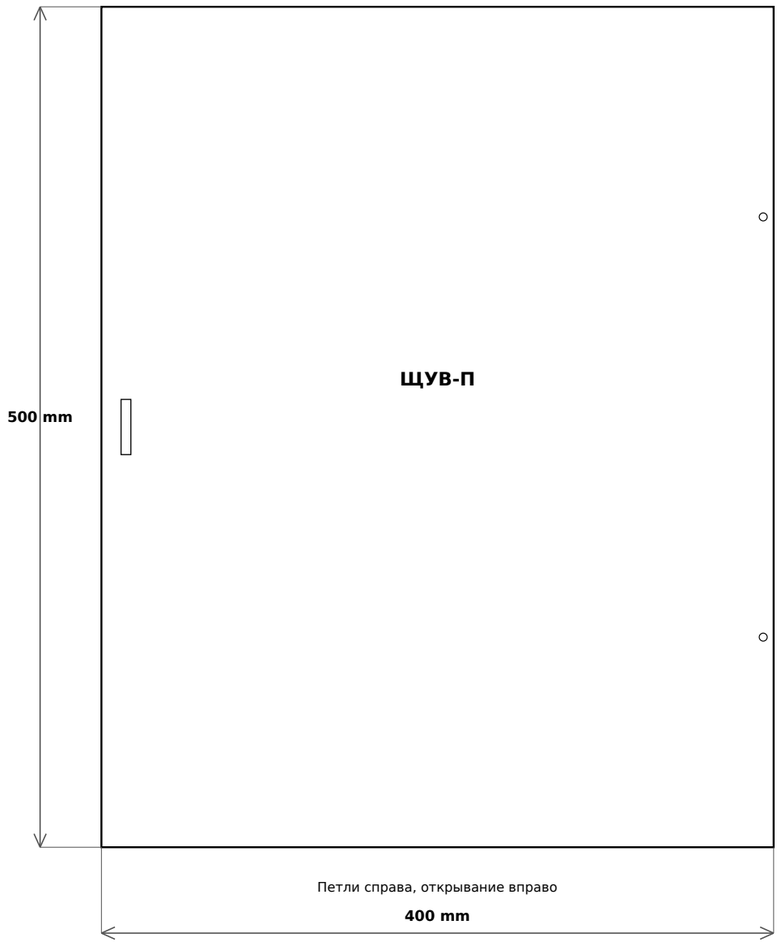

БОКОВОЙ ВИД

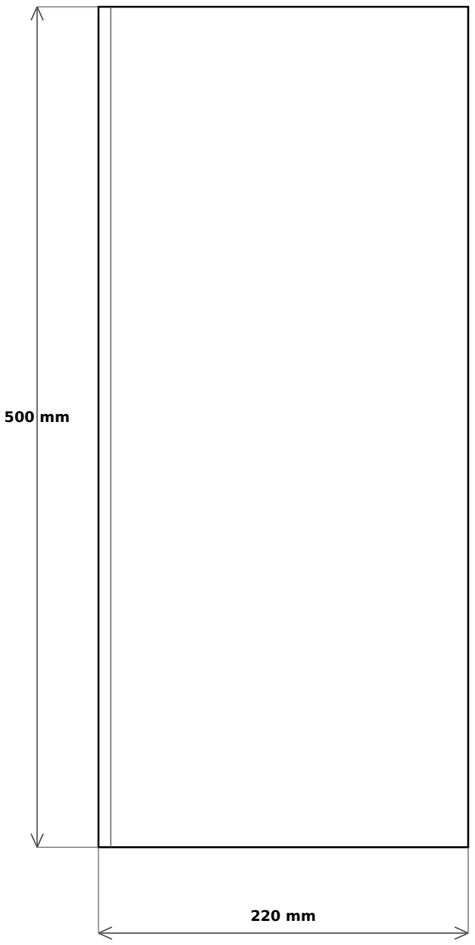

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	205886	АВ NXM-63S/3P 25кА 32А	1	CHINT	ВВОД
3	946996	Нез. расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый)	1	CHINT	УПР.
4	814014	АВ NXB-63 1P 16А 6кА х-ка C	9	CHINT	ОТХ.
5	296708	АВ NXB-63S 1P 6А 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
6	946951	Доп. контакт AX-M1 R для NXM-125(63)/NXMLE-125(правый)	1	CHINT	УПР.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 500 x 400 x 220 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩУВ-П**	**500 x 400 x 220 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 20/25**


19. ЩС.В3

Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54

ВИД СПЕРЕДИ

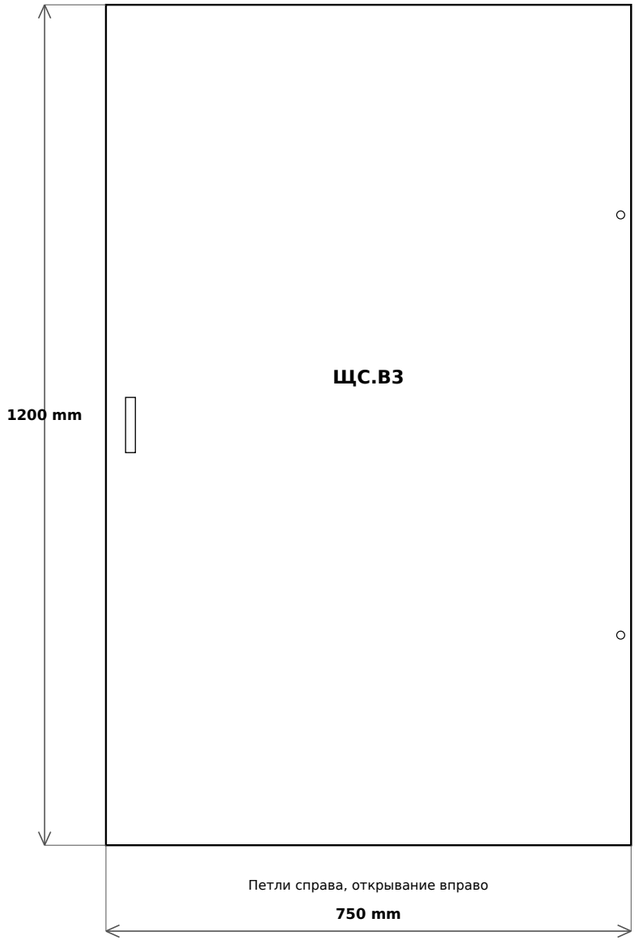

БОКОВОЙ ВИД

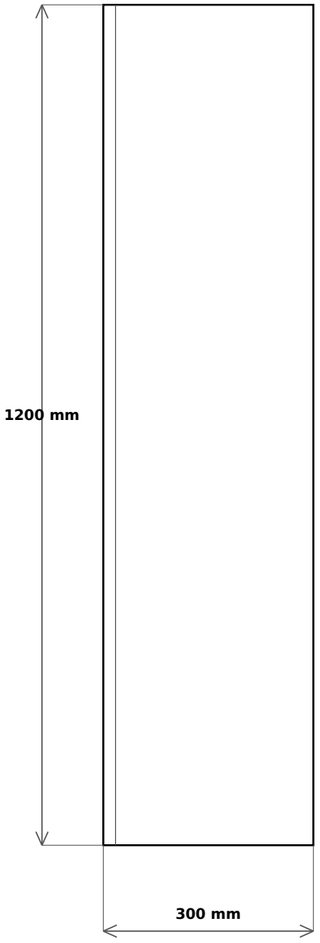

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15562	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54	1	TEKSAN	КОРПУС
2	131367	АВ NXM-250S/3P 200A 36кА	1	CHINT	ВВОД
3	946972	Нез. расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый)	1	CHINT	УПР.
4	205887	АВ NXM-63S/3P 25кА 40A	1	CHINT	ОТХ.
5	131361	АВ NXM-125S/3P 80A 25кА	2	CHINT	ОТХ.
6	814014	АВ NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C	7	CHINT	ОТХ.
7	814170	АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C	5	CHINT	ОТХ.
8	814173	АВ NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C	2	CHINT	ОТХ.
9	296708	АВ NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
10	946944	Доп. контакт AX-M3 L для NXM(LE)-320(250) (левый)	1	CHINT	УПР.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 1200 x 750 x 300 мм; IP54.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩС.В3**	**1200 x 750 x 300 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 21/25**


20. ЩУВ1

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

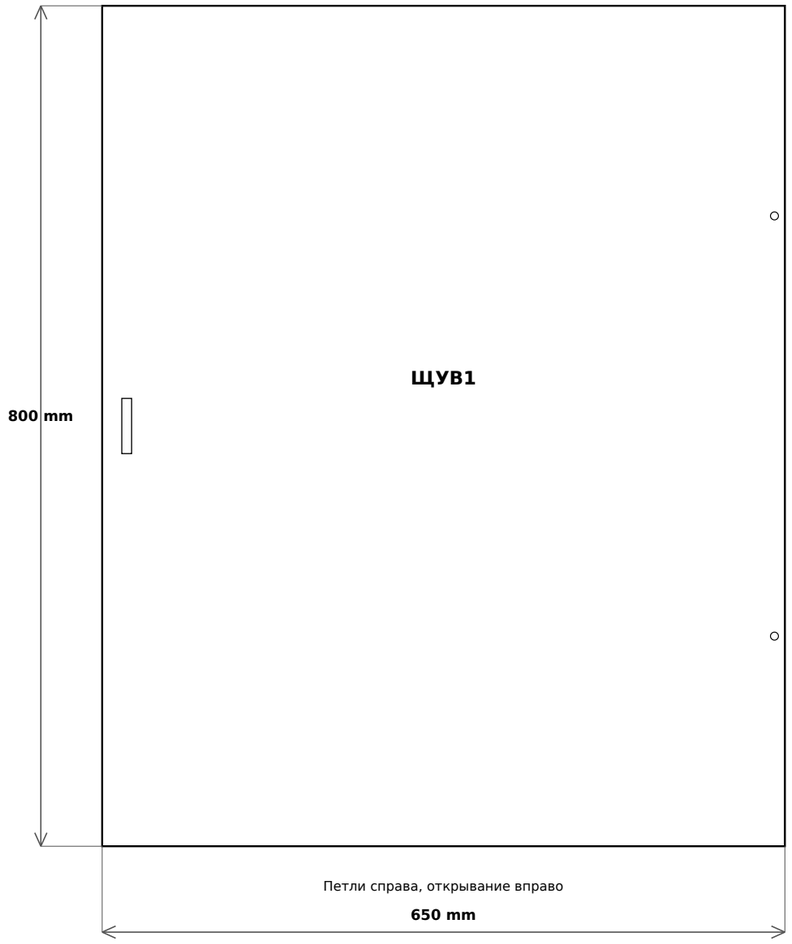

БОКОВОЙ ВИД

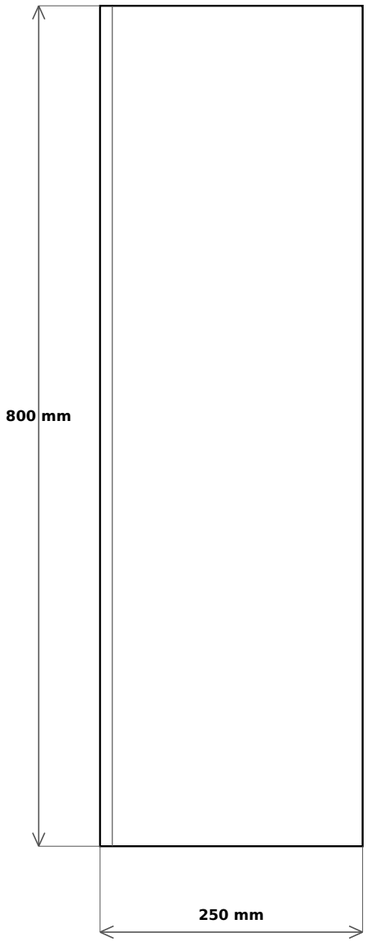

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	131363	АВ NXM-125S/3P 125A 25кА	1	CHINT	ВВОД
3	946996	Нез. расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый)	1	CHINT	УПР.
4	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	4	CHINT	ОТХ.
5	814170	АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C	6	CHINT	ОТХ.
6	814172	АВ NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	2	CHINT	ОТХ.
7	814173	АВ NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C	3	CHINT	ОТХ.
8	296708	АВ NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
9	946951	Доп. контакт AX-M1 R для NXM-125(63)/NXMLE-125(правый)	1	CHINT	УПР.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩУВ1**	**800 x 650 x 250 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 22/25**


21. ЩУВ.п

Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

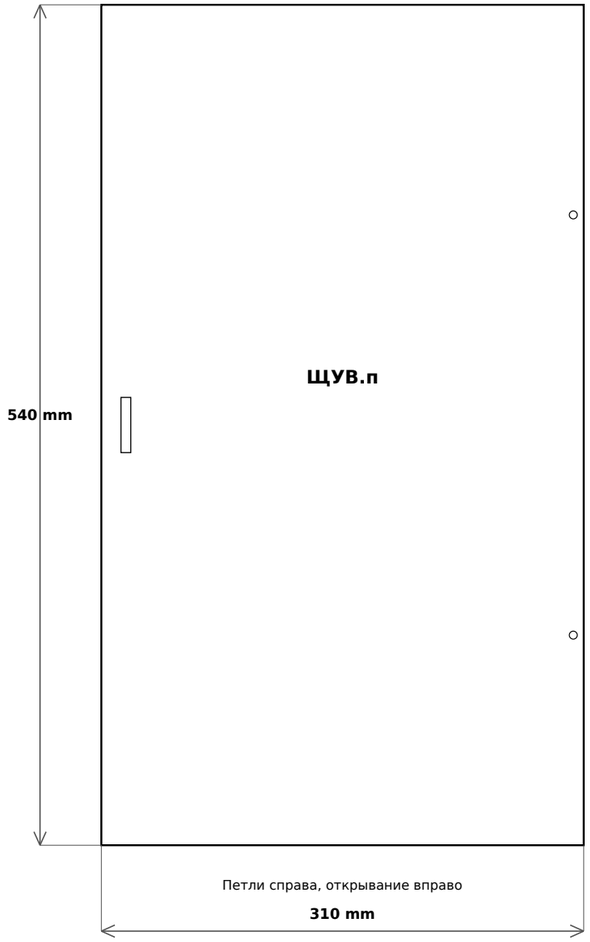

БОКОВОЙ ВИД

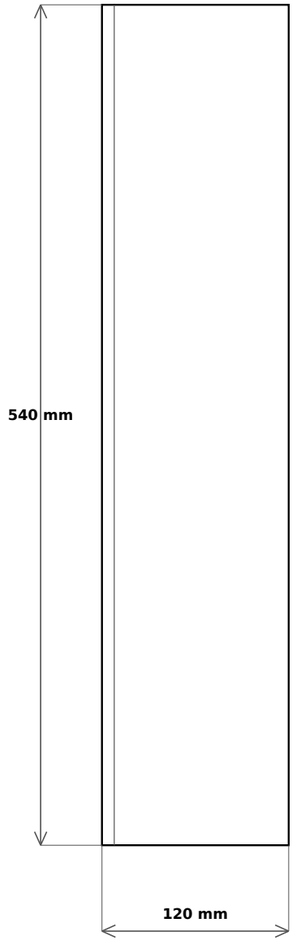

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	714-15070	Щит мет.ЩРн-36 б/о (540x310x120) S/U 36 IP54 (TS)	1	TEKSAN	КОРПУС
2	816989	Нез. расцепитель SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G)	1	CHINT	УПР.
3	813873	АВ NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C	1	CHINT	ВВОД
4	814090	АВ NXB-63 2P 6A 6кА х-ка C	5	CHINT	ОТХ.
5	814092	АВ NXB-63 2P 16A 6кА х-ка C	4	CHINT	ОТХ.
6	296708	АВ NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
7	814991	Доп. контакт AX-X1 для NXB-63	1	CHINT	УПР.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 540 x 310 x 120 мм; IP54.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩУВ.п**	**540 x 310 x 120 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 23/25**


22. ЩУВ.кр

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

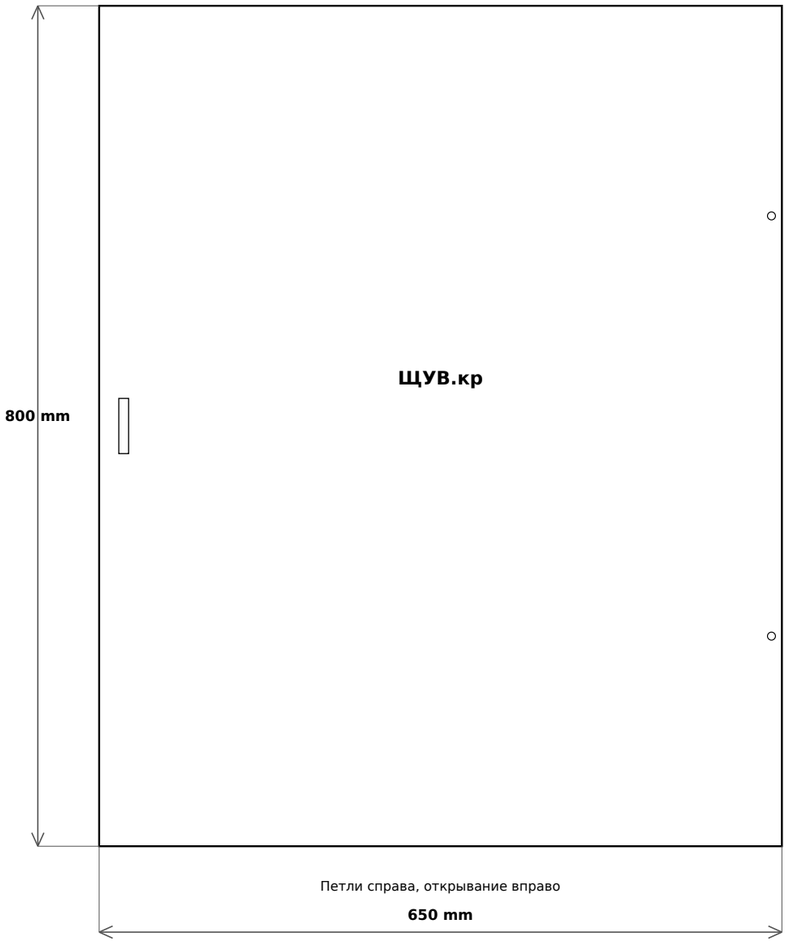

БОКОВОЙ ВИД

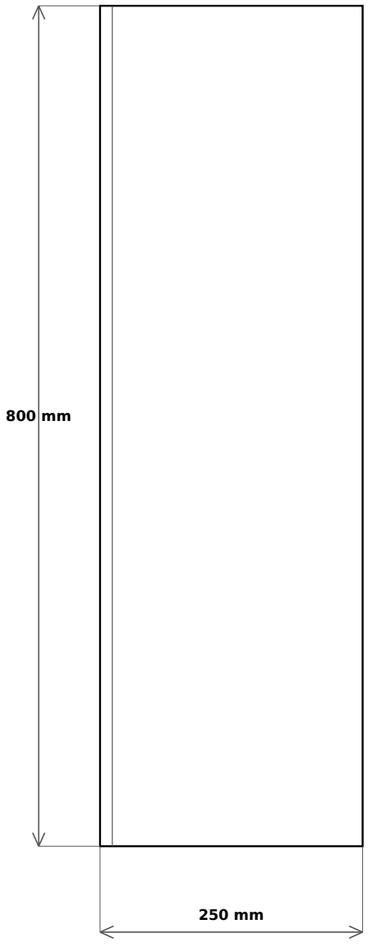

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	131364	АВ NXM-160S/3P 160A 36кА	1	CHINT	ВВОД
3	946953	Нез. расцепитель SHT-M2 A1 L для NXM(LE)-160 AC230V (левый)	1	CHINT	УПР.
4	814014	АВ NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C	2	CHINT	ОТХ.
5	814170	АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C	2	CHINT	ОТХ.
6	814172	АВ NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	4	CHINT	ОТХ.
7	814173	АВ NXB-63 3P 32A 6кА х-ка C	1	CHINT	ОТХ.
8	814174	АВ NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C	3	CHINT	ОТХ.
9	296708	АВ NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
10	946946	Доп. контакт AX-M2 L для NXM(LE)-160 (левый)	1	CHINT	УПР.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	ЩУВ.кр	800 x 650 x 250 мм	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	Лист 24/25


23. ЩС.ПУ

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

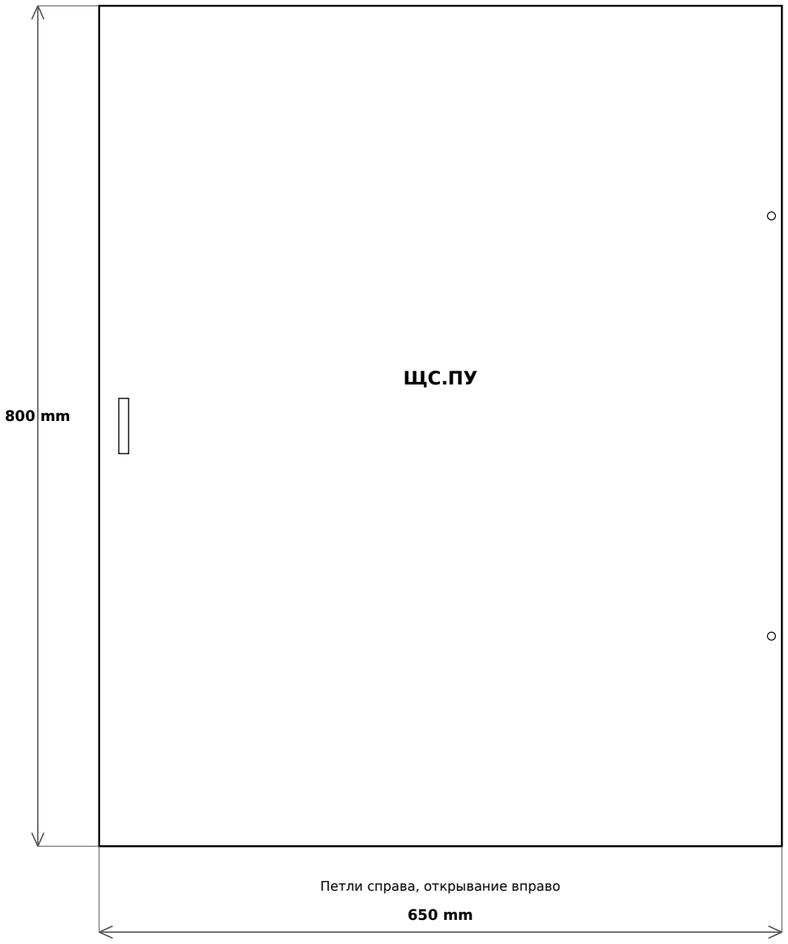

БОКОВОЙ ВИД

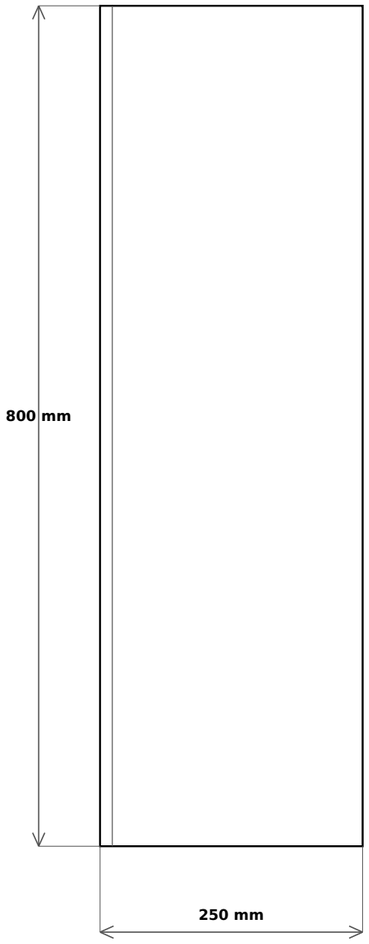

ВИД СНИЗУ



Отверстия и сальники - по проекту и фактическому кабельному вводу; без отдельной привязки не вырезать.

№	Артикул	Наименование	Кол.	Марка	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	TEKSAN	КОРПУС
2	131363	АВ NXM-125S/3P 125A 25кА	1	CHINT	ВВОД
3	946996	Нез. расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый)	1	CHINT	УПР.
4	814014	АВ NXB-63 1P 16A 6кА х-ка C	8	CHINT	ОТХ.
5	814170	АВ NXB-63 3P 16A 6кА х-ка C	4	CHINT	ОТХ.
6	814172	АВ NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	4	CHINT	ОТХ.
7	296708	АВ NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	1	CHINT	УПР.
8	946951	Доп. контакт AX-M1 R для NXM-125(63)/NXMLE-125(правый)	1	CHINT	УПР.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Габарит: 800 x 650 x 250 мм; IP31.
- Лист согласования содержит только внешние 2D виды: спереди, сбоку и снизу.
- Внутренняя компоновка аппаратов на данном листе не требуется.
- Состав аппаратов - строго по BOM; схема и маркировка цепей - по проекту DXF.
- Отверстия кабельного ввода выполнять только после подтверждения привязки кабелей.
- Однодверный корпус: петли справа, открывание двери вправо.

YSF ELECTRIC Производственный лист согласования	**ЩС.ПУ**	**800 x 650 x 250 мм**	Проект: Казино / Maksad Дата: 21.09.2026	Разраб.: YSF Проверил: ____	**Лист 25/25**
